

INFORME DE EJECUCIÓN

Entidad contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO

Contratista: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INGEBO SAS

Responsable: Oswaldo Almanza

1.Objeto: “SUMINISTRO DE UN (1) EQUIPO DE RX FIJO DIGITAL AL SERVICIO DE ÍMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO”

IT	ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VR TOTAL
1	Equipo de RX Fijo Digital	UNIDAD	1	\$310.915.200	\$59.073.888	\$369.989.088

2. Actividades realizadas:

-El día 7 de agosto del año 2025 se realizo la entrega a satisfacción del equipo de Rx fijo digital en el Hospital Local de Algarrobo.

- El 11 de agosto se realizó visita de preinstalación de rx.

-El 12 de agosto del año 2025 se procedió con la Instalación y puesta en funcionamiento de equipo de Rx fijo digital DigiEye 280 en la ESE Hospital De Algarrobo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y contractuales.

2.1. Ingreso del equipo

Fecha de entrega: 7/08/2025

Lugar de entrega: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO

Equipo: EQUIPO DE RAYOS X MINDRAY 50 KW CON MONITOR 24 - DIGIEYE 280 -

Serial / número de identificación del equipo: EB6-45000647

Registro Invima: 2015EBC-0012975

Personal presente en la recepción: Luis Javier De La Rosa Mendoza

2.2. Instalación del equipo

Fecha de instalación: 12/08/2025

Ubicación final: Radiología

Procedimiento de instalación:

La instalación del equipo de RX fijo digital Digieye 280, consistió en recibir y verificar el equipo y sus accesorios completos, en la visita de preinstalación se validó dimensiones de la sala y acometida eléctrica requerida, se desempaqueto y ubico el equipo en su posición final, se conectó la alimentación, puesta a tierra y sistemas de control, se realizaron pruebas iniciales y calibraciones según el fabricante, y finalmente se brindó capacitación al personal y entrega de la documentación correspondiente.

Materiales o accesorios instalados: Detector plano, generador de alta frecuencia, mesa fija flotante, consola de operación de rx, gabinete de control, fuente de poder y tubo de rx.

Tiempo total de instalación: 48 horas

2.3. Funcionamiento y pruebas técnicas

Fecha de pruebas: 12/08/2025

Pruebas realizadas:

1. Se encendió el sistema y verificamos encendido sin errores.
2. Se ejecutaron pruebas de posicionamiento, movimiento y exposición de prueba (sin paciente).
3. Se realizó la configuración de parámetros según especificaciones del fabricante.
4. Se realizó calibración de imagen y verificación de calidad radiográfica

Resultados: Satisfactorio, cumple con lo establecido en el contrato.


Observaciones: Se coordinarán 2 mantenimientos preventivos con el fin de preservar la garantía del equipo.

3. Conclusión

Se deja constancia de que el equipo Rx fijo digital DigiEye 280 ingresó, fue instalado y se encuentra en pleno funcionamiento en la ESE Hospital De Algarrobo cumpliendo con las especificaciones técnicas y contractuales.

4. Registro fotográfico



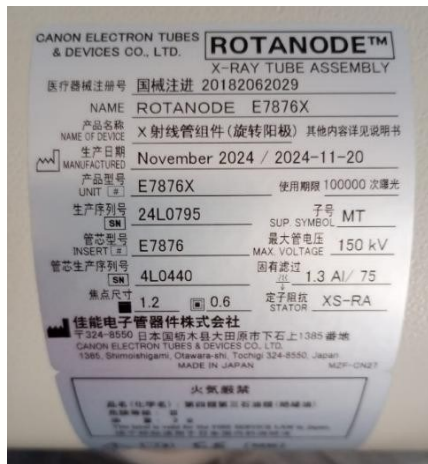


4. Firma y certificación



Responsable:

Nombre: Oswaldo Almanza

Fecha: 12/08/2025



Representante del Hospital

Nombre: Luis Gabriel De La Rosa Mendoza

Fecha: 12/08/2025

