

Intervención

CIV 13000744

Carrera 20 entre calles 57 y 58
Barrio San Luis.



ORDENADOR DEL GASTO

Los recursos para la intervención de las vías del contrato FDLT-552-2024 COP (120683), han sido asignados por el **Fondo De Desarrollo Local De Teusaquillo**.


- La intervención vial que presentamos hoy es el resultado del compromiso de la Alcaldía Local de Teusaquillo para mejorar la infraestructura urbana, garantizando vías más seguras, accesibles y eficientes para todos los ciudadanos.
- Esta iniciativa busca responder a las necesidades de nuestra localidad, optimizando el tráfico, fortaleciendo la seguridad vial y promoviendo un entorno más amigable para peatones y conductores.
- Gracias a los recursos gestionados y al esfuerzo conjunto de las autoridades locales y la comunidad, estamos dando pasos firmes hacia una ciudad mejor conectada y preparada para el futuro.

CONTRATO DE OBRA No. FDLT-552-2024 COP (120683) – CONCORCIO TEUSAVIAL

OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”D.C.



UBICACIÓN

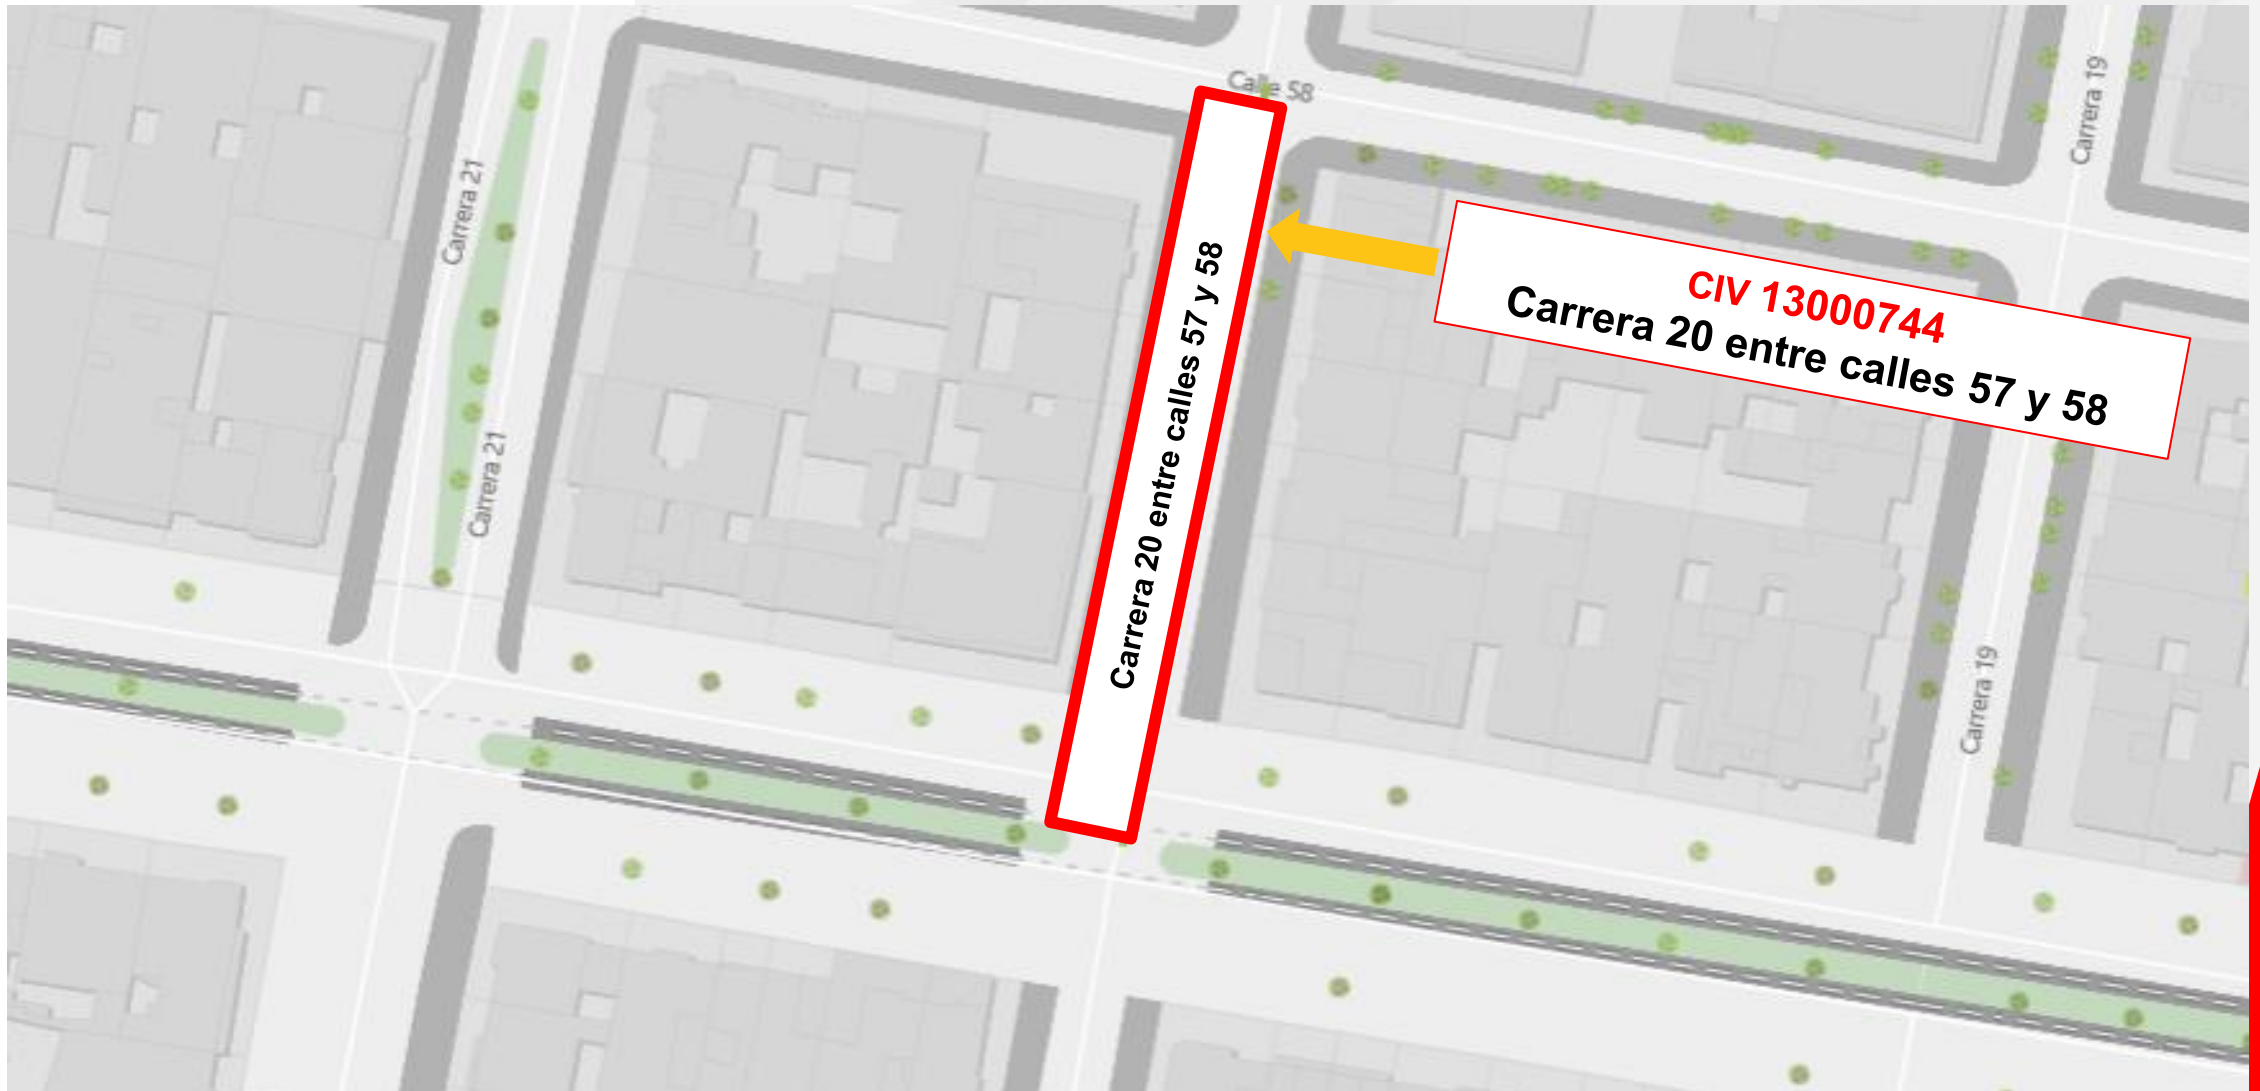

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA CIV 13000744



Carrera 20 entre calles 57 y 58

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA CIV 13000744



Carrera 20 entre calles 57 y 58


ESTADO ACTUAL DE LA VÍA CIV 13000744



Carrera 20 entre calles 57 y 58

NECESIDAD DE INTERVENCIÓN VIAL

- Mejoramiento de subrasante y manejo de grietas, hundimiento y/o abultamiento de estructura por raíces arbóreas
- Reparación y manejo de deformaciones en la estructura vial
- Manejo de aguas lluvias
- Cambio de estructura de la vía
- Mejorar el estado vial
- Mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del área a intervenir

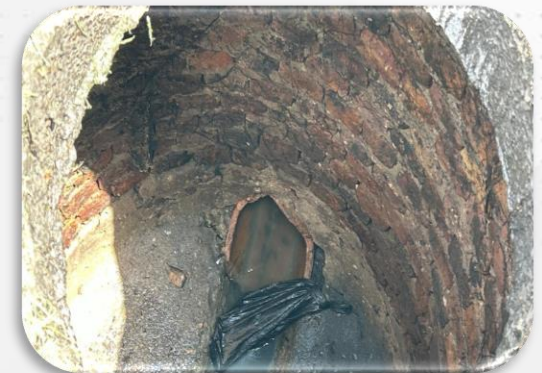

ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN DIAGNÓSTICO

- Instalación de geotextil tejido
- Conformación de subbase granular con agregado reciclado.
- Instalación de geocelda rellena con agregado reciclado.
- Instalación de Base granular mejorada con cemento y aditivo.
- Terminación concreto asfáltico .



Instalación
geotextil tejido y
geocelda



ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN DIAGNÓSTICO

- Instalación de material granular reciclado para subbase
- Conformación de base granular mejorada con cemento portland 5%
- Sello de base con imprimación, emulsión
- Conformación con asfalto.
- Conformación capa de rodadura en asfalto



Geocelda rellena
con agregado



Altitud: 2556
Velocidad: 40
Observación: T



Altitud: 2556
Velocidad: 40
Observación: T

Instalación de
asfalto



Altitud: 2556
Velocidad: 40
Observación: T

GRACIAS

