 <p><b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> NIT. 890.205.229-1</p>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 1 de 42	

## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 332 DE 2025 “SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER”



**ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA**  
Supervisor


**GLOBALNET INGENIERIA S.A.S.**  
Contratista

**DICIEMBRE DE 2025**

 <p>ALCALDÍA DE <b>MÁLAGA</b> NIT. 890.205.229-1</p>	<h1>INFORME</h1>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 2 de 42	

## CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	6
3.	ACTAS SUSCRITAS HASTA LA PRESENTE FECHA.....	6
4.	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO.....	6
4.1.	ACTIVIDADES TÉCNICAS .....	6
4.2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .....	36
4.3	ACTIVIDADES FINANCIERAS.....	36
5.	CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.....	37
6.	RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO POR EL CONTRATISTA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO .....	41
7.	RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS .....	42

 ALCALDÍA DE <b>MÁLAGA</b> NIT. 890.205.229-1	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico		
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26	
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3	
			Página 3 de 42	

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión se elabora en el marco del Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025, cuyo objeto es el **“SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER”**.

La celebración de este contrato responde a la necesidad identificada por la Administración Municipal de garantizar la instalación de un alumbrado navideño ornamental y temporal en espacios públicos, como estrategia de integración ciudadana, fortalecimiento de las tradiciones culturales, dinamización de la economía local y promoción turística durante la temporada decembrina. El municipio carece de personal técnico y de los materiales requeridos para ejecutar directamente este tipo de proyectos, razón por la cual se acudió a la contratación pública para asegurar su adecuada planeación, montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento.


El alumbrado navideño constituye una actividad de interés público y cultural, orientada al bienestar social, la conservación de tradiciones y el embellecimiento urbano. Su instalación en lugares emblemáticos como la Plaza Institucional y la Alameda fomenta la cohesión social, incrementa la seguridad mediante una mejor iluminación nocturna y contribuye al atractivo turístico del municipio en una de las épocas más significativas para la comunidad.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia (artículo 311), corresponde al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local y promover la participación comunitaria. En este contexto, la Administración Municipal de Málaga celebró el Contrato No. 332 de 2025, garantizando la transparencia, la planeación y el uso racional de los recursos públicos para la ejecución del alumbrado navideño, en beneficio de la comunidad malagueña y de los visitantes que acuden en la temporada decembrina.

### ***Localización de sectores intervenidos:***

Málaga es un municipio colombiano, capital de la provincia de García Rovira ubicada al sur oriente del departamento de Santander sobre la Troncal Central del Norte. Las coordenadas geográficas del sitio son: Latitud 6°41'58.0" N y Longitud 72°43'58.0" W.

 <p>ALCALDÍA DE <b>MÁLAGA</b> NIT. 890.205.229-1</p>	<h1>INFORME</h1>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 4 de 42	

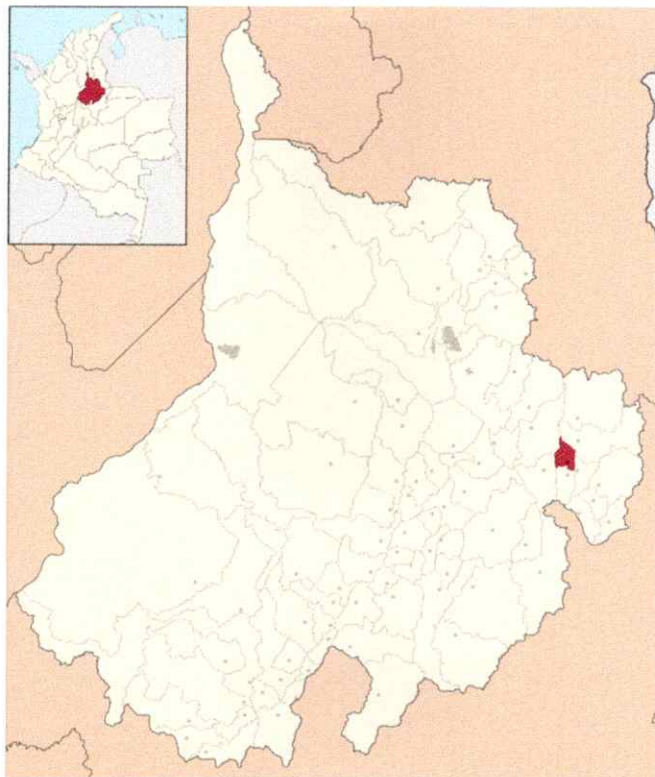

**Ilustración 1.** Localización del municipio de Málaga, Santander, Colombia [1]

Las actividades se desarrollaron en sectores de la zona urbana del municipio de Málaga – Santander como se aprecia en las siguientes imágenes:



**Ilustración 2.** Plaza institucional del municipio de Málaga y edificio de la Alcaldía.

**Fuente:** catastroenlinea.com.co y google earth




Tramo  
intervenido

**Ilustración 3.** Tramo intervenido de la Avenida Argelino Durán Quintero  
*Fuente: catastroenlinea.com.co y google earth*



**Ilustración 4.** Alameda  
*Fuente: catastroenlinea.com.co y google earth*

 <b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> <small>NIT. 890.205.229-1</small>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 6 de 42	

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 332 DE 2025
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
<b>NIT</b>	890.205.229-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	91.255.736 DE BUCARAMANGA
<b>CONTRATISTA</b>	GLOBALNET INGENIERIA S.A.S.
<b>NIT</b>	901.091.814-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	DAVID ERNESTO SERRANO NAVARRO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	13.498.784 DE CÚCUTA
<b>OBJETO</b>	<b>SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER</b>
<b>CDP</b>	10-55-25 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025
<b>RP</b>	11-68-25 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$199.881.683,00 COP)
<b>PLAZO INICIAL</b>	VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2025
<b>DOMICILIO CONTRACTUAL</b>	MUNICIPIO DE MÁLAGA
<b>SUPERVISIÓN</b>	<b>ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA</b> JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## 3. ACTAS SUSCRITAS HASTA LA PRESENTE FECHA

<b>ACTA</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025	LEGALIZADA
ACTA DE INICIO	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025	LEGALIZADA
ACTA DE TERMINACIÓN	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2025	LEGALIZADA

La ejecución física del contrato finalizó el día ocho (08) de diciembre de 2025, y el acta de terminación se suscribió el día nueve (09) de diciembre de 2025 por ser día hábil para la reunión de las partes.

## 4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO

### 4.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

El día catorce (14) de noviembre de 2025 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025 entre el Municipio de Málaga - Santander y GLOBALNET

**Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011**

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

[Página Web: www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)

 <b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> <small>NIT. 890.205.229-1</small>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3 Página 7 de 42

INGENIERIA S.A.S. con el objeto de realizar el **“SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER”**. A través del acta de inicio, Alejandro Melgarejo Zapata, como SUPERVISOR DEL CONTRATO, y David Ernesto Serrano Navarro, como representante legal del CONTRATISTA, acordaron el día diecinueve (19) de noviembre de 2025 como fecha de inicio de ejecución del contrato.

Desde esa fecha de inicio, en el marco de la supervisión técnica del contrato, se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas mediante visitas de inspección en campo, verificación de avances físicos, revisión de los informes presentados por el contratista y análisis de registros fotográficos. Se cotejaron las cantidades reportadas con el presupuesto oficial y se validó la correspondencia entre lo ejecutado y contratado. Asimismo, se hizo control sobre el uso de equipos, la vinculación del personal en obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, y conforme al cronograma establecido, el contratista del diecinueve (19) de noviembre de 2025 al ocho (08) de diciembre de 2025 ejecutó las actividades que se detallan en los siguientes cuadros, los cuales incluyen el registro fotográfico correspondiente.

#### ÍTEM 1.1. ÁRBOL DE NAVIDAD EN LA ALAMEDA

Suministro, instalación y puesta en marcha de árbol de navidad de 3m de altura y 2,4 metros de diámetro en base, con estrella 3D de 1m. Construido en tubo redondo de 1 pulgada y platina de 1 pulgada x 3/16, anclado al piso con lamina 0.20 x 0.20 m con espesor de 1/4 pulgada, cubierto en malla plástica y grama sintética de color verde, en pintura aceite utilizando iluminación en lluvia multicolor color junto con strober blanco intenso bombillo flashear de navidad y configurado con circuito electronico para el manejo de secuencias con relevos de microcontrolador arduino y protecciones, montada dentro cobre metálico para uso exterior, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3


Página 8 de 42





### ÍTEM 1.2. REFLECTORES HACIA EL LETRERO “♥MÁLAGA” EN LA ALAMEDA

Instalación y puesta en marcha de reflectores de 200 vatios dirigidos hacia letrero de ♥MÁLAGA, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.

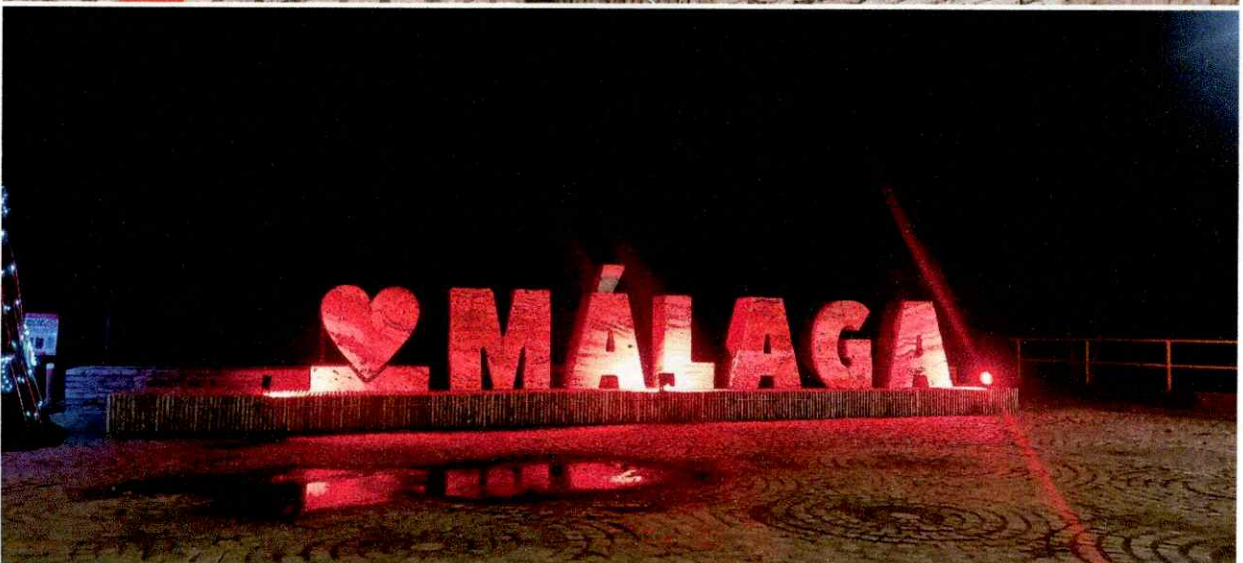



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 10 de 42



### ÍTEM 2.1. ESTRUCTURAS DECORATIVAS EN POSTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO

Adecuación de estructura decorativa de alumbrado navideño para uso exterior en postes de alumbrado público, incluye cambio de imagen, con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led multicolor y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.



Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

Página Web: [www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico


Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3


Página 11 de 42

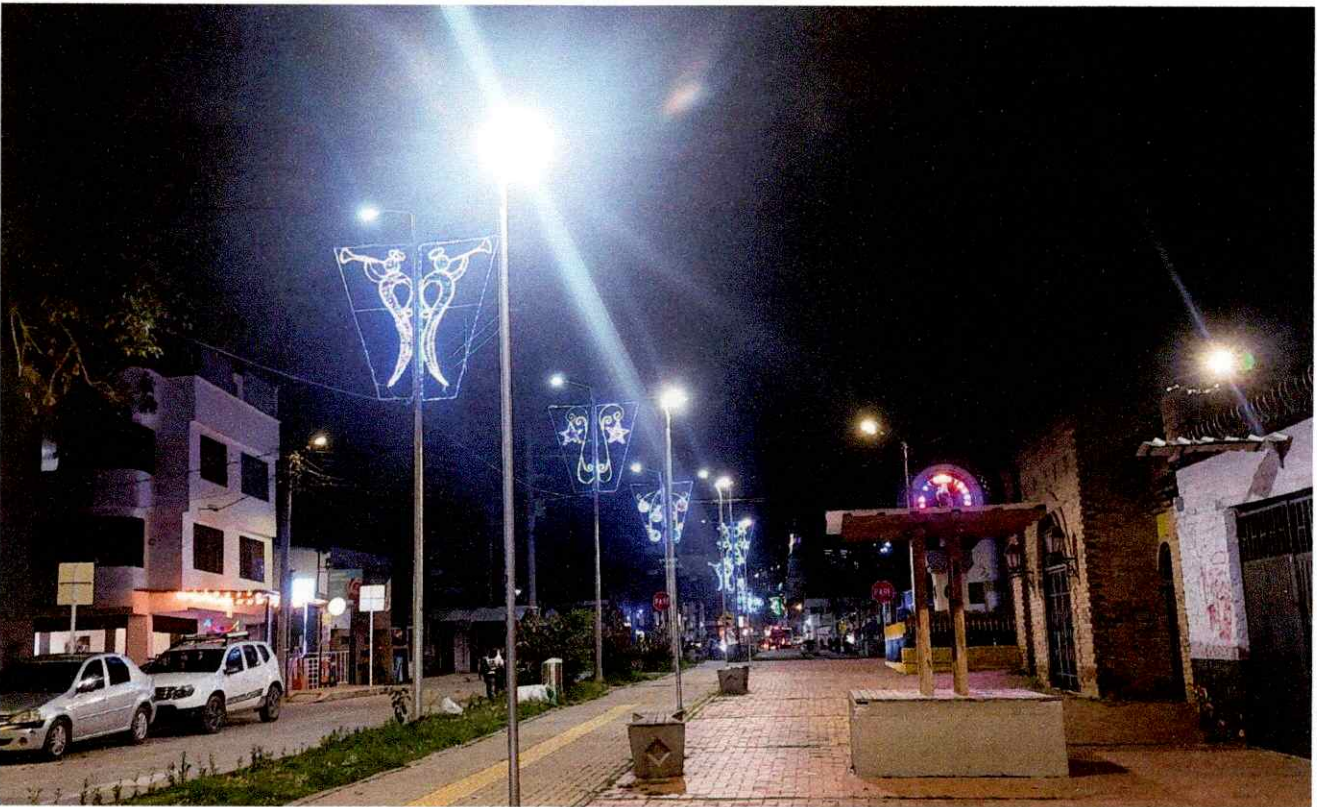

**Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011**

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

Página Web: [www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)

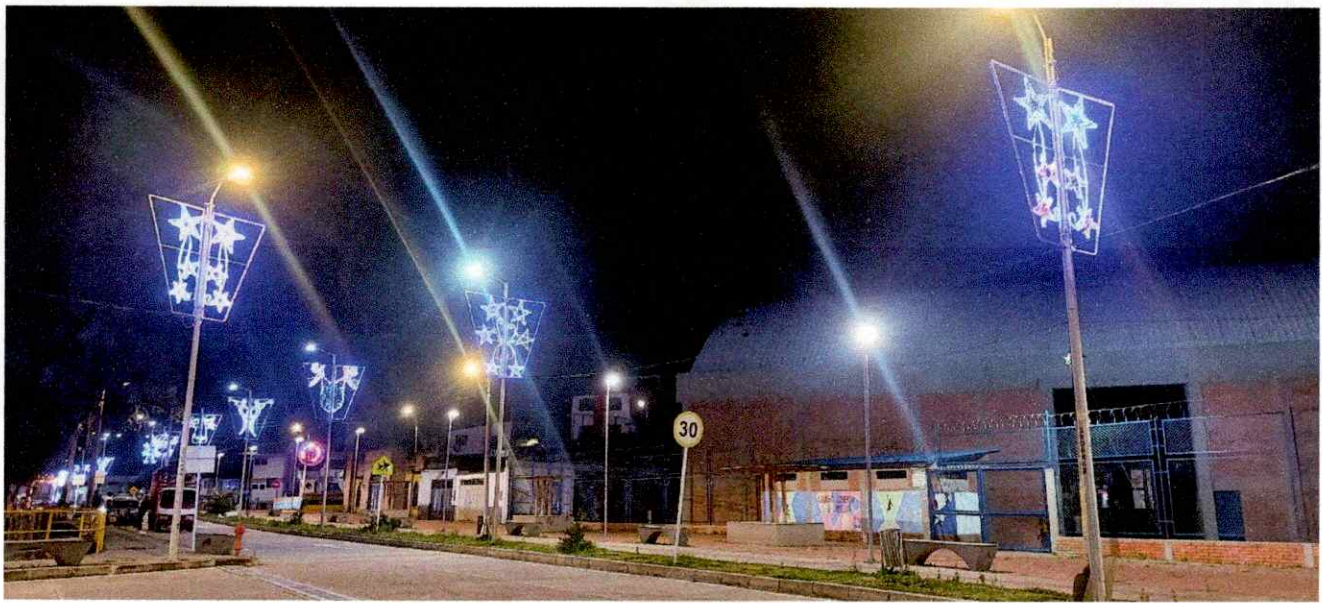



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 13 de 42



### Ítem 3.1. ILUMINACIÓN DE FACHADA FRONTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de iluminación de fachada frontal de la alcaldía municipal en cinta neo flex en todos los bordes y ventanas de la fachada frontal iluminación en lluvia de color multicolor junto con strober blanco intenso bombillo flasher navidad decoración blanco cálido y secuencia programables además contiene figura luminosas agradables conmemorando la navidad fiesta de paz y reconciliación, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.



Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

Página Web: [www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico




Código Formato:  
DE-FO-04



Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 14 de 42

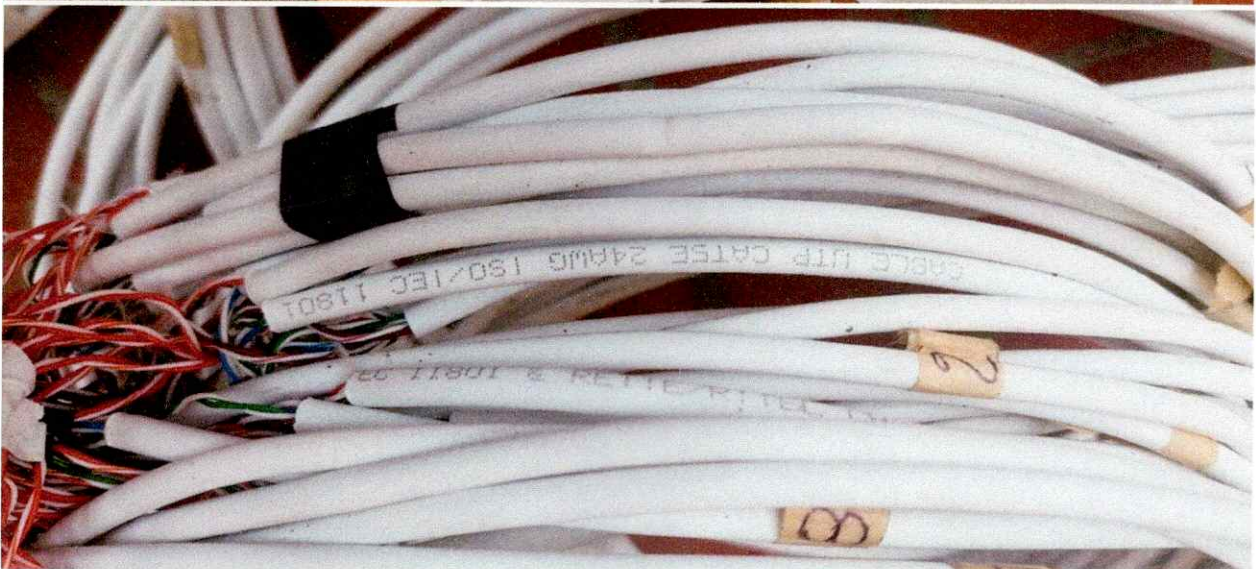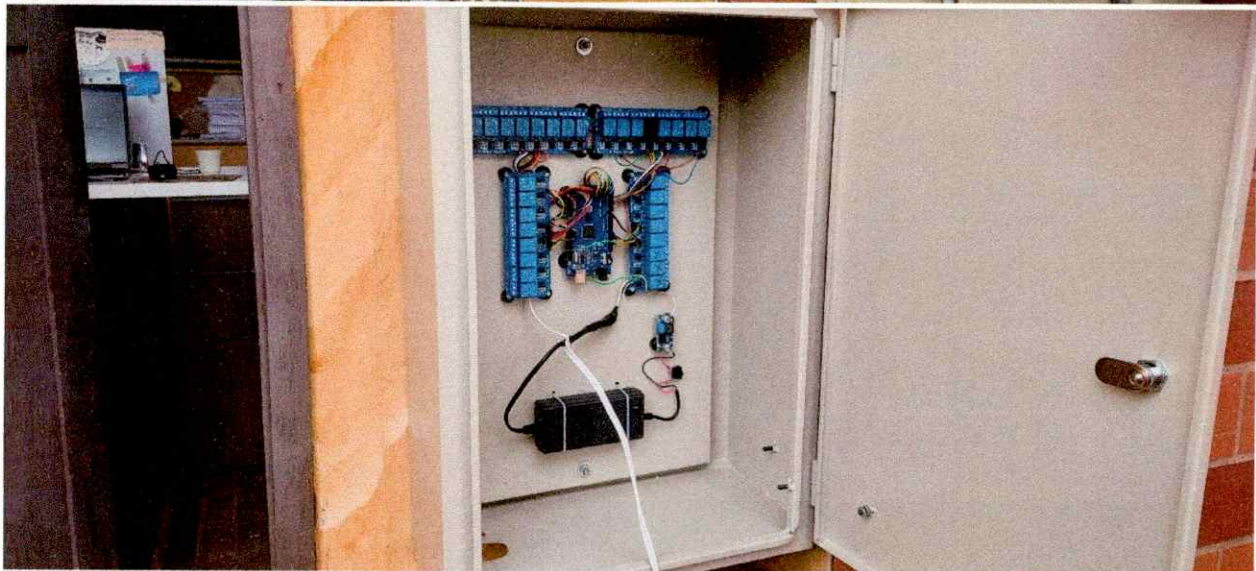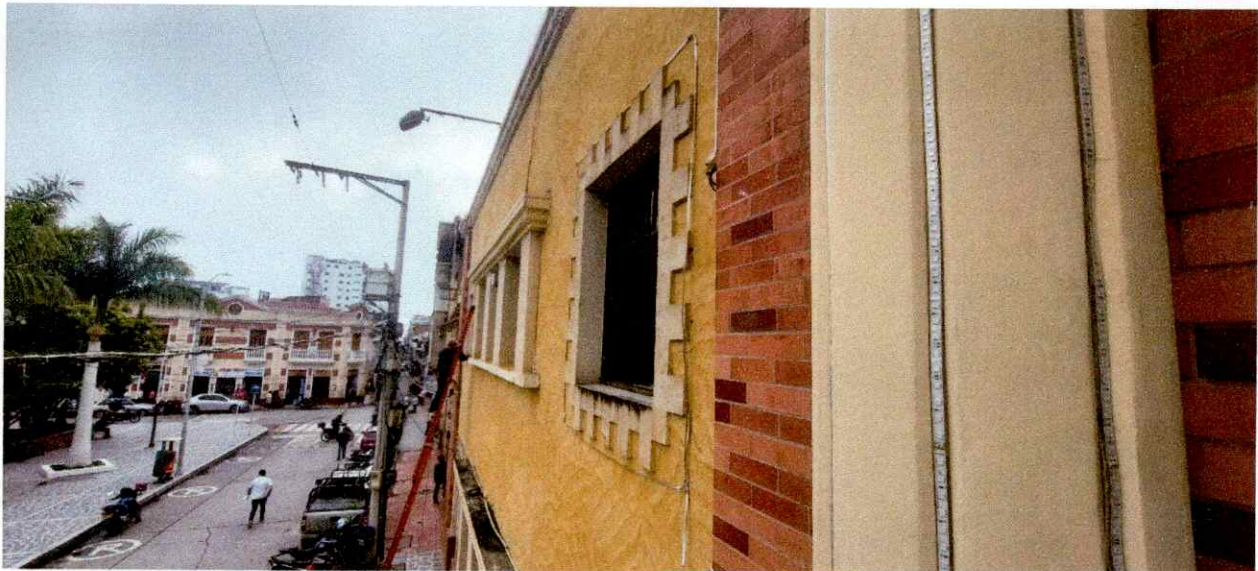

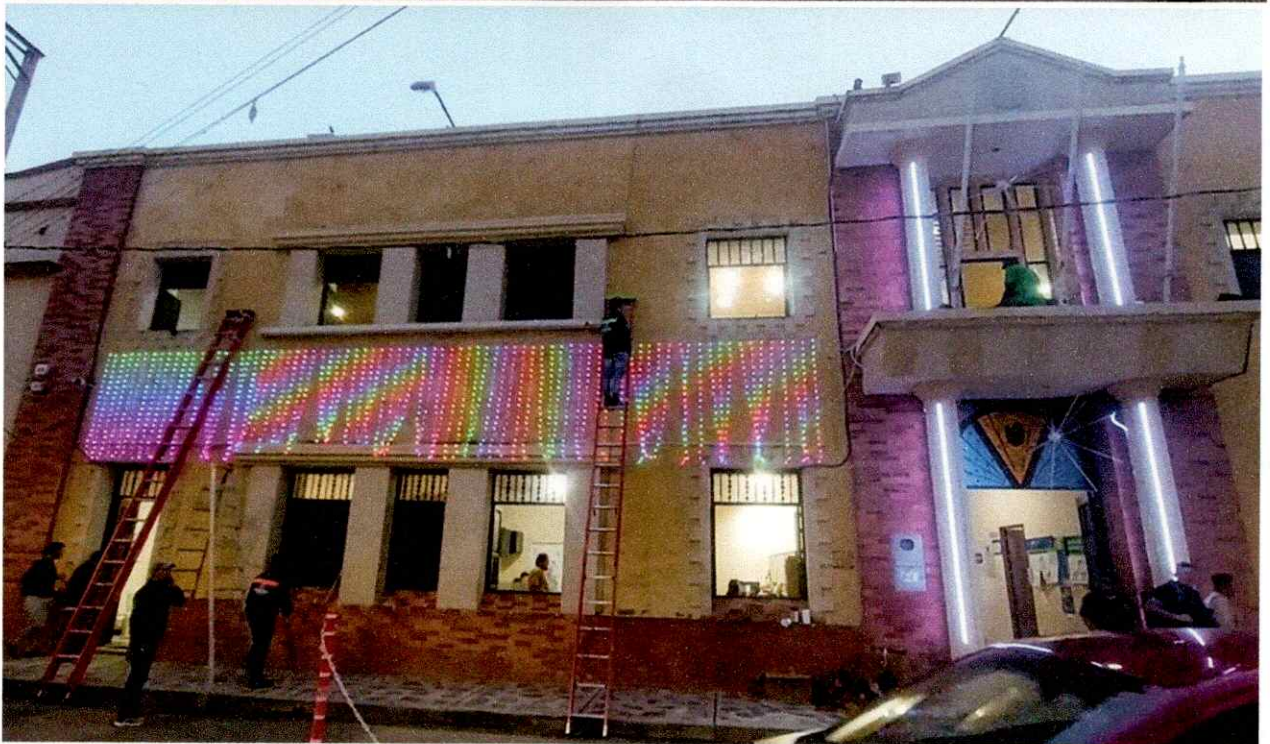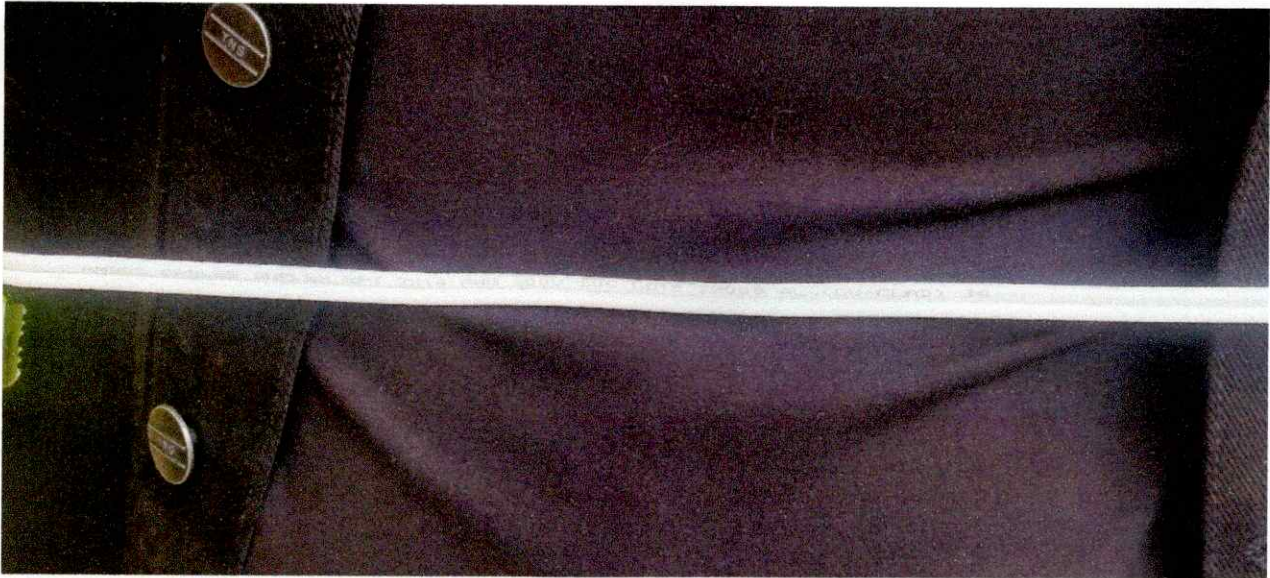



#### ÍTEM 4.1. ÁRBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de árbol de navidad de 7m de altura y 3,5 metros de diámetro en base, con estrella 3D de 1.5m. Construido en tubo redondo de 1 pulgada y platina de 1 pulgada x 3/16, anclado al piso con lamina 0.20 x 0.20 m con espesor de 1/4 pulgada, cubierto en malla plástica y grama sintética de color verde, en pintura aceite utilizando iluminación en lluvia multicolor color junto con strober blanco intenso bombillo flasher de navidad y configurado con circuito electrónico para el manejo de secuencias con relevos de microcontrolador arduino y protecciones, montada dentro cobre metálico para uso exterior, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

# INFORME

Proceso: Estratégico


Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 17 de 42

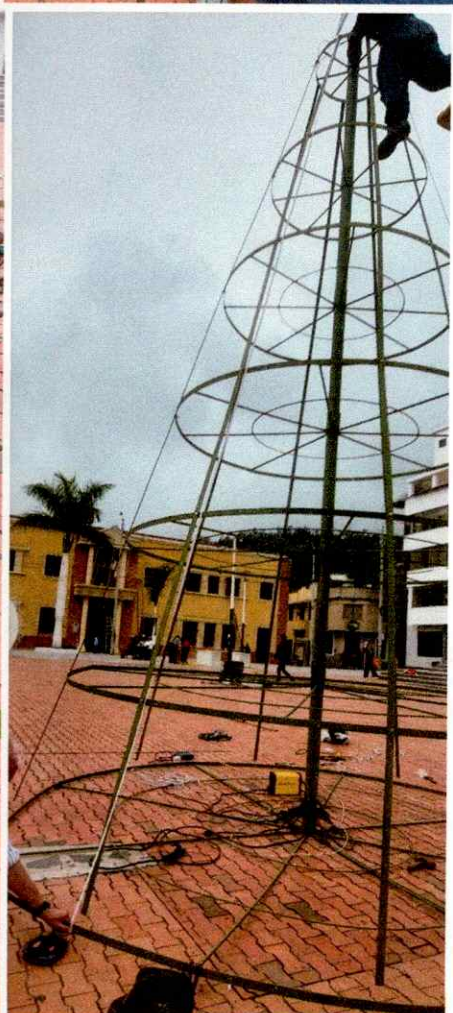



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 18 de 42





#### ÍTEM 4.2. CENTRO DE PARQUE CON LLUVIAS FLOTANTES ACONDICIONADAS A ÁRBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de centro de parque con lluvias flotantes acondicionadas a árbol de navidad ubicado en la parte central ambiente de noche estrellada utilizando iluminación en lluvia de color cálido junto con strober blanco intenso bombillo flasher navidad decoración blanco cálido y configurado con circuito electrónico para el manejo de secuencias con relevos de microcontrolador arduino y protecciones, montada dentro cobre metálico para uso exterior, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 20 de 42






### ÍTEM 4.3. PERSONAJES DEL PESEBRE EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de imágenes de la sagrada familia elaborada en tubería de  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  pulgada en calibre 18 con altura aproximada de 3.5 metros, soportadas sobre estibas en madera. Figuras independientes de arcos, animales, reyes magos y nacimiento forrados en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led color calido y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.



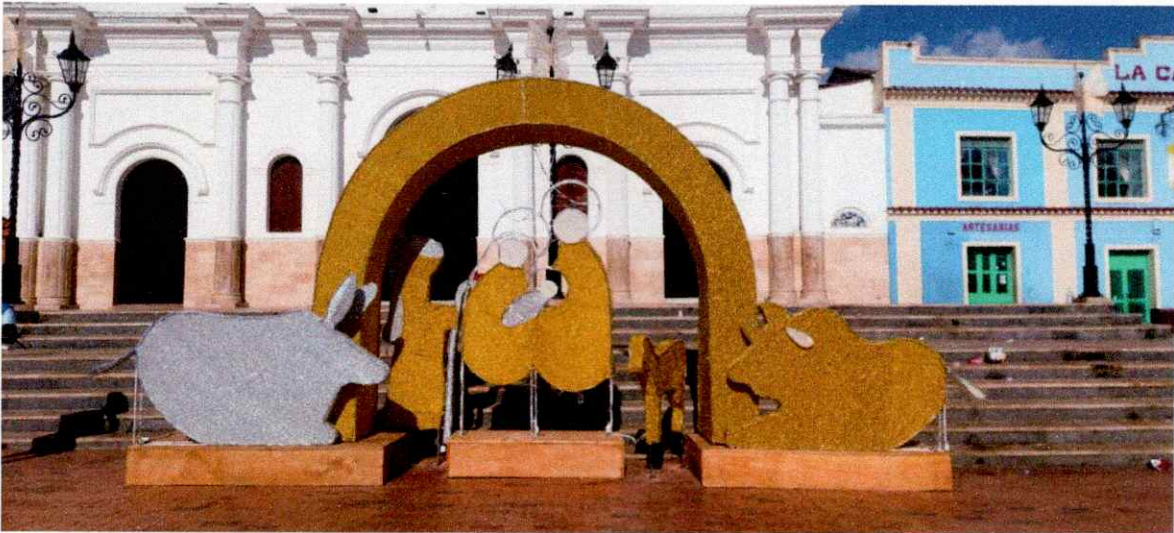

#### ÍTEM 4.4. ARCO CON ARABESCO EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de imagen de arco con arabesco elaborada en tubería de  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  pulgada en calibre 18 con dimensión aproximada de 2.8 m de alto, 2.5 m de ancho y 0.80 m de profundidad, soportadas sobre base en tubería de 1 pulgada, forrados en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led multicolor y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





#### ÍTEM 4.5. ARCO CON ÁRBOL DE NAVIDAD INTERNO EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de guirnalda y árbol de navidad interno elaborada en tubería de  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  pulgada en calibre 18 con dimensión aproximada de 2.8 m de alto, 2.5 m de ancho y 0.80 m de profundidad, soportadas sobre base en tubería de 1 pulgada, forrados en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led multicolor y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 24 de 42



**Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011**

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

Página Web: [www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)



#### ÍTEM 4.6. ARCO CON RENOS EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de arco con renos de navidad elaborada en tubería de  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  pulgada en calibre 18 con dimensión aproximada de 2.8 m de alto, 2.5 m de ancho y 0.80 m de profundidad, soportadas sobre base en tubería de 1 pulgada, forrados en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led multicolor y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





#### ÍTEM 4.7. ARCO CON ESTRELLAS EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de arco con estrellas de navidad elaborada en tubería de  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  pulgada en calibre 18 con dimensión aproximada de 2.8 m de alto, 2.5 m de ancho y 0.80 m de profundidad, soportadas sobre base en tubería de 1 pulgada, forrados en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led multicolor y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





#### ÍTEM 4.8. LUNA CON ESTRELLAS Y NUBES EN LA PLAZA INSTITUCIONAL


Suministro, instalación y puesta en marcha de luna con estrellas y nubes de navidad elaborada en tubería de  $\frac{3}{4}$  y  $\frac{1}{2}$  pulgada en calibre 18 con dimensión aproximada de 3 m de alto, 2.5 m de ancho y 0.80 m de profundidad, soportadas sobre base en tubería de 1 pulgada, forradas en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, centro en instalaciones led multicolor y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





#### ÍTEM 4.9. MARIPOSAS EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro, instalación y puesta en marcha de mariposas elaborada en platina de 1/2 pulgada de 0.80m de altura, forrados en tela tornasol con manguera de 3 vías en led, y bombillo strober incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.

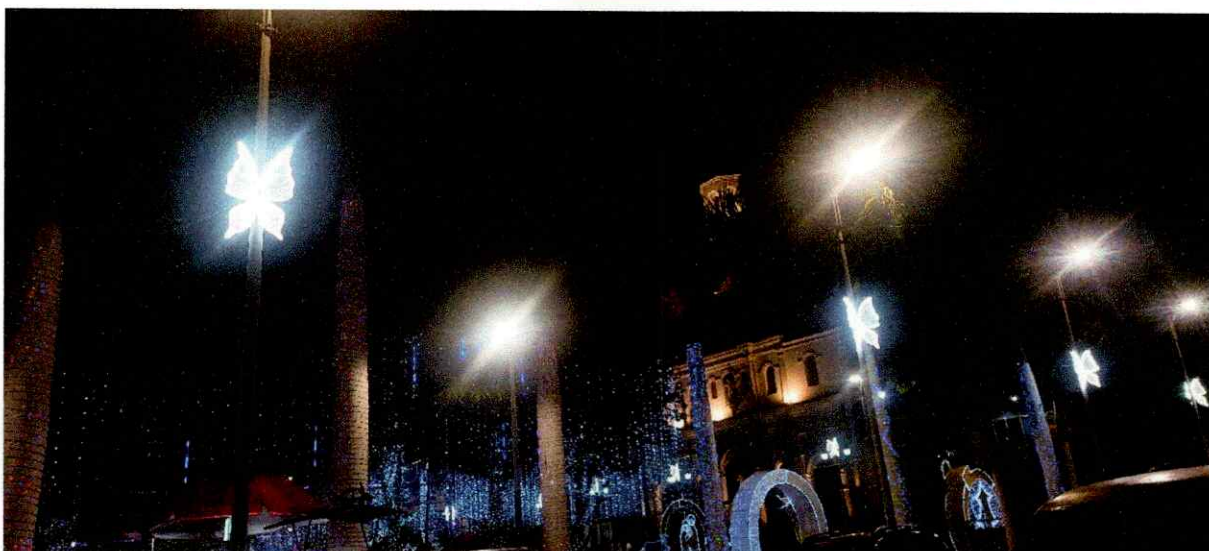



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 29 de 42



**Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011**

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

[Página Web: www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)



### ÍTEM 4.10. DECORACIÓN DE PALMAS EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro e instalación de decoración de palmas en instalaciones led multicolor y bombillo strober altura máxima 6m, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico



Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 31 de 42

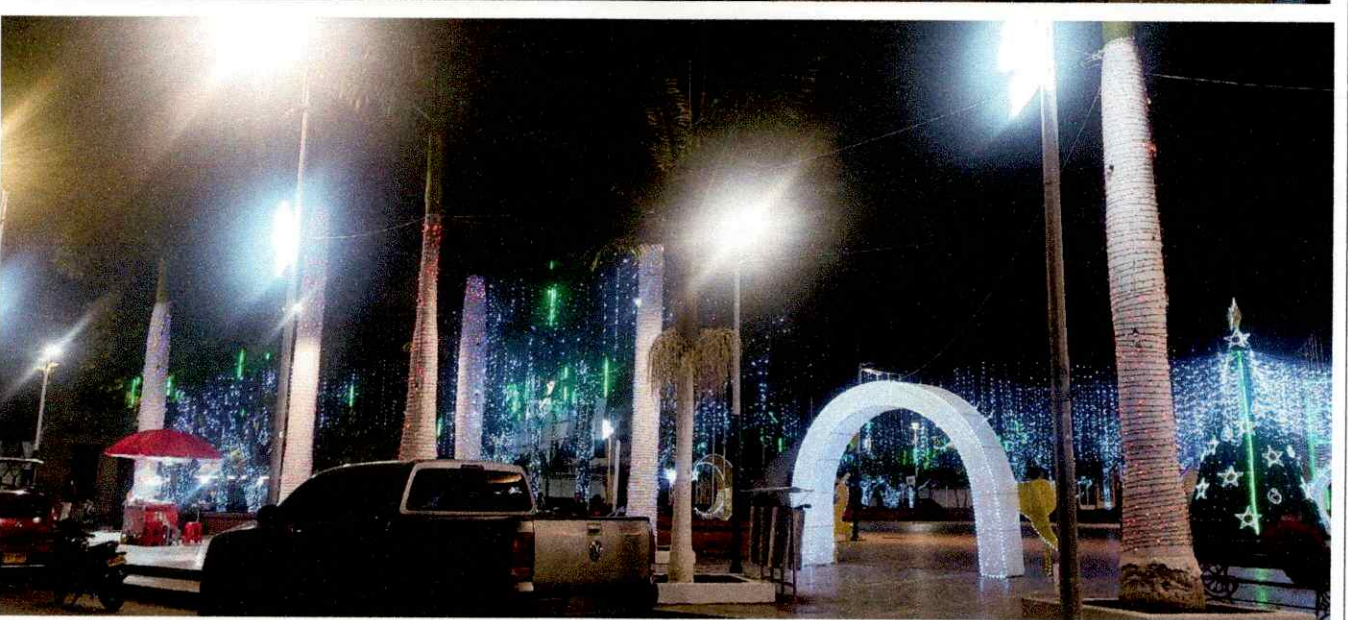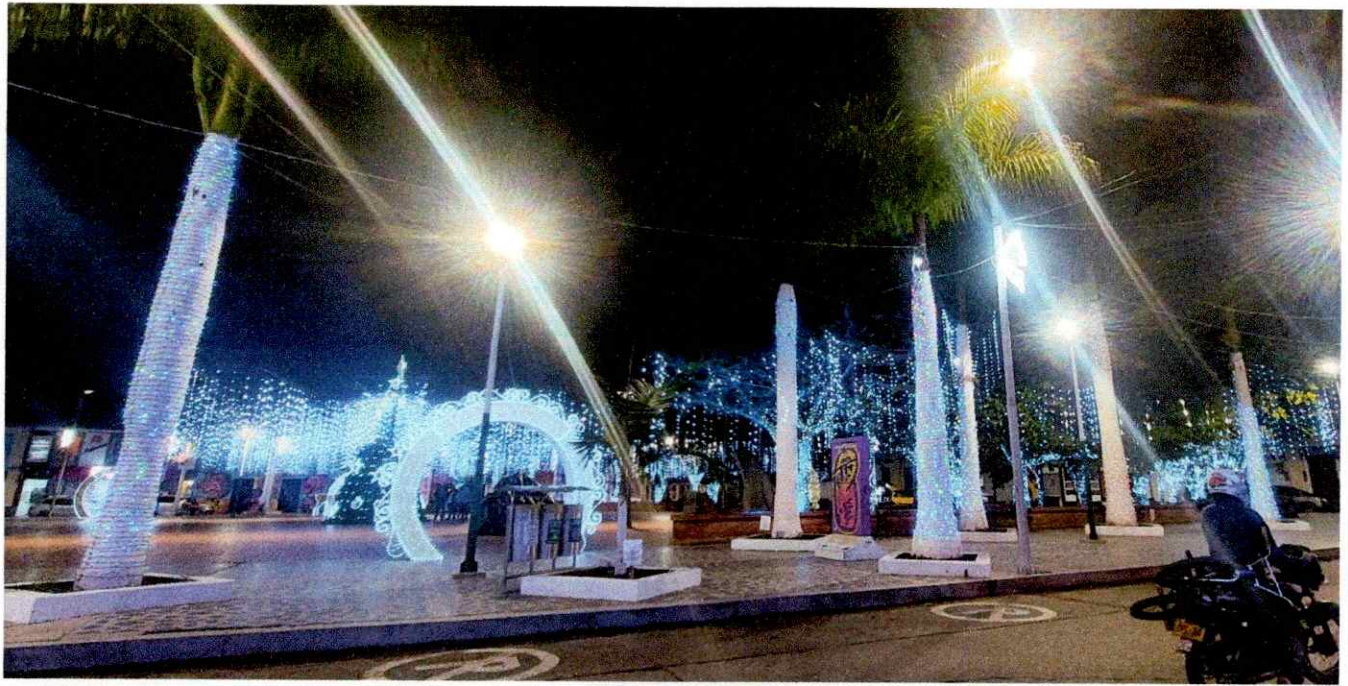



### ÍTEM 4.11. DECORACIÓN DE ÁRBOLES EN LA PLAZA INSTITUCIONAL

Suministro e instalación de decoración de árboles con instalaciones led multicolor en lluvia, incluye controles, conectores, cableado, soportes, cinta, mano de obra y mantenimiento durante toda la época navideña en el municipio de Málaga.





ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico


Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 33 de 42

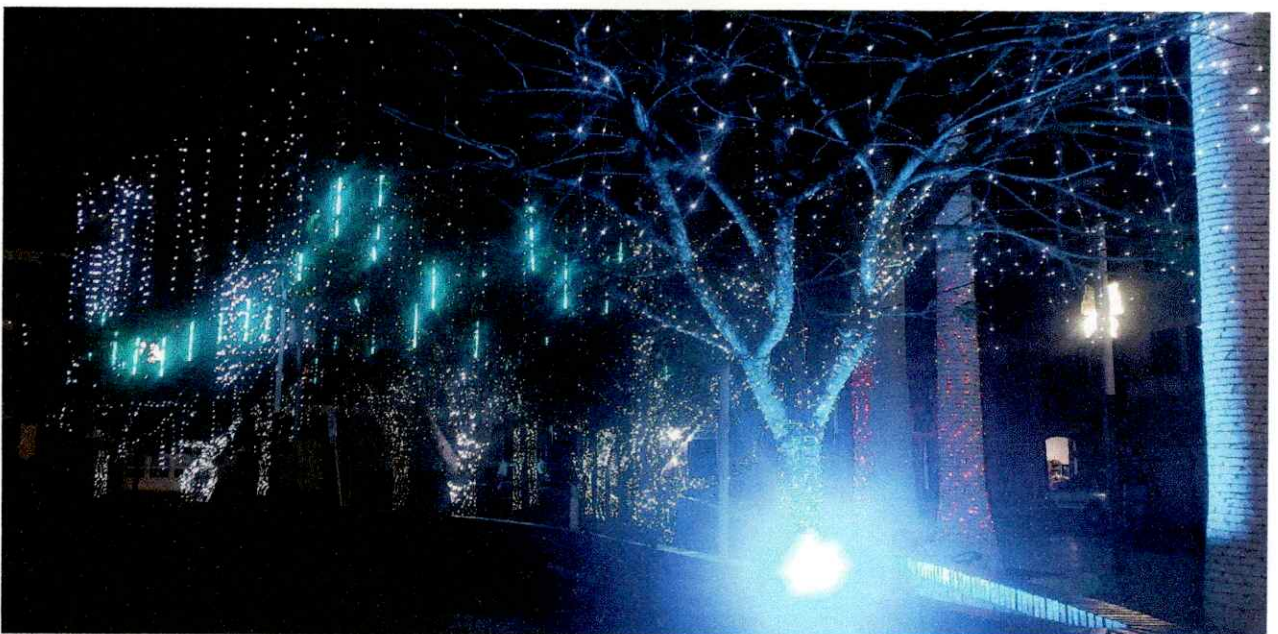

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025, el contratista adelantó la instalación de elementos adicionales al alumbrado navideño

**Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Málaga - Santander Teléfono 6615339 Código Postal 682011**

[alcaldia@malaga-santander.gov.co](mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co)

[Página Web: www.malaga-santander.gov.co](http://www.malaga-santander.gov.co)




inicialmente previsto, con el propósito de embellecer aún más los espacios públicos del municipio y brindar a la comunidad una decoración más completa y atractiva. Estas actividades incluyeron la colocación de un mayor número de unidades en algunos ítems y la incorporación de elementos ornamentales no contemplados en el anexo técnico, sin que ello generara costos adicionales para la Administración Municipal. Las instalaciones complementarias fueron aportadas por el contratista, no generan reconocimiento económico adicional ni modifican las cantidades objeto de pago. Las fotografías que se presentan a continuación evidencian dichas instalaciones complementarias, las cuales contribuyeron al realce del proyecto y al fortalecimiento del ambiente festivo en la temporada decembrina. Cabe aclarar que las fotografías de algunos de estos ítems adicionales ya se encuentran incorporadas en el registro fotográfico del respectivo ítem, razón por la cual en esta sección únicamente se presentan las imágenes correspondientes a los elementos complementarios, con el fin de evitar la duplicidad de soportes.

### Ítems ejecutados en mayor cantidad

#### ÍTEM 1.2. REFLECTORES

Estaba contemplada la instalación de 2 reflectores en la Alameda. En dicho sector se instalaron 4 reflectores dirigidos hacia el letrero "♥MÁLAGA". Adicionalmente se instaló un reflector en los árboles del parque y 2 reflectores dirigidos hacia la fachada occidental de la Alcaldía Municipal. Fueron 5 reflectores adicionales.

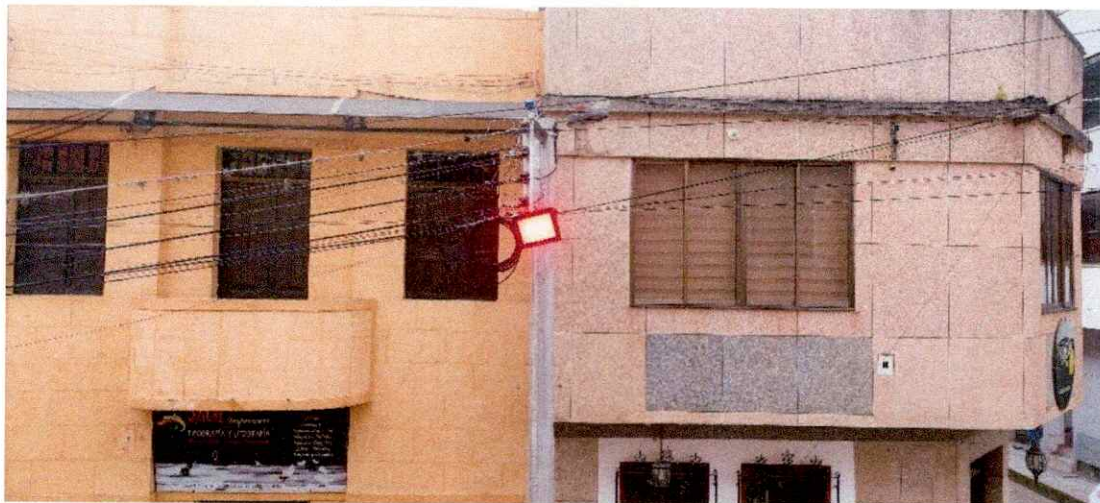

**ÍTEM 2.1. ESTRUCTURAS DECORATIVAS EN POSTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO**

Estaba contemplada la instalación de 26 estructuras decorativas en postes de alumbrado navideño, 14 en la Avenida Argelino Durán Quintero y 12 en la Alameda. En la Alameda se instalaron 24 unidades, de tal manera que fueron 12 estructuras adicionales.

**ÍTEM 4.9. MARIPOSAS EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA INSTITUCIONAL**

Estaba contemplada la instalación de 8 mariposas y se instalaron 12 unidades, de tal manera que fueron 4 mariposas adicionales.

**ÍTEM 4.10. DECORACIÓN DE PALMAS EN LA PLAZA INSTITUCIONAL**

Estaba contemplada la iluminación de 10 palmeras y se iluminaron 12 de tal manera que fueron 2 unidades adicionales.

**ÍTEM 4.11. DECORACIÓN DE ÁRBOLES EN LA PLAZA INSTITUCIONAL**


Estaba contemplada la iluminación de 16 árboles y se iluminaron 29 de tal manera que fueron 13 unidades adicionales.

**Ítems ejecutados no previstos en el contrato**

**ÍTEM NP. DECORACIÓN DE MONUMENTO DE CUSTODIO GARCÍA ROVIRA EN LA PLAZA INSTITUCIONAL**

Se iluminó el monumento dónde se encuentra la estatua de Custodio García Rovira



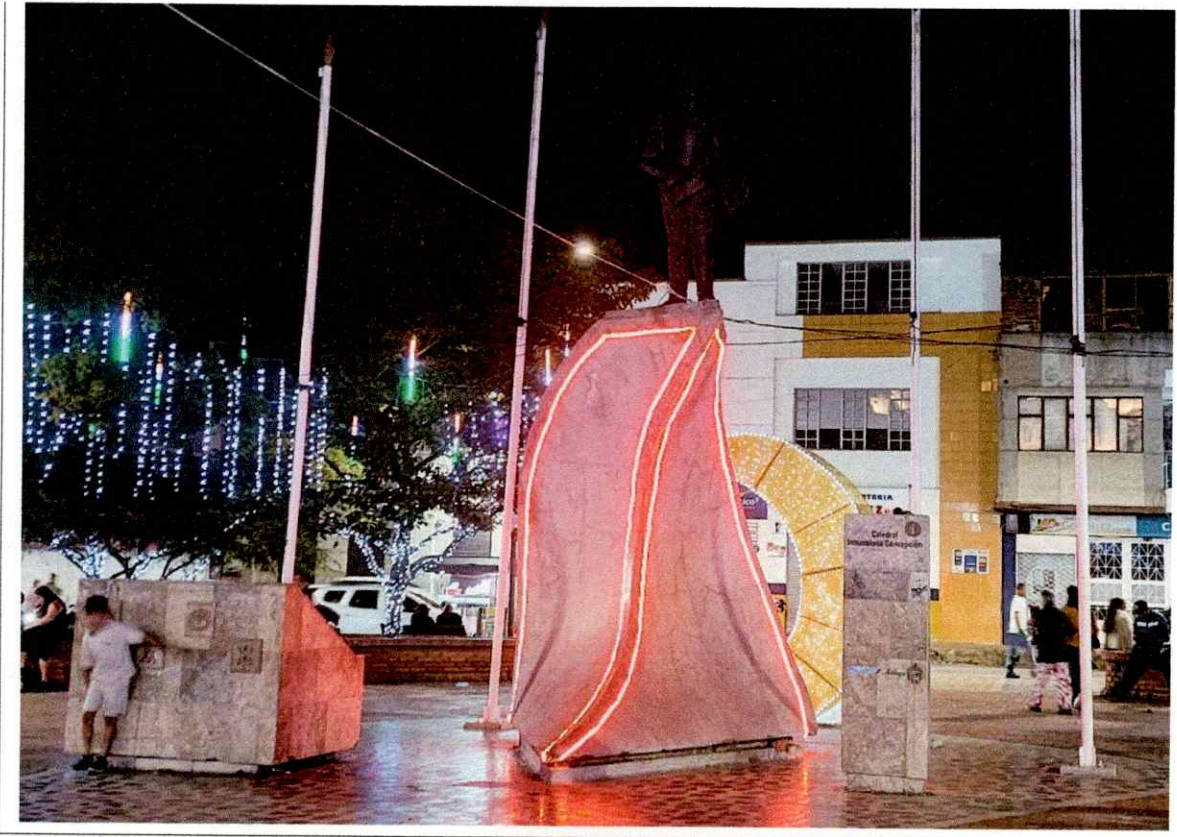


#### 4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Registro fotográfico periódico para documentar el avance del proceso contratado.
- Organización y actualización de los archivos y documentación del contrato.
- Supervisión continua de la ejecución de cada actividad, conforme a las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar la calidad, cumplimiento y durabilidad de las obras ejecutadas.

#### 4.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se muestra el balance financiero del contrato:


<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 332 DE 2025</b>	<b>VALORES</b>	
CDP No. 10-55-25 DEL 23/10/2025		\$ 199.881.683,00
RP No. 11-68-25 DEL 19/11/2025		\$ 199.881.683,00
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 199.881.683,00</b>
VALOR ADICIONADO		NA
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 0,00	
VALOR A PAGAR EN ACTA DE PAGO FINAL	\$ 199.881.683,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 199.881.683,00</b>	<b>\$ 199.881.683,00</b>

 <b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> <small>NIT. 890.205.229-1</small>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 37 de 42	

## 5. CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

La Supervisión del Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025 certifica una ejecución del 100%, conforme al cuadro que se presenta a continuación. En virtud de lo estipulado en el contrato, se solicita se realice el pago respectivo al Contratista por un valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$199.881.683,00 COP)**, valor que corresponde al Acta de Pago Final.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>ALAMEDA</b>				
1,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ÁRBOL DE NAVIDAD DE 3M DE ALTURA Y 2,4 METROS DE DIAMETRO EN BASE, CON ESTRELLA 3D DE 1M. CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA Y PLATINA DE 1 PULGADA X 3/16, ANCLADO AL PISO CON LAMINA 0.20 X 0.20 M CON ESPESOR DE 1/4 PULGADA, CUBIERTO EN MALLA PLASTICA Y GRAMA SINTETICA DE COLOR VERDE, EN PINTURA ACEITE UTILIZANDO ILUMINACIÓN EN LLUVIA MULTICOLOR COLOR JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHEAR DE NAVIDAD Y CONFIGURADO CON CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL MANEJO DE SECUENCIAS CON RELEVOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO Y PROTECCIONES, MONTADA DENTRO COBRE METALICO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	1	\$ 13.598.478,00	\$ 13.598.478,00
1,2	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE REFLECTORES DE 200 VATIOS DIRIGIDOS HACIA LETRERO DE MÁLAGA, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	2	\$ 651.184,00	\$ 1.302.368,00
<b>2</b>	<b>POSTES ALUMBRADO PUBLICO</b>				
2,1	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA DECORATIVA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA USO EXTERIOR EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE CAMBIO DE IMAGEN, CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	26	\$ 587.890	\$ 15.285.140,00

 <b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> <small>NIT. 890.205.226-1</small>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 38 de 42	

3	<b>FACHADA ALCALDIA</b>				
3,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ILUMINACIÓN DE FACHADA FRONTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN CINTA NEO FLEX EN TODOS LOS BORDES Y VENTANAS DE LA FACHADA FRONTAL ILUMINACIÓN EN LLUVIA DE COLOR MULTICOLOR JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHER NAVIDAD DECORACIÓN BLANCO CÁLIDO Y SECUENCIA PROGRAMABLES ADEMÁS CONTIENE FIGURA LUMINOSAS AGRADABLES CONMEMORADO LA NAVIDAD FIESTA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	GL	1	\$ 24.739.154	\$ 24.739.154,00
4	<b>PLAZA INSTITUCIONAL</b>				
4,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ÁRBOL DE NAVIDAD DE 7M DE ALTURA Y 3,5 METROS DE DIAMETRO EN BASE, CON ESTRELLA 3D DE 1.5M. CONSTRUIDO EN TUBO REDONDO DE 1 PULGADA Y PLATINA DE 1 PULGADA X 3/16, ANCLADO AL PISO CON LAMINA 0.20 X 0.20 M CON ESPESOR DE 1/4 PULGADA, CUBIERTO EN MALLA PLASTICA Y GRAMA SINTETICA DE COLOR VERDE, EN PINTURA ACEITE UTILIZANDO ILUMINACIÓN EN LLUVIA MULTICOLOR COLOR JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHER DE NAVIDAD Y CONFIGURADO CON CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL MANEJO DE SECUENCIAS CON RELEVOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO Y PROTECCIONES, MONTADA DENTRO COBRE METALICO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	1	\$ 19.348.585	\$ 19.348.585,00
4,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRO DE PARQUE CON LLUVIAS FLOTANTES ACONDICIONADAS A ARBOL DE NAVIDAD UBICADO EN LA PARTE CENTRAL AMBIENTE DE NOCHE ESTRELLADA UTILIZANDO ILUMINACIÓN EN LLUVIA DE COLOR CÁLIDO JUNTO CON STROBER BLANCO INTENSO BOMBILLO FLASHER NAVIDAD DECORACIÓN BLANCO CÁLIDO Y CONFIGURADO CON CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL MANEJO DE SECUENCIAS CON RELEVOS DE MICROCONTROLADOR ARDUINO Y PROTECCIONES, MONTADA DENTRO COBRE METALICO PARA USO EXTERIOR, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA.	UNIDAD	1	\$ 18.424.353	\$ 18.424.353,00



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico

Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3

Página 39 de 42

4,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE IMÁGENES DE LA SAGRADA FAMILIA ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON ALTURA APROXIMADA DE 3.5 METROS, SOPORTADAS SOBRE ESTIBAS EN MADERA. FIGURAS INDEPENDIENTES DE ARCOS, ANIMALES, REYES MAGOS Y NACIMIENTO FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED COLOR CALIDO Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.896.555	\$ 5.896.555,00
4,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE IMAGEN DE ARCO CON ARABESCO ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 4.674.382	\$ 4.674.382,00
4,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GUIRNALDA Y ARBOL DE NAVIDAD INTERNO ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 4.932.397	\$ 4.932.397,00
4,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ARCO CON RENOS DE NAVIDAD ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.398.419	\$ 5.398.419,00



ALCALDÍA DE  
**MÁLAGA**  
NIT. 890.205.229-1

## INFORME

Proceso: Estratégico


Código Formato:  
DE-FO-04

Código TRD:  
210.26

Fecha Adopción:  
02.05.2025

Versión: 3  
Página 40 de 42

4,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ARCO CON ESTRELLAS DE NAVIDAD ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 2.8 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.063.875	\$ 5.063.875,00
4,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUNA CON ESTRELLAS Y NUBES DE NAVIDAD ELABORADA EN TUBERÍA DE ¾ Y 1/2 PULGADA EN CALIBRE 18 CON DIMENSION APROXIMADA DE 3 M DE ALTO, 2.5 M DE ANCHO Y 0.80 M DE PROFUNDIDAD , SOPORTADAS SOBRE BASE EN TUBERIA DE 1 PULGADA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, CENTRO EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UND	1	\$ 5.290.462	\$ 5.290.462,00
4,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MARIPOSAS ELABORADA EN PLATINA DE 1/2 PULGADA DE 0.80M DE ALTURA, FORRADOS EN TELA TORNASOL CON MANGUERA DE 3 VÍAS EN LED, Y BOMBILLO STROBER INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	8	\$ 808.381	\$ 6.467.048,00
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORACION DE PÁLMAS EN INSTALACIONES LED MULTICOLOR Y BOMBILLO STROBER ALTURA MAXIMA 6M, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	10	\$ 781.769	\$ 7.817.690,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORACION DE ARBOLES CON INSTALACIONES LED MULTICOLOR EN LLUVIA, INCLUYE CONTROLES, CONECTORES, CABLEADO, SOPORTES, CINTA, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE TODA LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE MALAGA.	UNIDAD	16	\$ 613.850	\$ 9.821.600,00
<b>SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)</b>					<b>\$ 148.060.506,00</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS (35% COSTOS DIRECTOS)</b>		ADMINISTRACION	29%	\$ 42.937.547,00	
		IMPREVISTOS	1%	\$ 1.480.605,00	
		UTILIDAD	5%	\$ 7.403.025,00	
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 199.881.683,00</b>

 <b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> <small>NIT. 890.205.229-1</small>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3 Página 41 de 42


## 6. RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO POR EL CONTRATISTA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El personal vinculado por el Contratista a la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

NO.	CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES
1	13921556	RANGEL ORTIZ	LIBARDO
2	13929678	SANDOVAL GUARÍN	NÉSTOR JOAQUÍN
3	13498784	SERRANO NAVARRO	DAVID ERNESTO
4	1096953637	LIZCANO RINCON	EVER FERNANDO
5	1096957554	FLOREZ PERALTA	HERNAN CAMILO
6	1098100513	CASTAÑEDA SANABRIA	RAFAEL
7	1100502150	CASTRO MEDINA	JHON SNEIDER
8	13924453	SEPULVEDA RIAÑO	LUIS ALFONSO
9	13925373	CRISTANCHO ANGARITA	DARIO ENRIQUE

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Se anexan planillas de seguridad social.

		PERIODO DE COTIZACIÓN	
		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>APORTES A PENSIÓN</b>	No. de planilla	7997696195	6000377155
	Valor cotizado	\$1.822.400	\$1.822.400
	Fondos de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
		PROTECCIÓN	PROTECCIÓN
		COLFONDOS	COLFONDOS
	PORVENIR	PORVENIR	
<b>APORTES A A.R.L.</b>	No. de planilla	7997696195	6000377155
	Valor cotizado	\$312.300	\$312.300
	ARL	POSITIVA	POSITIVA
<b>APORTES A SALUD</b>	No. de planilla	7993126963 7996345178	7997696195
	Valor cotizado	\$513.000	\$513.000
	E.P.S.	NUEVA EPS	NUEVA EPS
		SANITAS S.A.	SANITAS S.A.
		SALUD TOTAL	SALUD TOTAL
<b>APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN</b>	No. de planilla	7997696195	6000377155
	Valor cotizado	\$513.000	\$513.000
	C.C.F.	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER

 <b>ALCALDÍA DE MÁLAGA</b> <small>NIT. 890.205.226-1</small>	<b>INFORME</b>	Proceso: Estratégico	
		Código Formato: DE-FO-04	Código TRD: 210.26
		Fecha Adopción: 02.05.2025	Versión: 3
		Página 42 de 42	

## 7. RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS



Para la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025, el contratista empleó los equipos que se listan a continuación:

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD
Herramienta menor	Global	1
Escaleras dieléctricas	Unidad	2
Escaleras	Unidad	2
Taladros eléctricos	Unidad	2
Multímetro	Unidad	3
Equipos de seguridad industrial	Global	1
Extensiones y cables eléctricos	Global	1

Se expide en Málaga, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

  
**ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA**

Jefe de la Oficina Asesora De Planeación y Ordenamiento Territorial  
 Supervisor del Contrato de Obra Pública No. 332 de 2025

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>PROYECTÓ</b>	Viviana Carolina Martínez García	Profesional de Apoyo - Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
<b>REVISÓ</b>	Alejandro Melgarejo Zapata	Jefe - Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.
