

Consorcio Obras Nuquí

CONTRATANTE: AEROCIVIL

CONTRATO: 18000928 H4 A DE 2018

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO N° 2.

A continuación se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente.

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 RELLENO EN RECEBO B-200 COMPACTADO: Se realiza compactación del relleno mediante vibro compactador manual tipo rana



Consorcio Obras Nuquí

1.2 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.



Consorcio Obras Nuquí

1.3 CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO:




1.4 ESTRUCTURA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA



Consorcio Obras Nuquí

1.5 ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) e= 0.10 m ESCOBIADO Y DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada)

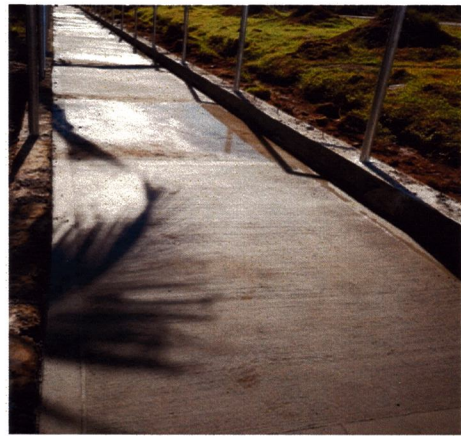

Consorcio Obras Nuquí

1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACIÓN DE PASOS DE AGUA



1.7 CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2,50*1,80*0,85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO



1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1700



Consorcio Obras Nuquí

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

2.1 AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2.2 INDUCCION AEROCIVIL.


Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

2.3 DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.

3. SEGUIMIENTO PROGRAMACION

Según programación entregada, se está cumpliendo con el programa establecido, no obstante la condición climática de lluvias que afecta el normal desarrollo del proyecto.



DIEGO ROLANDO GUTIÉRREZ CASTRO
Representante legal
CONSORCIO OBRAS NUQUÍ

REPÚBLICA DE COLOMBIA AERONÁUTICA CIVIL <small>Unidad Administrativa Especial</small>		INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL			FECHA		
					2018 AAAA	04 MM	30 DD

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.....	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 18000928 H4 A de la vigencia 2018
 Nombre del Contratista: CONSORCIO OBRAS NUQUI
 Periodo informe: del trece (13) de noviembre al cinco (5) de diciembre de 2018
 Nombre de Supervisor: Mauricio Hoyos Sierra
 Nombre del Interventor: N/A
 Área perteneciente: Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, relaciono las funciones realizadas por el contratista:

ACTIVIDADES TÉCNICAS.

- RELLENO EN RECEBO B-200 COMPACTADO: Se realiza compactación del relleno mediante vibro compactador manual tipo rana
- VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.
- CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO:
- ESTRUCTURA METALICA SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA
- ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) e= 0.10 m ESCOBIADO Y DILATADO JUNTA SECA(incluye malla electrosoldada)

REPÚBLICA DE COLOMBIA AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	 INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>04</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>AAAA</td> <td>MM</td> <td>DD</td> </tr> </table>	FECHA			2018	04	30	AAAA	MM	DD
FECHA											
2018	04	30									
AAAA	MM	DD									

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACIÓN DE PASOS DE AGUA
- CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2,50*1,80*0,85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1700

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

- **AFILIACION DEL PERSONAL.**
Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.
- **INDUCCION AEROCIVIL.**
Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.
- **DOTACION DEL PERSONAL.**
Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.
- **SEGUIMIENTO PROGRAMACION**
Según programación entregada, se está cumpliendo con el programa establecido, no obstante la condición climática de lluvias que afecta el normal desarrollo del proyecto.

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por **LA AEROCIVIL** que se relacionen con el objeto del contrato.
2. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión Calidad; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento y mejora, cuando sea conveniente.
3. Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental, y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.
4. Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las actividades del contrato y velar para que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos en la ley.
5. Entregar los informes y documentos relacionados en la cláusula novena del presente contrato, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor del mismo, en la Dirección Regional Antioquia de **LA AEROCIVIL**.
6. Conocer y aplicar las Políticas de Seguridad de la Información, definidas por **LA AEROCIVIL**.
7. Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción.
8. **EI CONTRATISTA** debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, **LA AEROCIVIL** dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
9. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

REPÚBLICA DE COLOMBIA AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial		INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL			FECHA		
					2018	04	30
		AAAA	MM	DD			

- a) Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
 - b) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de **LA AEROCIVIL**.
 - c) Hacer entrega al Grupo de Salud Ocupacional del certificado del examen médico pre-ocupacional de conformidad con la legislación vigente.
 - d) Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.
 - e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la inducción, definido en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - f) Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo determinadas por LA AEROCIVIL, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.
 - g) Participar y contribuir al cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - h) Participar en la investigación y análisis de accidentes de trabajo, si usted como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo en su dependencia.
10. Quedan sujetos al código de ética de **LA AEROCIVIL** especialmente en lo relacionado con las causales de conflicto de intereses.
 11. Atender a los clientes internos y externos de **LA AEROCIVIL** de manera cordial, eficiente y oportuna.
 12. Apoyar a **LA AEROCIVIL** en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos en el marco de su objeto contractual.
- El contratista ha cumplido con las obligaciones mencionadas anteriormente en el literal 3.2

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018 no se presentó ninguna entrega de bienes.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

A la fecha el contrato va de acuerdo al cronograma establecido.

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial		INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL			FECHA		
					2018 AAAA	04 MM	30 DD

5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

5. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

5.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
16 DE OCTUBRE DE 2018	

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERÍODO 2018	SALDO	PAGADO	VALOR PERÍODO PENDIENTE
18000928 H4 A DE 2018	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ	\$491.725.785	SEPTIEMBRE	\$491.725.785	\$ -	\$ -
			OCTUBRE	\$491.725.785	\$ -	\$ -
			NOVIEMBRE	\$491.725.785	\$ 170.244.194	\$ -
			DICIEMBRE	\$321.481.591	\$ -	\$220.299.387

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 79,42% hasta el 5 de diciembre de 2018


6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Las actividades de excavación, ciclópeo, viga, box coulvert, geotextil y rellenos están finalizadas al 100%.

Continúan en obra cerramiento y mortero de fijación.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



MAURICIO HOYOS SIERRA
 C.C. 71.778.683
 SUPERVISOR
