

 CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 <small>INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</small>	Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar
	INFORME FINAL		Fecha: OCTUBRE de 2023



Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia

CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023

OBJETO “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

INFORME TÉCNICO - FINAL

CONTRATO No. 04-38-2023

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2023

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar	
		INFORME FINAL	Fecha: OCTUBRE de 2023

INFORME FINAL – ETAPA DE EJECUCION

PERIODO: 04 DE JULIO DE 2023 AL 8 DE OCTUBRE DE 2023

REVISION Y APROBACION

	Nombre	Firma
ELABORÓ	Yeison Manuel Tuiran Atencia.	
REVISÓ Y APROBO	Ing. Gustavo Suarez Coronado	

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
1. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
1.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	5
1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR	5
1.3 ESTADO DE LAS POLIZAS	5
2. INFORME DE GESTION	6
2.1 EJECUCIÓN DE OBRA - RECURSOS	6
2.2 AVANCE MENSUAL.....	6
2.3 CERTIFICADOS DE MATERIALES	¡Error! Marcador no definido.
2.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES	7
2.5 EJECUCION DE OBRA.....	8
ANEXOS.....	16

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN</p>	Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar	
		INFORME FINAL	Fecha: OCTUBRE de 2023

INTRODUCCIÓN.

El consejo superior de la judicatura de bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar Registraduría Nacional cuenta con un inmueble de su propiedad ubicado en la Barrio La Bodega. Calle 8 Cra. 12, San Juan Nepomuceno – Bolívar; inmueble de una (1) planta en diferentes niveles que en la actualidad acusa deterioro por el uso continuo y requiere con urgencia actividades de adecuación que conserven su infraestructura física, proporcionen áreas de trabajo adecuadas para funcionarios y mejoren las condiciones al ciudadano mediante la adecuación de zonas para atención al colombiano que hace uso de los servicios ofrecidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar.

En razón a lo anterior se considera prioritario intervenir con actividades de obra civil las Instalaciones donde funciona la sede de la Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar, por cuanto, se ha evidenciado que la edificación tenía problemas de humedad deterioro en la pintura y en el cielo raso, entre otros.

Por lo antes indicado se requiere que a través del proyecto de inversión “contratar en nombre de la nación- consejo superior de judicatura - dirección seccional de administración judicial de Cartagena – las obras de mejoramiento y mantenimiento general de la sede donde funciona el juzgado promiscuo municipal de san juan Nepomuceno en el departamento de bolívar, contribuyendo con ello a la optimización en la prestación del servicio en instalaciones adecuadas que potencien de manera significativa la productividad del personal técnico y administrativo, en ambientes de trabajo funcionales.

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN</p>	Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MU MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar	
		INFORME FINAL	Fecha: OCTUBRE de 2023

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR."

VALOR CONTRATO DE OBRA: \$ 37.126.054,55
VALOR ADICION DE OBRA: \$ 4.409.048,00
PLAZO DE INICIAL: Dos (02) Meses
PLAZO ADICIONAL: UN (1) Meses y Cinco (5) días
ACTA DE INICIACIÓN: 04 de julio de 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN OBRA: 08 de octubre de 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023
APOYO A LA SUPERVISION: Ing. Silvio Villegas Sander
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en un (1) solo pago, una vez terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

El presente corresponde a un contrato de obra cuyo objeto tiene como fin realizar las obras de adecuación del seccional san juan del consejo superior de judicatura - dirección seccional de administración judicial de Cartagena.

1.3 ESTADO DE LAS POLIZAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101185857 – ANEXO 2	25-09-2023	13-06-2023	03-07-2024	\$4.153.510,26
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101185857 – ANEXO 2	25-09-2023	13-06-2023	03-01-2027	\$4.153.510,26
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14-44-101161288 – ANEXO 1	25-09-2023	13-06-2023	03-07-2024	\$4.153.510,26
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RCE	14-40-101056709 ANEXO 2	25-09-2023	22/08/2022	18/01/2024	\$348.000.000,00

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

2. INFORME DE GESTION

2.1 EJECUCIÓN DE OBRA - RECURSOS

En la fase de ejecución de obra, los recursos necesarios para la ejecución del contrato fueron:

PERSONAL DISPONIBLE

Los profesionales que participaron en el desarrollo de labores en la etapa de obra son los siguientes:

Profesional	Profesión	Cargo	Dedicación
Yeison Manuel Tuiran Atencia	Ingeniero civil	Director de Obra	20%
Gustavo Suarez Coronado	Ingeniero civil	Residente de obra	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO DISPONIBLE

La maquinaria y equipo que se tiene disponible para la ejecución del contrato en el presente periodo es:

Frentes de trabajo activos 4, Balcón, Atanasio Girardot, Aguas y El Consuelo

MAQUINARÍA Y EQUIPO	CANTIDAD
Pulidoras	1
Cilindro de gas	2
Hidro lavadora	1

HERRAMIENTA MENOR	CANTIDAD
Palas	2
Macetas	2
Punteros	2
Extensiones x 20 mtr	2
Manguera x 50 mts	2

2.2 AVANCE MENSUAL

	Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar	
		INFORME FINAL	Fecha: OCTUBRE de 2023

El presente es el avance por corte general de obra.

VALOR TOTAL DEL CONTRATIO	TOTAL, VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ACTA	TOTAL, ACTA	ESTADO
\$ 41.535.102,55	\$ 41.535.102,55	\$ 0.00	1	\$ 41.535.102,55	EN TRAMITE
100%	100 %	0.000%			

2.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES

Las siguientes actividades se desarrollaron en el periodo de adecuación comprendido desde el 04 de julio de 2023 hasta el 08 de octubre de 2023.

➤ Etapa de adecuacion.

Las siguientes actividades se desarrollaron en el periodo de adecuación comprendido desde el 04 de julio de 2023 hasta el 08 de octubre de 2023.




ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Mayores y/o menores cantidades (+/-)	Cantidades actualizada	Valor total
Actividades Contractuales								
1	Pintura de muros internos en vinilo tipo I a dos manos	m2	312,0	\$ 9.000,00	\$ 2.808.000,00	0,00	312,00	\$ 2.808.000,00
2	Resane de muros con pañete impermeabilizado	m2	32,4	\$ 20.000,00	\$ 648.000,00	0,00	32,40	\$ 648.000,00
3	Estuco para muros	m2	186,0	\$ 10.100,00	\$ 1.878.600,00	0,00	186,00	\$ 1.878.600,00
4	Pintura en fachada principal, lateral y patio en pintura tipo koraza o similar a dos manos	m2	226,1	\$ 17.674,00	\$ 3.996.091,40	57,36	283,46	\$ 5.009.872,04
5	Mantenimiento general de puerta doble en vidrio templado incluido desmonte lubricación de pivotes superior e inferior y bisagra hidráulica y montaje	und	1,0	\$ 470.000,00	\$ 470.000,00	0,00	1,00	\$ 470.000,00
6	Desmonte de cielo raso en fibra mineral de 60x60 cm. Incluye desmonte de estructura en aluminio y luminarias existentes	m2	126,5	\$ 8.000,00	\$ 1.012.000,00	0,00	126,50	\$ 1.012.000,00
7	Mantenimiento general de verja en fachada incluido raspado, pintura anticorrosivo y acabado	m2	23,4	\$ 19.000,00	\$ 444.600,00	0,00	23,40	\$ 444.600,00
8	Mantenimiento general de protectores de hierro para ventanas incluido raspado, pintura anticorrosivo y acabado	m2	16,6	\$ 16.000,00	\$ 265.600,00	16,60	33,20	\$ 531.200,00
9	Mantenimiento general de tubo metálico de 4" incluido raspado, pintura anticorrosivo y acabado	ml	4,8	\$ 25.000,00	\$ 120.000,00	0,00	4,80	\$ 120.000,00
10	Puerta en aluminio anodizado de 0.70 a 0.90 x 1.80 a 2.10 m, incluye marco, cerradura y desmonte de puerta en madera entambrada existente	und	11,0	\$ 550.000,00	\$ 6.050.000,00	0,00	11,00	\$ 6.050.000,00
11	Mantenimiento y ajuste de canaleta amazona (aguas lluvias)	ml	16,6	\$ 32.000,00	\$ 531.200,00	16,60	33,20	\$ 1.062.400,00
12	Aplicación de bamiz en piedra de fachada	m2	38,2	\$ 18.000,00	\$ 687.600,00	1,80	40,00	\$ 720.000,00
13	Lavado de piedra de fachada	m2	38,2	\$ 8.500,00	\$ 324.700,00	1,80	40,00	\$ 340.000,00
14	Cielo raso en PVC rígido opaco blanco. Longitud de 3m a 5m, ancho de 25cm o 28cm, suministro e instalación. Perfil tipo clip, PVC rígido para cambios de nivel o uniones. Longitud estándar 3m, 4m y 5m, suministro e instalación. Incluye el suministro e instalación de marcos para luminarias (24 und) 60cm x 60cm, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Garantía mínima 5 años	m2	129,9	\$ 45.000,00	\$ 5.845.500,00	0,00	129,90	\$ 5.845.500,00
15	Suministro e instalación de luminaria Panel LED EFLIGHT 48W, 600*600mm cool white 6000K, 100-240V AC, incluye perfil en aluminio blanco	und	24,0	\$ 134.900,00	\$ 3.237.600,00	-6,00	18,00	\$ 2.428.200,00
16	Aseo, retiro de material sobrante y limpieza general de la obra	gbl	1,0	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	0,00	1,00	\$ 250.000,00
Total Actividades Iniciales					\$ 28.569.491,40			\$ 29.618.372,04
Actividades No Previstas								
NP-01	suministro e instalaciones tubería para drenaje de aires acondicionados (incluye tubería, corte en muro y piso, resane y accesorios para su buen funcionamiento)	ml	0,0	\$ 43.000,00	\$ -	25,00	25,00	\$ 1.075.000,00
NP-02	mantenimiento y reparación de cubierta, y toma de filtraciones en cubierta con material impermeabilizante	m2	0,0	\$ 85.000,00	\$ -	11,40	11,40	\$ 968.999,70
NP-03	suministro e instalación de lámpara ojo de buey	und	0,0	\$ 75.000,00	\$ -	4,00	4,00	\$ 300.000,00
Total Actividades Iniciales					\$ -			\$ 2.343.999,70
COSTOS DIRECTOS					\$ 28.569.491,40			\$ 31.962.371,74
ADMINISTRACION					19,00%	\$ 5.428.203,37	19,00%	\$ 6.072.850,63
IMPREVISTOS					5,00%	\$ 1.428.474,57	5,00%	\$ 1.598.118,59
UTILIDAD					5,00%	\$ 1.428.474,57	5,00%	\$ 1.598.118,59
IVA SOBRE UTILIDAD					19,00%	\$ 271.410,17	19,00%	\$ 303.642,53
TOTAL					\$ 37.126.054,07			\$ 41.535.102,55

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	
	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	<p>INFORME FINAL</p> <p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

2.4 EJECUCION DE OBRA

Ítem 1.1 – Pintura de muros internos en vinilo tipo I a dos manos

Registro fotográfico de la actividad.

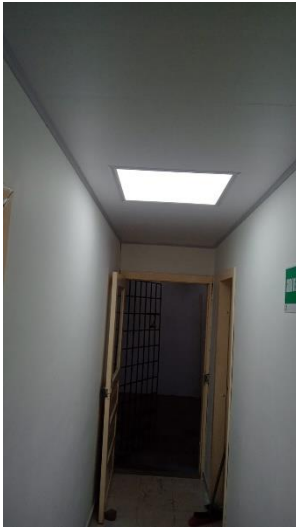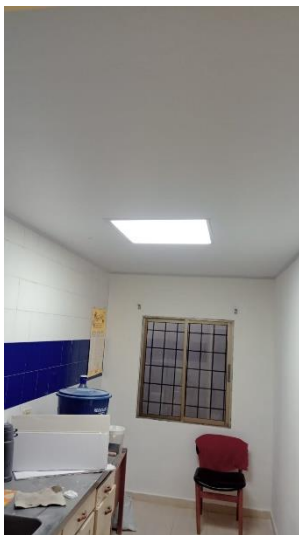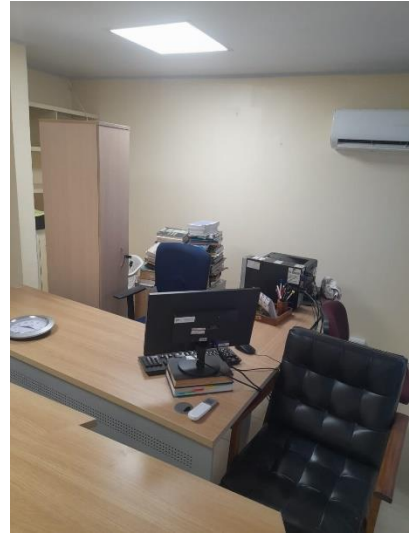

Ítem 1.2 – Resane de muros con pañete impermeabilizado.

Registro fotográfico de la actividad.



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>



Ítem 1.3. – Estuco para muros.

Registro fotográfico de la actividad.



Ítem 1.4 – Pintura en fachada principal, lateral y patio en pintura tipo koraza o similar a dos manos.

Registro fotográfico de la actividad.



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.5 – Mantenimiento general de puerta doble en vidrio templado incluido desmonte lubricación de pivotes superior e inferior y bisagra hidráulica y montaje.


Registro fotográfico de la actividad.



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.6 – Desmante de cielo raso en fibra mineral de 60x60 cm. Incluye desmante de estructura en aluminio y luminarias existentes.


Registro fotográfico de la actividad.

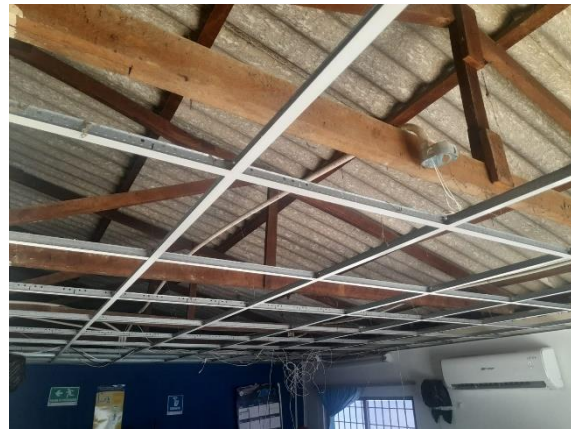

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.7 y 1.8 – Mantenimiento general de reja en fachada incluido raspado, pintura anticorrosivo y acabado. Y Mantenimiento general de protectores de hierro para ventanas incluido raspado, pintura anticorrosivo y acabado

Registro fotográfico de la actividad.

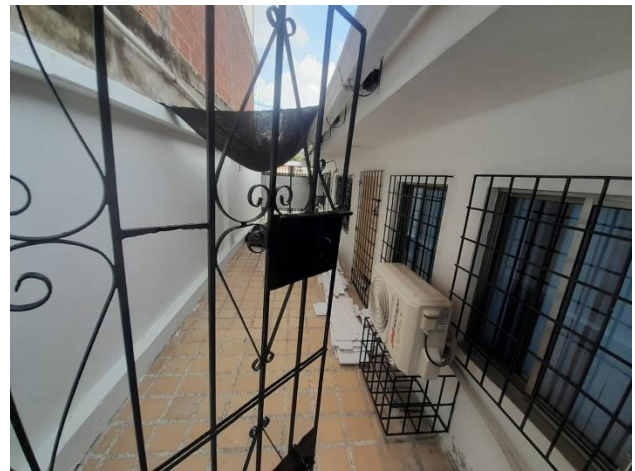

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.9 – Mantenimiento general de tubo metálico de 4" incluido raspado, pintura anticorrosivo y acabado.

Registro fotográfico de la actividad.



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.10 – Puerta en aluminio anodizado de 0.70 a 0.90 x 1.80 a 2.10 m, incluye marco, cerradura y desmote de puerta en madera entamborada existente.


Registro fotográfico



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.11 – Mantenimiento y ajuste de canaleta amazona (aguas lluvias).

Registro fotográfico

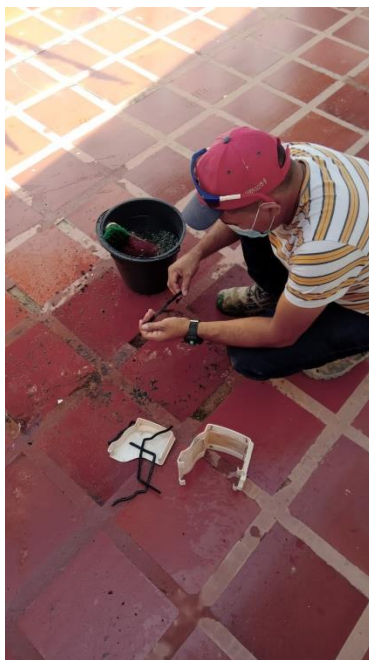


 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>



Ítem 1.12 y 1.13 – Mantenimiento y ajuste de canaleta amazona (aguas lluvias), y Lavado de piedra de fachada.

Registro fotográfico

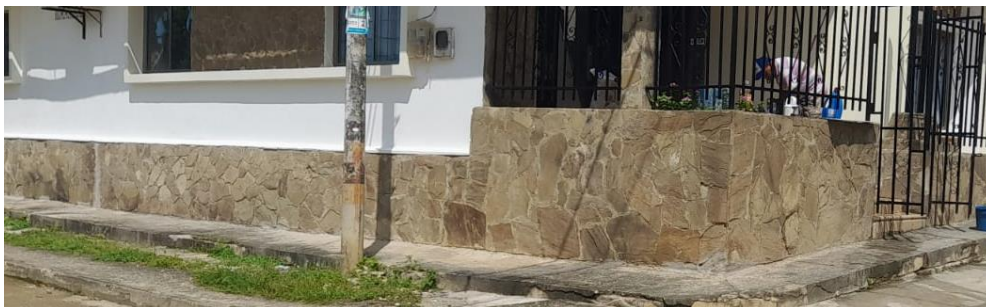

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.14 - Cielo raso en PVC rígido opaco blanco. Longitud de 3m a 5m, ancho de 25cm o 28cm, suministro e instalación. Perfil tipo clip, PVC rígido para cambios de nivel o uniones. Longitud estándar 3m, 4m y 5m, suministro e instalación. Incluye el suministro e instalación de marcos para luminarias (24 und) 60cm x 60cm, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Garantía mínima 5 años



Registro fotográfico



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem 1.15 - Suministro e instalación de luminaria Panel LED EFLIGHT 48W, 600*600mm cool white 6000k, 100-240V AC, incluye perfil en aluminio blanco

Registro fotográfico

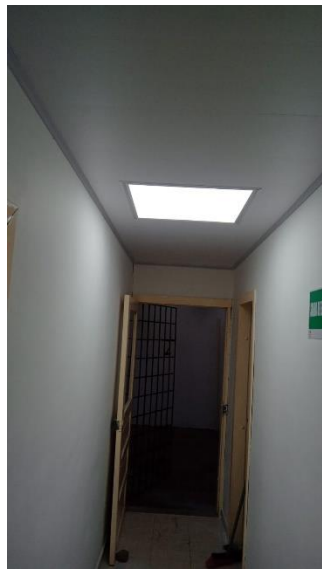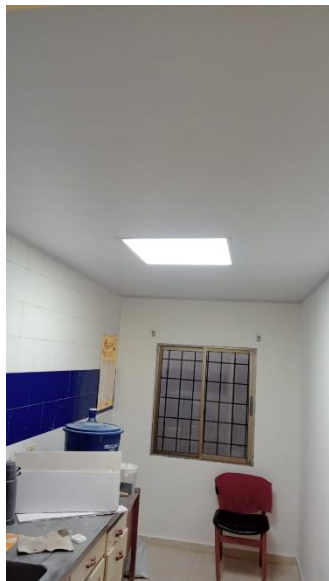

 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem Np - 01 - suministro e instalaciones tubería para drenaje de aires acondicionados (incluye tubería, corte en muro y piso, resane y accesorios para su buen funcionamiento)

Registro fotográfico



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem Np - 02 - mantenimiento y reparación de cubierta, y toma de filtraciones en cubierta con material impermeabilizante

Registro fotográfico



 <p>CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023 INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION</p>	<p>Contrato de Obra Pública N° 04-38-2023 "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA – LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p>	<p>Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena- Bolívar</p>	
		<p>INFORME FINAL</p>	<p>Fecha: OCTUBRE de 2023</p>

Ítem Np - 03 - suministro e instalación de lampara ojo de buey

Registro fotográfico

