



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN “ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN CHAPARRAL”

FECHA 29 de diciembre 2023.
LUGAR Instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en el Batallón de Infantería No. 17 "José Domingo Caicedo" de Chaparral, Tolima.
HORA 2:00 P.M
INTERVIENEN NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Profesional de defensa
Supervisor de contrato de obra No. 042-2023

AF INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
NIT 901.518.239-6
KIMBERLY JOHANA RUIZ GUTIERREZ
Representante Legal

ASUNTO Recibo Adecuaciones de la infraestructura fisica para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Chaparral

DATOS GENERALES:

- Número del contrato: 042-2023
- Objeto del contrato: Adecuaciones de la infraestructura fisica para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Chaparral.
- Valor Total: \$101.963.885,00
- Contratista: AF INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS
- Fecha de aprobación de garantías: 2 de octubre de 2023
- Plazo de ejecución: Hasta 29 de diciembre de 2023
- Supervisor: Nixon Hernando López Perdigón

ÍTEMS CONTRATADOS

NO.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1,01	Desmante cubierta existente. Incluye disposición final certificada.	m2	96,43
1,02	Suministro e intalación de cubierta termoacústica tipo Ecoroof 37 UPVC color verde. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	101,25
1,03	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	2,30
1,04	Desmante y retiro de mesón de cocina. Incluye anulación puntos hidráulicos.	un	1,00
1,05	Construcción de muro en bloque #4	m2	2,50
1,06	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	6,50



1,07	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	5,00
1,08	Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica - nova marfil- similar al existente.	m	62,00
1,09	Desmante de lámparas instaladas.	un	16,00
1,10	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	6,90
1,11	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	5,75
1,12	Desmante de cielo raso existente, incluye disposición final certificada.	m2	63,00
1,13	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfilieria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	63,00
1,14	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	0,00
1,15	Cortinas enrollables screen	m2	27,20
1,16	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	138,00
1,17	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	0,00
1,18	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
1,19	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos para su instalación.	un	12,00
1,20	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	0,00
1,21	Adecuación eléctrica para la instalación de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	0,00
1,22	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1,00
NP-1	Tuberia Rectangular estructural de 100x40 mm e=1,9 mm)incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje (Vigas, Cerchas, anticorrosivo)	M	50,00
NP-2	Anden en Concreto Grava Comun de 3000 PSI hecho en obra E=0,10 M (incluye Mezcla, Formaleta, Fundida y Curado)	M2	8,72
2,01	Desmante cubierta existente. Incluye disposición final certificada.	m2	25,20
2,02	Suministro e intalación de cubierta termoacústica tipo Ecoroof 37 UPVC color verde. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	27,73
2,03	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfilieria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	112,01
2,04	Desmante y retiro de mesón de cocina. Incluye anulación puntos hidráulicos.	un	1,00
2,05	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	5,50
2,06	Construcción de muro en bloque #4	m2	5,40
2,07	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	7,20
2,08	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	153,00
2,09	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio	m2	30,00



	+ Frescaca en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.		
2,10	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintado de negro 10cm X1 cm.	m	0,00
2,11	Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica - nova marfil- similar al existente.	m	60,00
2,12	Dintel en mampostería reforzado con varilla de 3/4" de diámetro	m	0,00
2,13	Columneta concreto 21 Mpa confinamiento de vano de puerta, reforzada con varilla de 1/2" de diámetro	m	0,00
2,14	Suministro e instalación de puertas en lámina cal. 18 pl-01_d=0,85 x 2,30 mt acabado en pintura electroestatica. Incluye marco y cerradura de seguridad.	un	0,00
2,15	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	4,60
2,16	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	14,00
2,17	Cortinas enrollables screen	m2	0,00
2,18	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	264,43
2,19	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	4,00
2,20	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
2,21	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos para su instalación.	un	18,00
2,22	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	40,00
2,23	Adecuación eléctrica para la instalción de 3 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00
2,24	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1,00
NP-1	Tuberia Rectangular estructural de 100x40 mm e=1,9 mm)incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje (Vigas, Cerchas, anticorrosivo)	M	21,00




ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Desmonte y retiro de mesón de cocina. Incluye anulación puntos hidráulicos. Se realiza el vaciado del cárcamo en concreto en la zona de las marmitas.




- Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.

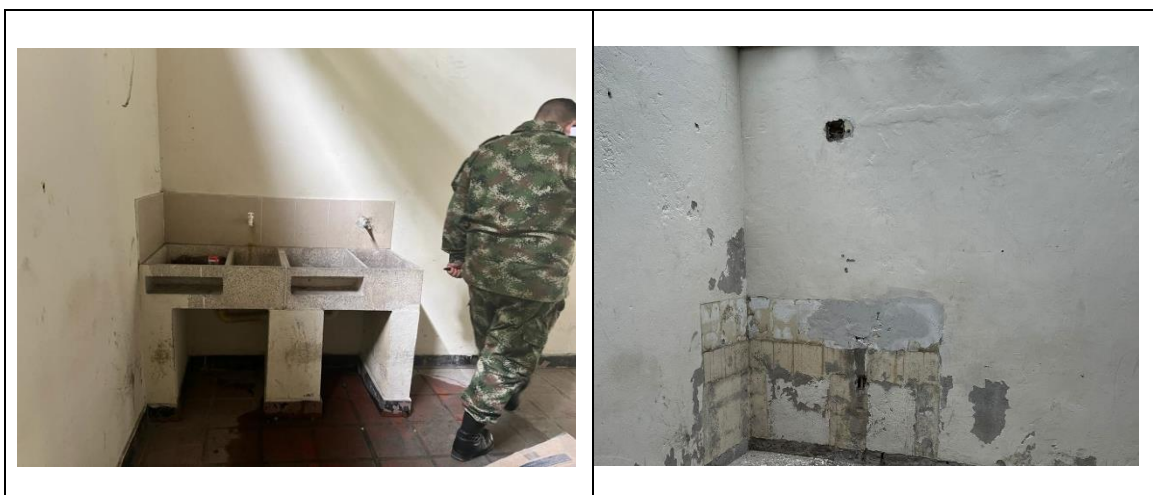




- Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24. Acabado blanco.

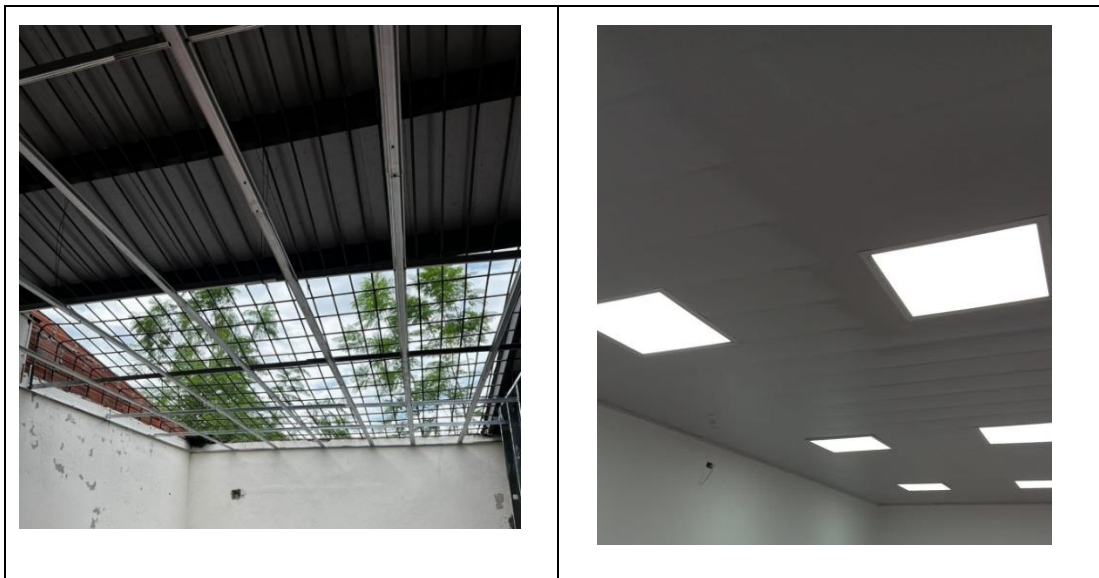

- MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.



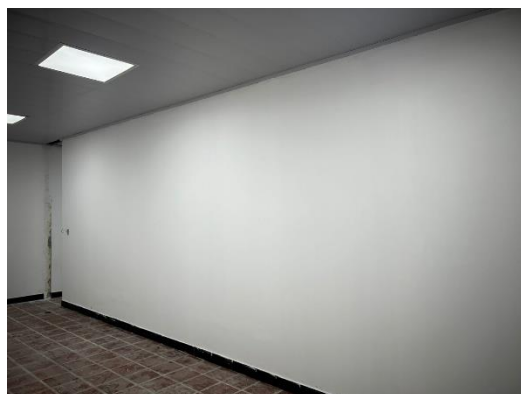

- Desmonte cubierta existente. Incluye disposición final certificada.



- Construcción de muro en bloque #4




- Pañete 1:3, incluye filos y dilataciones lineales



- Adecuación eléctrica para la instalación de 3 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.



- Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.

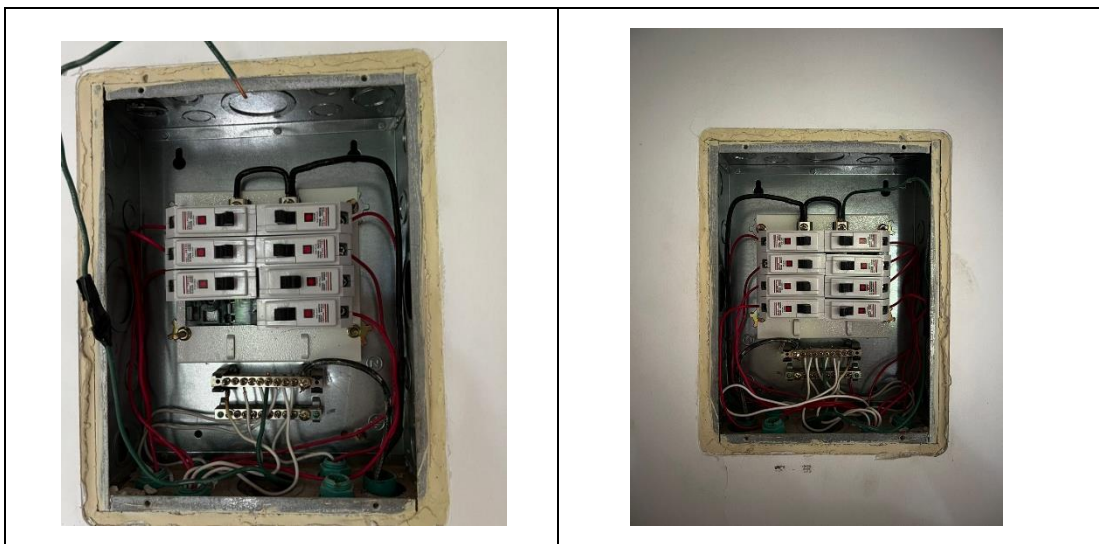

- Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halógenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.





- Suministro e instalación de cubierta termo acústica tipo Ecoroof 37 UPVC color verde. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.



- Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.






- Desmonte de lámparas instaladas.



- Desmonte de cielo raso existente, incluye disposición final certificada.

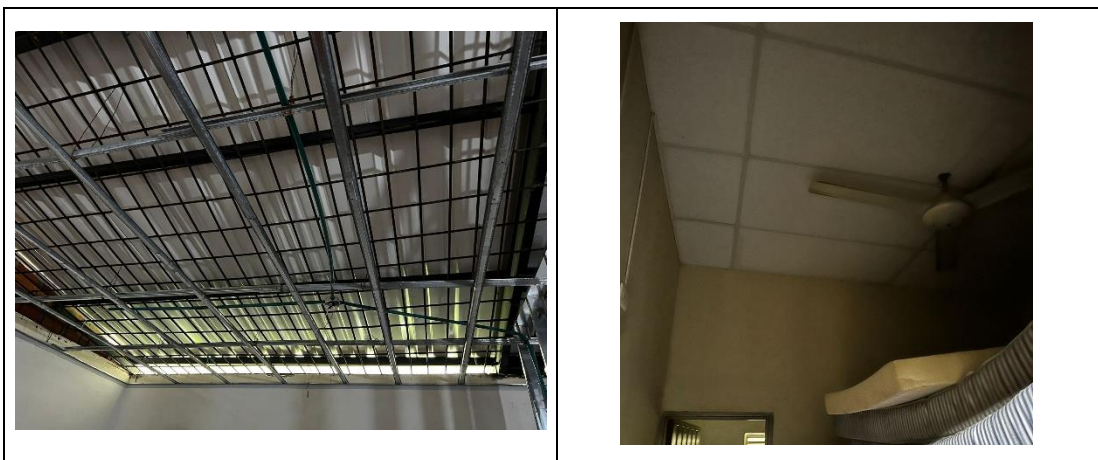

- Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 24. Acabado blanco.





- tubería Rectangular estructural de 100x40 mm e=1,9 mm) incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje (Vigas, Cerchas, anticorrosivo)



- Anden en Concreto Grava común de 3000 PSI hecho en obra E=0,10 M (incluye Mezcla, Formaleta, Fundida y Curado)





- Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)




- Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica - nova marfil- similar al existente.





- Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos

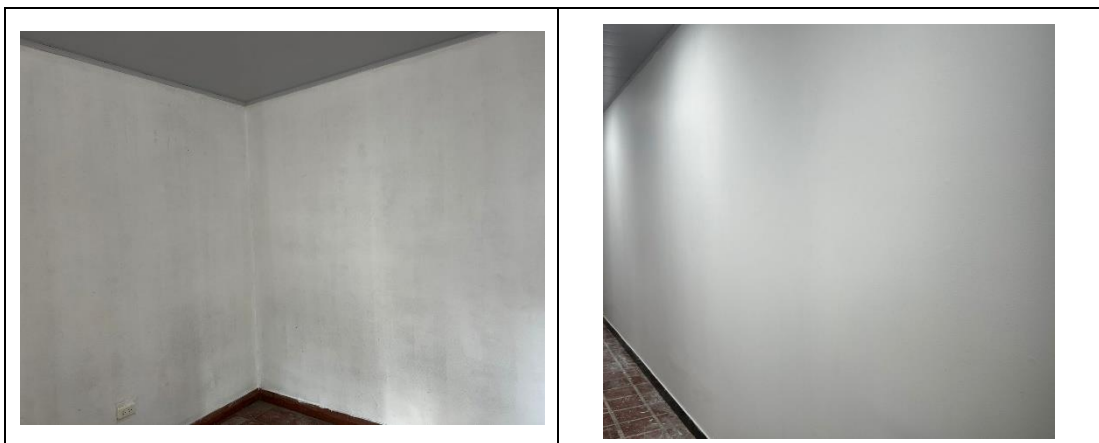


- Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto






- Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos para su instalación.

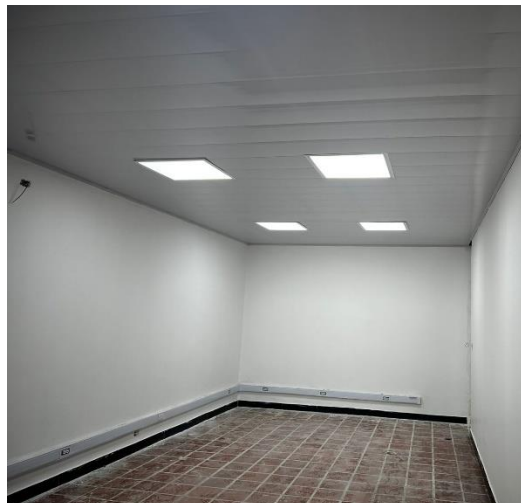

- Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plástica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto.

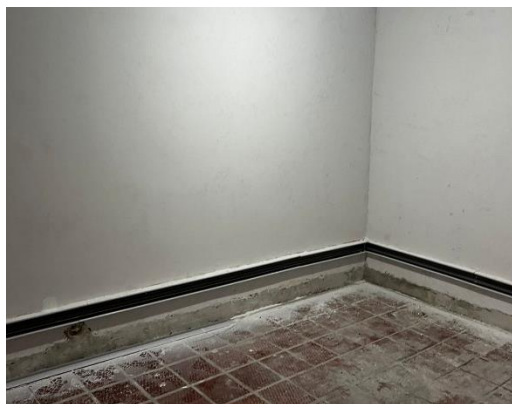



- Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla



- Cortinas enrollables screen





- Señalética



No siendo otro el objeto de la presente acta para constancia se firma por los que en ella intervinieron el 29 de diciembre de 2023.

NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN
Supervisor de contrato No. 042-2023

AF INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.518.239-6
KIMBERLY JOHANA RUIZ GUTIERREZ
Representante legal.
