


Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial "Turística y Cultural"

Departamento de Planeación e Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	26	10	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,1	DESCRIPCION:	Trazado y replanteo	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	5043,1

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			M2	Ancho	Año	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	PARQUE		5.043,1			5043,1
ESQUEMA Y/O PLANO:						
						5043,1

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



**ALCALDÍA DE
RIOHACHA**

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIONACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA
26

FECHA
MES
10

ANO
2020

CONSECUTIVO
CDI

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

1.2

DESCRIPCION:

Cerramiento en laminas de zinc

UNIDAD:

CANTIDAD

MI

233,9

[illegible]


ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Capital, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DÍA
26

MES
10

AÑO
2020

CONSECUTIVO
001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM: 1,4

DESCRIPCION: Demolicion de muros en mamposteria Incluye retiro

UNIDAD: M2



CANTIDAD: 230,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	M2	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	JARDINERA NORTE	1,00	104,00	0,40		41,6
	JARDINERA NORTE	1,00	60,00	0,40		24,0
	JARDINERA OESTE	1,00	53,00	0,40		21,2
	JARDINERA OESTE	1,00	102,00	0,40		40,8
	JARDINERA SUR	1,00	85,00	0,40		34,0
ESQUEMA Y/O PLANO:	JARDINERA CENTRO	1,00	44,00	0,40		17,6
	TARIMA	1,00	28,00	0,40		11,2
	MURO CERRAMIENTO CANCHA	1,00	66,00	0,60		39,6
	ACUMULADO PRESENTE CORTE=					230,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeacion E Infraestructura

**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

FECHA

CONSECUTIVO

DIA
26

MES
10

ANO
2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

1.5

DESCRIPCION:	
--------------	--

Desmante de postes, cables y luminarias existentes

UNIDAD:

LUND

[illegible]



6,0

[illegible]

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA		AÑO	CONSECUTIVO
DIA	MES		
26	10	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,6	DESCRIPCION:	Desmonte de cubierta Incluye retiro			UNIDAD:	M2
						CANTIDAD	105,0
OBSERVACIONES:		UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES		M2	TOTAL
				Largo	Ancho		
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.		PARQUE LAS TUNAS					
		CUBIERTA KIOSKO				45,00	45,0
		CUBIERTA GRADERÍA CANCHA		30,00	2,00		60,0
ESQUEMA Y/O PLANO:							
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						105,0	
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =							
ACUMULADO TOTAL CORTES =							
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =							

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial, Turismo y Cultural

Departamento de Planeación e Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA


FECHA
DIA MES AÑO
26 10 2020

CONSECUTIVO
001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	1,7	DESCRIPCION:	Demolicion de bordillos			UNIDAD:	ML
						CANTIDAD	206,3
OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL	
			Largo	Ancho	Ancho		
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS						
	LADO NORTE		70,44			70,4	
	LADO SUR		59,32			59,3	
	LADO OESTE		76,52			76,5	
ESQUEMA Y/O PLANO:							
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						206,3	
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =							
ACUMULADO TOTAL CORTES =							
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =							

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeacion E Infraestructura				
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	001
	26	10	2020	


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
ITEM:	1,8	DESCRIPCION:	Demolicion de estructuras Incluye retiro	UNIDAD: M3
				CANTIDAD 12,5

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	COLUMNAS DE KIOSKO	8,00	3,00	0,40	0,40	3,8
	ARCO ENTRADA	2,00	12,00	0,40	0,40	3,8
	MUROS DE GRADERÍA	20,00	1,00	1,20	0,20	4,8
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						12,5
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	26	10	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,9	DESCRIPCION:	Descapote manual y retiro	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	2883,4


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			M2	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	PARQUE		2.883,40			2883,4
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						2883,4
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Oficina Ejecutiva de Planeación y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	26	10	2020	001


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2,1	DESCRIPCION:	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	UNIDAD:	M3
				CANTIDAD	563,1

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	PERIMETRO	1,00	283,00	0,35	0,70	68,3
	VIGA CIMENTACION	1,00	51,50	0,35	0,70	12,6
	VIGA CIMENTACION	1,00	16,6	0,35	0,70	4,1
	VIGA CIMENTACION	1,00	5,00	0,35	0,70	1,2
ESQUEMA Y/O PLANO:	VIGA CIMENTACION	1,00	56,50	0,35	0,70	13,8
	VIGA CIMENTACION	1,00	109,70	0,35	0,70	26,9
	VIGA CIMENTACION	1,00	125,60	0,35	0,70	30,8
	VIGA CIMENTACION	1,00	18,00	0,35	0,70	4,4
	VIGA CIMENTACION	1,00	33,30	0,35	0,70	8,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	111,00	0,35	0,70	27,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	16,30	0,35	0,70	4,0
	VIGA CIMENTACION	1,00	102,40	0,35	0,70	25,1
	VIGA CIMENTACION	1,00	69,70	0,35	0,70	17,1
	VIGA CIMENTACION	1,00	45,80	0,35	0,70	11,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	29,40	0,35	0,70	7,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	3,00	0,35	0,70	0,7
	VIGA CIMENTACION	1,00	28,60	0,35	0,70	7,0
	VIGA CIMENTACION	1,00	20,80	0,35	0,70	5,1
	VIGA CIMENTACION	1,00	15,10	0,35	0,70	3,7
	JARDINERA	3,00	11,70	0,35	0,70	8,6
	VIGA CIMENTACION	1,00	9,70	0,35	0,70	2,4
	JARDINERA	6,00	11,20	0,35	0,70	16,5
	JARDINERA	9,00	9,70	0,35	0,70	21,4
	VIGA CIMENTACION	1,00	19,30	0,35	0,70	4,7
	VIGA CIMENTACION	1,00	17,00	0,35	0,70	4,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	24,30	0,35	0,70	6,0
	VIGA CIMENTACION	1,00	57,60	0,35	0,70	14,1
	JARDINERA	2,00	8,90	0,35	0,70	4,4
	VIGA CIMENTACION	1,00	26,40	0,35	0,70	6,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	9,00	0,35	0,70	2,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	29,20	0,35	0,70	7,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	50,10	0,35	0,70	12,3
	VIGA CIMENTACION	1,00	26,40	0,35	0,70	6,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	17,00	0,35	0,70	4,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	46,80	0,35	0,70	11,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	50,20	0,35	0,70	12,3
	VIGA CIMENTACION	1,00	18,20	0,35	0,70	4,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	10,70	0,35	0,70	2,6
	VIGA CIMENTACION	1,00	9,00	0,35	0,70	2,2
	JARDINERA	2,00	9,00	0,35	0,70	4,4
	VIGA CIMENTACION	1,00	8,50	0,35	0,70	2,1
	VIGA CIMENTACION	1,00	10,30	0,35	0,70	2,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	21,40	0,35	0,70	5,2
	VIGA CIMENTACION	1,00	10,30	0,35	0,70	2,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	7,30	0,35	0,70	1,8
	VIGA CIMENTACION	1,00	10,30	0,35	0,70	2,5
	VIGA CIMENTACION	1,00	13,00	0,35	0,70	3,2
	JARDINERA	2,00	10,30	0,35	0,70	5,0
				0,35	0,70	0,0
	VIGA CIMENTACIÓN ESTRUCTURA	2,00	28,00	0,35	0,70	13,7
	CIMENTACIÓN POSTES DETRÁS DE CANCHAS	4,00	-17,00	0,35	0,70	-16,7
	CIMENTACIÓN POSTES DETRÁS DE CANCHAS	4,00	17,00	0,35	1,00	23,8


ZAPATAS CUBIERTA	12,00	2,10	2,10	1,50	79,4
ACUMULADO PRESENTE CORTE=					563,1
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =					
ACUMULADO TOTAL CORTES =					
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =					

ILUSTRACIONES

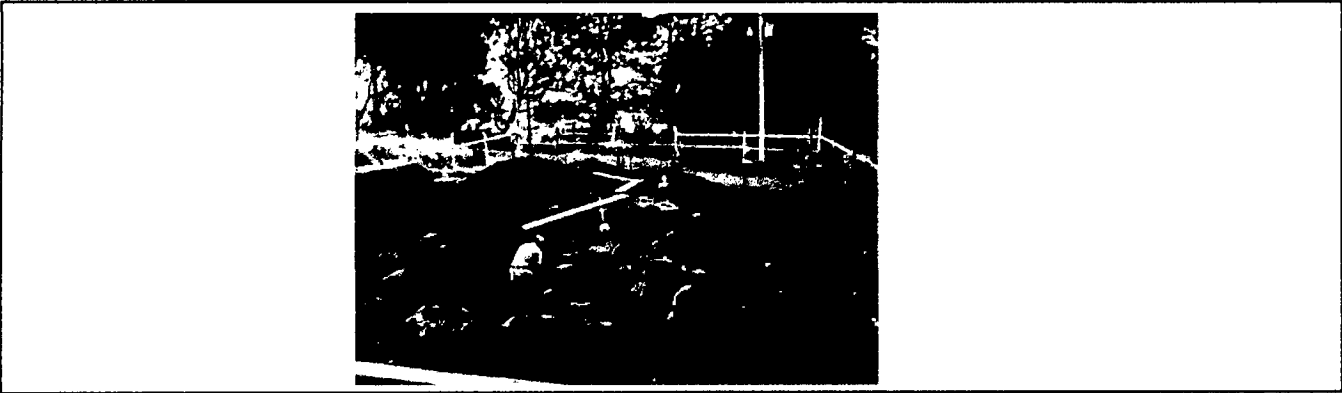

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



**ALCALDÍA DE RIOHACHA**
Resistencia y Desarrollo

Departamento de Planeación E Infraestructura			
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES	
	26	10	001
		AÑO	2020

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM:	2.3	DESCRIPCION:	Suministro extendida y compactacion de Sub-base granular
		UNIDAD:	M3
		CANTIDAD	647,7


	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA 1		27,00	17,00	0,20	91,8
	CANCHA 2		27,00	17,00	0,20	91,8
	JUEGOS INFANTILES	617,26			0,20	123,5
	JUEGOS BIOSALUDABLES	170,10			0,20	34,0
	LOSETA DE CEMENTO	1.166,55			0,20	233,3
	SENDERO PEATONAL	366,45			0,20	73,3
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						647,7
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA
DIA MES AÑO
26 10 2020

CONSECUTIVO
001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2,4	DESCRIPCION:	Empradización y paisajismo			UNIDAD:	M2
					CANTIDAD	1241,6	

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito de Riohacha, Surabima y Guatuncho


Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	DIA 7	FECHA MES 9	AÑO 2020	CONSECUTIVO 001
---	----------	-------------------	-------------	--------------------

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				
ITEM:	3.1	DESCRIPCION:	Concreto ciclópeo sin formaleta, concreto 3000 ps(60% cto+40% piedra)	UNIDAD:
				CANTIDAD

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN EL ÁREA TOTAL, OSTENDIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	PERÍMETRO	1,00	283,00	0,35	0,35	34,7
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	51,50	0,35	0,35	6,3
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	16,6	0,35	0,35	2,0
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	5,00	0,35	0,35	0,6
ESQUEMA Y/O PLANO:	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	56,50	0,35	0,35	6,8
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	109,70	0,35	0,35	13,4
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	125,60	0,35	0,35	15,4
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	18,00	0,35	0,35	2,2
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	33,30	0,35	0,35	4,1
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	111,00	0,35	0,35	13,6
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	16,30	0,35	0,35	2,0
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	102,40	0,35	0,35	12,6
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	69,70	0,35	0,35	8,5
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	45,80	0,35	0,35	5,6
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	29,40	0,35	0,35	3,6
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	3,00	0,35	0,35	0,4
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	28,60	0,35	0,35	3,5
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	30,80	0,35	0,35	3,5
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	15,10	0,35	0,35	1,8
	JARDINERA	3,00	11,70	0,35	0,35	4,3
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	9,70	0,35	0,35	1,2
	JARDINERA	6,00	11,70	0,35	0,35	8,2
	JARDINERA	9,00	9,70	0,35	0,35	10,7
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	19,30	0,35	0,35	2,4
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	17,00	0,35	0,35	2,1
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	24,30	0,35	0,35	3,0
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	57,60	0,35	0,35	7,1
	JARDINERA	2,00	8,90	0,35	0,35	2,2
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	26,40	0,35	0,35	3,2
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	8,00	0,35	0,35	1,1
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	79,70	0,35	0,35	9,6
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	50,10	0,35	0,35	6,1
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	26,40	0,35	0,35	3,2
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	17,00	0,35	0,35	2,1
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	46,60	0,35	0,35	5,7
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	50,70	0,35	0,35	6,1
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	18,20	0,35	0,35	2,2
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	10,70	0,35	0,35	1,3
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	9,00	0,35	0,35	1,1
	JARDINERA	2,00	9,00	0,35	0,35	2,2
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	6,50	0,35	0,35	1,0
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	10,30	0,35	0,35	1,3
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	21,40	0,35	0,35	2,6
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	10,30	0,35	0,35	1,3
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	7,30	0,35	0,35	0,8
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	10,30	0,35	0,35	1,3
	VIGA CIMENTACIÓN	1,00	13,00	0,35	0,35	1,6
	JARDINERA	2,00	10,30	0,35	0,35	2,5
	VIGA CIMENTACIÓN	2,00	18,00	0,35	0,35	4,4
	ESTRUCTURA					
	CIMENTACIÓN POSTES DETRÁS DE CANCHAS	4,00	11,00	0,70	0,35	10,8
	ACUMULADO PRESENTE CORTE=					246,63
	ACUMULADO CORTE ANTERIOR =					
	ACUMULADO TOTAL CORTE=					
	SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =					

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Municipal, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA

FECHA

CONSECUTIVO

7

MES

ANO

001

9

2020

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

3.2

DESCRIPCION:

Zapatas en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo

UNIDAD:

M3

CANTIDAD

28.7

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			M2	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CUBIERTA	12.00	2.1	2.10	0.50	26.5
	CIMENTACION DE POSTE	23.00	0.40	0.40	0.60	2.2
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=					28.7	
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA
DÍA
7
MES
9
AÑO
2020

CONSECUTIVO
001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Salado en concreto de 10.3 Mpa

UNIDAD: M3

CANTIDAD: 4.0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CUBIERTA	12,00	2,1	2,10	0,07	3,7
	CIMENTACION DE POSTE	23,00	0,40	0,40	0,07	0,3
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=					4,0	
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DIA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM: 3.4 DESCRIPCION: Pedestales concreto (3000psi) no incluye ref.

UNIDAD: M3

CANTIDAD: 6.1

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Altura	Largo	Ancho	
SE DISCRIMINAN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	GRADERÍA	12.00	1.20	0.65	0.65	6.1
ESQUEMA Y/O PLANO:						
	ACUMULADO PRESENTE CORTE=					6.1
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DIA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

001

7

9

2020

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

3,6

DESCRIPCIÓN:

Viga de cimentación en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo

UNIDAD:

M3

CANTIDAD

6,9

	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL	
			Largo	Ancho	Largo		
OBSERVACIONES:	PARQUE LAS TUNAS						
	VIGA CIMENTACIÓN ESTRUCTURA	2,00	28,00	0,35	0,35	6,9	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.							
	ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						6,9	
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =							
ACUMULADO TOTAL CORTES =							
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =							

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DIA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM: 3,7 DESCRIPCION: Columna en concreto de 20,7 Mpa sección < 1.600 cm2, no incluye refuerzo

UNIDAD: M3


CANTIDAD: 11,8

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES		TOTAL
			Largo	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS				
	CUBIERTA CANCHA	12,00	0,50	5,00	11,8
ESQUEMA Y/O PLANO:					
ACUMULADO PRESENTE CORTE=					11,8
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =					
ACUMULADO TOTAL CORTES =					
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =					

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA

7

FECHA

MES

9

AÑO

2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

3,90

DESCRIPCIÓN:

Bancas en concreto

UNIDAD:

CANTIDAD

UND

32,0

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL,
OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Alt

TOTAL

PARQUE LAS TUNAS

PARQUE

32,00

32,0

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

32,0

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =

ACUMULADO TOTAL CORTES =

SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DIA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

3,10

DESCRIPCION:

Bordillos en concreto (15x15) 3000psi incluye Ref. Long 3/8" Y Ref.Trasn. 1/4" No incluye Preparación Del

UNIDAD:


ML

CANTIDAD

122,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	JARDINERAS	1,00	122			122,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
CERRAMIENTO CANCHA, TRANSVERSAL					122,0	
CERRAMIENTO CANCHA LONGITUDINAL						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira						
Memoria de Cantidades						
			 ALCALDÍA DE RIOHACHA <small>Departamento de Turismo y Cultura</small>			
Departamento de Planeación E Infraestructura						
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		FECHA		CONSECUTIVO		
		DÍA		MES		
		7		9		
		AÑO		2020		
				001		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						
ITEM:	3,12	DESCRIPCION:			Piso en concreto 3000psi e = 0,10m estampado	UNIDAD:
						M2
					CANTIDAD	203,4
		UBICACIÓN		Frecuencia		DIMENSIONES
						Largo
						Ancho
						M2
						TOTAL
OBSERVACIONES:		PARQUE LAS TUNAS				
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.		ZONA BIOSALUDABLES				203,40
						203,4
ESQUEMA Y/O PLANO:						
				CERRAMIENTO CANCHA, TRANSVERSAL		203,4
				CERRAMIENTO CANCHA LONGITUDINAL		
				ACUMULADO TOTAL CORTES =		
				SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =		
ILUSTRACIONES						

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades





ALCALDÍA DE RIOHACHA

Distrito Educativo, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

7

9

2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

4,1

DESCRIPCION:

Refuerzo fy=4200 kg/cm2 1/2"

UNIDAD:

KG

CANTIDAD

11576,8



OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN	frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
		Largo	peso kg/ml	Cantidad	
PARQUE LAS TUNAS					
ACERO CANCHA MULTIPLE (2.1m X 2.1m)					
ZAPATAS					
ZAPATAS	12,00	2,00	1,56	36,00	1347,8
COLUMNAS D=50cm, H=5m					
COLUMNAS CUBIERTA	12,00	7,00	1,56	10,00	1310,4
ESTRIBOS	12,00	1,55	0,56	70,00	728,1
VIGA CIMENTO CUBIERTA					
VIGA	7,00	26,00	1,56	4,00	324,5
traslapo	7,00	7,20	1,56	4,00	69,9
ESTRIBOS	7,00	0,75	0,56	130,00	109,2
PLACA GRADA 1					
CANCHA 1 TRANSVERSAL	7,00	0,70	0,56	55,00	43,1
CANCHA 1 LONGITUDINAL	7,00	11,00	0,56	5,00	61,6
CANCHA 1 TRANSVERSAL	7,00	0,50	0,56	55,00	30,8
CANCHA 1 LONGITUDINAL	7,00	11,00	0,56	4,00	49,3
CANCHA 1 TRANSVERSAL	7,00	0,70	0,56	48,00	37,6
CANCHA 1 LONGITUDINAL	7,00	9,60	0,56	5,00	53,8
CANCHA 1 TRANSVERSAL	7,00	0,50	0,56	48,00	26,9
CANCHA 1 LONGITUDINAL	7,00	9,60	0,56	4,00	43,0
PLACA GRADA 2					
CANCHA 2 TRANSVERSAL	7,00	0,70	0,56	55,00	43,1
CANCHA 2 LONGITUDINAL	7,00	11,00	0,56	5,00	61,6
CANCHA 2 TRANSVERSAL	7,00	0,50	0,56	55,00	30,8
CANCHA 2 LONGITUDINAL	7,00	11,00	0,56	4,00	49,3
CANCHA 2 TRANSVERSAL	7,00	0,70	0,56	48,00	37,6
CANCHA 2 LONGITUDINAL	7,00	9,60	0,56	5,00	53,8
CANCHA 2 TRANSVERSAL	7,00	0,50	0,56	48,00	26,9
CANCHA 2 LONGITUDINAL	7,00	9,60	0,56	4,00	43,0
BORDILLOS					
LONGITUDINAL	1,00	122,00	0,56	1,00	68,3
TRASLAPO	1,00	12,70	0,56	1,00	6,8
GANCHOS	244	0,25	0,56	1,00	34,2
VIGA AMARRE CIMENTACIÓN 0.35X0.35					
LONGITUDINAL	1,00	1,743	0,56	4,00	3904,6
TRASLAPO	1,00	348,63	0,56	4,00	780,6
GANCHOS	11.621	0,75	0,25	1,00	2178,9
ACUMULADO PRESENTE CORTE=					11576,8
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =					
ACUMULADO TOTAL CORTES =					
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =					

ILUSTRACIONES

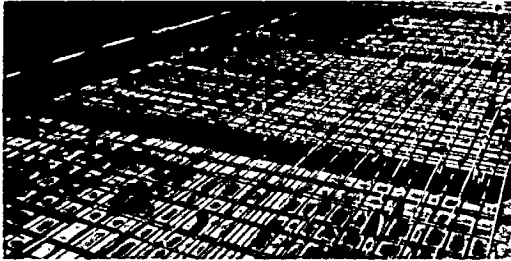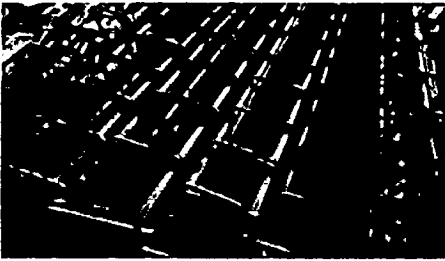

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DÍA
7

FECHA
MES
9

AÑO
2020

CONSECUTIVO
001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



Maila electrosoldada de 15x15x6mm

UNIDAD: KG

CANTIDAD: 6300,1

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES		TOTAL	
			Largo	Ancho		
SE DISCRIMINAN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA MULTIPLE 1			2,99	465,50	1381,8
	CANCHA MULTIPLE 2	1,00		2,99	465,50	1381,8
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES	1,00		2,99	617,31	1845,8
ESQUEMA Y/O PLANO:		1,00				
	CAFETERÍA			2,99	22,20	66,4
	PISTA ATLETICA			2,99	366,45	1095,7
	ZONA BIOSALUDABLES			2,99	170,10	508,6
ACUMULADO PRESENTE CORTE=					6300,1	
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =					0,0	
ACUMULADO TOTAL CORTES =					6300,1	
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =					-6300,1	

ILUSTRACIONES

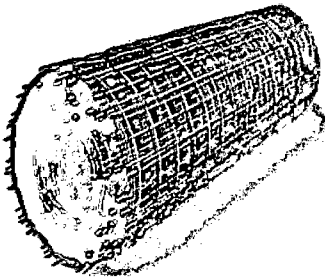

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA

7

FECHA

MES

9

AÑO

2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

4,3

DESCRIPCION:

Suministro e instalación de Estructura Metálica Acero ASTM - 36 Según Diseño de Cerchas Metálicas,

UNIDAD:


KG

CANTIDAD

13201,9



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	peso kg/ml	Ancho	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CERCHA					
	4" X 3MM	6,00	22,45	8,35	2,00	2248,49
	4" X 3MM	6,00	22,45	8,35	2,00	2248,48
	UNIÓN VERTICAL 1 1/2" X 2.0MM	6,00	0,40	2,35	86,00	485,04
	UNIÓN DIAGONAL 1 1/2" X 2.0MM	6,00	0,61	2,35	84,00	722,48
	UNIÓN HORIZONTAL 1 1/2" X 2.0MM	6,00	0,15	2,35	86,00	181,89
ESQUEMA Y/O PLANO:	COLUMNA METÁLICA					
	COLUMNA METÁLICA 4" X 3MM	12,00	2,00	8,35	4,00	801,60
	UNIÓN VERTICAL 1 1/2" X 2.0MM	12,00	0,15	2,35	8,00	33,84
	UNIÓN DIAGONAL 1 1/2" X 2.0MM	12,00	0,50	2,35	8,00	112,80
	UNIÓN HORIZONTAL 1 1/2" X 2.0MM	12,00	0,15	2,35	8,00	33,84
	VIGA RIOSTRA					
	4" X 3MM	7,00	26,31	8,35	4,00	1757,51
	UNIÓN VERTICAL 1 1/2" X 2.0MM	7,00	0,50	2,35	106,00	248,10
	UNIÓN DIAGONAL 1 1/2" X 2.0MM	7,00	0,40	2,35	106,00	199,28
	UNIÓN HORIZONTAL 1 1/2" X 2.0MM	7,00	0,70	2,35	106,00	348,74
	PERFIL 120MM X 60 X 2MM	24,00	27,00	5,58	1,00	3615,84
	PERNOS 3/4", 2.235KG/ML	8,00	0,75	2,24	12,00	160,82
	PLATINAS 5/8", 124.49KG/M2	1,00	0,20	174,49	12,00	283,32
	ACUMULADO PRESENTE CORTE=					13201,9
	ACUMULADO CORTE ANTERIOR =					
	ACUMULADO TOTAL CORTES =					
	SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =					

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



ITEM:	5,1	DESCRIPCION:	Sobrenivel sencillo en ladrillo macizo h=60 cm	UNIDAD:	ML
				CANTIDAD	1743,1

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	SOBRENIVEL	1,00	1.743,13			1743,1
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1743,1
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Espacial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES	
	6	8	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	5,4	DESCRIPCION:	Aplicación de Pulplast	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	74,50

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			M2	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERÍA		74,50			74,50
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						74,50
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeacion E Infraestructura			
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	6	8	2020
			CONSECUTIVO
			001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	5,5	DESCRIPCION:	Pintura con vinillo tipo la tres manos, incluye dilataciones y filos	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	74,50

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERÍA		74,50			74,5
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						74,50
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	6	8	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	5,7	DESCRIPCION:	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	21,2

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	M2	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERÍA		21,20			21,2
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						21,2
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	6	8	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	5,8	DESCRIPCION:	Cielo raso en laminas de PVC, incluye estructura metalica	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	21,70

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERÍA		4,80	4,52		21,70
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						21,70
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	6	8	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	5,9	DESCRIPCION:	Piso en Cerámica para Interior 40x40cm	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	21,2

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	M2	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERÍA		21,20			21,2
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						21,2
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial: Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DÍA	MES	AÑO	001
	7	9	2020	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	6,2	DESCRIPCION:	Gramas sintética de 8800 Dtex, densidad 50400 en colores para piso de juegos infantiles Incluye	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	617,3



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES		M2	TOTAL
			Largo	Ancho		
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				617,26	617,3
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						617,3
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



**ALCALDÍA DE RIOHACHA**
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeacion E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA7

FECHA
MES9

AÑO2020

CONSECUTIVO001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:6,3

DESCRIPCION:Grama sintetica de 30mm con cesped entorchado de 15mm, 240 s/m puntadas, densidad 50000, Dtex

UNIDAD:M2



CANTIDAD459,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA MULTIPLE 2		27,00	17,00		459,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						459,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeacion E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		AÑO	CONSECUTIVO
	DIA	MES		
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA




ITEM:	6,4	DESCRIPCION:	Shockpad 10mm de 70kg/m3	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	459,0

	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA MULTIPLE 2		27,00	17,00		459,0
ESQUÉMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						459,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turismo y Cultura

Departamento de Planeacion E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	6,5	DESCRIPCION:	Shockpad 20mm de 70kg/m3	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	617,3

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	ZONA DE JUEGOS INFANTILES				617,26	617,3
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						617,3
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



**ALCALDÍA DE RIOHACHA**
Distrito Histórico, Turístico y Cultural


Departamento de Planeación E Infraestructura				CONSECUTIVO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	DIA	FECHA MES	AÑO	
	7	9	2020	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	7,1	DESCRIPCION:	Cerramiento en tubo de 2"	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	408,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA MULTIPLE 1	2,00	17,00		6,00	204,0
	CANCHA MULTIPLE 2	2,00	17,00		6,00	204,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						408,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades




Departamento de Planeacion E Infraestructura				FECHA		CONSECUTIVO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				DIA	MES	AÑO
				7	9	2020
						001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
ITEM:	7,2	DESCRIPCION:	Cerramiento en tubo cuadrado de 3" x 1,5"		UNIDAD: ML
					CANTIDAD 201,0



	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES:	PARQUE LAS TUNAS					
	CERRAMIENTO JUEGOS INFANTILES	1,00	134,00		1,50	201,0
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.						
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						201,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES AÑO	
	6	8 2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	7,3	DESCRIPCION:	Arcos 3,0x2 en tubo de 3" (portico y 2" estructura incluye redes)	UNIDAD:	UNO
				CANTIDAD	4,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA DE FUTBOL	4,00				4,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						4,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultural

Division Española de Traducción y Cultura

Departamento de Planeacion E Infraestructura

**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

DIA
7

FECHA

MES

ANO
2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

7,4

DESCRIPTION:	<p>1. The first part of the report is a general description of the project, including the title, objectives, and scope. This section is followed by a detailed description of the methodology used in the study, including the data collection methods and the statistical analysis techniques.</p> <p>2. The second part of the report is a detailed description of the results of the study. This section includes a table of the data collected, a graph showing the results of the statistical analysis, and a discussion of the findings. The results are presented in a clear and concise manner, making it easy for the reader to understand the findings of the study.</p> <p>3. The third part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the findings of the study and provides a final statement on the results. The references list the sources of information used in the study, including books, articles, and websites.</p>
--------------	---

Tableros de baloncesto acrílicos. Incluye armazón metálico para baloncesto aro maila e instalación

UNIDAD:

UND

UNIDAD:	CANTIDAD
---------	----------


0,0

[illegible]

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Deporte, Fiestas, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



ITEM:	7,5	DESCRIPCION:	Esteras para cafetería cal. 22	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	7,0

	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA MULTIPLE	1,00	2,80	2,50		7,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						7,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación e Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DÍA

7

MES

9

AÑO

2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	7,6	DESCRIPCION:	Suministro e instalacion de Puerta en aluminio anodizado -01 hoja (0.90x2.23m) con respiradero del	UNIDAD:	UND
				CANTIDAD	2,0

	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERIA BAÑOS					2,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						2,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		AÑO	CONSECUTIVO
	DÍA	MES		
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	7.8	DESCRIPCION:	Protector metalico incluye anticorrosivo , pintura e inst. Según esp.	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	2,0


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CAFETERIA BAÑOS	2,00				2,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						2,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						


ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades










Departamento de Planeacion E Infraestructura				
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



ITEM:	8,1	DESCRIPCION:	Suministro e Instalacion de Acometida Subterránea en cable de cu 2Nº 4 + 1Nº 4 AWG para transformador de 15 kva	UNIDAD:	ml
				CANTIDAD	30,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CUARTO ELECTRICO	1,00	30,00			30,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						30,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						30,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-30,0

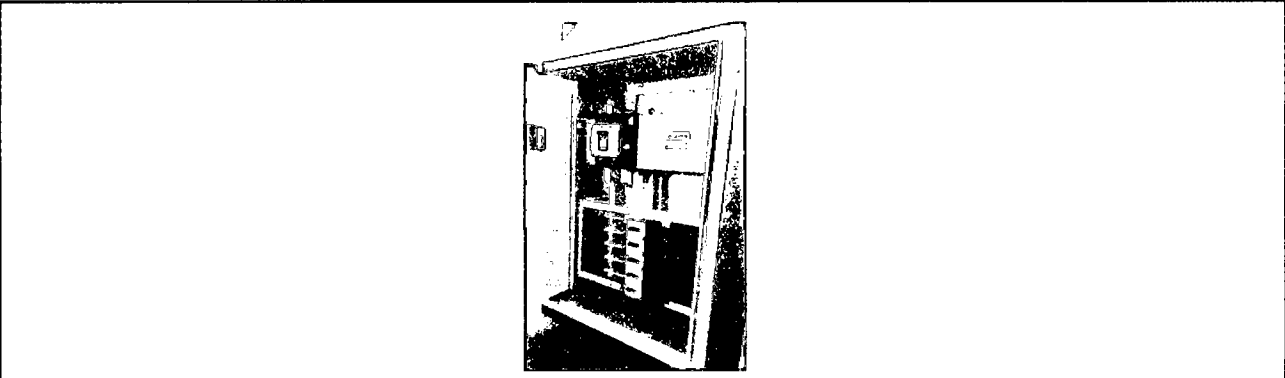

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeacion E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,2	DESCRIPCION:	Suministro e instalacion de Ducto pvc de 2" conduIt	UNIDAD:	ml
				CANTIDAD	20,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CUARTO ELECTRICO	1,00	20,00			20,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						20,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						20,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-20,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

7

9

2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

8,3

DESCRIPCION:

Suministro E Instalacion Tablero General con espacio para dos medidores, Totalizador de 3x80 amp y

UNIDAD:

UND

CANTIDAD

1,0

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

UBICACIÓN

PARQUE LAS TUNAS

Frecuencia

CUARTO ELECTRICO

1,00

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Alto

TOTAL

1,0

ESQUEMA Y/O PLANO:

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

1,0

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =

0,0

ACUMULADO TOTAL CORTES =

1,0



SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

-1,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades





ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

7

9

2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

8,4

DESCRIPCION:

Suministro E Instalación De Tablero De Control con totalizador principal, 5 Salidas De Iluminación,

UNIDAD:

UND

CANTIDAD




1,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00				1,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						1,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-1,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,5	DESCRIPCION:	Suministro e instalacion de salida de iluminacion en caja octagonal rawel con salida de 3/4, Incluye	UNIDAD:	UND
				CANTIDAD	2,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	2,00				2,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						2,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						2,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-2,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



**ALCALDÍA DE RIOHACHA**
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

7

9

2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

8,6

DESCRIPCION:

Caja de Inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7

UNIDAD:

UND

CANTIDAD

2,0

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

Largo

Ancho

Alto

TOTAL

PARQUE LAS TUNAS

2,00

2,0

CANCHA

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

2,0

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =

0,0

ACUMULADO TOTAL CORTES =

2,0


SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

-2,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Dirección Especial: Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DÍA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,7	DESCRIPCION:	Suminstro e instalacion de egulpo de medida directa 100amp 2F en poste	UNIDAD:	UND
				CANTIDAD	0,0


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	0,00				0,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						0,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						0,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0


ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









Departamento de Planeación E Infraestructura			
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	DIA	FECHA MES	CONSECUTIVO
	7	9 2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM:	8,8	DESCRIPCIÓN:	Suministro e Instalacion de adecuacion de punto de conexon en BT en poste fijacion
		UNIDAD:	UND
		CANTIDAD	1,0


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00				1,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						1,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-1,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeacion E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DÍA

7

FECHA

MES

9

AÑO

2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

8,10

DESCRIPCION:

Suministro y tendido de acometida subterránea en tuboconduit de 1"

UNIDAD:

ml

CANTIDAD

60,0

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS ÁREAS QUE COMPRENDEN EL ÁREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

Largo

Ancho

Alto

TOTAL

PARQUE LAS TUNAS

CANCHA

1,00

60,00

60,0

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

60,0

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =

0,0

ACUMULADO TOTAL CORTES =

60,0



SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

-60,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Division of Tourism & Cultural

Departamento de Planeacion E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA
7

FECHA

MES

ANO
2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

8.11

DESCRIPCION:

Suministro y tendido de acometida aérea en tubo cmt 3/4"

UNIDAD:

mi

UNIDAD.	CANTIDAD
---------	----------


70.9

[illegible]

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades




**ALCALDÍA DE RIOHACHA**
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura			
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	DIA	FECHA MES	CONSECUTIVO
	7	9	2020

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM:	8,12	DESCRIPCION:	Suministro y tendido de cable de cobre (2F+1T)x12awg
		UNIDAD:	ml
		CANTIDAD	790,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00	790,00			790,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						790,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						790,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-790,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades





ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

Departamento de Planeación E Infraestructura				CONSECUTIVO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOMACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			001
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA

Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



ITEM:	8,15	DESCRIPCION:	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" para aterrizaj la infraestructura de puesta a	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	1,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00				1,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						1,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-1,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,16	DESCRIPCION:	Suministro y tendido de cable de cobre No. 2 desnudo para configurar sistema de malla a tierra	UNIDAD:	ml
				CANTIDAD	40,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00	40,00			40,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						40,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						40,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-40,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES	
	7	9	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,17	DESCRIPCION:	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 g para empalmes del sistema de puestas a tierra.	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	4,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	4,00				4,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						4,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						4,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-4,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,18	DESCRIPCION:	Suministro e instalacion de sistema de aterrizaje de estructura metalica en postes	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	0,0


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	0,00				0,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						0,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						0,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0


ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades










ALCALDÍA DE RIOHACHA
Origen Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura				FECHA		CONSECUTIVO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				DÍA	MES	AÑO
				7	9	2020
						001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					
ITEM:	8,19	DESCRIPCION:	Suministro E Instalacion 200 W, 100-277 V, Incluye: Accesorios De Sujecion Y Accesorios De Conexion		UNIDAD: ud
				CANTIDAD	12,0


	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	12,00				12,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						12,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						12,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-12,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación e Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,20	DESCRIPCION:	Suministro y colocación de lámparas tipo campana 100w para cancha con cubierta	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	8,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	8,00				8,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						8,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						8,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-8,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES	
	7	9	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,21	DESCRIPCION:	Suministro y colocación de luminarias led 40w en zona infantil e iluminación perimetral y senderos	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	46,0



OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	46,00				46,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						46,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						46,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-46,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DÍA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,22	DESCRIPCION:	Suministro e Instalacion, arrimada, hincada y plomada de poste 10 mts. galvanizado	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	4,0


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	4,00				4,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						4,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						4,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-4,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación e Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DÍA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	8,23	DESCRIPCION:	Caja de paso metálica 40 x 40 x 20 cm. Suministro e instalación	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	0,0


	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA					0,0
ESQUEMA V/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						0,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						0,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						0,0

ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeacion E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIONACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA			CONSECUTIVO
	DIA	MES	AÑO	
	7	9	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	8,24	DESCRIPCION:	Suministro e instalacion de postes metalico 3" doble brazo 6mts altura	UNIDAD:	ud
				CANTIDAD	23,0


[illegible]

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA

DIA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

7

9

2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

8,25

DESCRIPCION:

Suministro e instalacion de bajante en encauchetado 3x14 para luminarias

UNIDAD:

ml

CANTIDAD

450,0

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL,
OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Alto

TOTAL

PARQUE LAS TUNAS

1,00

450,00

450,0

CANCHA

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

450,0

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =

0,0

ACUMULADO TOTAL CORTES =

450,0



SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

-450,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



Departamento de Planeación E Infraestructura			
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	DIA	FECHA MES	CONSECUTIVO
	7	9	001
AÑO 2020			

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA



ITEM:	9,1	DESCRIPCION:	Juegos infantiles en tubería de 4" con pintura electrostática, pisos metalcos recubiertos en PVC y pastas	UNIDAD:	UND
				CANTIDAD	1,0

OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00				1,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						1,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-1,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultural

Departamento de Planeación e Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES	
	7	9	001


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			
ITEM:	9,2	DESCRIPCION:	Juegos Biosaludables
		UNIDAD:	UND
		CANTIDAD	1,0

	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	
OBSERVACIONES: SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	CANCHA	1,00				1,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						0,0
ACUMULADO TOTAL CORTES =						1,0
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						-1,0

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA
7

FECHA
MES
9

AÑO
2020

CONSECUTIVO
001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	10,1
-------	------

DESCRIPCION:	
--------------	--

Relleno común compactado y nivelado

UNIDAD:	
---------	--

M3

	UNIDADES
	CANTIDAD

1963,8

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL,
OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

DIMENSIONES

M2

Anche

Alto

[illegible]

PARQUE LAS TUNAS

CANCHA

1,00

5.043,10

0,39

1963,8

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

1963,8

ACUMULADO CORTE ANTERIOR ☐


ACUMULADO TOTAL CORTES =

SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura


CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		CONSECUTIVO
	DIA	MES AÑO	
	7	9 2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	10,2	DESCRIPCION:	Piso tipo loseta de cemento para exterior	UNIDAD:	M2
				CANTIDAD	1075,3


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			M2	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	PISO LOSETA	1,00	1.075,30			1075,3
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1075,3
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						


ILUSTRACIONES



Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DÍA

FECHA

MES

AÑO

CONSECUTIVO

6

8

2020

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

10,5

DESCRIPCION:

Arena cernida entre 0.6 - 1.2 micras para juegos caninos

UNIDAD:

M3

CANTIDAD

83,7

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL,
OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

DIMENSIONES

M2

Ancho

Alto

TOTAL

PARQUE LAS TUNAS

ZONA JUEGOS CANINOS

279,00

0,30

83,7

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

83,7

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =


ACUMULADO TOTAL CORTES =

SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades



ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Oficina Especial de Turismo y Cultura

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA		ANO	CONSECUTIVO
	DÍA	MES		
	6	8	2020	001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	10,7	DESCRIPCION:	Juegos para caninos	UNIDAD:	UND
				CANTIDAD	1,0


OBSERVACIONES:	UBICACIÓN	Frecuencia	DIMENSIONES			TOTAL
			M2	Ancho	Alto	
SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.	PARQUE LAS TUNAS					
	ZONA JUEGOS CANINOS	1,00				1,0
ESQUEMA Y/O PLANO:						
ACUMULADO PRESENTE CORTE=						1,0
ACUMULADO CORTE ANTERIOR =						
ACUMULADO TOTAL CORTES =						
SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =						

ILUSTRACIONES

Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira

Memoria de Cantidades









ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Departamento de Planeación E Infraestructura

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DIA

6

FECHA

MES

8

AÑO

2020

CONSECUTIVO

001

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:

10,7

DESCRIPCION:

Suministro e Instalación de Cubierta Standing Seam, Acesco Grado 40 CAL. 26 (Incluye Elementos de

UNIDAD:

M2

CANTIDAD

616,0

OBSERVACIONES:

SE DISCRIMINAN LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL AREA TOTAL, OBTENIDAS POR MEDIO DE LOS PLANOS DE AUTOCAD.

ESQUEMA Y/O PLANO:

UBICACIÓN

Frecuencia

DIMENSIONES

Largo

Ancho

Alto

TOTAL

PARQUE LAS TUNAS

CANCHA MULTIPLE 1

22,00

28,00

616,0

ACUMULADO PRESENTE CORTE=

616,0

ACUMULADO CORTE ANTERIOR =

0,0

ACUMULADO TOTAL CORTES =

616,0

SALDO POR EJECUTAR SEGÚN CONTRATADO =

-616,0

ILUSTRACIONES
