

	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	22/01/2025

ACTA No. DE MAYORES Y MENORES E ÍTEMS NO PREVISTOS

IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

TIPO DE CONTRATO: MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO MS

CONTRATO No. STM-LP-009-2025

INTERVENCIÓN: CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

Mediante la presente Acta, **Alexander Román** Director de Obra del Contratista y **Ernesto Perdomo** Director de Interventoría dejan constancia de la verificación de las cantidades de obra implementadas en el punto **25785_CN_02- Mirador Tabio** del municipio de **Tabio**, el día **18 del mes de junio de 2025**.

La interventoría hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción, de acuerdo con el siguiente cuadro que incluye cantidades y precios:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
IMPRIMANTE											
1	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro de 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	m	0	\$ 1.880,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro de 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	m	0	\$ 2.120,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
3	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de sólidos por volumen.	m2	173,51	\$ 20.450,00	\$ 3.548.279,50	36,02		\$ 736.609,00	\$ -	209,53	\$ 4.284.889,00
DEMARCAIONES - Pintura acrílica base solvente											
0											
4	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen.	m	0	\$ 2.980,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
5	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen.	m	0	\$ 3.020,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
6	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	m2	0	\$ 35.450,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
7	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	m2	0	\$ 33.140,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
DEMARCAIONES - Pintura acrílica base agua											
0											
8	Suministro y aplicación de pintura acrílica base agua de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	m	0	\$ 2.650,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
9	Suministro y aplicación de pintura acrílica base agua de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen.	m	0	\$ 3.010,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
10	Suministro y aplicación de pintura acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	m2	0	\$ 35.450,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
11	Suministro y aplicación de pintura acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	m2	0	\$ 33.140,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
DEMARCAIONES - Resina termoplástica.											
0											
12	Suministro y aplicación de resina termoplástica de 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2,3 mm).	m	0	\$ 8.950,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
13	Suministro y aplicación de resina termoplástica de 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2,3 mm).	m	0	\$ 9.650,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
14	Suministro y aplicación de resina termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2,3 mm), incluye pictogramas.	m2	0	\$ 80.040,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
15	Suministro y aplicación de resina termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2,3 mm), incluye pictogramas.	m2	0	\$ 70.040,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
DEMARCAIONES - Pintura plástico en frío metilmelacrilato.											
0											
16	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmelacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 y/o normalidad vigente.	m	0	\$ 6.050,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
17	Suministro y aplicación de pintura en plástico en frío metilmelacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 y/o normalidad vigente.	m	0	\$ 7.650,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
18	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmelacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 y/o normalidad vigente.	m2	0	\$ 72.450,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
19	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frío metilmelacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 y/o normalidad vigente.	m2	0	\$ 63.120,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
20	Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío metilmelacrilato con microesfera para marcas viales de espesor seco de 50 mils, según norma NTC 4744 y/o normalidad vigente, incluye pictogramas.	m2	101,24	\$ 75.450,00	\$ 7.638.558,00	37,428		\$ 2.823.943,00	\$ -	138,67	\$ 10.462.501,00
21	Suministro y aplicación manual (método llano) de pintura de plástico en frío metilmelacrilato sin microesfera para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744 y/o normalidad vigente, incluye pictogramas.	m2	0	\$ 73.450,00	\$ -		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
DEMARCAIONES - Otros.											
0											
22	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072 y/o normalidad vigente.	m2	101,24	\$ 10.140,00	\$ 1.026.573,60	37,43		\$ 379.540,00	\$ -	138,67	\$ 1.406.114,00
23	Borrado mecánico de marcas viales.	m2	0	\$ 41.250,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
24	Suministro e instalación de cinta preformada para señalización horizontal, de acuerdo con NTC-5888 y/o normalidad vigente.	m2	0	\$ 74.150,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
SEÑALES VERTICALES											
0											
25	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 447.150,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
26	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 690.450,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
27	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 600.450,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
28	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 854.520,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
29	Fabricación, suministro e instalación de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte.	Ud.	0	\$ 654.120,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
30	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A/SR de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte para la señal.	Ud.	0	\$ 862.560,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
31	Fabricación, suministro e instalación de señal SP-04, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte para la señal.	Ud.	0	\$ 862.120,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
32	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte.	Ud.	0	\$ 644.527,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
33	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SR-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 802.450,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
34	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SR-04 (poste de referencia) de 45 x 125 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 805.320,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
35	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE tipo slot - SR-30/SR-39, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte.	Ud.	0	\$ 906.540,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
36	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 o SR-39 de 75 x 25 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte.	Ud.	0	\$ 654.710,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
37	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 con baliza destellante de panel solar, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte.	Ud.	0	\$ 1.945.750,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
38	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 45 x 30 cm en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, anillo luminoso fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 405.680,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
39	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, anillo luminoso fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 441.450,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
40	Fabricación, suministro e instalación de marcador sencillo de obstáculo (dó) 80 x 15 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, anillo luminoso fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 362.309,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
41	Fabricación, suministro e instalación de marcador D-16 de obstáculo (chevron) 80 x 30 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, anillo luminoso fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 711.127,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
42	Fabricación, suministro e instalación de tableros en lámina galvanizada C-16 y cinta retroreflectiva Tipo XI, para señales SP-SR-SI, cumpliendo con normalidad vigente. Incluye elementos de fijación.	m2	0,00	\$ 353.193,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
43	Fabricación, suministro e instalación de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (poste sencillo para tableros letreros o menores a 75 x 100 cm), cumpliendo con normalidad vigente. Incluye la cimentación del soporte.	m2	0	\$ 258.381,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
44	Suministro e instalación de película antigrafi para señales verticales.	m2	0	\$ 108.470,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
45	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y duplex). Incluye la cimentación del soporte para la señal.	Ud.	0	\$ 102.360,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
46	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en el lugar dispuesto por la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y duplex).	Ud.	5	\$ 53.700,00	\$ 268.500,00			\$ -	\$ -	5	\$ 268.500,00
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Delineadores de piso o elevados.											
47	Suministro e instalación de tachas reflectivas, cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1) y la normalidad vigente.	Ud.	0	\$ 13.787,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
48	Suministro e instalación de letreros reflectivos con espigo de mínimo 3 cm, cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1) y la normalidad vigente.	Ud.	56	\$ 15.305,00	\$ 857.080,00	12		\$ 183.660,00	\$ -	44	\$ 673.420,00
49	Suministro y anclaje de espigones plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm de acuerdo con NTC 4745 y/o normalidad vigente, incluye elementos de fijación.	Ud.	0	\$ 12.636,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
50	Suministro y anclaje de espigones metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2 cm de altura, con un espigo de mínimo 5 cm de acuerdo con NTC 4745 y/o normalidad vigente, incluye elementos de fijación.	Ud.	1176	\$ 13.964,00	\$ 16.421.664,00	260		\$ 3.630.640,00	\$ -	916	\$ 12.791.024,00
51	Suministro y anclaje de bordos traspasables en resina polimérica de color amarillo con alta resistencia al impacto (tipo piramidal), dimensiones: altura mínima de 8 cm, ancho de 15 cm y largo 40 cm. Incluye accesorios y elementos de fijación.	Ud.	0	\$ 100.627,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
52	Suministro y anclaje de bordos no traspasables en polietileno de alta densidad sin plomo de color amarillo, seccionado en dos unidades, altura mínima 15 cm, ancho 20 cm y largo 60 cm con un lengüeta superior.	Ud.	0	\$ 224.687,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
53	Suministro y anclaje de bordos no traspasables, en concreto de 4000 PSI con vanilla de refuerzo de 1/2" (tipo piramidal con notificación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud).	Ud.	0	\$ 306.250,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
54	Suministro e instalación de boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas de 10 cm de altura y 24 cm de base).	Ud.	0	\$ 99.828,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
55	Suministro e instalación de boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas de 10 cm de altura y 24 cm de base).	Ud.	0	\$ 60.679,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
56	Retiro de delineadores de piso o elevados con su respectivo anclaje, incluye entrega en el lugar dispuesto por la respectiva Entidad territorial.	Ud.	0	\$ 5.042,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Delineadores verticales y marcadores de obstáculos.											
57	Suministro e instalación de delineador tubular simple construido en metal sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel reflectivo blanco tipo XI, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm.	Ud.	0	\$ 90.231,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
58	Retiro de delineadores verticales o marcadores de obstáculos con su respectivo anclaje, incluye entrega en el lugar dispuesto por la respectiva Entidad territorial.	Ud.	0	\$ 29.970,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Bandas alertadoras.											
59	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2,0 cm de altura, construida con gravilla de 12", pintura de larga duración blanca y resina epóxica con ancho mínimo de 25 cm.	m2	0	\$ 359.796,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
60	Construcción de bandas alertadoras longitudinales de 1,0 cm de altura, resaladas con pintura de larga duración termoplástica o similar.	m2	0	\$ 314.381,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
61	Construcción de bandas alertadoras longitudinales de 1,2 cm de altura, resaladas con pintura de larga duración termoplástica o similar.	m2	0	\$ 321.262,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
62	Construcción de bandas alertadoras longitudinales de 1,5 cm de altura, resaladas con pintura de larga duración termoplástica o similar.	m2	0	\$ 337.755,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -
63	Retiro de bandas en agregado y disposición de escombros en lugar autorizado.	m2	0	\$ 103.636,00	\$ -			\$ -	\$ -	0	\$ -


DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - Reductores de velocidad, resaltos.										
0										
64	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho o plástico con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 cm y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	m	0	\$	220.435,00	\$	-	\$	-	\$
65	Construcción de resalto fijo de 3,1 m de ancho con mezcla asfáltica densa en caliente tipo MOC-19, demarcado. Cumpliendo con la normatividad vigente. (Incluye: suministro, transporte, colocación, nivelación)	m	0	\$	990.110,00	\$	-	\$	-	\$
66	Construcción de resalto parabólico de 3 m de ancho con concreto (mezcla 1 Silu) de 28 Mpa (4000 psi) y acero de refuerzo en varilla de 10 mm. Incluye: suministro, transporte, colocación, nivelación.	m	0	\$	1.027.780,00	\$	-	\$	-	\$
67	Remoción de resalto parabólico existente (incluye carga y transporte de escombros al lugar autorizado)	m	0	\$	180.000,00	\$	-	\$	-	\$
68	Retiro de resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en el lugar dispuesto por la respectiva Entidad territorial.	m	0	\$	90.636,00	\$	-	\$	-	\$

DISPOSITIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA VELOCIDAD - Radares de velocidad con panel de mensajería variable.										
0										
69	Suministro e instalación de radares medidores de velocidad de 2 dígitos, con protección antivandálica, dígitos en verde/rojo (límite programable), tecnología Doppler, conectividad bluetooth y USB, energía: panel solar, adsorbible a poste, con más del 99% de precisión en la velocidad, mensaje variable y garantía de mínimo dieciocho meses. Incluye tablero con señal SR-30 de acuerdo con el manual de señalización vigente. Incluye accesorios y materiales para la cimentación del soporte del radar.	Ud.	0	\$	27.800.233,00	\$	-	\$	-	\$

ITEMS NO PREVISTOS										
NP-01	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la	Ud.	14	\$	447.150,00	\$	6.260.100,00	\$	-	\$
NP-02	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad	Ud.	2	\$	690.450,00	\$	1.380.900,00	\$	-	\$
NP-03	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad	Ud.	0	\$	600.450,00	\$	-	\$	-	\$
NP-04	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad	Ud.	0	\$	854.520,00	\$	-	\$	-	\$
NP-05	Fabricación, suministro e instalación de señal SP-47, SP-47A de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	0	\$	654.120,00	\$	-	\$	-	\$
NP-06	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SP-47/SR, SP-47A/SR de 75 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	0	\$	862.560,00	\$	-	\$	-	\$
NP-07	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	0	\$	862.120,00	\$	-	\$	-	\$
NP-08	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	2	\$	644.527,00	\$	1.289.054,00	\$	-	\$
NP-09	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 100 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad	Ud.	0	\$	802.450,00	\$	-	\$	-	\$
NP-10	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE SI-04 (poste de referencia) de 45 x 125 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad	Ud.	0	\$	805.320,00	\$	-	\$	-	\$
NP-11	Fabricación, suministro e instalación de señal DOBLE tipo SI26 - SR30/SR-38, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	0	\$	906.540,00	\$	-	\$	-	\$
NP-12	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	0	\$	654.710,00	\$	-	\$	-	\$
NP-13	Fabricación, suministro e instalación de señal SR-30 con baliza destellante de panel solar, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con normatividad vigente.	Ud.	0	\$	1.945.750,00	\$	-	\$	-	\$
NP-14	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 45 x 30 cm en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con	Ud.	0	\$	405.680,00	\$	-	\$	-	\$
NP-15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 50 x 40 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con	Ud.	26	\$	441.450,00	\$	11.477.700,00	\$	-	\$
NP-16	Fabricación, suministro e instalación de marcador sencillo de obstáculo (50) 50 x 15 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en tubería calibre 14, cumpliendo con	Ud.	0	\$	362.309,00	\$	-	\$	-	\$
NP-17	Fabricación, suministro e instalación de marcador DOBLE de obstáculo (chevron) 80 x 30 cm, en lámina galvanizada C-16 y cinta retrorreflexiva Tipo XI, amarillo limón fluorescente, pedestal en ángulo, cumpliendo con	Ud.	0	\$	711.127,00	\$	-	\$	-	\$
NP-18	Fabricación, suministro e instalación de pedestal sencillo en tubería calibre 14 para señales SP-SR-SI (poste sencillo para laberios iguales o menores a 75 x 100 cm), cumpliendo con normatividad vigente. (Incluye la	Ud.	0	\$	258.381,00	\$	-	\$	-	\$
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					50.168.408,10		3.940.092,00		3.614.300,00	
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					16.053.890,00		1.720.576,00		16.094.145,00	
ADMINISTRACION				250%	12.542.102,00		985.023,00		953.575,00	
IMPREVISTOS				2%	1.003.358,00		76.807,00		76.206,00	
UTILIDAD				5%	2.508.470,00		197.005,00		190.715,00	
IVA 19% SOBRE UTILIDAD				9%	-		-		-	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					66.222.295,10		5.200.922,00		5.034.875,00	

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS	-166.047,90
--	-------------

NOTA: El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato y anexar la matriz de garantías firmadas por las partes.

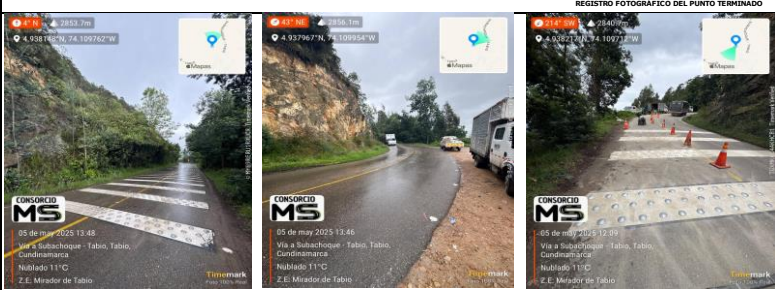

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PUNTO TERMINADO										

(Esta parte va únicamente en la última página)										
EL CONTRATISTA:										
Firma: 										
Nombre: JOSE ALEXANDER ROMÁN										
DIRECTOR DE OBRA										
18/06/2025										
FECHA DE ELABORACIÓN										
EL INTERVENTOR:										
Firma: 										
Nombre: ERNESTO PERDOMO										
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA										

Nota: En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

Copias: Contratista, Interventor
