

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 002

ÁREA:	DIRECCION OPERACIONES AEROPORTUARIAS		PROCESO:	EJECUCION CONTRATOS	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Realizar revisión operativa de sitios, para la ejecución del contrato 25000722 H2 de 2025 que tiene por objeto “ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON TECNOLOGÍA DE RADAR PARA AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL” . Seguimiento al contrato de seguridad No. 24001294 - H3				
LUGAR:	AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ				
FECHA:	DEL 13-08-2025 AL 15-08-2025	HORA INICIO:	10:30 AM del 13-08-2025	HORA FINAL:	05:00 PM del 15-08-2025

I. ASISTENTES A LA REUNION DE INICIO Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ASISTENTES:	ROL ACTUAL	FIRMA
1. Héctor Iván Bedoya Diaz	Profesional Especialista Supervisor del contrato.	—
2. Angelica Maria Elinan Garzon	Ingeniera Avsec Apoyo contractual	
3. Sergio Aranzalez	Ingeniero de Proyectos Prosegur	
4. Elvis Ferias	Técnico lider. Prosegur	
5. Carlos Camargo	Coordinador regional norte Prosegur	
6. José Rambal	técnico de mantenimiento- Prosegur	
7. Giovanni Buitrago	Supervisor de seguridad- Aeronáutica civil- Barranquilla	
8. David Alexander rendón maya	Jefe de seguridad – Aeronáutica civil Barranquilla.	
9. Vicente Peña Barraza	Asesor de la dirección- Aeronáutica civil Barranquilla	
10. Roberto Osorio caballero	Subgerente técnico operativo- Prosegur	
11. Gustavo Rojas Hernández	Gerente de Tecnología - Prosegur	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

II. OBJETIVO Y TEMAS TRATADOS EN LA VISITA:

A continuación, se listan las actividades realizadas:

Revisión central CCTV, donde se suministrará rack y aire acondicionado para la instalación de servidor, Ups. Se propone instalar en el cuarto lockers de la misma sala de CCTV.

Se revisan las opciones de energía dos circuitos aire 12000 btu, acondicionado a 120 Vac promedio 10 Amperios, Ups 3Kva de soporte Servidor del rack a integrar, donde se debe tener presente que se tome desde el tablero de la subestación, para que lo propongan a la administración del sitio y poder Prosegur hacer la infraestructura. De parte de Prosegur enviar las fichas técnicas y carga de los equipos que van

Los nuevos puntos de coordenadas pasarán a evaluarse con fabrica para tomar los puntos definitivos.

Las Puestas a tierra certificadas se deben tener presente para los equipos nuevos en las torres a instalar y generar la protección a equipos.

Se realizó visita a la Torre de Control para visualizar la posible comunicación entre radioenlaces (Torre de Control → Central CCTV). Se determinó que los radioenlaces de recolección de datos deben ubicarse en la Torre de Control por altura y cobertura., por lo tanto, se evalúa el recorrido del cableado de FO.

Pendiente solicitar y/o averiguar por los planos de lado tierra para evaluar rutas de comunicación.


III. REGISTRO FOTOGRAFICO DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SISTEMA PERIMETRAL

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25



Propuesta Rack nuevo para el Server y Ups en el cuarto de rack frente a CCTV – imagen 2. Propuesta Rack y equipos.

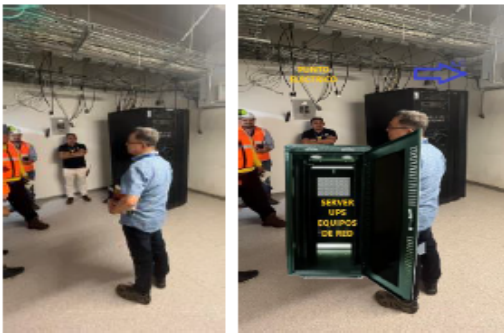

Propuesta de instalar Monitor 55” en muro del costado del CCTV, para visualización los eventos, alarmas



Inspección – Infraestructura desde Cuarto de rack a torre de control del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En color amarillo futuro recorrido de la fibra óptica





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE COMISIÓN

Clave: ESTR-3. 0-12-005

Versión: 5

Fecha de aprobación: 01/04/2022


6102.25




 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

Recorrido perímetro, punto 1, cabecera 2.3

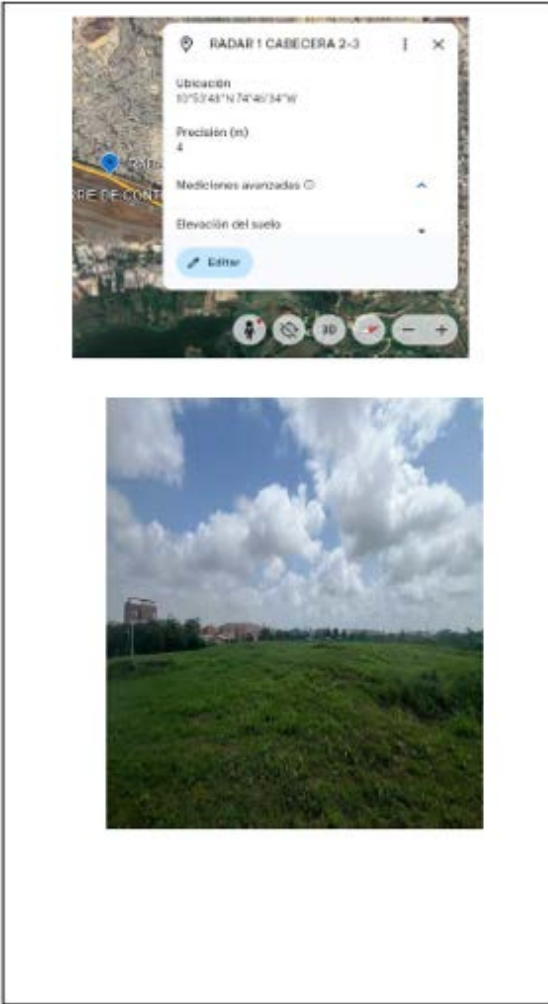

Recorrido perímetro, punto 2,

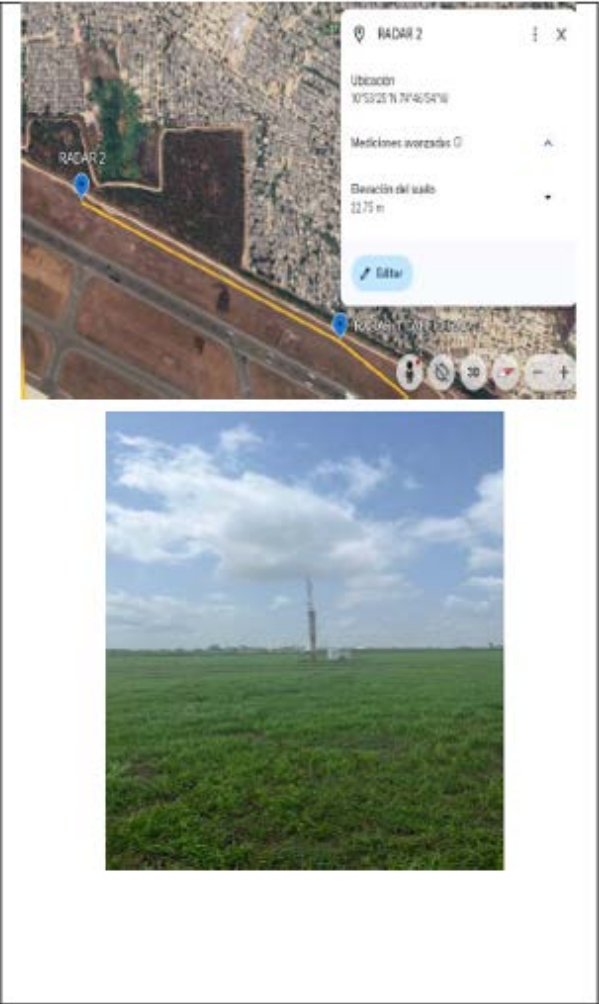


 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

Punto 3 Perímetro Central

Punto 4 Perímetro

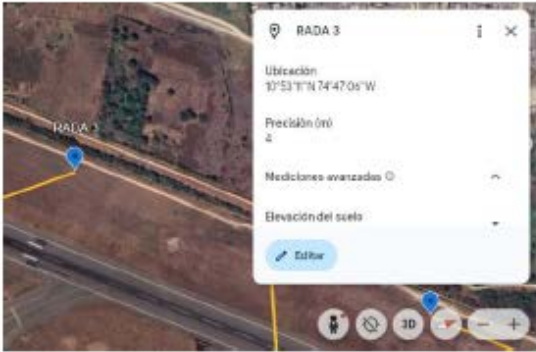








AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME DE COMISIÓN


Clave: ESTR-3. 0-12-005

Versión: 5

Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

PUNTO 5 - TORRE DE CONTROL

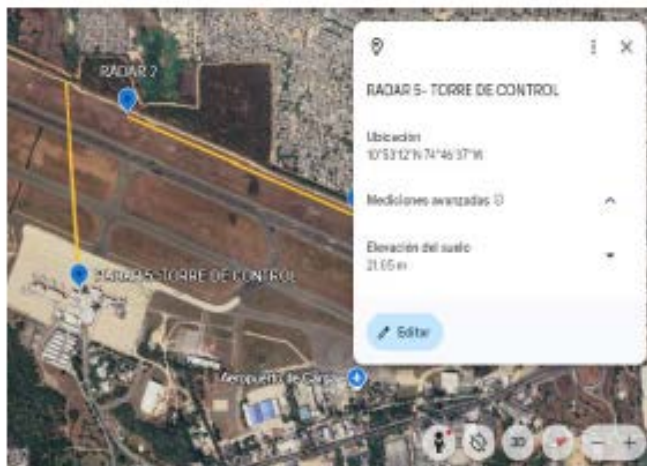

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SEGURIDAD No. 24001294 - H3

Se realiza seguimiento y verificación de las actividades que contempla el formato 8 de Especificaciones Técnicas del contrato en mención, donde se analizan cada uno de los subsistemas que tienen integrado este contrato, como lo son:



- **SISTEMA DE CCTV:**

Se verifica la instalación y operatividad de las 24 cámaras (20 minidomos y 4 PTZ) conforme al documento contractual, garantizando la cobertura requerida para reforzar la seguridad del aeropuerto. El sistema de grabación opera bajo detección de movimiento, almacenando datos por un período de 90 días para todas las cámaras. Adicionalmente, se revisan los protocolos de mantenimiento preventivo ejecutados durante las rondas técnicas realizadas hasta la fecha, confirmando su cumplimiento y registros.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25



- **MÁQUINAS DE RX Y ARCOS DETECTORES DE METALES:**

Se examinan las Hojas de Vida (H.V.) de los equipos y los protocolos de mantenimiento aplicados en las rondas efectuadas durante el contrato. Se formulan observaciones técnicas respecto al sistema de baterías de las UPS que alimentan

tanto las máquinas de RX como los arcos detectores, con el fin de asegurar su continuidad operativa. Asimismo, se comprueba la última intervención correctiva ejecutada, específicamente el cambio de la banda transportadora de la máquina del BHS (Sistema de Manipulación de Equipajes).



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25

- **FILTROS DE SEGURIDAD:**

Durante el recorrido por los puntos de control, se valida la correcta carnetización del personal de seguridad, la adecuada portación de uniformes y dotación reglamentaria, así como la aplicación estricta de los protocolos establecidos en cada puesto de vigilancia.

- **INSPECCIÓN PERIMETRAL DE PISTA:**

En el área de pista, se verifica la instalación y estado de las casetas ubicadas en la zona perimetral, junto con los baños portátiles complementarios asignados a cada caseta, asegurando que cumplan con las condiciones necesarias para su operación.



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	INFORME DE COMISIÓN		
	Clave: ESTR-3. 0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

6102.25



V. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Barranquilla, al día 15 del mes de agosto año 2025.

Nombre completo	Cargo	Firma
HECTOR IVÁN BEDOYA DÍAZ	ESPECIALISTA AERONÁUTICO.	
