



Bodega 1

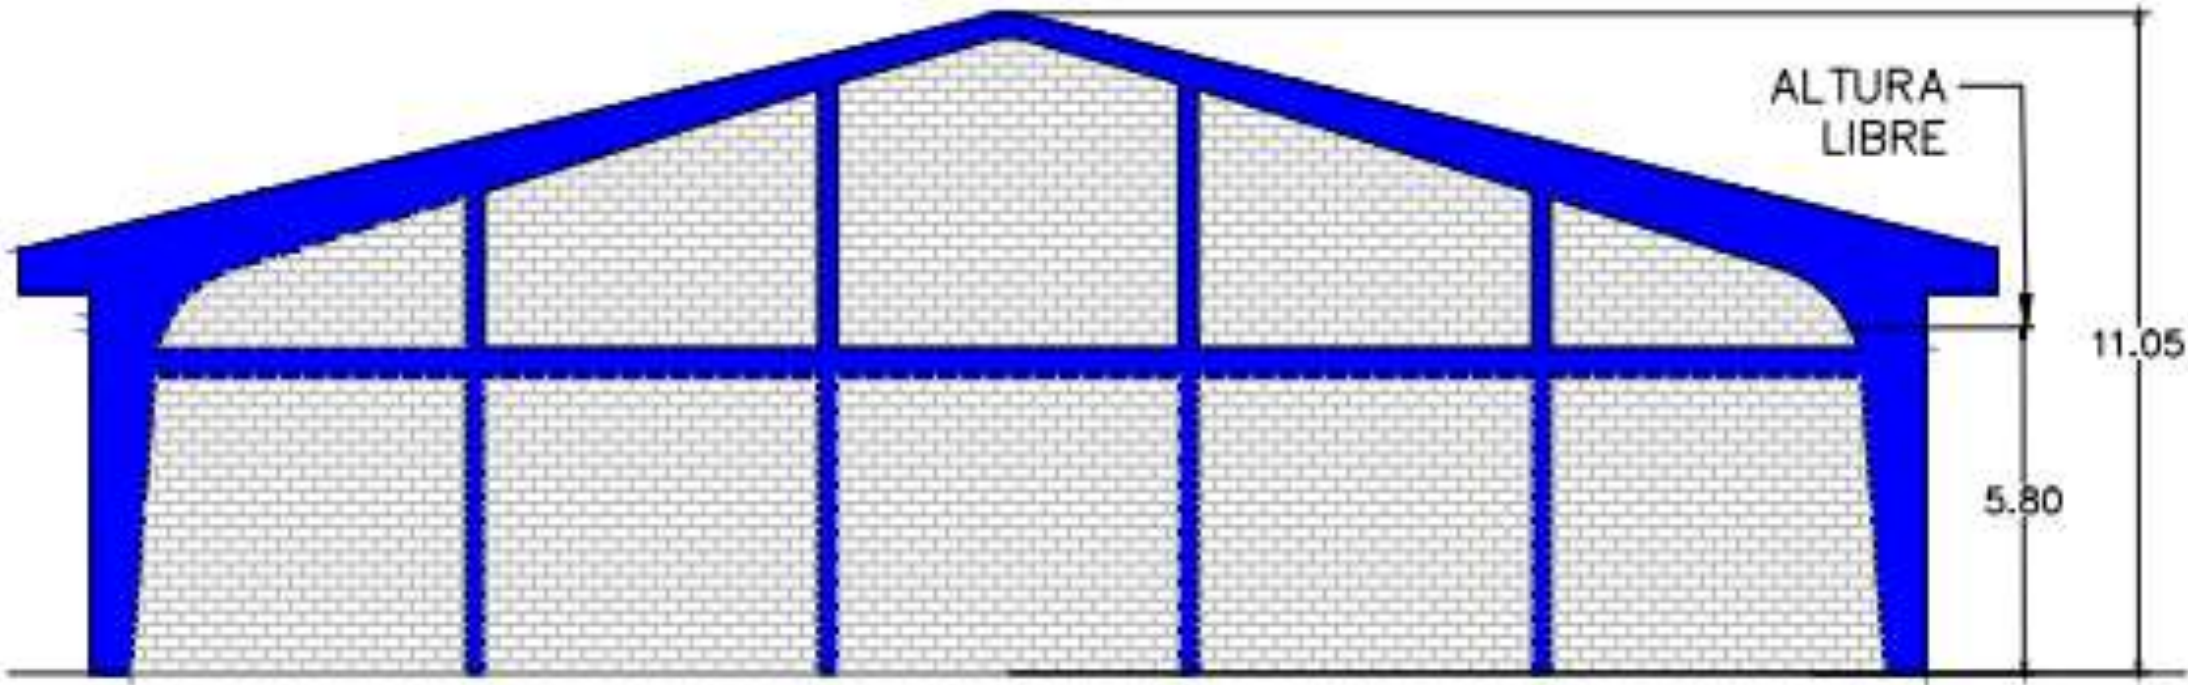

Bodega 1 Modulo 1

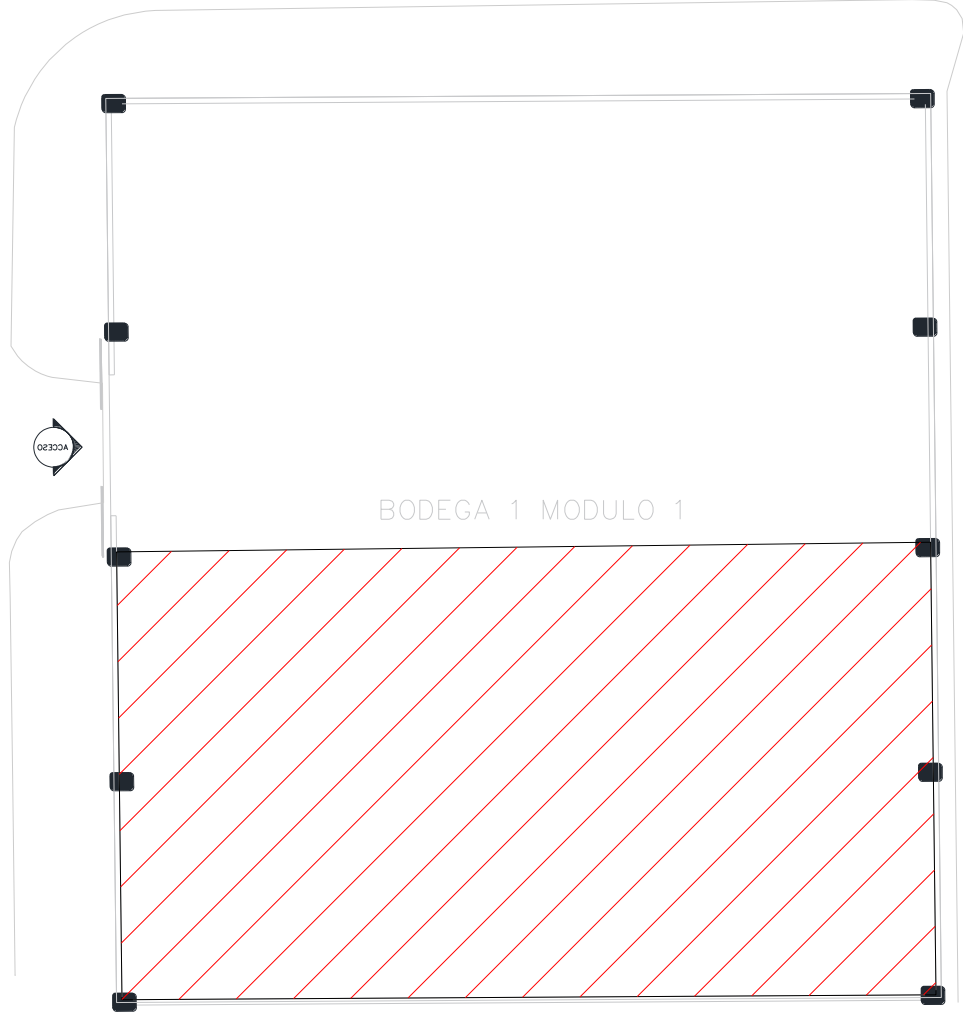

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 1	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	1035	0
MINCIT	Bodega 1	1	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	88	20
MINCIT	Bodega 1	1	Viga	Viga de concreto	ml	1035	0
MINCIT	Bodega 1	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	675	0
MINCIT	Bodega 1	1	Cubierta	caballetes Eternit	und	28	0
MINCIT	Bodega 1	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega cuenta con el 50% concreto y 50% terreno natural	m2	1.000	503
MINCIT	Bodega 1	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	678	12
MINCIT	Bodega 1	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 1	1	Oficina	No cuenta con oficina	no		

Bodega 1 Modulo 1
Registro Fotográfico.




Bodega 1 Modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega 1 Modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega 1 modulo 2

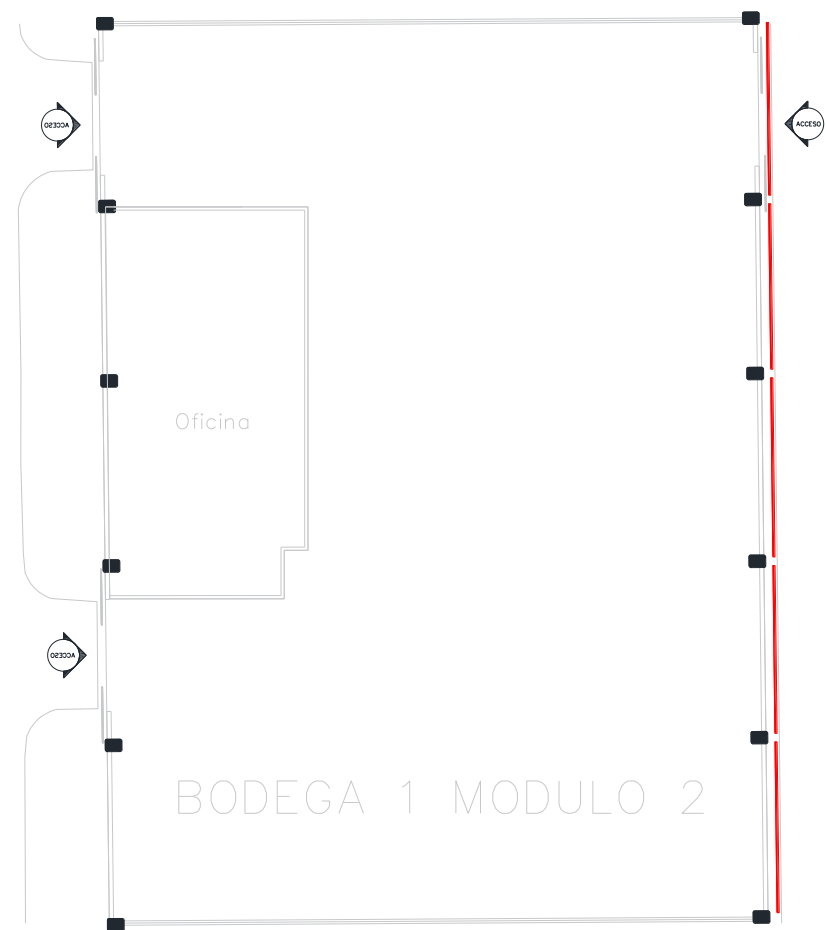

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 1	2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	142	0
MINCIT	Bodega 1	2	Columna	Columnas en concreto	Und	24	0
MINCIT	Bodega 1	2	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	110	6
MINCIT	Bodega 1	2	Viga	Viga de concreto	ml	340	0
MINCIT	Bodega 1	2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	844	0
MINCIT	Bodega 1	2	Cubierta	caballetes Eternit	und	58	0
MINCIT	Bodega 1	2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.250	0
MINCIT	Bodega 1	2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	748	0
MINCIT	Bodega 1	2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	4	4
MINCIT	Bodega 1	2	Oficina		si		

Bodega 1 modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega 1 modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega 1 modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega 1 modulo 3



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 1	3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes	ml	110	0
MINCIT	Bodega 1	3	Columna	Columnas en concreto	Und	17	0
MINCIT	Bodega 1	3	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	66	0
MINCIT	Bodega 1	3	Viga	Viga de concreto	ml	242	0
MINCIT	Bodega 1	3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	507	0
MINCIT	Bodega 1	3	Cubierta	caballetes Eternit	und	29	0
MINCIT	Bodega 1	3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	750	0
MINCIT	Bodega 1	3	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad,	m2	634	0
MINCIT	Bodega 1	3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 1	3	Oficina		no		

Bodega 1 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 1 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 1 modulo 3
Registro Fotográfico.




Bodega 1 modulo 4



Nota: No se pudo visitar por estar cerrada

Bodega 2

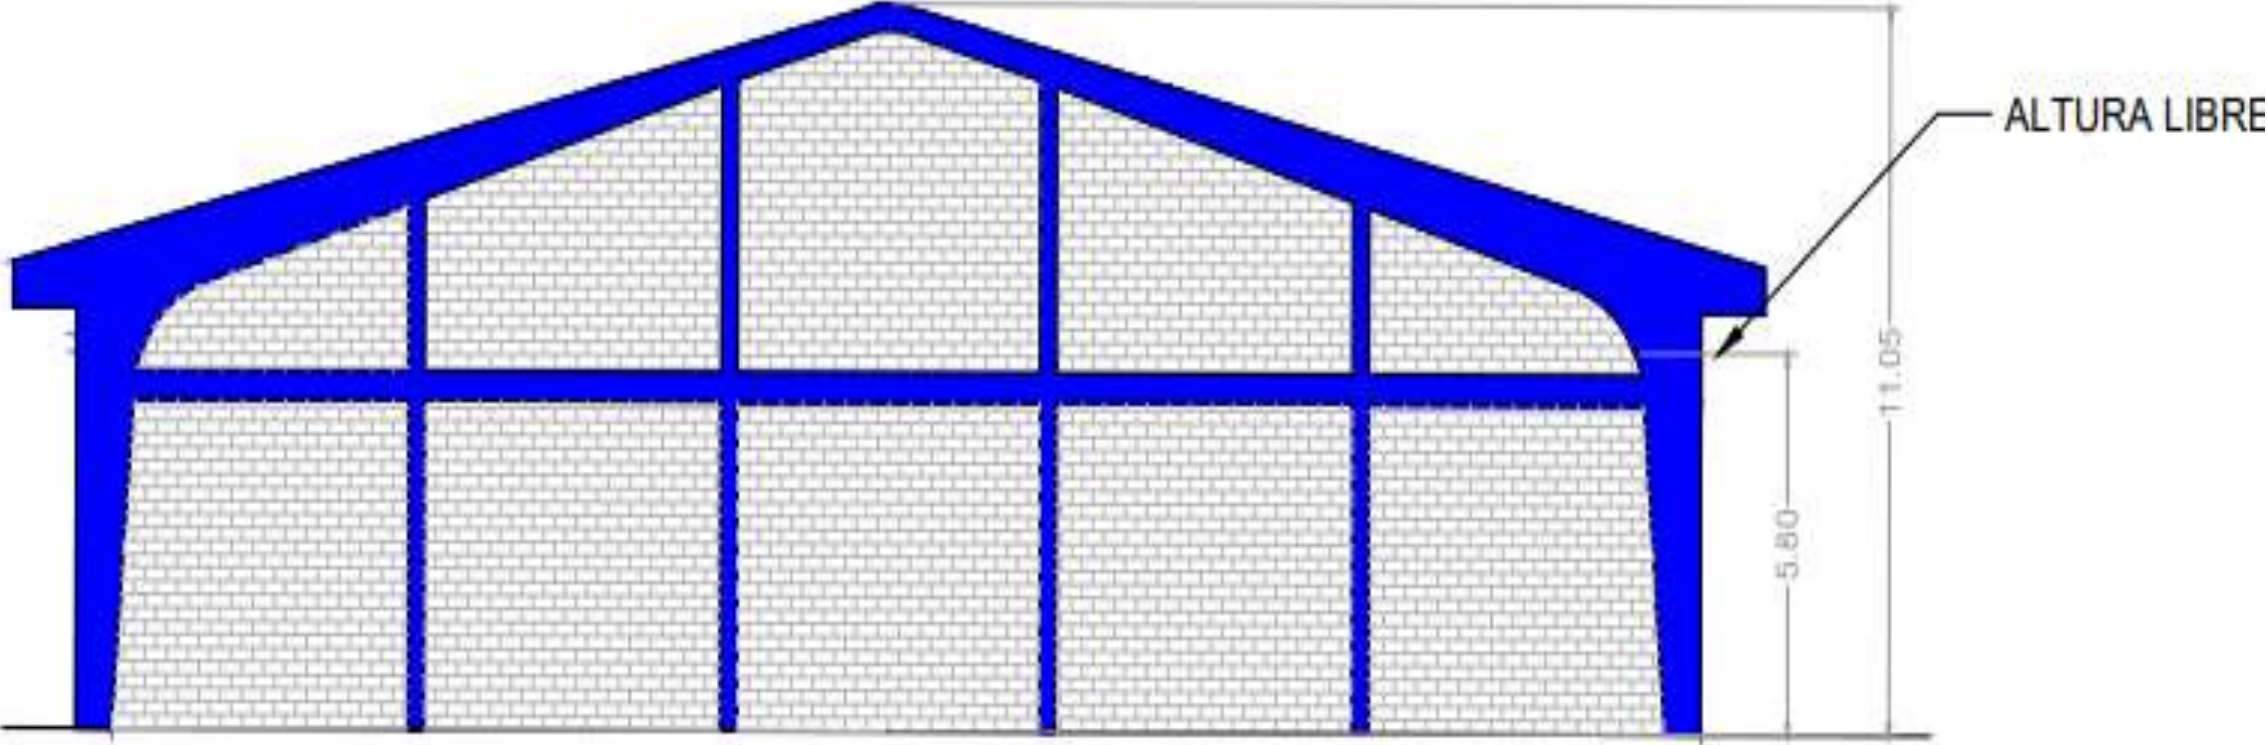


Bodega 2 modulo 1



Nota: No se pudo visitar por estar cerrada

Bodega 2 modulo 2

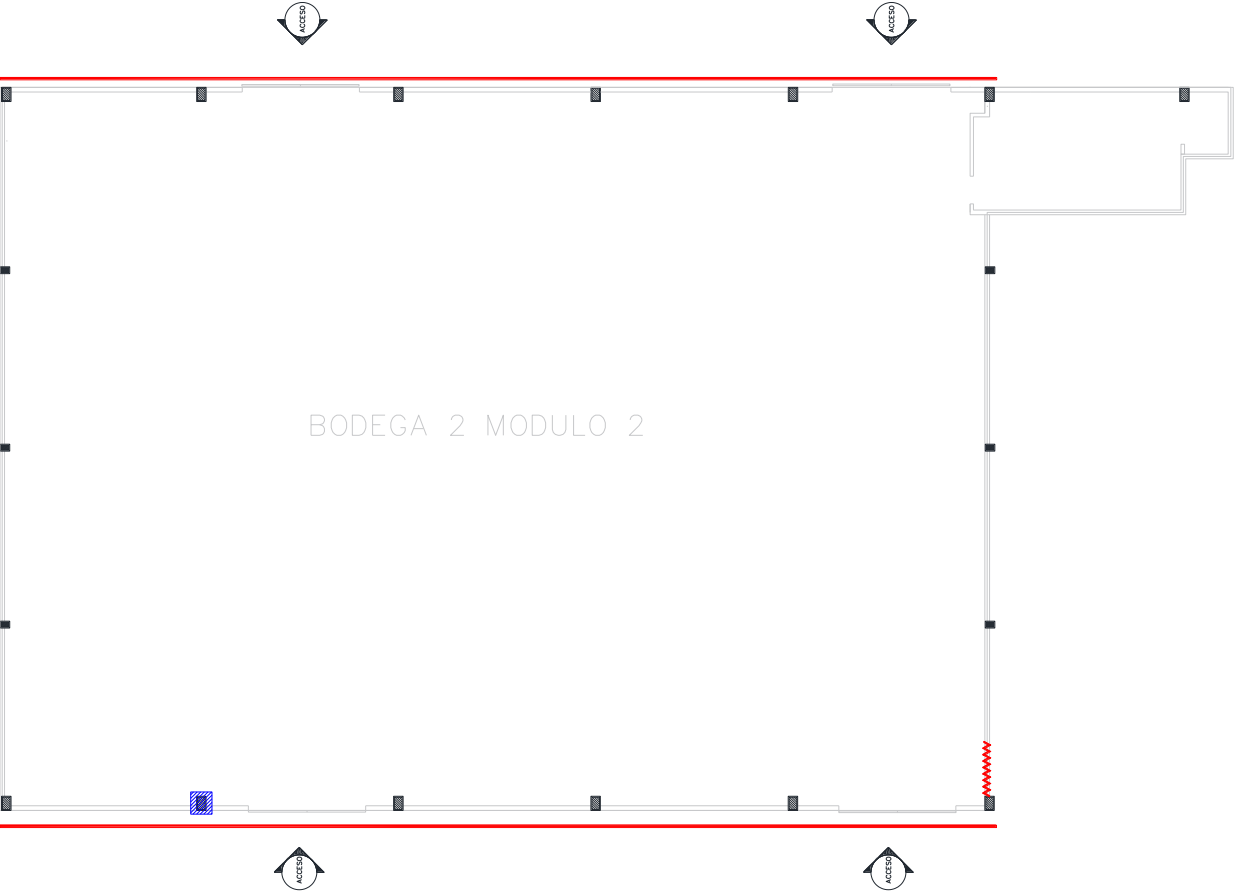

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 2	2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes	ml	165	0
MINCIT	Bodega 2	2	Columna	Columnas en concreto	Und	15	1
MINCIT	Bodega 2	2	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	110	43
MINCIT	Bodega 2	2	Viga	Viga de concreto	ml	270	0
MINCIT	Bodega 2	2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	507	4
MINCIT	Bodega 2	2	Cubierta	caballetes Eternit	und	21	0
MINCIT	Bodega 2	2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.260	40
MINCIT	Bodega 2	2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad,	m2	760	28
MINCIT	Bodega 2	2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	4	4
MINCIT	Bodega 2	2	Oficina		no		


Bodega 2 modulo 2
Registro Fotográfico.




Bodega 2 modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega 2 modulo 2
Registro Fotográfico.

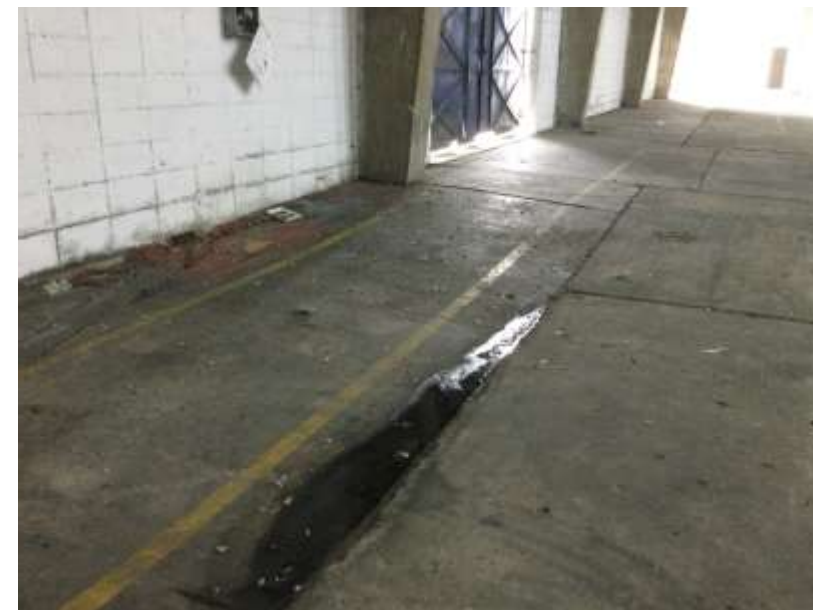

Bodega 2 modulo 3

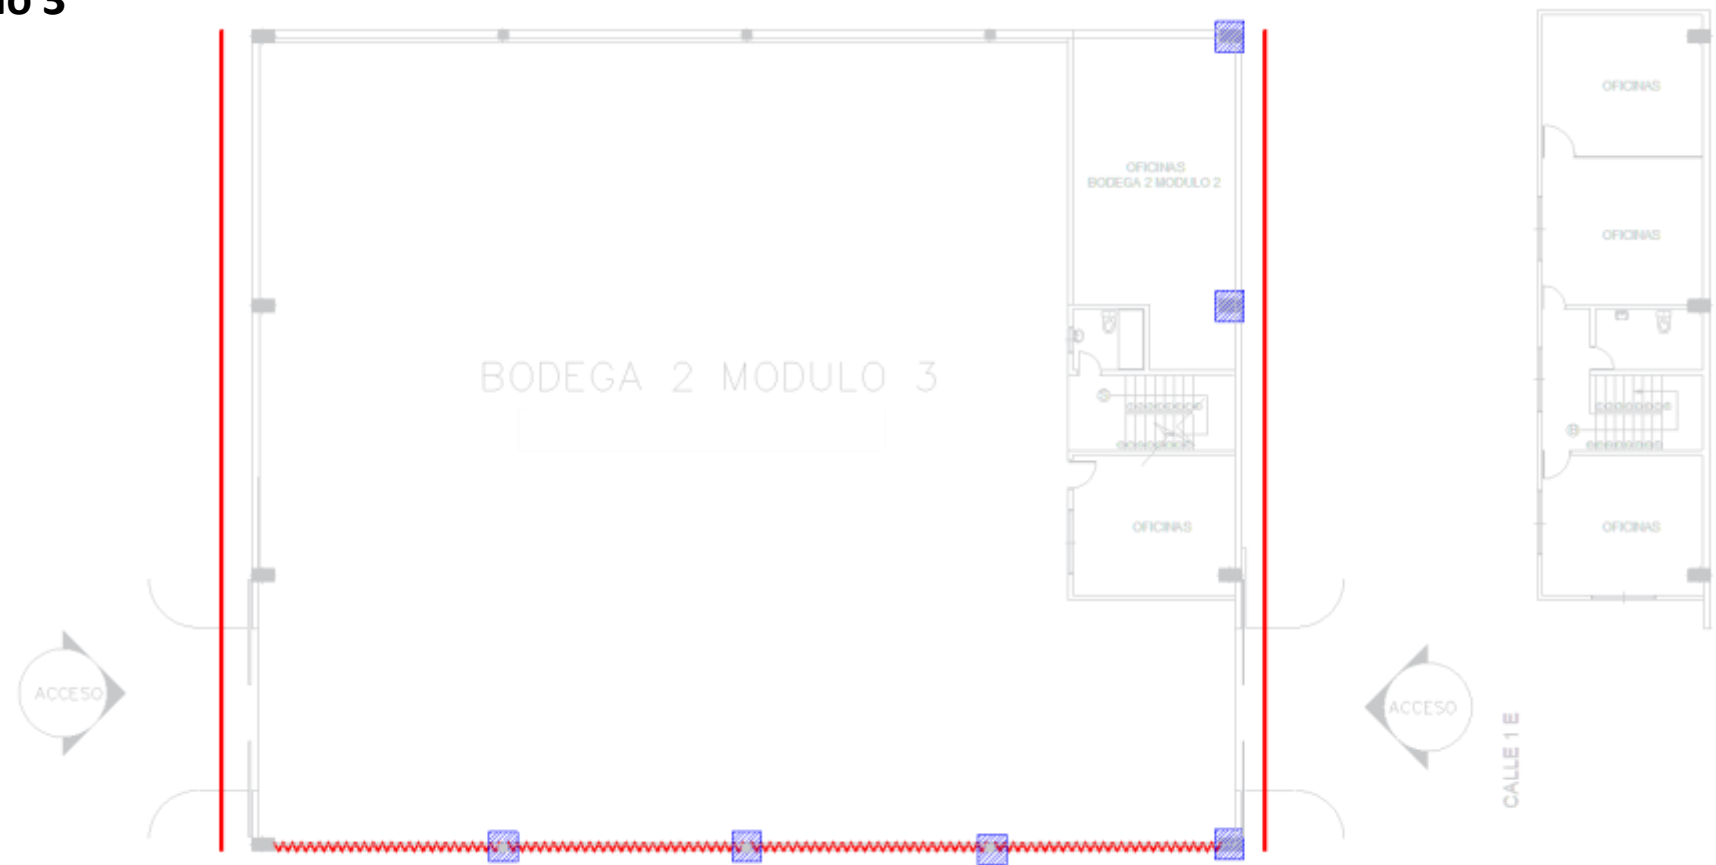

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 2	3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes	ml	110	0
MINCIT	Bodega 2	3	Columna	Columnas en concreto	Und	14	7
MINCIT	Bodega 2	3	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	66	6
MINCIT	Bodega 2	3	Viga	Viga de concreto	ml	240	0
MINCIT	Bodega 2	3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	476	0
MINCIT	Bodega 2	3	Cubierta	caballetes Eternit	und	18	0
MINCIT	Bodega 2	3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	664	0
MINCIT	Bodega 2	3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	638	113
MINCIT	Bodega 2	3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 2	3	Oficina		si		

Bodega 2 modulo 3
Registro Fotográfico.




Bodega 2 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 2 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 2 modulo 4

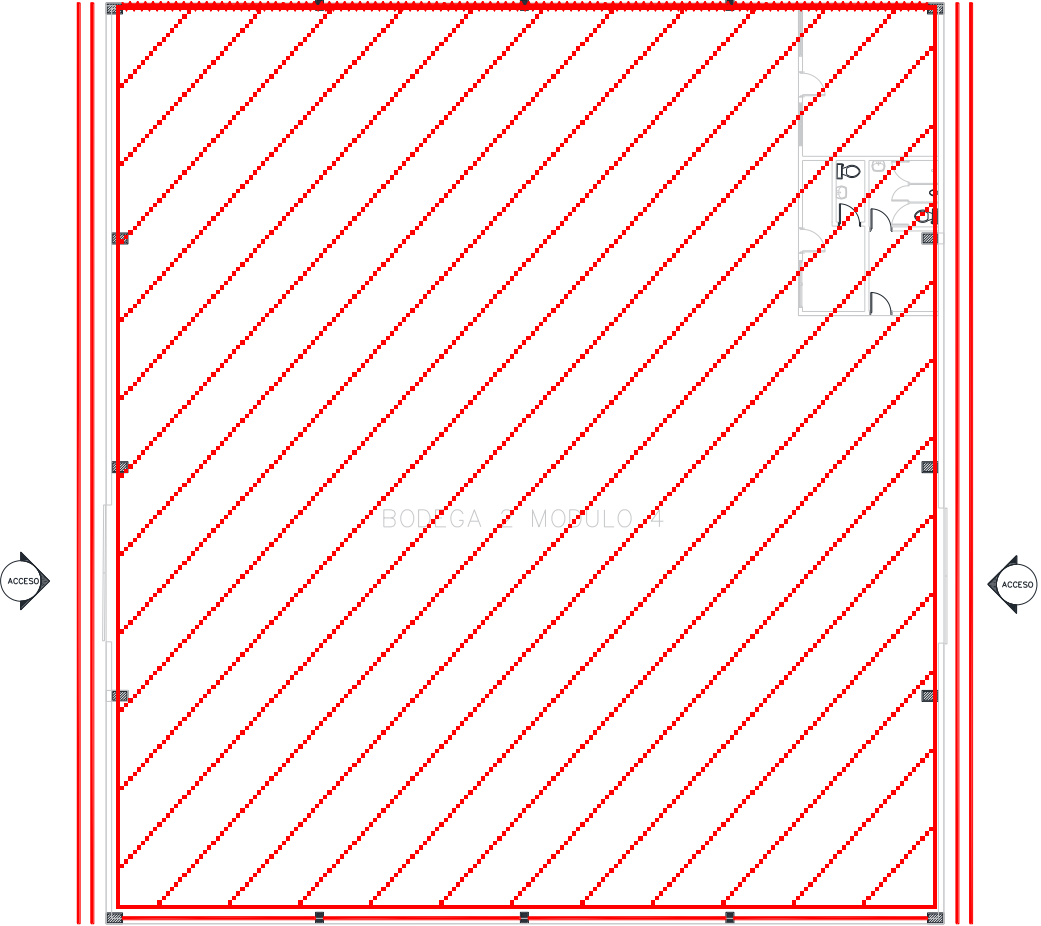

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 2	4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes	ml	126	0
MINCIT	Bodega 2	4	Columna	Columnas en concreto	Und	16	0
MINCIT	Bodega 2	4	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	88	16
MINCIT	Bodega 2	4	Viga	Viga de concreto	ml	300	37
MINCIT	Bodega 2	4	Cubierta	Eternit Ondulada	und	675	0
MINCIT	Bodega 2	4	Cubierta	caballetes Eternit	und	36	0
MINCIT	Bodega 2	4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	947	947
MINCIT	Bodega 2	4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	742	222
MINCIT	Bodega 2	4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 2	4	Oficina		si		

Bodega 2 modulo 4
Registro Fotográfico.




Bodega 2 modulo 4
Registro Fotográfico.




Bodega 2 modulo 4
Registro Fotográfico.



Bodega 3

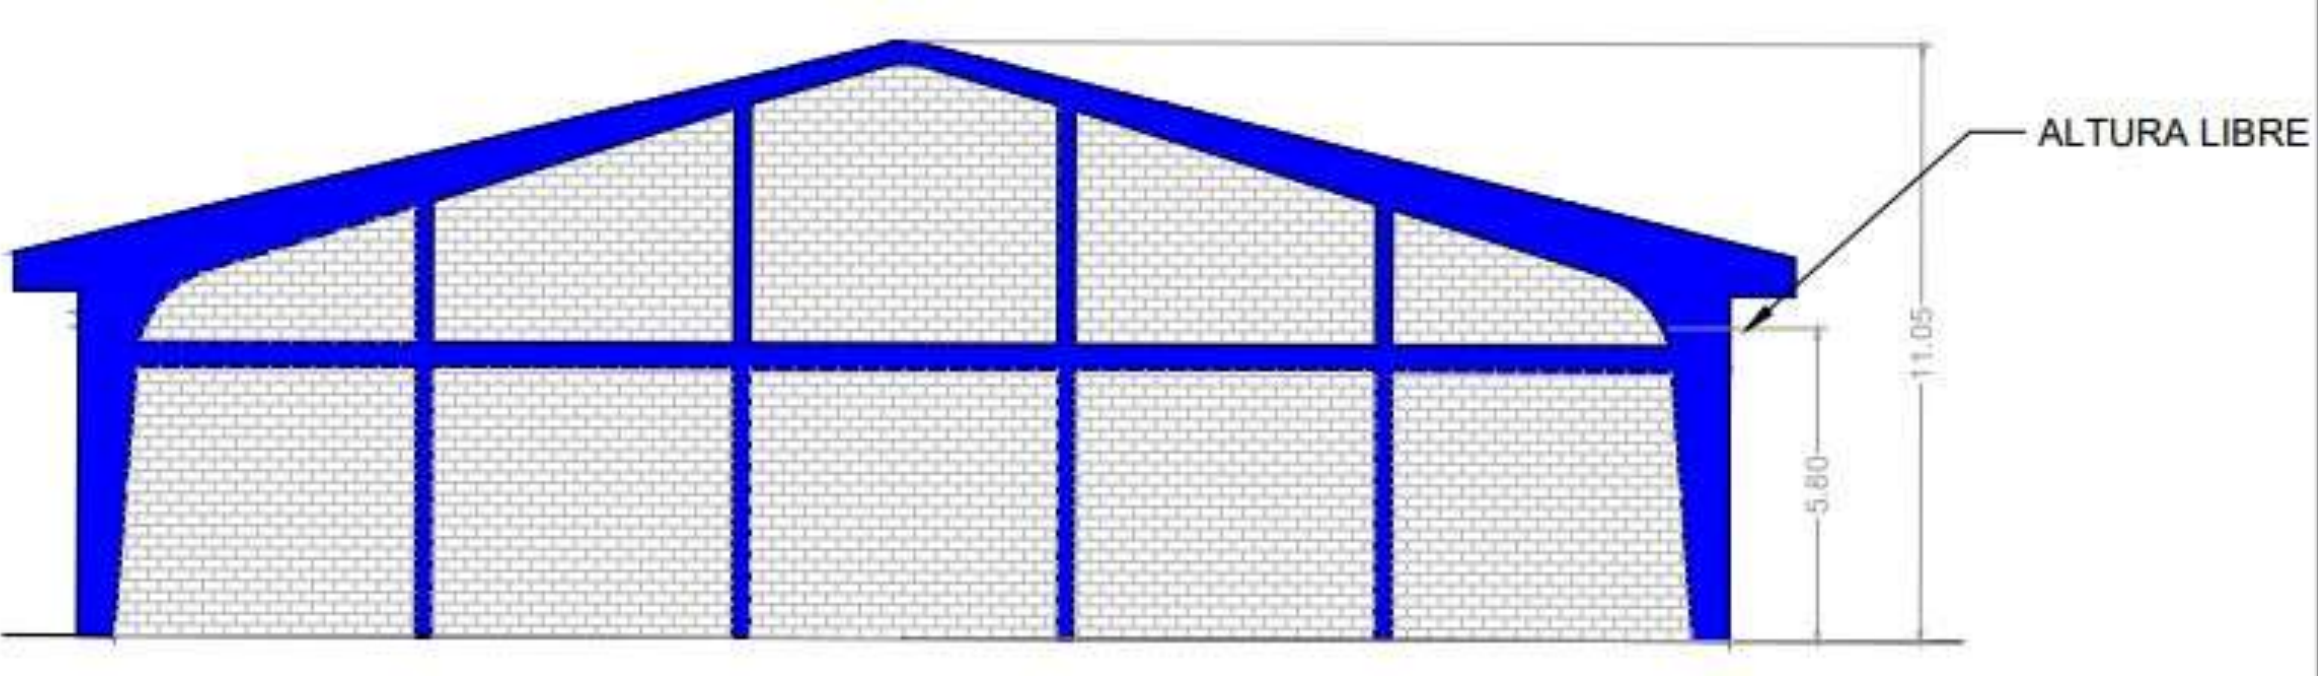

Bodega 3 modulo 1

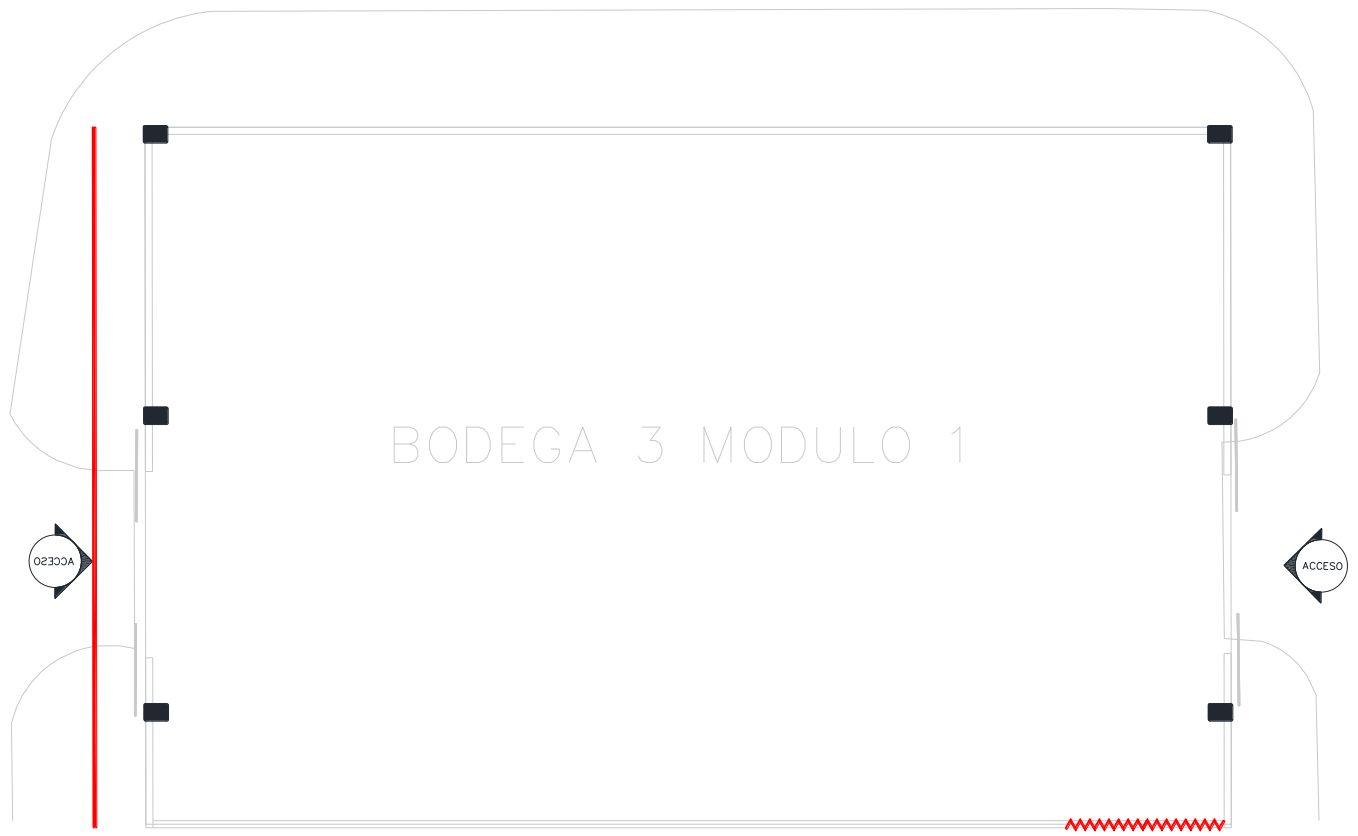

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 3	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	99,34	0
MINCIT	Bodega 3	1	Columna	Columnas en concreto	Und	13	0
MINCIT	Bodega 3	1	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	55	5
MINCIT	Bodega 3	1	Viga	Víga de concreto	ml	197	0
MINCIT	Bodega 3	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	405	0
MINCIT	Bodega 3	1	Cubierta	caballetes Eternit	und	18	0
MINCIT	Bodega 3	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	600	0
MINCIT	Bodega 3	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.		630	24
MINCIT	Bodega 3	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 3	1	Oficina		SI		



Bodega 3 modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 1
Registro Fotográfico.

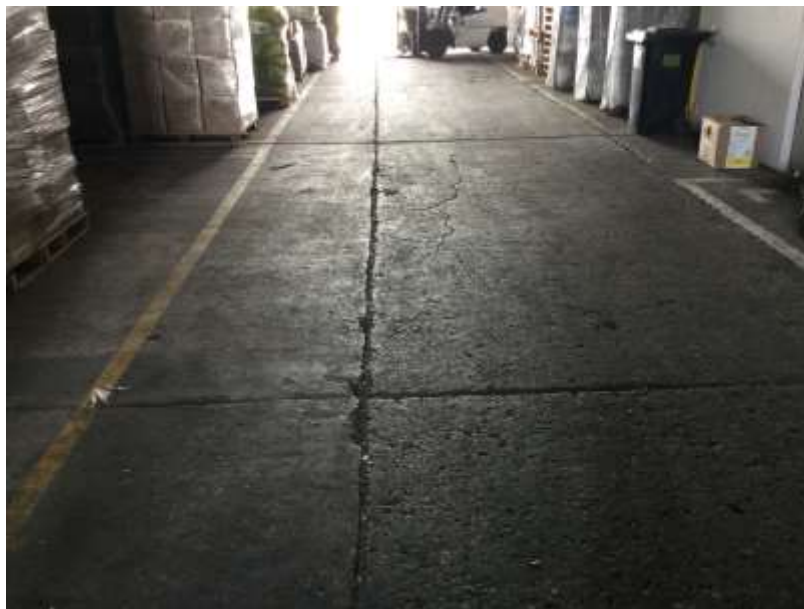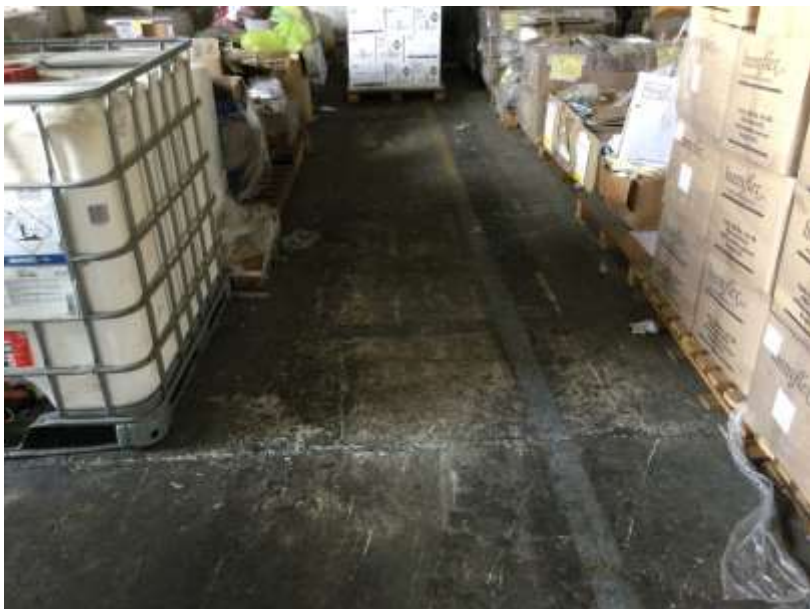

Bodega 3 modulo 2



Convenciones


-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 3	2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	100	0
MINCIT	Bodega 3	2	Columna	Columnas en concreto	Und	13	0
MINCIT	Bodega 3	2	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	55	6
MINCIT	Bodega 3	2	Viga	Viga de concreto	ml	197	0
MINCIT	Bodega 3	2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	405	0
MINCIT	Bodega 3	2	Cubierta	caballetes Eternit	und	18	0
MINCIT	Bodega 3	2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	660	0
MINCIT	Bodega 3	2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	630	24
MINCIT	Bodega 3	2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 3	2	Oficina		SI		


Bodega 3 modulo 2
Registro Fotográfico.

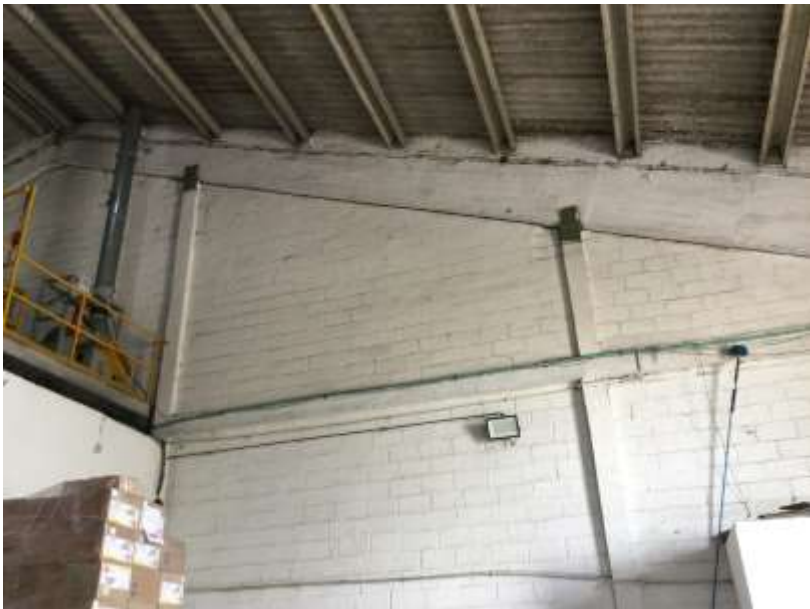


Bodega 3 modulo 2
Registro Fotográfico.

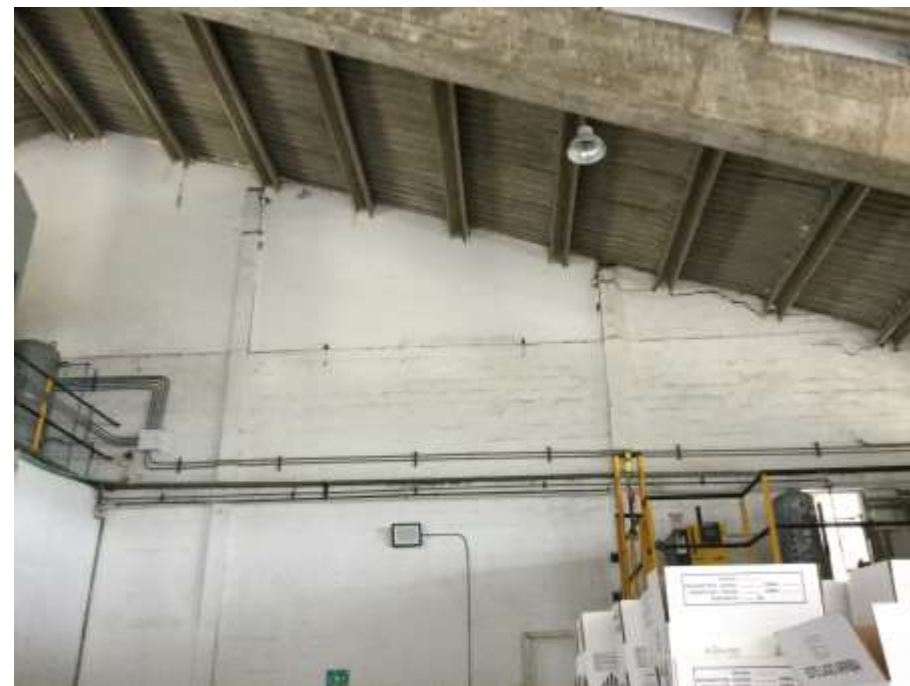

Bodega 3 modulo 2
Registro Fotográfico.

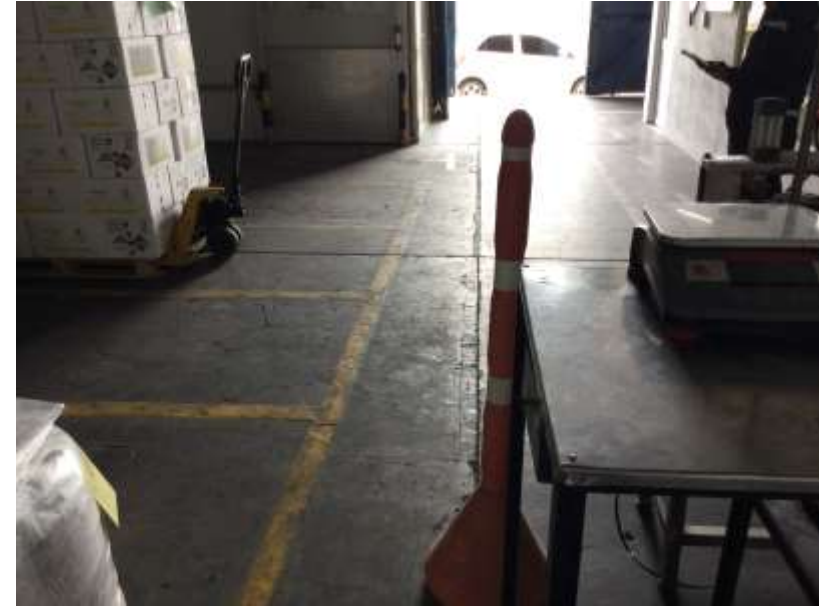

Bodega 3 modulo 3

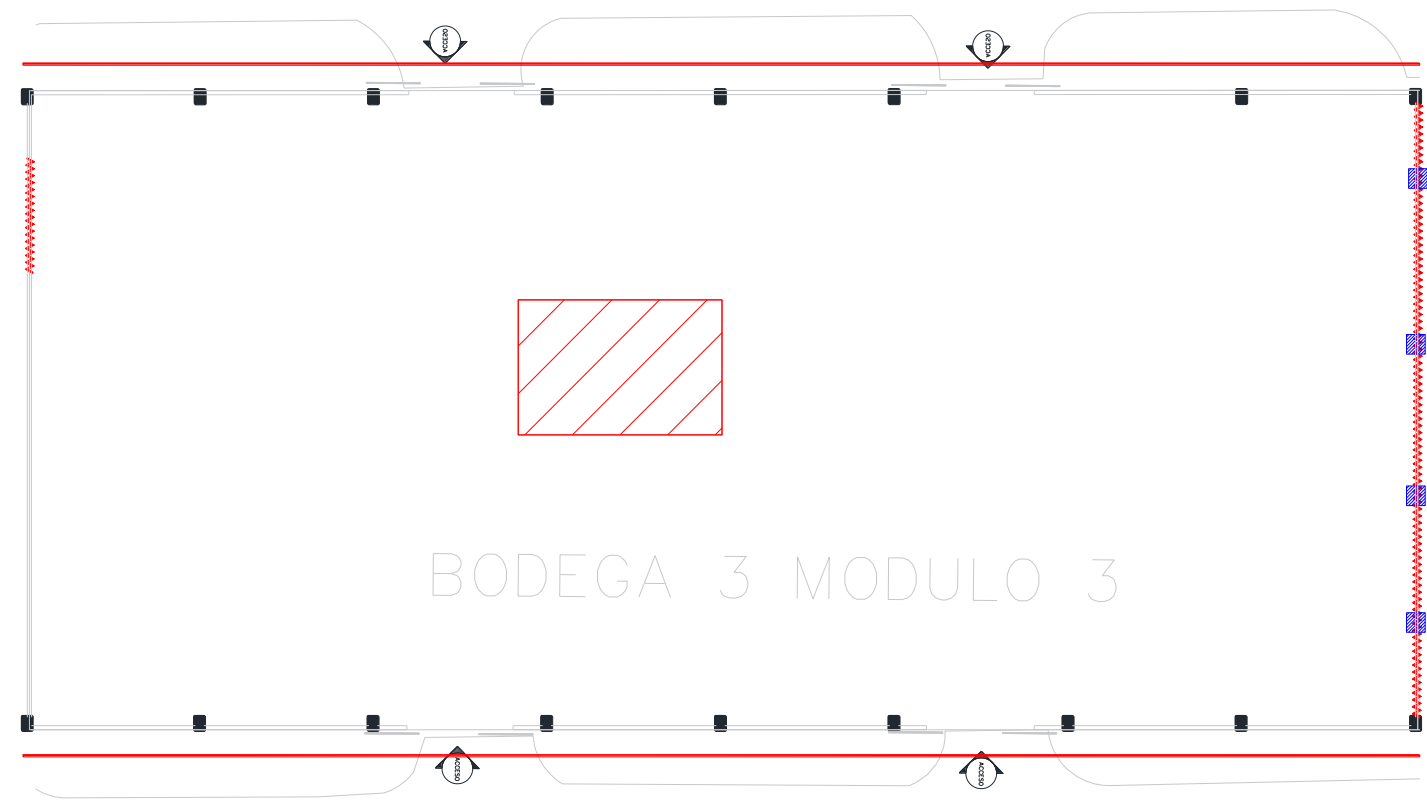


Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bodega 3 modulo 3A

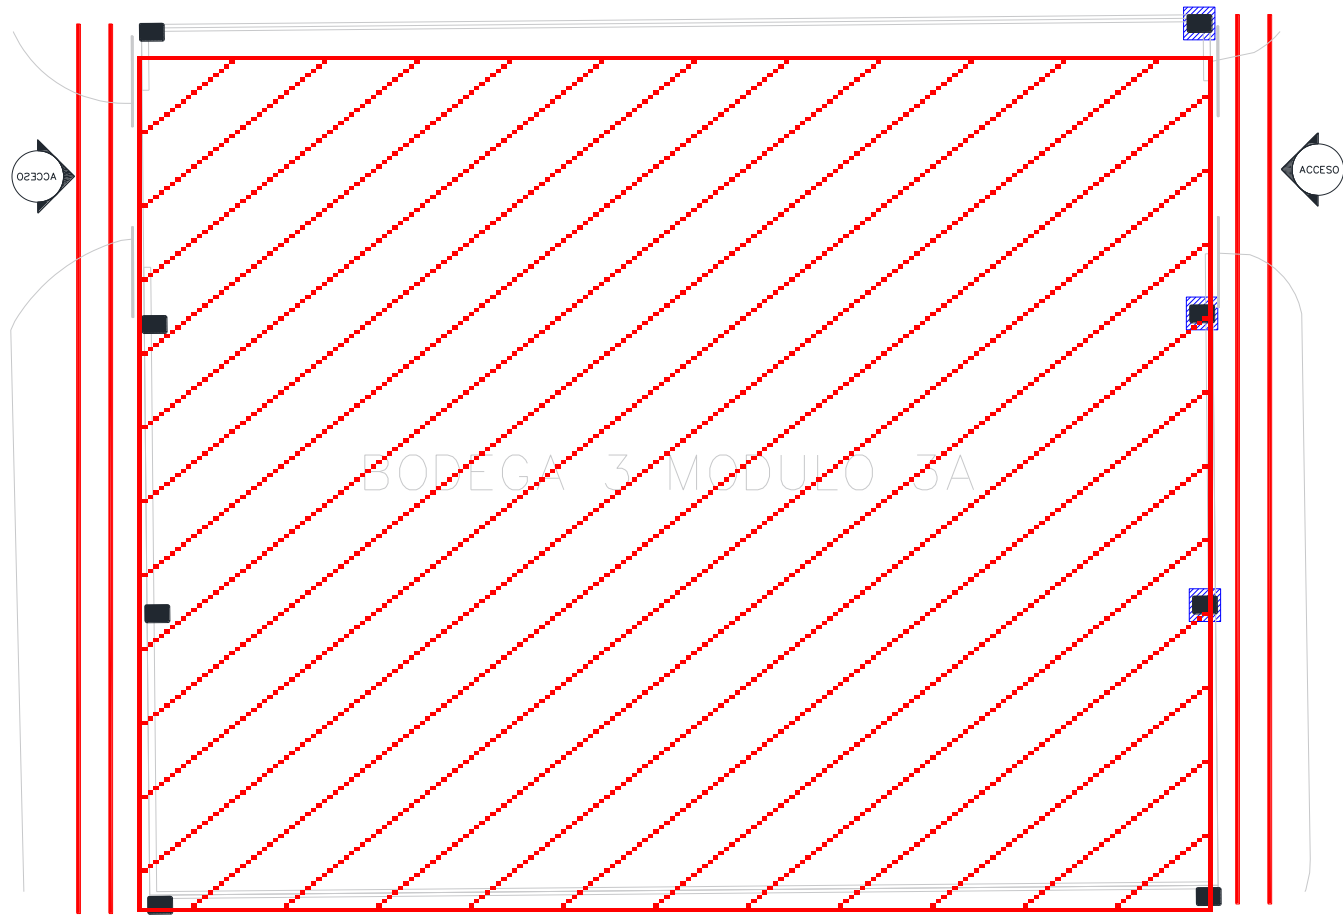

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 3	3A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	111	0
MINCIT	Bodega 3	3A	Columna	Columnas en concreto	Und	14	2
MINCIT	Bodega 3	3A	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	66	3
MINCIT	Bodega 3	3A	Viga	Viga de concreto	ml	192	0
MINCIT	Bodega 3	3A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	507	0
MINCIT	Bodega 3	3A	Cubierta	caballetes Eternit	und	21	0
MINCIT	Bodega 3	3A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	751	751
MINCIT	Bodega 3	3A	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	366	0
MINCIT	Bodega 3	3A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 3	3A	Oficina		no		

Bodega 3 modulo 3A
Registro Fotográfico.




Bodega 3 modulo 3A
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 3A
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 4

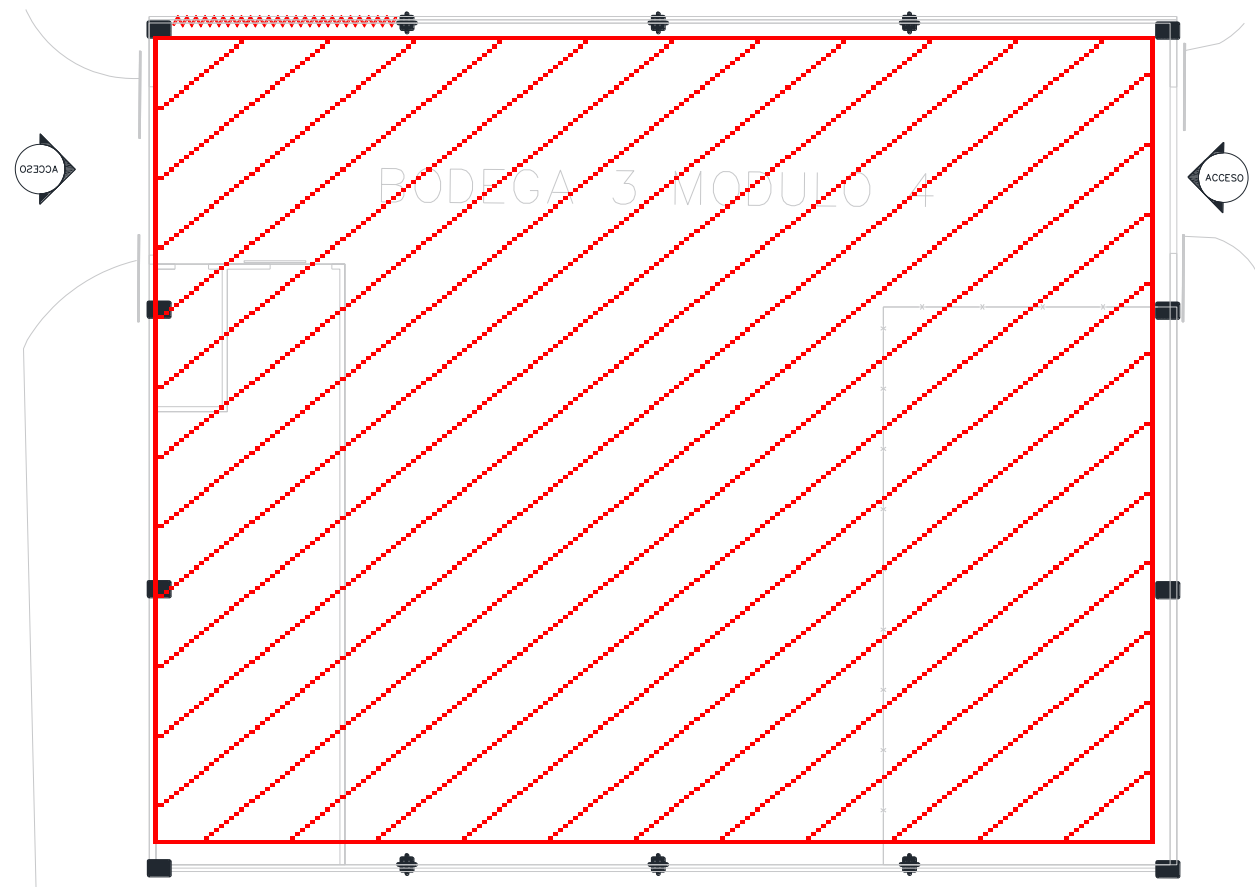

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 3	4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	111	0
MINCIT	Bodega 3	4	Columna	Columnas en concreto	und	14	0
MINCIT	Bodega 3	4	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	und	66	9
MINCIT	Bodega 3	4	Viga	Viga de concreto	ml	192	0
MINCIT	Bodega 3	4	Cubierta	Eternit Ondulada	und	360	0
MINCIT	Bodega 3	4	Cubierta	caballetes Eternit	und	28	0
MINCIT	Bodega 3	4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	661	661
MINCIT	Bodega 3	4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	366	17,6
MINCIT	Bodega 3	4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega 3	4	Oficina		NO		


Bodega 3 modulo 4
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 4
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 4
Registro Fotográfico.

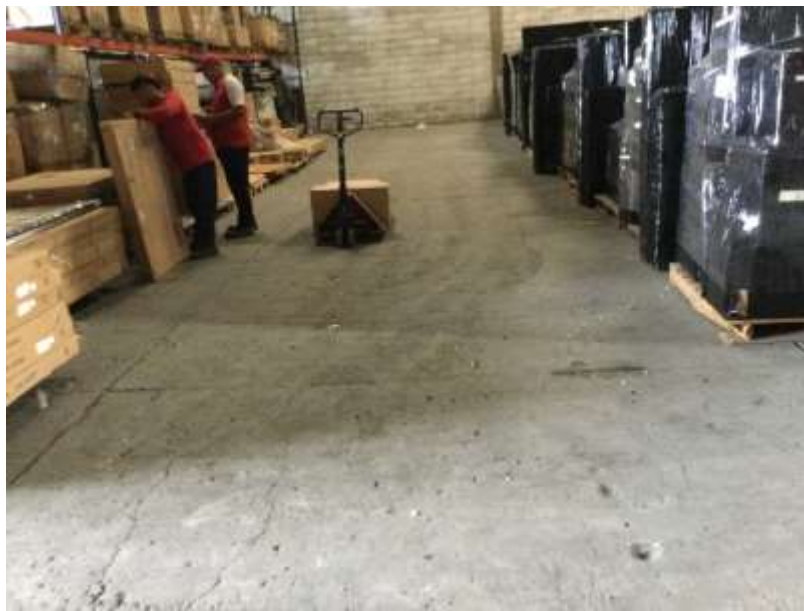

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 3	3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	194	0
MINCIT	Bodega 3	3	Columna	Columnas en concreto	Und	25	4
MINCIT	Bodega 3	3	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	176	20
MINCIT	Bodega 3	3	Viga	Viga de concreto	ml	491	30
MINCIT	Bodega 3	3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1362	0
MINCIT	Bodega 3	3	Cubierta	caballetes Eternit	und	85	0
MINCIT	Bodega 3	3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2.015	64
MINCIT	Bodega 3	3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	622	234
MINCIT	Bodega 3	3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	4	4
MINCIT	Bodega 3	3	Oficina		SI		

Bodega 3 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 3 modulo 5



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/VO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 3	5	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	92	0
MINCIT	Bodega 3	5	Columna	Columnas en concreto	Und	12	0
MINCIT	Bodega 3	5	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	44	0
MINCIT	Bodega 3	5	Viga	Viga de concreto	ml	191	1
MINCIT	Bodega 3	5	Cubierta	Eternit Ondulada	und	337	0
MINCIT	Bodega 3	5	Cubierta	caballetes Eternit	und	18	0
MINCIT	Bodega 3	5	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	476	0
MINCIT	Bodega 3	5	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	554	16
MINCIT	Bodega 3	5	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 3	5	Oficina		SI		

Bodega 3 modulo 5
Registro Fotográfico.




Bodega 3 modulo 5
Registro Fotográfico.




Bodega 3 modulo 5
Registro Fotográfico.



Bodega 4

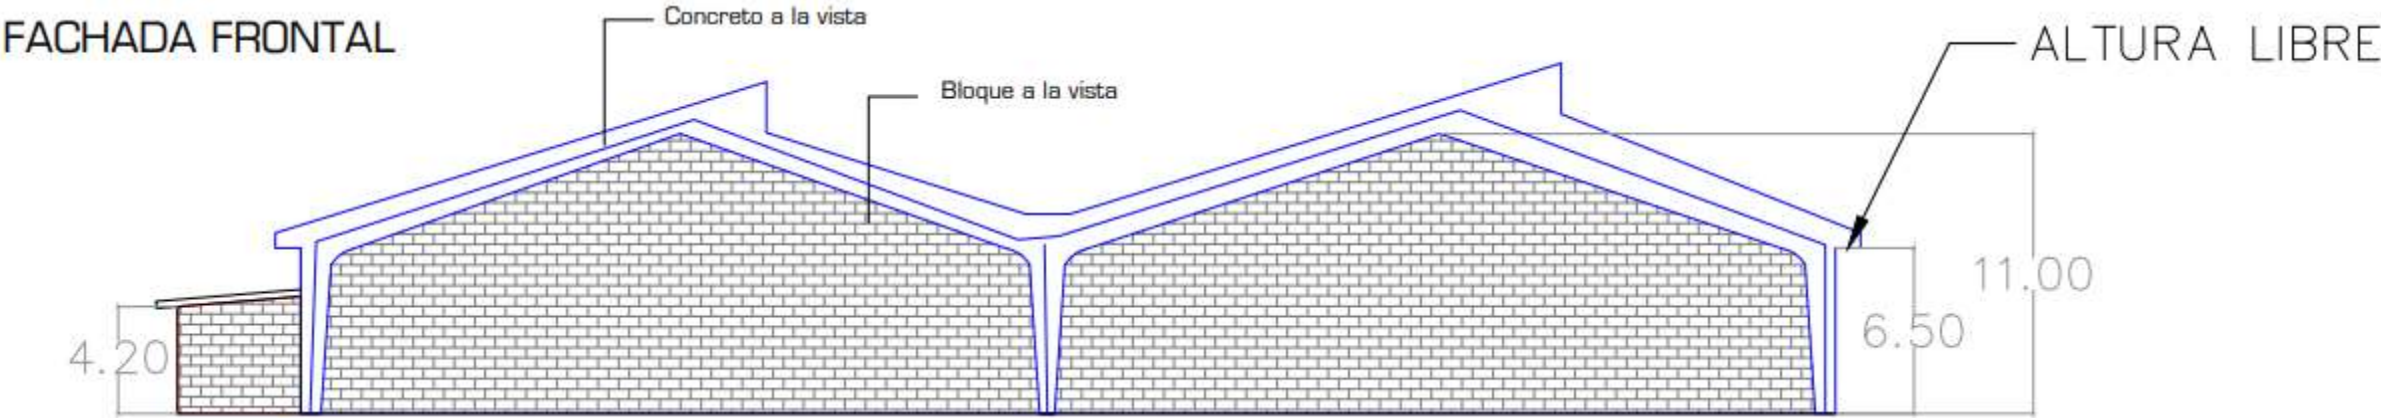

Bodega 4 modulo 1-2-3

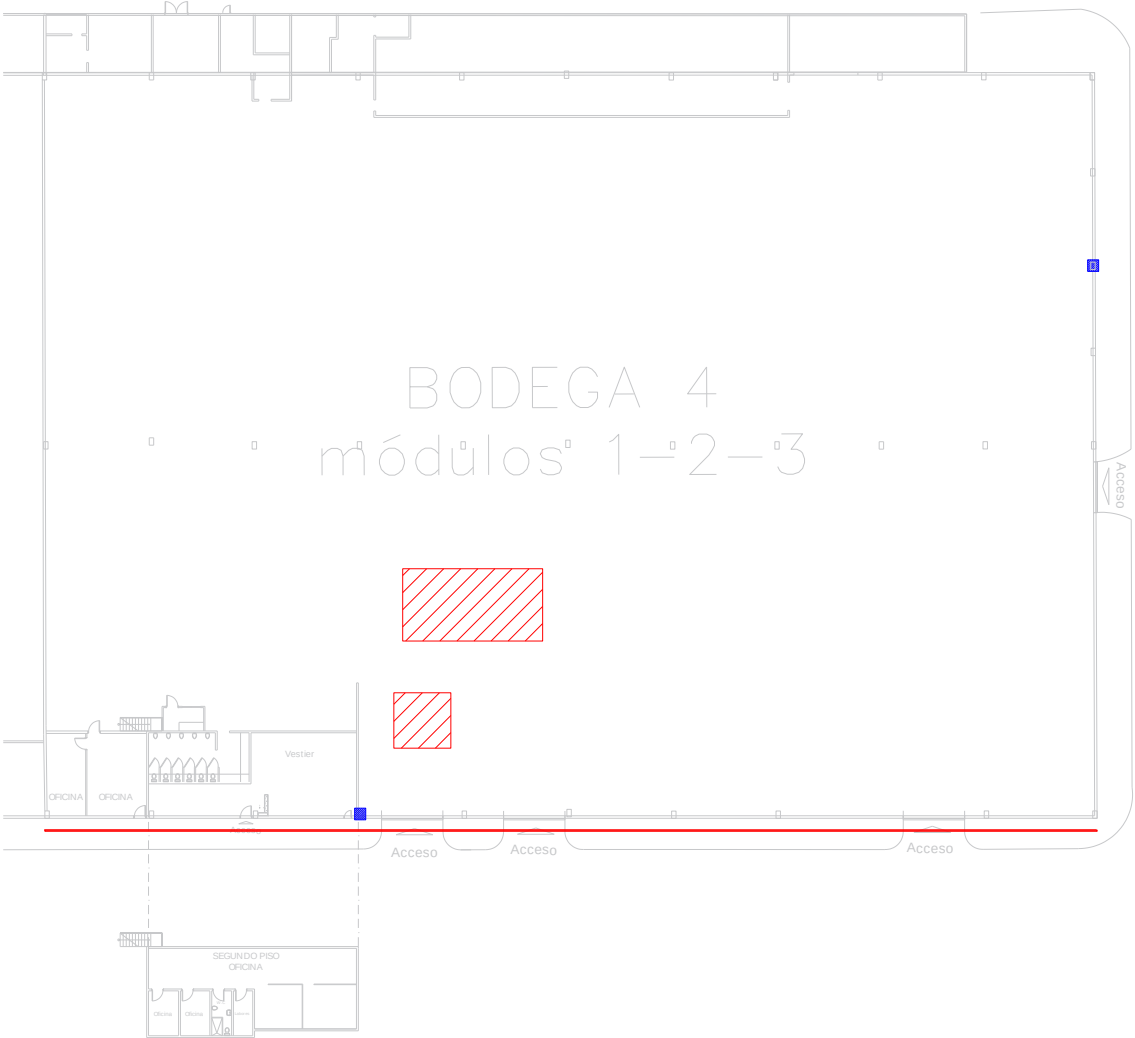

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	250	0
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Columna	Columnas en concreto	Und	50	2
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	420	10
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Viga	Viga de concreto	ml	315	0
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	85	0
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	3723	0
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Cubierta	caballetes Eternit	und	195	0
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	4.568	64
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1834	0
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	4	4
MINCIT	Bodega 4	1 2 3	Oficina		si		

Bodega 4 modulo 1-2-3
Registro Fotográfico.




Bodega 4 modulo 1-2-3
Registro Fotográfico.



Bodega 4 modulo 1-2-3
Registro Fotográfico.



Bodega 4 modulo 4-5

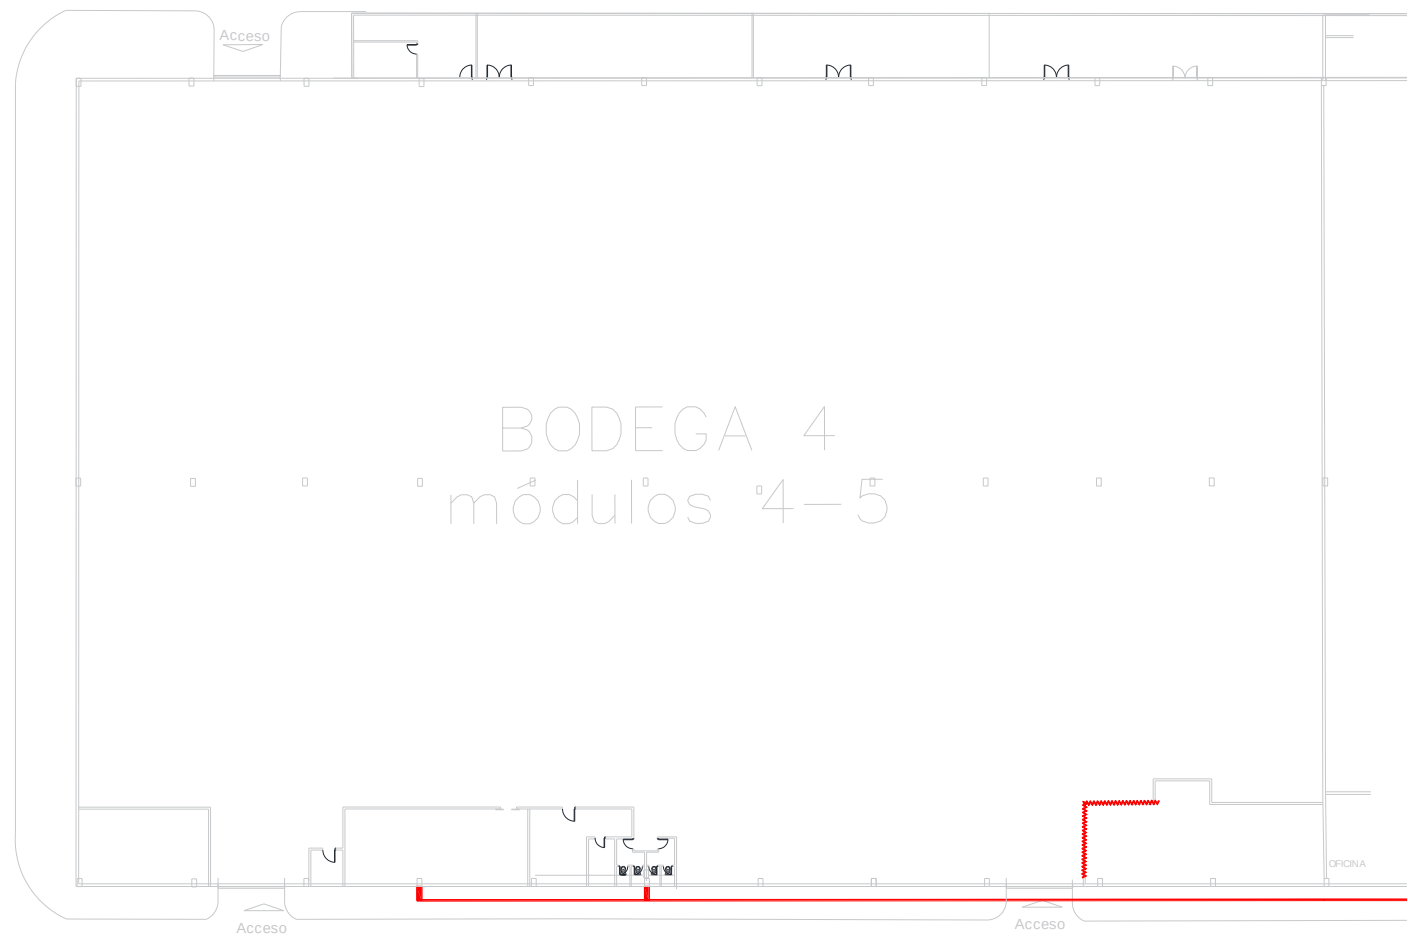

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 4	45	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	290	0
MINCIT	Bodega 4	45	Columna	Columnas en concreto	Und	39	0
MINCIT	Bodega 4	45	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	572	8
MINCIT	Bodega 4	45	Viga	Viga de concreto	ml	1021	7
MINCIT	Bodega 4	45	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	93	0
MINCIT	Bodega 4	45	Cubierta	Eternit Ondulada	und	4142	0
MINCIT	Bodega 4	45	Cubierta	caballetes Eternit	und	214	0
MINCIT	Bodega 4	45	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	5.314	0
MINCIT	Bodega 4	45	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	2100	0
MINCIT	Bodega 4	45	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	3	3
MINCIT	Bodega 4	45	Oficina		SI		

Bodega 4 modulo 4-5
Registro Fotográfico.




Bodega 4 modulo 4-5
Registro Fotográfico.




Bodega 4 modulo 4-5
Registro Fotográfico.



Bodega 5

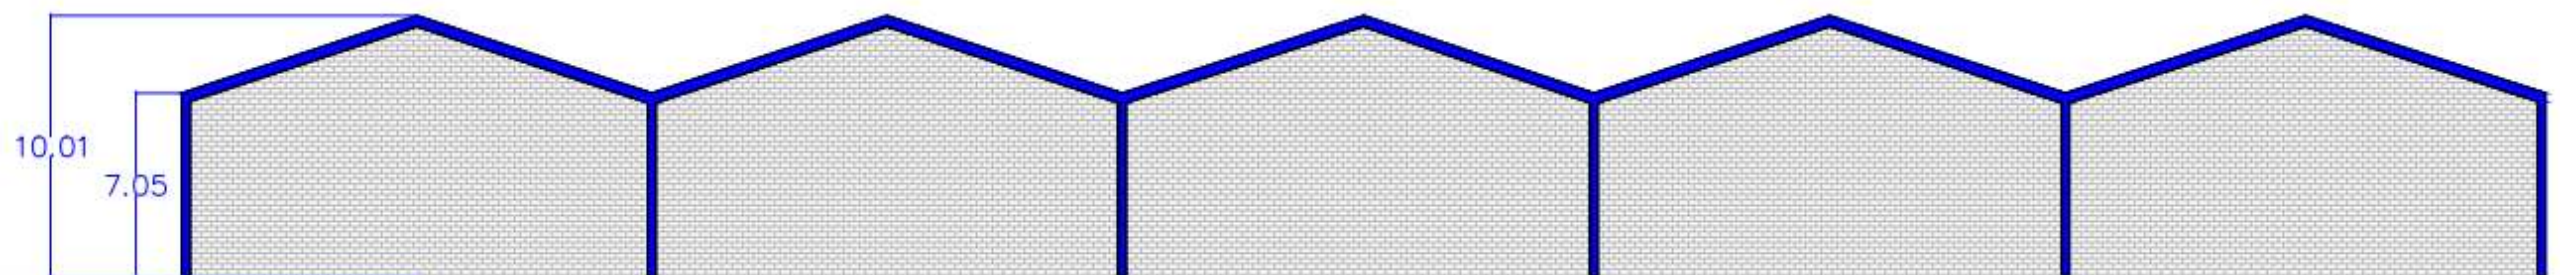

Bodega 5 modulo 1-2-3-4-5

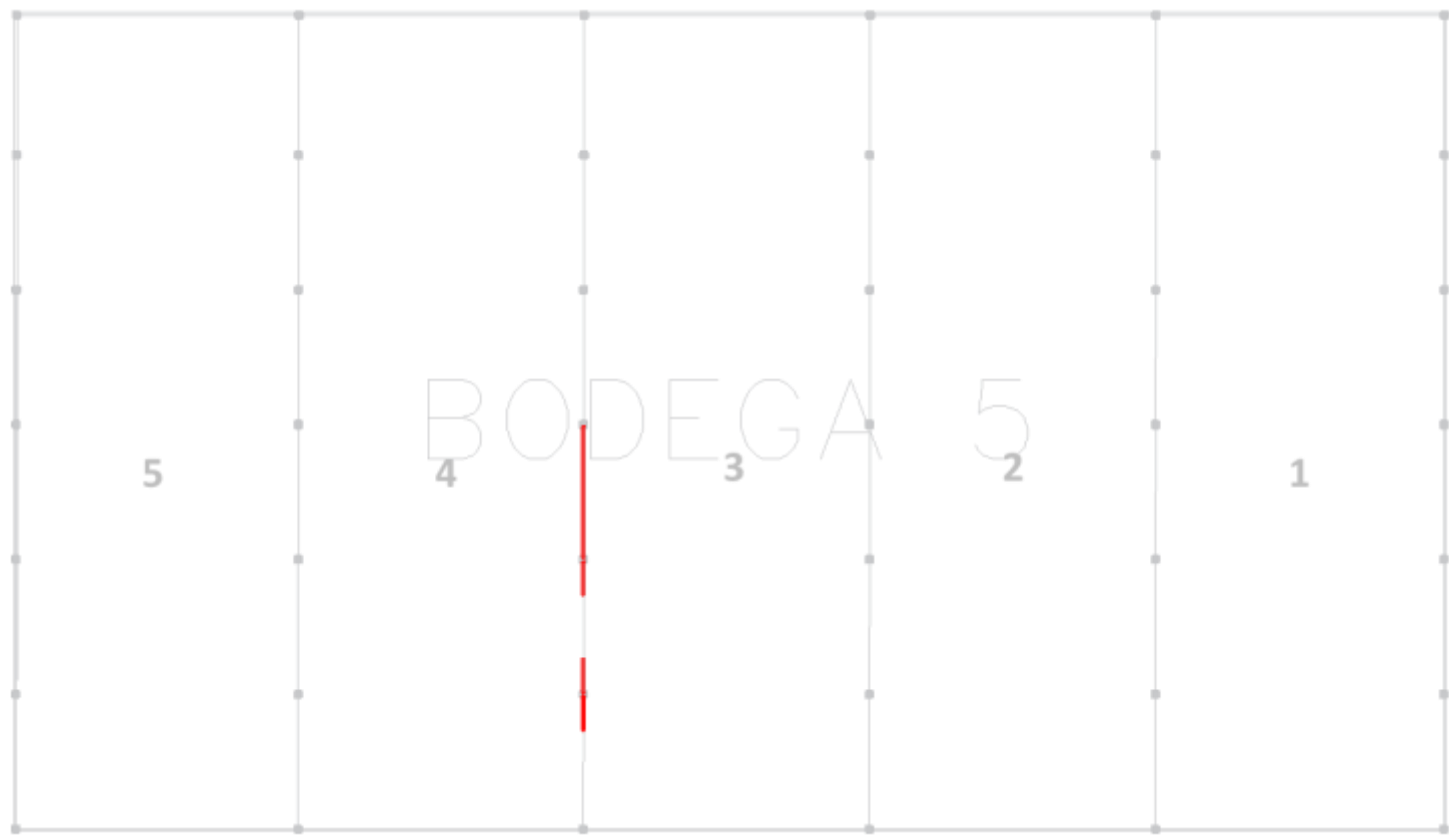

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	210	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Columna	Columnas en concreto	Und	28	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	252	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Viga	Viga de concreto	ml	641	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	153	5
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1876	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Cubierta	caballetes Eternit	und	177	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2.776	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1574	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega 5	1 2 3	Oficina		no		



FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 5	4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	136	0
MINCIT	Bodega 5	4	Columna	Columnas en concreto	Und	14	0
MINCIT	Bodega 5	4	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	60	0
MINCIT	Bodega 5	4	Viga	Viga de concreto	ml	285	0
MINCIT	Bodega 5	4	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	102	0
MINCIT	Bodega 5	4	Cubierta	Eternit Ondulada	und	634	0
MINCIT	Bodega 5	4	Cubierta	caballetes Eternit	und	59	0
MINCIT	Bodega 5	4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	918	0
MINCIT	Bodega 5	4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1002	0
MINCIT	Bodega 5	4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	0	0
MINCIT	Bodega 5	4	Oficina		NO		

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE



			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	136	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Columna	Columnas en concreto	Und	14	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	84	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Viga	Viga de concreto	ml	285	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	102	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	634	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Cubierta	caballetes Eternit	und	59	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	918	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1002	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	0	0
MINCIT	Bodega 5	5- 5A	Oficina		SI		

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía





Bodega 5 modulo 1-2-3-4-5
Registro Fotográfico.

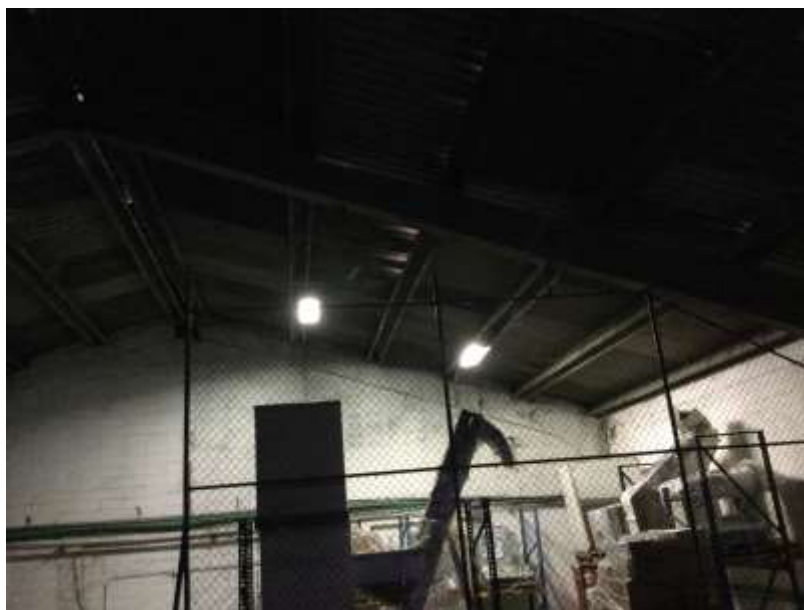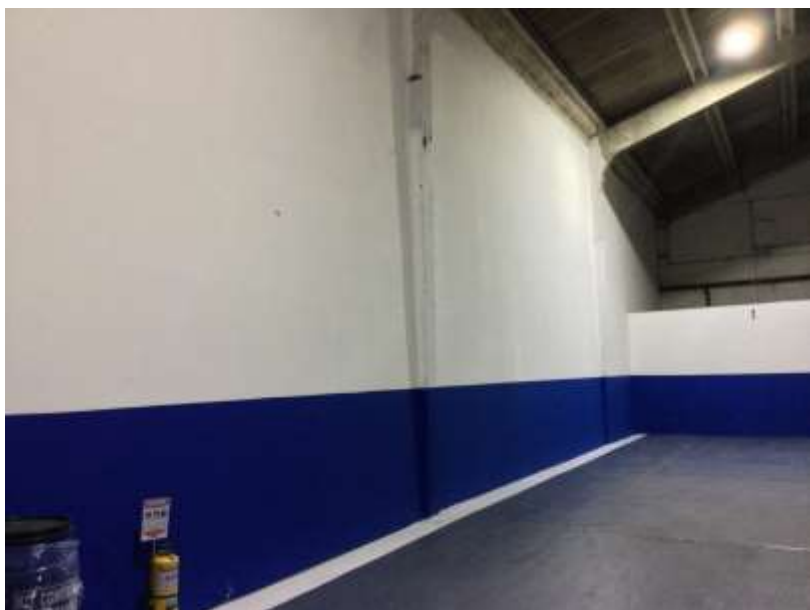


Bodega 5 modulo 1-2-3-4-5
Registro Fotográfico.

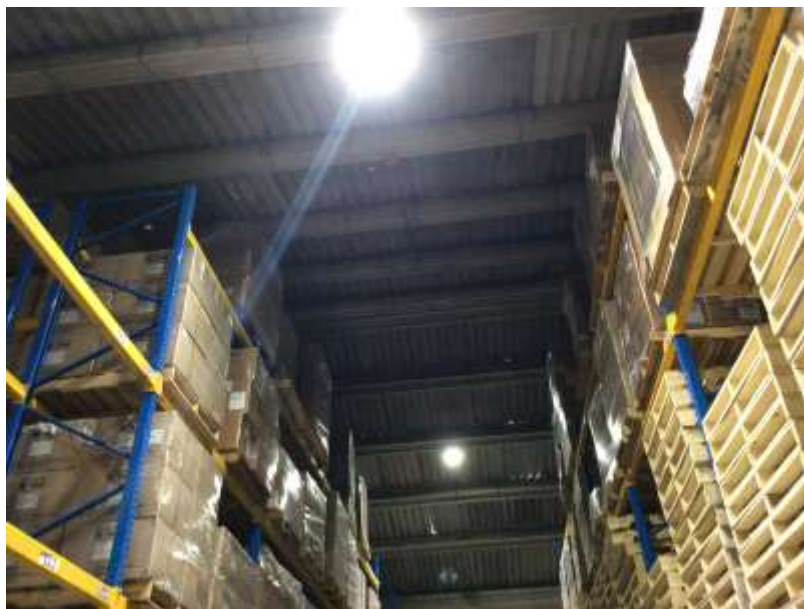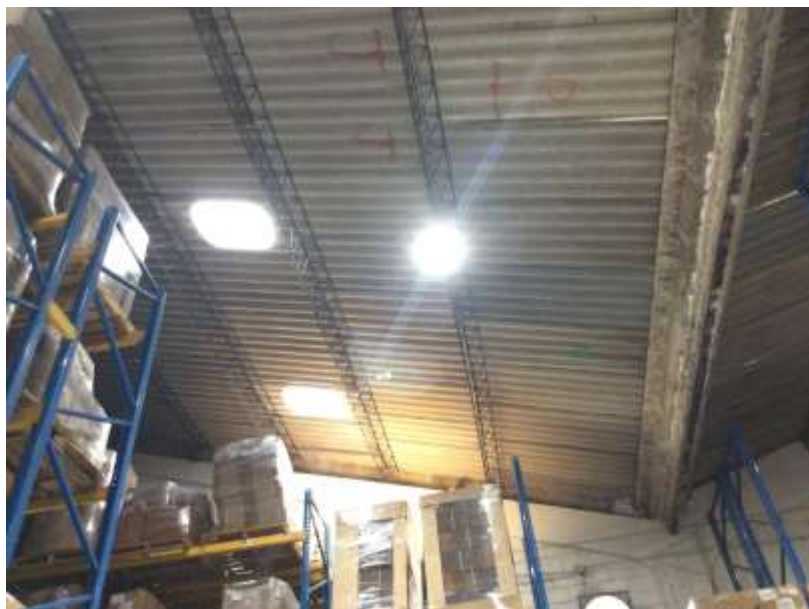


Bodega 5 modulo 1-2-3-4-5
Registro Fotográfico.

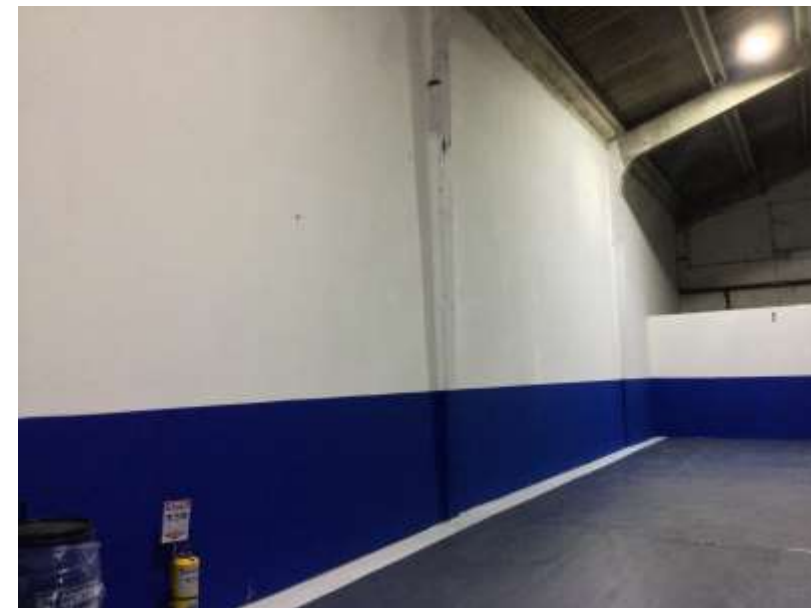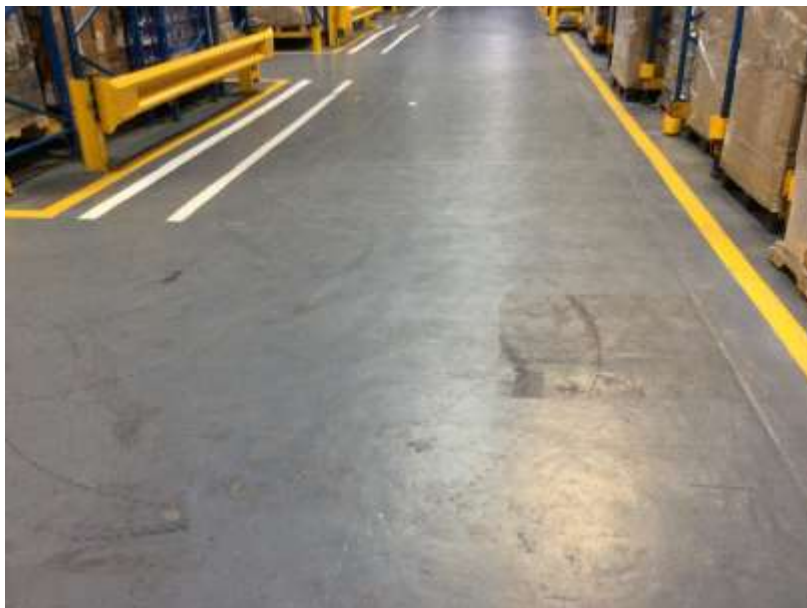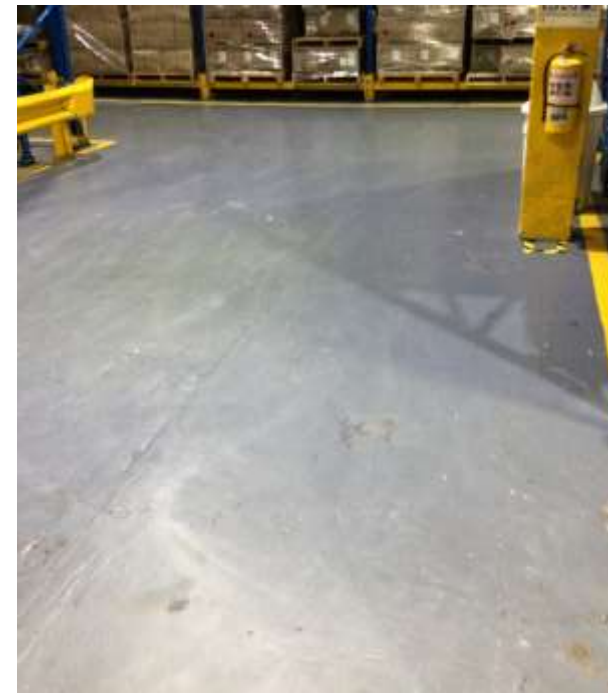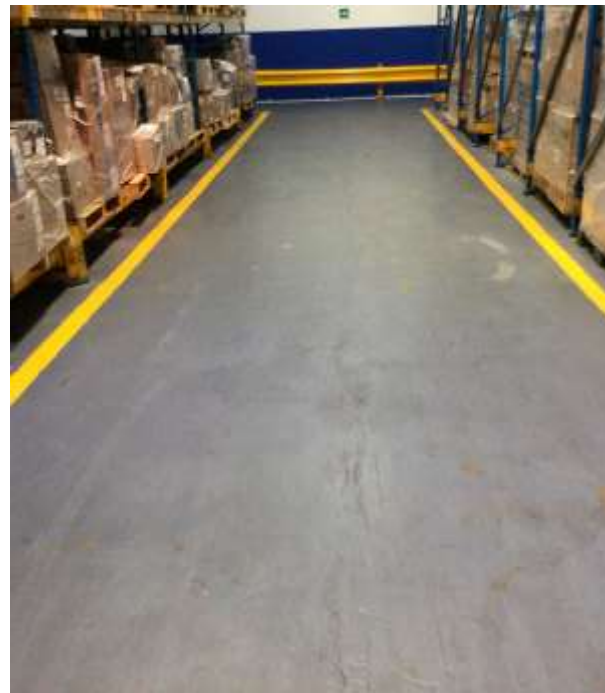

Bodega 6

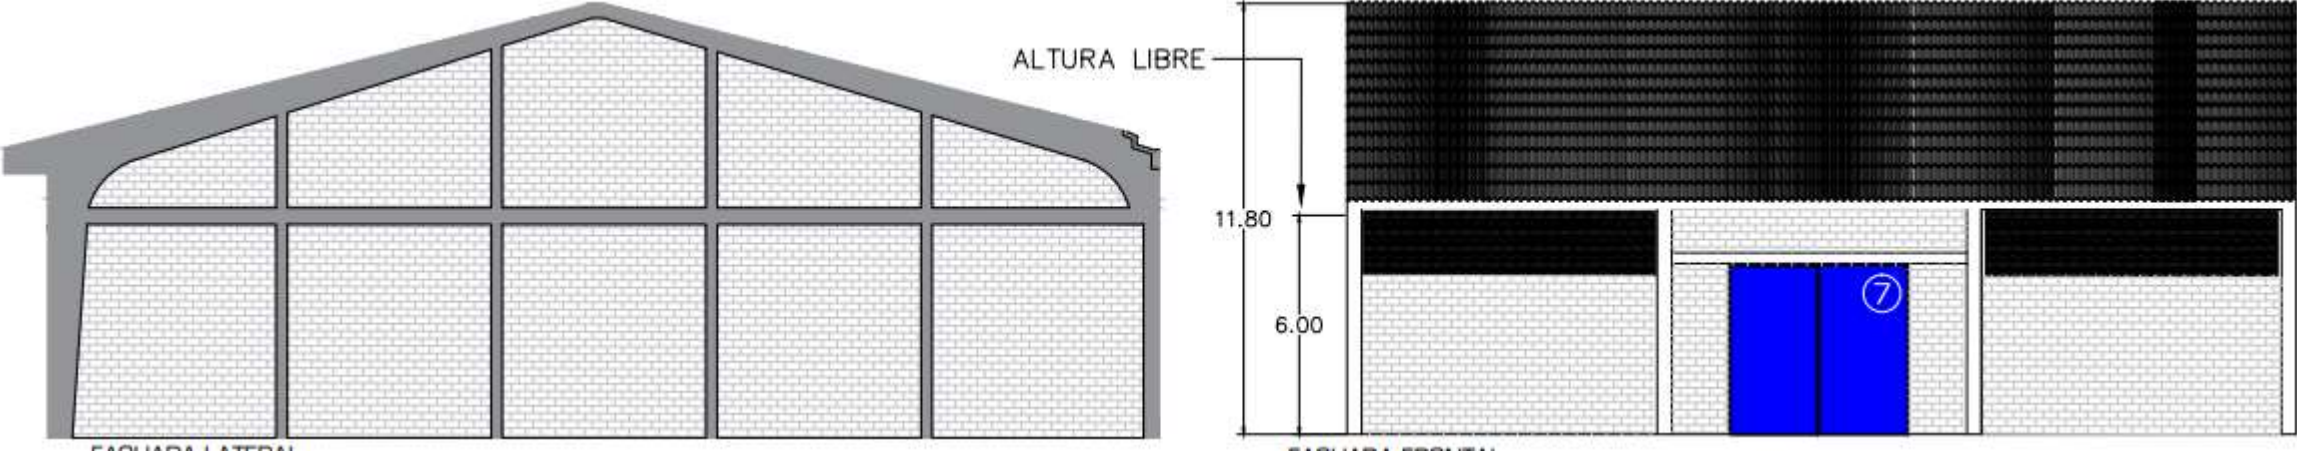

Bodega 6 modulo 1-2-3-4-5-6

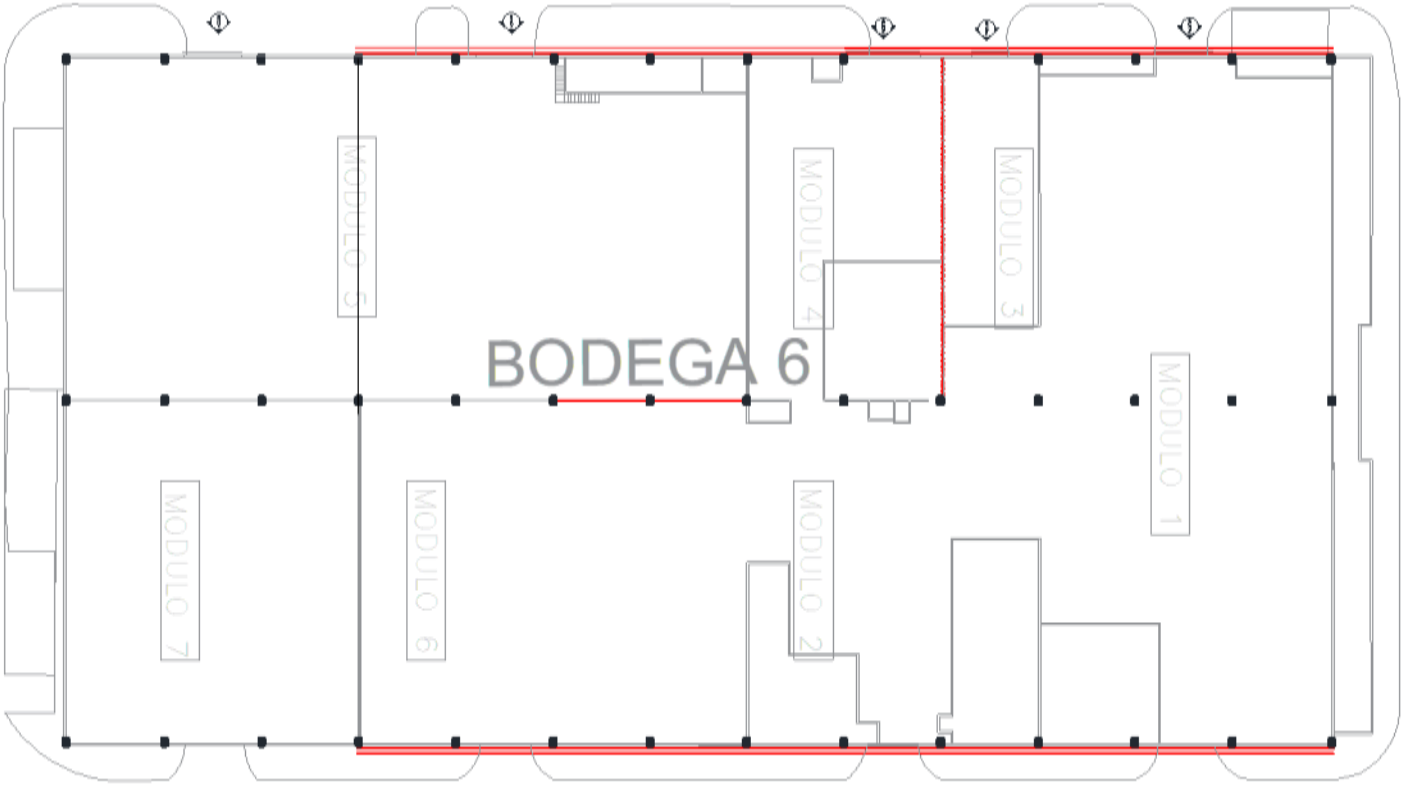

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	273	0
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Columna	Columnas en concreto	Und	21	5
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	264	22
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Viga	Viga de concreto	ml	411	30
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	51	0
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1761	0
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Cubierta	caballetes Eternit	und	55	0
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2.886	0
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1353	247
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	3	3
MINCIT	Bodega 6	1 2 4	Oficina		SI		

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 6	3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	64	0
MINCIT	Bodega 6	3	Columna	Columnas en concreto	Und	4	0
MINCIT	Bodega 6	3	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	24	0
MINCIT	Bodega 6	3	Viga	Viga de concreto	ml	10	0
MINCIT	Bodega 6	3	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	0	0
MINCIT	Bodega 6	3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	296	0
MINCIT	Bodega 6	3	Cubierta	caballetes Eternit	und	10	0
MINCIT	Bodega 6	3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	200	0
MINCIT	Bodega 6	3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	108	0
MINCIT	Bodega 6	3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega 6	3	Oficina		no		

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE


			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 6	5	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	128	0
MINCIT	Bodega 6	5	Columna	Columnas en concreto	Und	18	0
MINCIT	Bodega 6	5	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	96	0
MINCIT	Bodega 6	5	Viga	Viga de concreto	ml	225	0
MINCIT	Bodega 6	5	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	34	7
MINCIT	Bodega 6	5	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1480	0
MINCIT	Bodega 6	5	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 6	5	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.000	0
MINCIT	Bodega 6	5	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	865	0
MINCIT	Bodega 6	5	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 6	5	Oficina		no		

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 6	6	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	129	0
MINCIT	Bodega 6	6	Columna	Columnas en concreto	Und	5	0
MINCIT	Bodega 6	6	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	96	8
MINCIT	Bodega 6	6	Viga	Viga de concreto	ml	200	0
MINCIT	Bodega 6	6	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	34	8
MINCIT	Bodega 6	6	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1533	0
MINCIT	Bodega 6	6	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 6	6	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.000	0
MINCIT	Bodega 6	6	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	902	0
MINCIT	Bodega 6	6	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 6	6	Oficina				


Bodega 6 modulo 1-2-3-4-5-6
Registro Fotográfico.





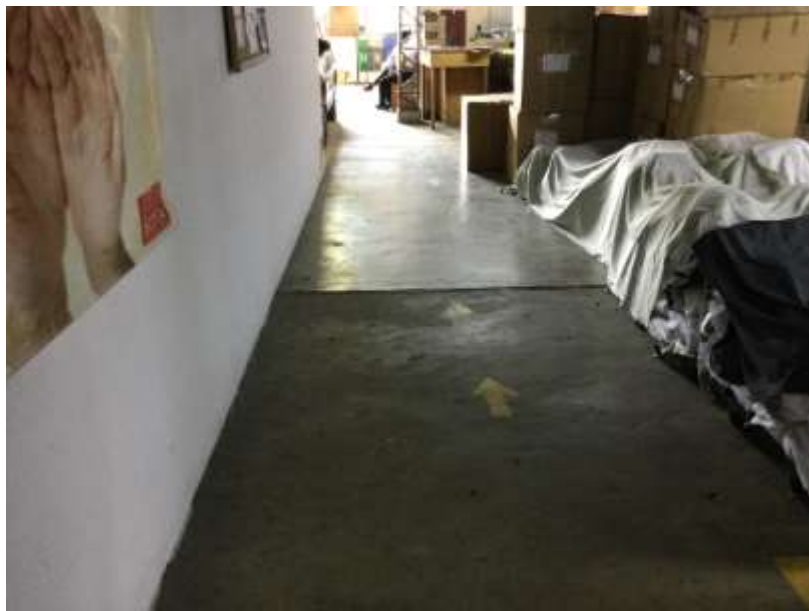

Bodega 6 modulo 5A
Registro Fotográfico.

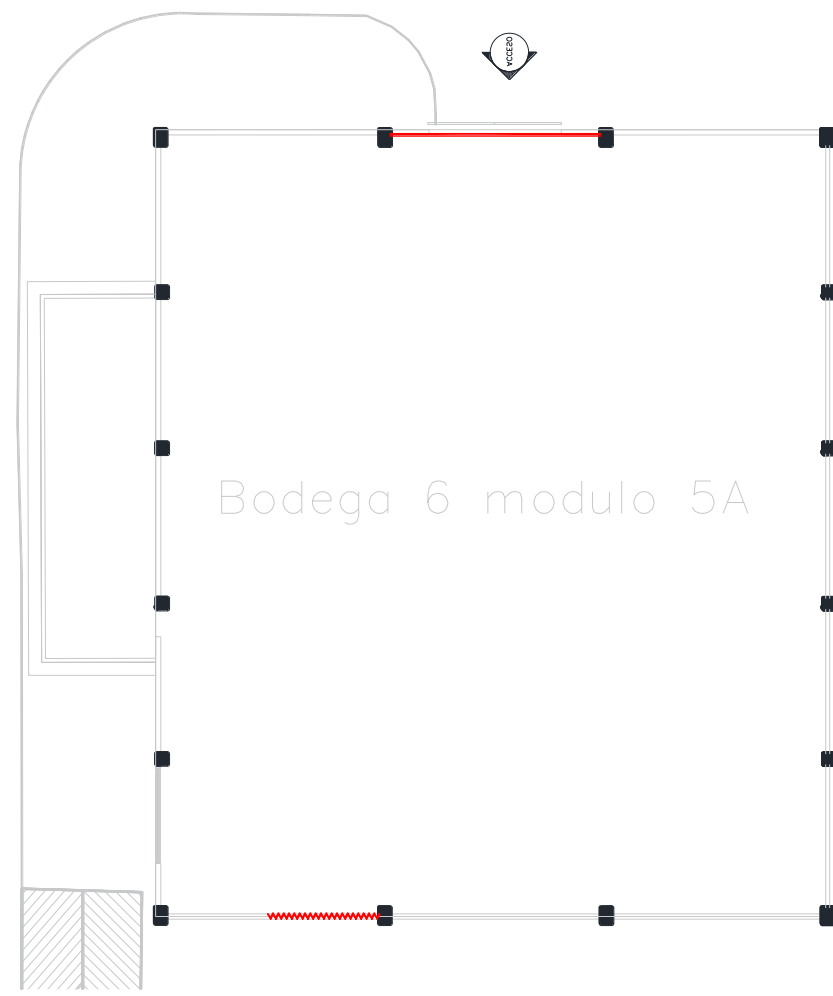

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 6	5A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	112	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Columna	Columnas en concreto	Und	16	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	72	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Viga	Viga de concreto	ml	192	5
MINCIT	Bodega 6	5A	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	25	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1161	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Cubierta	caballetes Eternit	und	27	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	700	0
MINCIT	Bodega 6	5A	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	769	6
MINCIT	Bodega 6	5A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega 6	5A	Oficina		no		


Bodega 6 modulo 5A
Registro Fotográfico.




Bodega 6 modulo 5A
Registro Fotográfico.



Bodega 6 modulo 5A
Registro Fotográfico.

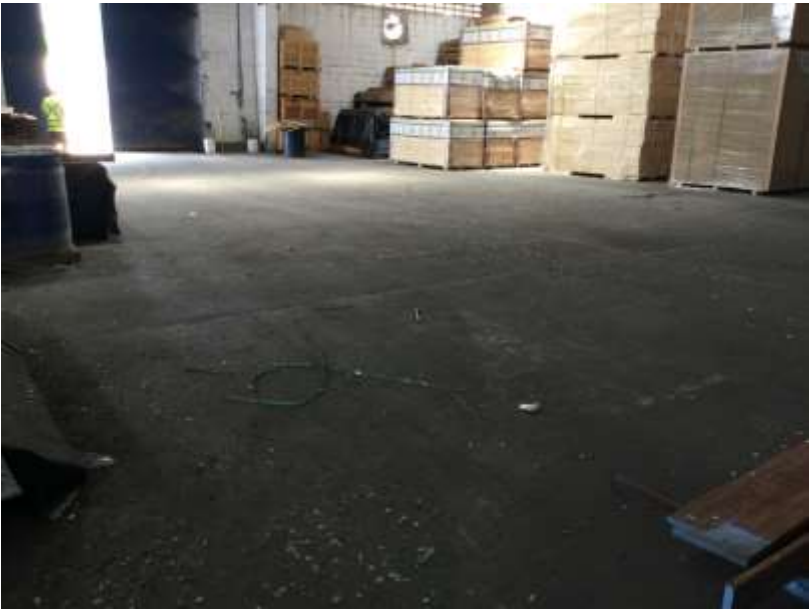

Bodega 6 modulo 7

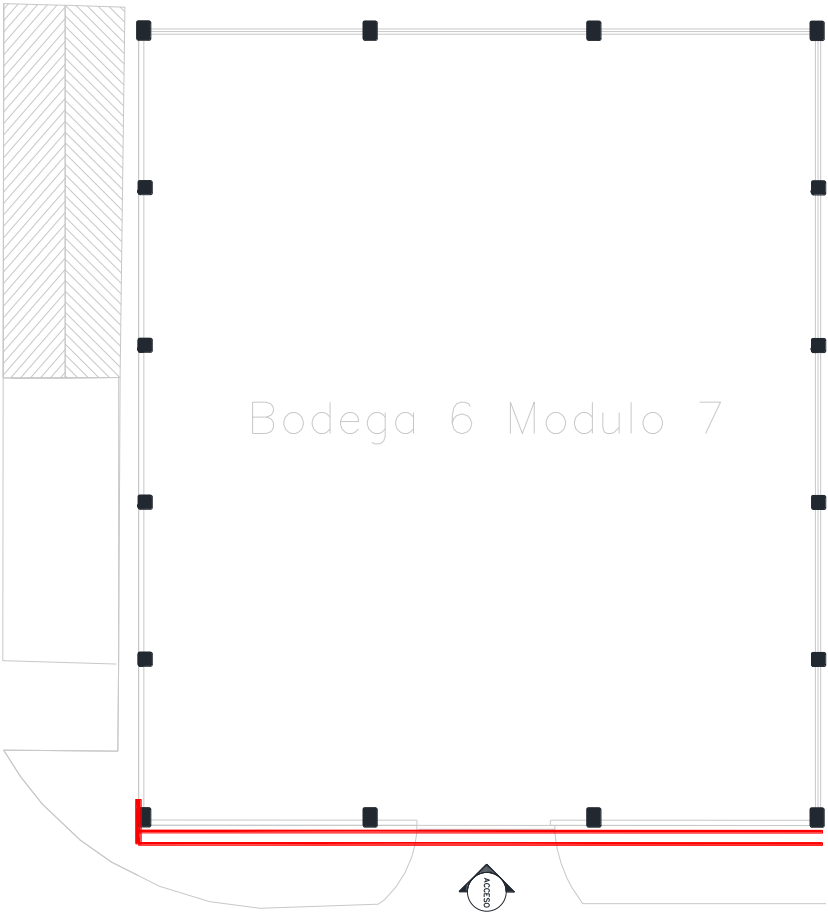

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 6	7	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	112	0
MINCIT	Bodega 6	7	Columna	Columnas en concreto	Und	16	0
MINCIT	Bodega 6	7	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	72	0
MINCIT	Bodega 6	7	Viga	Viga de concreto	ml	197	0
MINCIT	Bodega 6	7	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	25	0
MINCIT	Bodega 6	7	Cubierta	Eternit Ondulada	und	524	0
MINCIT	Bodega 6	7	Cubierta	caballetes Eternit	und	28	0
MINCIT	Bodega 6	7	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	775	0
MINCIT	Bodega 6	7	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	769	0
MINCIT	Bodega 6	7	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 6	7	Oficina		no		


Bodega 6 modulo 7
Registro Fotográfico.




Bodega 6 modulo 7
Registro Fotográfico.




Bodega 6 modulo 7
Registro Fotográfico.

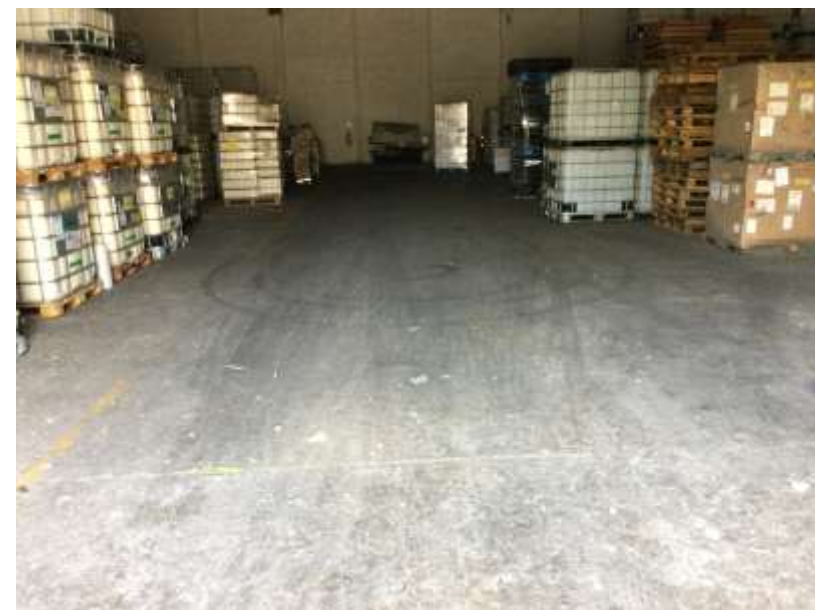

Bodega 7

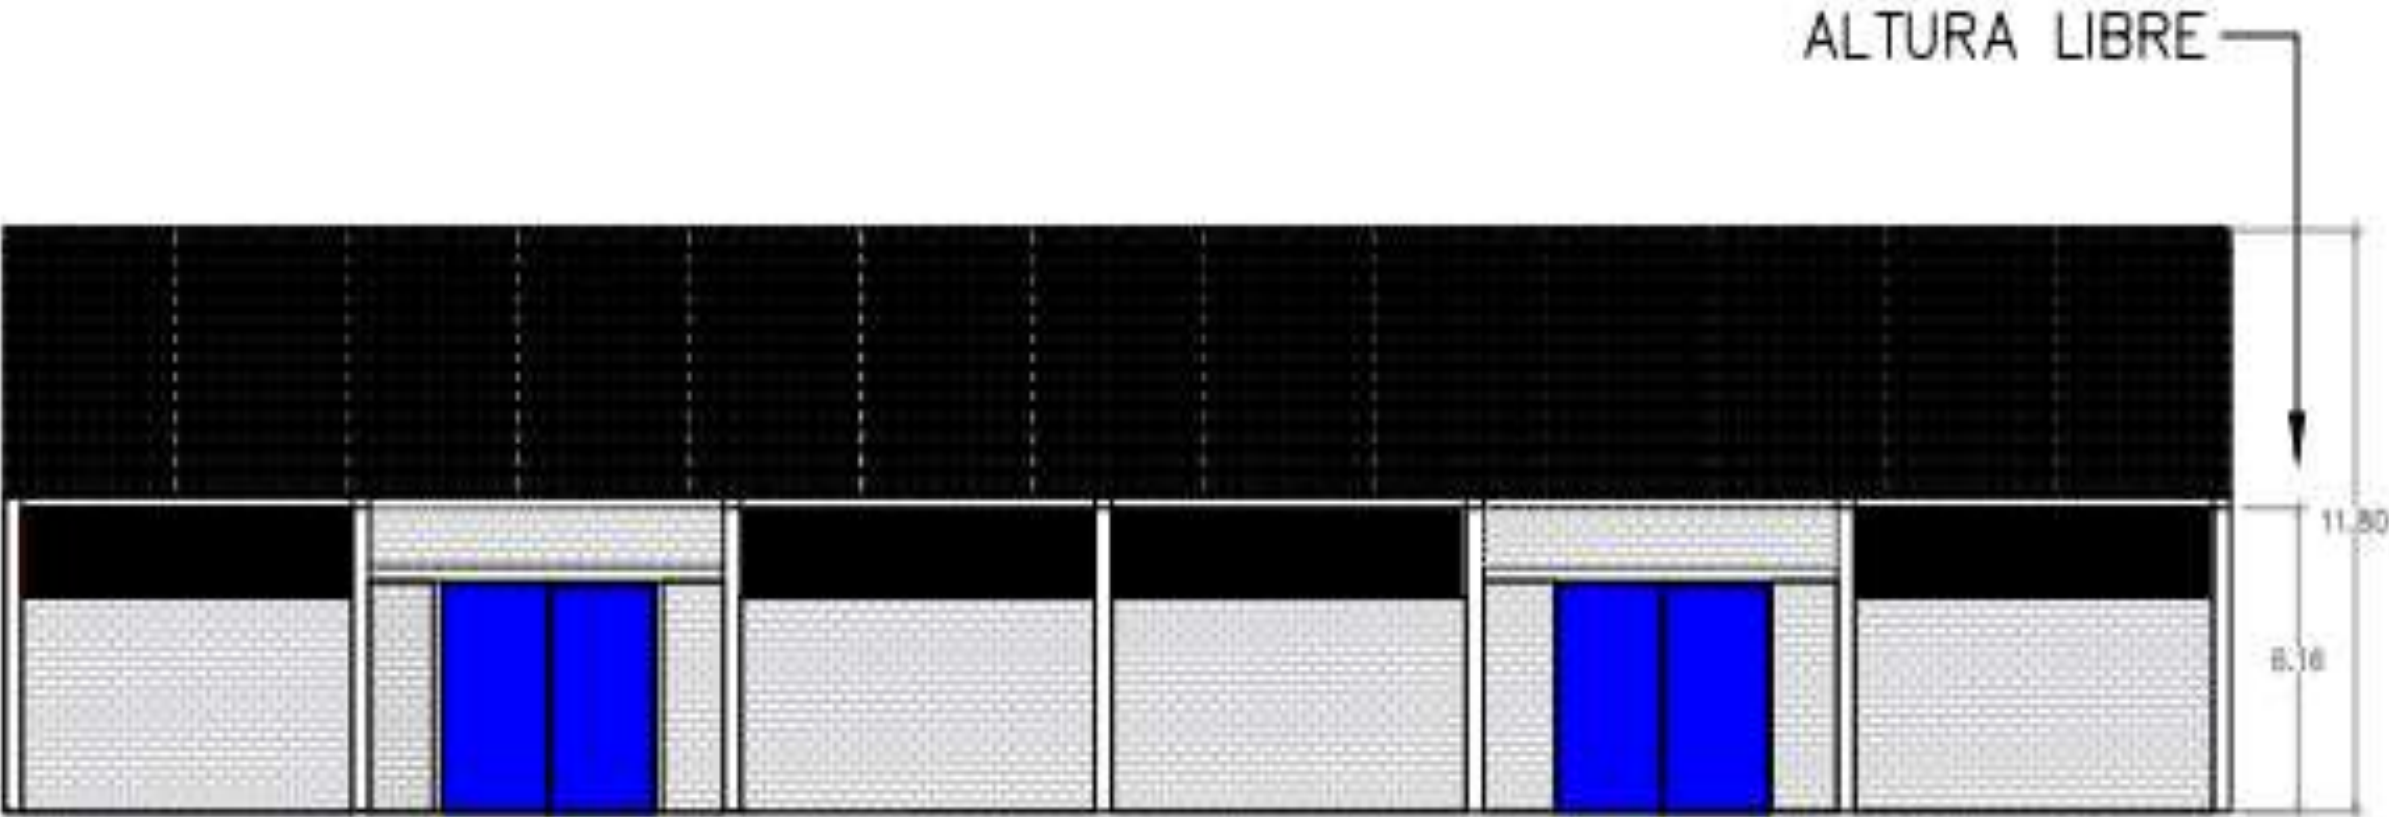

Bodega 7 modulo 1-2-3-4-5-6-7-8-9

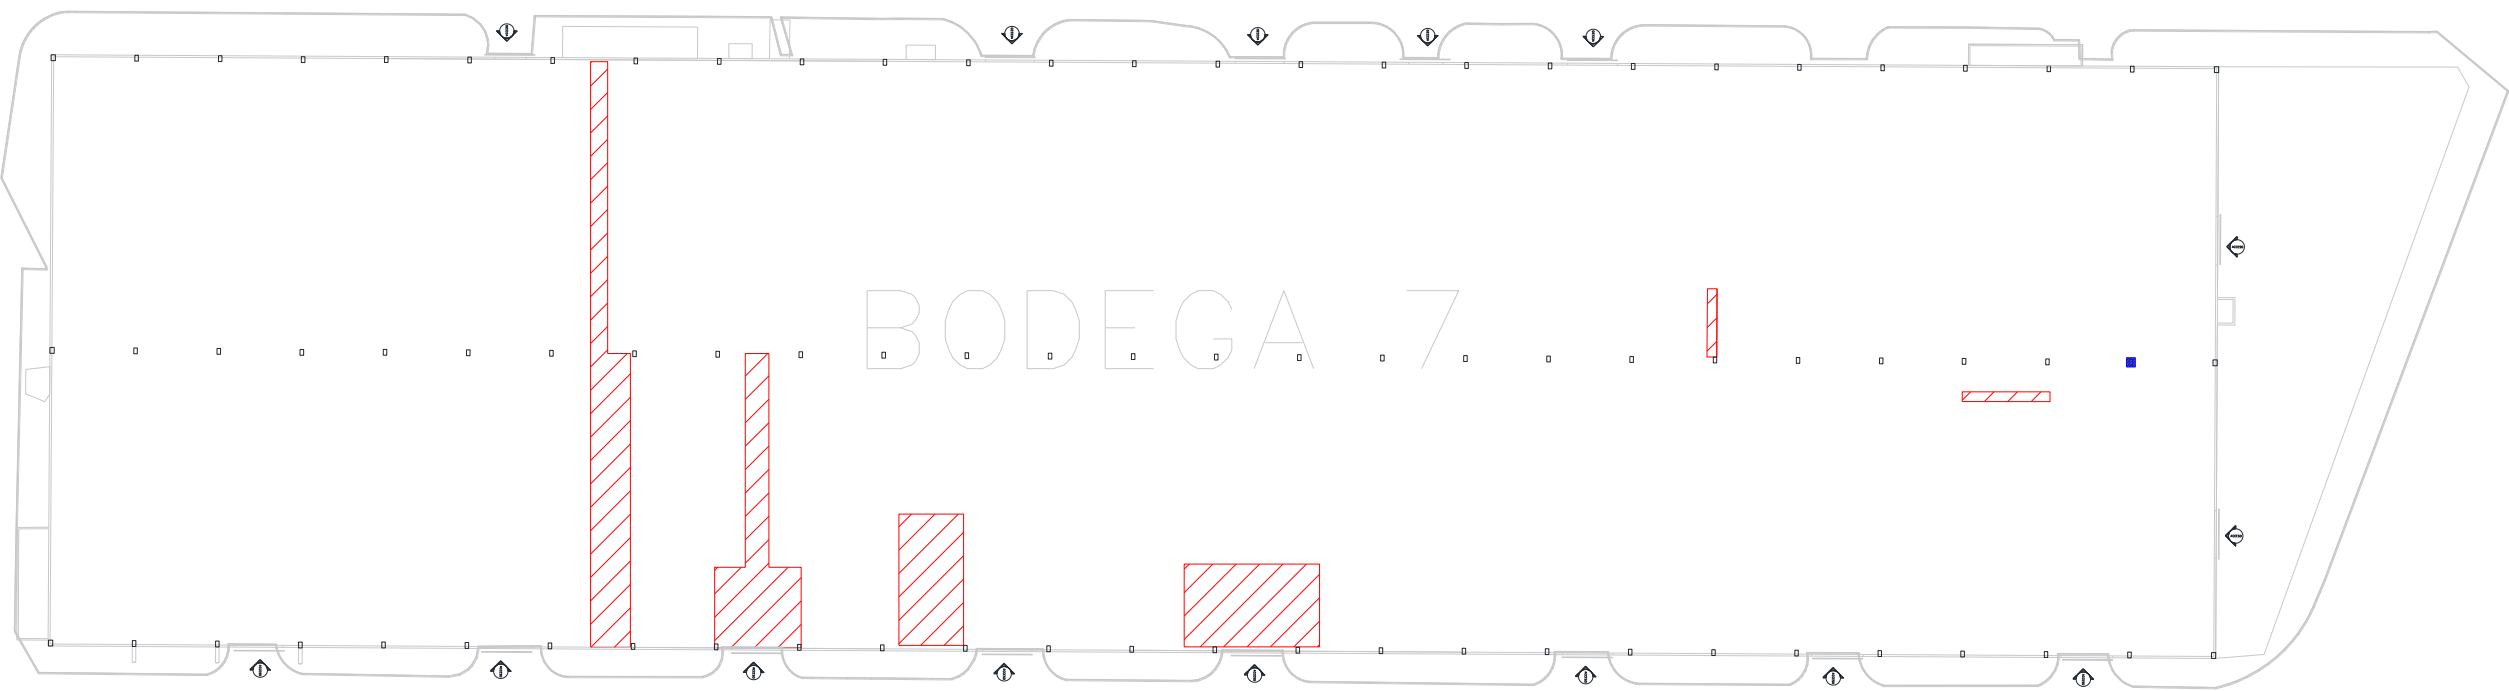

Convenciones



-  **Columnas con deterioro normal por uso y goce**
-  **Muros con deterioro normal por uso y goce**
-  **Vigas con deterioro normal por uso y goce**
-  **Losa / piso con deterioro normal por uso y goce**

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	787	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Columna	Columnas en concreto	Und	93	2
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	1040	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Viga	Viga de concreto	ml	1875	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	222	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Cubierta	Eternit Ondulada	und	9071	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Cubierta	caballetes Eternit	und	478	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	13500	521
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	3378	0
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	15	15
MINCIT	Bodega 7	4-5-5A-6-7-8-8A-9	Oficina		SI		

Bodega 7 modulo 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Registro Fotográfico.

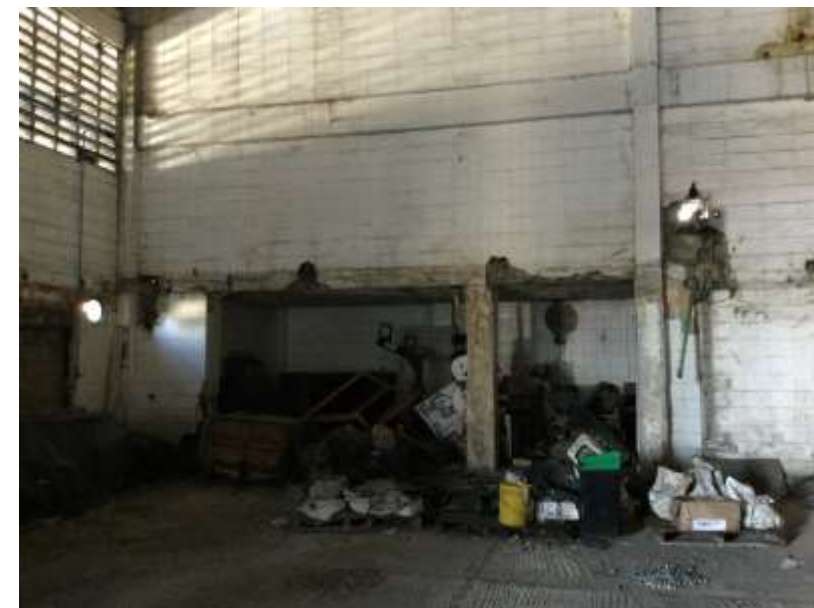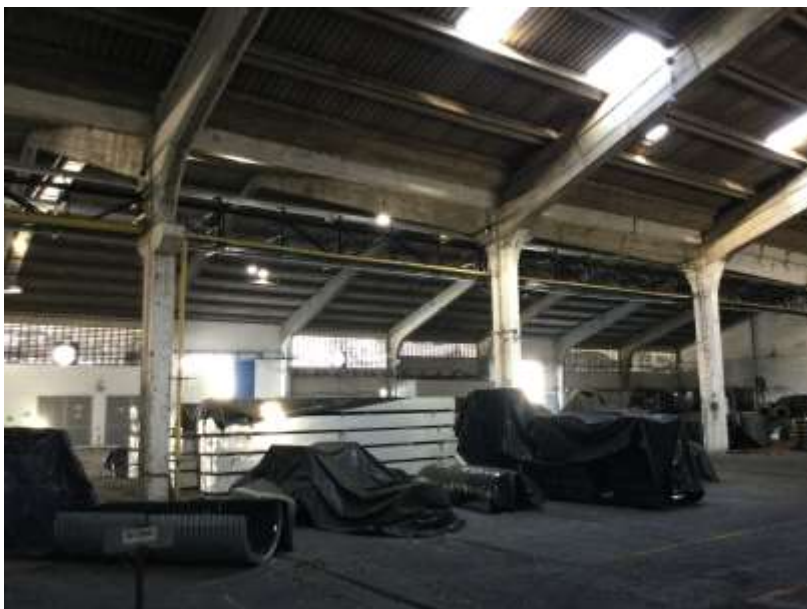


Bodega 7 modulo 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Registro Fotográfico.




Bodega 7 modulo 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Registro Fotográfico.



Bodega 8

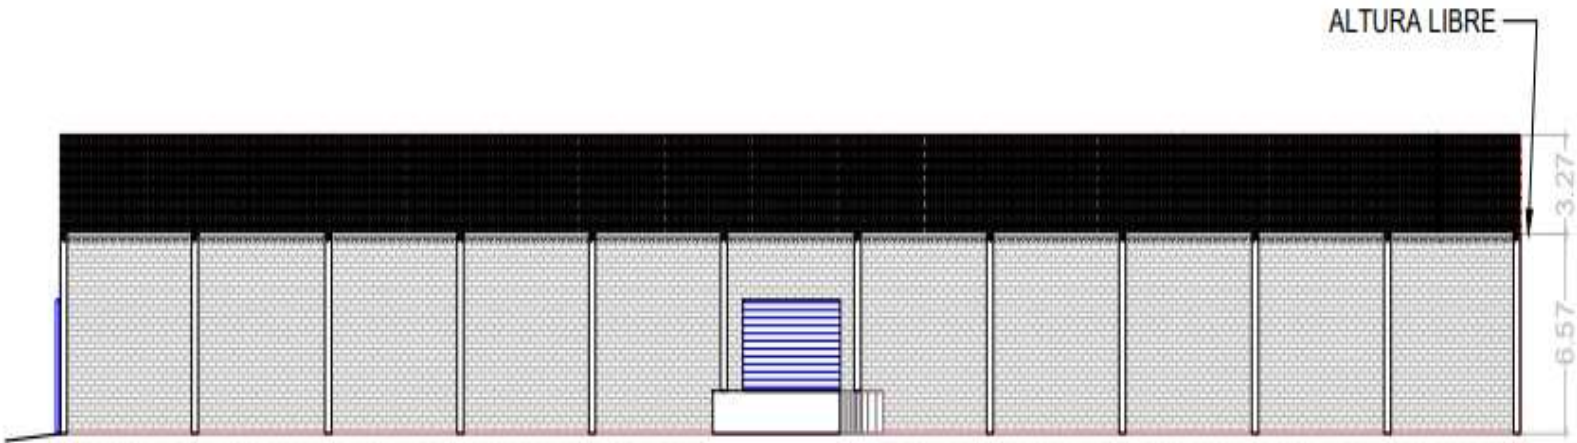

Bodega 8 modulo 1

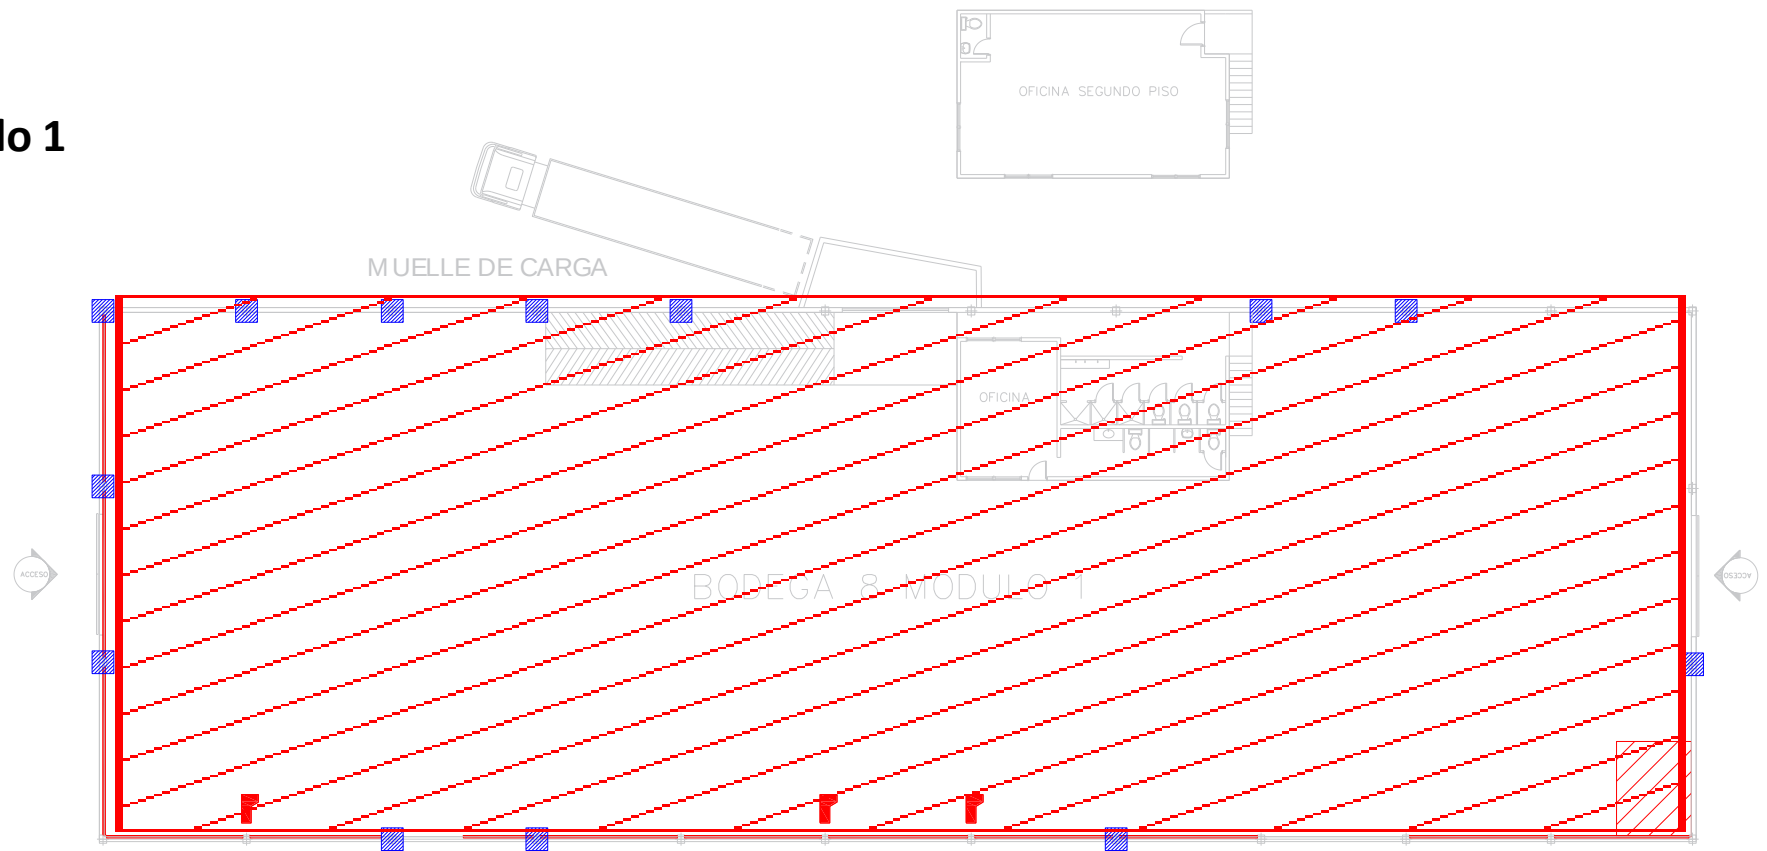

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	1	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	1	Mensulas	mensulas en concreto	Und	10	3
MINCIT	Bodega 8	1	Columna	Columnas en concreto	Und	28	12
MINCIT	Bodega 8	1	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	1	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	10
MINCIT	Bodega 8	1	Viga	Viga de concreto	ml	110	32
MINCIT	Bodega 8	1	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	66	66
MINCIT	Bodega 8	1	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	1	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	1	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.349	1.349
MINCIT	Bodega 8	1	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	0
MINCIT	Bodega 8	1	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 8	1	Oficina		SI		

Bodega 8 modulo 1
Registro Fotográfico.





Bodega 8 modulo 1
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 1
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 1
Registro Fotográfico.

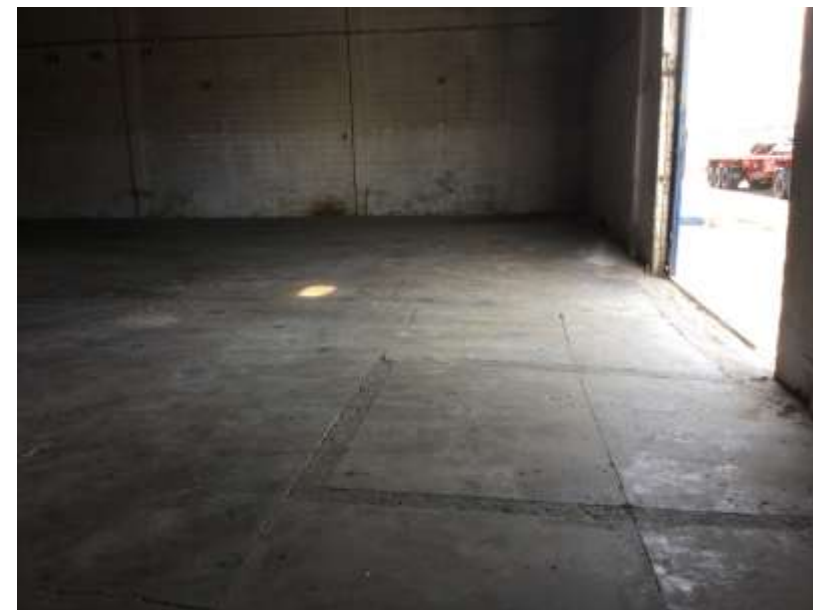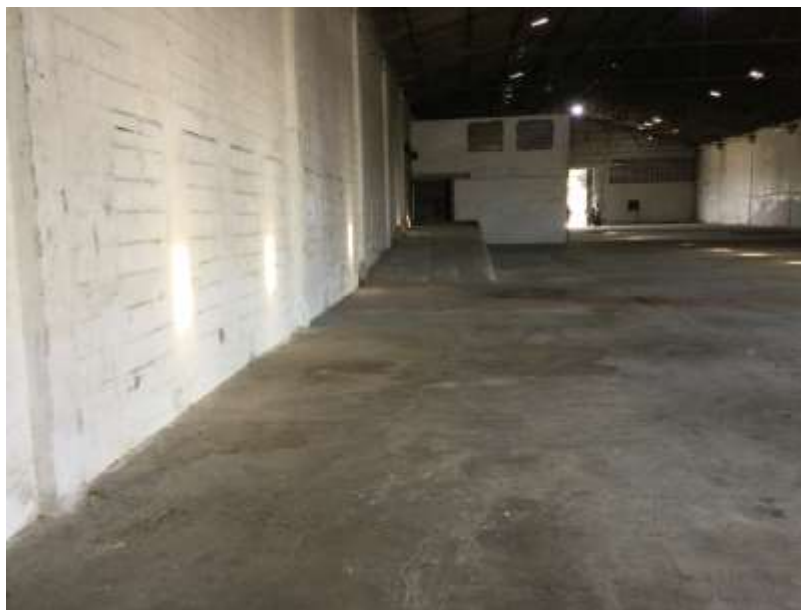

Bodega 8 modulo 2

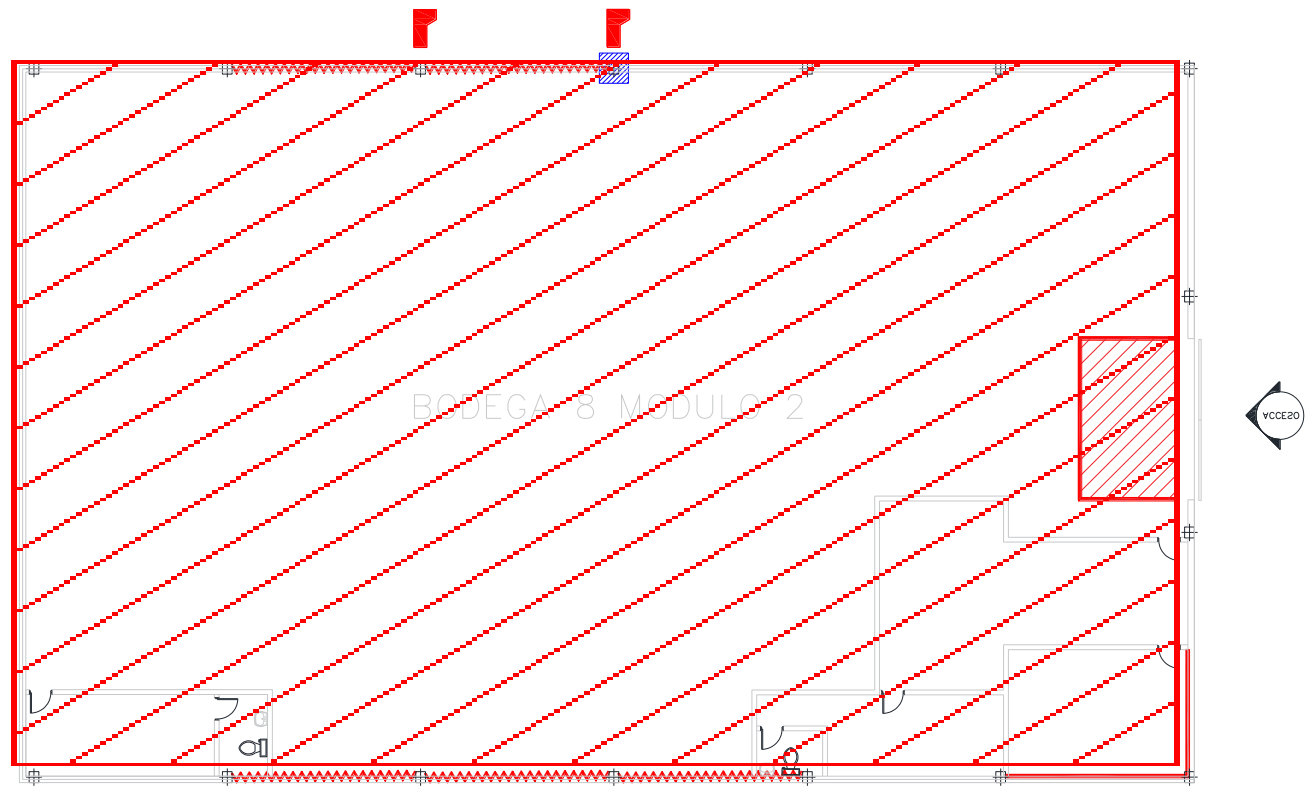


Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripcion de la Bodega:					
		Fecha de inspeccion		martes, 24 de septiembre de 2024			
		Ubicación		Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	116	0
MINCIT	Bodega 8	2	Mensulas	mensulas en concreto	Und	10	3
MINCIT	Bodega 8	2	Columna	Columnas en concreto	Und	21	1
MINCIT	Bodega 8	2	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	96	96
MINCIT	Bodega 8	2	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	5	0
MINCIT	Bodega 8	2	Viga	Viga de concreto	ml	80	5
MINCIT	Bodega 8	2	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	72	5,56
MINCIT	Bodega 8	2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	535	0
MINCIT	Bodega 8	2	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 8	2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	681	681
MINCIT	Bodega 8	2	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	901	112,8
MINCIT	Bodega 8	2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 8	2	Oficina		SI		

Bodega 8 modulo 2
Registro Fotográfico.

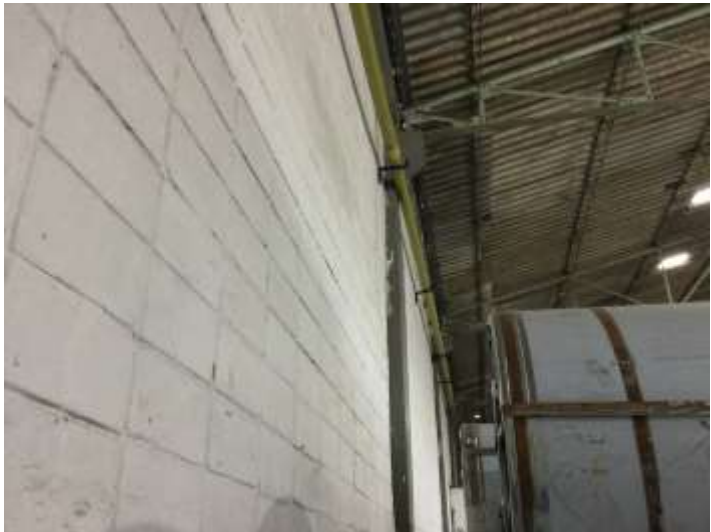

Bodega 8 modulo 2
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 2
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 3

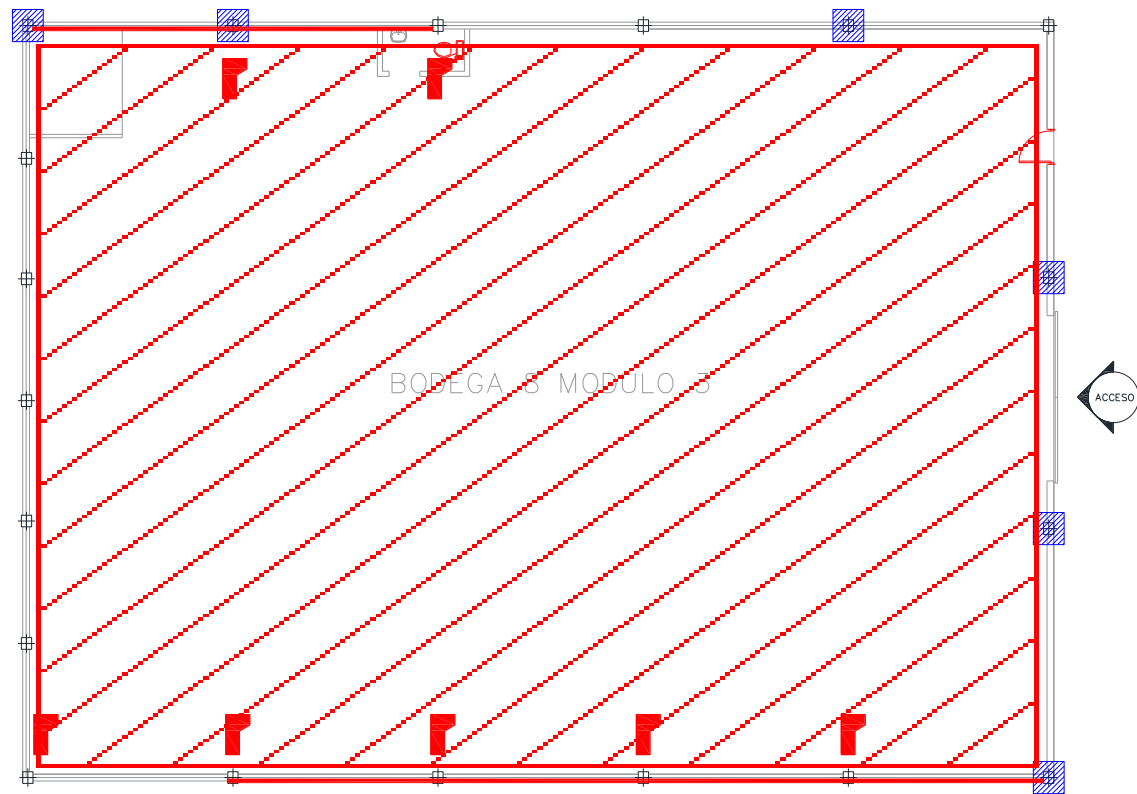

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	3	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	104	0
MINCIT	Bodega 8	3	Mensulas	mensulas en concreto	Und	12	7
MINCIT	Bodega 8	3	Columna	Columnas en concreto	Und	18	6
MINCIT	Bodega 8	3	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	80	80
MINCIT	Bodega 8	3	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	5	5
MINCIT	Bodega 8	3	Viga	Viga de concreto	ml	40	0
MINCIT	Bodega 8	3	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	60	36
MINCIT	Bodega 8	3	Cubierta	Eternit Ondulada	und	445	0
MINCIT	Bodega 8	3	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 8	3	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	660	660
MINCIT	Bodega 8	3	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	629	0
MINCIT	Bodega 8	3	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 8	3	Oficina		SI		

Bodega 8 modulo 3
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 3
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 4

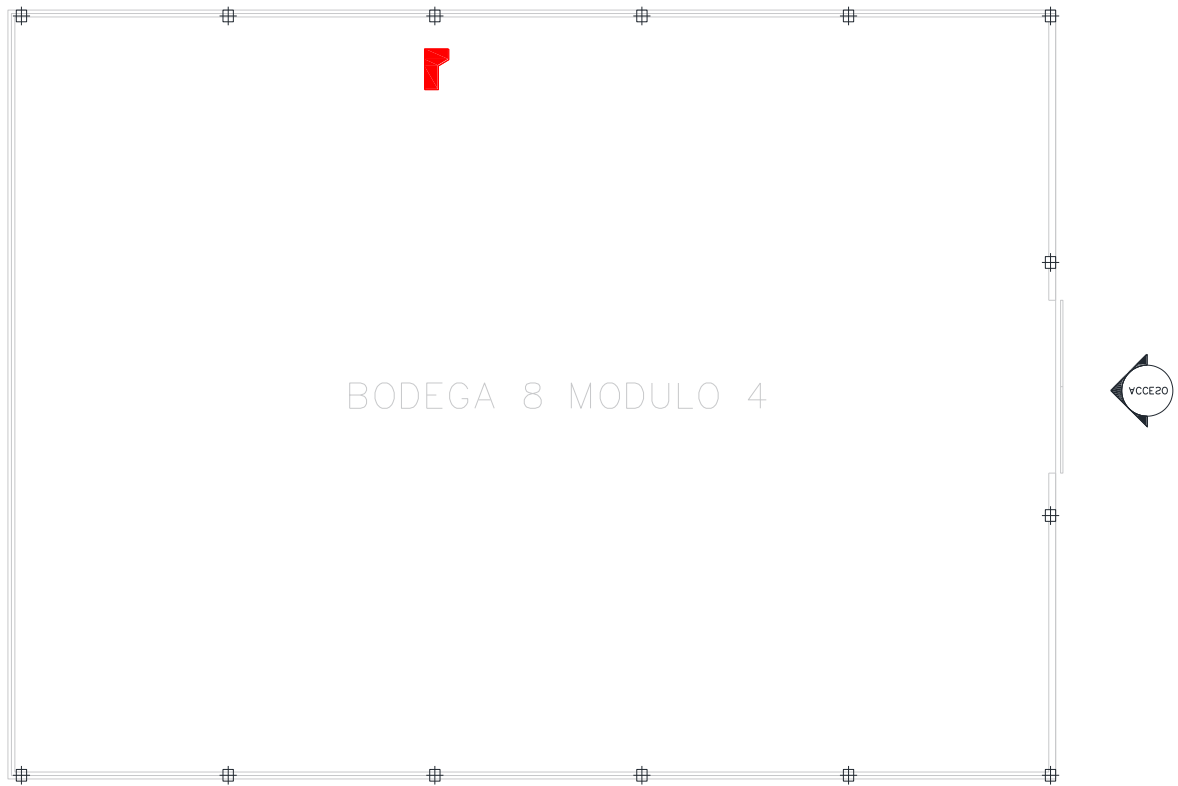

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/U O	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	104	0
MINCIT	Bodega 8	4	Mensulas	mensulas en concreto	Und	8	1
MINCIT	Bodega 8	4	Columna	Columnas en concreto	Und	14	0
MINCIT	Bodega 8	4	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	70	0
MINCIT	Bodega 8	4	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	4	0
MINCIT	Bodega 8	4	Viga	Víga de concreto	ml	44	0
MINCIT	Bodega 8	4	Viga Canal	Víga canal en concreto	ml	60	0
MINCIT	Bodega 8	4	Cubierta	Eternit Ondulada	und	445	0
MINCIT	Bodega 8	4	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 8	4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	660	0
MINCIT	Bodega 8	4	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	831	0
MINCIT	Bodega 8	4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega 8	4	Oficina				

Bodega 8 modulo 4
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 4
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 4
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 5



Nota: No se pudo visitar por estar cerrada

Bodega 8 modulo 6-6ª

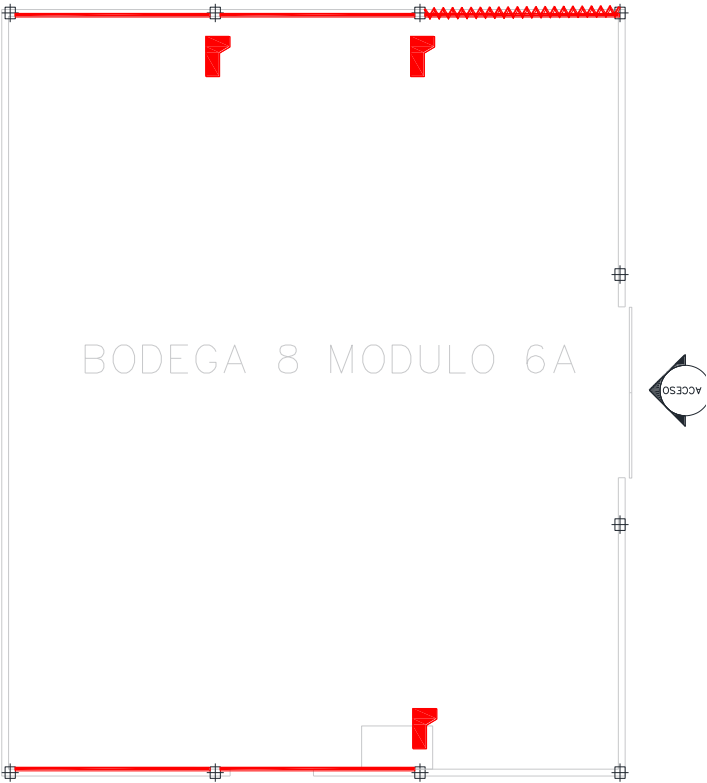


Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

Bodega 8 modulo 6-6ª

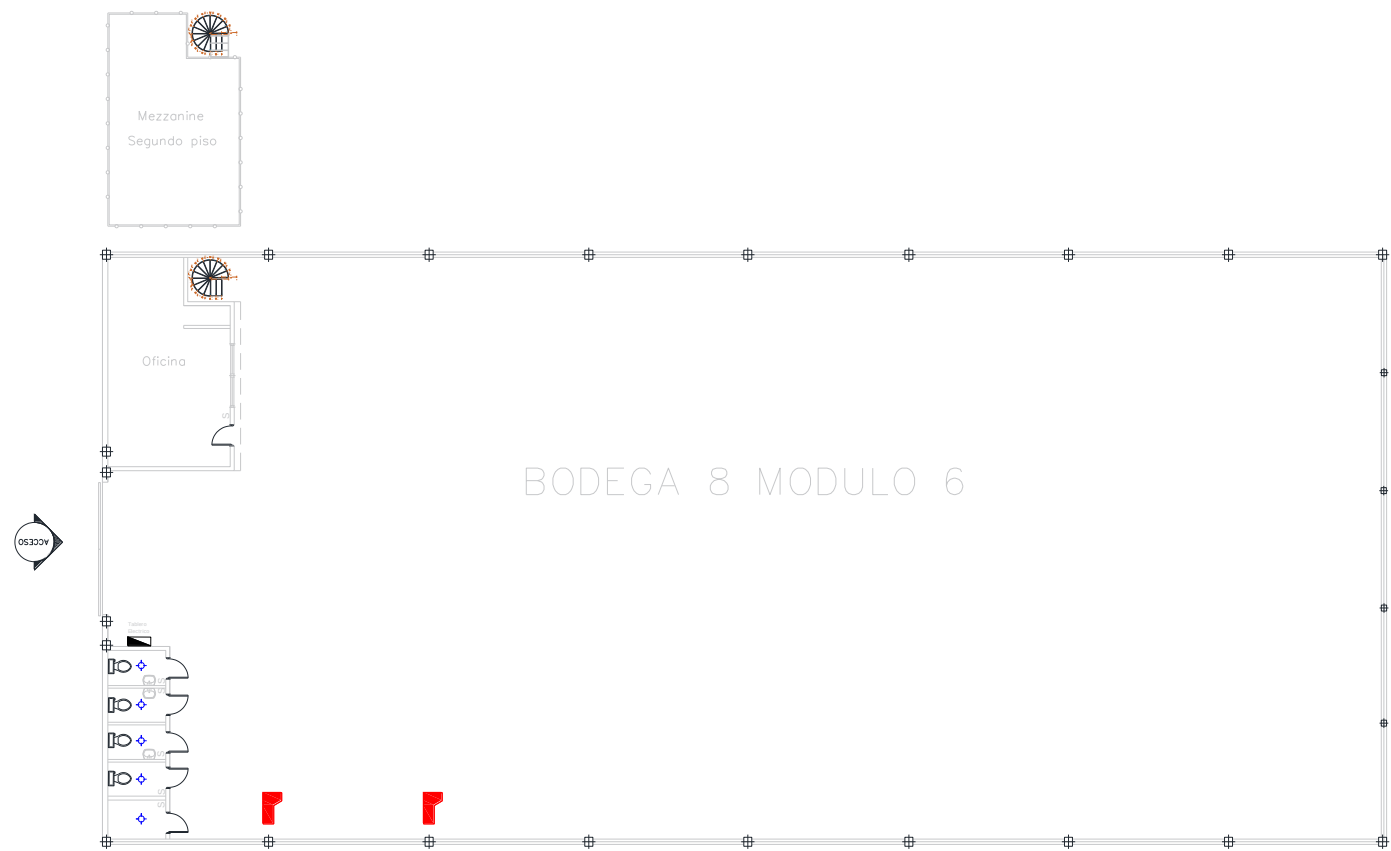

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	6	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	140	0
MINCIT	Bodega 8	6	Mensulas	mensulas en concreto	Und	14	2
MINCIT	Bodega 8	6	Columna	Columnas en concreto	Und	26	0
MINCIT	Bodega 8	6	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	128	128
MINCIT	Bodega 8	6	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	7	0
MINCIT	Bodega 8	6	Viga	Viga de concreto	ml	66	0
MINCIT	Bodega 8	6	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	96	0
MINCIT	Bodega 8	6	Cubierta	Eternit Ondulada	und	704	0
MINCIT	Bodega 8	6	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 8	6	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.043	0
MINCIT	Bodega 8	6	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	831	0
MINCIT	Bodega 8	6	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega 8	6	Oficina				

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspección	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	6A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	80	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Mensulas	mensulas en concreto	Und	6	3
MINCIT	Bodega 8	6A	Columna	Columnas en concreto	Und	10	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	48	48
MINCIT	Bodega 8	6A	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	2	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Viga	Viga de concreto	ml	44	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	36	24
MINCIT	Bodega 8	6A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	263	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Cubierta	caballetes Eternit	und	20	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	389	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	471	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega 8	6A	Oficina		no		

Bodega 8 modulo 6-6ª
Registro Fotográfico.



Bodega 6 modulo 6-6ª
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 6-6ª
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 6-6ª
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 7

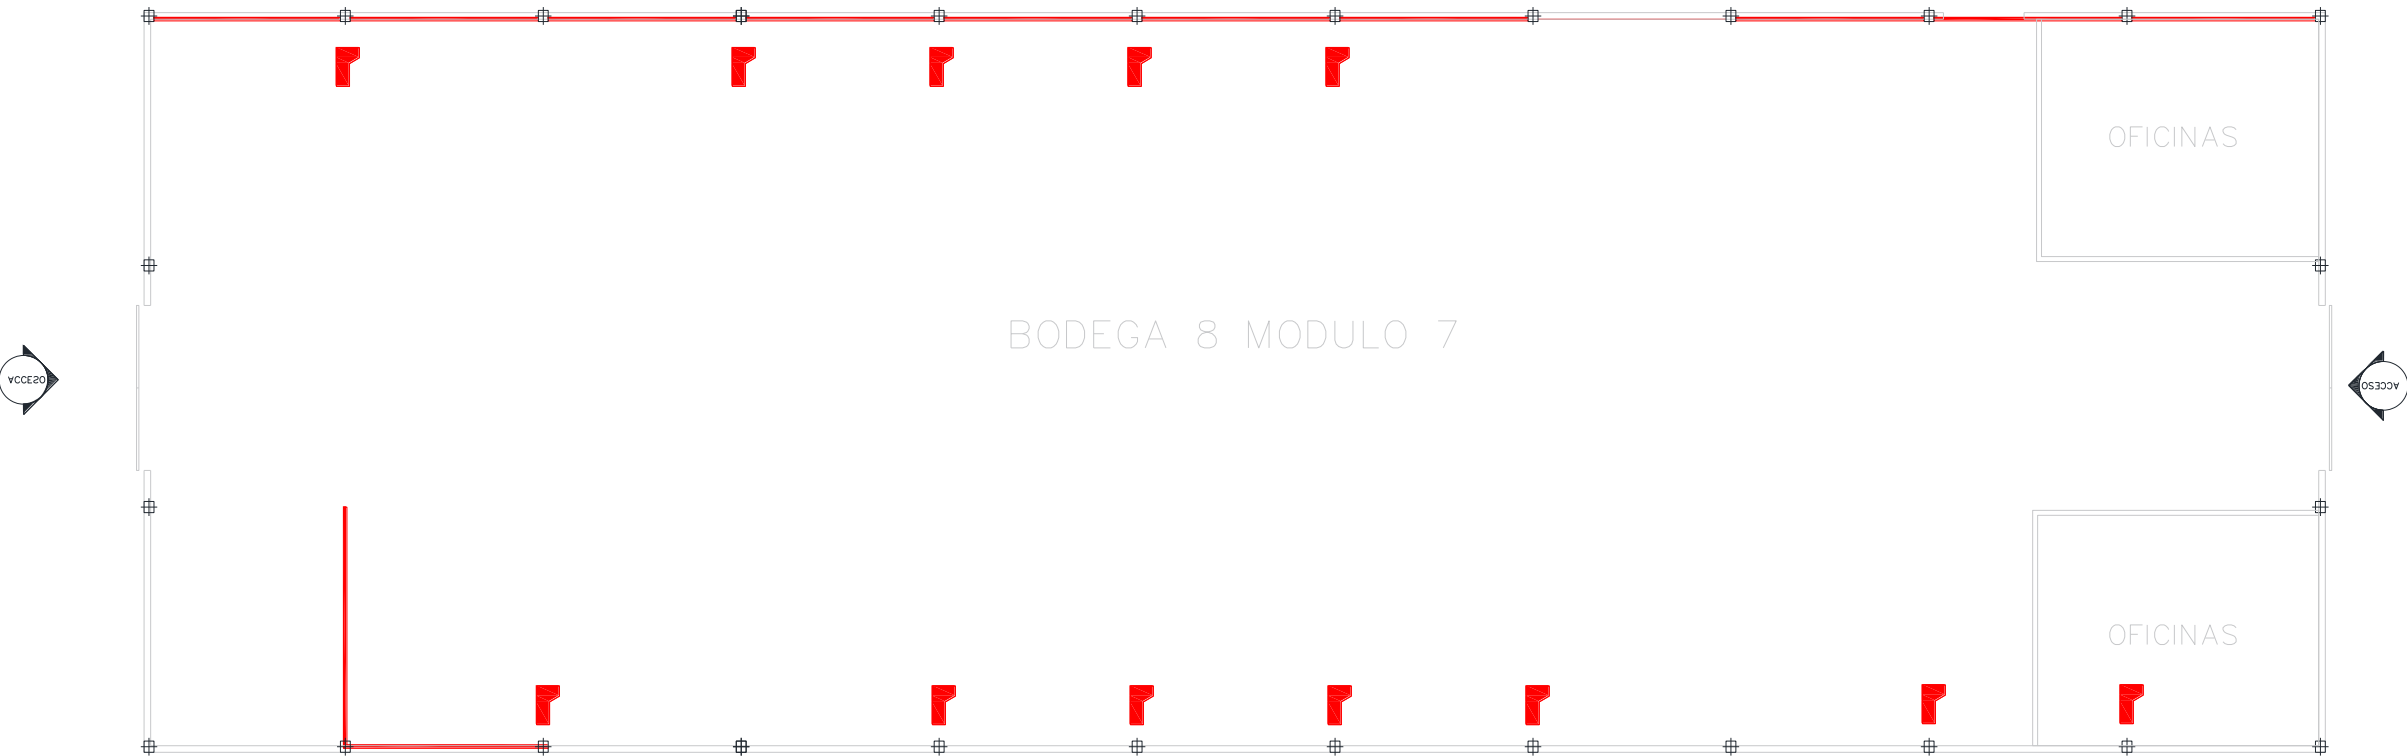

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce


Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UNO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	7	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	7	Mensulas	mensulas en concreto	Und	20	12
MINCIT	Bodega 8	7	Columna	Columnas en concreto	Und	28	0
MINCIT	Bodega 8	7	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	7	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	1
MINCIT	Bodega 8	7	Viga	Viga de concreto	ml	44	0
MINCIT	Bodega 8	7	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	72
MINCIT	Bodega 8	7	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	7	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	7	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.325	0
MINCIT	Bodega 8	7	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	0
MINCIT	Bodega 8	7	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 8	7	Oficina		si		

Bodega 8 modulo 7

Registro fotográfico

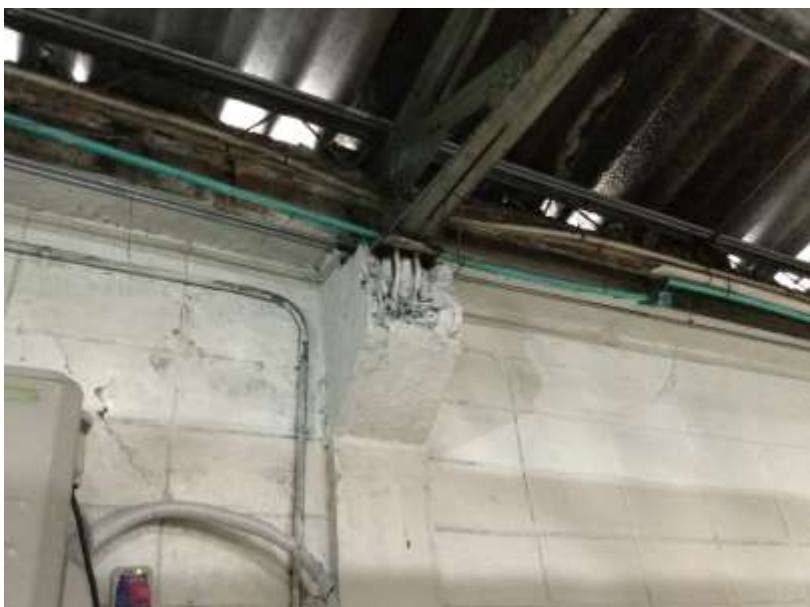


Bodega 8 modulo 7
Registro fotográfico



Bodega 8 modulo 7
Registro fotográfico



Bodega modulo 8 modulo 8

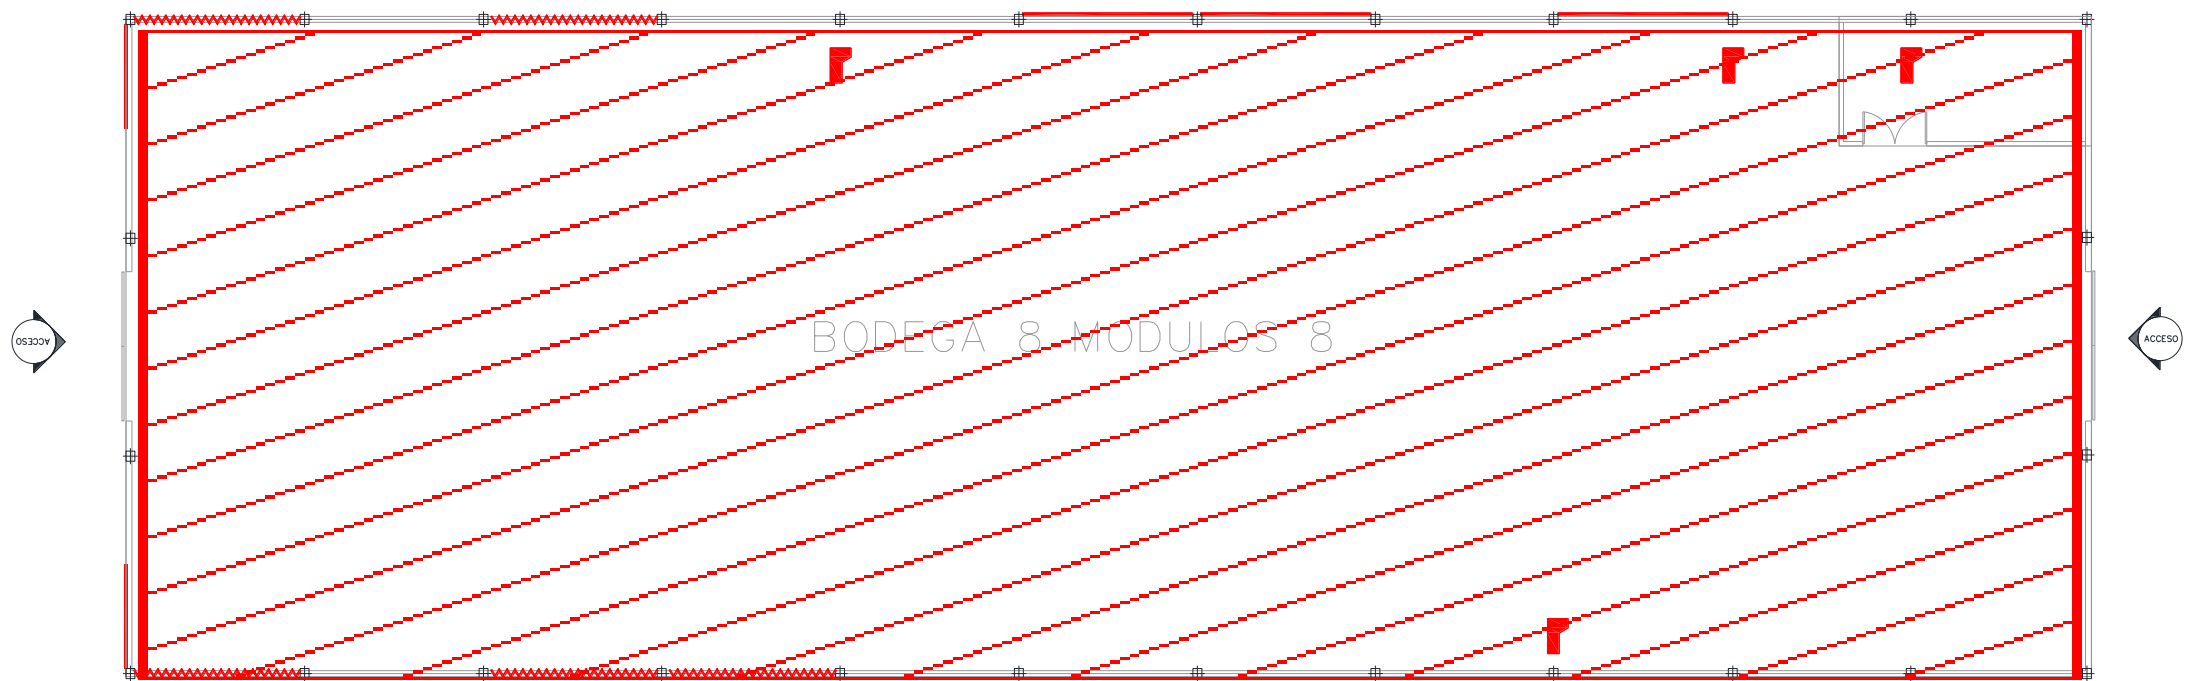

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UNO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	8	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	8	Mensulas	mensulas en concreto	Und	20	4
MINCIT	Bodega 8	8	Columna	Columnas en concreto	Und	28	0
MINCIT	Bodega 8	8	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	8	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	10
MINCIT	Bodega 8	8	Viga	Viga de concreto	ml	44	4
MINCIT	Bodega 8	8	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	18
MINCIT	Bodega 8	8	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	8	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	8	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.399	1.399
MINCIT	Bodega 8	8	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	210
MINCIT	Bodega 8	8	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 8	8	Oficina		si		

Bodega modulo 8 modulo 8
Registro Fotográfico.



Bodega modulo 8 modulo 8
Registro Fotográfico.




Bodega modulo 8 modulo 8
Registro Fotográfico.



Bodega modulo 8 modulo 8
Registro Fotográfico.



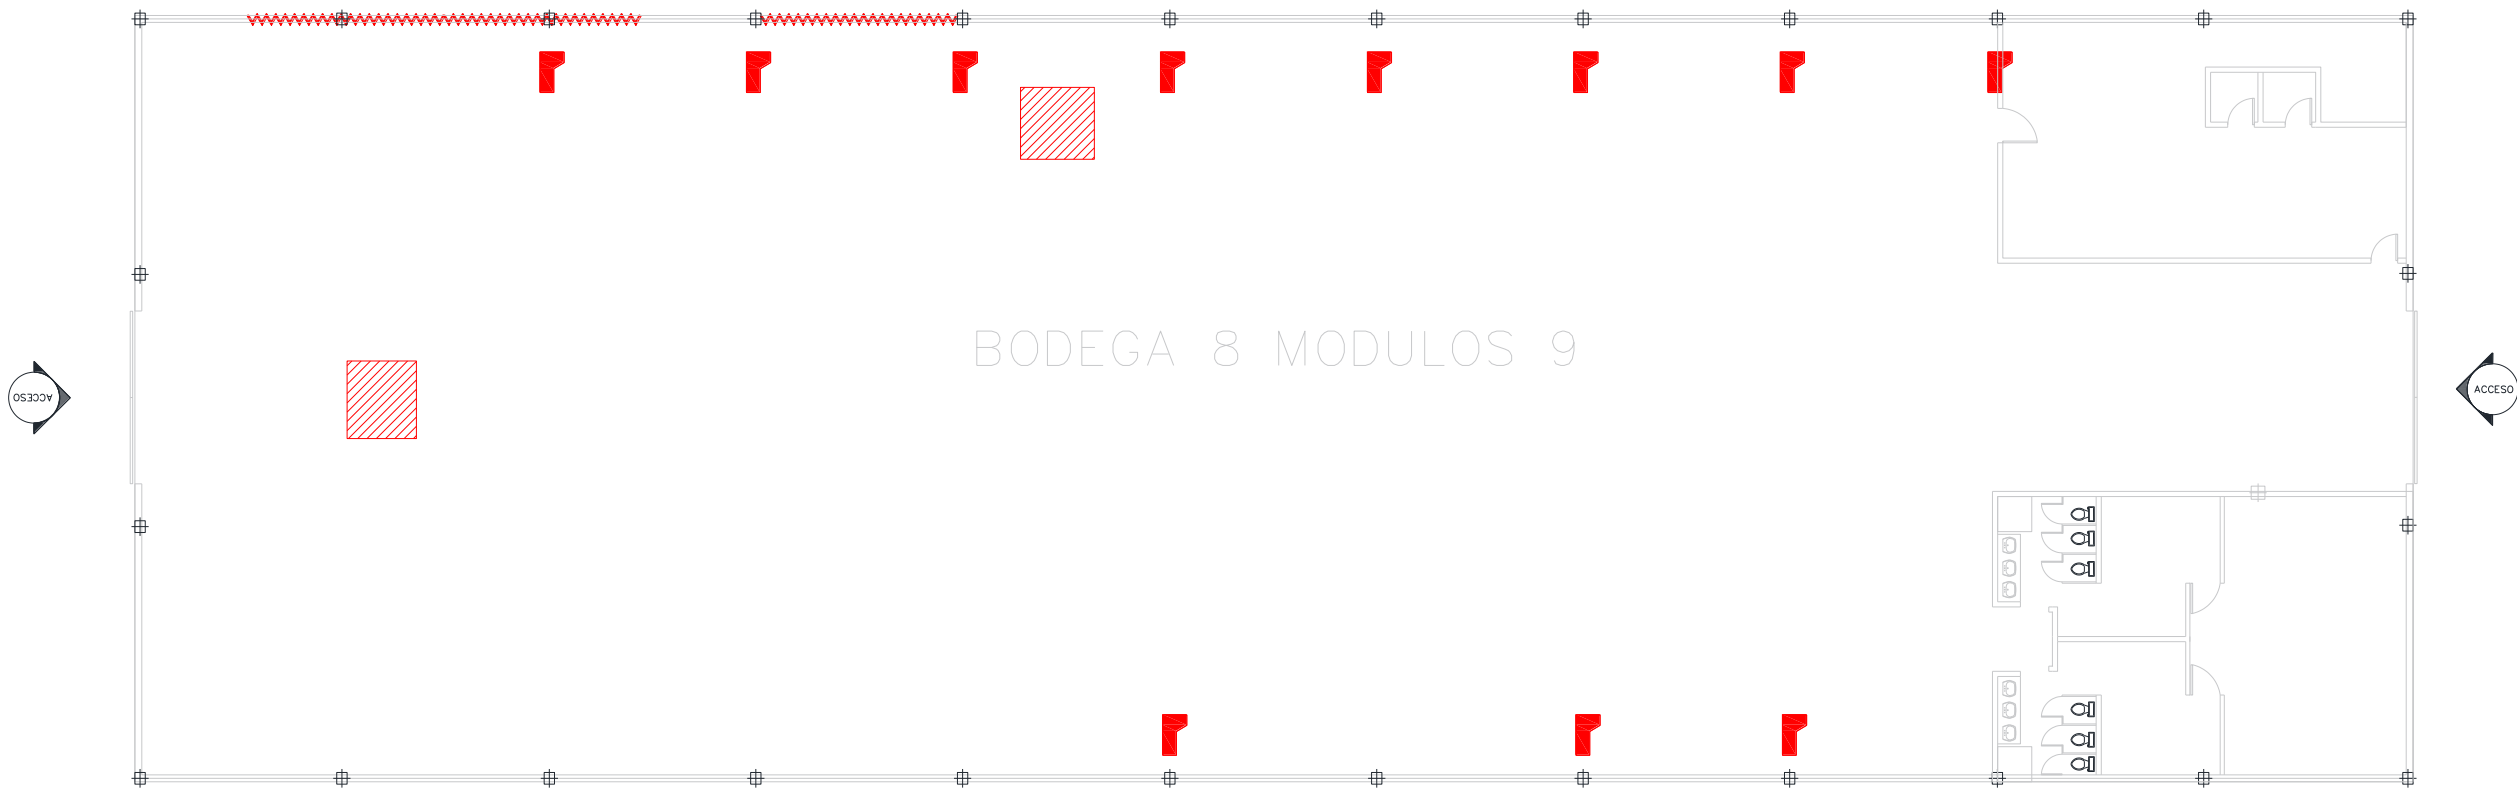

Convenciones


-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripcion de la Bodega:					
		Fecha de inspeccion		martes, 24 de septiembre de 2024			
		Ubicación		Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	9	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	9	Mensulas	mensulas en concreto	Und	20	11
MINCIT	Bodega 8	9	Columna	Columnas en concreto	Und	28	0
MINCIT	Bodega 8	9	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	9	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	10
MINCIT	Bodega 8	9	Viga	Viga de concreto	ml	178	0
MINCIT	Bodega 8	9	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	0
MINCIT	Bodega 8	9	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	9	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	9	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	1.255	8
MINCIT	Bodega 8	9	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	50
MINCIT	Bodega 8	9	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 8	9	Oficina		si		

Bodega 8 modulo 9
Registro Fotográfico.

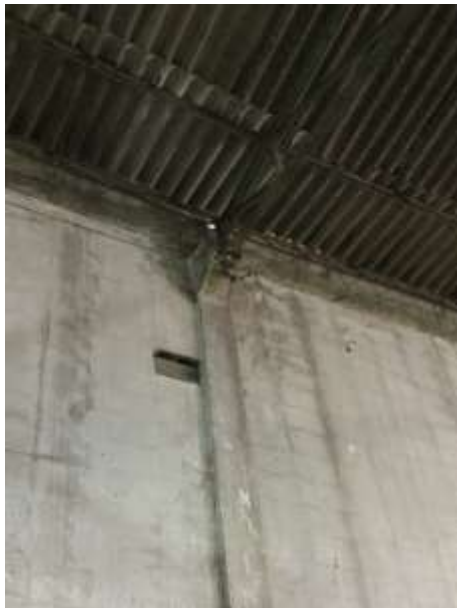

Bodega 8 modulo 9
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 9
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 9
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 10-11

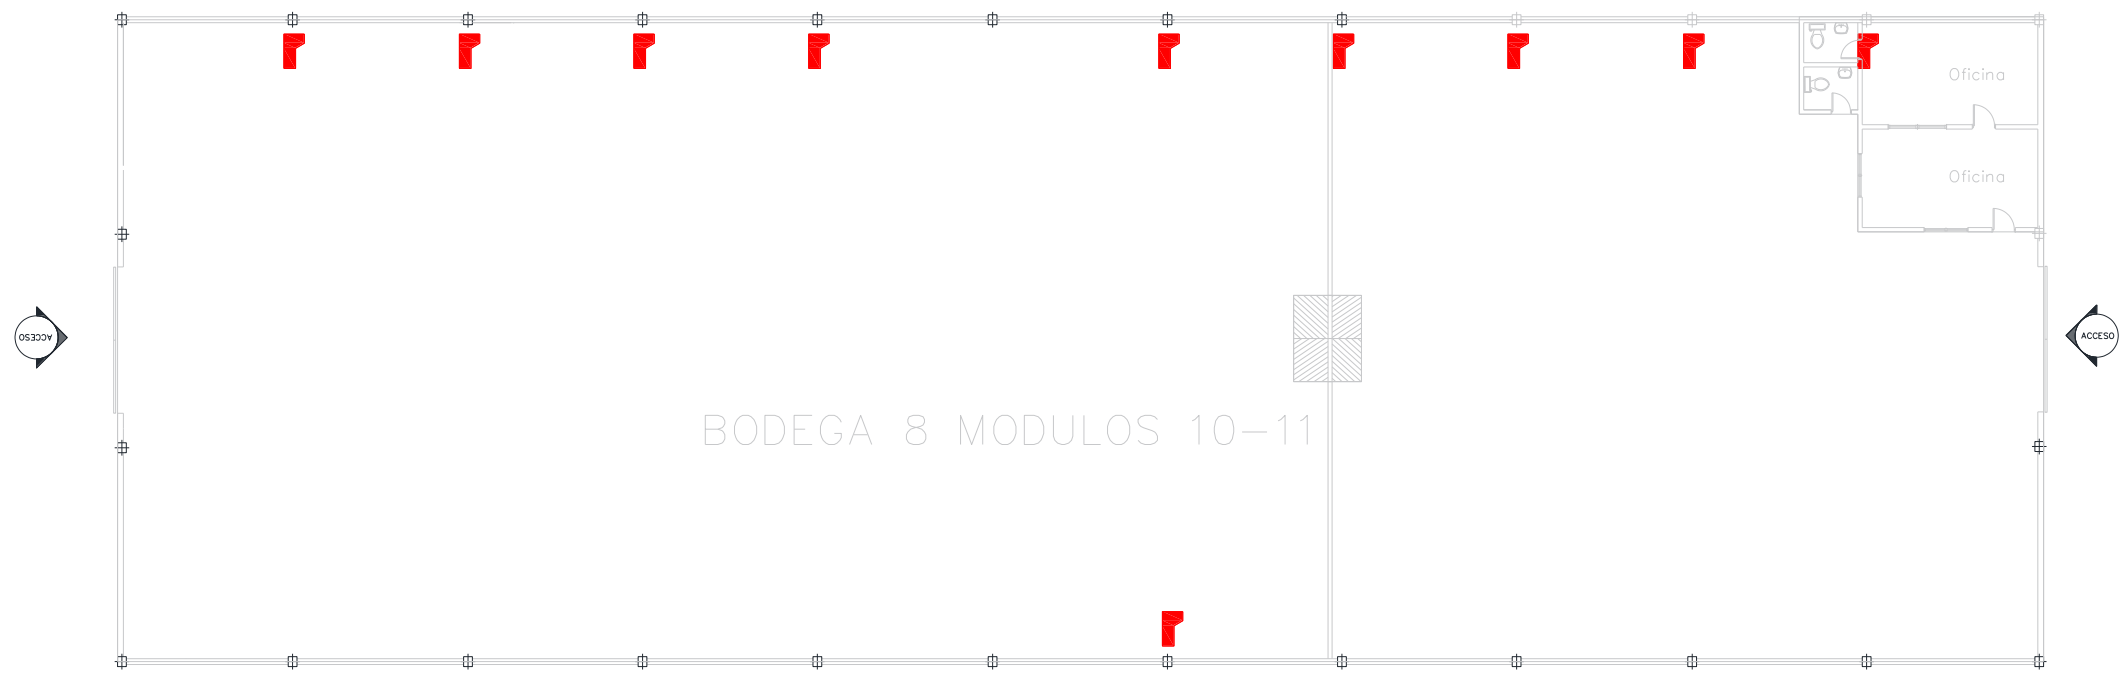

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	10 11	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Mensulas	mensulas en concreto	Und	20	10
MINCIT	Bodega 8	10 11	Columna	Columnas en concreto	Und	28	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	10 11	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Viga	Viga de concreto	ml	178	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.386	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 8	10 11	Oficina		SI		

Bodega 8 modulo 10-11
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 10-11
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 10-11
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 10-11
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 12

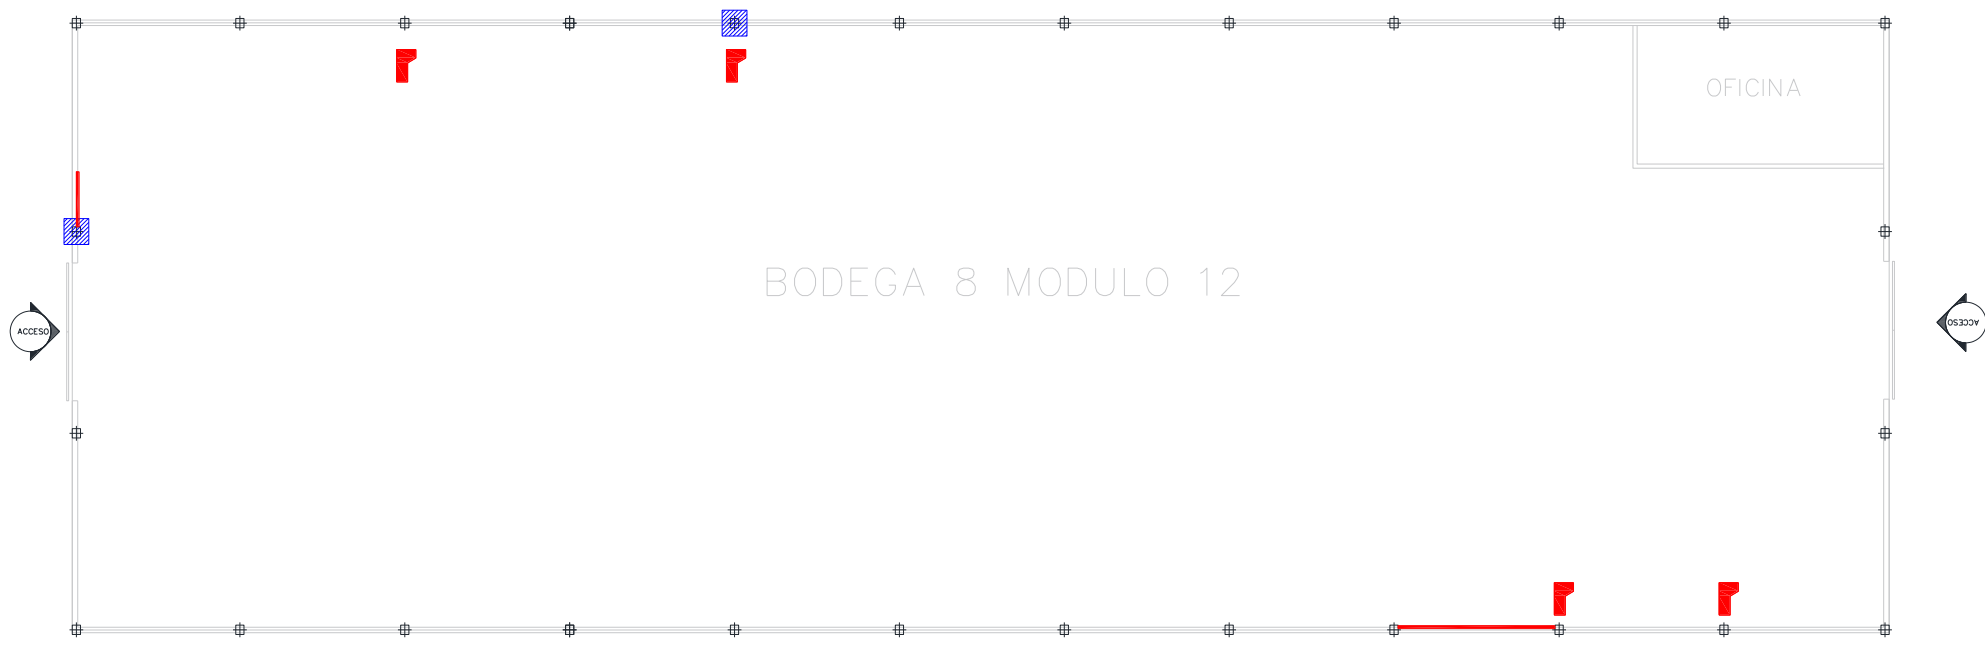

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	12	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	12	Mensulas	mensulas en concreto	Und	20	4
MINCIT	Bodega 8	12	Columna	Columnas en concreto	Und	28	0
MINCIT	Bodega 8	12	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	12	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	0
MINCIT	Bodega 8	12	Viga	Viga de concreto	ml	178	2
MINCIT	Bodega 8	12	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	6
MINCIT	Bodega 8	12	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	12	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	12	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.386	0
MINCIT	Bodega 8	12	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	0
MINCIT	Bodega 8	12	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 8	12	Oficina		si		

Bodega 8 modulo 12
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 12
Registro Fotográfico.






Bodega 8 modulo 12
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 13

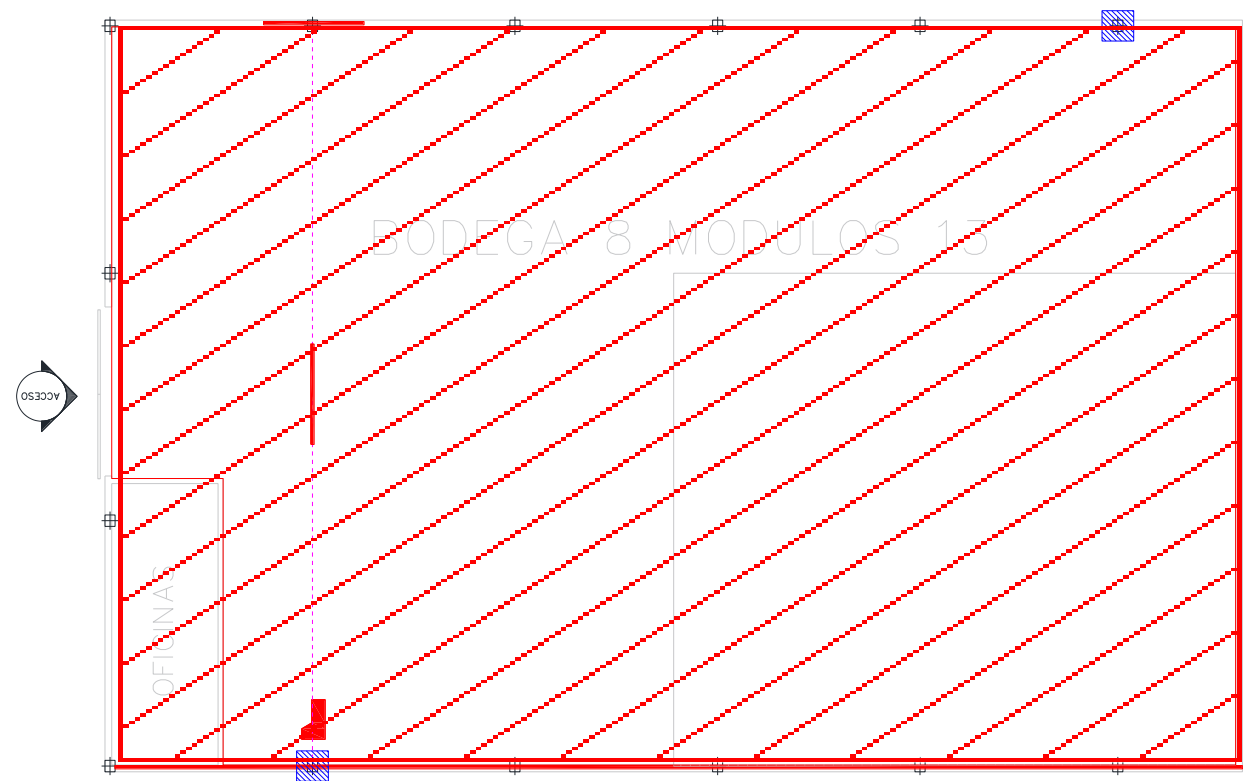

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA	ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	13	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	110	0
MINCIT	Bodega 8	13	Mensulas	mensulas en concreto	und	10	1
MINCIT	Bodega 8	13	Columna	Columnas en concreto	und	18	1
MINCIT	Bodega 8	13	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	und	96	0
MINCIT	Bodega 8	13	Cercha	cercha metalica en angulo	und	5	1
MINCIT	Bodega 8	13	Viga	Viga de concreto	ml	44	0
MINCIT	Bodega 8	13	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	67,2	35
MINCIT	Bodega 8	13	Cubierta	Eternit Ondulada	und	490	0
MINCIT	Bodega 8	13	Cubierta	caballetes Eternit	und	38	0
MINCIT	Bodega 8	13	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto y cuenta con una zona de piso en tablon rojo de 243 m2	m2	701	701
MINCIT	Bodega 8	13	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	776	0
MINCIT	Bodega 8	13	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 8	13	Oficina	En levante	SI		

Bodega 8 modulo 13
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 13
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 13
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 13
Registro Fotográfico.

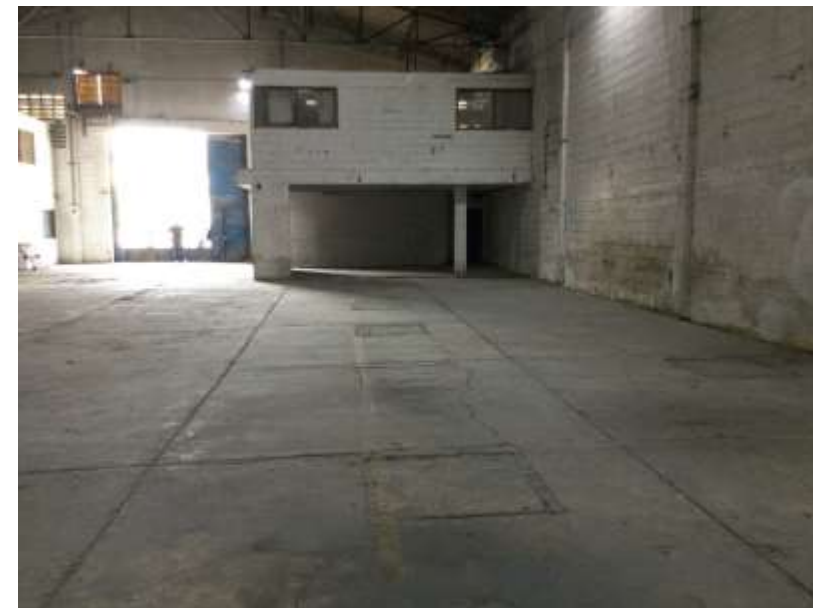

Bodega 8 modulo 13A

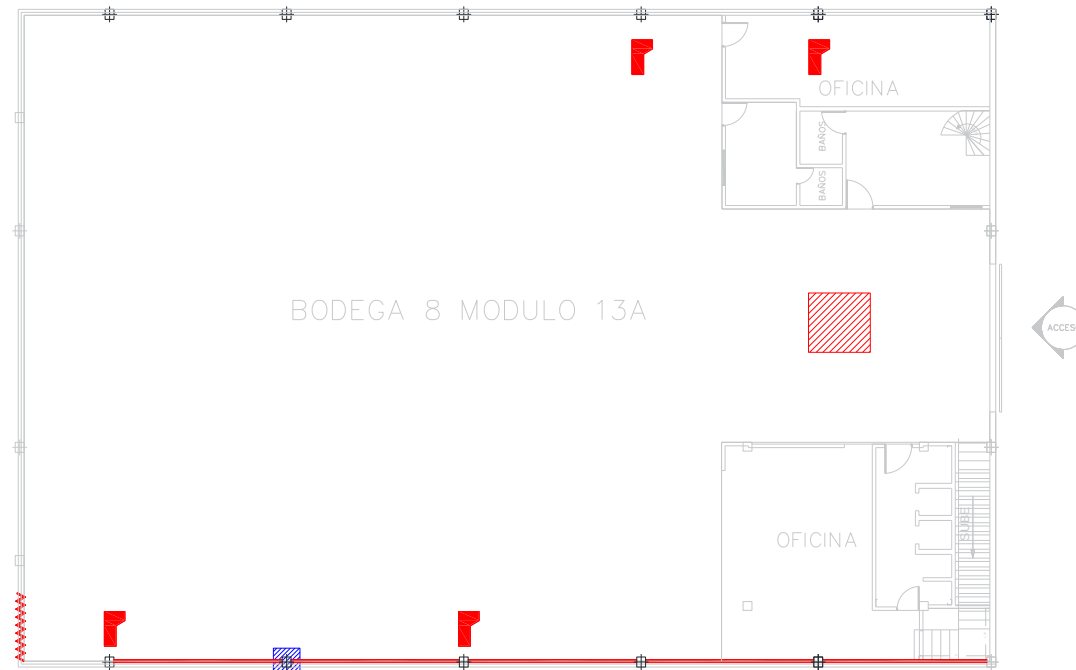

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	13A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	110	0
MINCIT	Bodega 8	13A	Mensulas	mensulas en concreto	Und	10	4
MINCIT	Bodega 8	13A	Columna	Columnas en concreto	Und	18	1
MINCIT	Bodega 8	13A	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	96	96
MINCIT	Bodega 8	13A	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	5	5
MINCIT	Bodega 8	13A	Viga	Víga de concreto	ml	70	0
MINCIT	Bodega 8	13A	Viga Canal	Víga canal en concreto	ml	66	33
MINCIT	Bodega 8	13A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	490	0
MINCIT	Bodega 8	13A	Cubierta	caballetes Eternit	und	37	0
MINCIT	Bodega 8	13A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	589	9
MINCIT	Bodega 8	13A	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	639	16
MINCIT	Bodega 8	13A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 8	13A	Oficina		SI		

Bodega 8 modulo 13A
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 13A
Registro Fotográfico.



Bodega 8 modulo 13A
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 14



Nota: No se pudo visitar por estar cerrada

Bodega 8 módulos 15- 15 A

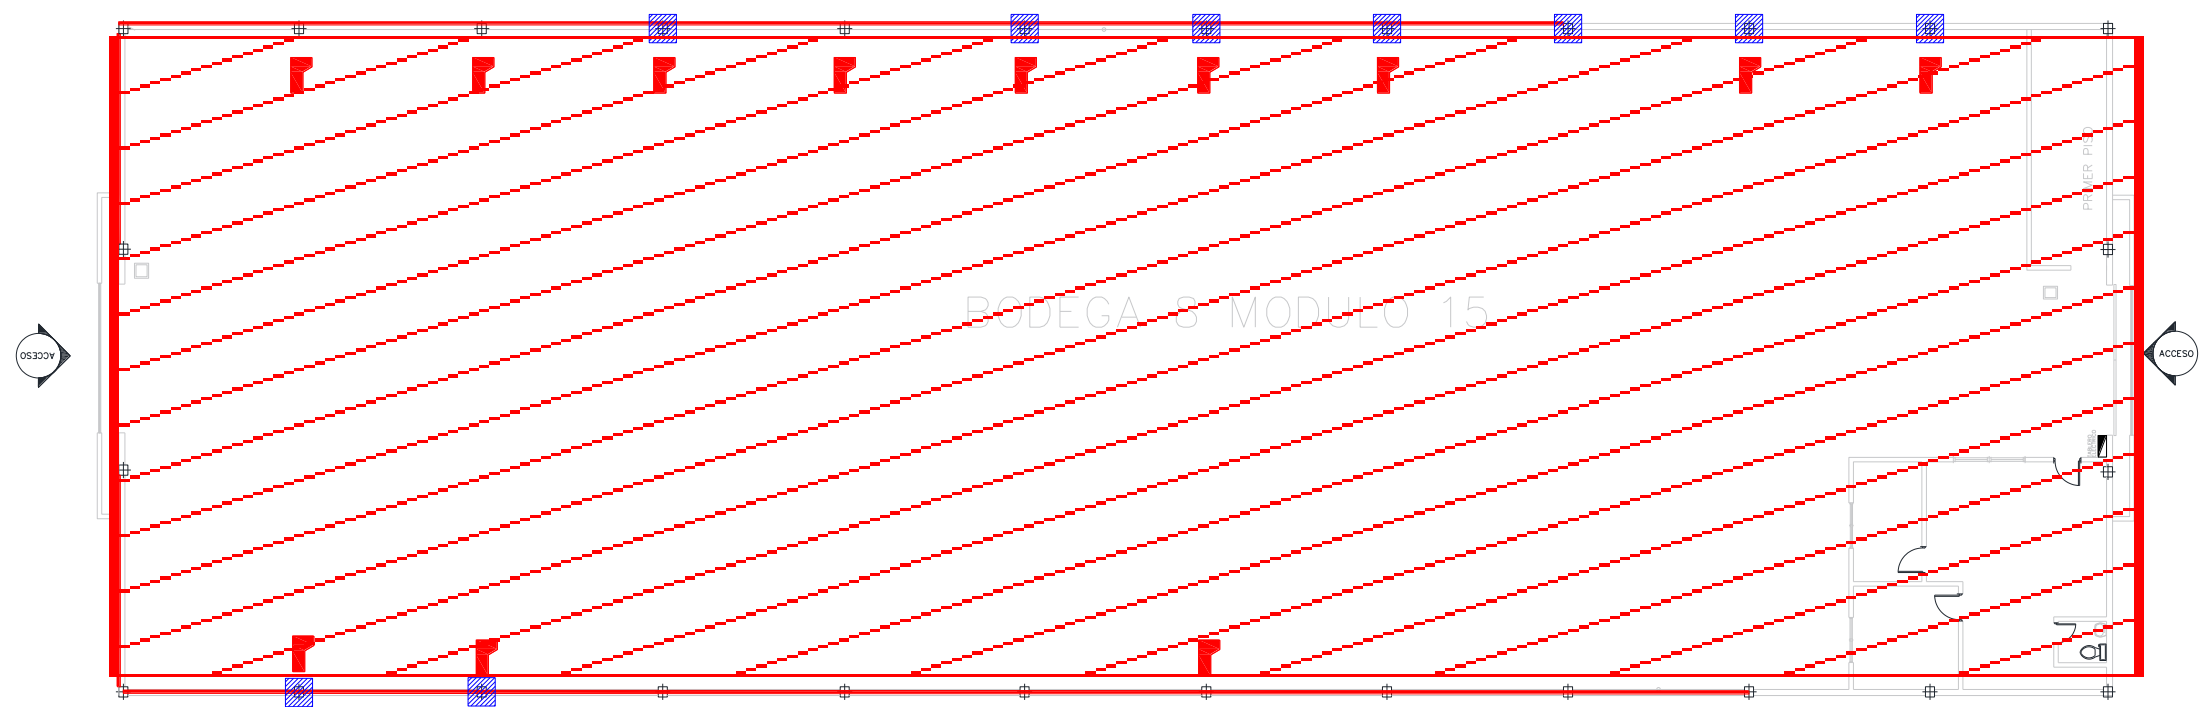

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Mensulas	mensulas en concreto	und	20	12
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Columna	Columnas en concreto	und	28	9
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	und	176	0
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Cercha	cercha metalica en angulo	und	10	0
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Viga	Viga de concreto	ml	44	14
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	102
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto y presenta dos zona en baldosas tipo tablon, que proporciona una superficie capaz de soportar cargas pesadas.	m2	1.351	1.351
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	0
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 8	15 15A	Oficina	En levante	Si		


Bodega 8 módulos 15- 15 A
Registro Fotográfico.



Bodega 8 módulos 15- 15 A
Registro Fotográfico.



Bodega 8 módulos 15- 15 A
Registro Fotográfico.

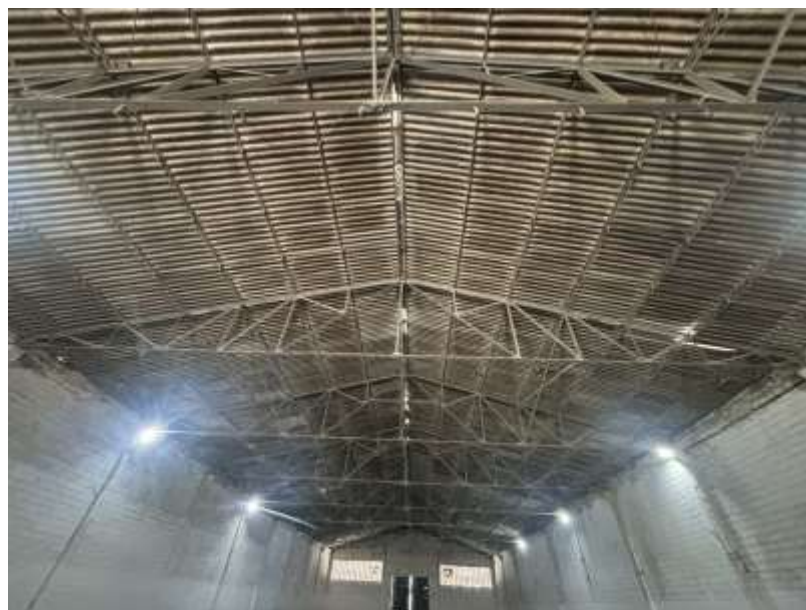

Bodega 8 módulos 15- 15 A
Registro Fotográfico.




Fachada Norte Cra 1




Fachada Sur Cra 2



Bodega 8 módulos 15- 15 A
Registro Fotográfico.

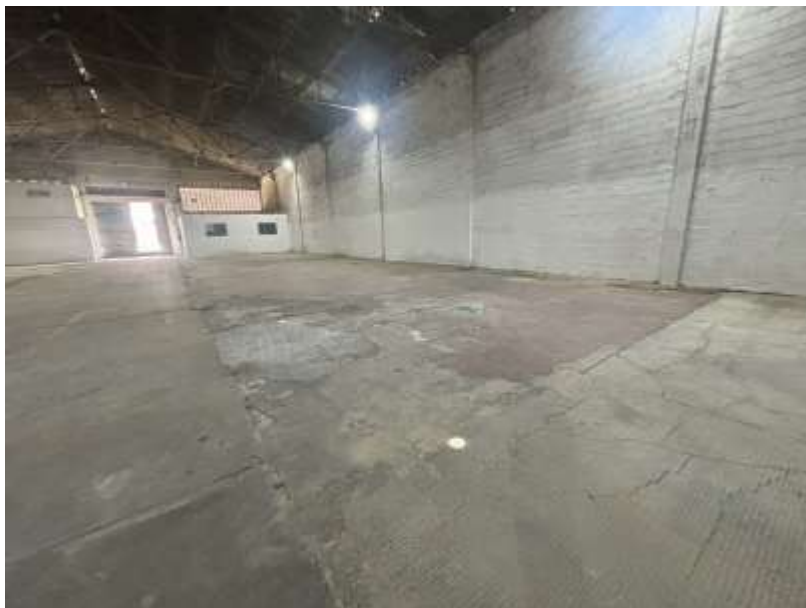

Bodega 8 modulo 16/17

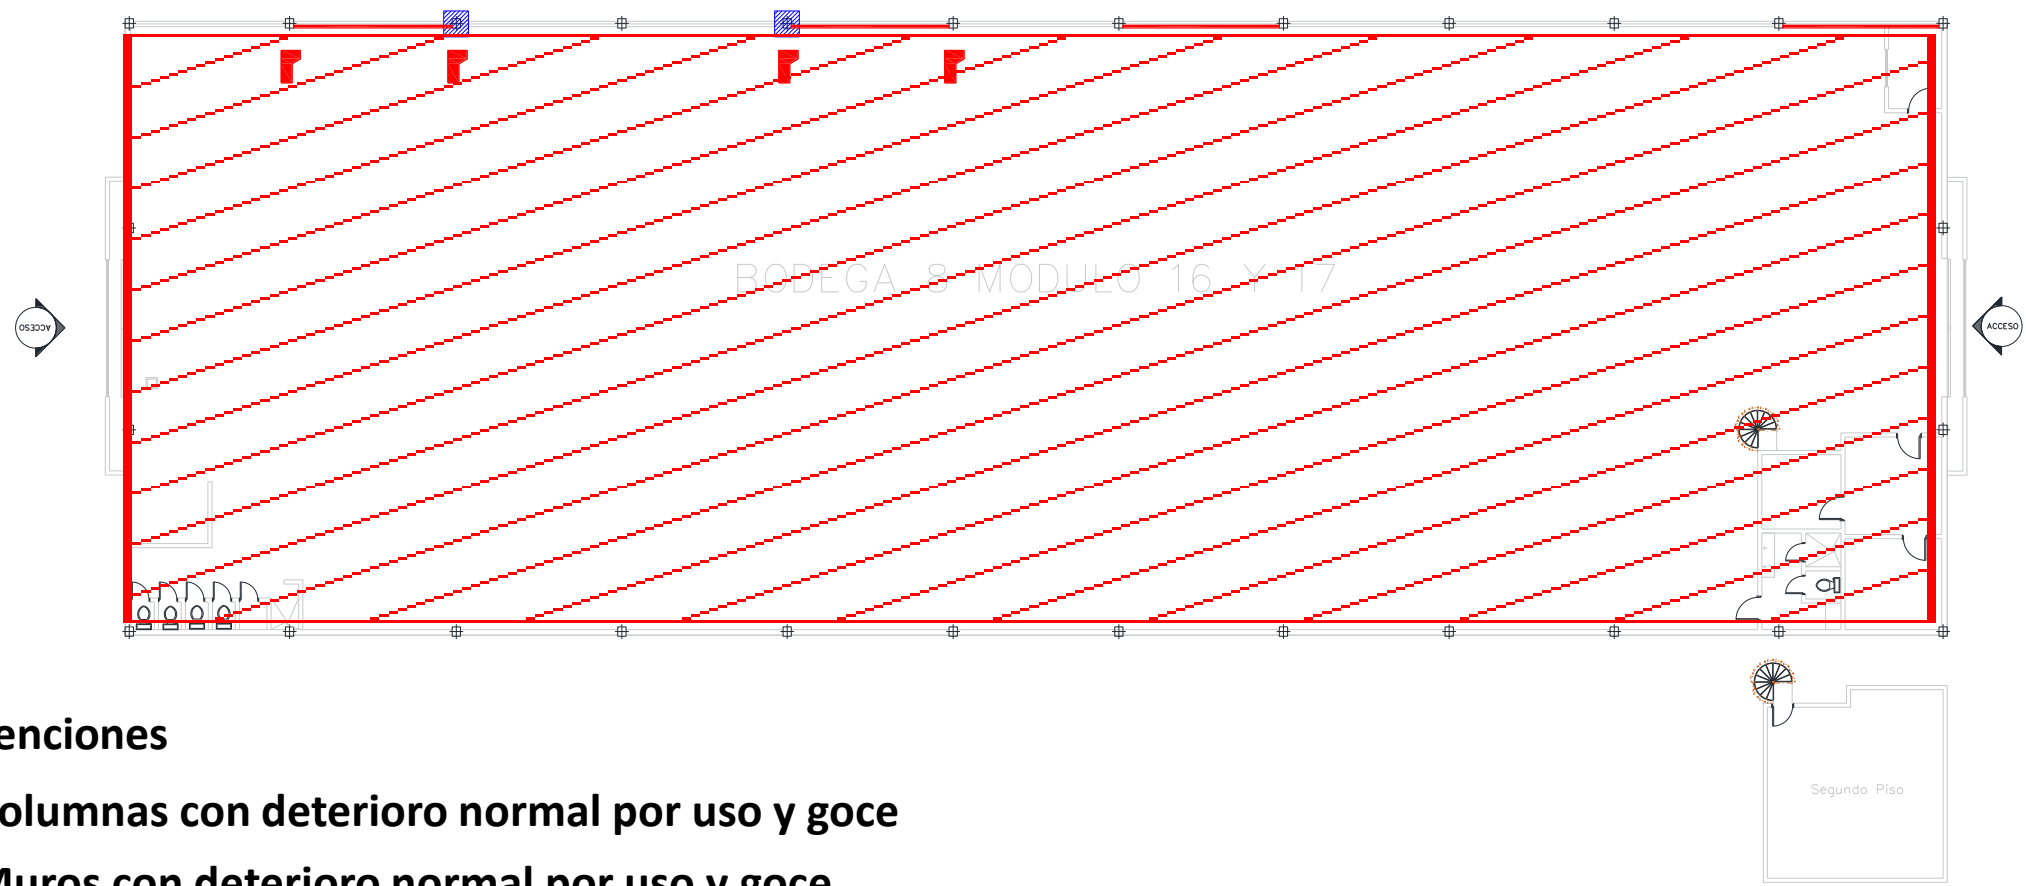

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce
-  Ménsulas con deterioro normal por uso y goce

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripcion de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/U O	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 8	16 17	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	176	0
MINCIT	Bodega 8	16 17	Mensulas	mensulas en concreto	Und	20	12
MINCIT	Bodega 8	16 17	Columna	Columnas en concreto	Und	28	9
MINCIT	Bodega 8	16 17	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	176	176
MINCIT	Bodega 8	16 17	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	10	0
MINCIT	Bodega 8	16 17	Viga	Viga de concreto	ml	44	14
MINCIT	Bodega 8	16 17	Viga Canal	Viga canal en concreto	ml	132	102
MINCIT	Bodega 8	16 17	Cubierta	Eternit Ondulada	und	981	0
MINCIT	Bodega 8	16 17	Cubierta	caballetes Eternit	und	75	0
MINCIT	Bodega 8	16 17	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto y presenta dos zona en baldosas tipo tablon, que proporciona una superficie capaz de soportar cargas pesadas.	m2	1.351	1.351
MINCIT	Bodega 8	16 17	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1068	0
MINCIT	Bodega 8	16 17	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	2
MINCIT	Bodega 8	16 17	Oficina			SI	

Bodega 8 modulo 16/17
Registro Fotográfico.





Bodega 8 modulo 16/17
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 16/17
Registro Fotográfico.




Bodega 8 modulo 16/17
Registro Fotográfico.

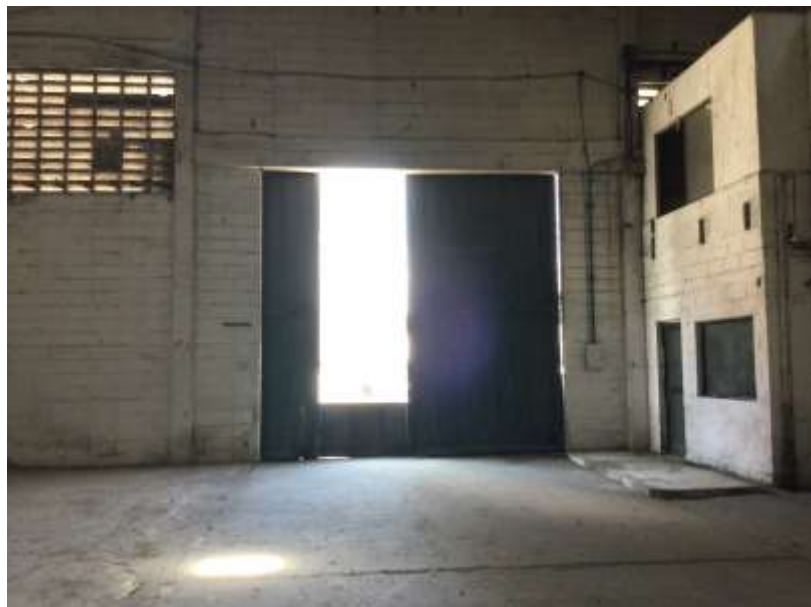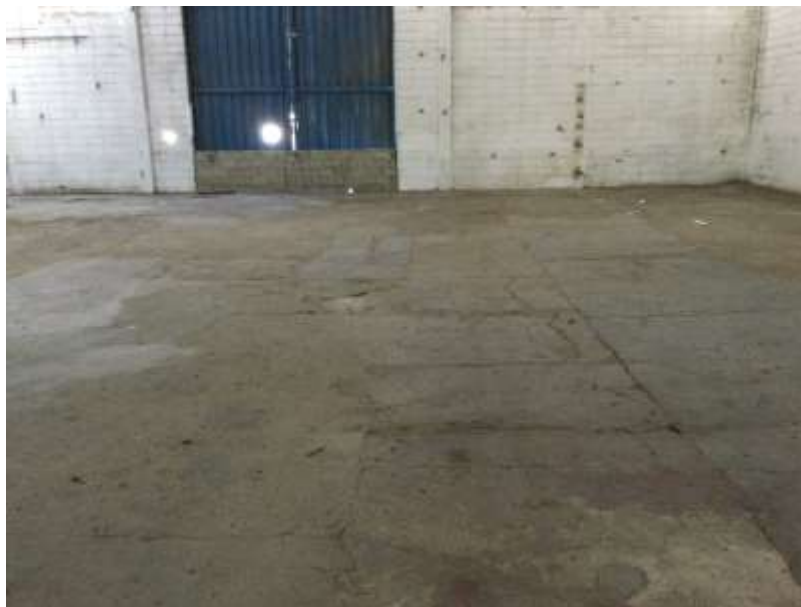

Bodega 9

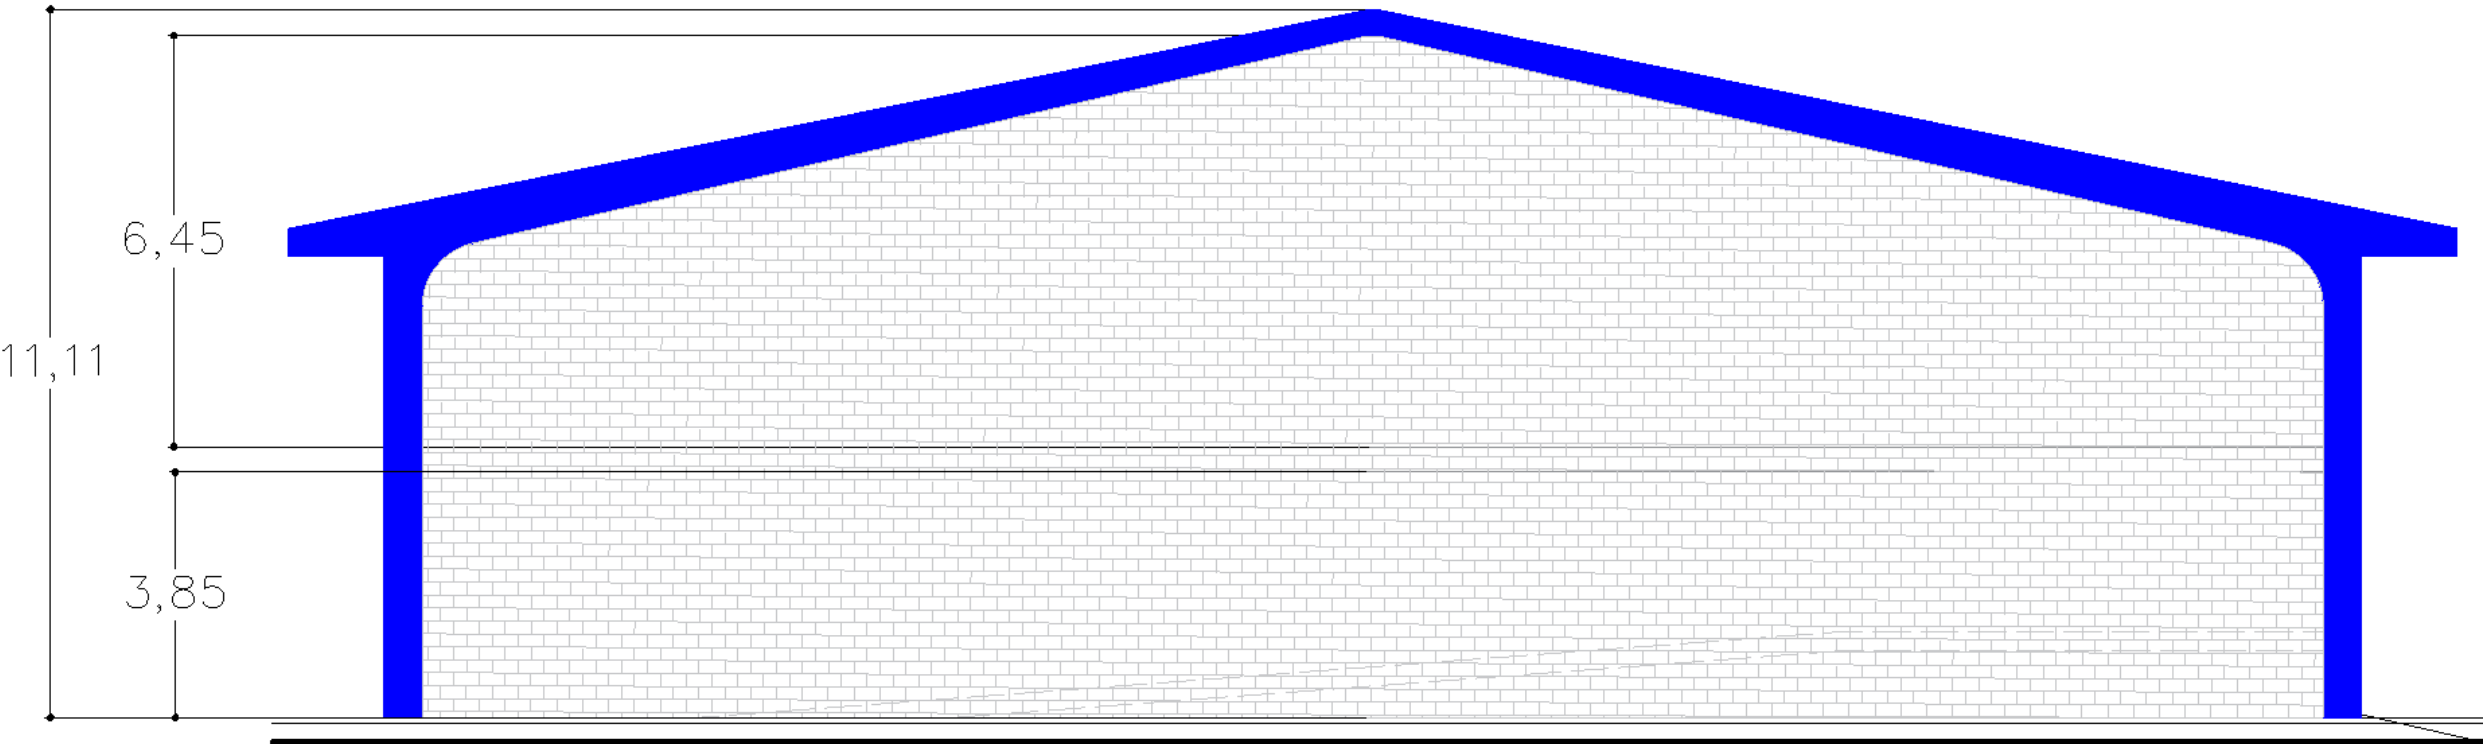

Bodega 9

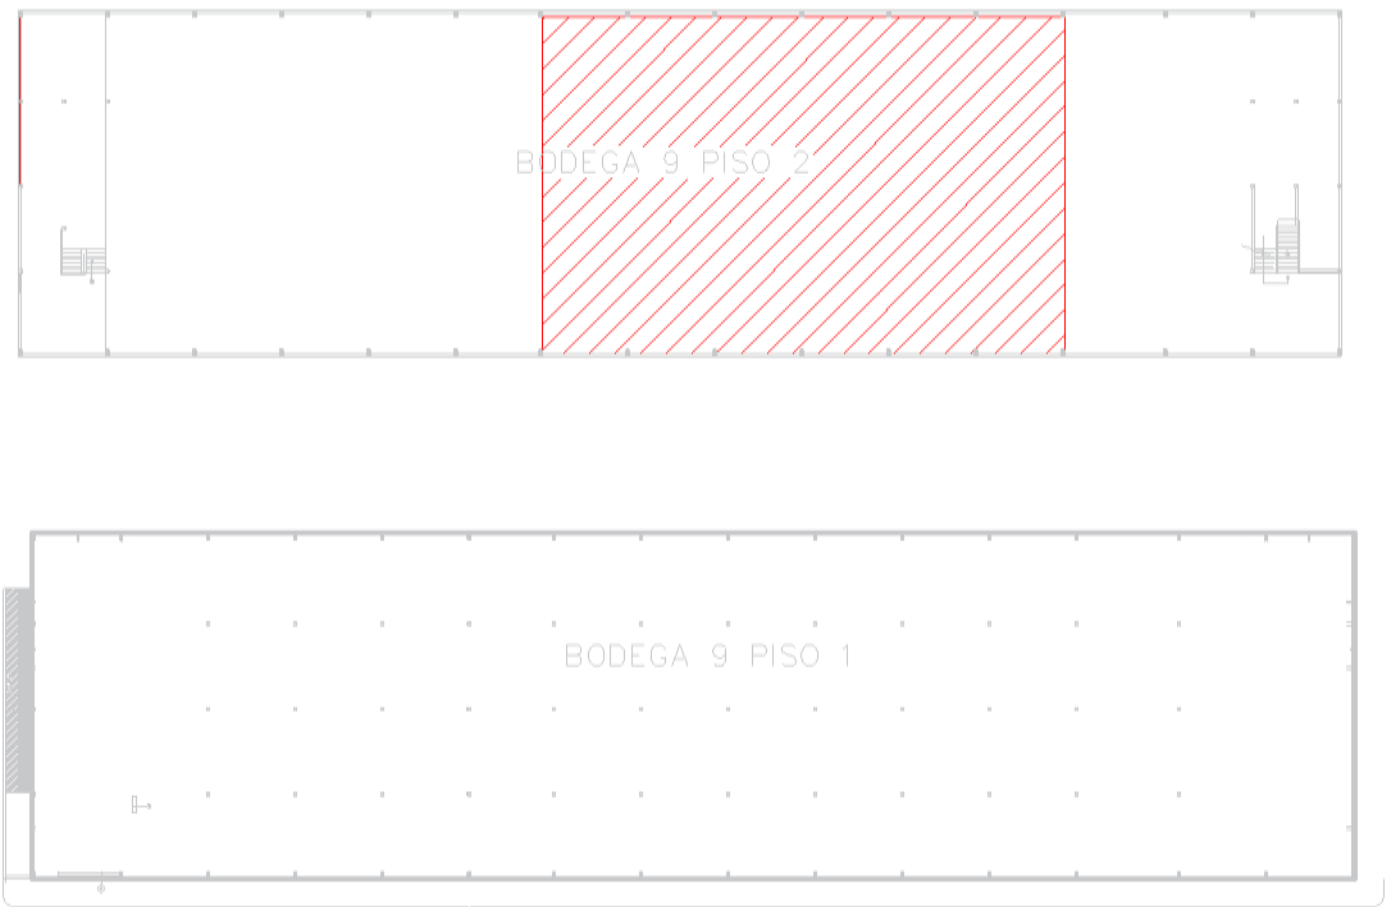

Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Bodega 9

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UNO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	294	0
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Columna	Columnas en concreto	Und	32	0
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Correa	correas en concreto prefabricadas tipo U	Und	120	16
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Viga	Viga de concreto	ml	362	6
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	losa de entre piso	losa en concreto	m2	3410,07	0
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Cubierta	Eternit canaleta 90	und	1033	15
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Cubierta	caballetes Eternit	und	187	4
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	3.410	1.404
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	2284	0
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 9	Piso 1- Piso 2	Oficina			SI	

Bodega 9
Registro Fotográfico.




Bodega 9
Registro Fotográfico.



Bodega 9
Registro Fotográfico.



Bodega 10

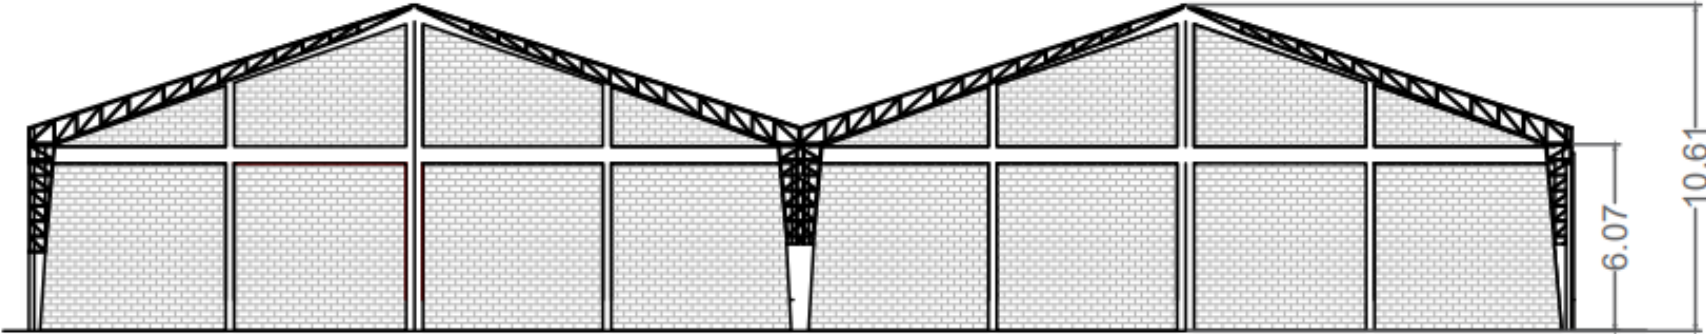

Bodega 10 modulo 1 - 2



Convenciones

-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Descripción de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 10	1 2	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	190	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	12	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Columna	Columnas en concreto	Und	18	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	160	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	12	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Viga	Viga de concreto	ml	284	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	45	20
MINCIT	Bodega 10	1 2	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1520	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Cubierta	caballetes Eternit	und	105	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	2.250	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1110	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	0
MINCIT	Bodega 10	1 2	Oficina		SI		




Bodega 10 modulo 1 - 2
Registro Fotográfico.




Bodega 10 modulo 1 - 2
Registro Fotográfico.



Bodega 10 modulo 1 - 2
Registro Fotográfico.

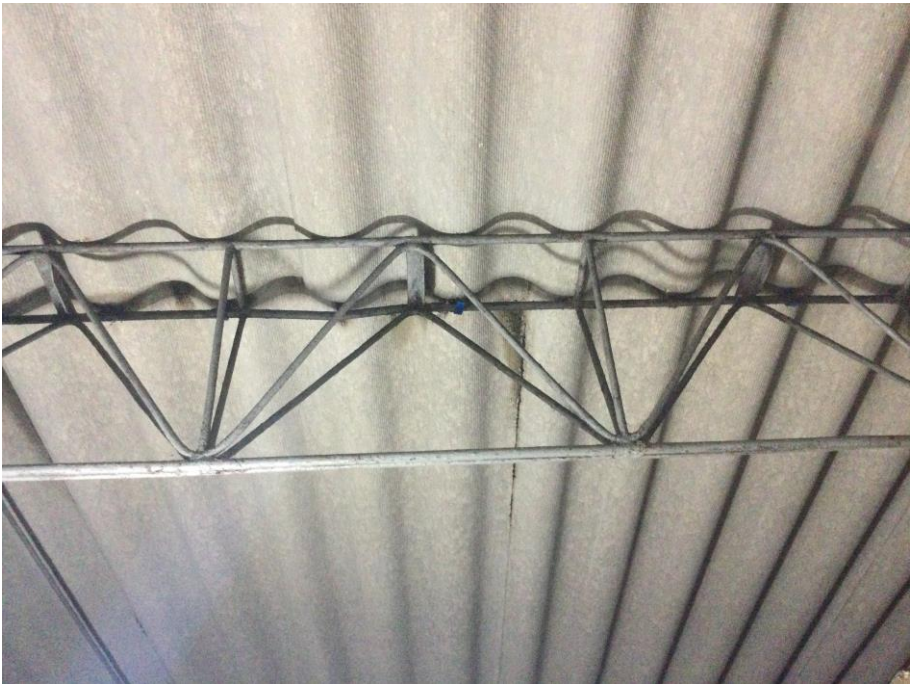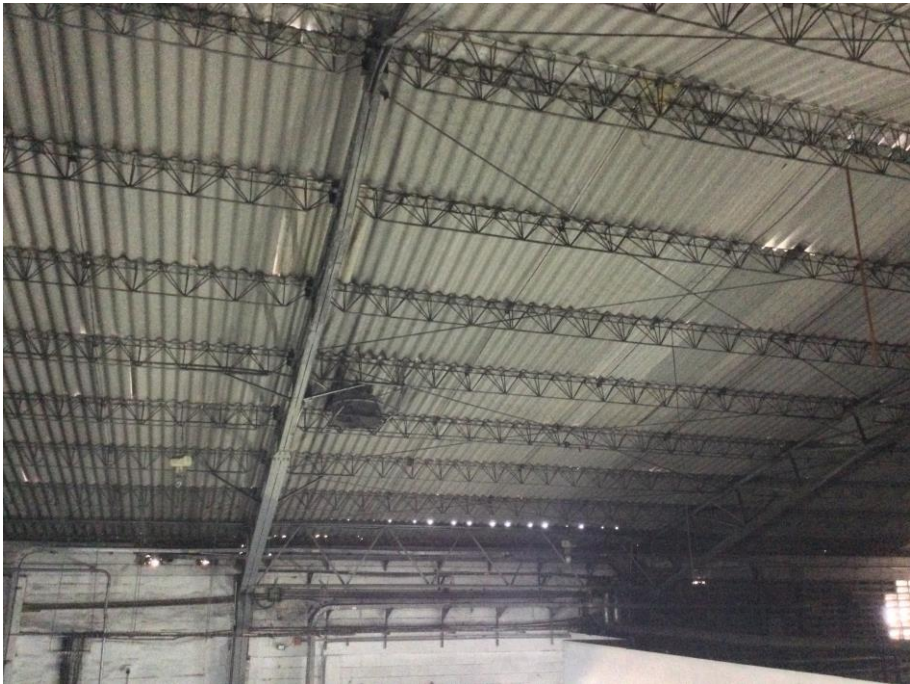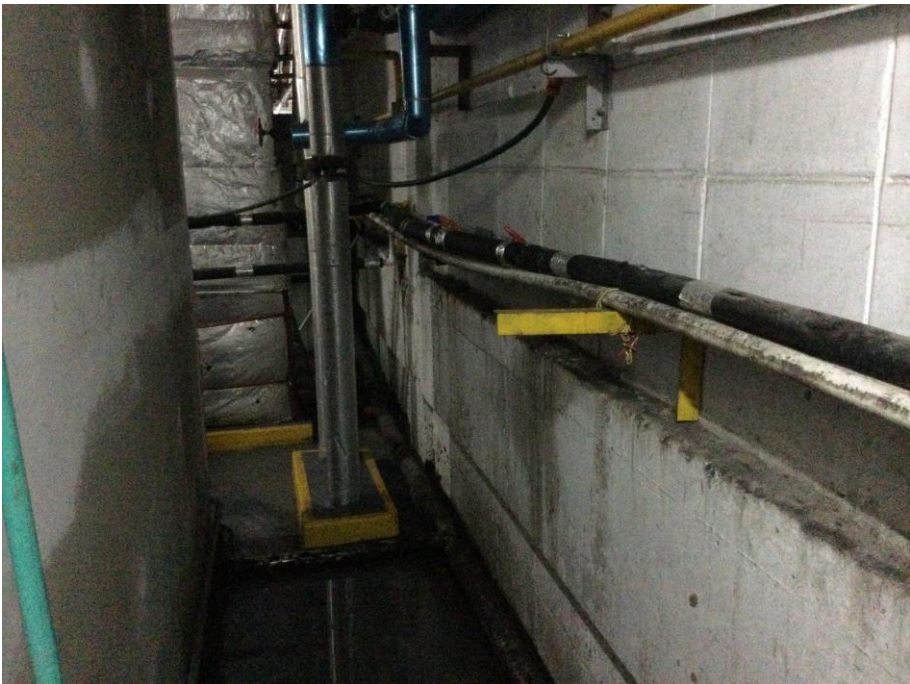

Bodega 10 modulo 3-4

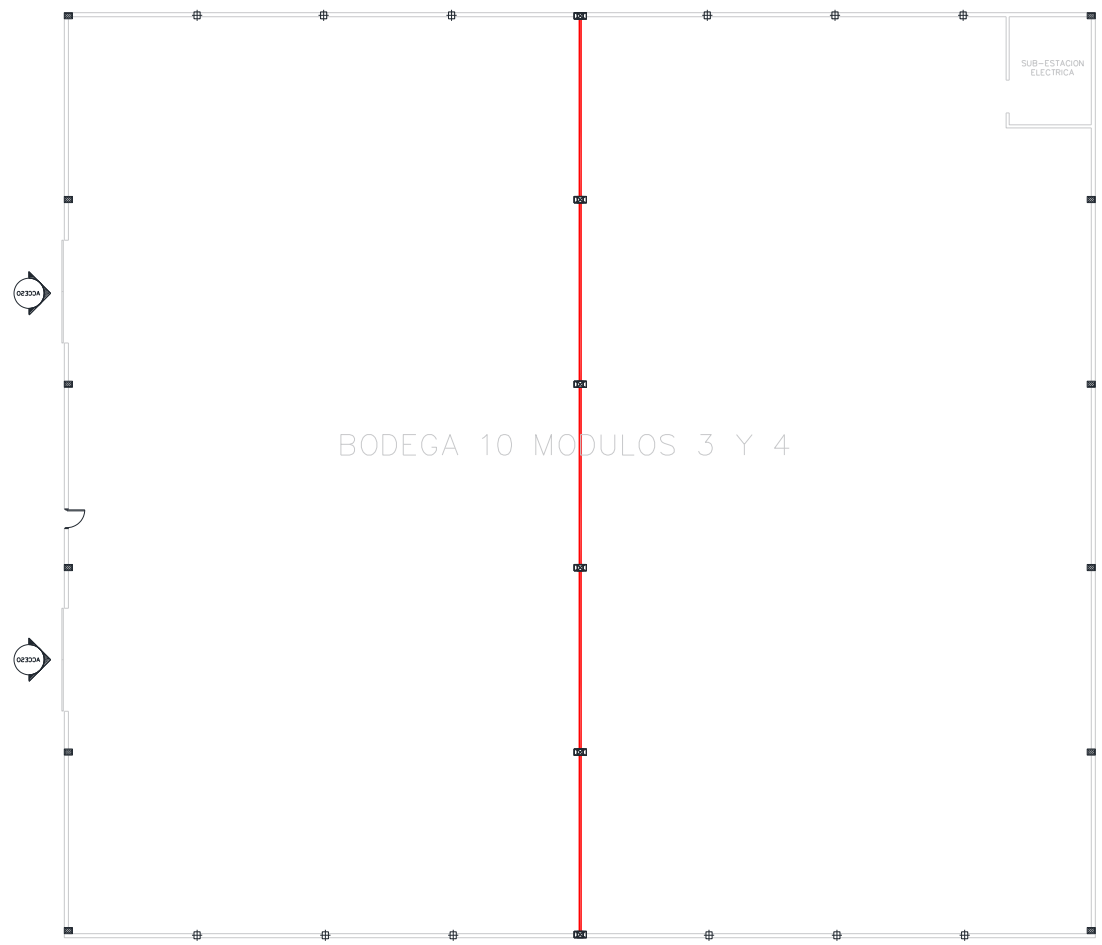

Convenciones


-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

			Descripción de la Bodega:				
FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 10	3 4	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	190	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	12	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Columna	Columnas en concreto	Und	18	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	160	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	12	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Viga	Viga de concreto	ml	284	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	45	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Cubierta	Eternit Ondulada	und	1520	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Cubierta	caballetes Eternit	und	105	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	2.250	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	1110	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	0
MINCIT	Bodega 10	3 4	Oficina		NO		




Bodega 10 modulo 3-4
Registro Fotográfico.

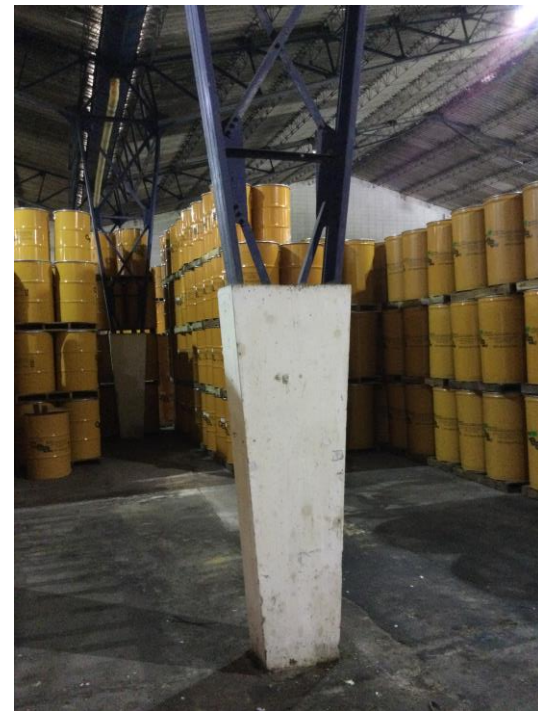


Bodega 10 modulo 3-4
Registro Fotográfico.

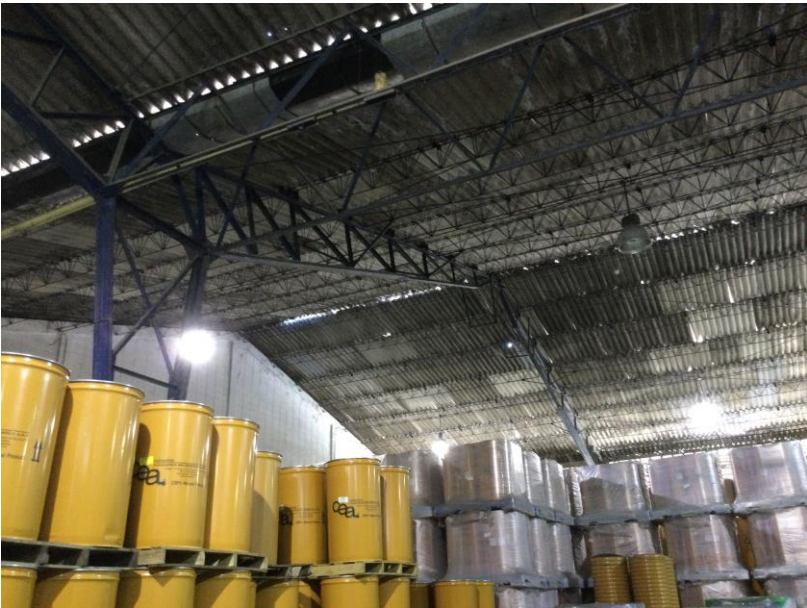

Bodega 10 modulo 3-4
Registro Fotográfico.

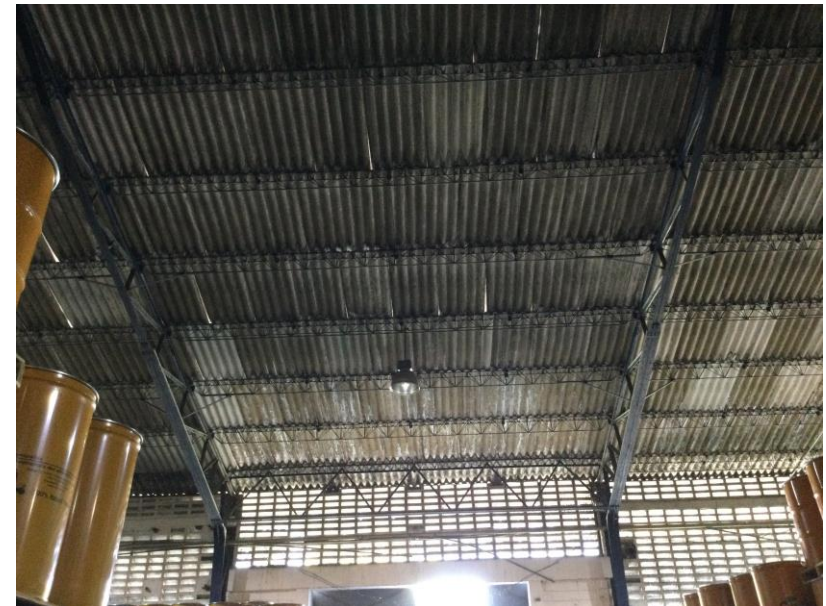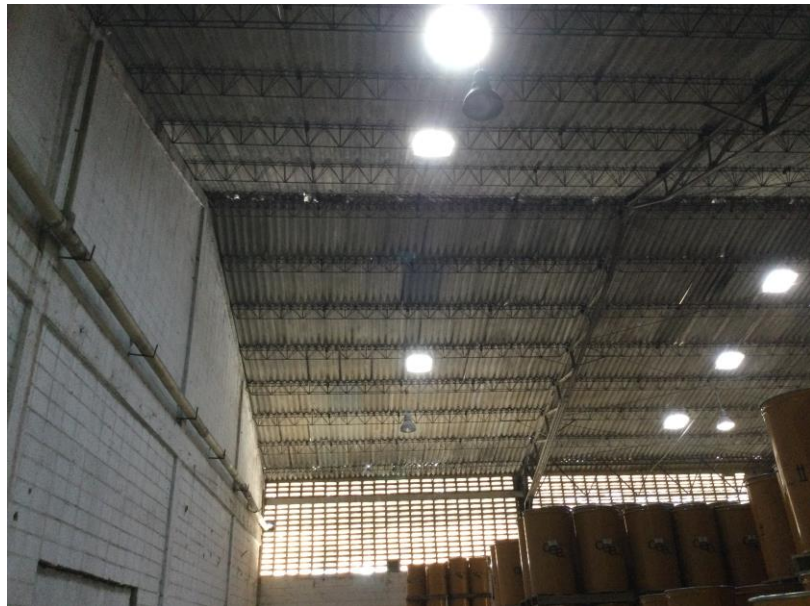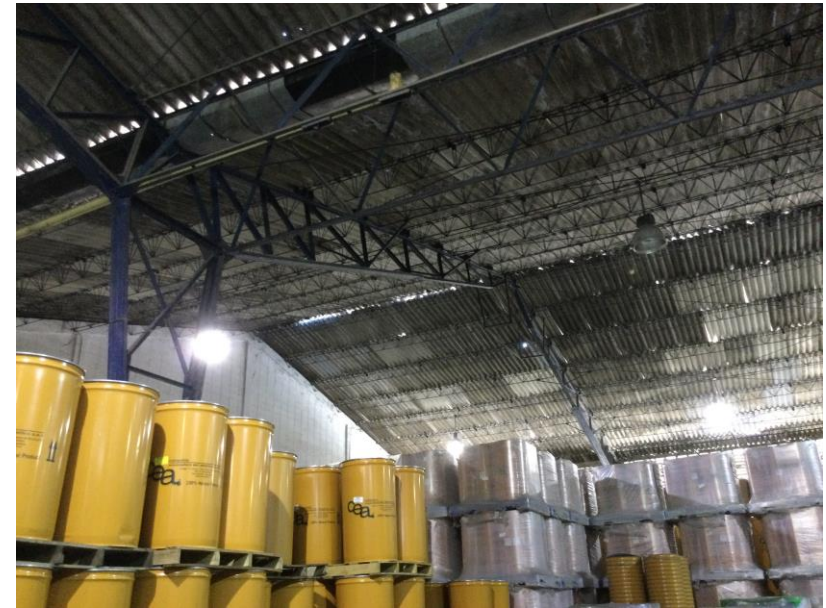

Bodega 10 modulo 3-4
Registro Fotográfico.

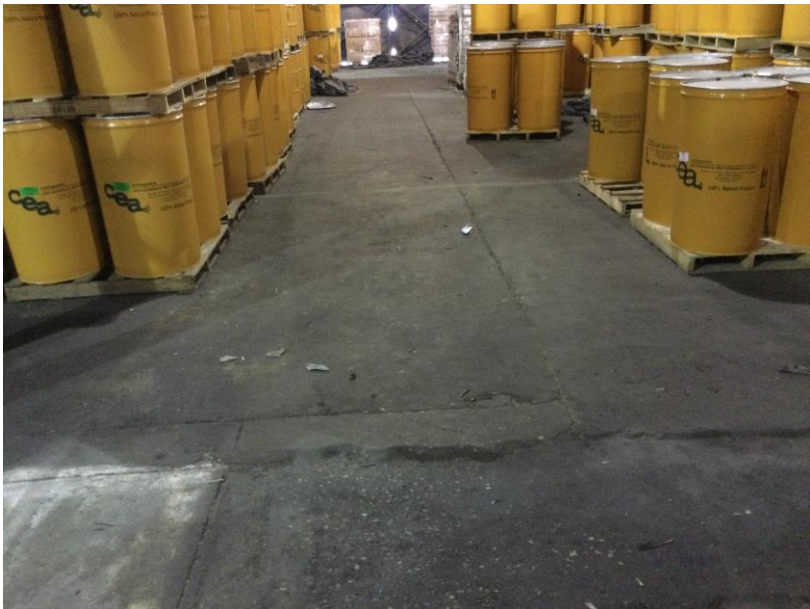

Bodega 10 modulo 5



Convenciones




-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripcion de la Bodega:					
		Fecha de inspeccion		martes, 24 de septiembre de 2024			
		Ubicación		Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 10	5	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	136	0
MINCIT	Bodega 10	5	Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	6	2
MINCIT	Bodega 10	5	Columna	Columnas en concreto	Und	17	0
MINCIT	Bodega 10	5	Correa	Correas metálicas de celosia en varilla	Und	64	0
MINCIT	Bodega 10	5	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	2	0
MINCIT	Bodega 10	5	Viga	Víga de concreto	ml	156	0
MINCIT	Bodega 10	5	Viga Canal	Víga canal en acero	ml	18	8
MINCIT	Bodega 10	5	Cubierta	Eternit Ondulada	und	608	0
MINCIT	Bodega 10	5	Cubierta	caballetes Eternit	und	41	0
MINCIT	Bodega 10	5	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están construidos en concreto	m2	900	0
MINCIT	Bodega 10	5	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	851	0
MINCIT	Bodega 10	5	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 10	5	Oficina		SI		


Bodega 10 modulo 5
Registro Fotográfico.

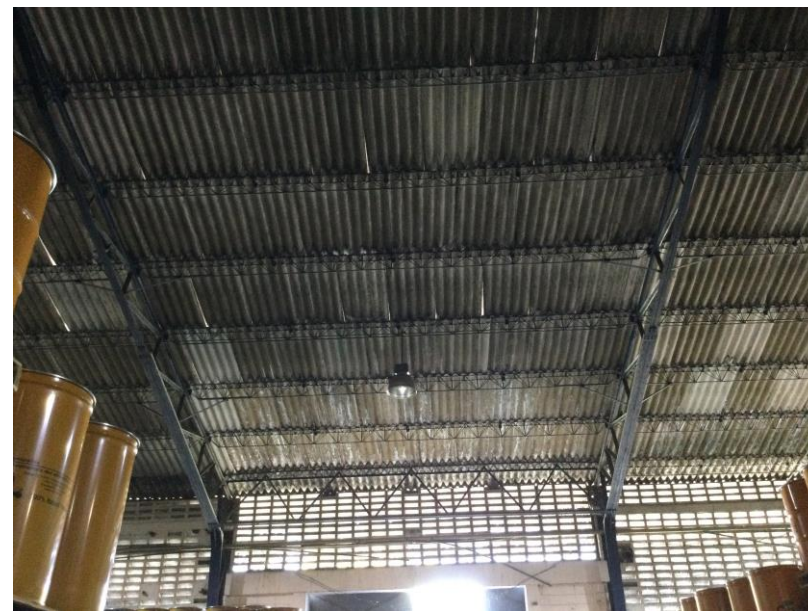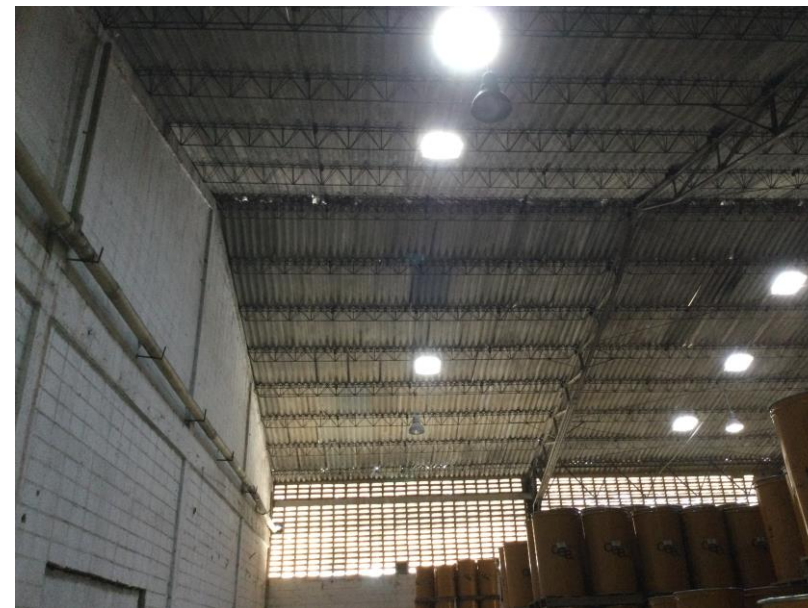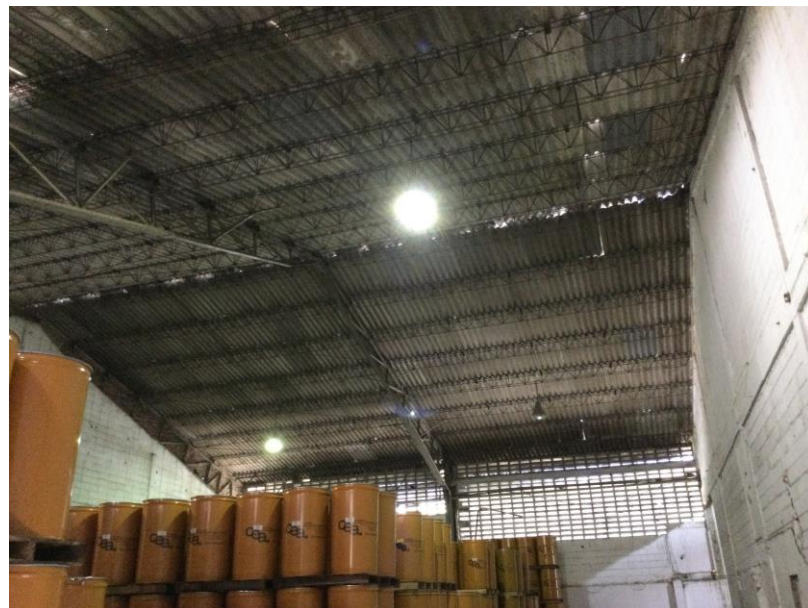

Bodega 10 modulo 5
Registro Fotográfico.



Bodega 10 modulo 6

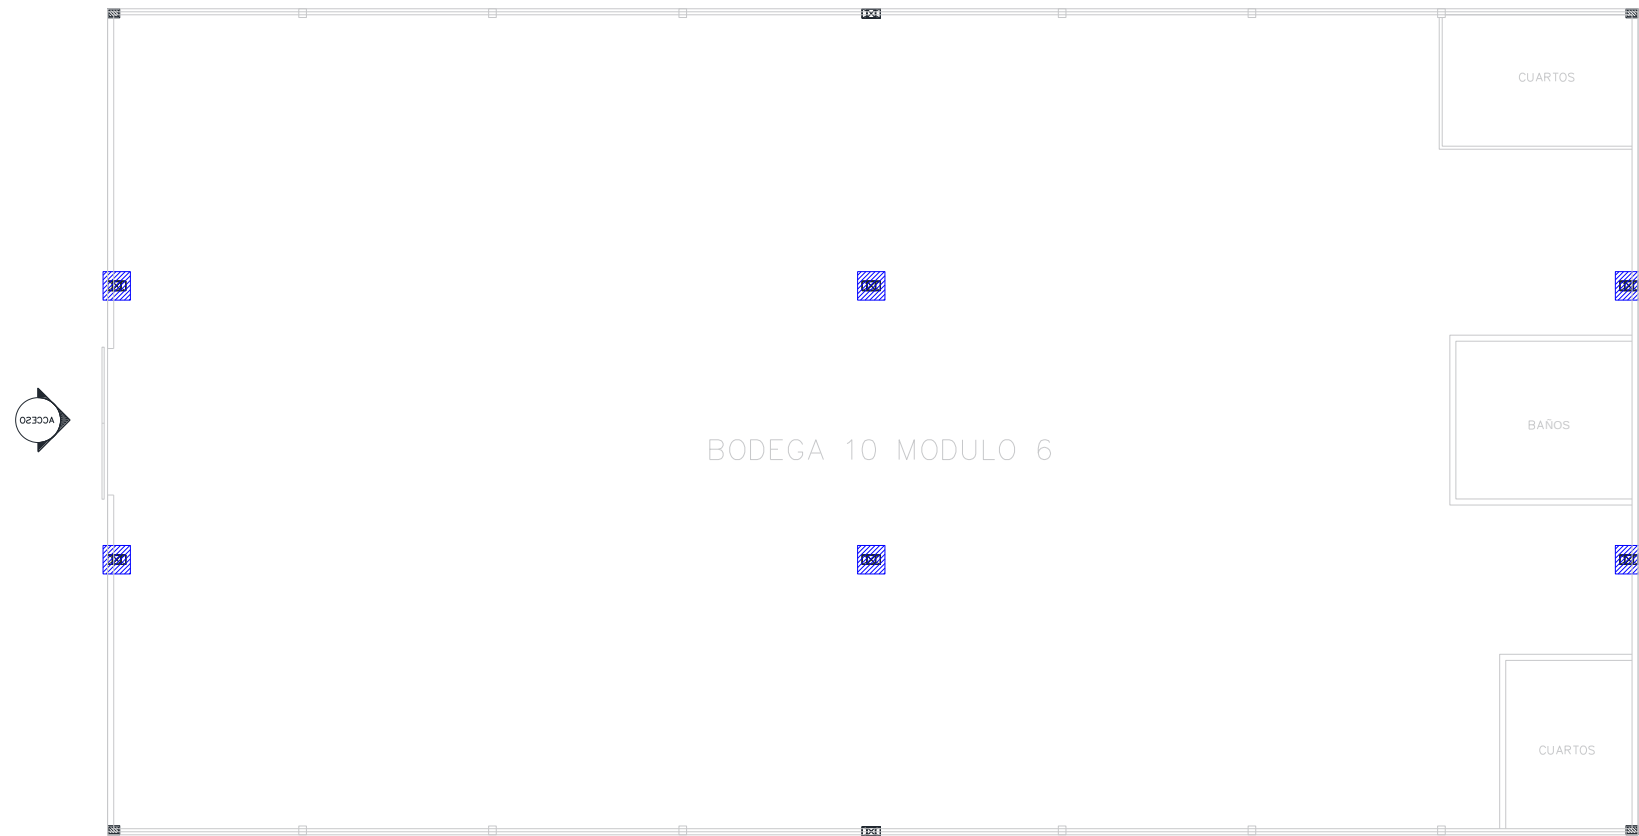

Convenciones


-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

	FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripcion de la Bodega:				
			Fecha de inspeccion	martes, 24 de septiembre de 2024			
			Ubicación	Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 10	6	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	154	0
MINCIT	Bodega 10	6	Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	9	9
MINCIT	Bodega 10	6	Columna	Columnas en concreto		12	0
MINCIT	Bodega 10	6	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	108	99
MINCIT	Bodega 10	6	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	6	6
MINCIT	Bodega 10	6	Viga	Viga de concreto	ml	54	0
MINCIT	Bodega 10	6	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	27	2
MINCIT	Bodega 10	6	Cubierta	Eternit Ondulada	und	912	0
MINCIT	Bodega 10	6	Cubierta	caballetes Eternit	und	61	0
MINCIT	Bodega 10	6	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.350	0
MINCIT	Bodega 10	6	Muros	Los muros de la bodega están construidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	846	0
MINCIT	Bodega 10	6	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 10	6	Oficina		NO		





Bodega 10 modulo 6
Registro Fotográfico.

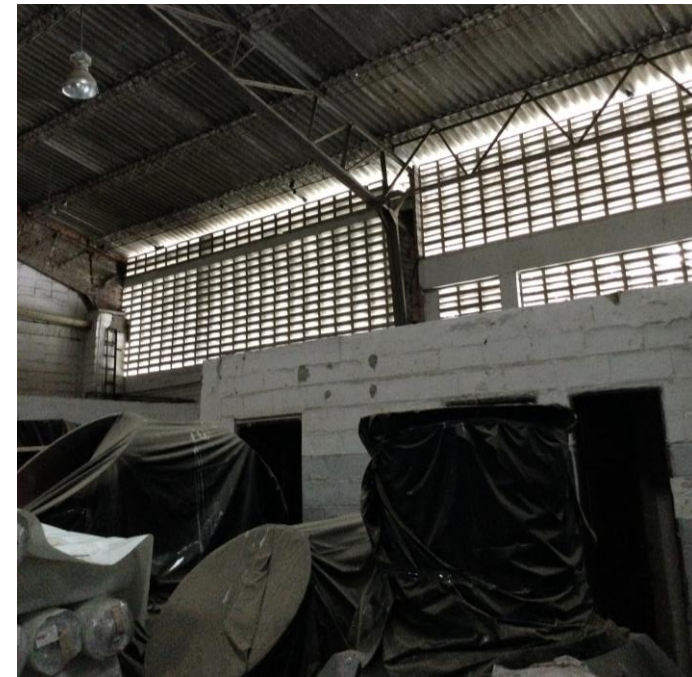



Bodega 10 modulo 6
Registro Fotográfico.

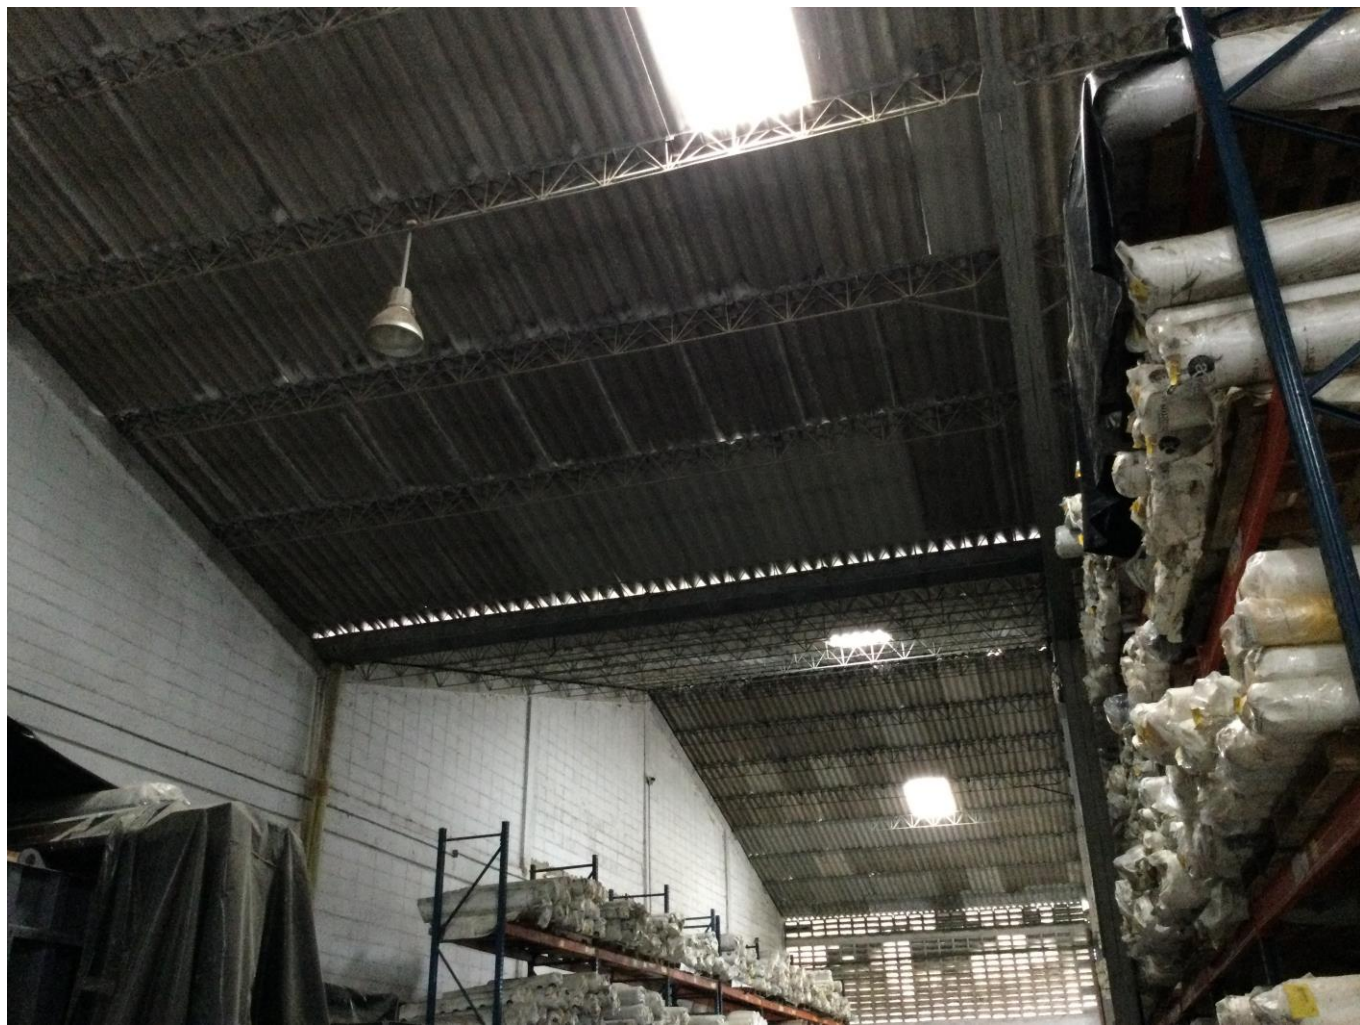


Bodega 10 modulo 6
Registro Fotográfico.

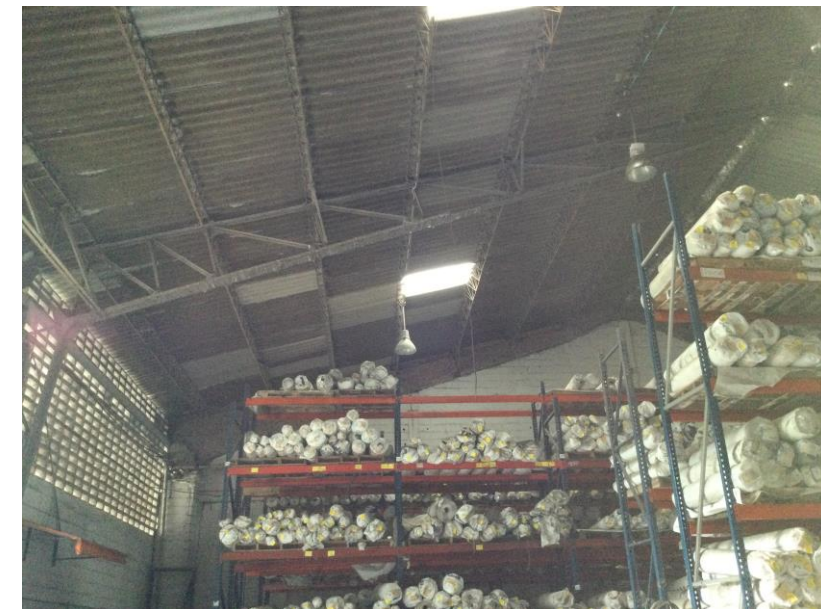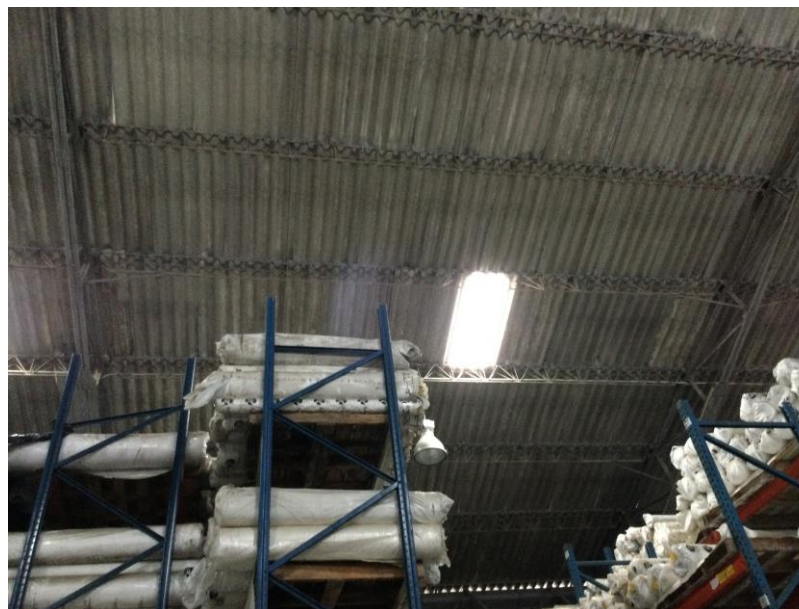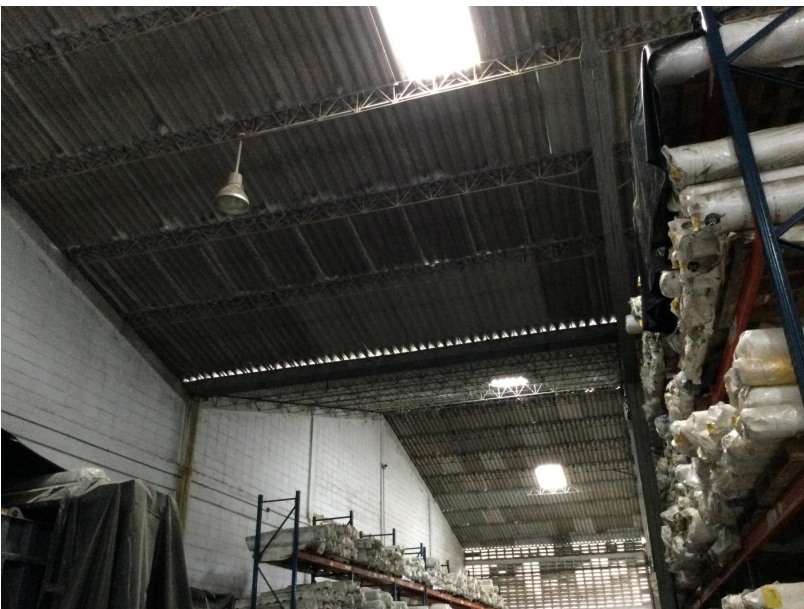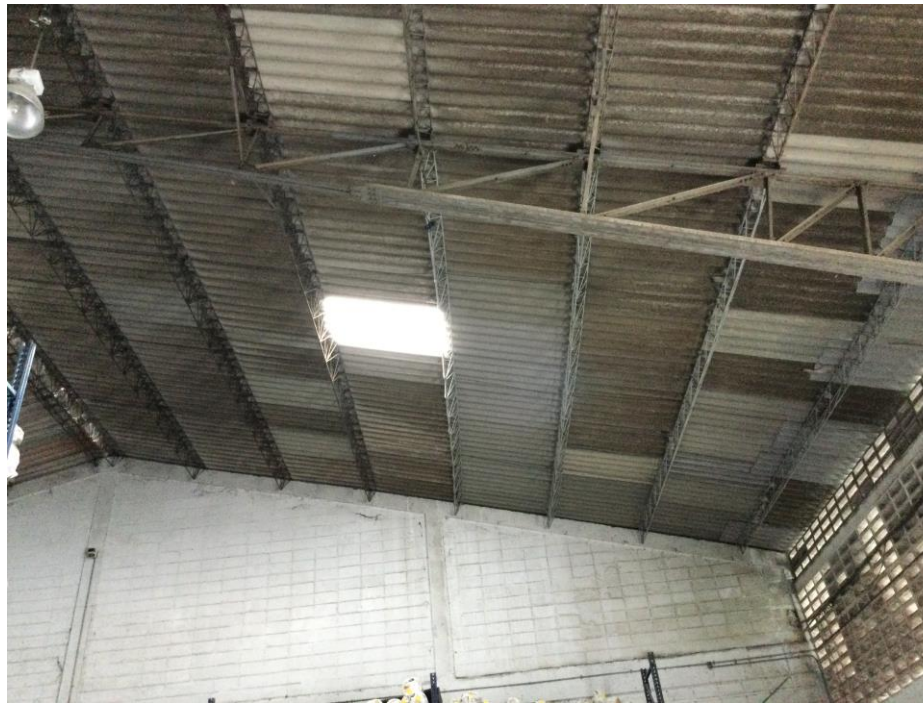

Bodega 10 modulo 6
Registro Fotográfico.

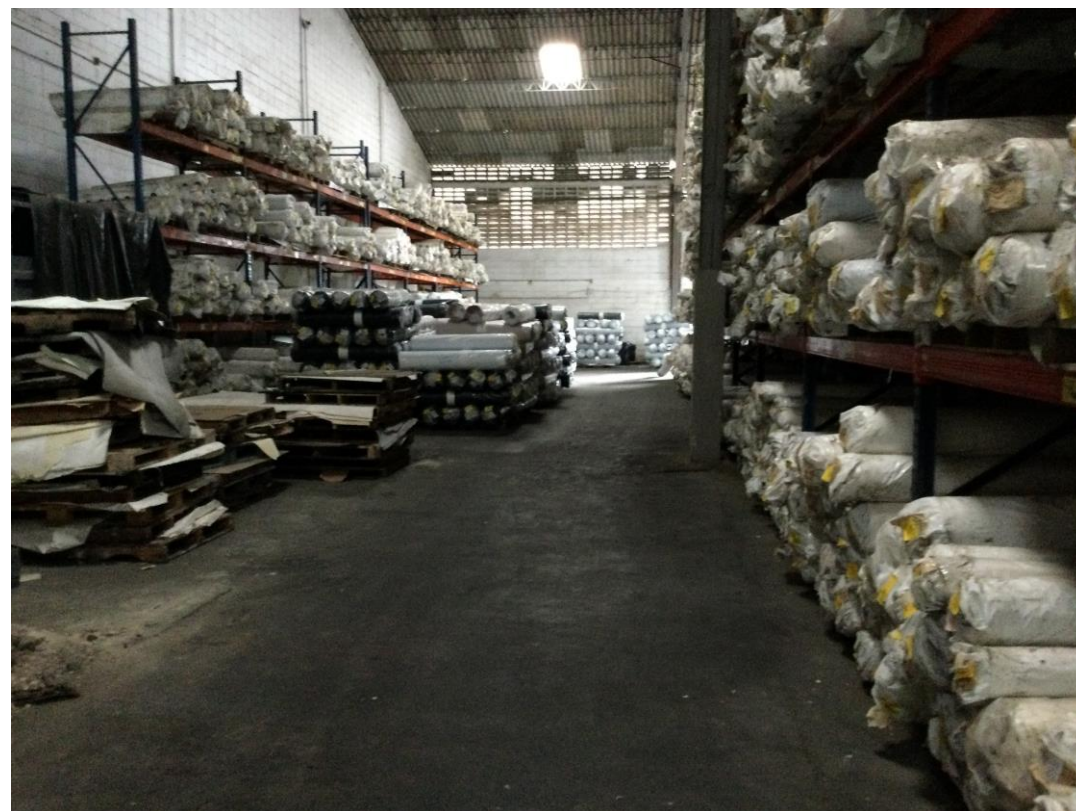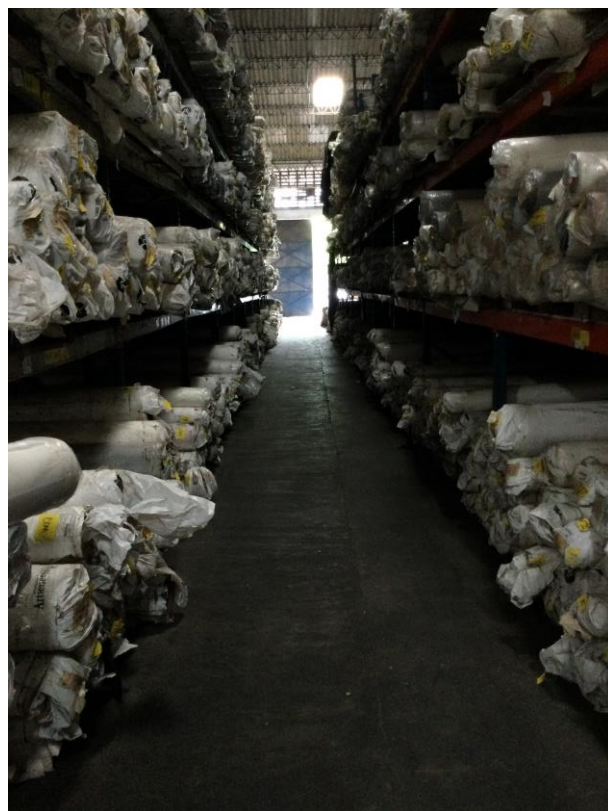

Bodega 10 modulo 7

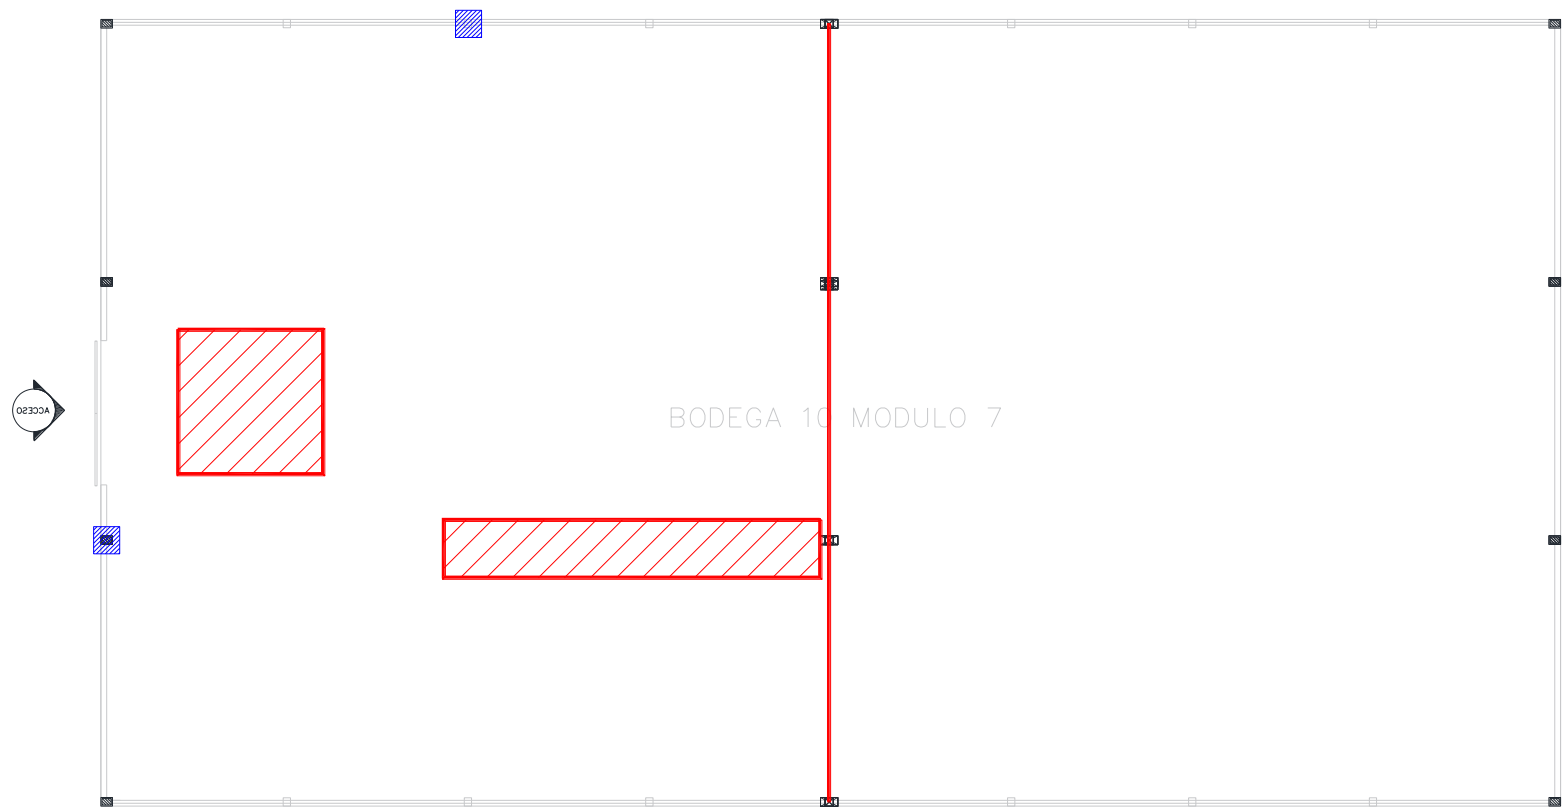

Convenciones


-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía

INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripción de la Bodega:					
		Fecha de inspeccion		martes, 24 de septiembre de 2024			
		Ubicación		Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 10	7	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	154	0
MINCIT	Bodega 10	7	Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	6	6
MINCIT	Bodega 10	7	Columna	Columnas en concreto	Und	14	2
MINCIT	Bodega 10	7	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	108	108
MINCIT	Bodega 10	7	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	4	0
MINCIT	Bodega 10	7	Viga	Viga de concreto	ml	114	0
MINCIT	Bodega 10	7	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	27	27
MINCIT	Bodega 10	7	Cubierta	Eternit Ondulada	und	912	0
MINCIT	Bodega 10	7	Cubierta	caballetes Eternit	und	63	0
MINCIT	Bodega 10	7	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	1.350	71
MINCIT	Bodega 10	7	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	958	0
MINCIT	Bodega 10	7	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	2	1
MINCIT	Bodega 10	7	Oficina		NO		


Bodega 10 modulo 7
Registro Fotográfico.

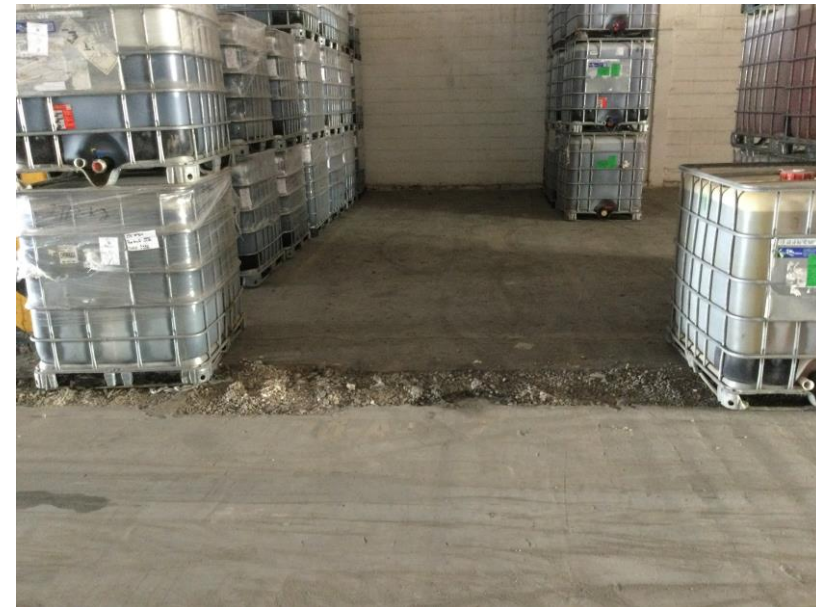

Bodega 10 modulo 7
Registro Fotográfico.




Bodega 10 modulo 7
Registro Fotográfico.

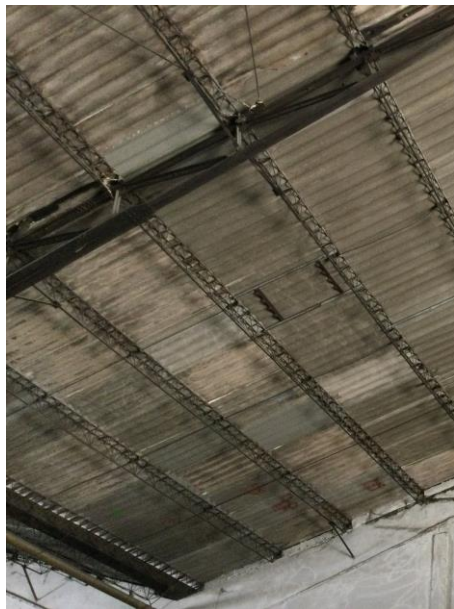

Bodega 10 modulo 7
Registro Fotográfico.



Bodega 10 modulo 8
Registro Fotográfico.

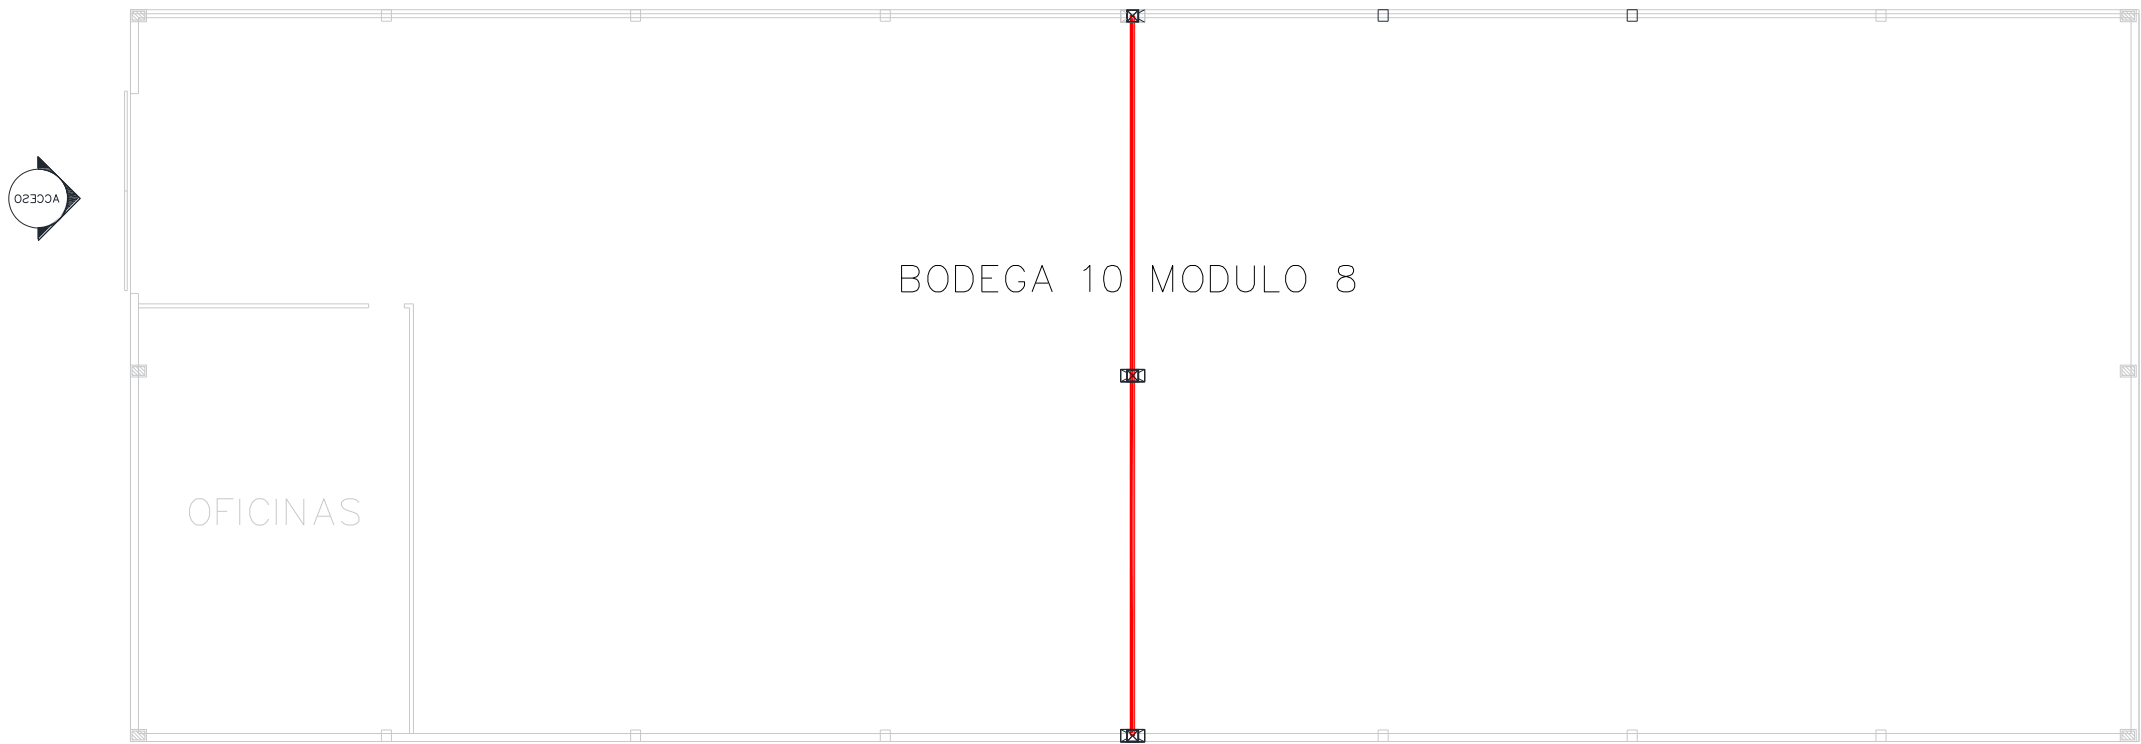

Convenciones



-  Columnas con deterioro normal por uso y goce
-  Muros con deterioro normal por uso y goce
-  Vigas con deterioro normal por uso y goce
-  Losa / piso con deterioro normal por uso y goce

Nota: No fue posible identificar el estado total del piso por estar ocupada con mercancía


INVENTARIO FISICO DEL INMUEBLE

FICHA TECNICA ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE		Descripción de la Bodega:					
		Fecha de inspeccion		martes, 24 de septiembre de 2024			
		Ubicación		Zona Franca Barranquilla			
MINCIT/UO	IDENTIFICACIÓN	MODULO	ELEMENTOS DE LA BODEGA	TIPOLOGIA DE LA BODEGA	UNIDAD	TOTAL	DETERIORO NORMAL POR USO Y GOCE
MINCIT	Bodega 10	8	Cimientos y Fundaciones	La bodega cuenta con cimientos sólidos y adecuadamente diseñados para soportar la carga de la estructura y los bienes almacenados.	ml	136	0
MINCIT	Bodega 10	8	Columna	Columnas en acero de celosia en angulo	Und	9	9
MINCIT	Bodega 10	8	Columna	Columnas en concreto	Und	12	0
MINCIT	Bodega 10	8	Correa	Correas metalicas de celosia en varilla	Und	64	64
MINCIT	Bodega 10	8	Cercha	cercha metalica en angulo	Und	3	1
MINCIT	Bodega 10	8	Viga	Viga de concreto	ml	110	0
MINCIT	Bodega 10	8	Viga Canal	Viga canal en acero	ml	18	18
MINCIT	Bodega 10	8	Cubierta	Eternit Ondulada	und	608	0
MINCIT	Bodega 10	8	Cubierta	caballetes Eternit	und	41	0
MINCIT	Bodega 10	8	Pisos de Concreto	Los pisos de la bodega están contruidos en concreto	m2	825	0
MINCIT	Bodega 10	8	Muros	Los muros de la bodega están contruidos con bloques de concreto No 20, reconocidos por su solidez y durabilidad, ofreciendo una estructura resistente.	m2	821	0
MINCIT	Bodega 10	8	Portones Metálicos	Los portones de acceso a la bodega son corredizos y están fabricados con acero, que ofrecen durabilidad y seguridad.	und	1	1
MINCIT	Bodega 10	8	Oficina		SI		



Bodega 10 modulo 8
Registro Fotográfico.

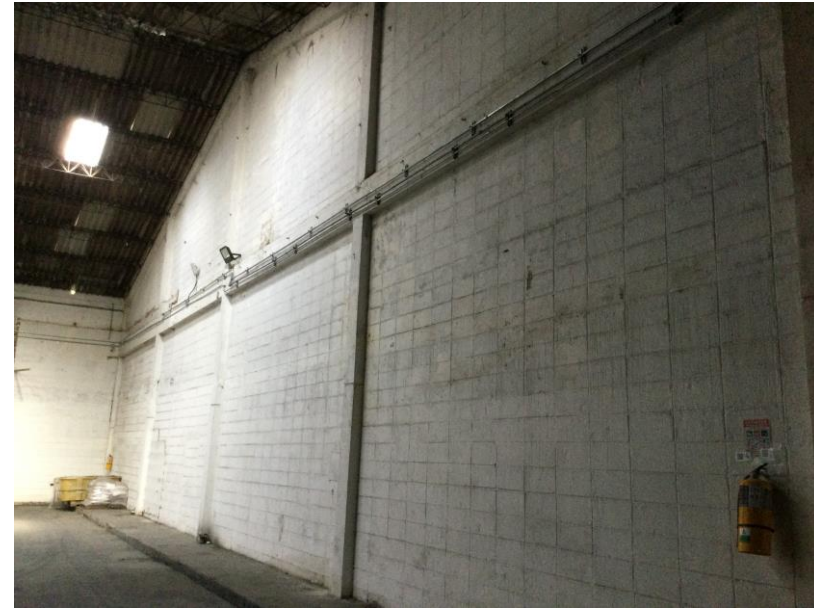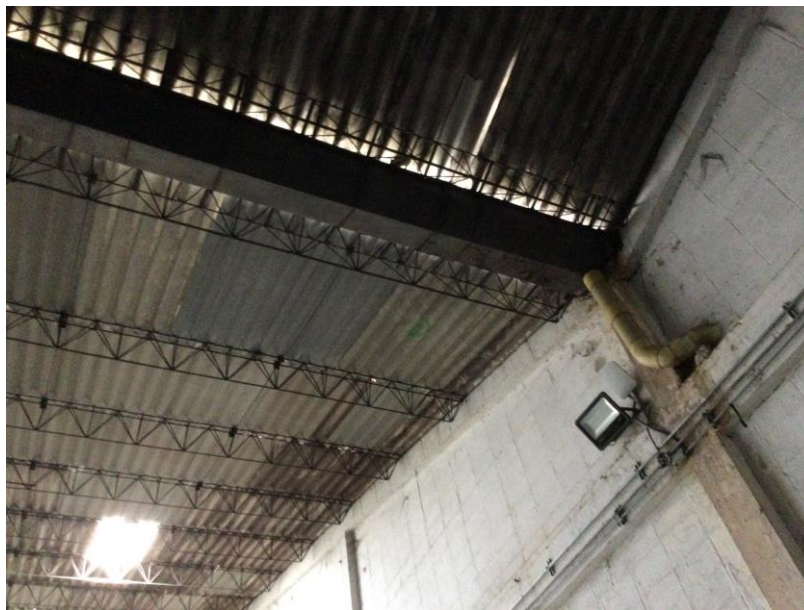

Bodega 10 modulo 8
Registro Fotográfico.

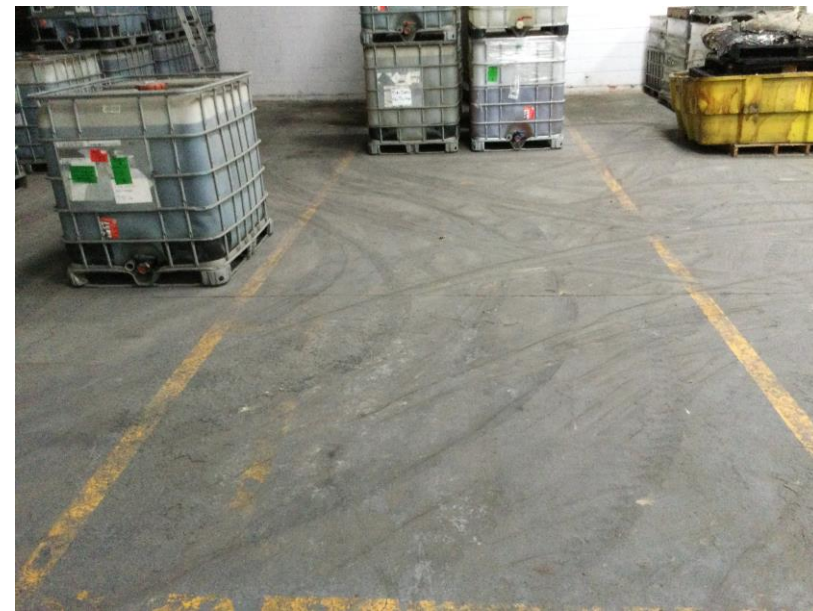

Bodega 10 modulo 8
Registro Fotográfico.

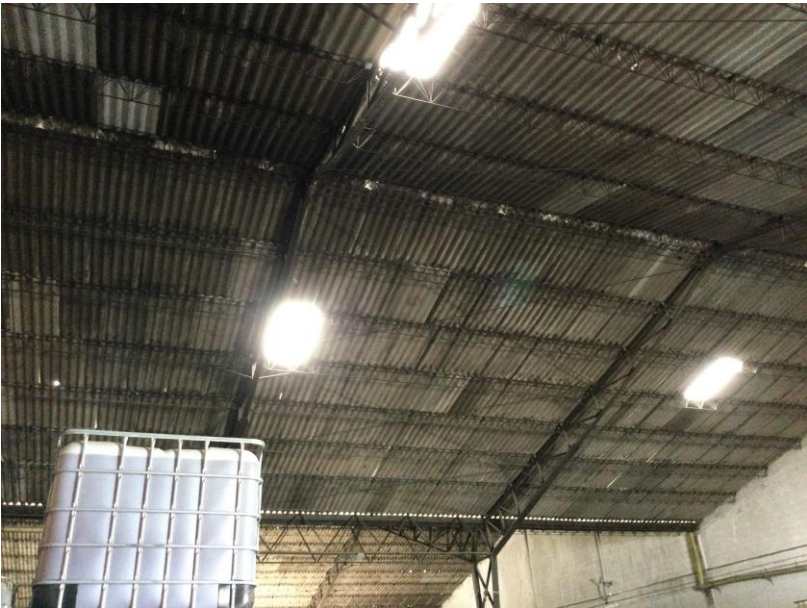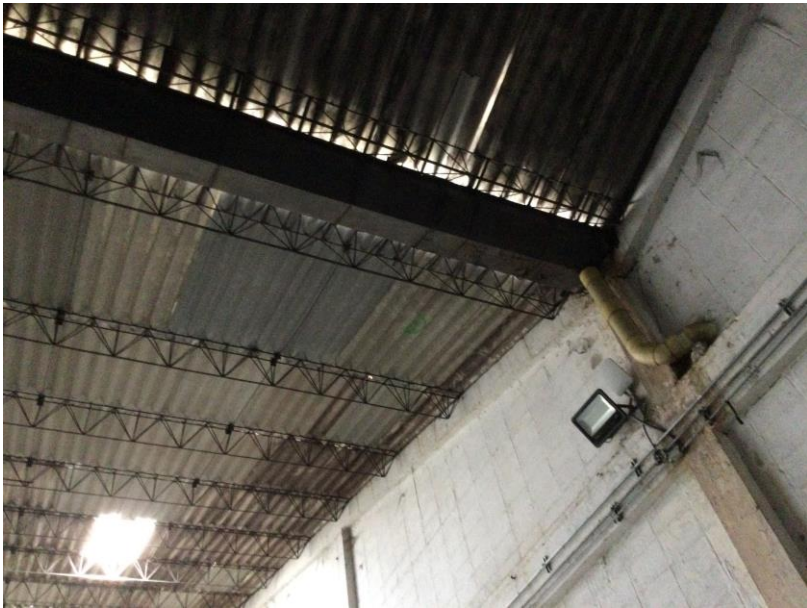

Bodega 10 modulo 8
Registro Fotográfico.

