



DESCRIPCION DE INSTALACION

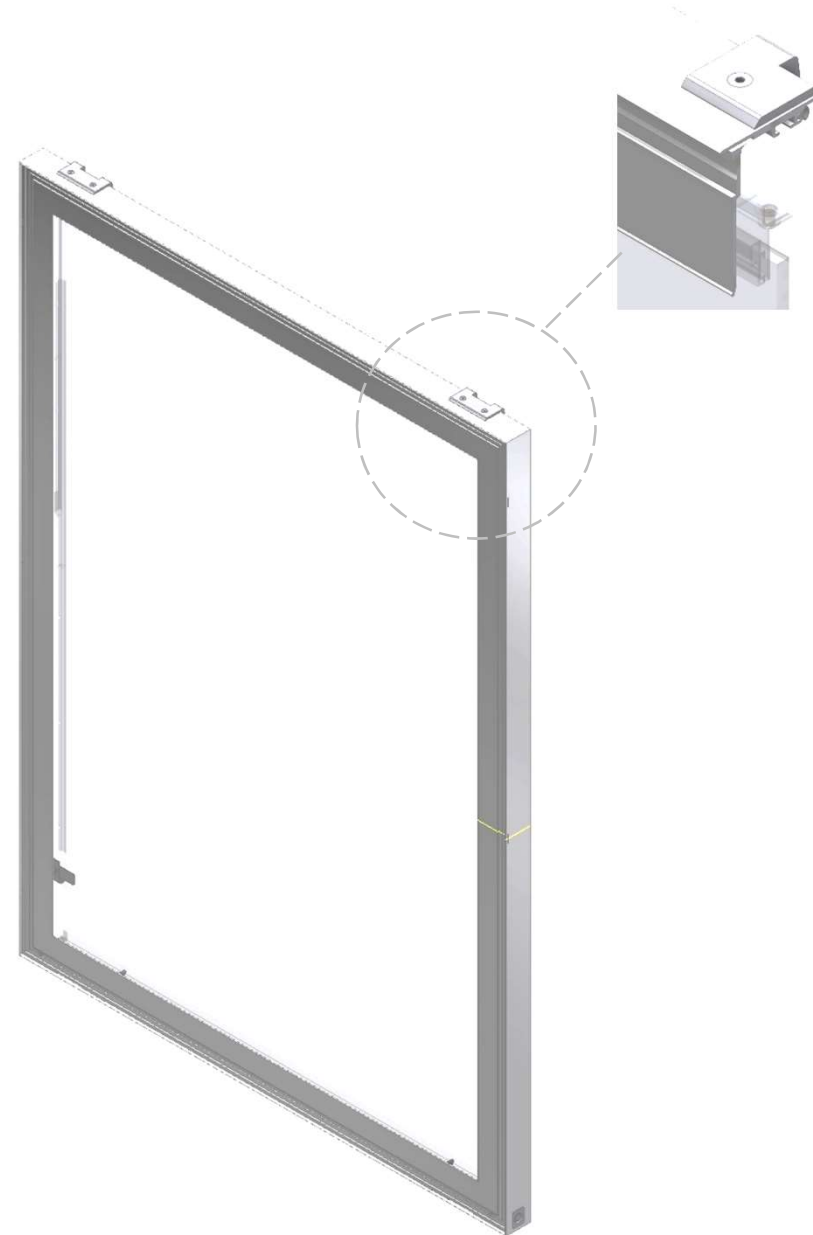

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

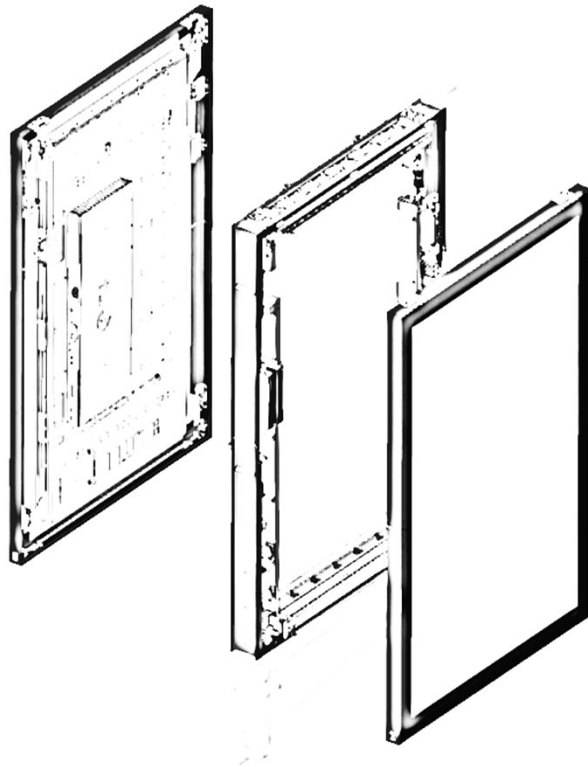


PANEL PUBLICITARIO DIGITAL LCD 75"

Descripción Instalación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

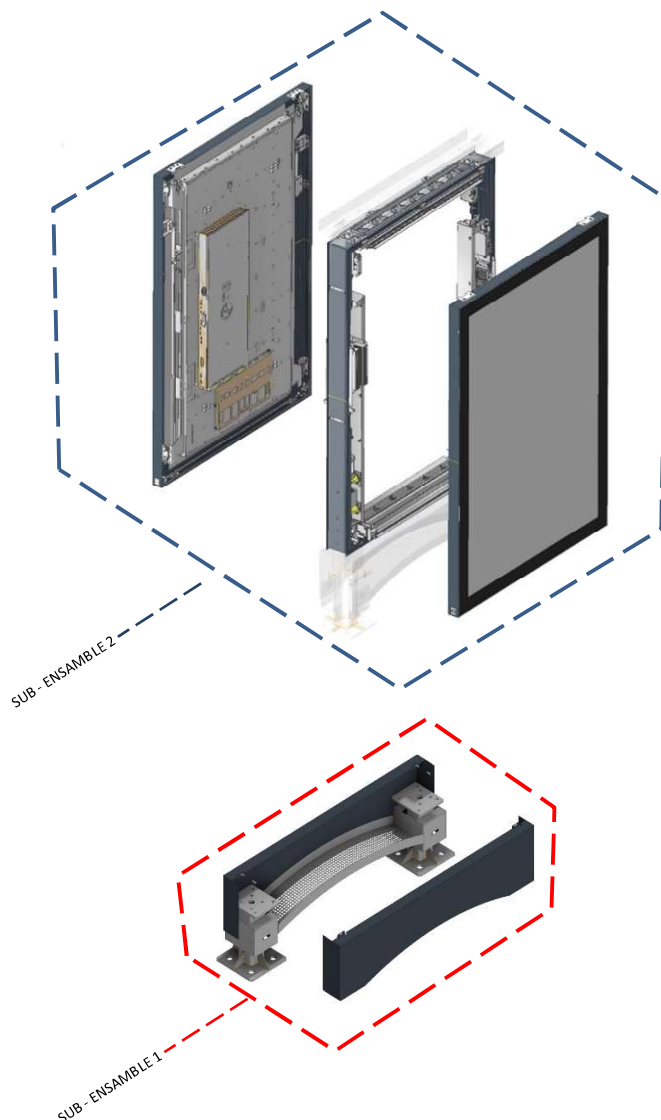

OBRA CIVIL

EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DE SOPORTE DEL PANEL PUBLICITARIO DIGITAL SE REALIZA EN FASES SEGÚN ESPECIFICACIONES RESULTANTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS:

- PRELIMINARES: EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL TERRENO, DEMOLICION Y EXCAVACION.
- 1ERA FASE DE FUNDICION: EJECUTADA LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES, SE REALIZA EL POSICIONAMIENTO, NIVELACION DE LOS ANCLAJES Y ARMADO DE REFUERZO PARA LUEGO HACER EL VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI HASTA EL NIVEL REQUERIDO.
- 2DA FASE DE FUNDICION: CUANDO EL CONCRETO DE LA 1ERA FASE ALCANZA RESISTENCIA, SE INSTALA EL MUEBLE Y SE FUNDE EL VOLUMEN DE CONCRETO RESTANTE HASTA EL NIVEL DEL ANDEN EXISTENTE, DANDO ACABADO.
- CANALIZACION ACOMETIDA ELECTRICA: PARALELO A LAS OBRAS DE CIMENTACION DEL MUEBLE, SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES HASTA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DEFINIDOS.

ARMADO Y MONTAJE

BUSCANDO LA MENOR OCUPACION DE ANDENES Y VIAS DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION DEL MUEBLE, ESTE SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES ETAPAS.

ETAPA DE SUB-ENSAMBLE - ALISTAMIENTO Y ARMADO MECANICO DE PIEZAS EN TALLER POR SUBGRUPOS:

- SUBGRUPO 1 BASTIDOR ESTRUCTURAL PERIMETRAL + PANTALLA + PUERTAS + REMATE VENTILACION
- SUBGRUPO 2 ESTRUCTURA DE SOPORTE + HERRAJES + TAPAS ZOCALO + REJILLA

ETAPA DE ENSAMBLE Y MONTAJE - ARMADO DE MOBILIARIO EN SITIO DE INSTALACION:

- IZAJE DE SUBGRUPO 1 EN ANCLAJES DE LA CIMENTACION DE SOPORTE FUNDIDA PREVIAMENTE.
- ENSAMBLE DE SUBGRUPOS 2 EN SUBGRUPO 1.
- FIJACION DE CARTELERIA
- LIMPIEZA GENERAL DEL MUEBLE Y AREAS INTERVENIDAS.

ALIMENTACION ELECTRICA

- CABLEADO DE ACOMETIDA Y PROTECCION DEL SISTEMA.
- CONEXIÓN DE ACOMETIDA A SISTEMA ELECTRICO DEL MUEBLE.

TRANSPORTE

EL TRASLADO DEL MUEBLE DEBE CONSIDERAR:

- CARGAR PARTES SUB-ENSAMBLADAS QUE FACILITE LA MANIPULACION, EVITANDO DESAJUSTES Y ESFUERZOS DE UNIONES.
- ASEGURAR PIEZAS CONTRA MOVIMIENTOS BRUSCOS.
- PROTEGER LOS COMPONENTES ADECUADAMENTE PARA QUE NO SE GENEREN RAYADURAS Y GOLPES.
