

	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04	VERSIÓN: 01
		F.A.: 2016-05-10	Página 1 de 2

CONTRATO No.:	001 de 2025	FECHA:	15/12/2025
OBJETO DE LA VISITA:	Verificación solicitud mejoramiento / expansión de alumbrado público.		

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yuslan López	Técnico	ESO	Yuslan López
Juan Felipe Valencia	Revd inter	HCE	[Firma]
Alejandra M. Ceballos	HSECR	HCR	[Firma]
Alvaro Durán	Ing. Residente	HCR	[Firma]
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

OBSERVACIONES
La interventoría se trasladó a la Vereda Ponce de León para realizar la verificación en sitio de solicitud de mejoramiento / expansión del alumbrado público.
Se realiza el recorrido en 2 sectores diferentes en la presencia de representante de la Eso Dinero S.A.S y en el acompañamiento de la interventoría.
De acuerdo con el recorrido realizado en el sector No. 1, Colegio Baltazar Salazar, se evidencia la existencia de 7 postes tipo arabado de 6m brazo doble, sin embargo



3 de estos, en su iluminación hacia el área patrimonial se encuentran obstruidos por la presencia de árboles frondosos. La interventoría solicita programar mantenimiento para realizar limpieza vegetal. Sin embargo, solicita poner este asunto en conocimiento del arco de habitud del municipio para tomar una solución de fondo.

De acuerdo con el recorrido realizado en el sector 2, - los linderos vio a la cga, se identificaron 2 tramos oscuras en los cuales se requiere la instalación de:

→ 1 poste ; 2 luminarias led ; 29m red trenzada

Por otro lado, en el tramo 1 se evidenció una luminaria de sodio, cuya ubicación fue levantada para consultar en el área de catastro del municipio para determinar su pertenencia o no al municipio de Riogrande - Antioquia.


La información levantada se consignó en el bosquejo a mano alzada adjunto al presente acta y se remitió a la Eo Riogrande S.A.S. para sus fines pertinentes.

REALIZADA POR:

Alexis Durán


Tramo 1

6.068636, -75.422036

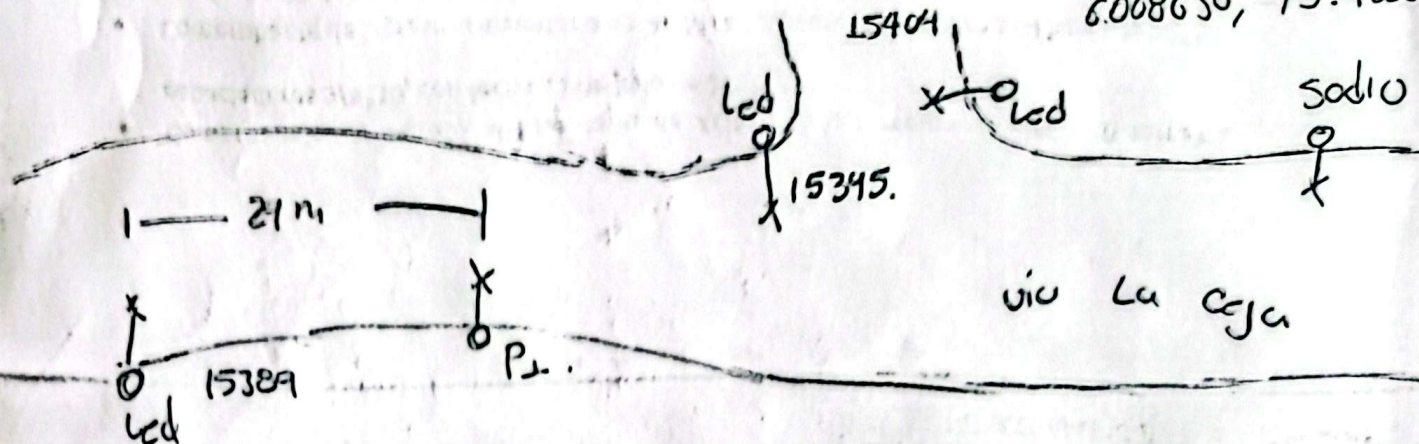

P₁: Todo nuevo (Poste, luminario, red).
6.069349, -75.422470

Tramo 2



P₂ (Todo luminario) red.
6.071256, -75.423411
