
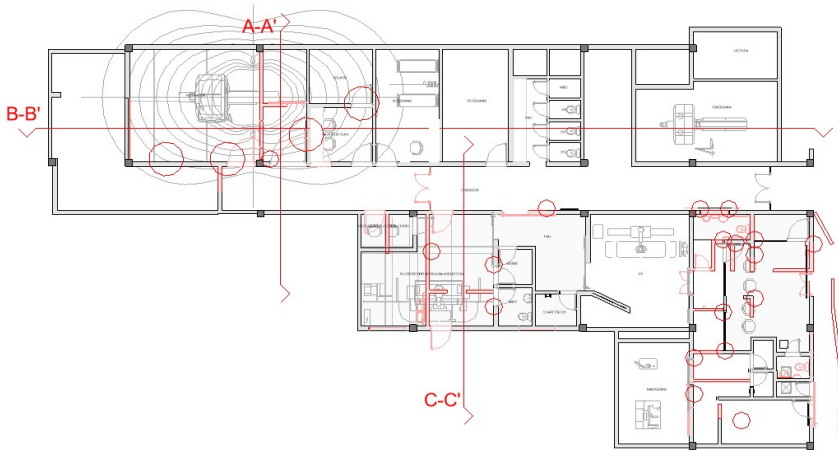


		REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEMORIA DE CALCULO							
MEMORIAS AL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE RIONEGRO							
CONTRATISTA:		LINARQ S.A.S.		CONTRATANTE:		E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO			
CONTRATO N°		240-2025		LOCALIZACION:		MUNICIPIO DE RIONEGRO			
CAPITULO:		2		ITEM	2.1	Corte con pulidora en pisos y muros			
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA		
ml	98,000		98,000		62,890		160,890		
									
<div></div> <div><p>Seccion A-A' Muro Resonador</p><p>Seccion B-B' Muro Resonador y apertura de puertas en muros</p><p>Seccion C-C' Apertura de nuevas puertas en muro fluoroscopia</p></div>									
Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					5,100	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					5,100	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					6,000	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					6,000	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					5,200	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					1,530	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					2,100	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					1,080	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					0,840	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					1,950	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					1,200	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					5,100	
Dilatación piso Fluoroscopia		corte pulidora	ml					5,100	
Dilatación piso Resonador		corte pulidora	ml					8,160	
Dilatación piso Resonador		corte pulidora	ml					5,350	
Dilatación piso Resonador		corte pulidora	ml					5,350	
Apertura ventana Resonador		corte pulidora	ml					1,470	


Apertura ventana Resonador		corte pulidora	ml						1,450	
Apertura ventana Resonador		corte pulidora	ml						0,950	
Apertura ventana Resonador		corte pulidora	ml						0,960	
Apertura gases Resonador		corte pulidora	ml						0,500	
Apertura AA Sala equipos		corte pulidora	ml						0,460	
Apertura gases Resonador		corte pulidora	ml						0,500	
Apertura AA Sala equipos		corte pulidora	ml						0,470	
Apertura gases Resonador		corte pulidora	ml						0,250	
Apertura AA Sala equipos		corte pulidora	ml						0,240	
Apertura gases Resonador		corte pulidora	ml						0,300	
Apertura AA Sala equipos		corte pulidora	ml						1,050	
Apertura extracción en Resonador		corte pulidora	ml						0,820	
Apertura extracción en Resonador		corte pulidora	ml						0,810	
Apertura extracción en Resonador		corte pulidora	ml						0,430	
Apertura extracción en Resonador		corte pulidora	ml						0,420	
Apertura Inyeccion en Resonador		corte pulidora	ml						0,840	
Apertura Inyeccion en Resonador		corte pulidora	ml						0,840	
Apertura Inyeccion en Resonador		corte pulidora	ml						0,420	
Apertura Inyeccion en Resonador		corte pulidora	ml						0,420	
Ampliacion puerta en Resonador		corte pulidora	ml						1,700	
Ampliacion puerta en Resonador		corte pulidora	ml						2,320	
Nueva puerta lectura en Resonador		corte pulidora	ml						0,920	
Nueva puerta lectura en Resonador		corte pulidora	ml						2,320	
Apertura vanos en corredor ppal		corte pulidora	ml						2,120	
Apertura vanos en corredor ppal		corte pulidora	ml						3,290	
Apertura vanos en corredor ppal		corte pulidora	ml						0,880	
Apertura caja gases en corredor ppal		corte pulidora	ml						0,790	
Apertura caja gases en corredor ppal		corte pulidora	ml						0,830	
Apertura caja gases en corredor ppal		corte pulidora	ml						0,700	
Apertura caja gases en corredor ppal		corte pulidora	ml						0,700	
Apertura vanos en corredor ppal		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion muro mamografia		corte pulidora	ml						3,290	
Apertura vanos en corredor ppal		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion puerta fluoroscopia		corte pulidora	ml						3,290	
Demolicion puerta equipos Resonador		corte pulidora	ml						2,220	
Demolicion puerta equipos Resonador		corte pulidora	ml						1,010	
AA pase consultorio		corte pulidora	ml						1,440	
AA pase consultorio		corte pulidora	ml						1,440	
AA pase consultorio		corte pulidora	ml						0,430	
AA pase consultorio		corte pulidora	ml						0,420	
Gases lectura pase consultorio		corte pulidora	ml						0,490	
Gases lectura pase consultorio		corte pulidora	ml						0,490	
Gases lectura pase consultorio		corte pulidora	ml						0,430	
Gases lectura pase consultorio		corte pulidora	ml						0,420	
Demolicion puerta fluoroscopia		corte pulidora	ml						1,820	
Paso de recepción a corredor interno		corte pulidora	ml						1,500	
Acceso a resonador		corte pulidora	ml						1,600	
Acceso control		corte pulidora	ml						0,900	
Apertura Quench resonador		corte pulidora	ml						1,600	
Apertura conexion consultorios para fluoroscopia ppal		corte pulidora	ml						3,290	
										160,89



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO




MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	2	ITEM	2.4	Demolición de mampostería en áreas a intervenir
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m ²	115.05	115.03	0	115.03

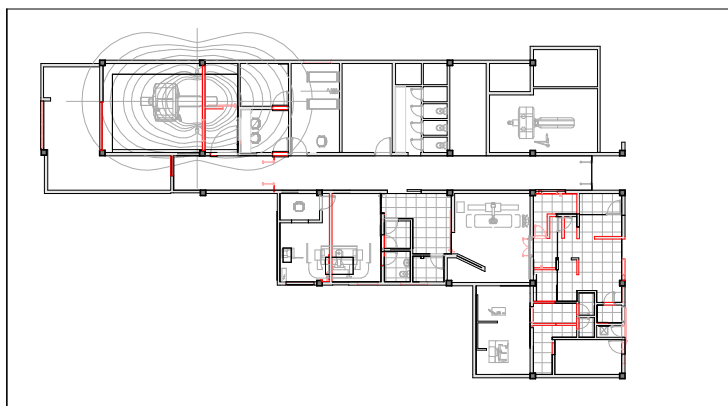

2.4 - Demolición de mampostería en áreas a intervenir

Type	Localización	Area
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente	Mamografía	2.85 m ²
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente	Mamografía	4.32 m ²
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente	Mamografía	4.10 m ²
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente	Mamografía	4.29 m ²
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente	Mamografía	4.48 m ²
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente	Mamografía	4.10 m ²
M12_Muro en Mampostería de 12cm Existente: 6		24.13 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Resonado Muro antigua sala lectura	16.32 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	3.90 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	4.16 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	4.13 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	5.71 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Oficina de correo	5.36 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Fluoroscopia antiguo divisor de consultorios	16.87 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Resonador, antiguo divisor de cuarto equipos	3.48 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Apertura Ventana Resonador y Gases	2.00 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Puerta equipos resonador	0.96 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	2.21 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	2.24 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	1.97 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	1.15 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Mamografía	5.44 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente	Resonado Muro antigua sala lectura	15.01 m ²
M15_Muro en Mampostería de 15cm Existente: 16		90.90 m ²
		115.03 m ²

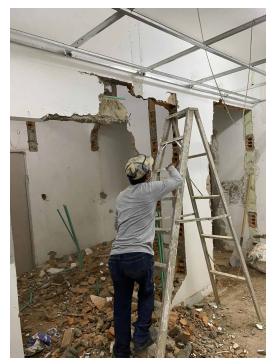




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	2	ITEM	2.7	Desmante de Ventanas
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
un	9	9	5	14

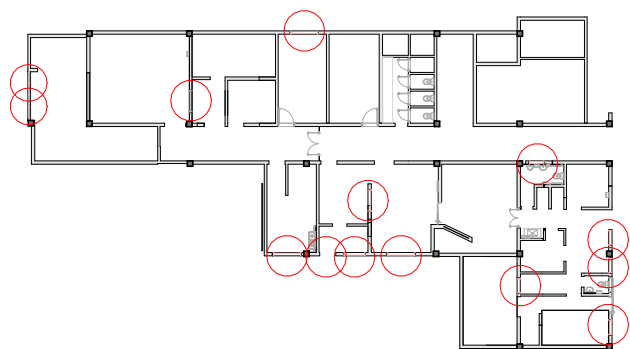



2.7 - Desmante de ventanas


Localización

Antigua sala de lectura RX
antiguo baño Imagenes
Apertura porcion superior para AA de Resonador
Recepcion antigua Imagenes
Recepcion antigua Imagenes
Recepcion antigua Imagenes
Ventana a patio antiguo consultorio
Ventana a patio antiguo consultorio
Ventana a patio antiguo consultorio
Ventana a patio antiguo RX
Ventana antigua resonador
ventana mamografia
ventana posterior
ventana posterior
total ventanas: 14

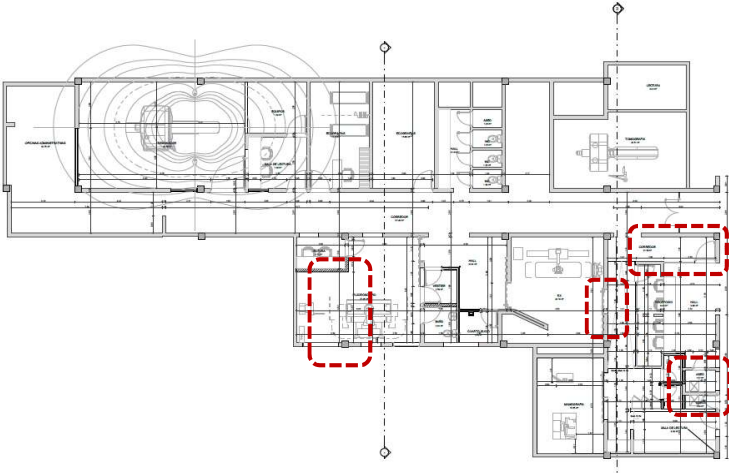

		REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																		
MEMORIAS AL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA																																																				
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE RIONEGRO																																																		
CONTRATISTA:		LINARQ S.A.S.		CONTRATANTE:		E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO																																														
CONTRATO N°		240-2025		LOCALIZACION:		MUNICIPIO DE RIONEGRO																																														
CAPITULO:		2		ITEM		2,80 Demolicion de Enchape																																														
UNIDAD		CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA																																														
m2		8,500		5,670		0,000																																														
						CANTIDAD ACUMULADA																																														
						5,670																																														
																																																				
																																																				
<table><thead><tr><th>Localizacion</th><th>TIPO</th><th>NOMBRE</th><th>UNIDAD</th><th>LONGITUD</th><th>ALTURA</th><th>ANCHO</th><th>NUM.ELEM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Baño mamografía</td><td></td><td>Enchape</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,430</td></tr><tr><td>Fluoroscopio - consultorio</td><td></td><td>Enchape</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,120</td></tr><tr><td>Baño Rx</td><td></td><td>Enchape</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,240</td></tr><tr><td>Circulación a mamografo</td><td></td><td>Enchape</td><td>m2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,880</td></tr></tbody></table>								Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL	Baño mamografía		Enchape	m2					0,430	Fluoroscopio - consultorio		Enchape	m2					1,120	Baño Rx		Enchape	m2					1,240	Circulación a mamografo		Enchape	m2					2,880
Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL																																												
Baño mamografía		Enchape	m2					0,430																																												
Fluoroscopio - consultorio		Enchape	m2					1,120																																												
Baño Rx		Enchape	m2					1,240																																												
Circulación a mamografo		Enchape	m2					2,880																																												
<table><tr><td></td><td>5,67</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>5,67</td></tr><tr><td>CANTIDAD ANTERIOR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>CANTIDAD TOTAL</td><td>5,67</td></tr><tr><td>ACUMULADO</td><td>5,67</td></tr></table>									5,67	SUBTOTAL	5,67	CANTIDAD ANTERIOR	0,00	CANTIDAD TOTAL	5,67	ACUMULADO	5,67																																			
	5,67																																																			
SUBTOTAL	5,67																																																			
CANTIDAD ANTERIOR	0,00																																																			
CANTIDAD TOTAL	5,67																																																			
ACUMULADO	5,67																																																			
RESIDENTE DE OBRA				SUPERVISION																																																

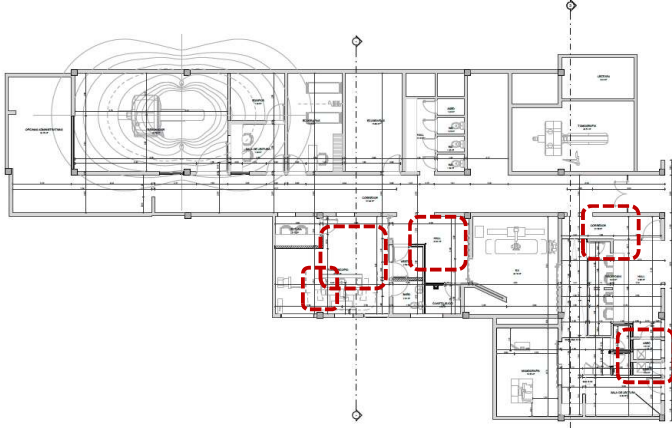		REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																													
MEMORIAS AL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA																																																																															
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE RIONEGRO																																																																													
CONTRATISTA:		LINARQ S.A.S.		CONTRATANTE:		E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO																																																																									
CONTRATO N°		240-2025		LOCALIZACION:		MUNICIPIO DE RIONEGRO																																																																									
CAPITULO:		2		ITEM		2,15																																																																									
		Anulacion de salidas de abastos																																																																													
UNIDAD		CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA																																																																									
UN		10,000		10,000		7,000																																																																									
						17,000																																																																									
																																																																															
																																																																															
<table><thead><tr><th>Localizacion</th><th>TIPO</th><th>NOMBRE</th><th>UNIDAD</th><th>LONGITUD</th><th>ALTURA</th><th>ANCHO</th><th>NUM.ELEM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pozuelos consultorio antiguo</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,000</td></tr><tr><td>Acometida principal para la zona y consultorio ecografia</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Salida de abasto bajo nivel de piso tras demolicion</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Demolicion de baño Rx</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,000</td></tr><tr><td>Demolicion de baño Rx y salida de acometida</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,000</td></tr><tr><td>Demolicion de pozuelo en Rx</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,000</td></tr><tr><td>Abasto de consultorio de ecografia y tuberias antiguas en piso</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,000</td></tr></tbody></table>								Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL	Pozuelos consultorio antiguo			un				2,00	2,000	Acometida principal para la zona y consultorio ecografia			un				1,00	1,000	Salida de abasto bajo nivel de piso tras demolicion			un				1,00	1,000	Demolicion de baño Rx			un				3,00	3,000	Demolicion de baño Rx y salida de acometida			un				4,00	4,000	Demolicion de pozuelo en Rx			un				2,00	2,000	Abasto de consultorio de ecografia y tuberias antiguas en piso			un				4,00	4,000
Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL																																																																							
Pozuelos consultorio antiguo			un				2,00	2,000																																																																							
Acometida principal para la zona y consultorio ecografia			un				1,00	1,000																																																																							
Salida de abasto bajo nivel de piso tras demolicion			un				1,00	1,000																																																																							
Demolicion de baño Rx			un				3,00	3,000																																																																							
Demolicion de baño Rx y salida de acometida			un				4,00	4,000																																																																							
Demolicion de pozuelo en Rx			un				2,00	2,000																																																																							
Abasto de consultorio de ecografia y tuberias antiguas en piso			un				4,00	4,000																																																																							
<table><tr><td></td><td>17,00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>17,00</td></tr><tr><td>CANTIDAD ANTERIOR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>CANTIDAD TOTAL</td><td>17,00</td></tr><tr><td>ACUMULADO</td><td>17,00</td></tr></table>									17,00	SUBTOTAL	17,00	CANTIDAD ANTERIOR	0,00	CANTIDAD TOTAL	17,00	ACUMULADO	17,00																																																														
	17,00																																																																														
SUBTOTAL	17,00																																																																														
CANTIDAD ANTERIOR	0,00																																																																														
CANTIDAD TOTAL	17,00																																																																														
ACUMULADO	17,00																																																																														
RESIDENTE DE OBRA				SUPERVISION																																																																											

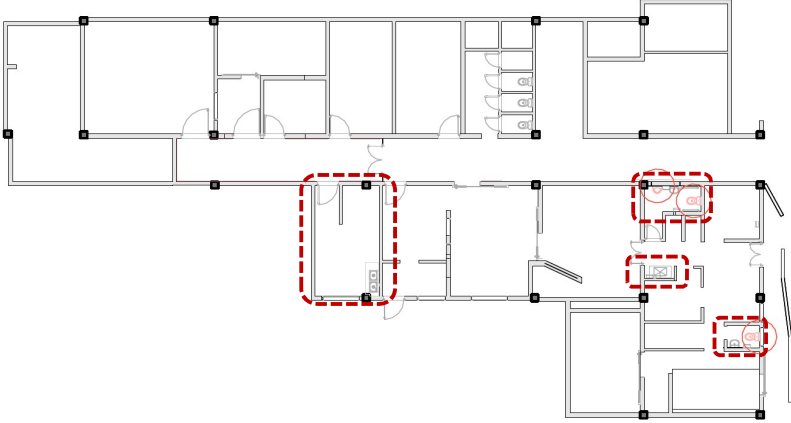
		REGISTRO FOTOGRAFICO Y MEMORIA DE CALCULO																																																																				
MEMORIAS AL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA																																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:		ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL AREA DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE RIONEGRO																																																																				
CONTRATISTA:		LINARQ S.A.S.		CONTRATANTE:		E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO																																																																
CONTRATO N°		240-2025		LOCALIZACION:		MUNICIPIO DE RIONEGRO																																																																
CAPITULO:		2		ITEM		2.16																																																																
		Anulacion de salidas sanitarias																																																																				
UNIDAD		CANTIDAD CONTRACTUAL		CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA																																																																
UN		10,000		10,000		6,000																																																																
						16,000																																																																
																																																																						
																																																																						
<table><thead><tr><th>Localizacion</th><th>TIPO</th><th>NOMBRE</th><th>UNIDAD</th><th>LONGITUD</th><th>ALTURA</th><th>ANCHO</th><th>NUM.ELEM</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pozuelos consultorio antiguo</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,000</td></tr><tr><td>Baños de Rx / Sanitario, orinal, lavamanos y piso</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,000</td></tr><tr><td>Baño de personal / Sanitario y lavamanos y piso</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,000</td></tr><tr><td>Pozuelo de acceso Rx</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Tuberias antiguas en piso de recuperacion tomografia</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,000</td></tr><tr><td>Tuberias antiguas en piso en Rx y mamografia</td><td></td><td></td><td>un</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,000</td></tr></tbody></table>								Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL	Pozuelos consultorio antiguo			un				2,00	2,000	Baños de Rx / Sanitario, orinal, lavamanos y piso			un				4,00	4,000	Baño de personal / Sanitario y lavamanos y piso			un				3,00	3,000	Pozuelo de acceso Rx			un				1,00	1,000	Tuberias antiguas en piso de recuperacion tomografia			un				3,00	3,000	Tuberias antiguas en piso en Rx y mamografia			un				3,00	3,000
Localizacion	TIPO	NOMBRE	UNIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	NUM.ELEM	TOTAL																																																														
Pozuelos consultorio antiguo			un				2,00	2,000																																																														
Baños de Rx / Sanitario, orinal, lavamanos y piso			un				4,00	4,000																																																														
Baño de personal / Sanitario y lavamanos y piso			un				3,00	3,000																																																														
Pozuelo de acceso Rx			un				1,00	1,000																																																														
Tuberias antiguas en piso de recuperacion tomografia			un				3,00	3,000																																																														
Tuberias antiguas en piso en Rx y mamografia			un				3,00	3,000																																																														
<table><tr><td></td><td>16,00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>16,00</td></tr><tr><td>CANTIDAD ANTERIOR</td><td>0,00</td></tr><tr><td>CANTIDAD TOTAL</td><td>16,00</td></tr><tr><td>ACUMULADO</td><td>16,00</td></tr></table>									16,00			SUBTOTAL	16,00	CANTIDAD ANTERIOR	0,00	CANTIDAD TOTAL	16,00	ACUMULADO	16,00																																																			
	16,00																																																																					
SUBTOTAL	16,00																																																																					
CANTIDAD ANTERIOR	0,00																																																																					
CANTIDAD TOTAL	16,00																																																																					
ACUMULADO	16,00																																																																					
RESIDENTE DE OBRA				SUPERVISION																																																																		



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.2	Construccion de Muro en Drywall Dos caras en placa de yeso
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m ²	78.05	38.10	0	38.10

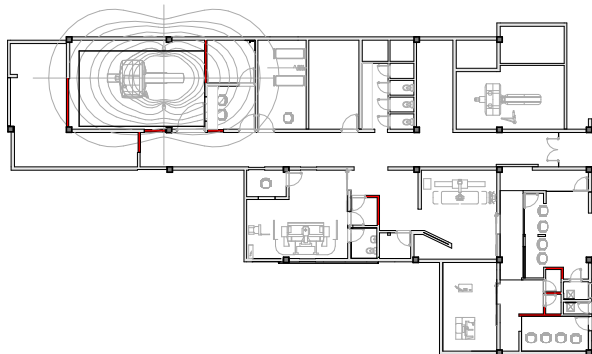

3.2 - Construccion de Muro en Drywall Dos caras base 9

Type	Localización	Area	Phase Created
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Resonador	5.58 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier Fluoroscopia	2.98 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier Fluoroscopia	4.62 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier mamografia	2.96 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier mamografia	1.60 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier mamografia	2.93 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Resonador	7.10 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Acceso desde corredor a oficinas posteriores	3.30 m ²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	sala lectura mamografia	7.02 m ²	Nueva construcción
		38.10 m ²	



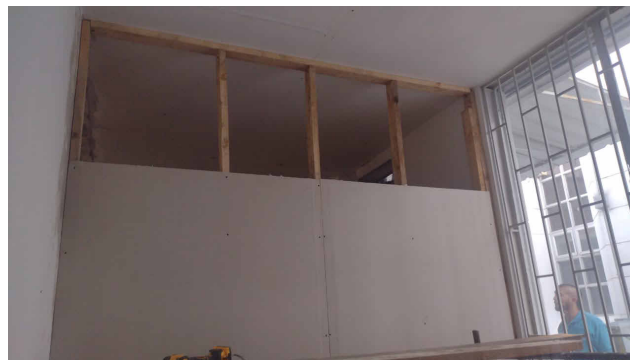




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.3	Construccion de FAJAS en Drywall. Estructura interior lamina galvanizada, y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	72.80	72.80		12.96
				85.76

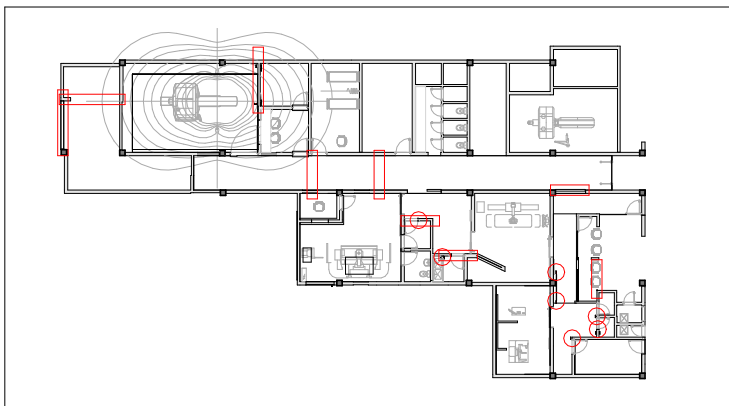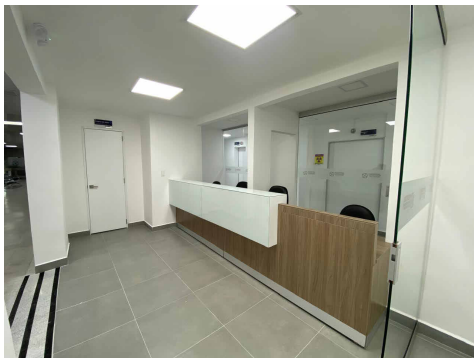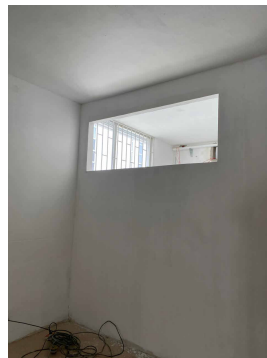

3.3 Fajas en drywall

Localización	Longitud (ml)
--------------	---------------

acceso cooredor	1.79 m
acceso cooredor	1.79 m

Corredor	2.03 m
Corredor	2.03 m
Corredor	2.03 m
Corredor	2.03 m
Corredor	2.03 m
Corredor	2.03 m

Mamografia	2.80 m
Mamografia	2.80 m
Mamografia	2.80 m
Mamografia	2.10 m
Mamografia	2.80 m
Mamografia	2.44 m
Mamografia	2.44 m
Mamografia	2.44 m
Mamografia	2.50 m
Mamografia	2.50 m

oficina posterior	3.16 m
oficina posterior	3.16 m
oficina posterior	3.16 m
oficina posterior	2.90 m
oficina posterior	2.90 m

Resonador	2.00 m
Resonador	0.75 m
Resonador	2.00 m
Resonador	0.75 m
Resonador	0.75 m
Resonador	0.75 m
Resonador	0.75 m
Resonador	0.75 m
Resonador	2.50 m
Resonador	2.50 m

3.3 Fajas en drywall

Localización	Longitud (ml)
--------------	---------------

Trabajo sucio	2.10 m
Trabajo sucio	2.10 m
Trabajo sucio	2.10 m
Trabajo sucio	0.85 m
Trabajo sucio	2.10 m
Trabajo sucio	0.85 m
Trabajo sucio	0.85 m


Vestier Fluoroscopio	2.10 m
Vestier Fluoroscopio	0.85 m
Vestier Fluoroscopio	0.85 m
Vestier Fluoroscopio	0.85 m
Grand total	85.76 m



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.4	Anulacion de salidas sanitarias
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m2	106.05	58.84	0	58.84

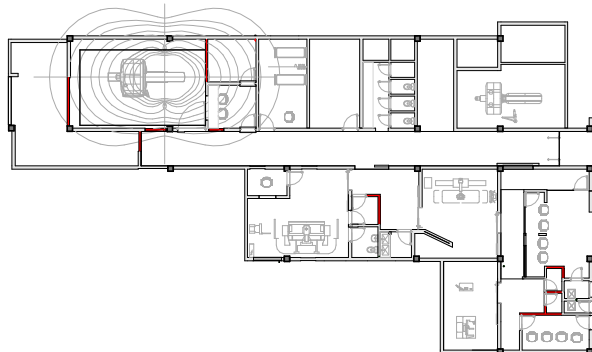

3.4 - Suministro e instalacion de lana mineral tipo frescasa


Type	Localización	Area	Phase Created
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Resonador	5.58 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier Fluoroscopio	2.98 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier Fluoroscopio	4.62 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier mamografia	2.96 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier mamografia	1.60 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Vestier mamografia	2.93 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Resonador	7.10 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	Acceso desde corredor a oficinas posteriores	3.30 m²	Nueva construcción
MDW_Muro en Drywall_Base 9 Nuevo	sala lectura mamografia	7.03 m²	Nueva construcción
		38.11 m²	
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	Divisor baño y vestier	2.98 m²	Nueva construcción
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	trabajo sucio	2.87 m²	Nueva construcción
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	trabajo sucio	0.41 m²	Nueva construcción
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	Vestier mamografia	5.25 m²	Nueva construcción
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	Vestier mamografia	2.24 m²	Nueva construcción
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	Vestier mamografia	2.04 m²	Nueva construcción
NUEVO DRYWALL BASE 9 MIXTO	Baño-Trabajo sucio	4.95 m²	Nueva construcción
		20.73 m²	
		58.84 m²	



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO



MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.5	Perfil esquinero en PVC
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ml	163.8	75.22	0	75.22

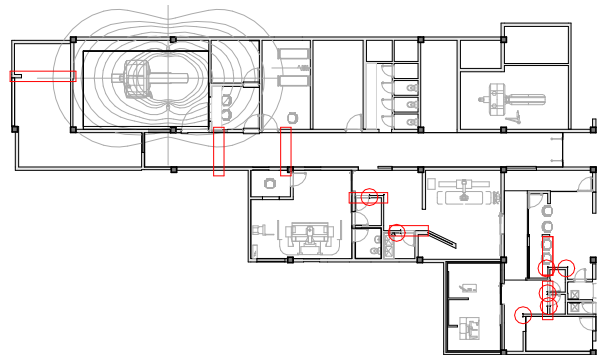

3.5 Perfil esquinero PVC

Localización	Longitud (ml)
Acceso sala lectura mamografo	2.80 m
Acceso sala lectura mamografo	2.80 m
Apertura AA Sala equipos	0.46 m
Apertura AA Sala equipos	0.47 m
Apertura AA Sala equipos	1.93 m
Apertura AA Sala equipos	1.93 m
Apertura AA Sala equipos	0.46 m
Apertura AA Sala equipos	0.47 m
Apertura AA Sala equipos	1.93 m
Apertura AA Sala equipos	1.93 m
Apertura Vano puerta vestier	2.80 m
Apertura Vano puerta vestier	2.80 m
Apertura Vano puerta vestier	2.80 m
Apertura Vano puerta vestier	2.80 m
Apertura Vano puerta vestier	2.80 m
Apertura vanos en corredor ppal	1.80 m
Corredor	2.05 m
Corredor	2.05 m
Dintel recepcion	2.42 m
Dintel recepcion	2.42 m
Dintel recepcion	2.05 m
Dintel recepcion	2.05 m
Dintel recepcion	3.30 m
Dintel recepcion	3.30 m
Recepcion imagenes	2.80 m
Recepcion imagenes	2.50 m
Trabajo sucio	2.10 m
Trabajo sucio	2.10 m
Trabajo sucio	2.50 m
Trabajo sucio	2.50 m
Trabajo sucio	0.85 m
Trabajo sucio	0.85 m
Vestier Fluoroscopio	2.10 m
Vestier Fluoroscopio	2.10 m
Vestier Fluoroscopio	2.50 m
Vestier Fluoroscopio	0.85 m
Vestier Fluoroscopio	0.85 m
75.22 m	

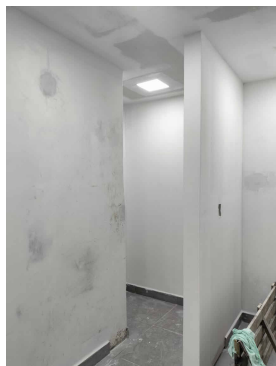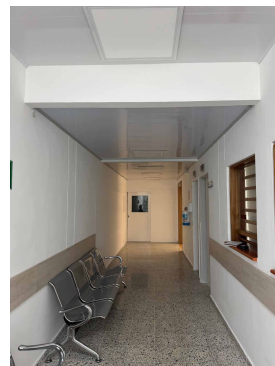




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.6	Refuerzo en madera plastica
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	80.80	31.15		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				31.15

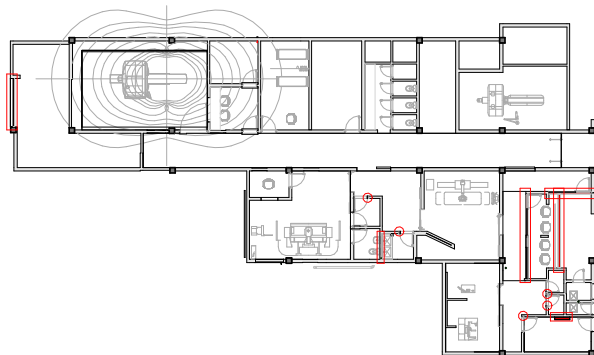

3.6 - Refuerzo en madera plastica


Localización	Longitud (ml)
Aire acondicionado	0.90 m
Aire acondicionado	0.90 m
Puerta mamografia lectura	2.10 m
Puerta recepcion	2.64 m
Puerta trabajo sucio	2.10 m
Puerta vestier	2.10 m
Puerta vestier	2.10 m
Puerta vestier	2.10 m
Puerta vestier fluoroscopio	2.10 m
Refuerzo baño y mueble metal	1.70 m
refuerzo dintel	4.47 m
refuerzo dintel ventaneria	5.04 m
Ventana oficina posterior	2.90 m
total refuerzos: 13	31.15 m



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.7	Construccion muro en bloque de concreto + grouting
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	27.47	29.07		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				29.07

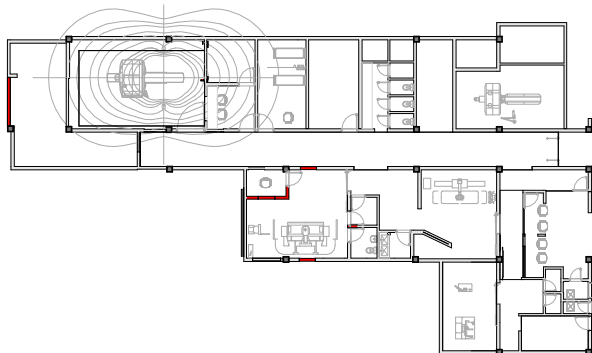

3.7- Construccion de Muro bloque de concreto

Localización	Area
Muro sala lectura	7.10 m²
Muro acceso sala lectura	2.87 m²
Puerta antiguo consultorio	2.02 m²
Puerta a patio antigua sala lectura	2.02 m²
ventana antiguo consultorio	1.68 m²
ventana antiguo consultorio	1.30 m²
ventana antiguo consultorio	1.27 m²
Divisor baño y vestier	1.82 m²
Muro posterior, ventanas	3.46 m²
ventanas y extractores en muro bloque	5.55 m²
	29.07 m²






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.8	Revoque en muros
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m2	54.94	54.94	3.2	58.14

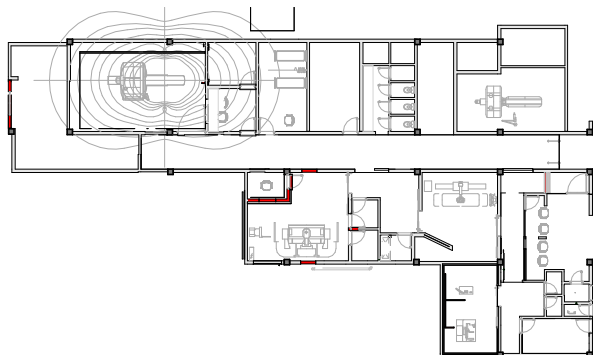

3.8- Revoque en muros

Localización	Área
Muro sala lectura	7.10 m²
Muro acceso sala lectura	2.86 m²
Puerta antiguo consultorio	1.89 m²
Puerta a patio antigua sala lectura	1.89 m²
ventana antiguo consultorio	1.68 m²
ventana antiguo consultorio	1.30 m²
ventana antiguo consultorio	1.27 m²
Divisor baño y vestier	1.82 m²
Muro posterior, ventanas	3.04 m²
ventanas y extractores en muro bloque	5.55 m²
	28.39 m²

cara a cara, total: 58.14 m²

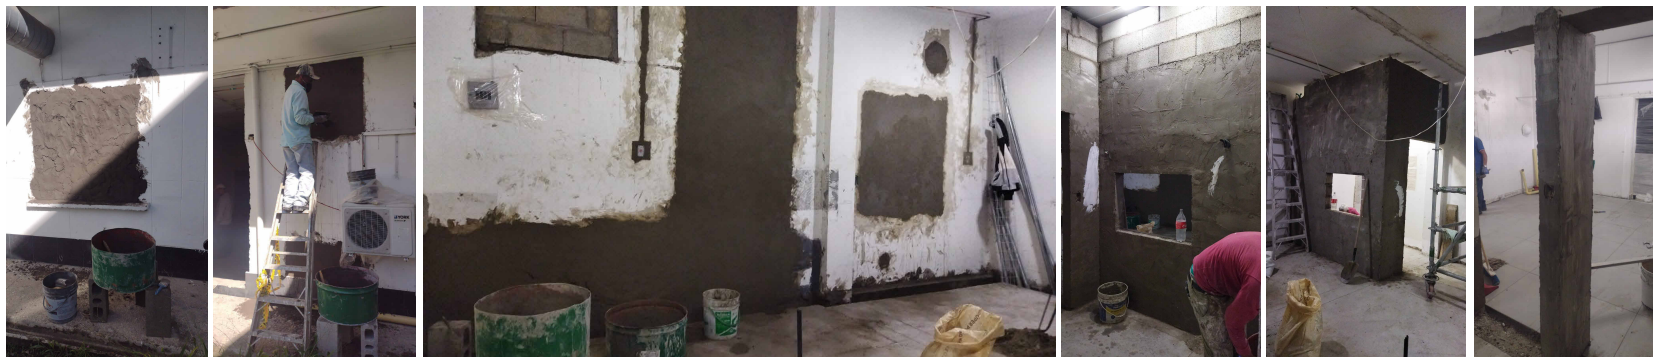



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO



MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	3	ITEM	3.9	Estuco en muros
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m²	591,65	182.07	0	182.07



3.9 - Estuco en muros

Localización	Largo	Alto	Area
corredor	0.80 m	0.98 m	0.78 m²
corredor	1.10 m	2.10 m	2.31 m²
corredor	2.28 m	4.37 m	4.98 m²
Fluoroscopio	1.98 m	0.98 m	1.76 m²
Fluoroscopio	3.78 m	3.00 m	3.78 m²
Fluoroscopio	1.58 m	2.10 m	3.32 m²
Fluoroscopio	2.00 m	2.50 m	4.95 m²
Fluoroscopio	5.33 m	2.86 m	8.42 m²
Fluoroscopio	17.52 m	20.30 m	44.02 m²
Mamografia	1.03 m	2.15 m	2.17 m²
Mamografia	43.32 m	65.00 m	102.91 m²
Oficina de correo	2.97 m	0.93 m	2.67 m²
	83.69 m	107.27 m	182.07 m²

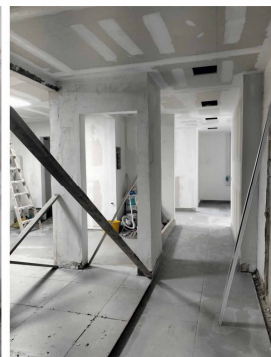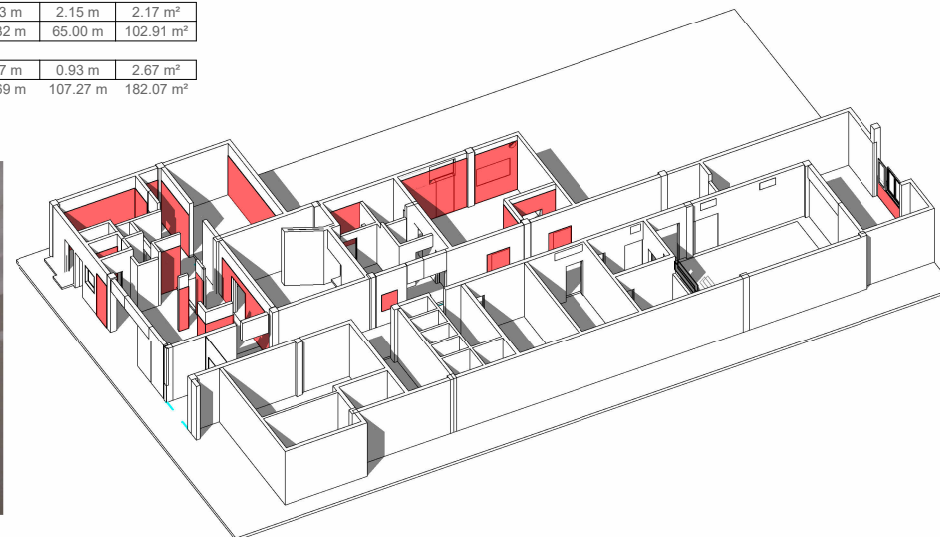




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	4	ITEM	4.1	Aplicación de PINTURA EN VINILO de primera calidad sobre muros, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m²	591,65	591,65	16,89	608,54

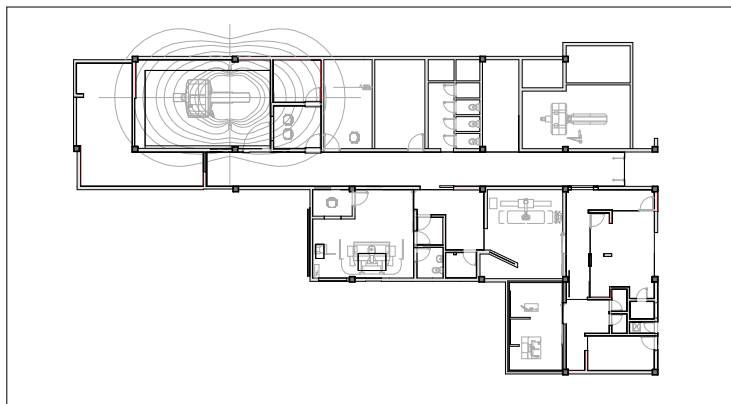


4.1 - Aplicación de pintura en vinilo		4.1 - Aplicación de pintura en vinilo		4.1 - Aplicación de pintura en vinilo		4.1 - Aplicación de pintura en vinilo	
Localización	Area	Localización	Area	Localización	Area	Localización	Area
Aseo	1.23 m²	hall imagenes	0.77 m²	oficina de correspondencia	10.72 m²	sala equipos resonador	8.16 m²
Aseo	2.58 m²	hall imagenes	1.02 m²	oficina de correspondencia	16.99 m²	sala equipos resonador	0.64 m²
Aseo	3.60 m²	hall imagenes	6.85 m²	rampa	0.38 m²	sala lectura mamografia	10.98 m²
Aseo	2.58 m²	hall imagenes	0.70 m²	rampa	1.02 m²	sala lectura mamografia	3.43 m²
Aseo	4.23 m²	hall recepcion	0.55 m²	rampa	20.58 m²	sala lectura mamografia	2.91 m²
Aseo	1.68 m²	hall recepcion	3.12 m²	rampa	0.30 m²	sala lectura mamografia	0.45 m²
Aseo	4.23 m²	hall recepcion	3.15 m²	rampa	0.68 m²	sala lectura mamografia	0.70 m²
Aseo	0.43 m²	hall recepcion	1.50 m²	rampa	2.45 m²	sala lectura resonador	7.09 m²
Aseo	1.08 m²	hall recepcion	0.45 m²	rampa	9.29 m²	sala lectura resonador	8.13 m²
Aseo	0.24 m²	hall recepcion	0.35 m²	rampa	0.38 m²	sala lectura resonador	6.02 m²
corredor	18.65 m²	hall recepcion	1.83 m²	rampa	0.38 m²	sala lectura resonador	8.83 m²
corredor	37.16 m²	hall recepcion	0.35 m²	rampa	2.93 m²	sala lectura resonador	9.92 m²
corredor	5.63 m²	hall recepcion	1.80 m²	rampa	3.60 m²	sala lectura resonador	20.05 m²
corredor	0.03 m²	hall recepcion	3.35 m²	rampa	0.48 m²	sala lectura resonador	0.75 m²
corredor	6.50 m²	hall recepcion	2.43 m²	rampa	2.91 m²	trabajo sucio	2.63 m²
corredor	23.42 m²	hall recepcion	2.69 m²	rampa	0.40 m²	trabajo sucio	3.32 m²
corredor	7.74 m²	hall recepcion	1.73 m²	rampa	0.30 m²	trabajo sucio	4.05 m²
corredor	19.64 m²	hall recepcion	1.25 m²	Resonador	0.45 m²	trabajo sucio	3.32 m²
corredor	0.70 m²	hall recepcion	2.38 m²	Resonador	1.02 m²	Vestier Fluoroscopio	2.12 m²
corredor	0.56 m²	hall recepcion	0.88 m²	Resonador	8.99 m²	Vestier Fluoroscopio	4.16 m²
corredor	6.11 m²	hall recepcion	0.75 m²	Resonador	18.02 m²	Vestier Fluoroscopio	3.37 m²
corredor	0.70 m²	hall recepcion	0.85 m²	Resonador	0.38 m²	Vestier Fluoroscopio	2.35 m²
corredor	4.14 m²	hall recepcion	1.08 m²	Resonador	1.12 m²	Vestier Fluoroscopio	0.44 m²
corredor	12.55 m²	hall recepcion	1.13 m²	Resonador	0.38 m²	Vestier Fluoroscopio	0.97 m²
corredor	6.13 m²	hall recepcion	0.30 m²	Resonador	6.18 m²	Vestier Fluoroscopio	0.31 m²
corredor	17.65 m²	hall recepcion	1.13 m²	Resonador	15.66 m²	Vestier mamografia	0.40 m²
corredor	5.40 m²	hall recepcion	0.33 m²	Resonador	2.84 m²	Vestier mamografia	1.36 m²
corredor	0.95 m²	hall recepcion	2.69 m²	Resonador	0.35 m²	Vestier mamografia	2.24 m²
corredor	6.54 m²	hall vestier	3.66 m²	Resonador	1.09 m²	Vestier mamografia	2.88 m²
corredor	0.37 m²	hall vestier	1.53 m²	Resonador	0.35 m²	Vestier mamografia	2.24 m²
corredor	4.82 m²	hall vestier	3.65 m²	Resonador	17.33 m²	Vestier mamografia	0.32 m²
Corredor Resonador	0.92 m²	oficina de correspondencia	1.15 m²	Resonador	0.38 m²	Vestier mamografia	2.28 m²
hall imagenes	0.91 m²	oficina de correspondencia	9.22 m²	Resonador	1.02 m²	Vestier mamografia	3.29 m²
hall imagenes	2.00 m²	oficina de correspondencia	1.34 m²	Resonador	0.64 m²	Vestier mamografia	2.23 m²
hall imagenes	5.25 m²	oficina de correspondencia	0.70 m²	sala equipos resonador	9.15 m²	Vestier mamografia	1.76 m²
hall imagenes	2.59 m²	oficina de correspondencia	1.34 m²	sala equipos resonador	7.23 m²		608.54 m²
hall imagenes	8.25 m²	oficina de correspondencia	5.82 m²	sala equipos resonador	7.13 m²		



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	4	ITEM	4.2	Sellos con elastica
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ml	248,4	95.79	0	95.79

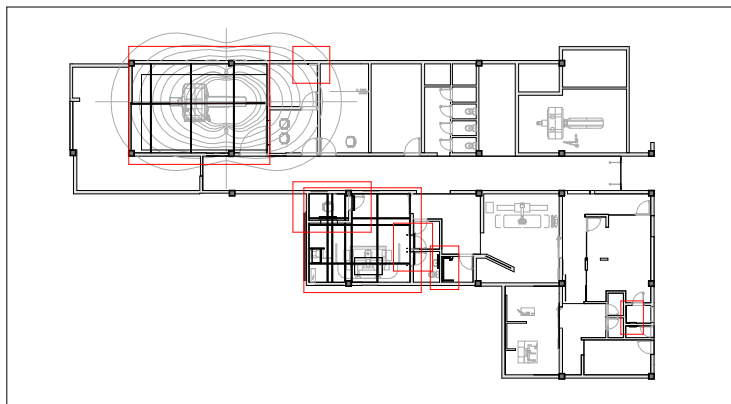


4.2 - Sellos con Elastica		4.2 - Sellos con Elastica	
Localización	Longitud (ml)	Localización	Longitud (ml)
aseo	0.40 m	Puertas fluoroscopia	0.85 m
aseo	0.40 m	Puertas fluoroscopia	0.85 m
aseo equipos resonador	0.40 m	Puertas fluoroscopia	0.85 m
aseo equipos resonador	0.40 m	Puertas fluoroscopia	2.10 m
Dilatación piso Fluoroscopia	5.39 m	Ventana fluoroscopia	0.80 m
Dilatación piso Fluoroscopia	5.39 m	Ventana fluoroscopia	0.80 m
Dilatación piso Fluoroscopia	5.39 m	Ventana fluoroscopia	1.00 m
Dilatación piso Fluoroscopia	5.39 m	Ventana fluoroscopia	1.00 m
Dilatación piso Fluoroscopia	5.39 m	Total	95.79 m
Dilatación piso Fluoroscopia	6.00 m		
Dilatación piso Fluoroscopia	6.00 m		
Dilatación piso Fluoroscopia	6.00 m		
Dilatación piso Fluoroscopia	1.48 m		
Dilatación piso Fluoroscopia	0.90 m		
Dilatación piso Resonador	5.31 m		
Dilatación piso Resonador	5.31 m		
Dilatación piso Resonador	5.31 m		
Dilatación piso Resonador	7.98 m		
lavamanos fluoroscopia	0.80 m		
meson Trabajo sucio	1.38 m		
meson Trabajo sucio	0.38 m		
meson Trabajo sucio	0.13 m		
meson Trabajo sucio	0.91 m		
meson Trabajo sucio	0.60 m		
Puertas fluoroscopia	2.10 m		
Puertas fluoroscopia	2.10 m		
Puertas fluoroscopia	2.10 m		
Puertas fluoroscopia	2.10 m		
Puertas fluoroscopia	2.10 m		



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO





MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	5	ITEM	5.1	Suministro e instalación de cielo falso en drywall e=1/2" a junta perdida
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m²	316,48	144.34		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				144.34

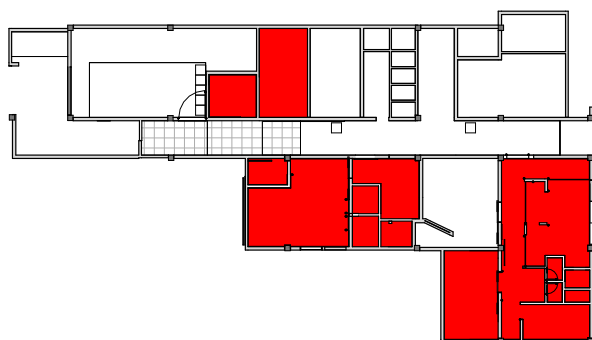

5.1 Cielos drywall

Localización	Area
Consultorio	15.29 m²
Fluoroscopio	26.99 m²
Hall, vestier, trabajo sucio y baño	19.60 m²
Mamografía	71.71 m²
Sala lectura Fluoroscopio	3.64 m²
Sala lectura Resonador	7.10 m²
	144.34 m²

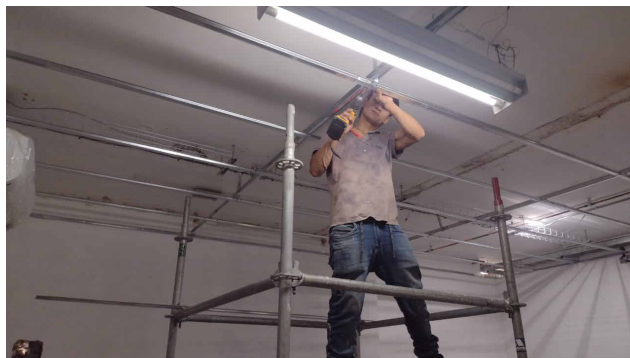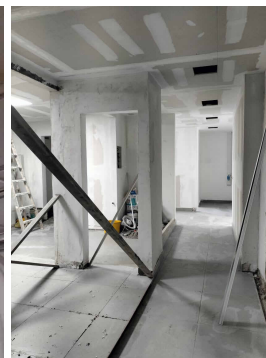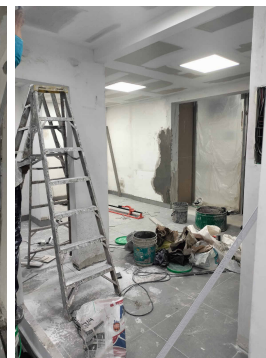




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	5	ITEM	5.2	Registros desmontables 60 x 60
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	8	2		0
				2

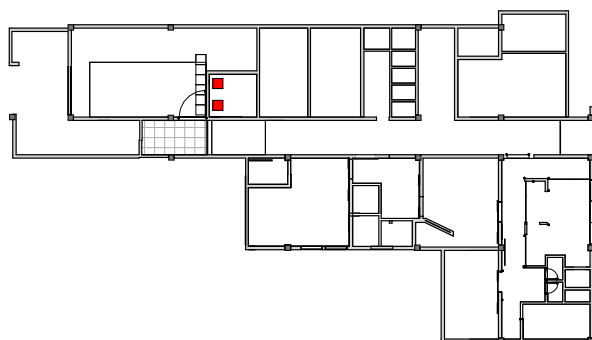

5.2 - registros desmontables

Localización	Count
Sala lectura Resonador	2
	2

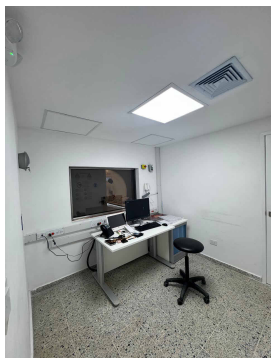




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO



MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	5	ITEM	5.3	Aplicación de PINTURA EN VINILO de primera calidad sobre muros, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m²	0	0	0	113.70

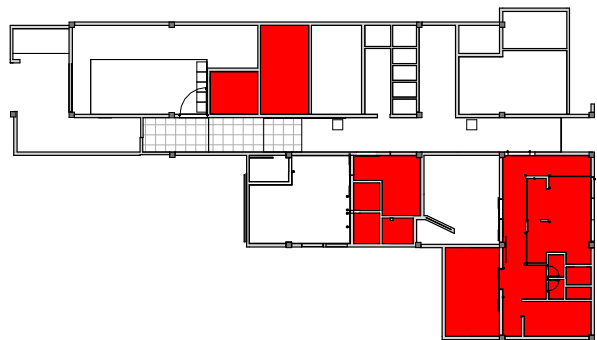

5.3 - Pintura cielos vinilo

Localización	Area	Pintura
Consultorio	15.29 m²	Vinilo
Hall, vestier, trabajo sucio y baño	19.60 m²	Vinilo
Mamografía	71.71 m²	Vinilo
Sala lectura Resonador	7.10 m²	Vinilo
	113.70 m²	

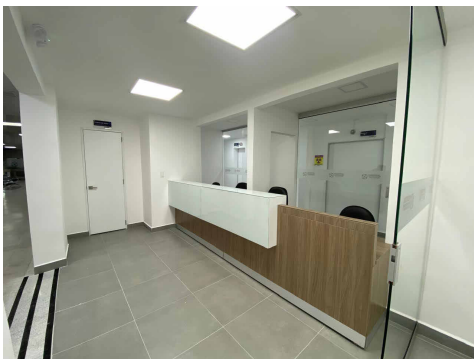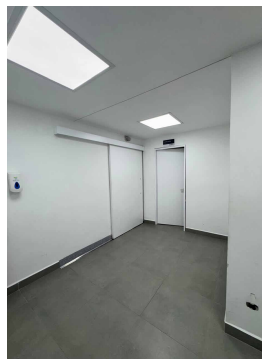




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO




MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	6	ITEM	6.1	Resane de piso en grano en zonas afectadas, incluye mortero, se contempla un desarrollo de 30 cm de ancho
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	34,5	12.60		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				12.60

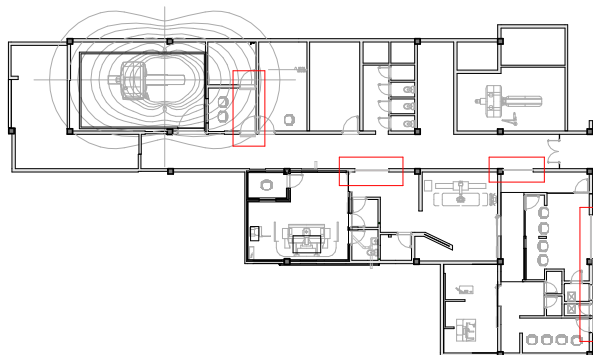

6.1 - Resane de piso grano

Localización	Longitud (ml)
acceso corredor mamografia	1.80 m
acceso hall imagenes	2.00 m
acceso hall recepcion ppal	2.60 m
Corredor ppal	4.40 m
Resonador nuevas puertas	0.90 m
Resonador nuevas puertas	0.90 m
	12.60 m

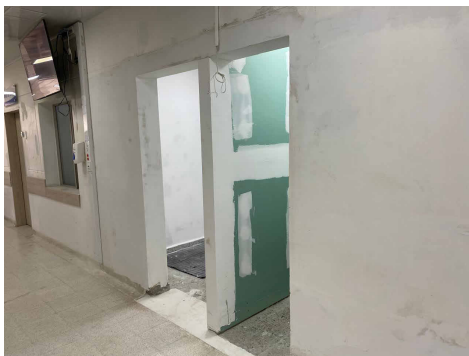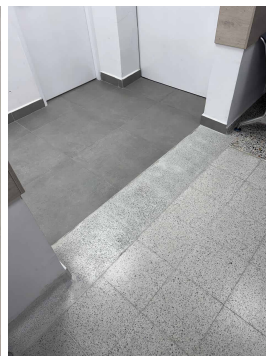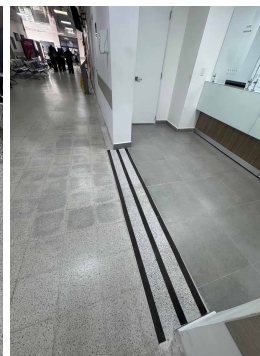




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO




MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	6	ITEM	6.3	Repulida y brillada de piso
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m ²	316,48	60.38	0	60.38

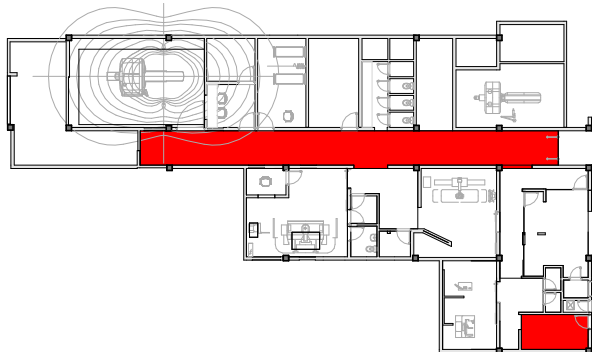

6.3 pulida de piso en grano

Localización	Area
sala lectura mamografia	8.47 m ²
corredor	51.92 m ²
	60.38 m ²

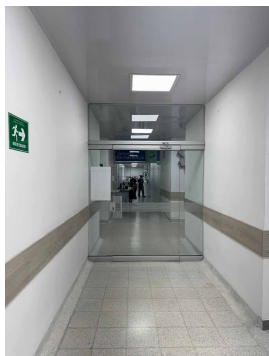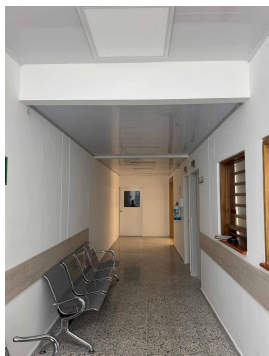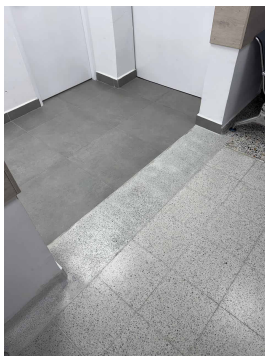




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	7	ITEM	7.1	Suministro e instalacion de superficies flotadas sala de lectura, Incluye soportes (no incluye sillas)
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	5,1	2.36		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				2.36

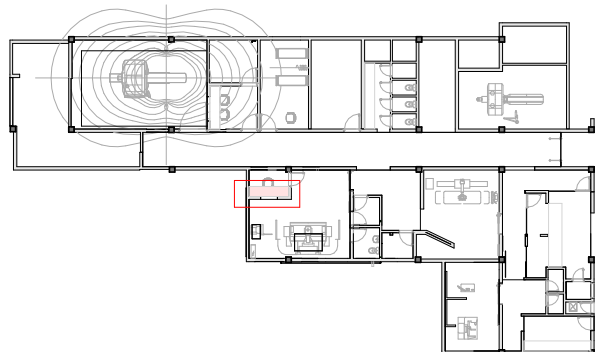

7.1 superficies flotadas sala lectura

Localización	Longitud (ml)
--------------	---------------

sala lectura fluoroscopia	2.36 m
	2.36 m






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA



OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	7	ITEM	7.10	Suministro e instalacion de puerta vidriera batiente, de 0,85x2,40m
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	1	1		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				1

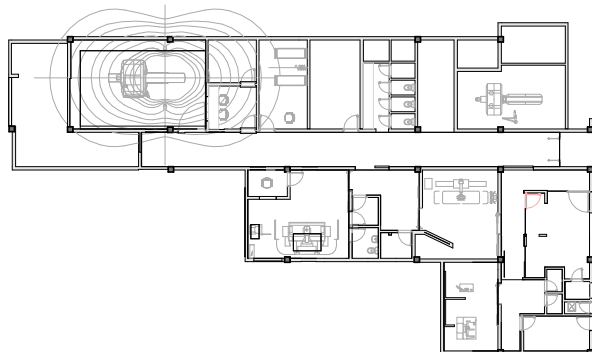

7.10 - Suministro e instalacion de puerta vidriera batiente, de 0,85x2,40m

Localización	Cantidad
--------------	----------

Recepcion	1
	1

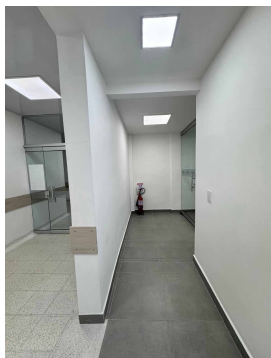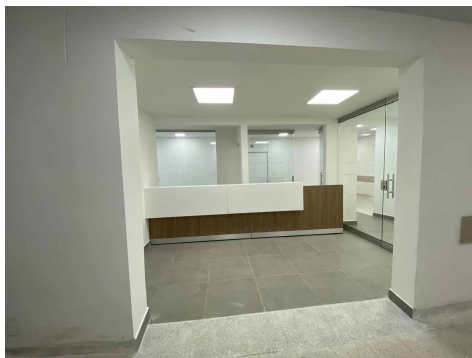




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO





MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	7	ITEM	7.11	Suministro e instalacion de divisorio en vidrio templado
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m ²	11.18	11.18	1.36	12.54

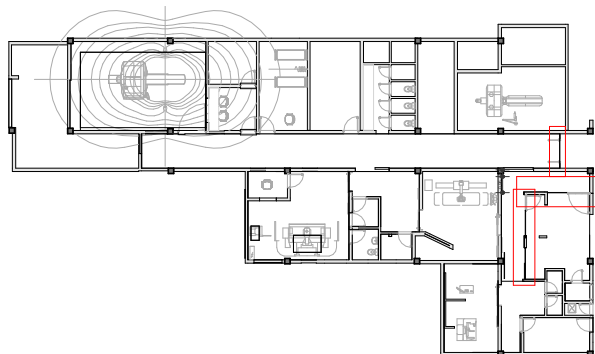

7.11 - Suministro e instalacion de divisorio en vidrio templado

Localización	Area
hall recepcion	4.32 m ²
hall recepcion	3.80 m ²
puerta hall recepcion	3.07 m ²
porcion superior puerta de vidrio acceso corredor	1.35 m ²
	12.54 m ²

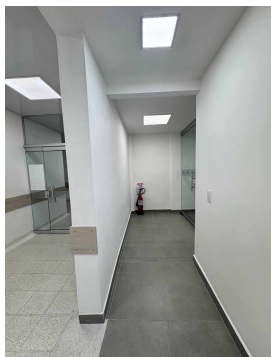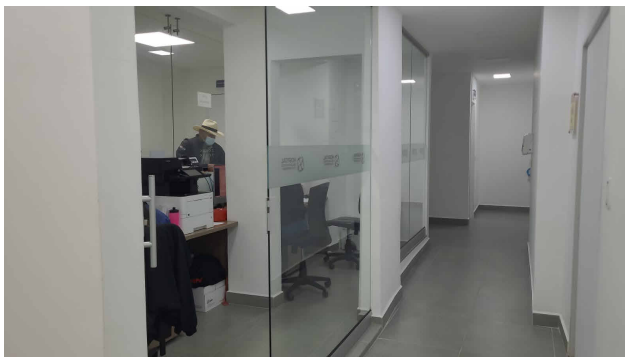





REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	8	ITEM	8.6	Combo sanitario y lavamanos Acuacer Plus con pedestal
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	1	1		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				1

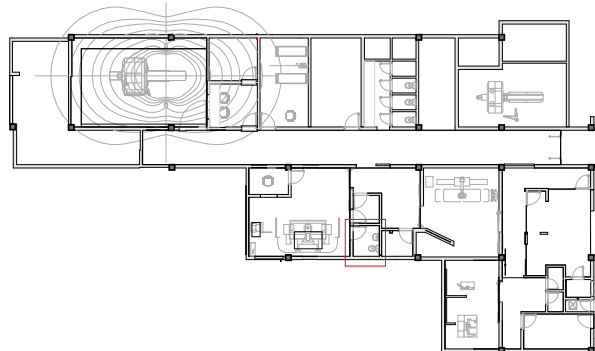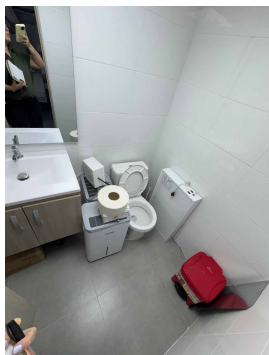




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	8	ITEM	8.11	Suministro e instalacion de llaves de regulacion y acoples marca grival o equivalente para sanitarios, lavamanos y pozuelos
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	3	3		1
				CANTIDAD ACUMULADA
				4

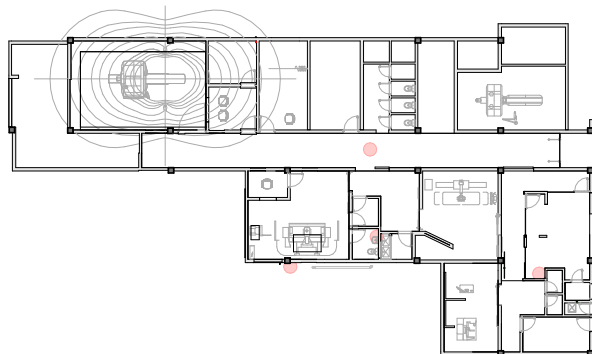

8.11 - Suministro e instalacion de llaves de regulacion y acoples marca grival o equivalente para sanitarios, lavamanos y pozuelos

Localización	Cantidad
Baño fluoroscopio	1
salida ppal fachada	1
Recepcion	1
corredor	1
	4

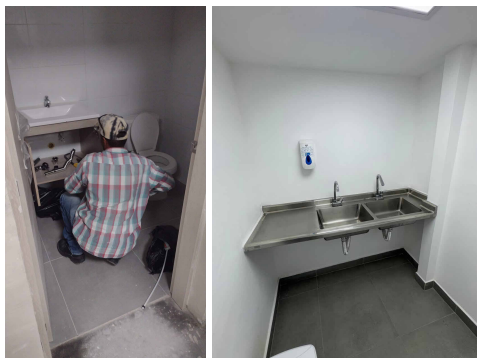




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	9	ITEM	9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN DIAM. 1/2" RDE. 9. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CUELGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	30.9	30.9		7.69
				38.59

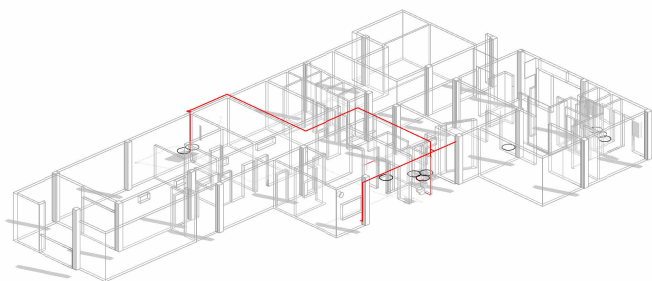

9.3 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. PRESIÓN DIAM. 1/2" RDE. 9. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, LIMPIADOR, CUELGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Diametro	Tipo	Largo (ml)
1/2 inø	Abastos	3.02 m
1/2 inø	Abastos	2.60 m
1/2 inø	Abastos	0.12 m
1/2 inø	Abastos	0.06 m
1/2 inø	Abastos	0.14 m
1/2 inø	Abastos	0.27 m
1/2 inø	Abastos	0.42 m
1/2 inø	Abastos	0.59 m
1/2 inø	Abastos	0.16 m
1/2 inø	Abastos	6.12 m
1/2 inø	Abastos	4.32 m
1/2 inø	Abastos	6.64 m
1/2 inø	Abastos	0.07 m
1/2 inø	Abastos	0.03 m
1/2 inø	Abastos	0.29 m
1/2 inø	Abastos	0.06 m
1/2 inø	Abastos	0.02 m
1/2 inø	Abastos	0.34 m
1/2 inø	Abastos	0.08 m
1/2 inø	Abastos	0.08 m
1/2 inø	Abastos	2.52 m
1/2 inø	Abastos	1.75 m
1/2 inø	Abastos	2.98 m
1/2 inø	Abastos	5.88 m
		38.59 m






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO



MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	9	ITEM	9.4	SALIDA A. FRÍA DIAM 1/2" PARA POZUELOS, LAVAMANOS, DUCHAS, LAVADEROS, ORINALES, SANITARIOS DE TANQUE. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P DIAM. 1/2" HASTA 3 METROS Y ACCESORIOS DIAM. 1/2" EN PVC, CÁMARA DE AIRE, TERMINALES EN PVC, SOLDAURA PVC, LIMPIADOR PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
un	3	3	7	10

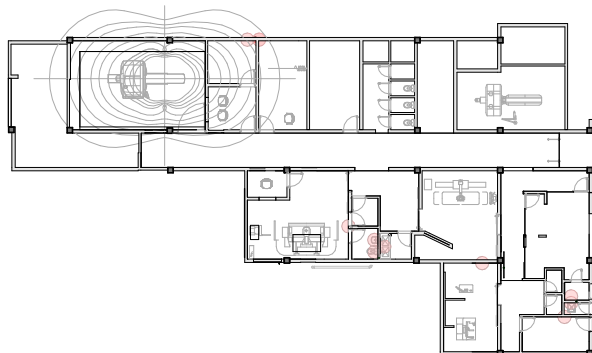

9.4 / SALIDA A. FRÍA DIAM 1/2" PARA POZUELOS, LAVAMANOS, DUCHAS, LAVADEROS, ORINALES, SANITARIOS DE TANQUE. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P DIAM. 1/2" HASTA 3 METROS Y ACCESORIOS DIÁ...

Localización	Cantidad
Baño	1
Baño	1
Trabajo sucio	1
AA Fluoroscopia	1
AA mamografia	1
AA sala de lectura mamografia	1
Aseo corredor	1
Aseo recepcion	1
Aseo cuarto equipos	1
Salida patio	1
	10

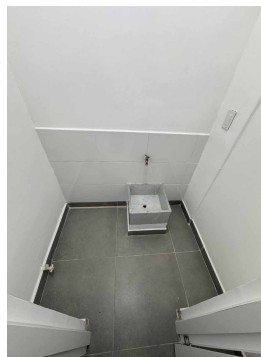




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO




MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	9	ITEM	9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	0	0		10.56
				10.56

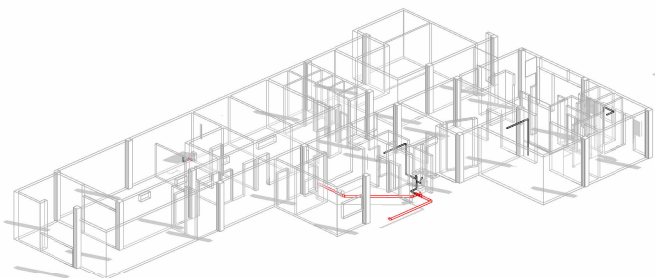

9.8 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"

Diametro	Tipo	Largo (ml)
4 ine	Desagues	2.20 m
4 ine	Desagues	3.90 m
4 ine	Desagues	0.22 m
4 ine	Desagues	0.73 m
4 ine	Desagues	0.12 m
4 ine	Desagues	0.12 m
4 ine	Desague	3.28 m
		10.56 m

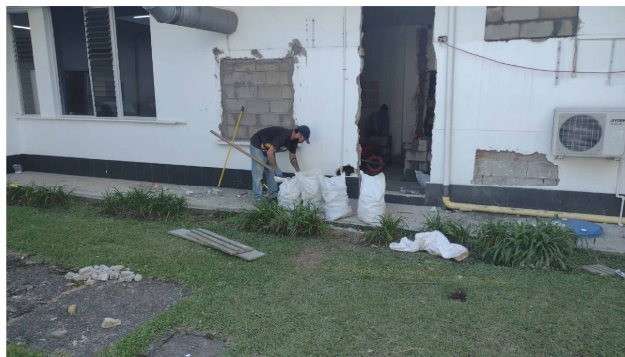




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	9	ITEM	9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 2"
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
ml	26	14.50		14.50

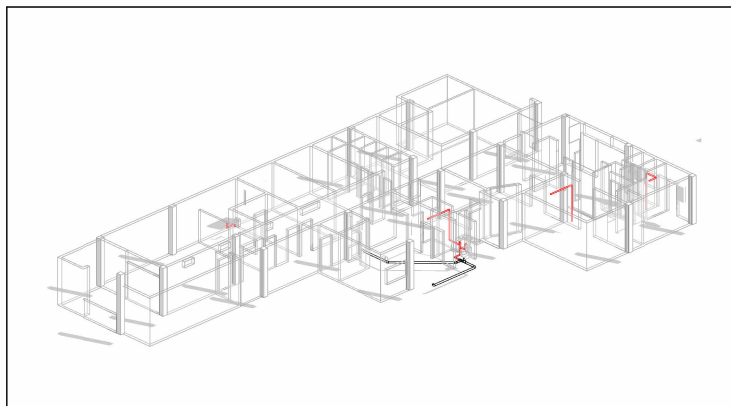

9.9 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"

Diametro	Tipo	Largo (ml)
2 inø	Desagues	0.35 m
2 inø	Desagues	0.36 m
2 inø	Desagues	0.37 m
2 inø	Desagues	0.23 m
2 inø	Desagues	0.30 m
2 inø	Desagues	0.08 m
2 inø	Desagues	1.74 m
2 inø	Desagues	1.92 m
2 inø	Desagues	0.77 m
2 inø	Desagues	0.02 m
2 inø	Desagues	1.68 m
2 inø	Desagues	2.35 m
2 inø	Desagues	0.72 m
2 inø	Desagues	2.35 m
2 inø	Desagues	0.53 m
2 inø	Desagues	0.23 m
2 inø	Desagues	0.41 m
2 inø	Desagues	0.07 m
		14.50 m






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO



MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	9	ITEM	9.12	SA LIDA SENCILLA P.V.C. SANITARIA DIÁM. 2" Y ACCESORIOS DIÁM. 2" PARA LAVAMANOS, POZUELOS, ORINALES; INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 2" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL HORIZONTAL PRINCIPAL), TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS, CUELGAS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	5	5		3
				CANTIDAD ACUMULADA
				8

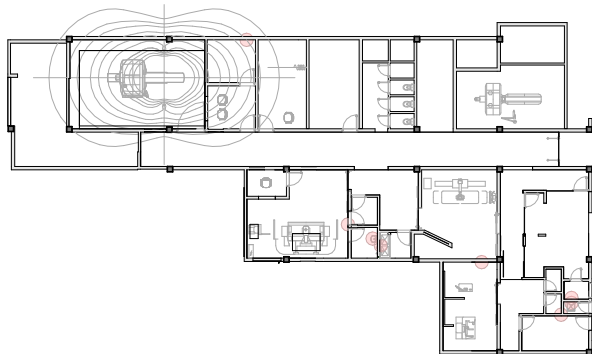

9.12 - SALIDA SENCILLA P.V.C. SANITARIA DIÁM. 2" Y ACCESORIOS DIÁM. 2" PARA LAVAMANOS, POZUELOS, ORINALES; INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 2" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL...

Localización	Cantidad
Lavamanos	1
Trabajo sucio	1
Aseo recepcion	1
Aseo corredor	1
Aseo cuarto equipos	1
AA Fluoroscopio	1
AA mamografia	1
AA sala de lectura mamografia	1
8	

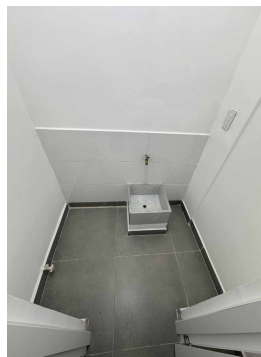





REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	9	ITEM	9.13	SALIDA P.V.C. SANITARIA DIÁM. 4" PARA SANITARIOS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 4" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL HORIZONTAL PRINCIPAL), TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS, CUELGAS, SOLDADURA, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	0	0		1

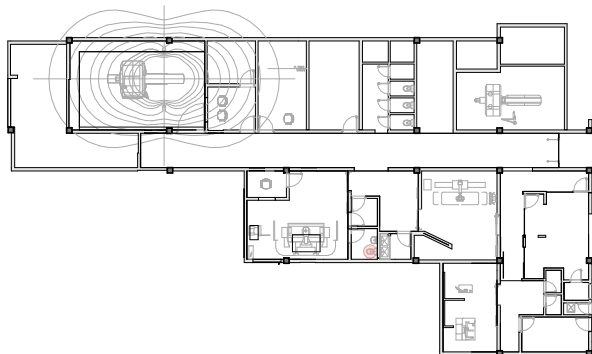

9.13 - SALIDA P.V.C. SANITARIA DIÁM. 4" PARA SANITARIOS INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DIAM 4" (MÁXIMO 2 METROS HASTA ALCANZAR EL RAMAL HORIZONTAL PRINCIPAL), TODOS LOS ACCESORIOS...	
Localización	Cantidad
Baño fluoroscopia	1
	1

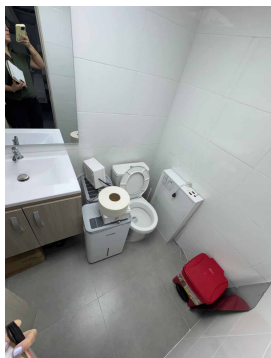




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	11	ITEM	11.1	Aseo durante la obra
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
hr	120	90		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				90

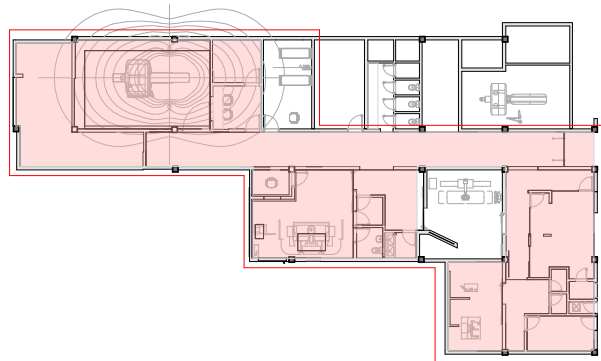

11.1 - Aseo durante la obra

Tipo	Día	Hora por día	Total hora trabajada
Aseo	45	2	90






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO



MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	11	ITEM	11.2	Aseo Final
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m2	316.48	316	0	316

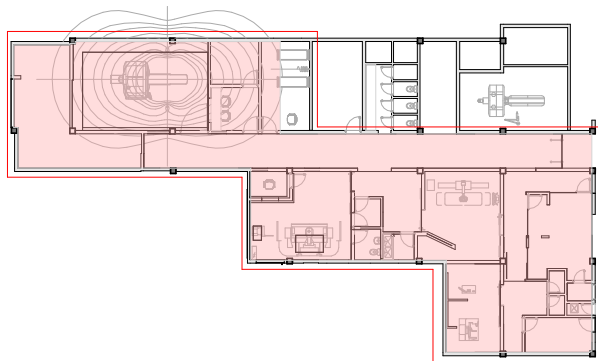

11.2 - Aseo Final

Tipo	Comments
Aseo Final	316.00






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	1	ITEM	RES_1.3	Empaque de escombros y transporte interno
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
Saco	650	650		705
				1.355

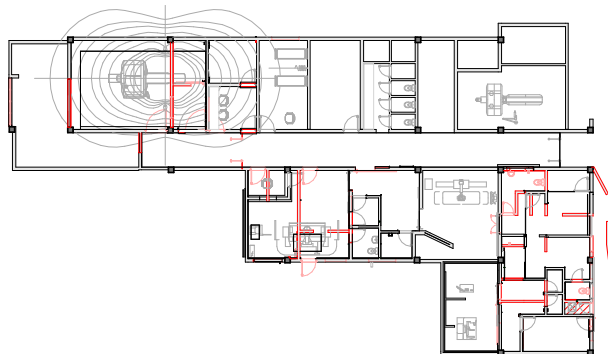

1.3 - Empaque de escombros y transporte interno

Tipo	Viaje	Costales x Viaje	fecha
Alquiler de Volqueta	1	186	12/10/25
	1	186	






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	1	ITEM	RES_1.3	Empaque de escombros y transporte interno
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
Saco	200	186		0
				186

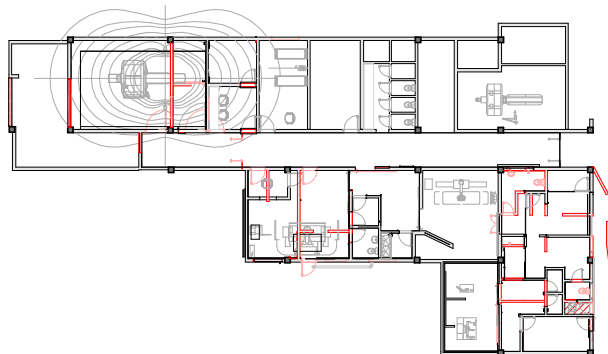

RES_1.3 - Empaque de escombros y transporte interno

Tipo	Viaje	Costales x Viaje	fecha
Alquiler de Volqueta	1	186	12/10/25
	1	186	






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	1	ITEM	RES_1.4	Retiro y botada de escombros y/o basura , en caso de ser requerido en otra actividad no estipulada.
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
Viajes	1	1	0	1

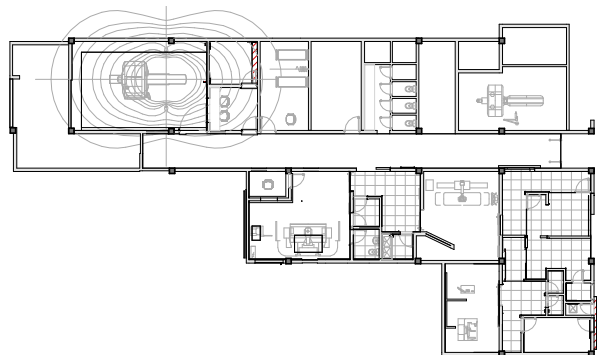

RES_1.4 - Volquetas

Tipo	Fecha	Cantidad de viajes
Alquiler de Volqueta	12/10/25	1
		1

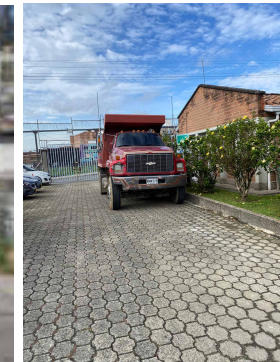




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	4	ITEM	RES_4.1	Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL de primera calidad las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	50	169.23		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				169.23

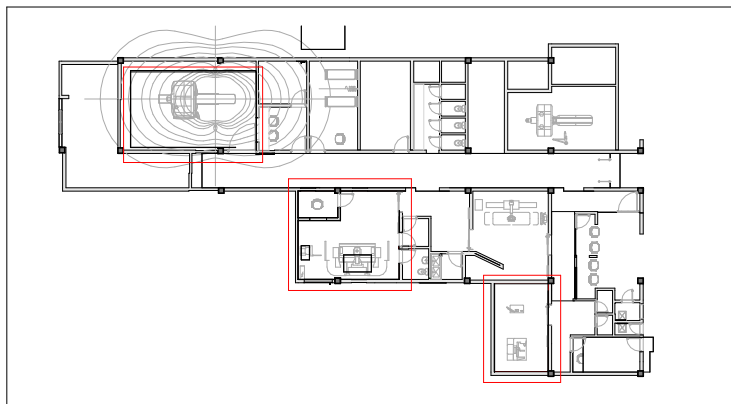

res4.1 - Aplicacion pintura alta asepsia

Type	Localización	Area
Pintura Alta Asepsia	cielo resonador	23.19 m²
Pintura Alta Asepsia	Fluoroscopio	68.52 m²
Pintura Alta Asepsia	Mamografía	39.74 m²
Pintura Alta Asepsia	muros resonador	37.75 m²
		169.20 m²

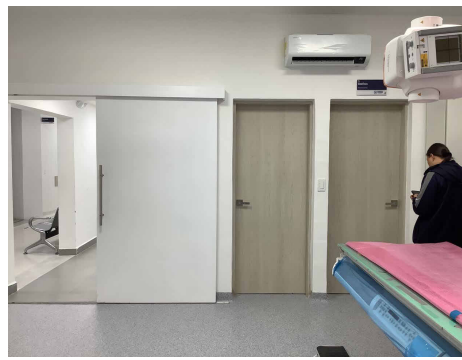




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	5	ITEM	RES_5.1	Suministro e instalación de cielo falso en placa de yeso RH junta perdida con estructura en aluminio
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	50	23.31		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				23.31

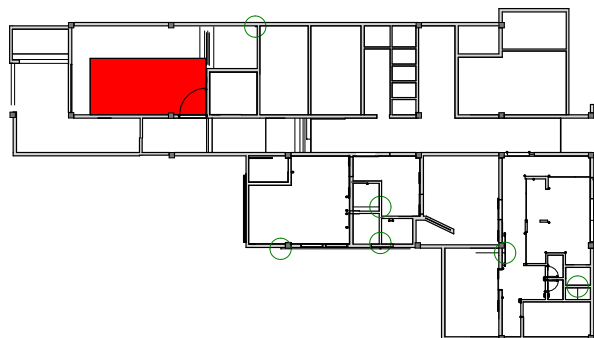

RES_5.1 Suministro e instalación de cielo falso en placa de yeso RH junta perdida con estructura en aluminio

Localización	Area	Pintura
Resonador	23.31 m² 23.31 m²	Alta asepsia






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	5	ITEM	RES_5.3	Media caña para remates de muros y cielos
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	38	38		9.81
				47.81

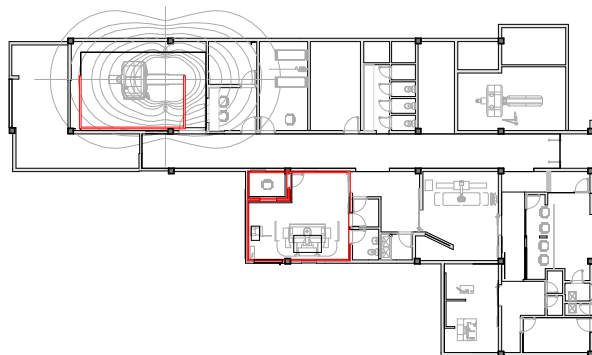

res5.3 media caña cielo

Localización	Length
cielo resonador	12.39 m
fluoroscopio	22.54 m
fluoroscopio	7.88 m
verticales resonador	2.50 m
verticales resonador	2.50 m
	47.81 m

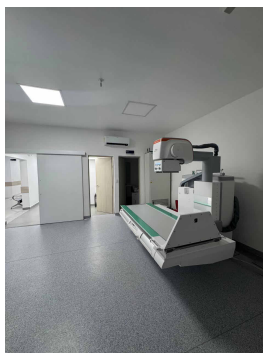



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	5	ITEM	RES_5.4	Media caña para remates de muros y cielos
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
un	1	1		6
				7



5.3 - Registros desmontables 60 x 60

Localización	Cantidad
Resonador, rejistro aluminio microperforado	7
	7

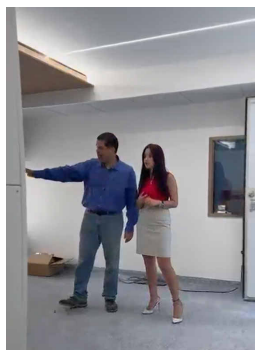




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	6	ITEM	RES_6.1	Piso en vinilo homogeneo
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	43	43		40.63
				83.64

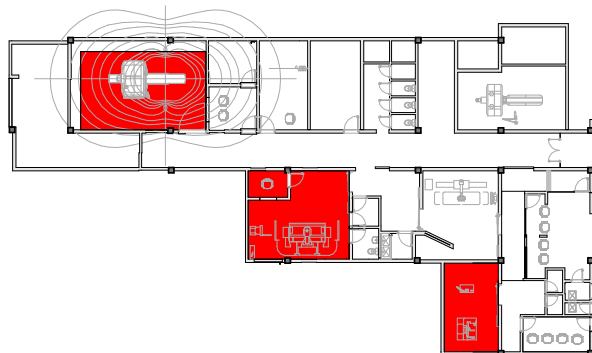

res6.1 - Suministro e instalacion de piso en vinilo (falta media caña)

Tipo	Localización	Area
PISO VINILO	Resonador, Fluoroscopio, Mamografo	83.64 m ²
		83.64 m ²

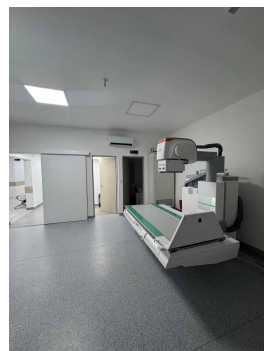




REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO


MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	6	ITEM	RES_6.2	Mediacaña piso vinílico con postformado y perfil mediacaña
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	25	25		39.29
				64.29

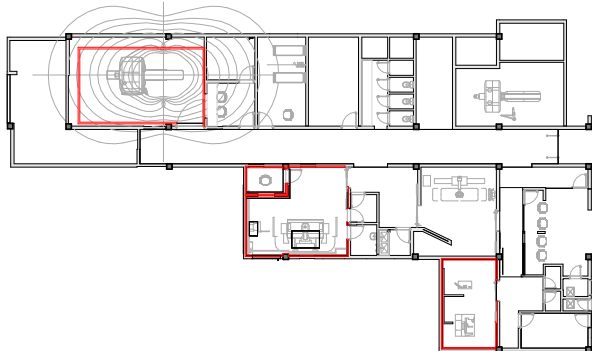

res6.2 media caña piso vinilo

Localización	Length
fluoroscopio	3.48 m
Sala lectura fluoroscopio	7.02 m
fluoroscopio	13.99 m
fluoroscopio	1.30 m
fluoroscopio	0.20 m
Resonador	22.53 m
Mamografo	15.77 m
	64.29 m

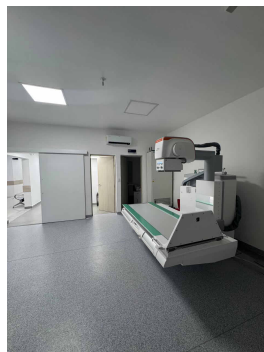





REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	7	ITEM	RES_7.1	Construccion de enchape interior en madecor laminado (incluye posformados) y placas de yeso RH, con detalles, según diseño (Altura estimada 2,50)
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	55	30.54		0
				CANTIDAD ACUMULADA
				30.54

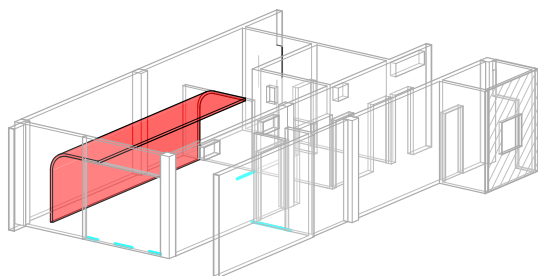

PANEL DE MADERA



SECCION B - B'

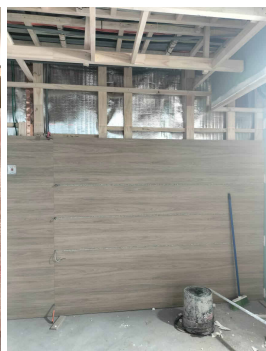


21/10/2025 10:23
6°9'32"N 75°22'19"W
Rionegro



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	7	ITEM	RES_7.3	Suministro e instalación de plomo de 2mm de acuerdo con estudio de blindaje
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	10	10		1.20
				11.20

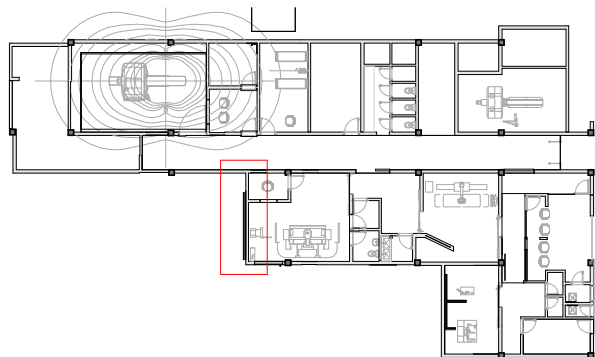

Res7.3 - Protección con Plomo

Localización	Largo	Alto	Area
Oficinas administrativas	4.00 m	2.80 m	11.20 m²
			11.20 m²






REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAS DEL ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	Adecuación de la infraestructura hospitalaria en el área de imagenología del hospital san juan de Dios E.S.E de Rionegro.			
CONTRATISTA	LINARQ S.A.S			
CONTRATO N°	240-2025			
LOCALIZACIÓN	Municipio de Rionegro			
CAPITULO	11	ITEM	RES_11.2	Aseo Final
UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA		CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA
m2	60	60		17
				77

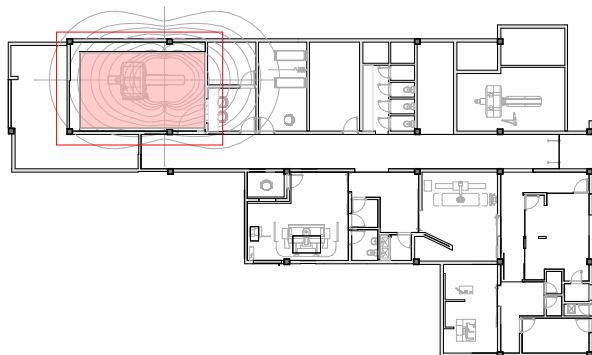

11.2 - Aseo Final

Tipo	Comments
------	----------

Aseo Final Resonador	77
----------------------	----



21/10/2025 10:23
6°9'32"N 75°22'19" W
Rionegro
