



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	028 DE 2026
OBJETO	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE PRESION SUBSION VACTOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P, VIGENCIA 2026”
CONTRATISTA	RMS MAINTENANCE SERVICES S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P.
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DEL TALENTO HUMANO / LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
VALOR CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) M/CTE
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2026	\$ 29.999.999
VALOR EJECUTADO	\$ 29.999.999
VALOR A FAVOR DE EPB	\$ 1

ADICIONAL

ADICIONAL No.	
FECHA ADICIONAL	
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	
PLAZO ADICIONAL	

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	
FECHA PRÓRROGA	



FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	
PLAZO PRÓRROGA	

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	
FECHA SUSPENSION	
FECHA REINICIO	
PLAZO	

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	\$ 30.000.000
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	\$ 29.999.999
VALOR EJECUTADO	\$ 29.999.999
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 6. APROBACION POLIZAS.pdf	6. APROBACION POLIZAS.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 7. ACTA DE INICIO.pdf	7. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	INICIO	15 DE AGOSTO DE 2025
002	RECIBO FINAL	06 DE ABRIL DE 2026
003	LIQUIDACIÓN	06 DE ABRIL DE 2026

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES






El presente informe de supervisión tiene como propósito dar a conocer el seguimiento, control y verificación de las actividades desarrolladas en el marco del contrato denominado **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE PRESIÓN SUCCIÓN VACTOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P., VIGENCIA 2026"**.

Actividades contratadas



ITEMS	MANTENIMIENTO
1	LAVADA GENERAL ✓
2	LUBRICACION GENERAL ✓
3	FILTRO ACEITE ✓
4	FILTRO COMBUSTIBLE 1 ✓
5	FILTRO COMBUSTIBLE 2 ✓
6	FILTRO AIRE INTERNO ✓
7	FILTRO AIRE EXTERNO ✓
8	FILTRO CABINA ✓
9	FILTRO SEPARADOR ✓
10	¼ DE ACEITE MOTOR 15W40 ✓
SISTEMA HIDRAULICO	
11	BOMBA HIDRAULICA 25 GALONES ✓
12	ADAPTADORES TIPO JEEP DE 1.5/16 1" 3/4 ✓
13	MANGUERA R-12 PARA 4000 PSI LONGITUD -1.50 METROS ✓
14	FILTRO HIDRAULICO ✓
15	¼ DE HIDRAULICO ISO 68 ✓
16	REVISION DE VALVULAS ELECTRONICAS ✓
ADAPTADORES	
17	REVISION MOTOR HIDRAULICO TORNAMESA Y TORNILLO SIN FIN, REGULADOR A 90 GRADOS ✓
18	¼ DE VALVULINA MOBIL /140 ✓
19	RETENEDOR Y RODAMIENTO CAJA TRANSFERENCIA ✓
SISTEMA ELECTRICO	
20	REPUESTOS ✓
21	REVISION DE CABLEADO GENERAL LUCES Y INSTALACION DE EXPLORADORAS ✓
22	MANO DE OBRA GENERAL ✓

Actividades realizadas

- Ítem 1: El contratista realizó la lavada general del equipo.

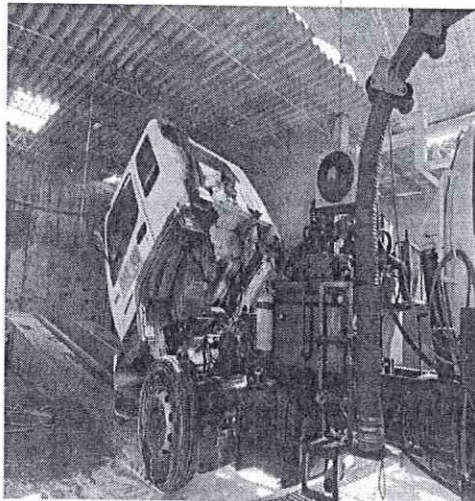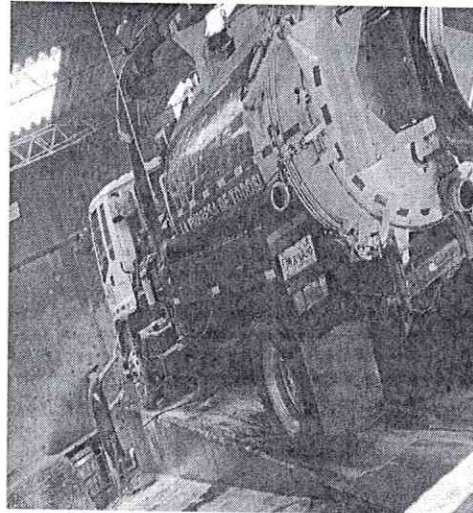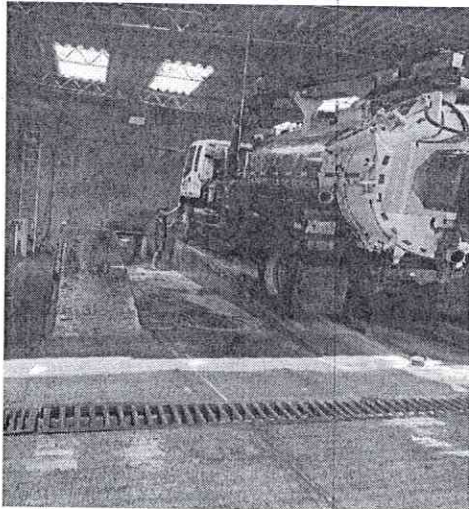

- Ítem 2: El contratista realizó la lubricación general.

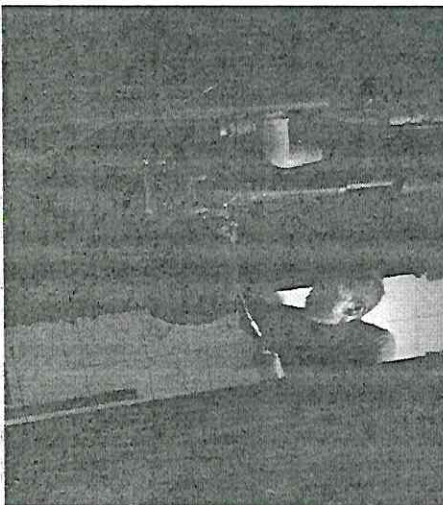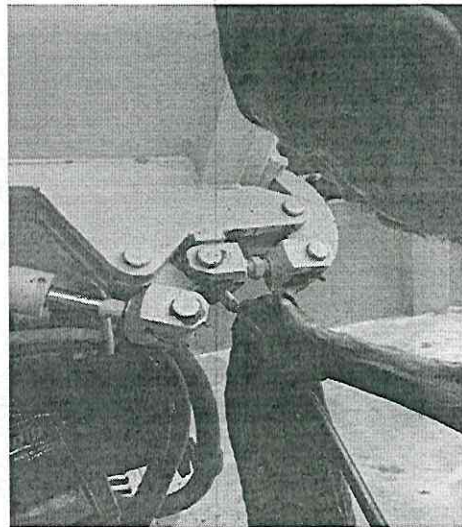


- Ítem 3: El contratista realizó el cambio de filtro de aceite.




- Ítem 4: El contratista realizó el cambio de filtro de combustible 1.




- Ítem 5: El contratista realizó el cambio de filtro de combustible 2.

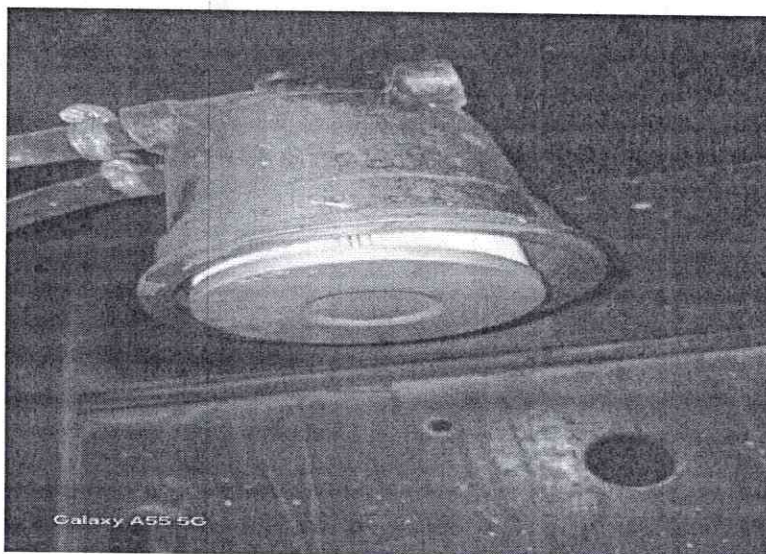


- Ítem 6: El contratista realizó el cambio de filtro de aire interno.

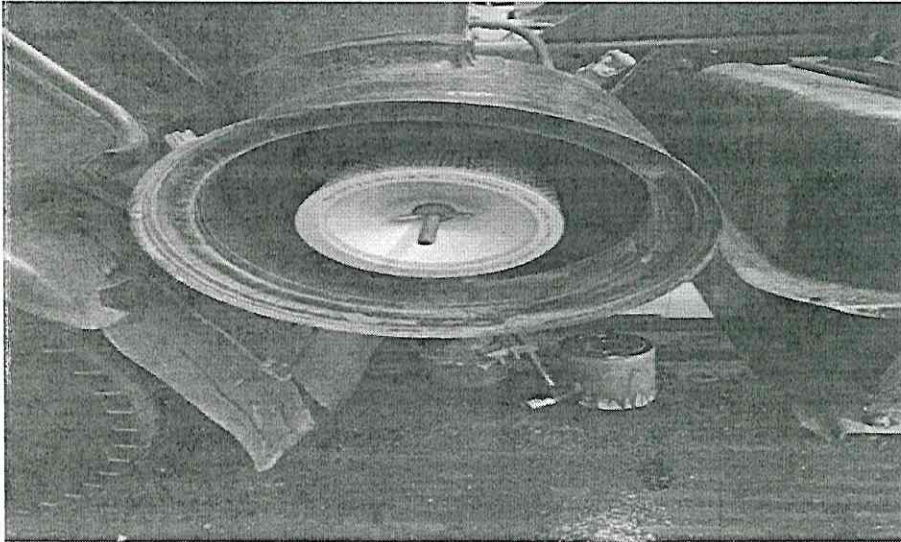



- Ítem 7: El contratista realizó el cambio de filtro de aire externo.

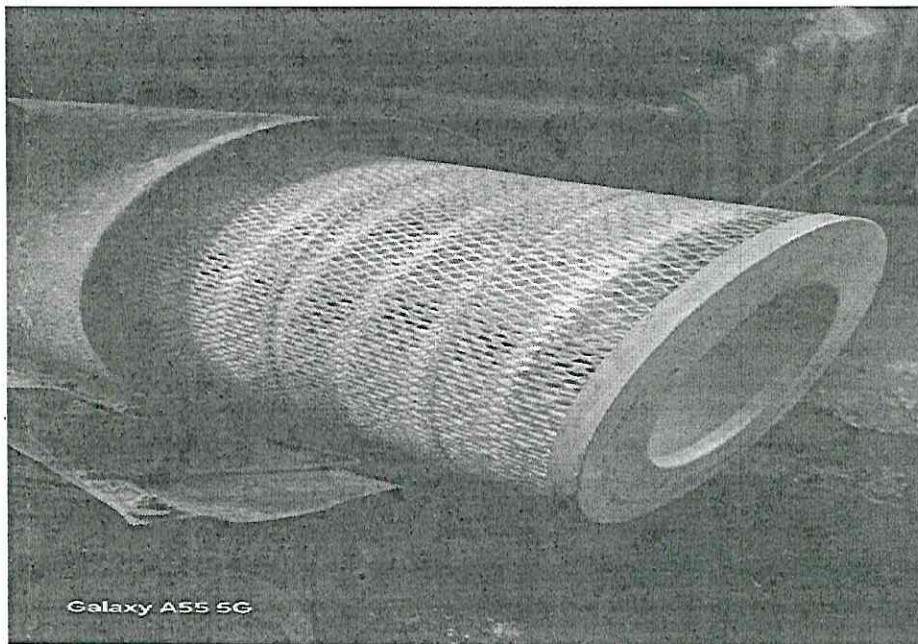


- Ítem 8: El contratista realizó el cambio de filtro de cabina.

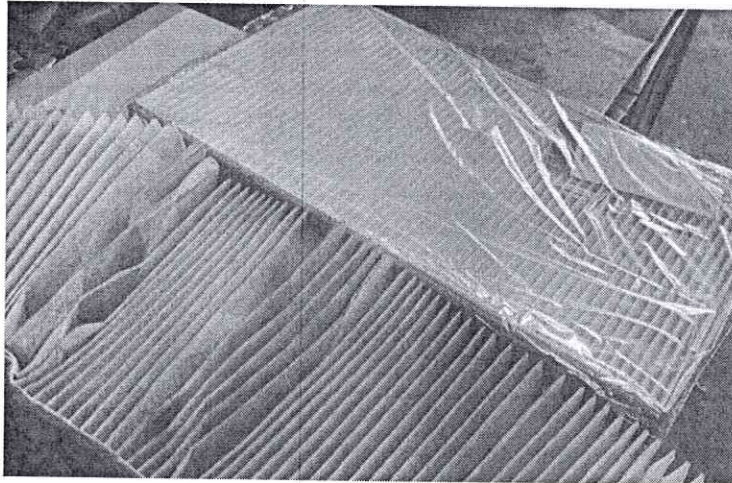

- Ítem 9: El contratista realizó el cambio de filtro separador.

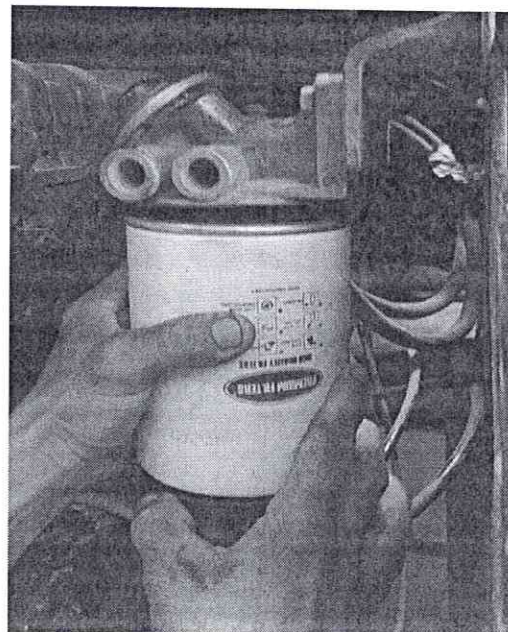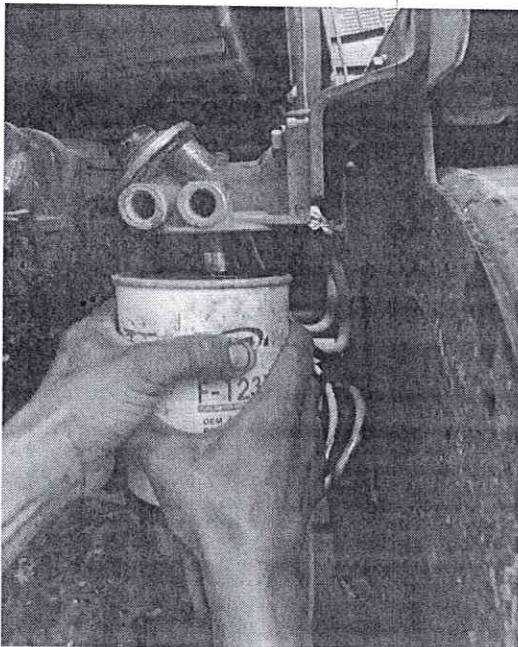

- Ítem 10: El contratista realizó el cambio de $\frac{1}{4}$ de aceite de motor 15W40 y mantenimiento del sistema hidráulico.

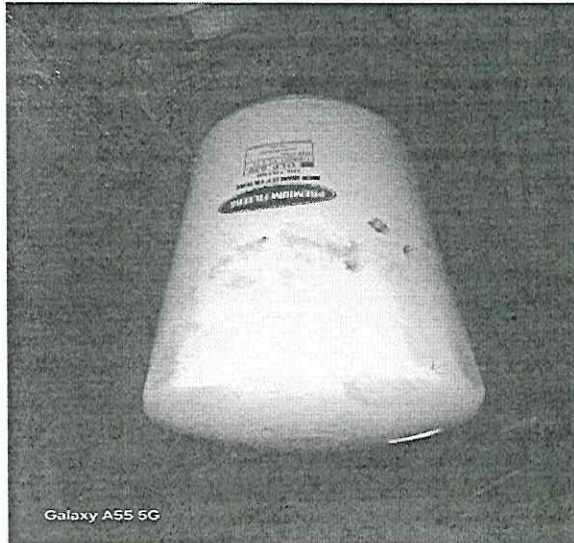


SISTEMA HIDRÁULICO


- Ítem 11: El contratista realizó la instalación de bomba hidráulica de 25 galones.



- Ítem 12: El contratista realizó el suministro de adaptadores tipo Jeep de 1.5/16" y 3/4".

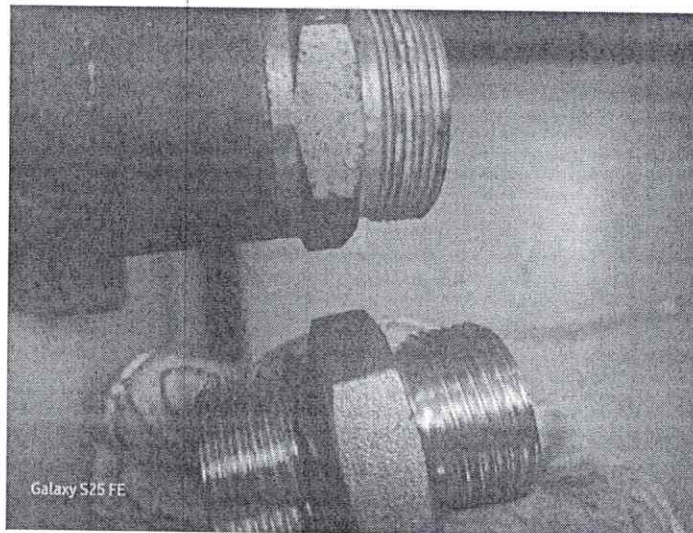

- Ítem 13: El contratista realizó la instalación de manguera R-12 para 4000 PSI con longitud de 1.50 metros.

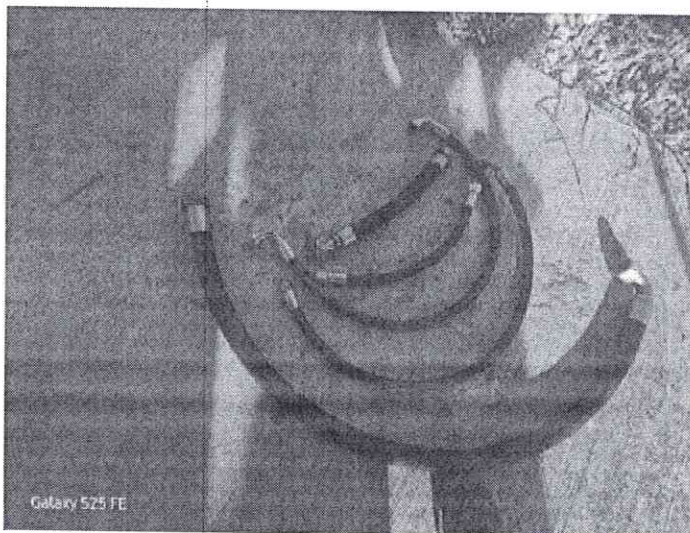



- Ítem 14: El contratista realizó el cambio de filtro hidráulico y aplicación de ¼ de hidráulico ISO 68.





- Ítem 16: El contratista realizó la revisión de válvulas electrónicas y adaptadores.



- Ítem 17: El contratista realizó la revisión del motor hidráulico, tornamesa y tornillo sin fin, incluyendo regulador a 90 grados y ajuste de válvula móvil 1/40.



- Ítem 19: El contratista realizó el cambio de retenedor y rodamiento de la caja de transferencia.

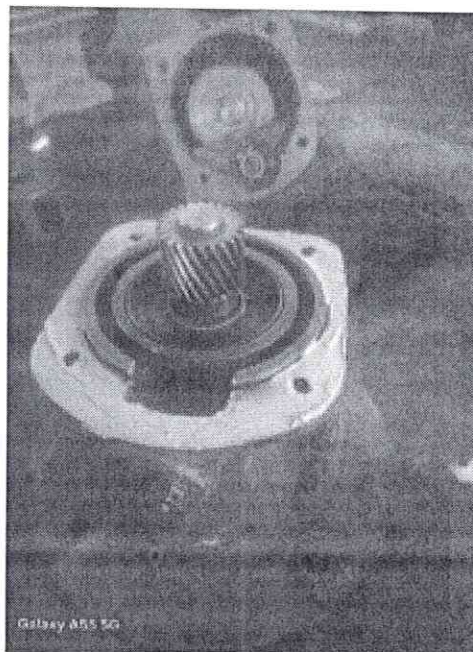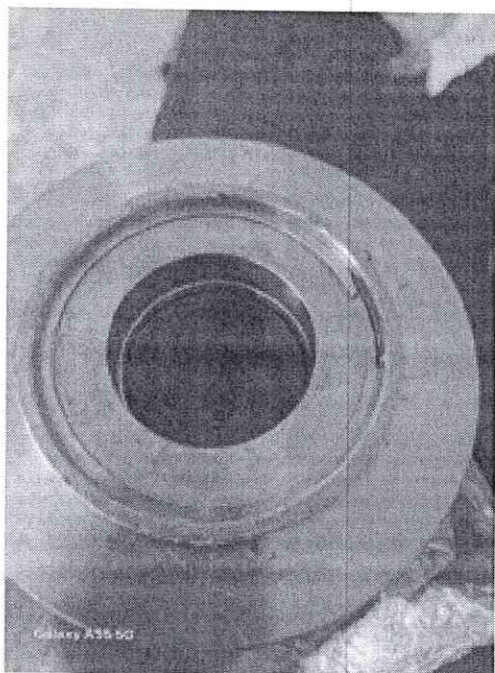



- Ítem 20: El contratista realizó la revisión del sistema eléctrico y reposición de repuestos.



- Ítem 21: El contratista realizó la revisión de cableado general, luces e instalación de exploradoras.



- Ítem 22: El contratista realizó la mano de obra general.




SUPERVISOR DEL CONTRATO
LINDA JULISSA ARDILA RENTERIA
