

Bogotá DC. 12 de abril de 2026



Señores
ALCALDIA DE FUNZA
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. SAMC-0015-2025.


Número del Contrato:	SAMC-0015-2025.		
Tipo de contrato:	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS		
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD MÓVIL DESTINADA A LA ATENCIÓN MÉDICO VETERINARIA DE CANINOS Y FELINOS, GARANTIZANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL Y LA REALIZACIÓN SEGURA Y EFICIENTE DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA.		
Contratista:	MEGABUSES DE COLOMBIA S.A.S		
No. de Nit	900889472 -3		
Fecha Inicio del Contrato	23/12/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025
Fecha de elaboración del informe	19/02/2026	Periodo del Informe	23/12/2025 al 30/01/2026
Valor Total del Contrato	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$144.935.483 IVA INCLUIDO).		
Valor a Pagar en este periodo	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$72.467.741) IVA INCLUIDO		
Saldo por pagar	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$72.467.741) IVA INCLUIDO		
Pago No.	002		

A continuación, relacionamos informe de materiales adquiridos para el desarrollo y puesta en funcionamiento de este proyecto unidad veterinaria.



ITEM	DESCRIPCION
1	Suministro e instalación de piso para cubículo de cirugía utilizando madera pino chileno inmunizado garantizado 10 años, recubierto de piso antideslizante tipo tráfico pesado ref. advange y su garantía será de 10 años. largo 3.42 x 1.90 m de ancho
	
2	Suministro e instalación de forros interiores en acero inoxidable y esquineros en material de P.V.C en cabina de cirugía. Largo de 3.42 x 2.24 metros
	





3	<p>Suministro e instalación de (2) dos mesas de cirugía en acero calibre 18 ref. 304 con rejilla en acero inoxidable en varilla redonda en ¼ ref. 304 canal de desagüe estructura en tubo cuadrado de 1 ½” en acero calibre 18 ref. 304 y piso en acero ref, 304 – mesa de recuperación fabricada en acero inoxidable calibre 18 ref304, desagüe, estructura en tubo cuadrado de 1 ½ en acero calibre 18 ref. 304 y piso en acero calibre 18 ref 304.</p> <p>De conformidad con el suministro efectivamente entregado y considerando las condiciones físicas y dimensiones de la cabina de la unidad móvil, se realizó la instalación de dos (2) mesas de cirugía con las siguientes medidas:</p> <p>Una (1) mesa de 260 cm x 50 cm x 90 cm Una (1) mesa de 270 cm x 50 cm x 90 cm</p> <p>Es importante señalar que, teniendo en cuenta que el estándar promedio de una mesa de cirugía corresponde aproximadamente a 140 cm x 50 cm, las dimensiones de las mesas instaladas superan significativamente dichas medidas, lo que permite concluir que su capacidad funcional equivale al suministro e instalación de tres (3) mesas de cirugía convencionales.</p> <p>En consecuencia, se da cumplimiento al objeto del ítem contractual, garantizando no solo las especificaciones técnicas exigidas, sino también una capacidad operativa equivalente o superior a la inicialmente requerida.</p>
	
4	Suministro e instalación (1) lavamanos en acero con cajonera en acero inoxidable calibre 20 ref. 304



CARROCERIAS
MEGABUSES
DE COLOMBIA





5	Suministro e instalación de tres (3) gabinetes flotantes en sala de cirugía en acero inoxidable 51x32x32- 1 m x 32x32 -1.50 de 32x32.
	
6	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de plata eléctrica para el consumo de energía en sala de cirugía
	
7	Suministro e instalación de dos (2) tanques de oxígeno de 6.5 litros.



- 8** Suministro e instalación de puesta en funcionamiento de (4) cuatro lámparas luz día tipo led ubicadas en el techo en la sala de cirugía de 60 watts



- 9** Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 5 tomas eléctricas a 110 vol. distribuidas en la sala de cirugía ref. levington certificado.



10

Suministro e instalación de redes eléctricas de 110 vol. Y 220 vol. Para la sala de cirugía en cable encauchetado numero 12 certificado



11

Suministro e instalación de aislamiento térmico techo y paredes sala de cirugía, stayrofon 1 ½ de alta densidad



12

Instalación y puesta de funcionamiento de bomba de agua en la sala de cirugía



13

Cambio de empaques de las puertas de acceso a la cabina de la unidad móvil



14

Cambio de cableado general de la unidad movil veterinaria





15

Mantenimiento de aire acondicionado






16	Suministro de una mesa plegable en acero inoxidable
	
17	Suministro de instalación equipo de refrigerador para residuos biológicos veterinarios.
	
18	Suministros y puesta en funcionamiento equipo de esterilización



CARROCERIAS
MEGABUSES
DE COLOMBIA

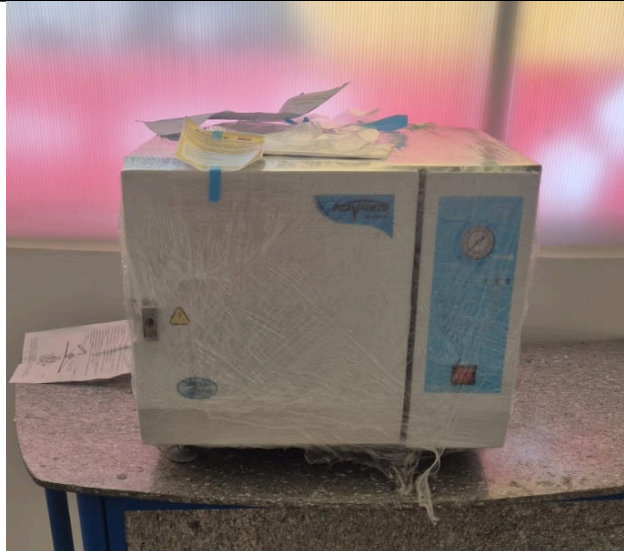

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

PEDRO BOHORQUEZ
GERENTE COMERCIAL
3208902390
