



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602

San Luis de Palenque, Casanare 28 de marzo del 2026

Señor:
EDGAR EDMUNDO BECERRA
Rector
institución educativa técnico francisco Lucea
San Luis de palenque

REFERENCIA: INFORME FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 001 DEL 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE HUGO GAMBOA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE

VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 19.467.000)

UN SOLO PAGO 100%: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 19.467.000)

PLAZO: 20 DIAS

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO 2026

FECHA DE TERMINACION: 23 DE MARZO DEL 2026

PERIODO DE INFORME: UNICO INFORME

INFORME DE ACTIVIDADES

Yo **DAIRO YESID SILVA PIÑA** con cedula de ciudadanía No 9.433.628 de Yopal, Casanare me permito presentar el informe final del contrato de obra 001 suscrito con la institución educativa de la sede Hugo gamboa de la institución técnico francisco Lucea del municipio de san Luis de palenque el 02 de marzo del 2026.

Atentamente,


DAIRO YESID SILVA PIÑA
Contratista

Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602

**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PACTADA SEGUN CONTRATO DE OBRA 001 DEL 02 DE
MARZO DEL 2026**

**ANEXOS-INFORME DE CONTRATO DE OBRA DE OBRA PUBLICA
CTO 001 DE 02 DE MARZO 2026**

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE HUGO GAMBOA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE

Se describe a continuación registro fotográfico de la ejecución del contrato:

No	UBICACIÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	RESTAURANTE ESCOLAR	Suministro e instalación de poli sombra al 90% para el encerramiento y control de plagas (incluye marcos de madera, chazos plásticos y tornillos 9	230 m2
		Suministro e instalación de vidrio de 4mm (portón 0.44 x 0.36 m)	9 un
		Suministro e instalación de tapas plásticas para tanque aéreo de 1000 litros	3 un
2	MUROS DE ENCERRAMIENTO Y AREAS COMUNES	Suministro de pintura en vinilo tipo 1 para muros de área externa (dos manos 9	150 m2
3	SALA DE INFORMATICA	Suministro y aplicación de pintura en aceite para serchas y perfiles en vinil tex de Pintuco (incluye lijada y aplicación de anticorrosivo)	24 m2
		Suministro e instalación de lamina master 1000 calibre 28 (incluye desmonte de cubierta existente y flanches sobre costado del muro)	80 m2
		Suministro y levantamiento de muro en bloque y pañete del mismo en 80cm de altura	16 m2
		Suministro e instalación de toma corriente	3 un
		Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 para muros área interna y externa de la sala (a dos manos e incluye resane)	120 m2
4	CANCHAS CUBIERTA Y AREAS DE ACCESO	Mantenimiento de red eléctrica (por fugas de energía) área de iluminación de 3 columnas o postes metálicos sobre la cancha cubierta.	1 un
		Suministro e instalación de rejilla en lamina alfajor de 3mm reforzada con remarco de Angulo 1" x 3/16 para desagüe de 1.30 x 0.30 m (incluye demolición y retirada de escombros de rampa existente	1un
		Mantenimiento y adecuación de estructura metálica de dos canchas de baloncesto con suministro y aplicación de pintura en esmalte a dos manos (incluye gratiada y aplicación de anticorrosivo)	2 un



DAIRO YESID SILVA PIÑA

NIT 9433628-6

CELULAR No.3112276602

		Suministro e instalación de toma corriente	4 un
		Desmonte es instalación de tableros acrílicos nuevos para la cancha multifuncional (Baloncesto), (incluye accesorios de aseguramiento y adecuación del marco)	2 un
5	BLOQUES DE TERCEROS	Arreglos de tanques de almacenamiento de agua de 3.000 L. Reforzando las tapas con tubos de PVC del bloque de aulas cuartos y quintos	2 un
		Sellamiento en cornisa en bloque tipo Maguncia en la parte superior de los salones para control de palomas (incluye pañete y pintura)	10 m2
6	SEGUNDO A	Suministro e instalación de piso en cerámica (Demolición de baldosa existente retirada de escombros y limpieza)	5 m2
7	SEGUNDO B	Suministro e instalación de vidrio traslucido 4mm de 0.66m x 1.19 m para ventana	2 un
		Suministro e instalación de chapa tipo inifer para puerta del salón grado 2B	1 un
		Suministro e instalación de vidrio traslucido 4mm de 0.55 m x 0.90 m para puerta.	1 un
		Suministro y aplicación de cemento para sellamiento entre puerta y pared (control de plagas murciélagos)	1 un
8	PRIMERO A	Suministro e instalación de vidrio traslucido de 4mm (ventana 0.67m x 1.16m)	1 un
		Suministro e instalación de papel grueso oscuro solar película polarizado de vidrios de ventanas (incluye limpieza de vidrios)	16 m2
9	PRIMERO B	Suministro e instalación de papel grueso oscuro solar película polarizado de vidrios y ventanas	16 m2
		Seguro para ventana (incluye soldadura y mano de obra)	2 un
10	TERCERO C	Suministro es instalación de toma corriente	2 un
11	BLOQUE DE AULAS GRADOS CUARTOS Y QUINTOS	Mantenimiento y suministro de accesorios para unidades sanitarias	2 un
		Mantenimiento y suministro de accesorios para orinales	2 un
		Mantenimiento con raspado y limpieza e impermeabilización de viga canal (incluye suministro y aplicación de pintura de esmalte a dos manos)	8 m2
12	UNIDADES SANITARIAS NIÑOS CERCA AL AULA MULTIPLE	Suministro e instalación de un toma corriente	1 un
		Suministro e instalación de un orinal mediano tipo corona	1un
		Suministro e instalación de 2 bizcochos	2 un

Dairo.sp@hotmail.com

Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad

San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602

13	ZONA DE LAVADEROS	Suministro e instalación de 4 laminas galvanizadas calibre 20 de medidas (40 x 70cm)	4 un
14	AULA MULTIPLE	Suministro e instalación de toma corriente	3 un
		Suministro e instalación de lámpara led de 35 watts con roseta plástica.	5 un
		Lijada, suministro y aplicación de pintura en esmalte para puertas y ventanas a dos manos (incluye lijada, suministro y aplicación de anticorrosivo)	34 m2
		Resanes suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 en muros con pintura para sócalos (incluye resanes)	76 m2

REGISTRO FOTOGRAFICO

RESTAURANTE ESCOLAR	
Suministro e instalación de poli sombra al 90% para el encerramiento y control de plagas (incluye marcos de madera, chazos plásticos y tornillos 9	
ANTES	DESPUES
	
	



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602



Se instala la polisombra par controlar la entrada de las palomas y mitigar la luz del sol

Suministro e instalación de vidrio de 4mm (portón 0.44 x 0.36 m) se instala los vidrios del portón del restaurante para evitar que se metan cocos, cucarachas y no puedan abrir el portón sin su llave.

ANTES

DESPUES



Suministro e instalación de tapas plásticas para tanque aéreo de 1000 litros se instalan las tapas de los tanques para conservar el agua y evitar que les caiga basura y tierra.





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

MUROS DE ENCERRAMIENTO Y AREAS COMUNES

Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 para muros de área externa (dos manos), el cual le da un entorno de embellecimiento a la fachada de la escuela

ANTES



DESPUES



SALA DE INFORMATICA

Suministro y aplicación de pintura en aceite para serchas y perfiles en vinil tex de pintuco





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602

Suministro de lamina master 1000 calibre 28, se hace el cambio del techo debido a que el anterior estaba muy deteriorado



Suministro y levantamiento en bloque y pañete del mismo en 80 cm de altura



Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 par muros área interna y externa, se hace el raspado con espátula para levantar lo húmedo y se resana con estuco y pega master



Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602

CANCHAS Y AREAS DE ASEO

Mantenimiento de red eléctrica por fugas de energía 8 área de iluminación, se hace la revisión a los postes metálico y se deshabilita para prevenir cualquier accidente eléctrico con los niños en el momento de tocarlas.





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

Suministro e instalación de rejillas en lamina alfajor de 3 mm reforzada con remarco de Angulo 1" x 3/ 16 para desagüe de 1.30 x 0.30 m



Mantenimiento y adecuación de estructura metálica de dos canchas de baloncesto con suministro y aplicación de pintura en esmalte a dos manos




Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602



Suministro de tomas corriente

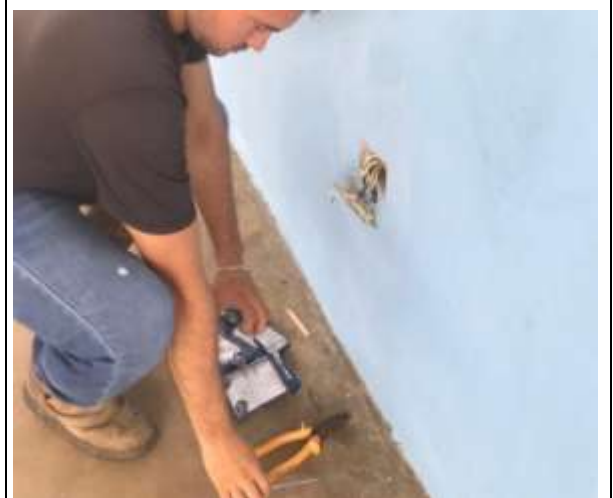

Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

Desmonte e instalación de tableros acrílicos nuevos para la cancha multifuncional



Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

BLOQUE DE TERCEROS

Arreglo de tanques de almacenamiento de agua de 3.000 L reforzando las tapas con tubos de pvc



Sellamiento de cornisa en bloque tipo Maguncia en la parte superior para el control de palomas






DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602



SEGUNDO A

Suministro e instalación de piso en cerámica

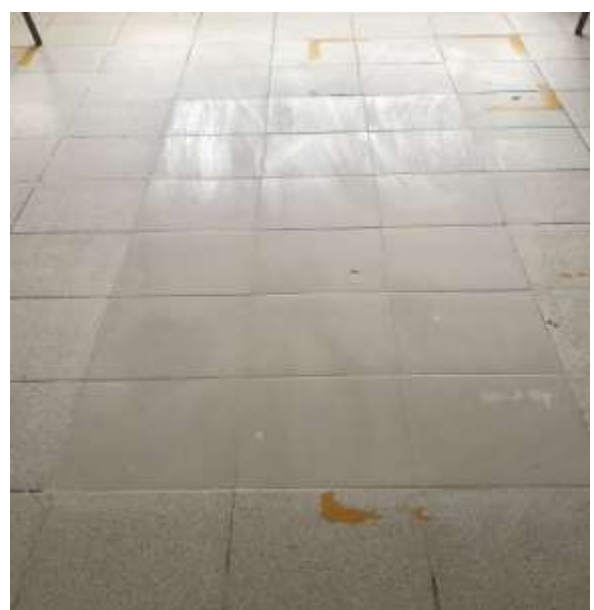

Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602



SEGUNDO B

Suministro de vidrio traslucido 4 mm para ventana



Suministro de chapa tipo inafer



Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

Suministro y aplicación de cemento para sellamiento entre puerta y pared



PRIMERO A

Suministro e instalación de vidrio traslucido de ventana



PRIMERO B

Suministro e instalación de papel grueso oscuro solar





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602

TERCERO C
Suministro de toma corriente



BLOQUE DE AULAS GRADOS CUARTOS Y QUINTOS
Mantenimiento y suministro para accesorios unidades sanitarias




Mantenimiento con raspado y limpieza e impermeabilización de viga canal





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

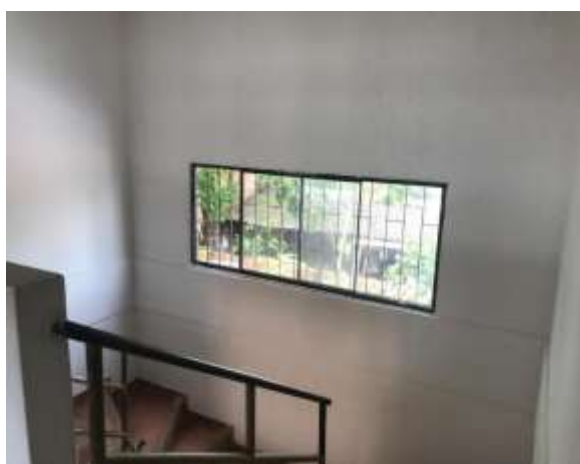

UNIDADES SANITARIAS NIÑOS CERCA AL AULA

Suministro de toma corriente



Dairo.sp@hotmail.com
Calle 1c No 11ª – 03 la Unidad
San Luis de Palenque - Casanare



DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

Suministro de un orinal mediano



Suministro e instalación de 2 biscochos





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

ZONA DE LAVADEROS

Suministro e instalación de 4 laminas galvanizadas calibre 20



AULA MULTIPLE

Suministro de toma corriente





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602

Suministro de lampara led de 35 watts



Lijada y suministro y aplicación de pintura en esmalte para puertas y ventanas





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR NO.3112276602



Resanes, suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 en muros





DAIRO YESID SILVA PIÑA
NIT 9433628-6
CELULAR No.3112276602



DAIRO SILVA PIÑA

Contratista

Anexos:

- 01 Documento Equivalente a la Factura de venta
- 02 Copia de Pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)
- 03 Certificación Bancaria
- 04 Registro Único Tributario
