

Ciudad: Cartagena

Fecha: 16 /enero/2026

Informe - Actividades Realizadas **SUPERCADÉ DE LAS AMERICAS.**

1. Objetivo del proyecto

Realizar el reemplazo de empaques sellos niples, tuberías y válvulas deterioradas del sistema hidráulico de la alcaldía de Bogotá, garantizando la correcta operación del sistema, la reducción de fugas y el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad.

2. Alcance de las actividades

Las actividades incluyen los siguientes trabajos principales:

a) Inspección y diagnóstico inicial.

- Revisión visual de las líneas de agua y válvulas existentes.

- Identificación de tramos deteriorados o con fugas.

- Registro fotográfico del estado actual del sistema.

b) Desmonte del sistema existente

- Cierre de válvulas principales y drenado de líneas.

- Corte controlado de tramos de tubería afectados.

- Retiro de válvulas en mal estado.

- Limpieza del área de trabajo.

c) Instalación de nuevas tuberías y válvulas

- Montaje de tubería en acero inoxidable y válvulas, según especificación.

- Instalación de válvulas de compuerta, esfera y retención en puntos estratégicos.

- Alineación, sujeción y sellado de uniones.

- Prueba hidrostática de presión para verificar estanqueidad.

d) Reinstalación y acabados

- Limpieza general del área.

- Entrega de sistema en correcto funcionamiento.

CRA 81 #24 - 127 LOCAL 103 – CARTAGENA – BOLIVAR

3145247124 – ACCEDER@GOURIYU.COM

3. Hallazgos



En la visita realizada se evidencio:





- Deterioro de las tuberías
- Mal estado de las válvulas
- Mal funcionamiento de las bombas del sistema de agua potable (requiere reemplazo de sellos)




4. Observaciones



- Durante la intervención se coordinarán los cortes de agua con la administración del Archivo para minimizar afectaciones.
- En caso de encontrar daños estructurales no visibles, se notificará al supervisor antes de realizar trabajos adicionales.
- Se garantizará la limpieza y el orden en todo momento dentro del área intervenida.

Soporte de actividades ejecutadas acuerdo contrato:

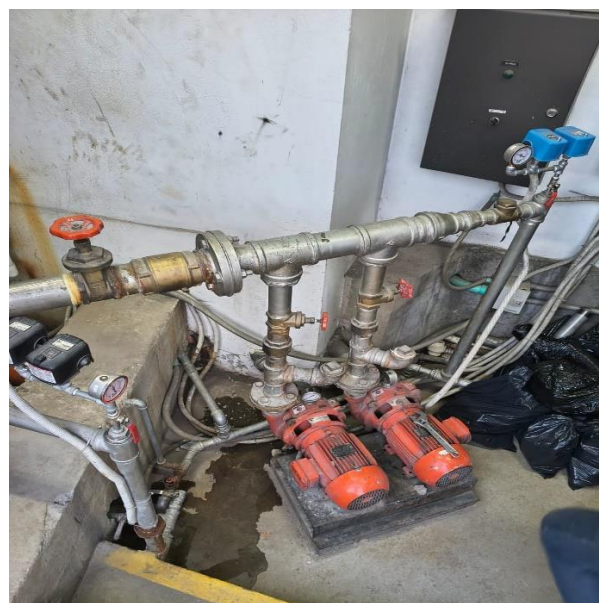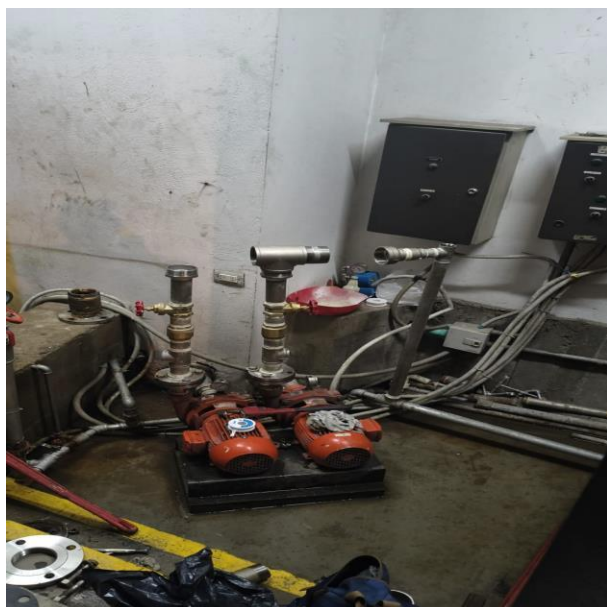

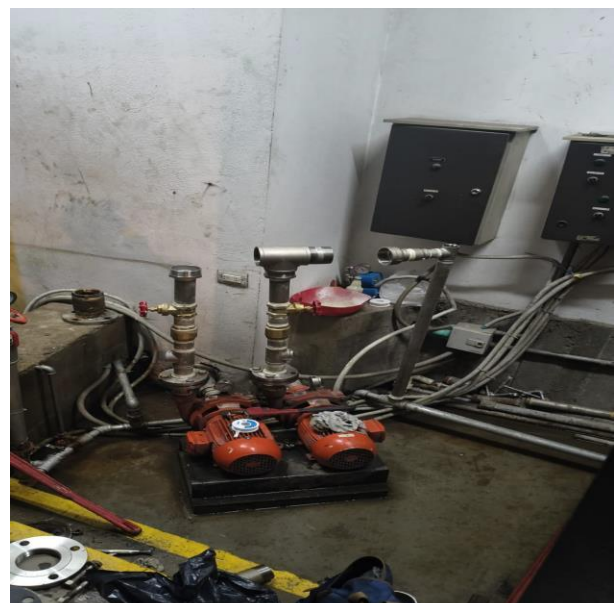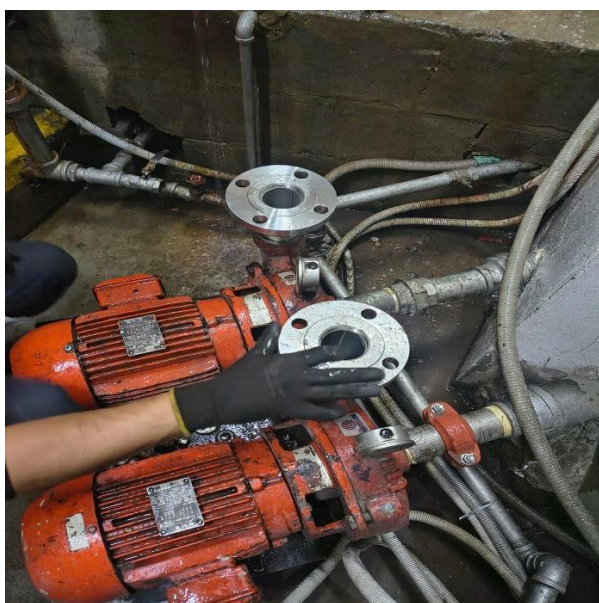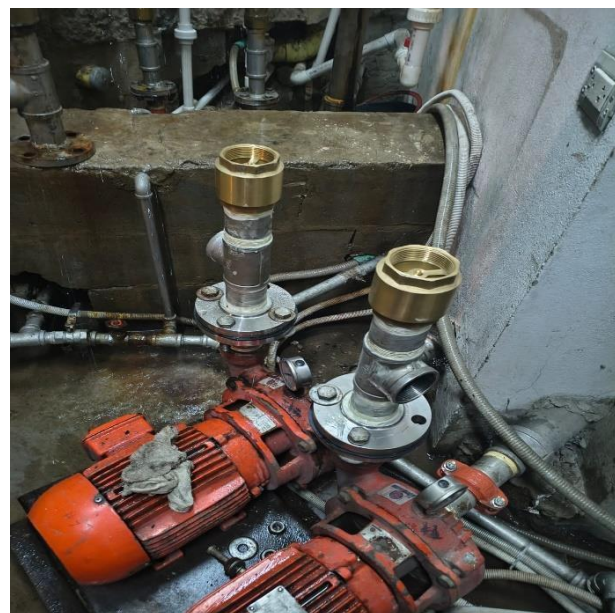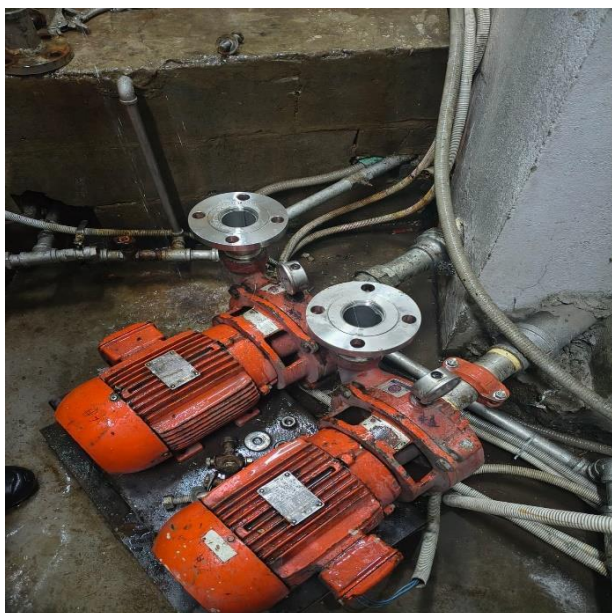

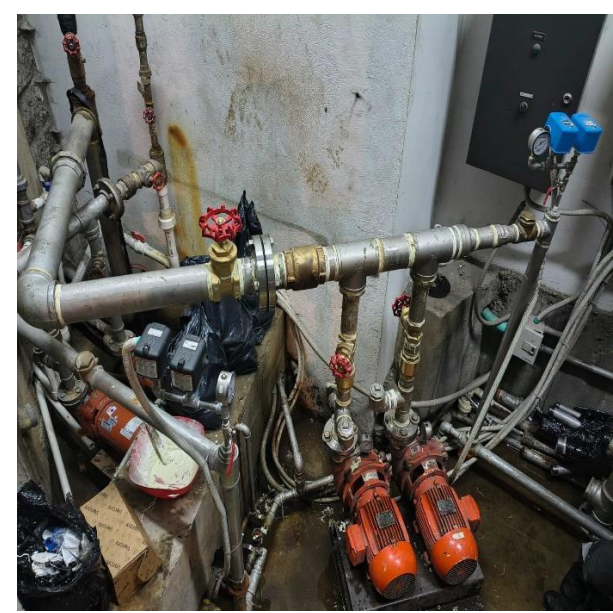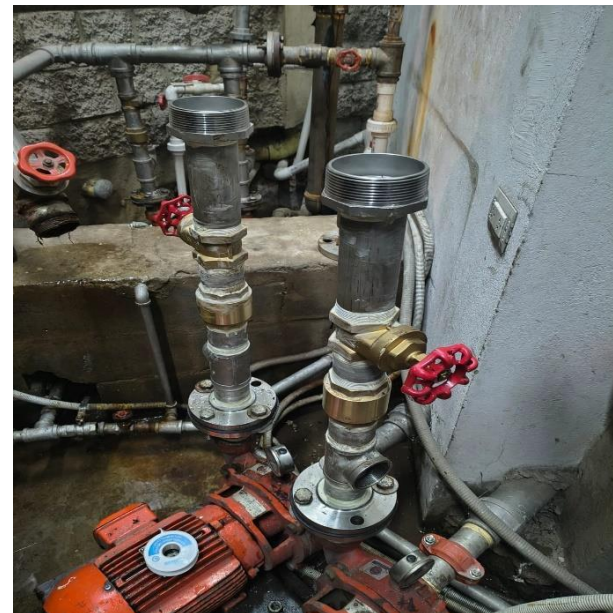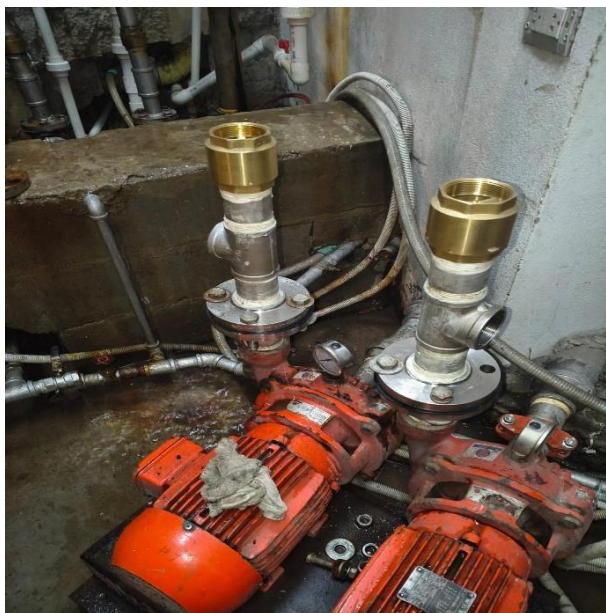

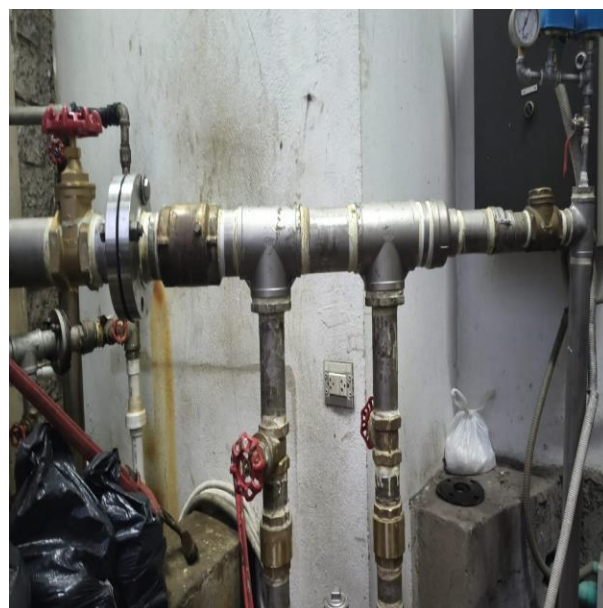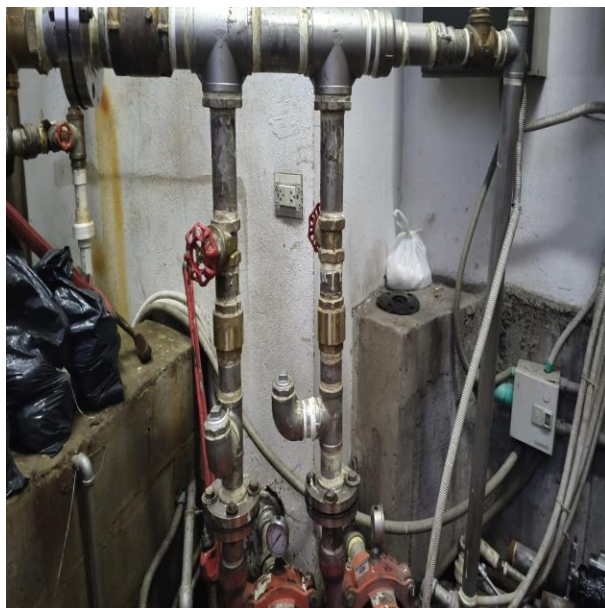

De igual manera una vez entregado las actividades se dispone listado de ítems instalados en la sede supercade las Américas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	cantidad	VALOR TOTAL CON IVA
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 20H-5TW IHM 5HP	UNIDAD	\$ 8.389.500	1	\$ 8.389.500
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS ALTA PRESIÓN BARNES HE 1.5-20/20-1 /30/30-1 2HP Y 3HP	UNIDAD	\$ 5.816.720	1	\$ 5.816.720
9	Suministro e Instalacion de Flauta en acero inoxidable de 3" con dos salidas de 2" succion y descarga del sistema hidraulico de las Motobombas	UNIDAD	\$ 6.616.519	1	\$ 6.616.519
23	Bushing acero inoxidable. 1.1/2" x 1"	UND	\$ 58.211	3	\$ 174.633
31	Bushing acero inoxidable. 1/2" x 1/4"	UND	\$ 46.957	4	\$ 187.828
33	Bushing acero inoxidable. 2" x 1"	UND	\$ 72.946	7	\$ 510.622
58	Brida en acero inoxidable 2"	UND	\$ 823.983	2	\$ 1.647.966
60	Brida en acero inoxidable 3"	UND	\$ 1.059.407	3	\$ 3.178.221
71	Codo acero inoxidable 1"	UND	\$ 37.246	9	\$ 335.214
78	Codo acero inoxidable 3"	UND	\$ 353.369	3	\$ 1.060.107
84	Codo mixto acero inoxidable 1.1/2"	UND	\$ 97.096	5	\$ 485.480
88	Codo mixto acero inoxidable 2"	UND	\$ 127.632	3	\$ 382.896
155	Reduccion acero inoxidable. 3" x 2"	UND	\$ 252.326	5	\$ 1.261.630
191	Tapon acero inoxidable 1.1/2"	UND	\$ 42.547	5	\$ 212.735
203	Tee acero inoxidable 1.1/2"	UND	\$ 82.159	7	\$ 575.113
207	Tee acero inoxidable 2"	UND	\$ 129.247	3	\$ 387.741
209	Tee acero inoxidable 3"	UND	\$ 336.972	5	\$ 1.684.860
241	Universal acero inoxidable 1"	UND	\$ 96.314	5	\$ 481.570
242	Universal acero inoxidable 1.1/2" mech @agua	UND	\$ 202.840	7	\$ 1.419.880
248	Universal acero inoxidable 3"	UND	\$ 803.432	4	\$ 3.213.728
263	Cheque Hidro Sello en Nitro helbert 1"	UND	\$ 493.091	3	\$ 1.479.273
265	Cheque Hidro Sello en Nitro helbert 1 1/2"	UND	\$ 907.640	3	\$ 2.722.920
266	Cheque Hidro Sello en Nitro helbert 2"	UND	\$ 1.375.423	2	\$ 2.750.846
291	Valvula de compuerta en bronce red white 1"	UND	\$ 590.903	3	\$ 1.772.709
293	Valvula de compuerta en bronce red white 1 1/2"	UND	\$ 937.146	3	\$ 2.811.438
294	Valvula de compuerta en bronce red white 2"	UND	\$ 1.322.617	3	\$ 3.967.851
296	Valvula de compuerta en bronce red white 3"	UND	\$ 3.129.937	1	\$ 3.129.937
309	Niple en Acero Inixidable de 1" x (5cm - 10cm)	UND	\$ 74.005	12	\$ 888.060
311	Niple en Acero Inixidable de 1 1/2" x (5cm - 10cm)	UND	\$ 107.753	7	\$ 754.271
312	Niple en Acero Inixidable de 2" (5cm - 10cm)	UND	\$ 141.253	8	\$ 1.130.024
313	Niple en Acero Inixidable de 3" x (5cm - 10cm)	UND	\$ 200.254	8	\$ 1.602.032
317	Niple en Acero Inixidable de 1" x (10cm - 20 cm)	UND	\$ 170.083	13	\$ 2.211.079
319	Niple en Acero Inixidable de 1 1/2" x (10cm - 20)	UND	\$ 213.400	4	\$ 853.600
327	Niple en Acero Inixidable de 1 1/2" x (20 cm - 40 cm)	UND	\$ 413.819	3	\$ 1.241.457
321	Niple en Acero Inixidable de 3" x (10cm - 20)	UND	\$ 266.553	5	\$ 1.332.765
344	Teflon de 1" por 50 metros	UND	\$ 48.570	5	\$ 242.850
346	Eterna	UND	\$ 112.942	6	\$ 677.652
					\$ 67.591.727

Cordialmente,


ADRIANA PATRICIA CAMERO PIRAQUIVE

C.C. No. 1.019.093.202 de
BOGOTÁ REPRESENTANTE
LEGAL

GOURIYU SISTEMAS SAS

900.738.226-0

CRA 81 #24 - 127 LOCAL 103 CARTAGENA - BOLÍVAR

3145247124

CORREO: acceder@gouriyu.com

CRA 81 #24 - 127 LOCAL 103 – CARTAGENA – BOLIVAR

3145247124 – ACCEDER@GOURIYU.COM
