



13 DE ABRIL DE 2026

Conectamos
PERSONAS

INFORME AVANCES

SEDES ADMON



NANCY RUIZ TOCORA

Sedes Admon

Proyecto: Parques Inteligentes
Objeto del informe: Entrega de avances de ejecución UCAD, Plaza de Artesanos y IDRDR y novedades presentadas.

1. Miércoles 8 de abril

Compra y Entrega de materiales en Sede IDRDR y plaza de artesanos, para inicio de obra.




Listado de Materiales

CO-RE-03 VERSIÓN: 3	ORDEN DE COMPRA																																																																
FECHA <u>31 de marzo de 2026</u>																																																																	
BERCONT LTDA Carrera 32 No. 25 A - 16 860.524.545-1 PBX 3696996 E-mail cesar.contreras@bercont.com - cas@bercont.com Favor elaborar factura a nombre de Bernardo Contreras y Cia Ltda.	PROVEEDOR ELECTRICOS Y C DIRECCION Cr NIT 830083878-6 CIU TELEFONO 5 E-mail 5 CONTACTO: DAVID SANCHEZ																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CANT</th> <th>REF</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>37</td><td>TEF2</td><td>TUBO EMT 3/4 x 3 MTS GEPAK</td></tr> <tr><td>2</td><td>54</td><td>UEMT3/4C</td><td>Union EMT 3/4 ACERO COLMENA</td></tr> <tr><td>3</td><td>16</td><td>CEMT3/4</td><td>Conector EMT 3/4 ACERO COLMENA</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>PBRA15X300PG</td><td>Riel Chanel 4x2 Ranurado x 3 mt</td></tr> <tr><td>5</td><td>14</td><td>VR38</td><td>Varilla Roscada 3/8" x 3 Mts</td></tr> <tr><td>6</td><td>340</td><td>10023</td><td>Tuerca 3/8"</td></tr> <tr><td>7</td><td>340</td><td>20001326</td><td>Arandela 3/8"</td></tr> <tr><td>8</td><td>110</td><td>CM1263</td><td>Chazo Multiuso 3/8"</td></tr> <tr><td>9</td><td>104</td><td>GUN3/4</td><td>Grapa Unistrud 3/4"</td></tr> <tr><td>10</td><td>40</td><td>CHASUP</td><td>Chazo Supra 1/4</td></tr> <tr><td>11</td><td>4</td><td>HOM120</td><td>Taco Enchufable 1x20 SQUARE'D</td></tr> <tr><td>12</td><td>150</td><td>CT3x12CentSint</td><td>Cable Trenzado 3x12 Azul A-B-V Sintox Centelsa</td></tr> <tr><td>13</td><td>4</td><td>5320-WCI</td><td>Toma doble c/polo a tierra BLANCA LEVITON</td></tr> <tr><td>14</td><td>17</td><td>AU1210</td><td>Conector Autodesforre VESTA</td></tr> <tr><td>20</td><td>8</td><td>CR58003/4-3SD</td><td>Caja RATWELL 5800 3/4 3 Salidas Doble Fdo</td></tr> </tbody> </table>		ITEM	CANT	REF	DESCRIPCION	1	37	TEF2	TUBO EMT 3/4 x 3 MTS GEPAK	2	54	UEMT3/4C	Union EMT 3/4 ACERO COLMENA	3	16	CEMT3/4	Conector EMT 3/4 ACERO COLMENA	4	4	PBRA15X300PG	Riel Chanel 4x2 Ranurado x 3 mt	5	14	VR38	Varilla Roscada 3/8" x 3 Mts	6	340	10023	Tuerca 3/8"	7	340	20001326	Arandela 3/8"	8	110	CM1263	Chazo Multiuso 3/8"	9	104	GUN3/4	Grapa Unistrud 3/4"	10	40	CHASUP	Chazo Supra 1/4	11	4	HOM120	Taco Enchufable 1x20 SQUARE'D	12	150	CT3x12CentSint	Cable Trenzado 3x12 Azul A-B-V Sintox Centelsa	13	4	5320-WCI	Toma doble c/polo a tierra BLANCA LEVITON	14	17	AU1210	Conector Autodesforre VESTA	20	8	CR58003/4-3SD	Caja RATWELL 5800 3/4 3 Salidas Doble Fdo
ITEM	CANT	REF	DESCRIPCION																																																														
1	37	TEF2	TUBO EMT 3/4 x 3 MTS GEPAK																																																														
2	54	UEMT3/4C	Union EMT 3/4 ACERO COLMENA																																																														
3	16	CEMT3/4	Conector EMT 3/4 ACERO COLMENA																																																														
4	4	PBRA15X300PG	Riel Chanel 4x2 Ranurado x 3 mt																																																														
5	14	VR38	Varilla Roscada 3/8" x 3 Mts																																																														
6	340	10023	Tuerca 3/8"																																																														
7	340	20001326	Arandela 3/8"																																																														
8	110	CM1263	Chazo Multiuso 3/8"																																																														
9	104	GUN3/4	Grapa Unistrud 3/4"																																																														
10	40	CHASUP	Chazo Supra 1/4																																																														
11	4	HOM120	Taco Enchufable 1x20 SQUARE'D																																																														
12	150	CT3x12CentSint	Cable Trenzado 3x12 Azul A-B-V Sintox Centelsa																																																														
13	4	5320-WCI	Toma doble c/polo a tierra BLANCA LEVITON																																																														
14	17	AU1210	Conector Autodesforre VESTA																																																														
20	8	CR58003/4-3SD	Caja RATWELL 5800 3/4 3 Salidas Doble Fdo																																																														
Observaciones:																																																																	
CLIENTE: IDRD																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FECHA DE ENTREGA:</td> <td style="width: 50%;">CONDICIONES COMERCIALES</td> </tr> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td></td> </tr> </table>		FECHA DE ENTREGA:	CONDICIONES COMERCIALES	FORMA DE PAGO																																																													
FECHA DE ENTREGA:	CONDICIONES COMERCIALES																																																																
FORMA DE PAGO																																																																	

2. Viernes 10 de abril

Se realiza instalación de tubería, cableado Eléctrico y UTP para punto de datos y punto eléctrico para TV Plaza de Artesanos

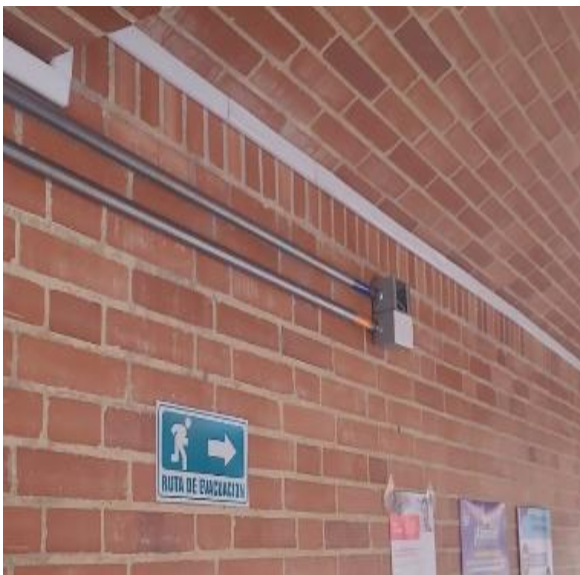




Ubicación en Patch Panel No. 13 en Rack de comunicaciones



3. Viernes 10 de abril. UCAD
Instalación de tubería, Cableado UTP y eléctrico

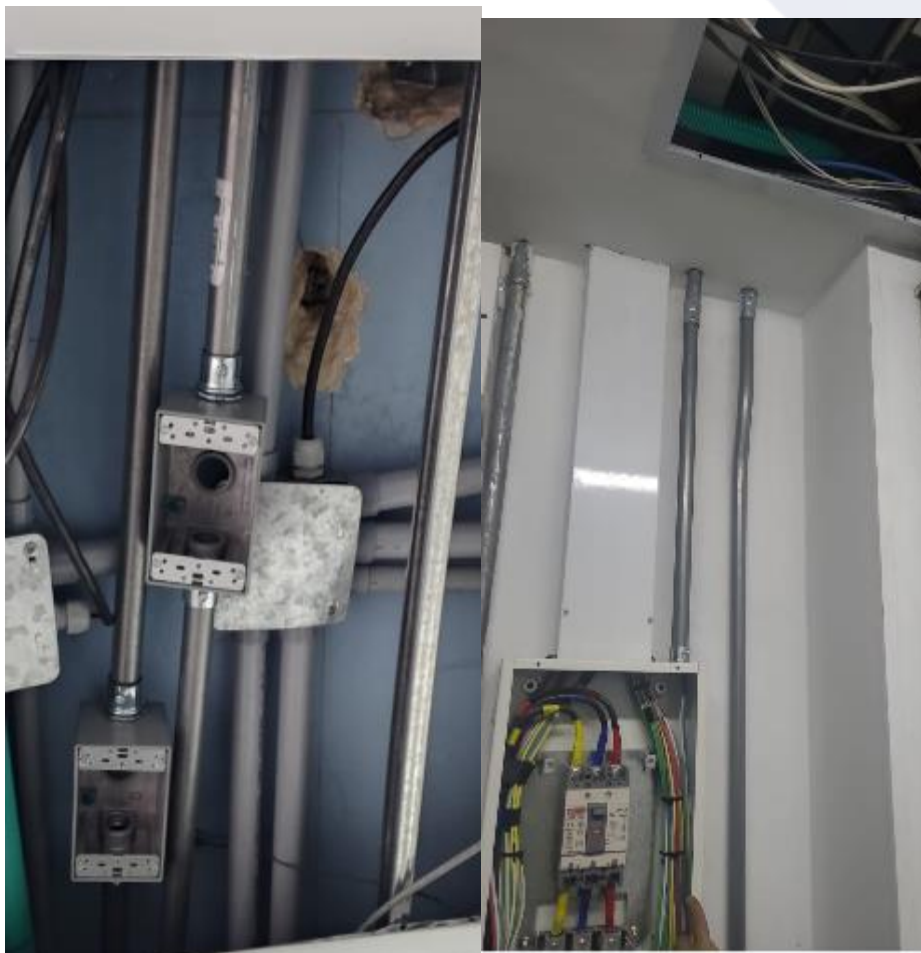

Ubicado en puerto 24 del patch panel

