

	Documento: FORMATO	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1
	Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Fecha: 2025-07-01 Página 1 de 10

1. INFORMACIÓN GENERAL	
LUGAR Y FECHA	FILANDIA – QUINDÍO, MAYO DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF – SAS E.S.P.
CONTRATISTA	GRUPO GONFOR S.A.S. BIC
No. DE CONTRATO	CPS-017-2026
INFORME PERTINENTE A:	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
PERIODO INFORMADO	ABRIL 2026

En el presente informe, se deja constancia de que hemos dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco normativo aplicable a los servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Decreto 943 de 2018, así como a las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y demás lineamientos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Minas y Energía. De igual forma, manifestamos que se ha venido cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y demás normas concordantes que regulan la adecuada prestación del servicio.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar un informe de la gestión realizada en función de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se atendieron durante el periodo informado. Siempre bajo la comprensión de que el servicio de Alumbrado Público es un servicio público no domiciliario, que se presta, con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes públicos y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del municipio.


3. ATENCIÓN AL USUARIO

El contrato informado NO contempla atención directa al usuario, es la entidad contratante quien hace la recepción de los requerimientos y nos traslada aquellos que correspondan a actividades de mantenimiento, a través de una matriz compartida en Google Drive, sobre estas actividades se informa en el punto 5.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

El sistema de alumbrado público del municipio cuenta con un total de 976 luminarias instaladas, de las cuales 59 se encuentran con medida y 917 por aforo, de estas, 767 se encuentran en la zona urbana, 55 en el corregimiento La India y 95 en la zona rural del municipio. Actualmente el 99.9% de las luminarias son de tecnología LED.


CLASIFICACION POR TECNOLOGIA



■ LED ■ SODIO

Gráfico 1. Clasificación de Tecnología del SALP.

CLASIFICACION POR ZONA DE
INSTALACION



■ URBANO ■ RURAL ■ LA INDIA (EEP)

Gráfico 2. Clasificación por zona del SALP.

En la tabla 1 abajo, se detalla el total de los activos eléctricos del sistema discriminado por tecnología, potencia y sector:

INVENTARIO DE LUMINARIAS SALP FILANDIA

TECNOLOGÍA	POTENCIA (W)	CON MEDIDA	URBANO	RURAL	LA INDIA (EEP)	TOTAL
REFLECTOR LED	20	0	1	0	0	1
REFLECTOR LED	24	0	19	0	0	19
REFLECTOR LED	50	0	7	0	0	7
REFLECTOR LED	100	15	5	0	0	20
REFLECTOR LED	400	16	0	0	0	16
LED ORNAMENTAL	50	0	21	0	0	21
LED	40	25	504	84	43	656
LED	50	0	0	2	0	2
LED	60	0	6	1	1	8
LED	66	0	2	2	2	6
LED	70	0	8	0	0	8
LED	74	1	161	6	9	177
LED	100	0	2	0	0	2
LED	110	0	16	0	0	16
LED	170	2	14	0	0	16
SODIO	70	0	0	0	0	0
SODIO	150	0	1	0	0	1
TOTAL		59	767	95	55	976

Tabla 1. Activos eléctricos del SALP.

5. RESUMEN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

El mantenimiento correctivo del alumbrado público se programa y ejecuta con base en los reportes remitidos por las Empresas Públicas de Filandia, así como, los reportes resultantes de los recorridos diurnos y nocturnos realizados por el personal de Empresas Públicas de Filandia y el personal técnico operativo del Grupo Gonfor S.A.S. BIC. Los mantenimientos realizados en este período se llevaron a cabo los días nueve (9), dieciséis (16), veintidós (22) y treinta (30) de abril del año 2026 en las jornadas laborales completas según las obligaciones contractuales.

5.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Durante el período se atendieron cuatro (4) mantenimientos correctivos en atención a las fallas reportadas por los usuarios, las inspecciones realizadas en el recorrido nocturno y eventualmente las encontradas durante la ejecución del mantenimiento preventivo.

5.2. REPOSICIONES.

Durante el período se efectuaron seis (6) reposiciones de luminarias tipo LED, como respuesta a las fallas reportadas por la comunidad y a las anomalías identificadas durante los recorridos nocturnos y las actividades de mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público.

En el Anexo No.2 se presenta la relación con la orden de trabajo ejecutada en cada mantenimiento. Allí se puede evidenciar el detalle de lo realizado y los elementos utilizados en cada caso.

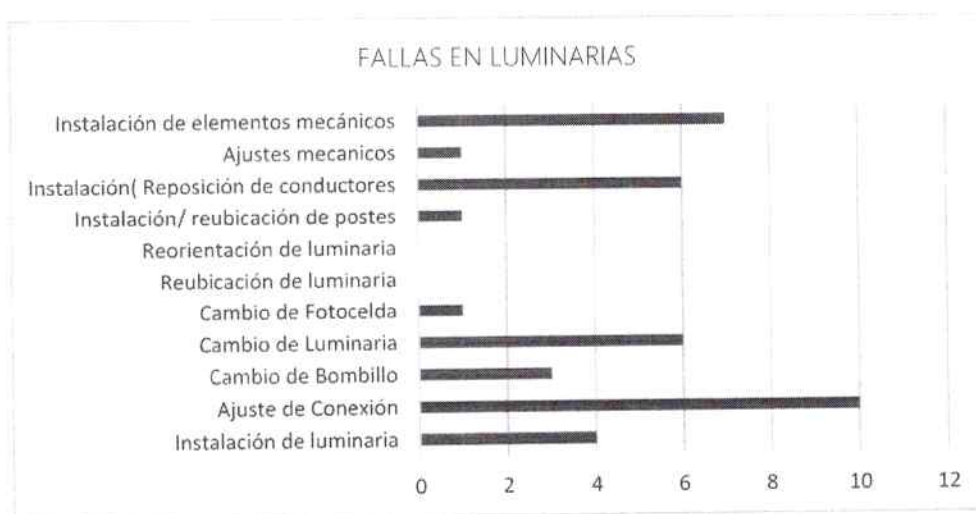


Gráfico 3. PQRs atendidas durante el período.

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 4 de 10
---	--	--

5.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el mes de abril se realizaron veinticuatro (24) mantenimientos preventivos a luminarias del sistema de alumbrado público del municipio.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
FECHA DE EJECUCION	SECTOR	Código Luminaria	LUMINARIA LED [W]
22/4/2026	LA INDIA ENTRADA DE LA FERRETERIA	1432	40
22/4/2026	VÍA LA INDIA FRENTE A LA FINCA CEILAN	1695	74
22/4/2026	VÍA LA INDIA FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL	1705	74
22/4/2026	ENTRADA XIXARAMA	1811	40
22/4/2026	FINCA LA ESPERANZA XIXARAMA	3004	40
22/4/2026	FINCA LA ESPERANZA XIXARAMA	3005	40
22/4/2026	CASA 1 XIXARAMA	1810	40
22/4/2026	ENTRADA A XIXARAMA	1715	40
22/4/2026	ENTRADA A XIXARAMA	1716	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	732	74
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	3042	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	3016	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	494	74
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	497	74
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	701	74
22/4/2026	XIXARAMA ENTRADA CASA 8	1688	74
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	1739	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	1721	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	403	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	1723	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	2012	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	1713	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	293	40
22/4/2026	VÍA A LA INDIA	176	40

5.4. ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN

Durante el mes de abril no se realizaron actividades de modernización.

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 5 de 10

5.5. ACTIVIDADES DE INSTALACION DE LUMINARIAS

Durante el mes de abril se realizó la instalación de cuatro (4) luminarias al sistema de alumbrado público en la zona urbana del municipio.

EXPANSIÓN					
FECHA DE EJECUCION	SECTOR	Código Luminaria	INSTALADA [W]	Coordenadas Latitud/longitud	
9/4/2026	CORREGIMIENTO LA INDIA SALIDA HACIA ARABIA	164	40	4,707719	-75,706627
30/04/2026	ESCUELA DE CRUCES	2685	40	4,692314	-75,606897
30/04/2026	ESCUELA DE CRUCES	2686	40	4,692369	-75,607007
30/04/2026	BARRIO SANTIAGO LOPEZ PASAJE- CALLEJON CALLE 2 CRA 3 BIS	2687	40	4,671501	-75,660667

A continuación, la tabla 2 corresponde al resumen general de actividades en que se relaciona la cantidad de luminarias atendidas por mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo conforme a los reportes recibidos y atendidos en el último mes en la zona urbana y rural del municipio, en el anexo se presenta la tabla completa. La columna de TOTAL hace referencia al total de cada fila desde el inicio del contrato (febrero 2026).

MUNICIPIO DE FILANDIA. MANTENIMIENTO MENSUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2026.						
TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FEB.	MAR	ABR	TOTAL
ATENCIÓN AL PÚBLICO	1	PQRS REPORTADOS	29	9	10	48
OPERACIÓN.	1	LUMINARIAS OPERANDO	970	972	976	976
	2	ACTIVIDADES EN LUMINARIAS	50	41	53	144
	3	LUMINARIAS ATENDIDAS DE SODIO 70W	0	0	0	0
	4	LUMINARIAS ATENDIDAS DE SODIO 150W	0	0	0	0
	5	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 20W	0	0	0	0
	6	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 40W	21	15	30	66
	7	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 50W	0	0	0	0
	8	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 60W	0	0	0	0
	9	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 66W	0	0	0	0
	10	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 74W	6	6	8	20
	11	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 100W	0	0	0	0
	12	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 110W	0	0	0	0
	13	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 150W	0	0	0	0

		Documento:	FORMATO				Código: FO-OP-004-4
		Nombre:	INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS				Revisión: 1
						Fecha: 2025-07-01	
						Página 6 de 10	
	14	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 174W	0	0	0	0	
	15	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 200W	0	0	0	0	
	16	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 400W	0	0	0	0	
	17	LUMINARIAS ATENDIDAS MES	27	21	38	48	
	18	LUMINARIAS ATENDIDAS POR MTTO CORRECTIVO	27	16	4	47	
	19	LUMINARIAS ATENDIDAS POR MTTO PREVENTIVO	0	0	24	0	
TOTAL ATENDIDAS	1	ATENDIDAS POR MODERNIZACIÓN	0	3	0	3	
	2	INSTALACION DE LUMINARIAS	0	2	4	2	
	3	ATENDIDAS POR PROVISIONAL	0	0	0	0	
	4	ATENDIDAS POR REPOSICIÓN			6	6	

Tabla 2. Resumen general de actividades

El gráfico 4 refleja el número de luminarias operando, mantenimientos correctivos atendidos y actividades por luminaria en el mes descritos en los numerales 5.1. El número de actividades corresponden a cambios de bombillos, fotoceldas, arrancadores, condensadores, reactancias, fusibles, varistores, DPS, elementos de conexión, limpiezas y adecuaciones de luminarias de LED.



Gráfico 4. Mantenimientos y Actividades realizadas.

El grupo Gonfor mantiene de forma permanente una provisión adecuada y suficiente de materiales y repuestos destinados a las labores de mantenimiento, con el fin de garantizar la continuidad y correcta prestación del servicio de alumbrado público.

5.6. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

De acuerdo con la cantidad de fallas en el mes y la cantidad total de luminarias del sistema, que según último censo ascienden a 976 luminarias operando, es posible señalar que para el periodo se presentó un índice de fallas

de 1,54 %, las cuales fueron atendidas en su totalidad para obtener una eficiencia del 100 %.

En la siguiente tabla se muestra un resumen del reporte de las fallas y la eficiencia del sistema:

EFICIENCIA DEL SISTEMA	
Luminarias Operando	976
Daños reportados	10
Daños atendidos	10
Índice de falla	1,02%
Eficiencia del servicio	100,0%

Tabla 3. Resumen general de la eficiencia del Sistema



Gráfico 5. Eficiencia del Sistema.

6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN

✓ Los materiales gastados adicionales son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG PARA ACOMETIDAS DE LUMINARIAS	13,00	M
CONECTORES DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO	16	UN
CABLE ALUMINIO AISLADO THHN/THWN #6 AWG	107	ML

Se viene realizando de manera adecuada la gestión y disposición final de los elementos retirados durante el mantenimiento del sistema de alumbrado público (SALP) que requieren tratamiento especial, mediante gestores autorizados, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; igualmente, los materiales aprovechables como balastos, retales de cable, brazos, soportes y luminarias están siendo entregados en las bodegas de Empresas Públicas de Filandia E.P.F S.A.S., y la certificación de disposición de residuos peligrosos junto con los respectivos soportes de entrega serán presentados en el informe final del contrato.

7. ANÁLISIS DE CARGA DEL SISTEMA Y BALANCE DE ENERGÍA

En la tabla 4, se detalla la información de las luminarias por aforo (sin medida) discriminadas por tecnología, potencia y energía consumida en el mes, de acuerdo con la carga instalada en sistema de alumbrado público. El balance del consumo de energía para el mes de abril del año 2026 es de 16.807 kWh/mes de aforo por concepto de alumbrado público, quedando un total de 917 luminarias operando en el municipio más 59 luminarias con medición es de 3.130 kWh/mes.

ALUMBRADO PÚBLICO FILANDIA QUINDIO. INVENTARIO DE LUMINARIAS Y BALANCE DE ENERGÍA DE ABRIL DE 2026.																				
DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)		mar-26				ENERGIA A FACTURAR KWH/MES	INSTALADAS EN PERIODO			RETIRADAS EN PERIODO			abr-26				ENERGIA A FACTURAR KWH/MES		
	Nominal	TOTAL	DÍAS			31		U	R	TOTAL	U	R	TOTAL	DÍAS			30			
			U	R	LI									TOTAL	U	R			LI	TOTAL
LED	20	20	1	0	0	1	7			0			0	1	0	0	1	7		
	24	24	19	0	0	19	170			0			0	19	0	0	19	164		
	50	50	7	0	0	7	130			0			0	7	0	0	7	126		
	100	100	5	0	0	5	186			0			0	5	0	0	5	180		
	400	400	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0		
	50	50	21	0	0	21	391			0			0	21	0	0	21	378		
	40	40	500	81	43	624	9.285	4	3	7			0	504	84	43	631	9.086		
	50	50	0	2	0	2	37			0			0	0	2	0	2	36		
	60	60	6	1	1	8	179			0			0	6	1	1	8	173		
	66	66	2	2	2	6	147			0			0	2	2	2	6	143		
	70	70	8	0	0	8	208			0			0	8	0	0	8	202		
	74	74	164	6	9	179	4.928			0	3		3	161	6	9	176	4.689		
	100	100	2	0	0	2	74			0			0	2	0	0	2	72		
	110	110	16	0	0	16	655			0			0	16	0	0	16	634		
	170	170	14	0	0	14	885			0			0	14	0	0	14	857		
SODIO	70	81	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0		
	150	169	1	0	0	1	63			0			0	1	0	0	1	61		
TOTAL			766	92	55	913	17.345	TOTAL			767	95	55	917				16.807		

Tabla 4 Consumo de energía del SALP

ALUMBRADO PÚBLICO FILANDIA QUINDIO.																		
INVENTARIO DE LUMINARIAS CON MEDIDA Y BALANCE DE ENERGÍA DE ABRIL DE 2026.																		
DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)		mar-26				ENERGÍA ANTERIOR KWH/MES	INSTALADAS EN PERIODO			RETIRADAS EN PERIODO			abr-26				ENERGIA A FACTURAR KWH/MES
	Nominal	TOTAL	DÍAS			31								DÍAS			28	
			U	R	LI									TOTAL	U	R		
LED	100	100	15	0	0	15	558			0			0	15	0	0	15	504
	400	400	16	0	0	16	2.381			0			0	16	0	0	16	2.150
	40	40	25	0	0	25	372			0			0	25	0	0	25	336
	74	74	1	0	0	1	28			0			0	1	0	0	1	25
	170	170	2	0	0	2	126			0			0	2	0	0	2	114
TOTAL			59	0	0	59	3.465	TOTAL			59	0	0	59				3.130

Tabla 5 Consumo de energía luminarias con medida


8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS

La eficiencia operativa del sistema de alumbrado público durante el mes fue del 100 %, dado que todos los mantenimientos correctivos requeridos fueron atendidos oportunamente. Esto garantizó el adecuado funcionamiento de la totalidad de los puntos lumínicos en servicio.

El grupo Gonfor está cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación, en la oferta presentada y en el contrato, garantizando la adecuada ejecución de las actividades conforme a los requerimientos definidos.

9. ANEXOS DEL INFORME

- Anexo 1. Registro fotográfico de labores de mantenimiento (Archivo PDF).
- Anexo 2. Reporte detallado de los mantenimientos realizados (Archivo PDF).

 Firmado digitalmente por Ana Verónica González Forero Fecha: 2026.05.29 09:43:02 -05'00' Nombre: ANA VERÓNICA GONZALEZ FORERO Cargo: Representante Legal Grupo Gonfor S.A.S. BIC	 Nombre: JONATHAN TAMAYO PARRA Cargo: Líder de proyectos Grupo Gonfor S.A.S. BIC
---	--

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 10 de 10
---	--	---

CONTROL DE CAMBIOS				
Código	Versión	Nombre del Documento	Fecha de Actualización	Razón del cambio
FO-OP-004-4	0	INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	2024-03-30	Creación del documento.
	1		2025-07-01	Se actualiza el nombre del documento para identificarlo con un título propio aplicable a informes de proyectos por contrato. Se incluye el campo "Número de contrato" en la parte superior, como mecanismo de identificación individual de cada informe, sin requerir modificaciones posteriores en la estructura del encabezado. Se ajusta la sección superior del encabezado acorde a los actuales documentos de la organización. Adicionalmente, se estructuran los cuadros internos del informe en formato de tabla, para su estandarización.

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES OPERATIVAS.

- Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 9 de abril del año 2026.



Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 16 de abril del año 2026.



Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 22 de abril del año 2026.



- Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 30 de abril del año 2026.




POR NO.	FECHA DE RADICADO	DATOS SOLICITUD			REPORTE DE SOLICITUD	OPERACIÓN	SOLUCIÓN DE POR		OBSERVACIONES
		DIRECCIÓN	TELÉFONO	SOLICITANTE			FECHA DE VENTA	FECHA EJECUCIÓN	
51	9/4/2026	ZONA CENTRO CALLE 7 CON CARRERA 8 ESQUINA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA LED 74W APAGADA	REPOSICIÓN	9/04/2026	9/04/2026	SE RETIRA LA LUMINARIA MARQUILADA N° 2894 DE 74 W QUE NO ENCIENDE Y SE INSTALA LA LUMINARIA MARQUILADA N° 2043 DE 74 W DEJANDO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. ADICIONAL, SE INSTALA UNA FOTOCELULA SUMINISTRADA POR EL GRUPO GONFOR.
52	8/4/2026	CORRECTORIO PARA LA INSTALACION HACIA ARABIA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	INSTALAR LUMINARIA NUEVA	EXPANSIÓN	9/04/2026	9/04/2026	SE REALIZA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE UN POSTE METALICO CON LUMINARIA DE 40 W CON MARQUILADA SIN, TENDIDO DE 85 M DE RED Y COLOCACION DE DOS PERCHAS. POSTERIORMENTE, SE CONECTA LA RED Y SE VERIFICA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
53	8/4/2026	ENTRADA PRINCIPAL FRENTE A RESTAURANTE MERUM	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA DE 74W APAGADA CON #0548	REPOSICIÓN	9/04/2026	9/04/2026	SE ENCUENTRA LUMINARIA DE 74 W APAGADA. AL VERIFICAR LA TENSIÓN NO ENCIENDE, POR LO QUE SE REEMPLAZA POR UNA LUMINARIA LED NUEVA DE 40 W MARQUILADA N° 2774, SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN, Y SE DEJA EN FUNCIONAMIENTO NORMAL.
54	8/4/2026	PARKING PRINCIPAL	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	FAROL DECORATIVO #0206 APAGADO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	9/04/2026	9/04/2026	SE REEMPLAZA BOMBILLA LED DE 40 W SUMINISTRADA POR EL GRUPO GONFOR Y SE VERIFICA SU ENCENDIDO Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL PUNTO.
55	8/4/2026	PARKING PRINCIPAL	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	FAROL DECORATIVO #0203 APAGADO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	9/04/2026	9/04/2026	SE REEMPLAZA BOMBILLA LED DE 40 W SUMINISTRADA POR EL GRUPO GONFOR Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL PUNTO.
57	14/4/2026	BARRO HORIZONTES MONJA E CAS #10	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA LED # 0475 APAGADA DE 74 W	REPOSICIÓN	16/04/2026	16/04/2026	SE INSPECCIONA LUMINARIA CELSA DE 74 W APAGADA. TRAS VERIFICAR CONEXIONES Y FOTOCELULA SIN LOGRAR SU ENCENDIDO, SE RETIRA Y SE INSTALA LUMINARIA ECOLLECTIVE DE 40 W MARQUILADA N° 2894 EL GRUPO GONFOR SUMINISTRA 2 M DE CABLE 3x18 Y DOS CONECTORES Y SE REEMPLAZA LA ACOMETIDA POR SU MAL ESTADO.
58	14/4/2026	BARRO GUILERMO LEON VALENCIA, TIENDA MUEBLAR Y PARQUE INFANTIL	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA LED # 0562 APAGADA DE 74 W	REPOSICIÓN	16/04/2026	16/04/2026	SE INSPECCIONA LUMINARIA CELSA DE 74 W QUE SE ENCUENTRA APAGADA. TRAS VERIFICAR LAS CONEXIONES SIN LOGRAR SU ENCENDIDO, SE RETIRA LA LUMINARIA MARQUILADA N° 0911 Y SE INSTALA UNA LUMINARIA ECOLLECTIVE DE 40 W MARQUILADA N° 2050 Y SE REEMPLAZA LA ACOMETIDA POR SU MAL ESTADO Y EL GRUPO GONFOR SUMINISTRA 1.5 M DE CABLE 3x18 Y CONECTORES PARA LA INSTALACION.
59	14/4/2026	ATRO DE LA IGLESIA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	FAROL APAGADO # 2806	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	16/04/2026	16/04/2026	SE INSPECCIONA FAROL DECORATIVO UNICADO EN LA ENTRADA DEL ATRO DE LA IGLESIA QUE SE ENCUENTRA APAGADO. SE REEMPLAZA LA BOMBILLA LED DE 40 W Y SE DEJA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
60	14/4/2026	CARRERA 2 NO 4-33, SECTOR PLAZA DE FERIAS	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA LED # 012 APAGADA DE 40 W	REPOSICIÓN	16/04/2026	16/04/2026	SE INSPECCIONA LUMINARIA CELSA DE 40 W QUE SE ENCUENTRA APAGADA. TRAS VERIFICAR CONEXIONES Y FOTOCELULA SIN LOGRAR SU ENCENDIDO, SE RETIRA LA LUMINARIA MARQUILADA N° 0911 Y SE INSTALA UNA LUMINARIA ECOLLECTIVE DE 40 W MARQUILADA N° 2050. ADICIONAL, SE REEMPLAZA LA ACOMETIDA POR SU MAL ESTADO, UTILIZANDO 1 M DE CABLE 3x18 Y DOS CONECTORES SUMINISTRADOS POR EL GRUPO GONFOR.
61	14/4/2026	BARRO FORVENIR CALLE 8 CARRERA 7	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA LED, ECOLLECTIVE #0202 APAGADA DE 40 W	REPOSICIÓN	16/04/2026	16/04/2026	SE INSPECCIONA LUMINARIA SUMINISTRADA DE 40 W QUE SE ENCUENTRA APAGADA. AL REVISARLA, SE EVIDENCIA PRESENCIA DE AGUA EN SU INTERIOR POR LO QUE SE RETIRA PARA GARANTIA (MARQUILADA N° 2695) Y SE INSTALA UNA LUMINARIA ECOLLECTIVE DE 40 W MARQUILADA N° 2050.
62	16/4/2026	SECTOR PLAZA DE FERIAS Y ESTADIO	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	CONEXION DE LA LUMINARIA AFECTADA POR MAGNATINA PESADA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	16/04/2026	16/04/2026	SE VERIFICA EL CONTACTO DEL POLIDORTIVOY EL CUAL, SE ENCUENTRA DESCONECTADO POR CABLE EN LAS ABRIGAZIONES DEL POSTE DE LUMINARIA N° 848 SE PROCESÓ A ORGANIZARLO CON AUTORIZACION DE NAGUE.
64	22/4/2026	LA INDA ENTRADA DE LA FERRITERIA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	LUMINARIA ENCENDIDA 1432	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	LUMINARIA ENCENDIDA POR FOTOCELULA DIRECTA LA CUAL NO ACTIVA, SE CAMBIA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA LA INDA FRENTE A LA FINCA CELAR	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-1895	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA LA INDA FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-1706	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	ENTRADA XIXARAMA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1811	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	FINCA LA ESPERANZA XIXARAMA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-3004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	FINCA LA ESPERANZA XIXARAMA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 60W-3005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	CASA 1 XIXARAMA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1810	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	ENTRADA A XIXARAMA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1715	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	ENTRADA A XIXARAMA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-0732	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 60W-3542	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-3018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-0494	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-0487	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-0291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	XIXARAMA ENTRADA CASA B	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 74W-1888	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1738	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-0402	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1723	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-1713	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-0283	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
N/A	22/4/2026	VIA A LA INDA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	MANTENIMIENTO LUMINARIA DE 40W-0178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	22/4/2026	22/4/2026	SE REVISAN CONEXIONES, SE HACE LIMPIEZA Y SE DEJA FUNCIONANDO.
56	13/4/2026	VENEZIA EL CASAL FRENTE A LA ESCUELA	3136620454	LUCIA OLIVERO RAYO	LUMINARIA LED APAGADA EN LA FINCA EL REVALO - LOS ALPES, SOLICITO REVISAR POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA NUEVA MAS ARRIBA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	30/04/2026	30/04/2026	SE REALIZA VISITA AL PUNTO SOLICITADO, DONDE EL USUARIO SEÑALA UNA LUMINARIA UNICADO AL INTERIOR DE SU PASEO, EN TECNOLOGIA DE MERCURIO, SIN LE RAYONER QUE ESTA HE Pertenecido AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ARRIBA, SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR Y SE HACE REGISTRO FOTOGRAFICO.
56	29/4/2026	ESCUELA DE CRUCES	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	INSTALAR LUMINARIA EN LOS APOYOS EXISTENTES	EXPANSIÓN	30/04/2026	30/04/2026	SE INSTALA LUMINARIA LED DE 40 W, N° 2888, CON BRAZO DE 1.3 M, PERCHA BENCILLA Y 47 M DE RED DE ALUMBRADO N° 8, RUEDA CON ANCLAJE A PARED, DOS ARRANZADORAS Y CINCO PERCHOS SE VERIFICA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
56	29/4/2026	ESCUELA DE CRUCES	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	INSTALAR LUMINARIA EN LOS APOYOS EXISTENTES	EXPANSIÓN	30/04/2026	30/04/2026	SE INSTALA LUMINARIA LED DE 40 W, N° 2888, CON BRAZO DE 1.3 M, PERCHA BENCILLA Y 47 M DE RED DE ALUMBRADO N° 8, RUEDA CON ANCLAJE A PARED, DOS ARRANZADORAS Y CINCO PERCHOS SE VERIFICA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
57	29/4/2026	BARRO SANTIAGO LOPEZ PASAJE- CALLEON CALLE 2 ONA 3 BBS	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	INSTALAR LUMINARIA LED Y BRAZO EN PARED DE VIVIENDA	EXPANSIÓN	30/04/2026	30/04/2026	SE INSTALA LUMINARIA LED DE 40 W, N° 2887 EN TACHADA PLACA CON CINCO PERCHOS DE ANCLAJE, PERCHA Y DOS ARRANZADORAS, SE TIENE RED EN ALAMBRE N° 12, SE CONECTA A CADA DE DISTRIBUCION A 220 V Y SE VERIFICA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
GRUPO GONFOR SAS BIC
NIT. 900.377.561-3

CERTIFICA

Que con base en lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27-12-2002 parágrafo 4, certifico que la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los subsistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales hasta **abril** de 2026. Que la causación y pagos de estas obligaciones están registrados en los libros de contabilidad.

Se expide en la ciudad de Pereira a los veinticinco (15) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).



Maribel Marulanda Henao
Revisor Fiscal
T.P. 121911-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIBEL ZULIMA MARULANDA HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42102461 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 121911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.102.461**

MARULANDA HENAO

APELLIDOS
MARIBEL ZULIMA

NOMBRES


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1971**


MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-SEP-1990 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00099842-F-0042102461-20081017 0004530519A 1 4910009965

LÍNEA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

121911-T

MARIBEL ZULIMA
MARULANDA HENAO
C.C. 42102461
RES. INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD LIBRE

DEL 02/11/2006

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

294048 **131784**




Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900377561-3	GRUPO GONFOR S.A.S	CARRERA 10 # 46 - 38 BARRIO JARDIN DE	3144368	divian.aguiar@grupogonfor.co				
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DÉPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menor de 200			RISARALDA	PEREIRA	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EXPLERADOS	CANTIDAD UPIC	
		82983773		19	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-05	2026-04	E	\$69.561.451	\$18.639.900		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	661.300	0	0	0	0	0	661.300
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	857.800	0	0	0	0	0	857.800
EPS010	EPS Sura	800388702-2	1.171.500	0	0	0	0	0	1.171.500
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	71.300	0	0	0	0	0	71.300

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
203201	Protección (ING + Protección)	800223739-0	1.488.000	0	0	0	0	0	1.488.000
230301	Poncentir	800224808-6	2.625.900	0	0	0	0	0	2.625.900
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.016.700	0	0	57.700	57.700	0	7.132.100

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.870.100	No. Autorización	Valor	1.870.100	0	0	1.870.100

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF44	Comfamiliar Resvalda	891480000-1	2.761.900	0	0	2.761.900	19		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	4	2.761.900	2.761.900	19
Pensión	3	11.246.000	11.246.000	6
Riesgos Laborales	1	1.870.100	1.870.100	19
CCF	1	2.761.900	2.761.900	6
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	9	18.639.900	18.639.900	19

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPD
		82983773		19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2006-05	2006-04	E	\$09,561,451	\$18,638,900	

INFORMACION COTIZANTE

[illegible]
