

INFORME TÉCNICO

DESMONTE Y LIMPIEZA DE LA VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA

Convenio Solidario No. MT-CD-CS-003 de 2026

Objeto del Convenio

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Peñas Bajo, con el fin de ejecutar acciones de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial.

Elaborado por:

Junta de Acción Comunal de la Vereda Peñas Bajo

Supervisión:

Arq. Paula Andrea Vanegas Vargas
Secretaria de Planeación – Supervisora del Convenio

Contratista:

Junta de Acción Comunal de la Vereda Peñas Bajo
Representante Legal: José Fermín Salinas

Tinjacá – Boyacá

Julio de 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. LOCALIZACIÓN	4
3. OBJETIVOS	5
3.1 OBJETIVO GENERAL	5
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICO	5
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	6
5. ACTIVIDADES	7
6. CONCLUSIONES	8

1. INTRODUCCIÓN


En cumplimiento del convenio No. MT-CD-CS-003 DE 2026, suscrito entre el municipio de Tinjacá y la junta de acción comunal de la vereda peñas bajo, se adelantaron las actividades preliminares de desmonte y limpieza del tramo vial objeto de intervención, las cuales constituyen la etapa inicial necesario para la posterior construcción de la placa huella

Estas actividades permiten adecuar las áreas de trabajo, garantizando las condiciones técnicas requeridas para el inicio de las obras y facilitando el desarrollo de las siguientes etapas constructivas

2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en la vereda Peñas Bajo, jurisdicción del municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, sobre un tramo de la red vial terciaria que comunica a los habitantes del sector y facilita la movilidad de personas, productos agropecuarios y demás actividades económicas de la comunidad.

La intervención corresponde al área donde se ejecutará la construcción de una placa huella, la cual presenta la necesidad de adecuación mediante actividades preliminares de desmonte y limpieza, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las etapas constructivas posteriores.

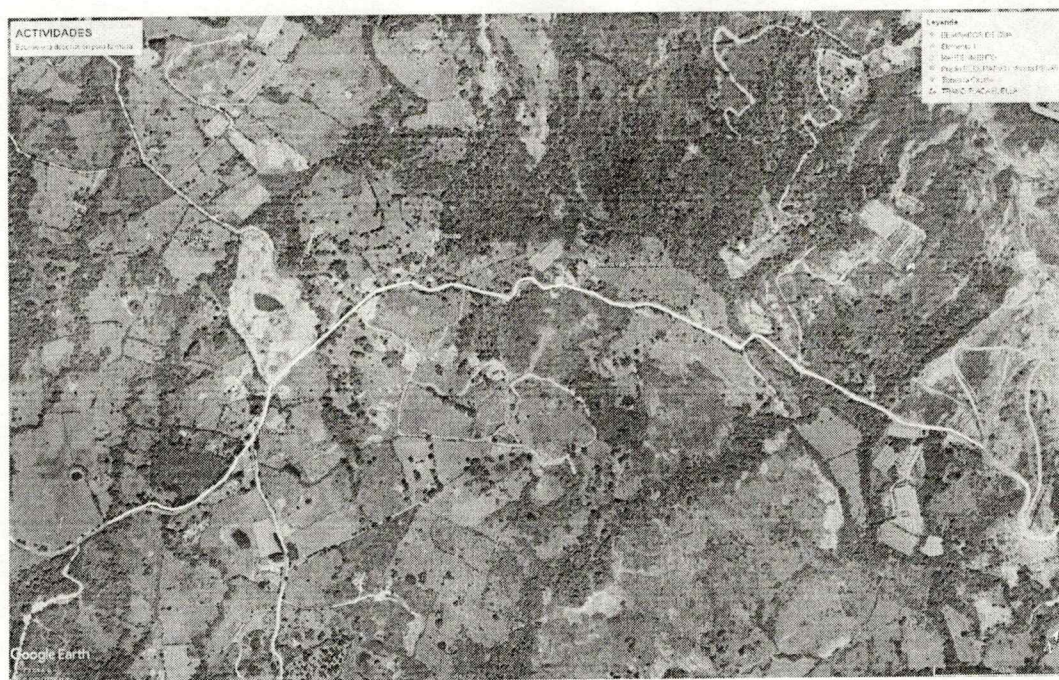

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Documentar las actividades de desmonte y limpiezas ejecutadas en el tramo vial objeto de intervención, como parte del convenio solidario No. MT-CD-CS-003 DE 2026, evidenciando la adecuación del terreno para el inicio de la construcción de la placa huela.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICO

- Describir las actividades de desmonte, limpieza y adecuación inicial realizadas en el área a de intervención
- Verificar que el tramo vial intervenido quede libre de vegetación, material orgánico y demás elementos que puedan afectar el desarrollo de las actividades constructivas.
- Registrar el estado de avance de las labores mediante la descripción técnica y el correspondiente registro fotográfico.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Concepto: Información

Convenio: MT-CD-CS-003 de 2026

Modalidad: Contratación Directa – Convenio Solidario

Contratista: Junta de Acción Comunal Vereda Peñas Bajo

Representante Legal: José Fermín Salinas

Supervisor: Arq. Paula Andrea Vanegas Vargas

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Tinjacá y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Peñas Bajo, con el fin de ejecutar acciones de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial.

Acta de inicio: 05 de junio de 2026

Plazo: Un (1) mes

Fecha de terminación 04 de julio de 2026

Valor: \$9.998.634,87

5. ACTIVIDADES

Como parte de las actividades preliminares del proyecto se desarrollaron las labores de desmonte y limpieza del tramo vial donde se construirá la placa huella, las cuales comprendieron:

Reconocimiento del área de intervención

Previo al inicio de las actividades se realizó un recorrido por el tramo vial objeto de intervención, con el propósito de identificar las condiciones existentes del terreno, la presencia de vegetación, material orgánico y demás elementos que pudieran interferir con la ejecución de la obra. Esta inspección permitió definir el área de trabajo y planificar las actividades preliminares.

Desmonte de vegetación

Se efectuó el retiro de la cobertura vegetal existente dentro del área destinada para la construcción de la placa huella, eliminando maleza, pastos, arbustos y demás vegetación que obstaculizaba la ejecución de las obras.

Estas actividades se realizaron procurando conservar las condiciones del entorno y limitando la intervención únicamente al área requerida para el proyecto.

Limpieza del área

Posteriormente se ejecutó la limpieza general del corredor vial, consistente en la recolección de residuos vegetales, ramas, piedras sueltas, material orgánico y demás elementos presentes sobre la superficie de intervención.

Esta actividad permitió obtener una superficie limpia y despejada para el inicio de las labores de replanteo y construcción.

Disposición del material retirado

El material producto del desmonte y la limpieza fue recolectado y dispuesto en un sitio autorizado o acondicionado para tal fin, evitando su acumulación sobre la vía y garantizando el orden y la seguridad del área de trabajo.


Estado final de la intervención

Una vez concluidas las actividades preliminares, se verificó que el tramo vial quedara libre de vegetación y material orgánico, permitiendo contar con las condiciones técnicas necesarias para dar inicio a las siguientes etapas de construcción de la placa huella.


6. CONCLUSIONES


Las actividades de desmonte y limpieza fueron ejecutadas conforme al objeto del convenio, permitiendo la preparación del terreno para el desarrollo de la construcción de la placa huella.

Con la culminación de estas labores preliminares se garantiza que el tramo intervenido cuenta con las condiciones necesarias para continuar con las actividades programadas dentro del proceso constructivo, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura vial de la Vereda Peñas Bajo.

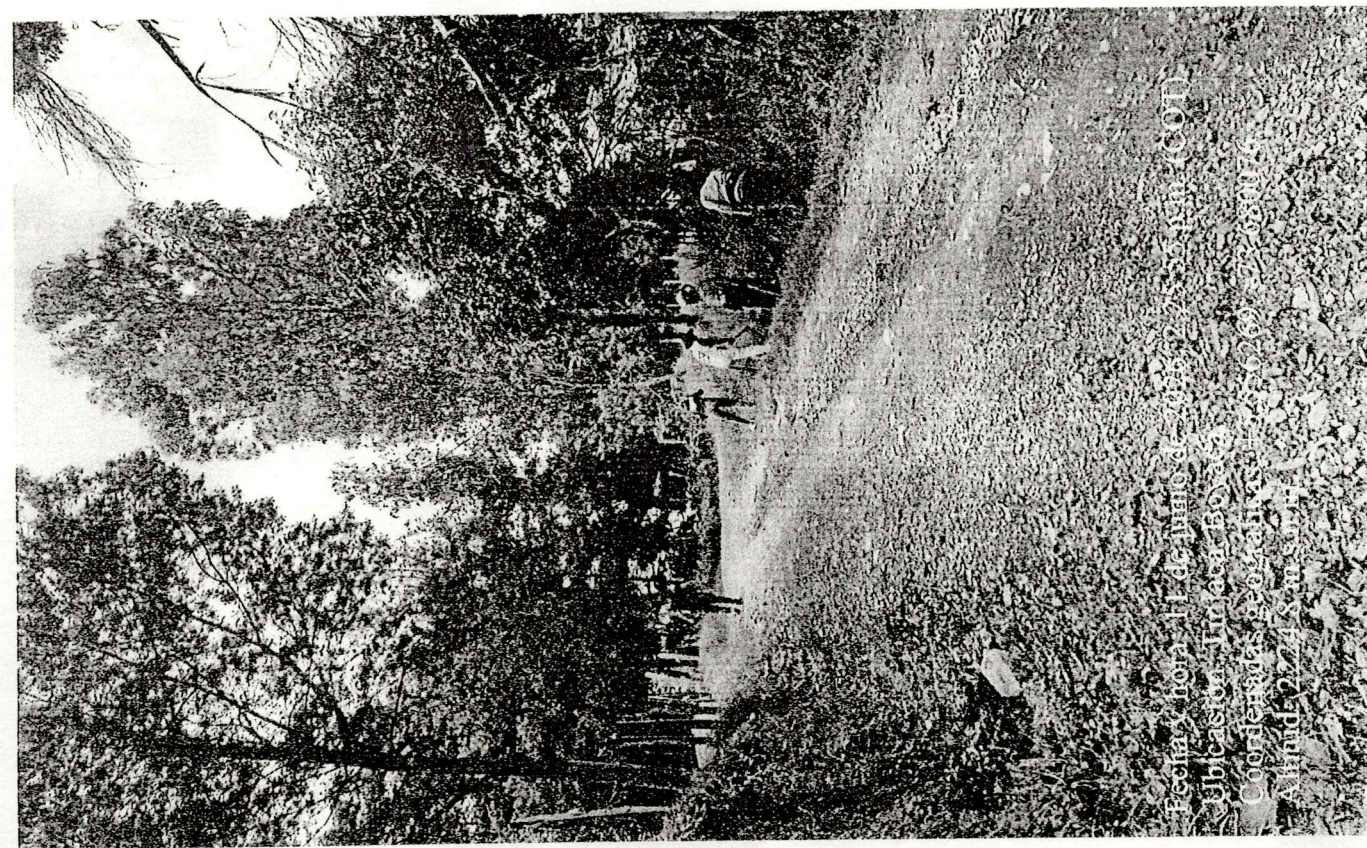


Pechia, zona de cultivo de
 Uricaria, Tingo, 1960
 Coordenadas: 20° 00' S
 78° 00' W

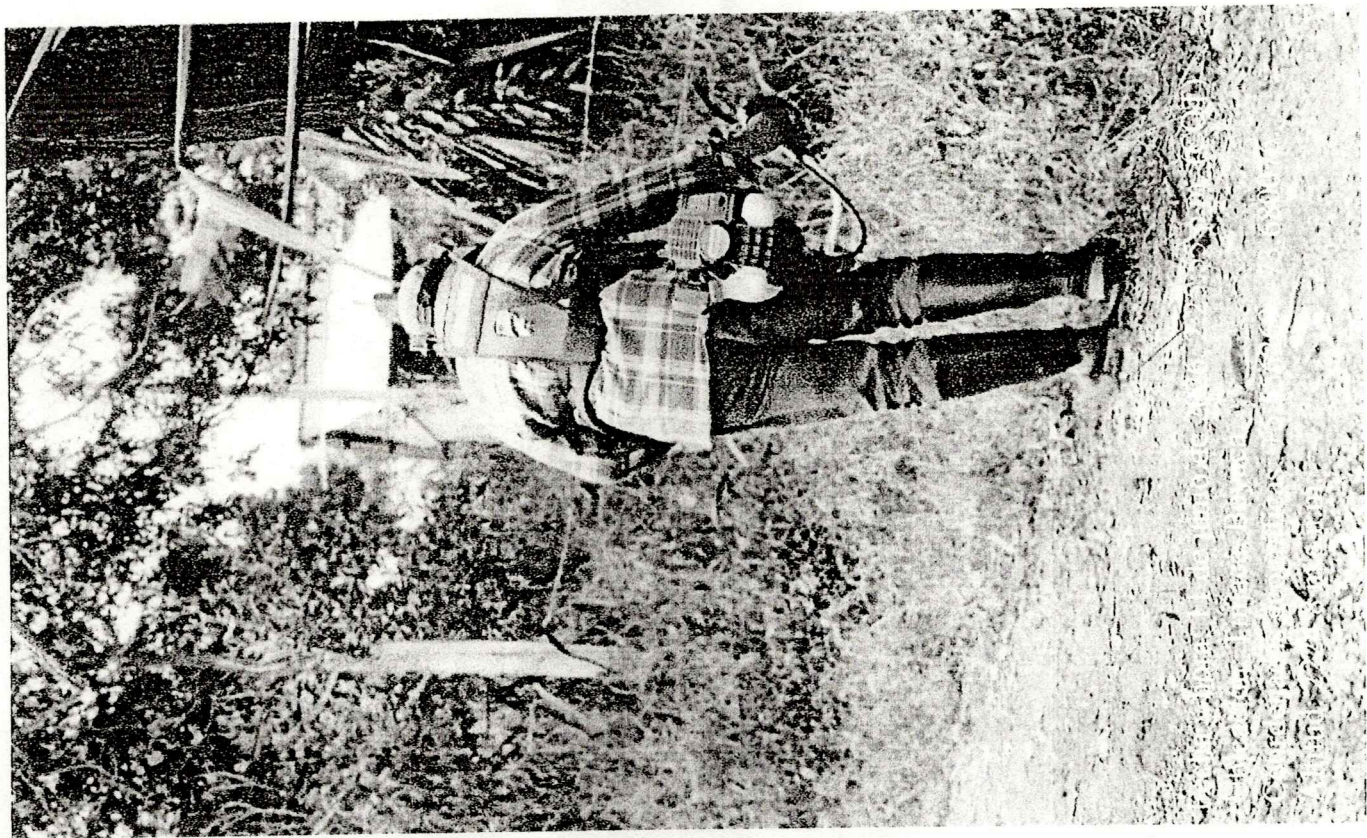


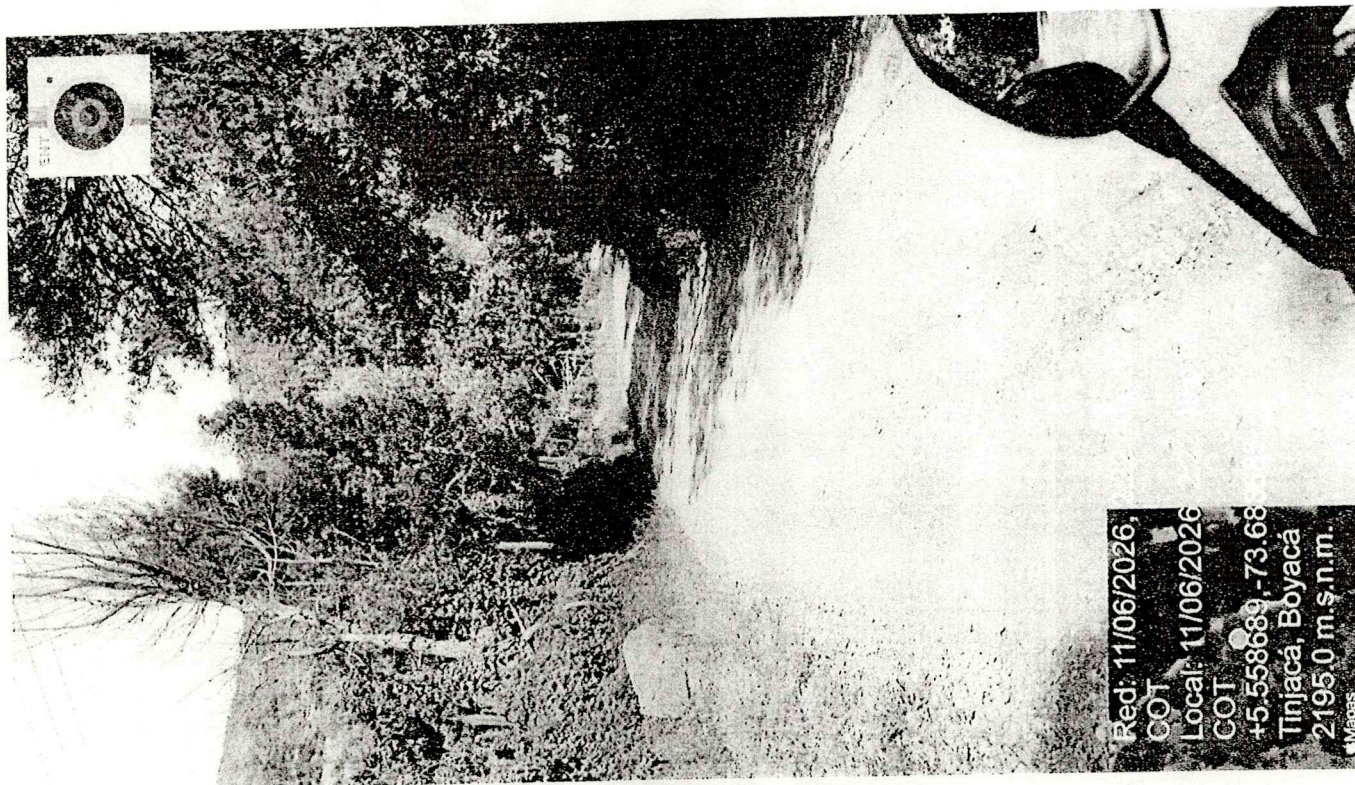

Red: 11/06/2026,
COT
Local: 11/06/2026
COT
+5.558689, -73.68
Tinjacá, Boyacá
2195.0 m.s.n.m.
Mapas

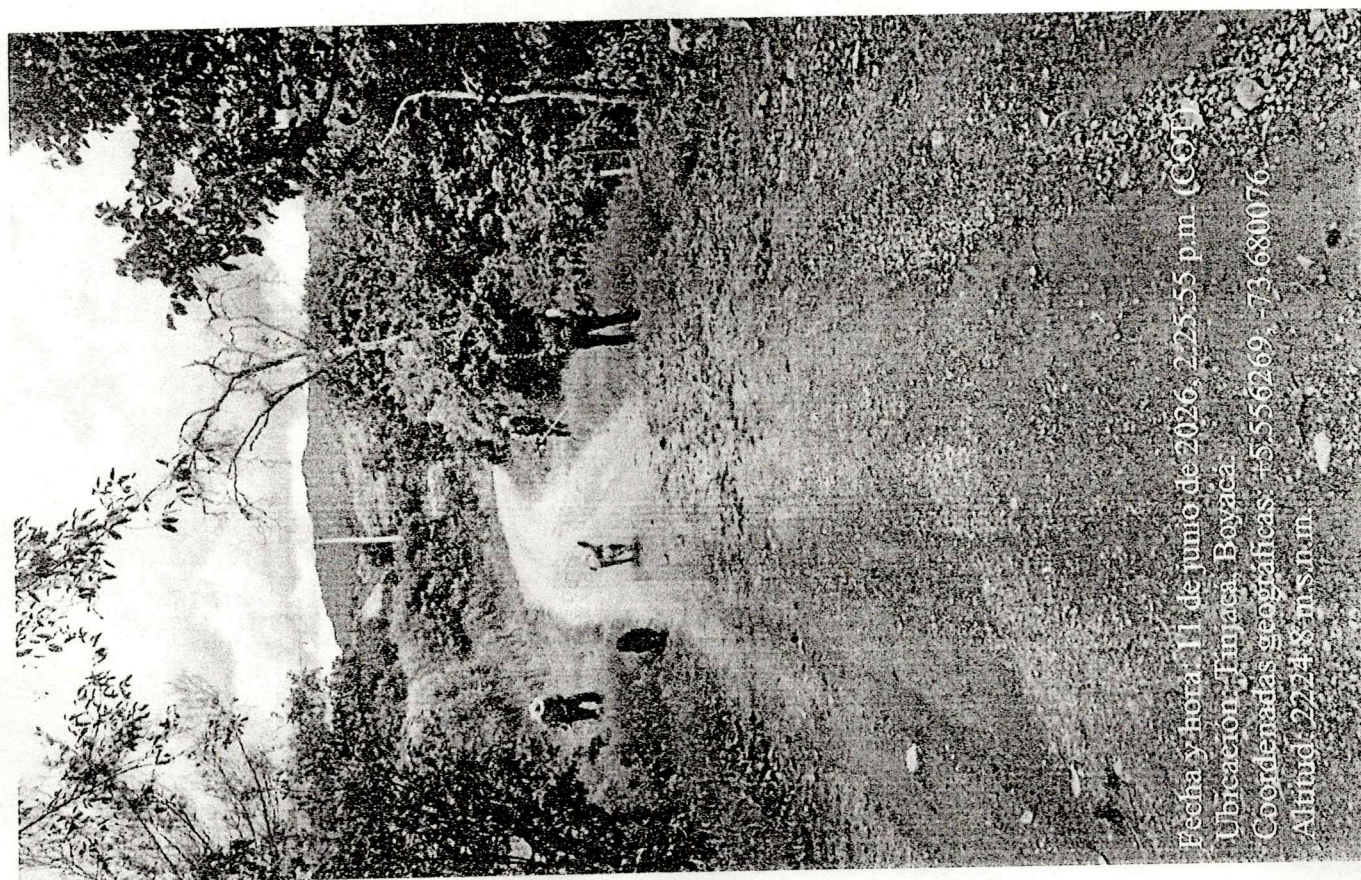

Fecha y hora: 11 de junio de 2026, 2:25:55 p.m. (COT)
Ubicación: Tinjacá, Boyacá
Coordenadas geográficas: +5.556269, -73.680076
Altitud: 2224.8 m.s.n.m.

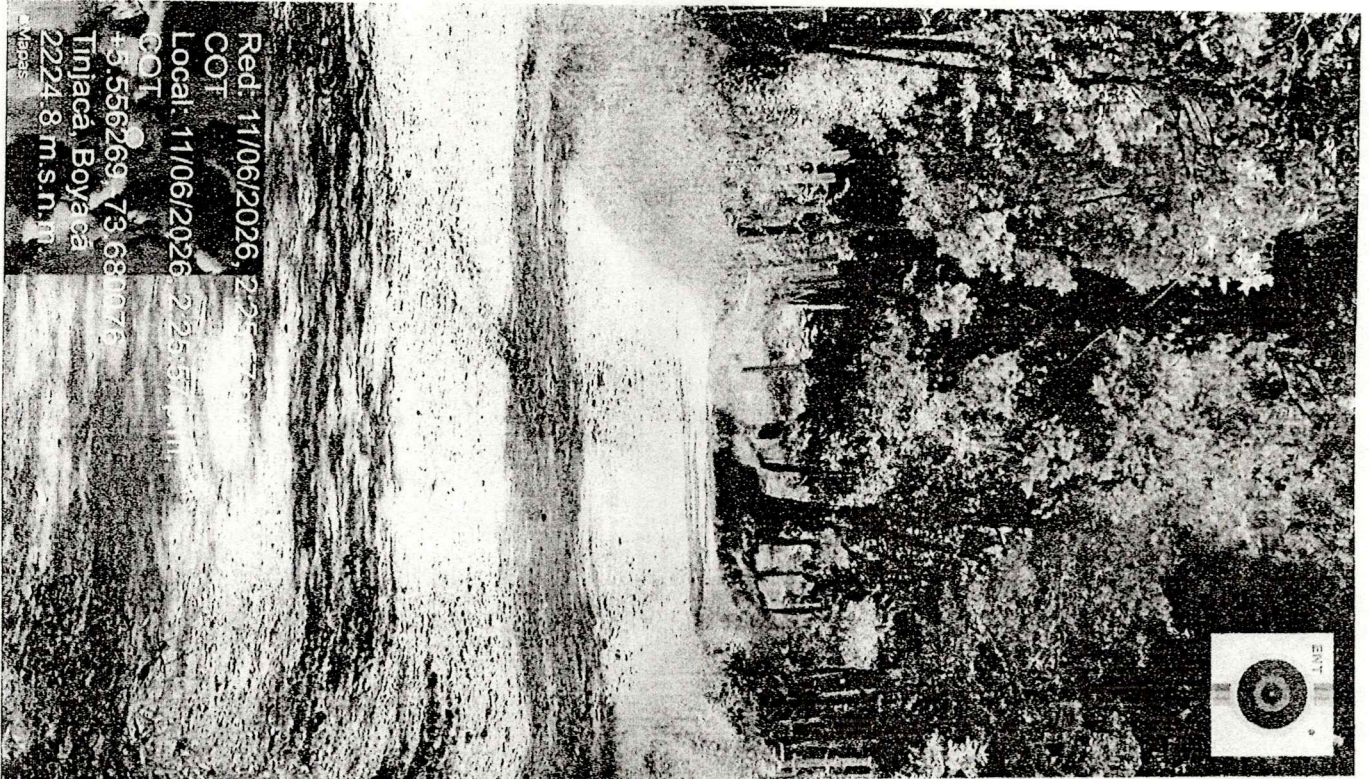

Red: 11/06/2026, 2:25:57 PM
COT
Local: 11/06/2026, 2:25:57 PM
COT
+55 556269 73681076
Tinjaca, Boyaca
22248 m.s.n.m.
A. Vasquez
