


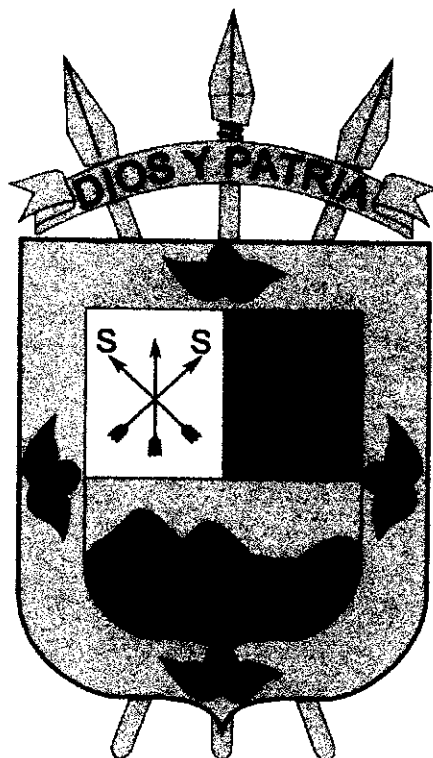

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

ABRIL 2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA


Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060

Teléfono móvil: + 57 317 848 2509

contactenos@laplata-huila.gov.co

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA																			
		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA (H)																			
		CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA																			
		10/04/2026																			
ITEM	DESCRIPCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	PRELIMINARES																				
1.1	Localización y replanteo en planta- zona de trabajos																				
1.2	Desmorte de torres de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado.																				
1.3	Excavación manual sin clasificar - Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.																				
1.4	Relleno en receo seleccionado y compactado mecánicamente.																				
1.5	Cerramiento provisional en lona H=2.1 m, soportado en polines 5x5 cm cada 3 m																				
1.6	Demolición placa de concreto por medios mecánicos.																				
2	CONCRETOS																				
2.1	Solado o concreto de limpieza (eprom= 5 cm) de 2.000 P.S.I.																				
2.2	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2																				
2.3	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2																				
2.4	Construcción de Columnas en Concreto de 210 KG/CM2																				
2.5	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2																				
2.6	Construcción de cuneta en concreto reforzado 3000 psi (Acero en malla electrosoldada D16 15x15)																				
2.7	Placa de concreto de 3000 psi para polideportivo (E=0.15 cm), incluye dilataciones, malla electrosoldada 7 mm, sello de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)																				
3	CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO																				
3.1	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I.																				
3.2	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles troquelados unidos/ancrados lateralmente de una sola pieza en acabado pinto polister estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Incluye todos lo necesario para su correcta instalación.																				
4	ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA																				
4.1	Mortero Impermeabilizado para Viga Canal																				
4.2	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto, incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos																				
5	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS																				
5.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.																				
5.2	Suministro e instalacion de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.																				
5.3	Caja de inspeccion en concreto de F'c=3000 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 0.8 m (Medida interna) incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms (Según diseño) , con espesores de paredes de 15 cm.según diseño																				
5.4	Caja de inspeccion en concreto de F'c=3000 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1.1 m (Medida interna) incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms (Según diseño) , con espesores de paredes de 15 cm.según diseño																				
5.5	Caja de inspeccion en concreto de F'c=3000 PSI, de seccion 1*1 H: 1.27 m (Medida interna) , incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 10 cms (Según diseño) , con espesores de paredes de 15 cm.según diseño																				
6	INSTALACIONES ELECTRICAS																				
6.1	Suministro e instalación de Medidor trifilar y acometida a red E.H. Incluye Legalización																				
6.2	Construcción Camara de inspección B.T tipo BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt																				
6.3	Suministro e instalación Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG																				
6.4	Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos																				
6.5	Suministro e instalación de Luminaria Led High Bay 100W Dim 5700K																				
6.6	Suministro e instalación Tornacorriente doble con polo a tierra																				
6.7	Suministro e instalación Apartallamiento para cubierta																				
7	MAMPOSTERÍA																				
7.1	Muro a la vista en ladrillo alcantara a la vista																				
8	CARPINTERÍA METÁLICA																				
8.1	Cerramiento en malla eslabonada (Incluye angulos laterales, tubería metálica 4" aguas negras y todo lo necesario apra su correcta instalación)																				
8.2	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de salón, baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1.8 x 1.05 m, incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.																				
	PMT																				
	PMA																				
	SST																				
	RETIE - RETILAB																				
	INTERVENTORIA																				


MAURICIO BONILLA TIAFFI
 Ingeniero Civil
 Municipio de La Plata Huila

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA (H)		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA														
FLUJO DE FONDOS		TIEMPO EN MESES														
		PERIODO DE EJECUCIÓN 2026														
		EJECUCIÓN														
		PRE CONTRACTUAL														
		POS CONTRACTUAL														
		LIQUIDACIÓN 2027														
ITEM	DESCRIPCION	W TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	
1	PRELIMINARES	\$ 161,761,079.03				\$ 161,761,079.03										
2	CONCRETOS	\$ 319,874,086.87				\$ 106,624,695.62	\$ 106,624,695.62	\$ 106,624,695.62								
3	ESTRUCTURA METALICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA	\$ 294,108,542.47					\$ 98,036,180.82	\$ 98,036,180.82	\$ 98,036,180.82							
4	ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA	\$ 4,380,024.09								\$ 4,380,024.09						
5	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS	\$ 11,675,848.76							\$ 11,675,848.76							
6	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 48,557,822.30							\$ 24,278,911.15	\$ 24,278,911.15						
7	MAMPOSTERIA	\$ 1,346,111.44							\$ 674,055.72	\$ 674,055.72						
8	CARPINTERIA METALICA	\$ 45,347,887.00							\$ 22,673,943.50	\$ 22,673,943.50						
7	PCIO	\$ 19,096,550.00				\$ 3,619,310.00	\$ 3,619,310.00	\$ 3,619,310.00	\$ 3,619,310.00	\$ 3,619,310.00						
8	RETIE - RETILAB	\$ 7,735,000.00								\$ 7,735,000.00						
	TOTAL COSTOS DE OBRA	\$ 912,884,952.00														
9	INTERVENTORIA	\$ 63,901,946.63				\$ 12,780,389.33	\$ 12,780,389.33	\$ 12,780,389.33	\$ 12,780,389.33	\$ 12,780,389.33						
	TOTAL	\$ 976,786,898.63				\$ 284,785,474.15	\$ 221,060,576.65	\$ 221,060,576.65	\$ 173,738,639.81	\$ 76,141,634.02						


MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil
Municipio de La Plata Huila
