

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N° 2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PASADISTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESERVARIO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZA, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ITEM N°	ACTIVIDAD	UNO	OBSERVACION	LARGO	ANCHO	ALTURA O ESP.	FACTOR	CANT	VOLUMEN	AREA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1.0 PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	ZONA PARQUE MADRE PLASTICA	8	8						\$4,00	
			MEJORA LINDACION									
			ZONA VIA PEATONAL, HELLLAS DE 1,2M SENDERO A SALON COMunal	38,8	2						77,00	
			ZONA VIA PEATONAL, HELLLAS DE 1,0M SENDERO PIEDRA ANCESTRAL	33	1,3						42,90	
			MATERIA 1, AL FRENTE DEL HOGAR DEL CER	32,4	1,185						38,41	
			ENTRADA PRINCIPAL									
			MATERIA 2, SENDERO NORTE	7,48	1,13						8,42	
			SEÑALIZACION PARQUE									
			MATERIA 3, SENDERO OESTE-ESTE	24,27	0,83						20,14	
			MATERIA 4, SENDERO NOROCCIDENTAL	4,28	1,30						5,51	
			MATERIA 5, FRENTE A LA CASA ORIS, ESCUELA	18,27	0,35						6,37	
			MATERIA 6, FRENTE A LOS JUEGOS DE NIÑOS, PARTE INTERIOR	23	0,37						8,51	
			MATERIA 7, FRENTE A PARQUE SENDERO PARTE INTERIOR	15,8	1,3						20,54	
			TRINCHOS GUADUA 1, FRENTE A LA CASA VERDE	12,50	1,6						20,05	
2.0	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO	M2	TRINCHOS GUADUA 2, FRENTE A LA CASA COMunal	8,8	1,8						11,68	
			BANCAS, INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DEL PARQUE SOCIAL	1,2	1			8			8,60	
			PUNTOS ECOLOGICOS									
			INSTALACION AL LADO DE PARQUE SOCIAL, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE Y CERCA AL PARQUE ANCESTRAL	1,8	0,8			2			2,88	
			TOTAL								386,59	
			EXCAVACION PEATONAL PARA HELLLAS DE 1,2M SENDERO PIEDRA ANCESTRAL	7	1,3	0,183					1,75	
				5,8	1,3	0,173					2,67	
				6,18	1,3	0,26					5,93	
				5,8	1,3	0,85					4,90	
				6,8	1,3	0,87					5,21	
			ACEREN PEATONAL, BARRA ENTRADA	1	2	0,260					6,40	
			EXCAVACION PEATONAL PARA HELLLAS DE 1,2M SENDERO A SALON COMunal	3,44	1,5	0,3					1,73	
			EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE D= 18CM DE DIAMETRO	18	0,8	0,4					4,32	
			EXCAVACION PRIMER LOGA HELLLAS Y/O SENDERO ENTRADA PARQUE	4,80	1,5	1,67					12,25	
			SEGUNDA LOGA FRENTE CONSTRUCCION NUEVA	2,3	1,5	0,4					1,38	
			HELLLAS TERCER LOGA FRENTE AL YACUA VERDE	1,2	1,8	0,3					0,56	
				5,23	1,8	0,3					2,51	
				1,2	1,8	0,3					0,56	



OBJETO: CONTRATATA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESERVARIO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZA, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."


A collage of six photographs showing various stages of a construction project. The top row shows a close-up of a concrete foundation being poured or finished, and a view of a building's exterior wall with a window frame. The middle row shows a view of a building's interior with a wooden floor and a wall, and a view of a building's exterior with a wooden roof. The bottom row shows a view of a building's interior with a wooden floor and a wall, and a view of a building's exterior with a wooden roof.



PREACTA N°1 DEL CONTRATO N° 464-2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PARCAÍSTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZA, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ITEM N°	ACTIVIDAD	UNID	OBSERVACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA O ESP.	FACTOR	CANT	VOLUMEN	AREA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
			RETINO PRODUCTO DE EXCAVACION PARA TIERRA PERMANENTE INTERNO CANTON DE LA ESPERANZA	30.5	0.3	0.3					1.63	
			TOTAL (I)								1.63	
			RETINO PRODUCTO DE EXCAVACION PARA TIERRA PERMANENTE INTERNO CANTON DE LA ESPERANZA	20	1.5	0.1					3.00	
			TOTAL (II)								4.32	
			TOTAL (I+II)								7.95	
30	ELABORAR EN CONCRETO PARA PROTECCION DE ZONAS VERDES											
			ANTES DE HELLAS L+1.20M								7.00	
			DESPUES DE HELLAS L+1.20M								4.00	
			HELLAS DESPUES DE PRIMERA LOSA DE L+0.71.20M								8.00	
			DESPUES DE LOSA DE L+0.71.20M								11.00	
			DESPUES DE LOSA DE AREA DE L+1.50M								17.00	
			TOTAL								46.00	
32	HELLAS EN CONCRETO OJO OJO 2500 PSI-21 NIV. ANCHO-40CM L+1.20 E+10CM A NIVEL DEL PISO SOBRE ZONA VERDE PARA PROTECCION DE LA MISMA	UNO										
			HELLAS EN L+1M DE LARGO								60.00	
			TOTAL								60.00	
37	BASES EN CONCRETO PARA INSTALACION DE BANCOS 1.20M L+1.00M E+10CM 2500 PSI-17 MPa	UNO										
			BASES EN CONCRETO								8.00	
			TOTAL								8.00	
38	BASES EN CONCRETO PARA INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS L+1.00M X ANCHO-80 CM E+10CM 2500 PSI-17 MPa	UNO										
			BASES EN CONCRETO PARA PUNTOS ECOLOGICOS								3.00	
			TOTAL								3.00	
310	BASES EN CONCRETO PARA INSTALACION DE ALCOBES EN MAQUINARIA	UNO										
			BASES								11.00	
			TOTAL								11.00	
MA-1	SUBASTRO E INSTALACION DE TIERRA DE DIF. INCLIVE ACCESORIOS	MA										
			Substrato e instalación de tubos y accesorios en 6" zona de huerto que dará al talón coronal								17.00	
			Substrato e instalación de tubos y accesorios en 6" zona de casita, confluencia a trabajo 2								1.00	
			TOTAL								18.00	

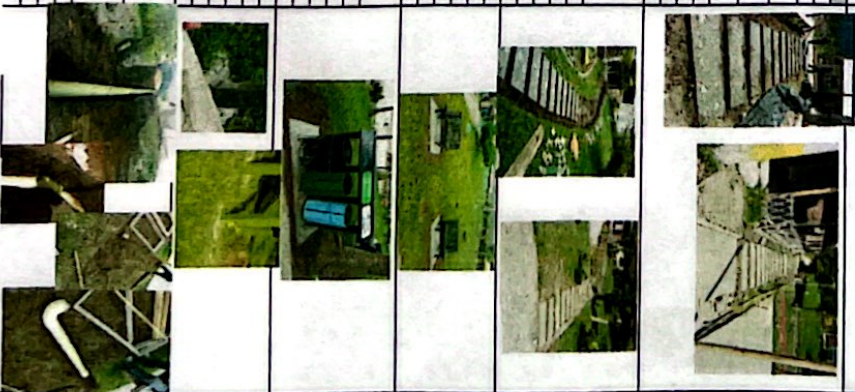

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N° 2116 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PASEATICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESURGIDO INDIGENA PAEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZA, CAUCA", En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ITEM N°	ACTIVIDAD	UNO	OBSERVACION	LARGO	ANCHO	ALTURA O ESP.	FACTOR	CANT.	VOLUMEN	AREA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
M2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSAS Y ANCHOS: 8-9, 10M	M2	Arden Inicial superior 17cm	2	1	0.1	1.17				2.14	
			Los 1	4.03	1.235	0.1					6.09	
			Los 2	1.2	1.8	0.1					1.92	
			Los 3	1.2	1.8	0.1					1.92	
			Los 4	1.18	0.27	0.1					0.31	
			Arden final	0.7	1.1	0.1					0.85	
			TOTAL								14.73	
M3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS y 10M	M3	Cunetas de 3000 psi	30.3							30.30	
			TOTAL								30.30	
4	MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECIKLADO										94.30	
M4	PINTURA CON ESMA. TE EXTERIOR Y MANTENIMIENTO DE MATERIAS	M4	MATERIA 1 Cans superior	32.5	0.23		2				65.00	
			materia 1 cans principal	32.5	0.25						32.50	
			materia 1 cans posterior	32.85	0.31						32.85	
			Viga madera 1	1.1			15				16.18	
			Viga base madera 1	1.27			1				1.27	
			acceso principal al parque	18.18			1				18.18	
			grada 2	8.86			1				8.86	
			grada 3	9.5			1				9.50	
			grada 4	10.08			1				10.08	
			grada 5	10.60			1				10.60	
			grada 6	11.32			1				11.32	
			grada 7	1			6				5.00	
			grada 8	1			6				5.00	
			grada 9	1			6				5.00	
			grada 10	1			6				5.00	
			grada 11	1			6				5.00	
			grada 12	1			6				5.00	
			grada 13	1			6				5.00	
			grada 14	1			6				5.00	
			grada 15	1			6				5.00	
			grada 16	1			6				5.00	
			grada 17	1			6				5.00	
			grada 18	1			6				5.00	
			grada 19	1			6				5.00	
			grada 20	1			6				5.00	
			grada 21	1			6				5.00	
			grada 22	1			6				5.00	
			grada 23	1			6				5.00	
			grada 24	1			6				5.00	
			grada 25	1			6				5.00	
			grada 26	1			6				5.00	
			grada 27	1			6				5.00	
			grada 28	1			6				5.00	
			grada 29	1			6				5.00	
			grada 30	1			6				5.00	
			grada 31	1			6				5.00	
			grada 32	1			6				5.00	
			grada 33	1			6				5.00	
			grada 34	1			6				5.00	
			grada 35	1			6				5.00	
			grada 36	1			6				5.00	
			grada 37	1			6				5.00	
			grada 38	1			6				5.00	
			grada 39	1			6				5.00	
			grada 40	1			6				5.00	
			grada 41	1			6				5.00	
			grada 42	1			6				5.00	
			grada 43	1			6				5.00	
			grada 44	1			6				5.00	
			grada 45	1			6				5.00	
			grada 46	1			6				5.00	
			grada 47	1			6				5.00	
			grada 48	1			6				5.00	
			grada 49	1			6				5.00	
			grada 50	1			6				5.00	
			grada 51	1			6				5.00	
			grada 52	1			6				5.00	
			grada 53	1			6				5.00	
			grada 54	1			6				5.00	
			grada 55	1			6				5.00	
			grada 56	1			6				5.00	
			grada 57	1			6				5.00	
			grada 58	1			6				5.00	
			grada 59	1			6				5.00	
			grada 60	1			6				5.00	
			grada 61	1			6				5.00	
			grada 62	1			6				5.00	
			grada 63	1			6				5.00	
			grada 64	1			6				5.00	
			grada 65	1			6				5.00	
			grada 66	1			6				5.00	
			grada 67	1			6				5.00	
			grada 68	1			6				5.00	
			grada 69	1			6				5.00	
			grada 70	1			6				5.00	
			grada 71	1			6				5.00	
			grada 72	1			6				5.00	
			grada 73	1			6				5.00	
			grada 74	1			6				5.00	
			grada 75	1			6				5.00	
			grada 76	1			6				5.00	
			grada 77	1			6				5.00	
			grada 78	1			6				5.00	
			grada 79	1			6				5.00	
			grada 80	1			6				5.00	
			grada 81	1			6				5.00	
			grada 82	1			6				5.00	
			grada 83	1			6				5.00	
			grada 84	1			6				5.00	
			grada 85	1			6				5.00	
			grada 86	1			6				5.00	
			grada 87	1			6				5.00	
			grada 88	1			6				5.00	
			grada 89	1			6				5.00	
			grada 90	1			6				5.00	
			grada 91	1			6				5.00	
			grada 92	1			6				5.00	
			grada 93	1			6				5.00	
			grada 94	1			6				5.00	
			grada 95	1			6				5.00	
			grada 96	1			6				5.00	
			grada 97	1			6				5.00	
			grada 98	1			6				5.00	
			grada 99	1			6				5.00	
			grada 100	1			6				5.00	
			grada 101	1			6				5.00	
			grada 102	1			6				5.00	
			grada 103	1			6				5.00	
			grada 104	1			6				5.00	
			grada 105	1			6				5.00	
			grada 106	1			6				5.00	
			grada 107	1			6				5.00	
			grada 108	1			6				5.00	
			grada 109	1			6				5.00	
			grada 110	1			6				5.00	
			grada 111	1			6				5.00	
			grada 112	1			6				5.00	
			grada 113	1			6				5.00	
			grada 114	1			6				5.00	
			grada 115	1			6				5.00	
			grada 116	1			6				5.00	
			grada 117	1			6				5.00	
			grada 118	1			6				5.00	
			grada 119	1			6				5.00	
			grada 120	1			6				5.00	
			grada 121	1			6				5.00	
			grada 122	1			6				5.00	
			grada 123	1			6				5.00	
			grada 124	1			6				5.00	
			grada 125	1			6				5.00	
			grada 126	1			6				5.00	
			grada 127	1			6				5.00	
			grada 128	1			6				5.00	
			grada 129	1			6				5.00	
			grada 130	1			6				5.00	
			grada 131	1			6				5.00	
			grada 132	1			6				5.00	
			grada 133	1			6				5.00	
			grada 134	1			6				5.00	
			grada 135	1			6				5.00	
			grada 136	1			6				5.00	
			grada 137	1			6				5.00	
			grada 138	1			6				5.00	
			grada 139	1			6				5.00	
			grada 140	1			6				5.00	
			grada 141	1			6				5.00	
			grada 142	1			6				5.00	
			grada 143	1			6				5.00	
			grada 144	1			6				5.00	
			grada 145	1			6				5.00	
			grada 146	1			6				5.00	
			grada 147	1			6				5.00	
			grada 148	1			6				5.00	
			grada 149	1			6				5.00	
			grada 150	1			6				5.00	
			grada 151	1			6				5.00	
			grada 152	1			6				5.00	
			grada 153	1								

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO #7216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PASADISTO DEL PASEO PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDEAS, MUNICIPIO DE INZA, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

[illegible]



PROYECTO N° 1 DEL CONTRATO N° 484-2022

OBJETO: CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N° 2218 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PASEATICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE MCA, CAUCA". En el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	OBSERVACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA O ESP.	FACTOR	CANT	VOLUMEN	AREA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
8.4	TRINCHOS EN GUADUA PARA CONTENCIÓN DE TALUD	MA	TRINCHO 1 ARRIETA FRENTE A LA CASA VERDE TRINCHO 1 ARRIETA FRENTE A LA CASA VERDE TRINCHO 2 ARRIETA FRENTE AL SALON SOCIAL TRINCHO 2 ARRIETA FRENTE AL SALON SOCIAL TOTAL	12.45 12.4 8.55 8.55 37.95							42.89 11.44 37.95	
8.6.7	INSTALACIÓN DE PUNDO REUTILIZADO DEL PARQUE	M2	Prado entrada del sendero de 1.10 de ancho Prado entrada de los afijos donde van las bancas Prado entrada de los afijos donde van las bancas Prado entrada de los afijos donde van las bancas Prado entrada de la zona de juegos infantiles TOTAL	33 1.3 1.3 1.3 0.5 37.43	1.3 1.1 1.1 1.1 0.5 75.83			8 3 80			42.89 11.44 37.95 4.98 20.09 75.83	
8.6.8	PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALMERAS EXISTENTES, REPLANTACIÓN DE 3 PALMERAS DENTRO DEL PARQUE	GLORIA	Fertilización y mantenimiento de palmeras existentes					1			1.00	

Olga Lucia David Hernandez
OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
CONTINUA



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

MEDIDAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO /CONVENIO Nro. 0494-2022		PLAZO: Dos (02)		INICIACION: 31 DE OCTUBRE DE 2022		ACTA DE SUSPENSIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTONICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."						ACTA DE REINICIO N°01: 8 DE AGOSTO DE 2023	
CONTRATISTA: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ							
INTERVENTOR :JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO							
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		VIGENTES					
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	Localización y Replanteo	M2	570,00	653	372.210	336,59	219.793
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO						
2,1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	M3	38,00	19.154	727.852	86,39	1.654.714
2,2	Suministro de material de préstamo instalación, compactación y nivelación para conformación de relleno	M3	13,00	56.450	733.850	0,00	
2,3	Relleno con material de sitio	M3	1,00	32.010	32.010	7,32	234.313
2,4	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	M3	21,00	25.521	535.941	79,07	2.017.945
3	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES						
3.1	Bordillo o cinta en concreto 3000psi 10x15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	ML	54,00	67.969	3.670.326		0
3,2	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	UND	43,00	58.493	2.515.199	48,00	2.807.664
3,3	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,00 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	UND	50,00	55.879	2.793.950	60,00	3.352.740
3.4	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-17Mpa, Ø60 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	UND	13,00	55.196	717.548	0,00	0
3.5	Losetas en concreto ciclopeo 2500 psi 1.20x1.60m e:10 cm para descansos sendero con pintura acrilica de juego tradicional	M2	6,00	143.108	858.648	0,00	0
3,6	Losa en concreto de 3000 PSI-21Mpa zona de juegos, área= 39 m2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma para instalación de	M2	62,00	123.481	7.655.822	0,00	0
3,7	Bases en concreto para instalación de bancas 1.20M X 1.00 E= 10cm, .2500PSI -17MP	UND	8,00	88.110	704.880	8,00	704.880
3,8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 80 cm, E= 10 cm, .2500PSI -17MP	UND	3,00	87.215	261.645	3,00	261.645
3,9	Suministro e instalación de Acabado de Piso en caucho reciclado granulado espesor 30mm y capa de colores espesor 10 mm	M2	54,00	386.888	20.891.952	0,00	0
3,10	Bases en concreto para instalación de juegos en madera plástica	UND	20,00	33.451	669.020	11,00	367.961
INP-1	Suministro e instalación de tubería de D=6", incluye accesorios	ML		175.967		18,00	3.167.406
INP-2	Concreto de 3000 psi para Rampa, losas y andenes, e=0,10m	M2		151.340		14,73	2.229.238
INP-3	Concreto de 3000 psi para cuneta e=0,10m	ML		111.631		30,30	3.382.419
4	MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLADO						0

CONTRATO /CONVENIO Nro. 0494-2022		PLAZO: Dos (02)		INICIACION: 31 DE OCTUBRE DE 2022		ACTA DE SUSPENSIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTONICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y palsajistico del espacio público en áreas urbanas."						ACTA DE REINICIO N°01: 8 DE AGOSTO DE 2023	
CONTRATISTA: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ							
INTERVENTOR :JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO							
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		VIGENTES					
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
4,1	Suministro e Instalación de Juego Infantil en madera plástica reciclada (según diseño y cotización).	UND	1,00	12.017.662	12.017.662	0,00	0
4,2	Pintura con esmalte para exterior y mantenimiento de materas	ML	170,00	20.776	3.531.920	601,00	12.486.376
4,3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	UND	8,00	589.702	4.717.616	8,00	4.717.616
4,4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	UND	2,00	939.903	1.879.806	3,00	2.819.709
4,5	Suministro e instalación de aviso de información con estructura en madera plástica reciclada	UND	1,00	290.236	290.236		0
INP - 4	Rasqueteo y resanes para enlucimiento de sardineles y materas existentes	ML		35.377		120,20	4.252.315
INP- 5	Complejo Infantil en madera plástica según diseño, incluye transporte	UND		20.335.376		1,00	20.335.376
INP-6	Suministro e instalación de señalética con escritura en lengua y en español	UND		646.421		1,00	646.421
5	MEJORAMIENTO DE VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES						
5,1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos	M2	12,00	117.341	1.408.092	6,00	704.046
5,2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza (reposición)	M2	136,00	22.769	3.096.584		0
5,3	Suministro y siembra de especies ornamentales Altura: (30 -50) cm	UND	267,00	23.700	6.327.900	425,00	10.072.500
5,4	Trinchos de Guadua para contención de talúd	ML	50,00	166.889	8.344.450	37,95	6.333.438
INP-7	Instalación de prado, reutilizado del parque	M2		16.900		78,93	1.333.917
INP-8	Fumigación y mantenimiento de palmeras existentes, reubicación de 3 palmeras dentro del parque	GLOBAL		610.000		1,00	610.000
COSTOS DIRECTOS						84.755.119	84.712.432,00
ADMINISTRACIÓN 20%						16.951.024	16.942.486
IMPREVISTOS 2%						1.695.102	1.694.249
UTILIDAD 5%						4.237.756	4.235.622
AJUSTE POR APROXIMACIÓN						-1	
IVA S/UTILIDAD 19%						805.174	804.768,00
COSTO TOTAL						108.444.174	108.389.557,00
CONTRATISTA: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ		SUPERVISOR: JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO					
firma		firma					

CONTRATO /CONVENIO Nro. 0494-2022		PLAZO: Dos (02)		INICIACION: 31 DE OCTUBRE DE 2022		ACTA DE SUSPENSIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."						ACTA DE REINICIO N°01: 8 DE AGOSTO DE 2023	
CONTRATISTA: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ							
INTERVENTOR :JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO							
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		VIGENTES					
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
4,1	Suministro e Instalación de Juego Infantil en madera plástica reciclada (según diseño y cotización).	UND	1,00	12.017.662	12.017.662	0,00	0
4,2	Pintura con esmalte para exterior y mantenimiento de materas	ML	170,00	20.776	3.531.920	601,00	12.486.376
4,3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	UND	8,00	589.702	4.717.616	8,00	4.717.616
4,4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	UND	2,00	939.903	1.879.806	3,00	2.819.709
4,5	Suministro e instalación de aviso de información con estructura en madera plástica reciclada	UND	1,00	290.236	290.236		0
INP - 4	Rasqueteo y resanes para enlucimiento de sardineles y materas existentes	ML		35.377		120,20	4.252.315
INP- 5	Complejo Infantil en madera plástica según diseño, incluye transporte	UND		20.335.376		1,00	20.335.376
INP-6	Suministro e instalación de señalética con escritura en lengua y en español	UND		646.421		1,00	646.421
5	MEJORAMIENTO DE VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES						
5,1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos	M2	12,00	117.341	1.408.092	6,00	704.046
5,2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza (reposición)	M2	136,00	22.769	3.096.584		0
5,3	Suministro y siembra de especies ornamentales Altura: (30 -50) cm	UND	267,00	23.700	6.327.900	425,00	10.072.500
5,4	Trinchos de Guadua para contención de talúd	ML	50,00	166.889	8.344.450	37,95	6.333.438
INP-7	Instalación de prado, reutilizado del parque	M2		16.900		78,93	1.333.917
INP-8	Fumigación y mantenimiento de palmeras existentes, reubicación de 3 palmeras dentro del parque	GLOBAL		610.000		1,00	610.000
COSTOS DIRECTOS		84.755.119				84.712.432,00	
ADMINISTRACIÓN 20%		16.951.024				16.942.486	
IMPREVISTOS 2%		1.695.102				1.694.249	
UTILIDAD 5%		4.237.756				4.235.622	
AJUSTE POR APROXIMACIÓN		-1					
IVA S/UTILIDAD 19%		805.174				804.768,00	
COSTO TOTAL		108.444.174				108.389.557,00	
CONTRATISTA: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ		SUPERVISOR: JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO					
firma		firma					

MEDIDAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO /CONVENIO Nro. 0494-2022		PLAZO: Dos (02)		INICIACION: 31 DE OCTUBRE DE 2022		ACTA DE SUSPENSIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCION DE UNA OBRA ARQUITECTONICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."						ACTA DE REINICIO N°01: 8 DE AGOSTO DE 2023	
CONTRATISTA: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ							
INTERVENTOR :JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO							
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		VIGENTES					
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	Localización y Replanteo	M2	570,00	653	372.210	336,59	219.793
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO						
2,1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	M3	38,00	19.154	727.852	86,39	1.654.714
2,2	Suministro de material de préstamo instalación, compactación y nivelación para conformación de relleno	M3	13,00	56.450	733.850	0,00	
2,3	Relleno con material de sitio	M3	1,00	32.010	32.010	7,32	234.313
2,4	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	M3	21,00	25.521	535.941	79,07	2.017.945
3	ELEMENTOS EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES						
3.1	Bordillo o cinta en concreto 3000psi 10x15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	ML	54,00	67.969	3.670.326		0
3,2	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	UND	43,00	58.493	2.515.199	48,00	2.807.664
3,3	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-21Mpa, ANCHO= 40 cm x L= 1,00 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	UND	50,00	55.879	2.793.950	60,00	3.352.740
3.4	Huellas en concreto ciclopeo 2500 PSI-17Mpa, Ø60 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	UND	13,00	55.196	717.548	0,00	0
3.5	Losetas en concreto ciclopeo 2500 psi 1.20x1.60m e:10 cm para descansos sendero con pintura acrilica de juego tradicional	M2	6,00	143.108	858.648	0,00	0
3,6	Losa en concreto de 3000 PSI-21Mpa zona de juegos, área= 39 m2 E= 10 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma para instalación de	M2	62,00	123.481	7.655.822	0,00	0
3,7	Bases en concreto para instalación de bancas 1.20M X 1.00 E= 10cm, .2500PSI -17MP	UND	8,00	88.110	704.880	8,00	704.880
3,8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 80 cm, E= 10 cm, .2500PSI -17MP	UND	3,00	87.215	261.645	3,00	261.645
3,9	Suministro e instalación de Acabado de Piso en caucho reciclado granulado espesor 30mm y capa de colores espesor 10 mm	M2	54,00	386.888	20.891.952	0,00	0
3,10	Bases en concreto para instalación de juegos en madera plástica	UND	20,00	33.451	669.020	11,00	367.961
INP-1	Suministro e instalación de tubería de D=6", incluye accesorios	ML		175.967		18,00	3.167.406
INP-2	Concreto de 3000 psi para Rampa, losas y andenes, e=0,10m	M2		151.340		14,73	2.229.238
INP-3	Concreto de 3000 psi para cuneta e=0,10m	ML		111.631		30,30	3.382.419
4	MOBILIARIO URBANO EN MATERIAL RECICLADO						0

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de tubería de D=6", incluye accesorios					Unidad	ml
INP -01						Fecha	
I. EQUIPO							
Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
Herramienta menor	5% M.O.				\$ 300		
Sub-Total						\$	300
II. MATERIALES EN OBRA							
Descripción	% Desperd	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit		
Tubería sanitaria D=6" tipo		tubo	\$ 250.000	0,167	\$ 41.667		
uniones pvc 6"		und	\$ 25.000	0,111	\$ 2.778		
codos 6" de 45°		und	\$ 48.000	0,111	\$ 5.333		
codos 6" de 90°		und	\$ 90.000	0,167	\$ 15.000		
soldadura y limpiador		glob	\$ 70.000	0,056	\$ 3.889		
rejilla		und	\$ 18.000	0,056	\$ 1.000		
Sub-Total						\$	69.667
III. TRANSPORTES							
Material	Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
TRANSPORTE HASTA CALDER			\$ 100.000	1,00	\$ 100.000		
Sub-Total						\$	100.000
IV. MANO DE OBRA							
DESCRIPCIÓN DE LA	Val / Hora	Pnes	Val/H/Pnes	Rendim	Valor/Unit		
CUADRILLA 2	\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	0,70	\$ 6.000		
Sub-Total						\$	6.000
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				% Máximo	Valor Total		
Administración				0,00%	\$ -		
Imprevistos				0,00%	\$ -		
Utilidades				0,00%	\$ -		
Sub-Total						\$	-

Olga Lucia David H
OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista


Valor del Unitario \$ 175.967

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	Concreto de 3000 psi para Rampa, losas y andenes, e=0,10m				Unidad	m2
INP -02					Fecha	
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
Herramienta menor	5% M.O.				\$ 1.250	
mezcladora	und	0,33	\$ 60.000	0,333	\$ 20.000	
Sub-Total					\$	21.250
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	% Desperd	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit	
concreto de 3000 psi	0,05	m3	\$ 567.264	0,10	\$ 85.090	
formaleta	0	global	\$ 5.000	1	\$ 5.000	
Sub-Total					\$	90.090
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
acarreo interno de la obra			\$ 15.000	1,00	\$ 15.000	
Sub-Total					\$	15.000
IV. MANO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE LA	Val / Hora	Pnes	Val/H/Pnes	Rendim	Valor/Unit	
CUADRILLA 2	\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	0,82	\$ 25.000	
Sub-Total					\$	25.000
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				% Máximo	Valor Total	
Administración				0,00%	\$ -	
Imprevistos				0,00%	\$ -	
Utilidades				0,00%	\$ -	
Sub-Total					\$	

Valor del Unitario \$ 151.340


OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
 Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	Concreto de 3000 psi para cuneta e=0,10m				Unidad	ml
INP -03					Fecha	
I. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Rendimiento	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
Herramienta menor	5% M.O.				\$ 1.250	
mezcladora	und	0,333	\$ 60.000	0,333	\$ 20.000	
Sub-Total						\$ 21.250
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	% Desperd	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit	
concreto de 3000 psi	0,05	m3	\$ 567.264	0,03	\$ 45.381	
formaleta	0	global	\$ 5.000	1	\$ 5.000	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
Sub-Total						\$ 50.381
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
acarreo interno de la obra			\$ 15.000	1,00	\$ 15.000	
Sub-Total						\$ 15.000
IV. MANO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE LA	Val / Hora	Pnes	Val/H/Pnes	Rendim	Valor/Unit	
CUADRILLA 2	\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	0,82	\$ 25.000	
Sub-Total						\$ 25.000
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				% Máximo	Valor Total	
Administración				0,00%	\$ -	
Imprevistos				0,00%	\$ -	
Utilidades				0,00%	\$ -	
Sub-Total						\$ -


OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista

Valor del Unitario \$ 111.631

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	RASQUETEY, Y RESANE PARA EL ENLUCIMIENTO DE					Unidad	ml
INP-04	SARDINELES - MATERAS EXISTENTES.					Fecha	
I. EQUIPO							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
Herramienta menor						\$ 1.097	
Sub-Total						\$ 1.097	
II. MATERIALES EN OBRA							
Descripción		Desperdicio	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit	
Mortero 1:2 con un espesor de 2 cm promedio, para resanes y sellado de grietas		10%	M3	\$ 587.264	0,020	\$ 12.333	
Sub-Total						\$ 12.333	
III. TRANSPORTES							
Material		Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
Sub-Total						\$ -	
IV. MANO DE OBRA							
Trabajador	Cant Hom	Val / hora	Pnes	Val/D/Pnes	Rendimi	Valor/Unit	
CUADRILLA 2 para rasqueteo y		\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	0,72	\$ 21.947	
Sub-Total						\$ 21.947	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción					% Máximo	Valor Total	
Administración					0,00%	\$ -	
Imprevistos					0,00%	\$ -	
Utilidades					0,00%	\$ -	
Sub-Total						\$ -	

Olga Lucía David H
OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista

Valor del Unitario **\$ 35.377**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	COMPLEJO INFANTIL EN MADERA PLÁSTICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TRANSPORTE					Unidad	und
INP -05						Fecha	
I. EQUIPO							
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
Herramienta menor					\$ 91.208		
compresor					\$ 10.000		
caladora							
Sub-Total						\$	101.208
MATERIALES EN OBRA							
Descripción	iva	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit		
COMPLEJO INFANTIL CON 2	\$ 2.660.000	und	\$ 14.000.000	1	\$ 16.660.000		
					\$ -		
					\$ -		
Sub-Total						\$	16.660.000
III. TRANSPORTES							
Material	Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
TRANSPORTE HASTA CALDERA			\$ 1.750.000	1,00	\$ 1.750.000		
Sub-Total						\$	1.750.000
IV. MANO DE OBRA							
Trabajador	Cant Hom	Val / hora	Pnes	Val/D/Pnes	Rendimi	Valor/Unit	
CUADRILLA 2		\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	60,00	\$ 1.824.168	
Sub-Total						\$	1.824.168
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				% Máximo	Valor Total		
Administración				0,00%	\$ -		
Imprevistos				0,00%	\$ -		
Utilidades				0,00%	\$ -		
Sub-Total						\$	-

Olga Lucia David Hernández
OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
 Contratista

Valor del Unitario	\$ 20.335.376
--------------------	---------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	Suministro e instalación de señalética con escritura en lengua y en español					Unidad	und
INP -06						Fecha	
I. EQUIPO							
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
Herramienta menor					\$ 1.364		
Sub-Total						\$	1.364
II. MATERIALES EN OBRA							
Descripción	iva	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit		
Señalética en lengua y en español	\$ 79.800	und	\$ 420.000	1	\$ 499.800		
bases en concreto para fijación	\$ -	und	\$ 33.451	2	\$ 66.902		
					\$ -		
Sub-Total						\$	566.702
III. TRANSPORTES							
Material	Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
transporte al sitio	und			1,00	\$ 50.000		
Sub-Total						\$	50.000
IV. MANO DE OBRA							
Trabajador	Cant Hom	Val / hora	Pnes	Val/D/Pnes	Rendimi	Valor/Unit	
CUADRILLA 2		\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	0,93	\$ 28.355	
Sub-Total						\$	28.355
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				% Máximo	Valor Total		
Administración				0,00%	\$ -		
Imprevistos				0,00%	\$ -		
Utilidades				0,00%	\$ -		
Sub-Total						\$	-

Olga Lucia David H.
OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista

Valor del Unitario	\$ 646.421
--------------------	------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE PRADO, REUTILIZADO DEL PARQUE					Unidad	M2
INP-7						Fecha	
I. EQUIPO							
Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
Herramienta menor					\$ 500		
					Sub-Total	\$ 500	
II. MATERIALES EN OBRA							
Descripción	% Desperd	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit		
Prado gateadora tipo		m2	\$ -	1,00	\$ -		
					Sub-Total	\$ -	
III. TRANSPORTES							
Material	Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit		
acarreo internos		m2	\$ 6.400	1,00	\$ 6.400		
					Sub-Total	\$ 6.400	
IV. MANO DE OBRA							
Trabajador	Cant Hom	Val / Hora	Pnes	Val/H/Pnes	Rendimi	Valor/Unit	
CUADRILLA 2		\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	0,50	\$ 10.000	
					Sub-Total	\$ 10.000	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				% Máximo	Valor Total		
Administración				0,00%	\$ -		
Imprevistos				0,00%	\$ -		
Utilidades				0,00%	\$ -		
					Sub-Total	\$ -	

Valor del Unitario	\$ 16.900
---------------------------	------------------

Olga Lucia David H.
OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
 Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONTRATO N°0494 DE 2022

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL SUBPROYECTO N°2216 DENOMINADO "MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CALDERAS, MUNICIPIO DE INZÁ, CAUCA" en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas."

ACTIVIDAD	FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PALMERAS EXISTENTES, REHUBICACIÓN 3 PALMERAS DENTRO DEL PARQUE.					Unidad	GLOBAL
INP-8						Fecha	
I. EQUIPO							
Descripción		Marca	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
Herramienta menor						\$ 10.000	
Sub-Total						\$ 10.000	
MATERIALES EN OBRA							
Descripción		% Desperd	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor/Unit	
Cal, fertilizantes, fungicidas, etc			m2	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000	
Sub-Total						\$ 250.000	
III. TRANSPORTES							
Material		Vol-peso	Tipo	Tarifa	Cantidad	Valor/Unit	
acarreo internos			global	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000	
Sub-Total						\$ 150.000	
IV. MANO DE OBRA							
Trabajador	Cant Hom	Val / Hora	Pnes	Val/H/Pnes	Rendimi	Valor/Unit	
CUADRILLA 2		\$ 16.042	89,52%	\$ 30.403	6,58	\$ 200.000	
Sub-Total						\$ 200.000	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción					% Máximo	Valor Total	
Administración					0,00%	\$ -	
Imprevistos					0,00%	\$ -	
Utilidades					0,00%	\$ -	
Sub-Total						\$	

Olga Lucía David Hernández
OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista

Valor del Unitario \$ 610.000



Juan Carlos Amezcuita Londoño <jamezcuita@crc.gov.co>

Fwd: Solicitud de reasignacion de supervisiones Contratos 494-449

2 mensajes

CELIO URRESTY MESA <subdirectordefensapatrimonio@crc.gov.co>
Para: Juan Carlos Amezcuita Londoño <jamezcuita@crc.gov.co>

5 de julio de 2023, 12:01

Buenos dias

Ing este fue el correo que se envio a juridica . se relacionan sólo dos convenios.

Atentamente,

CELIO URRESTY MESA.
SUBDIRECTOR DEFENSA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL.



----- Forwarded message -----

De: **CELIO URRESTY MESA** <subdirectordefensapatrimonio@crc.gov.co>
Date: vie, 19 may 2023 a las 16:50
Subject: Solicitud de reasignacion de supervisiones Contratos 494-449
To: SANDRA LILIANA AGREDO CARLOSAMA <slagredo@crc.gov.co>

Buenas tardes

Muy comedidamente solicito su amable colaboración para que sean reasignados los siguientes contratos al Administrador Agropecuario Juan Carlos Amezcuita Londoño, como nuevo responsable del proyecto 23056 "Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano".

Contrato 494 de 2022 Calderas Inza
Convenio 449 de 2022 CRC- Municipio de Santa Rosa

Atentamente,

CELIO URRESTY MESA.
SUBDIRECTOR DEFENSA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL.

Muy comedidamente solicito su amable colaboración para que sean reasignados los siguientes contratos al Administrador Agropecuario Juan Carlos Amezcua Londoño, como nuevo responsable del proyecto 23056 "Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano".

Contrato 494 de 2022 Calderas Inza
Convenio 449 de 2022 CRC- Municipio de Santa Rosa

Atentamente,

CELIO URRESTY MESA.
SUBDIRECTOR DEFENSA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL.



Declinacion de Responsabilidad: [click aquí](#)
