

EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Contrato de obra N° 1074 de 2019

OBJETO:

ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS

INFORME DE CONSTRUCCIÓN N° 2

PERÍODO DEL INFORME:

23 de noviembre – 13 de diciembre de 2019
18 de febrero – 20 de marzo de 2020

CONSTRUCTOR:

EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

20 de marzo de 2020
Neiva – Huila

EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

TABLA DE CONTENIDO

1	INFORMACIÓN GENERAL
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
	2.1 Localización General
	2.2 Características técnicas del proyecto
3	OBRA ORIGINALMENTE PACTADA Y VALOR
4	DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5	CONTROL DE CALIDAD
6	CONCLUSIONES
7	MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
8	DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA:	1074 DE 2019
OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE Y PINTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES Y VARIOS.
VALOR INICIAL:	\$301'313.935,00
VALOR ADICIONAL:	\$34'614.375,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$335'928310,00
CONTRATISTA:	Ingeniera Civil EDELMIRA VARÓN CORONADO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) meses calendario.
PLAZO ADICIONAL:	Un (1) mes calendario.
PLAZO ACTUAL:	Cinco (5) meses calendario
ACTA DE INICIACIÓN:	30 de septiembre de 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN:	13 de diciembre de 2019
ACTA DE REINICIO:	18 de febrero de 2020
SUPERVISOR:	Dr. GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
APOYO TÉCNICO SUPERV:	Ing. OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El Proyecto está localizado en la comuna 7 de la ciudad de Neiva en el Barrio Jorge Eliecer Gaitán en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Principal en la carrera 24 con calle 4.

El clima del municipio de Neiva se clasifica como caliente con variaciones entre 22 y 39 grados centígrados.

2.2 Características Técnicas del Proyecto.

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Obras integrales de adecuación y mantenimiento de la edificación consistentes en reparaciones y pintura de muros interiores y exteriores, reparación de carpintería y estructuras metálicas incluyendo pintura, reposición parcial de cubiertas, instalaciones hidráulicas y sanitarias con reposición de aparatos. Se incluyen obras de reparaciones y reforzamientos estructurales de muros incluyendo mampostería: muros nuevos y pañetes. También están incluidas obras exteriores de limpieza y paisajismo.

3. OBRA ORIGINALMENTE PACTADA Y MODIFICACIONES

Las condiciones de cantidades y precios originalmente pactadas en el contrato principal son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	Desmante de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	UN	11,00	12.500,00	137.500,00
1.4	Demolición concreto reforzados, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado	M3	0,88	245.000,00	215.600,00
1.7	Demolición de enchape y revoque sobre muro, Incluye retiro de escombros.	M2	36,30	8.500,00	308.550,00
1.8	Desmante de cubierta existente sin estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera	M2	872,20	8.100,00	7.064.820,00
1.12	Demolición muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros	M2	207,40	13.200,00	2.737.680,00
1.13	Demolición de placa pisos concreto hasta 20 cm, incluye retiro.	M2	6,25	24.100,00	150.625,00
1.14	Cerramiento provisional en tela Verde H : 2.00 mts aprox., Incluye madera, anclaje en caneca.	ML	40,00	20.000,00	800.000,00
1.22	Corte de Concreto en piso con disco diamantado	ML	48,00	2.500,00	120.000,00
1.27	Demolición de pisos existentes con alistado, incluye retiro a sitio autorizado	M2	107,20	14.900,00	1.597.280,00
1.29	Demolición de pañete mal estado sobre muro, Incluye retiro de escombros.	M2	210,00	8.200,00	1.722.000,00
1.41	Retiro de escombros por viaje de 6 m3. Incluye cargue maquinaria pesada cargador o similar a volqueta de 6 m3+retiro y disposición final a sitio autorizado por el municipio.	UND	1,00	130.500,00	130.500,00
1.45	Desmante de cubierta existente con estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera.	M2	220,00	10.500,00	2.310.000,00
3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

3.1	Suministro e instalación de llave de paso para control de ½" incluye accesorios y tapa pvc.	UN	1,00	37.500,00	37.500,00
3.2	Suministro e instalación de llave terminal de ½" incluye accesorios.	UN	5,00	22.000,00	110.000,00
3.5	Suministro e instalación de tubería de pvc de 6" RDE 21 presión. Incluye accesorios y pintura en alumol.	UN	12,00	74.500,00	894.000,00
3.8	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 2" .Incluye accesorios.	UN	3,00	44.200,00	132.600,00
3.27	Desmonte monte de tanque de aguas existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	6,00	23.100,00	138.600,00
3.30	Suministro e instalación de Punto agua fría PVC ½". Incluye accesorios y red funcionando.	UN	5,00	31.400,00	157.000,00
4	MAMPOSTERÍA				
4.1	Suministro e instalación de mampostería en tolete común. Incluye limpieza ladrillo.	M2	21,05	45.100,00	949.355,00
4.8	Pañete 1:4 Impermeabilizados en zona de ducha y fachada. Incluye filos, carteras y dilataciones.	M2	200,00	19.700,00	3.940.000,00
4.10	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.	M2	798,00	16.500,00	13.167.000,00
4.11	Remate sobre Muros viga alfajía, en concreto 2500 PSI ancho 0.25 a 0.4 m afinado, con gotero. Incluye 3No3 e:	ML	18,70	34.200,00	639.540,00
4.20	Mesón cocina en granito pulido en concreto reforzado. Ver detalle (Parrilla en varilla 3/8" cada 15 cm. En ambos sentidos).	ML	9,20	139.000,00	1.278.800,00
4.23	Suministro e instalación de bloque ladrillo hueco No. 4 cara Rayada, incluye mortero de pega, andamios.	M2	199,10	28.600,00	5.694.260,00
7	ESTRUCTURAS				
7.9	Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentación, columna, vigas aéreas, zapatas, placas etc.	KG	350,00	3.050,00	1.067.500,00
7.12	Suministro y construcción placa maciza e=.07 concreto 3000 psi. Incluye formaleta.	M2	3,00	75.300,00	225.900,00
7.17	Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos no estructurales.	M3	3,00	498.000,00	1.494.000,00
8	CUBIERTAS				
8.5	Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. Incluye pintura y anticorrosivo.	ML	524,00	24.500,00	12.838.000,00
8.7	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	ML	82,00	16.100,00	1.320.200,00
8.9	Suministro e instalación de Correa en perfil metálicos estructurales de 10 x 4 cal.18 de acuerdo a medidas del fabrican	ML	105,00	21.700,00	2.278.500,00
8,21	Suministro e instalación de caballete en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	ML	84,80	16.100,00	1.365.280,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

8.26	Suministro e instalación cubierta metálica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	1.092,20	47.600,00	51.988.720,00
9	CIELOS RASOS				
9.3	suministro e instalación Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estructura de soporte.	M2	666,46	40.500,00	26.991.630,00
10	IMPERMEABILIZACIONES				
10.2	Suministro e instalación Manto Foil de Aluminio FL 100, Pintado con Alumol Desarrollo L=.90 MTS, sobre muros.	ML	100,00	28.300,00	2.830.000,00
11	PISOS				
11.10	Suministro de guardaescoba altura 10 cm, incluye fragüe.	ML	40,00	11.500,00	460.000,00
11.13	Suministro y construcción de alizado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	M2	107,20	17.600,00	1.886.720,00
12	ENCHAPES				
12.5	Suministro e instalación de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluye bocel	M2	110,20	39.200,00	4.319.840,00
12.6	Suministro e instalación de cerámica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. Incluye bocel y fragüe.	M2	55,26	43.100,00	2.381.706,00
12.8	Suministro de Pintura Esmalte certificada NTC para zócalos, muros, ladrillo a la vista, incluye resane con masilla.	M2	371,48	10.900,00	4.049.132,00
12.10	Suministro e instalación de enchape con cerámica color cualquier formato para muros Zócalo, incluye bocel.	M2	48,36	33.600,00	1.624.896,00
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.4	Suministro e insta. Marco y Puerta lámina C.20 (1.00-0.90*2.20), para acceso principal. Incluye chapa seguridad y antic	UN	1,00	190.000,00	190.000,00
14.7	Suministro e instalación de Ventana en lámina C.20. Incluye alfajía metálica y anticorrosivo con reja en tubo ¾" cuadrado.	M2	4,50	149.800,00	674.100,00
14.24	Suministro e instalación puertas, divisiones baños, división orinal en acero inoxidable entaborado doble lamina, incluye estructura, puerta, anclaje piso y pared, pasadores.	M2	9,00	576.000,00	5.184.000,00
15	PINTURA				
15.1	Suministro y aplicación de estuco sobre muros, Incluye resane pañetes.	M2	25,80	5.800,00	149.640,00
15.2	Curado y arreglo de humedades en muros, incluye todo lo necesario para su correcta función.	M2	72,80	9.300,00	677.040,00
15.4	Suministro e instalación de pintura epóxica para muros, piso en concreto, incluye todo lo necesario para su terminado.	M2	213,15	24.300,00	5.179.545,00
15.8	Pintura esmalte certificada NTC correas, columnas, cerchas metálicas en la estructura de cubierta. Incluye limpieza	ML	741,90	6.900,00	5.119.110,00
15.24	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros interiores y cielo rasos incluye. Resane Masilla acrílica.	M2	1.541,30	10.900,00	16.800.170,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

15.25	Suministro y aplicación de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas, ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	M2	374,42	11.700,00	4.380.714,00
15.26	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrílica o plástica.	M2	2.828,65	12.300,00	34.792.395,00
16	APARATOS SANITARIOS				
16.1	Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios.	UN	5,00	150.500,00	752.500,00
16.4	Suministro e instalación de Lavamanos especial sobreponer. Incluye grifería y accesorios de instalación.	UN	1,00	179.000,00	179.000,00
17	OBRAS EXTERIORES Y CANALIZACIONES				
17.14	Suministro y limpieza mediante rocería y retiro de material vegetal.	M2	200,00	2.100,00	420.000,00
18	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				
18.5	Limpieza de la red de aguas lluvias y residuales, incluye retiro de basuras con disposición final a sitio autorizada.	ML	150,00	3.800,00	570.000,00
18.7	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 2" Incluye accesorios.	ML	12,00	14.400,00	172.800,00
18.9	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño	UN	1,00	289.000,00	289.000,00
26	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
26.16	suministro e instalación luminaria LED de 9W incluye cable encauchetado 3x12 AWG	UN	1,00	35.700,00	35.700,00
26.20	Suministro e instalación de Salida toma GFCI. 20 A	UN	3,00	84.700,00	254.100,00
26.86	Suministro e instalación de línea a tierra con varilla de cobre 70micras 5/8"x2.44m con alambre de cobre	UN	1,00	77.900,00	77.900,00
26.91	Acometida en cable 3x12AWG. Incluye cable tubo EMT ¾" y accesorios.	ML	100,00	14.800,00	1.480.000,00
26.100	Desmante de red eléctrica existente, tomas, lámparas, interruptores mal estado.	UN	1,00	732.000,00	732.000,00
26.102	Punto eléctrico para toma doble Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de ½" y accesorios.	UN	5,00	84.100,00	420.500,00
26.103	Punto eléctrico iluminación. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de ½" y accesorios.	UN	1,00	70.300,00	70.300,00
26.104	Punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT ½" y accesorios	UN	1,00	75.400,00	75.400,00
26.109	Suministro e instalación tablero monofásico de 6 circuitos incluye 6 breaker enchufable 1x20A.	UN	1,00	484.000,00	484.000,00
26.116	suministro e instalación lámpara hermética 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	UN	3,00	112.000,00	336.000,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

	SUBTOTAL				\$ 241.051.148
	ADMINISTRACIÓN	%	18,00%		\$ 43.389.207
	IMPREVISTOS	%	2,00%		\$ 4.821.023
	UTILIDADES	%	5,00%		\$ 12.052.557
	VALOR TOTAL				\$ 301.313.935

Modificación 1:

El 5 de diciembre de 2019 se firma el OTROSI 1 que adiciona plazo y valor al contrato con la inclusión de ítems no previstos al capítulo de INSTALACIONES ELÉCTRICAS a partir de las siguientes consideraciones:

Al realizar el desmonte de cubierta y cielo raso para su reposición se encontró que las instalaciones eléctricas existentes son conexiones inseguras con cable dúplex y cuando existen tuberías para las redes, están en material PVC completamente cristalizadas por el tiempo y las temperaturas, constituyendo un riesgo eléctrico inminente el cual debe subsanarse por lo menos en las áreas donde se va a instalar cielo raso.

Como la concepción inicial del proyecto fue la de adecuar las instalaciones eléctricas de la cocina por las demoliciones que se proyectaron para ella, las otras áreas a intervenir quedaron sin ninguna modificación respecto de instalaciones eléctricas porque no se evidenció su necesidad.

Luego de hacer un estudio para adecuar las áreas a intervenir de manera que sean seguras para la Institución y buscando en lo posible el menor costo de las mismas, en conjunto con la Arquitecta Apoyo de la Supervisión y el Ingeniero Electricista de la Alcaldía a determinar la necesidad de adicionar los siguientes ítems.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
27	ÍTEMS NO PREVISTOS				
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
27.1	Sub acometida trifásica para portería. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 + 1X12 AWG HFFR	ML	36,00	38.000,00	1.368.000,00
27.2	Sub acometida parcial trifásica subterránea. Incluye tubería PVC de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.	ML	15,00	46.000,00	690.000,00
27.3	Sub acometida trifásica para aire acondicionado. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 AWG HFFR	ML	24,00	38.000,00	912.000,00
27.4	Sub acometida eléctrica para sonido. Incluye tubería EMT de 1/2", cable monopolar 3x12 AWG HFFR	ML	20,00	38.000,00	760.000,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27.5	Sub acometida parcial trifásica aérea para sala de Profesores. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.	ML	30,00	48.500,00	1.455.000,00
27.6	Suministro e instalación panel LED de sobreponer 45W, tub.EMT 1/2" monopolar 3x12 AWG HFFR.	UND	60,00	282.000,00	16.920.000,00
27.7	Punto eléctrico 110V(salida toma doble GFCI). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	5,00	87.000,00	435.000,00
27.8	Punto eléctrico 110V(salida toma doble). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	51,00	61.100,00	3.116.100,00
27.9	Punto eléctrico para interruptor eléctrico. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR y accesorios.	UND	17,00	74.200,00	1.261.400,00
27.10	Punto eléctrico para video bind. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	4,00	86.000,00	344.000,00
27.11	Punto eléctrico para ventilador. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	5,00	86.000,00	430.000,00
	SUBTOTAL				\$ 27.691.500
	ADMINISTRACIÓN	%	18,00%		\$ 4.984.470
	IMPREVISTOS	%	2,00%		\$ 553.830
	UTILIDADES	%	5,00%		\$ 1.384.575
	VALOR TOTAL				\$ 34.614.375

Adicionalmente se protocolizó la ampliación del plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días calendario en consideración de que no se podían ejecutar las actividades de cielo raso hasta tanto no se realicen las instalaciones eléctricas requeridas y luego proceder a instalar los paneles led de iluminación, tomas e interruptores.

Modificación 2:

El 26 de febrero de 2020 se protocolizó la segunda modificación que abarca en forma integral la ejecución del contrato desde las condiciones originalmente pactadas, pasando por la inclusión de actividades del capítulo de Instalaciones Eléctricas con valor adicional plasmado en el OTROSI 1, y, haciendo finalmente la evaluación total del alcance del contrato y las necesidades prioritarias de las instalaciones encaminada a dejar obras terminadas y funcionales en sabiendo que el recurso económico asignado es insuficiente para intervenir la totalidad de la Institución. En este orden de ideas y ejecución física del proyecto, se optimizó el recurso interviniendo las áreas más críticas de deterioro, sin dejar obras inconclusas y sin aumentar el valor del contrato.

Las obras finalmente consideradas y balanceadas sin que superen el valor del contrato son las siguientes:

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES						
1.2	Desmante de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	UN	11,00	12.500,00	137.500,00	14,00	175.000,00
1.4	Demolición concreto reforzados, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado	M3	0,88	245.000,00	215.600,00	1,99	487.550,00
1.7	Demolición de enchape y revoque sobre muro, Incluye retiro de escombros.	M2	36,30	8.500,00	308.550,00	41,06	349.010,00
1.8	Desmante de cubierta existente sin estructura, asbesto,barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escomb	M2	872,20	8.100,00	7.064.820,00	1.134,26	9.187.506,00
1.12	Demolición muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros	M2	207,40	13.200,00	2.737.680,00	49,95	659.340,00
1.13	Demolición de placa pisos concreto hasta 20 cm, incluye retiro.	M2	6,25	24.100,00	150.625,00	47,41	1.142.581,00
1.14	Cerramiento provisional en tela Verde H : 2.00 mts aprox., Incluye madera, anclaje en caneca.	ML	40,00	20.000,00	800.000,00	4,00	80.000,00
1.22	Corte de Concreto en piso con disco diamantado	ML	48,00	2.500,00	120.000,00	1,20	3.000,00
1.27	Demolición de pisos existentes con alístate, incluye retiro a sitio autorizado	M2	107,20	14.900,00	1.597.280,00	80,88	1.205.112,00
1.29	Demolición de pañete mal estado sobre muro, Incluye retiro de escombros.	M2	210,00	8.200,00	1.722.000,00	104,96	860.672,00
1.41	Retiro de escombros por viaje de 6 m3. Incluye cargue maquinaria pesada cargador o similar a volqueta de 6 m3+retiro y disposición final a sitio autorizado por el municipio.	UND	1,00	130.500,00	130.500,00	1,00	130.500,00
1.45	Desmante de cubierta existente con estructura, asbesto,barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escomb	M2	220,00	10.500,00	2.310.000,00	60,57	635.985,00
3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS						
3.1	Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" incluye accesorios y tapa pvc.	UN	1,00	37.500,00	37.500,00	1,00	37.500,00
3.2	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.	UN	5,00	22.000,00	110.000,00	1,00	22.000,00
3.5	Suministro e instalación de tubería de pvc de 6" RDE 21 presión. Incluye accesorios y pintura en alúmol.	UN	12,00	74.500,00	894.000,00	0,00	0,00
3.8	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 2" .Incluye accesorios.	UN	3,00	44.200,00	132.600,00	6,00	265.200,00
3.27	Desmante monte de tanque de aguas existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	6,00	23.100,00	138.600,00	0,00	0,00
3.30	Suministro e instalación de Punto agua fría PVC 1/2". Incluye accesorios y red funcionando.	UN	5,00	31.400,00	157.000,00	10,00	314.000,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

4	MAMPOSTERÍA						
4.1	Suministro e instalación de mampostería en tolete común. Incluye limpieza ladrillo.	M2	21,05	45.100,00	949.355,00	29,07	1.311.057,00
4.8	Pañete 1:4 Impermeabilizados en zona de ducha y fachada. Incluye filos, carteras y dilataciones.	M2	200,00	19.700,00	3.940.000,00	295,95	5.830.215,00
4.10	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.	M2	798,00	16.500,00	13.167.000,00	119,81	1.976.865,00
4.11	Remate sobre Muros viga alfajía, en concreto 2500 PSI ancho 0.25 a 0.4 m afinado, con gotero. incluye 3No3 e:	ML	18,70	34.200,00	639.540,00	0,00	0,00
4.20	Mesón cocina en granito pulido en concreto reforzado. Ver detalle (Parrilla en varilla 3/8" cada 15 cm. En ambos sentidos).	ML	9,20	139.000,00	1.278.800,00	11,30	1.570.700,00
4.23	Suministro e instalación de bloque ladrillo hueco No. 4 cara Rayada, incluye mortero de pega, andamios.	M2	199,10	28.600,00	5.694.260,00	6,10	174.460,00
7	ESTRUCTURAS						
7.9	Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentación, columna, vigas aéreas, zapatas, placas etc.	KG	350,00	3.050,00	1.067.500,00	543,94	1.659.017,00
7.12	Suministro y construcción placa maciza e=.07 concreto 3000 psi. Incluye formaleta.	M2	3,00	75.300,00	225.900,00	5,71	429.963,00
7.17	Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos no estructurales.	M3	3,00	498.000,00	1.494.000,00	8,68	4.322.640,00
8	CUBIERTAS						
8.5	Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. Incluye pintura y anticorrosivo.	ML	524,00	24.500,00	12.838.000,00	1,54	37.730,00
8.7	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	ML	82,00	16.100,00	1.320.200,00	31,85	512.785,00
8.9	Suministro e instalación de Correa en perfil metálicos estructurales de 10 x 4 cal.18 de acuerdo a medidas del fabrican	ML	105,00	21.700,00	2.278.500,00	105,00	2.278.500,00
8,21	Suministro e instalación de caballete en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	ML	84,80	16.100,00	1.365.280,00	88,92	1.431.612,00
8.26	Suministro e instalación cubierta metálica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	1.092,20	47.600,00	51.988.720,00	1.178,24	56.084.224,00
9	CIELOS RASOS						
9.3	Suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estrutura de soporte.	M2	666,46	40.500,00	26.991.630,00	414,58	16.790.490,00
10	IMPERMEABILIZACIONES						
10.2	Suministro e instalación Manto Foil de Aluminio FL 100, Pintado con Alumol Desarrollo L=.90 MTS, sobre muros.	ML	100,00	28.300,00	2.830.000,00	0,00	0,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

11	PISOS						
11.10	Suministro de guardaescoba altura 10 cm, incluye frague.	ML	40,00	11.500,00	460.000,00	77,12	886.880,00
11.13	Suministro y construcción de alisado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	M2	107,20	17.600,00	1.886.720,00	86,08	1.515.008,00
12	ENCHAPES						
12.5	Suministro e instalación de enchape para Piso color Cerámica antideslizante tráfico 5.incluye bocel	M2	110,20	39.200,00	4.319.840,00	132,82	5.206.544,00
12.6	Suministro e instalación de cerámica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. Incluye bosal y frague.	M2	55,26	43.100,00	2.381.706,00	195,90	8.443.290,00
12.8	Suministro de Pintura Esmalte certificada NTC para zócalos, muros, ladrillo a la vista, incluye resane con masilla.	M2	371,48	10.900,00	4.049.132,00	493,00	5.373.700,00
12.10	Suministro e instalación de enchape con cerámica color cualquier formato para muros Zócalo, incluye bocel.	M2	48,36	33.600,00	1.624.896,00	0,00	0,00
14	CARPINTERÍA METÁLICA						
14.4	Suministro e insta. Marco y Puerta lámina C.20 (1.00-0.90*2.20), para acceso principal. Incluye chapa seguridad y antic	UN	1,00	190.000,00	190.000,00	2,00	380.000,00
14.7	Suministro e instalación de Ventana en lámina C.20. Incluye alfaja metálica y anticorrosivo con reja en tubo 3/4" cuad.	M2	4,50	149.800,00	674.100,00	0,00	0,00
14.24	Suministro e instalación puertas, divisiones baños, división orinal en acero inoxidable entaborado doble lamina, incluye estructura, puerta, anclaje piso y pared, pasadores.	M2	9,00	576.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00
15	PINTURA						
15.1	Suministro y aplicación de estuco sobre muros, Incluye resane pañetes.	M2	25,80	5.800,00	149.640,00	156,41	907.178,00
15.2	Curado y arreglo de humedades en muros, incluye todo lo necesario para su correcta función.	M2	72,80	9.300,00	677.040,00	33,95	315.735,00
15.4	Suministro e instalación de pintura epoxica para muros, piso en concreto, incluye todo lo necesario para su terminado.	M2	213,15	24.300,00	5.179.545,00	50,53	1.227.879,00
15.8	Pintura esmalte certificada NTC correas, columnas, cerchas metálicas en la estructura de cubierta. incluye limpieza	ML	741,90	6.900,00	5.119.110,00	1.160,20	8.005.380,00
15.24	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros interiores y cielo rasos incluye. Resane Masilla acrílica.	M2	1.541,30	10.900,00	16.800.170,00	2.531,61	27.594.541,12
15.25	Suministro y aplicación de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas, ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	M2	374,42	11.700,00	4.380.714,00	910,00	10.647.000,00
15.26	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrílica o plástica.	M2	2.828,65	12.300,00	34.792.395,00	1.353,23	16.644.729,00
16	APARATOS SANITARIOS						

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

16.1	Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios.	UN	5,00	150.500,00	752.500,00	2,00	301.000,00
16.4	Suministro e instalación de Lavamanos especial sobreponer. Incluye grifería y accesorios de instalación.	UN	1,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
17	OBRAS EXTERIORES Y CANALIZACIONES						
17.14	Suministro y limpieza mediante rocería y retiro de material vegetal.	M2	200,00	2.100,00	420.000,00	196,24	412.104,00
18	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS						
18.5	Limpieza de la red de aguas lluvias y residuales, incluye retiro de basuras con disposición final a sitio autorizada.	ML	150,00	3.800,00	570.000,00	95,20	361.760,00
18.7	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 2" Incluye accesorios.	ML	12,00	14.400,00	172.800,00	0,00	0,00
18.9	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño	UN	1,00	289.000,00	289.000,00	2,00	578.000,00
26	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
26.16	suministro e instalación luminaria LED de 9W incluye cable encauchetado 3x12 AWG	UN	1,00	35.700,00	35.700,00	1,00	35.700,00
26.20	Suministro e instalación de Salida toma GFCI. 20 A	UN	3,00	84.700,00	254.100,00	0,00	0,00
26.86	Suministro e instalación de línea a tierra con varilla de cobre 70micras 5/8"x2.44m con alambre de cobre	UN	1,00	77.900,00	77.900,00	0,00	0,00
26.91	Acometida en cable 3x12AWG. Incluye cable tub. EMT 3/4" y accesorios.	ML	100,00	14.800,00	1.480.000,00	0,00	0,00
26.100	Desmante de red eléctrica existente, tomas, lámparas, interruptores mal estado.	UN	1,00	732.000,00	732.000,00	1,00	732.000,00
26.102	Punto eléctrico para toma doble Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UN	5,00	84.100,00	420.500,00	0,00	0,00
26.103	Punto eléctrico iluminación. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UN	1,00	70.300,00	70.300,00	67,00	4.710.100,00
26.104	Punto eléctrico para interruptor doble. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT 1/2" y accesorios	UN	1,00	75.400,00	75.400,00	11,00	829.400,00
26.109	Suministro e instalación tablero monofásico de 6 circuitos incluye 6 breaker enchufable 1x20A.	UN	1,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00
26.116	Suministro e instalación lámpara hermética 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	UN	3,00	112.000,00	336.000,00	11,00	1.232.000,00
27	ÍTEMS NO PREVISTOS						
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
27.1	Sub acometida trifásica para portería. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 + 1x12 AWG HFFR	ML	36,00	38.000,00		29,13	1.106.940,00
27.2	Sub acometida parcial trifásica subterránea. Incluye tubería PVC de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.	ML	15,00	46.000,00		0,00	0,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27.3	Sub acometida trifásica para aire acondicionado. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 AWG HFFR	ML	24,00	38.000,00		78,60	2.986.800,00
27.4	Sub acometida eléctrica para sonido. Incluye tubería EMT de 1/2", cable monopolar 3x12 AWG HFFR	ML	20,00	38.000,00		0,00	0,00
27.5	Sub acometida parcial trifásica aérea para sala de Profesores. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.	ML	30,00	48.500,00		25,00	1.212.500,00
27.6	Suministro e instalación panel LED de sobreponer 45W, tub.EMT 1/2" monopolar 3x12 AWG HFFR.	UND	60,00	282.000,00		49,00	13.818.000,00
27.7	Punto eléctrico 110V(salida toma doble GFCI). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	5,00	87.000,00		4,00	348.000,00
27.8	Punto eléctrico 110V(salida toma doble). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	51,00	61.100,00		72,00	4.399.200,00
27.9	Punto eléctrico para interruptor eléctrico sencillo. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR y accesorios.	UND	17,00	74.200,00		6,00	445.200,00
27.10	Punto eléctrico para video bind. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	4,00	86.000,00		5,00	430.000,00
27.11	Punto eléctrico para ventilador. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	5,00	86.000,00		4,00	344.000,00
	OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS						
27.12	Adecuación de tableros eléctricos. Incluye reubicación de circuitos viejos y la ubicación de nuevos circuitos con sus breakers.	UND		113.800,00		5,00	569.000,00
27,13	Adecuación de acometida eléctrica de reflectores. Incluye cambio de tubería EMT 1 1/4", percha, capacete, bushing y cableado de alimentación AWG # 8 hffr hasta el tablero de circuitos.	UND		228.400,00		1,00	228.400,00
27,14	Suministro e instalación de tomacorriente Levington con protector.	UND		51.812,00		19,00	984.428,00
27,15	Excavación manual sin clasificar, incluye todo factor y disposición final de material en escombrera autorizada.	M3		38.917,00		15,46	601.656,82
27,16	Demolición de concreto ciclópeo. Incluye bote de escombros.	M3		124.354,00		2,31	287.257,74
27,17	Demolición de cielorraso en madera, malla y pañete, hico por, drywall. Incluye retiro a sitio autorizado.	M2		13.008,00		397,65	5.172.631,20
27,18	Corte de muro con disco para la construcción de elementos de reforzamiento estructural	ML		7.680,00		108,90	836.352,00
27,19	Demolición, rectificación y perfilada de remates de culata en mortero 1:3 para adecuar las superficies a las nuevas cubiertas	ML		15.896,00		272,69	4.334.680,24
27,20	Mantenimiento de cubierta existente consistente en limpieza de teja, tapa gotera, m.o. Incluye cambio de tornillería.	M2		4.490,00		33,80	151.762,00
27,21	Suministro e instalación Manto Foil de Aluminio FL 100 de 3mm, Pintado con emulsión asfáltica, sobre placa en concreto.	M2		43.238,00		76,32	3.299.924,16

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27,22	Alistado de superficie de muros para instalar enchape.	M2		4.280,00		121,66	520.704,80
27,23	Reparación de muros fracturados con grapas en varilla de 3/8". Incluye regata sobre muros, perforaciones para incrustar la grapa, pañete y estuco.	ML		16.414,00		16,90	277.396,60
27,24	Poda de árboles entre 0,0 y 5,0 m para despejar y propiciar mantenimiento de cubiertas.	UND		324.884,00		4,00	1.299.536,00
27,25	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra.	M3		48.767,00		5,25	256.026,75
27,26	Solado en concreto de limpieza de 2500 PSI E:0.10 MTS	M2		369.635,00		10,39	3.840.507,65
27,27	Desmonte y monte de aparatos sanitarios: lavamanos, orinales, sanitarios. Incluye cambio de acoples y grifería.	UND		22.453,00		5,00	112.265,00
27,28	Suministro e instalación de punto sanitario de 4". Incluye accesorios	UND		56.162,00		2,00	112.324,00
27,29	Suministro e instalación de punto sanitario de 3". Incluye accesorios	UND		50.453,00		4,00	201.812,00
27,30	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6". Incluye codos y uniones para retirar el descole de la viga canal del área de los salones	ML		49.223,00		3,50	172.280,50
27,31	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 4" Incluye accesorios.	ML		27.043,00		6,20	167.666,60
27,32	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 3" Incluye accesorios.	ML		15.248,00		5,40	82.339,20
27,33	Suministro e instalación de rejilla de piso 3x2 anticucarachas	UND		8.256,00		3,00	24.768,00
27,34	Suministro e instalación de válvulas de pozuelo de 2"	UND		14.680,00		1,00	14.680,00
27,35	Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC de 1/2".	ML		5.742,00		9,50	54.549,00
27,36	Reparación, adecuación y anclaje de puntos hidráulicos de 1/2". Incluye demolición y reconstrucción de muro, mortero y pañete.	UND		26.478,00		3,00	79.434,00
27,37	Suministro e instalación de canal en lámina HG C20 según diseño. Incluye Pintura base.	ML		40.233,00		3,50	140.815,50
27,38	Suministro e instalación de bajante A.LL.4". Incluye accesorios, demolición y reconstrucción de piso	ML		13.920,00		7,20	100.224,00
27,39	Rectificación de alineamientos y adecuación de bajantes de aguas lluvias de 4". Incluye accesorios PVC y abrazaderas.	UND		69.399,00		2,00	138.798,00
27,40	Limpieza de correas metálicas existentes. Incluye grata metálica y estopa.	UND		3.840,00		237,60	912.384,00
27,41	Suministro e instalación de persiana rectangular metálica para la cocina en lámina C18 para marco y celosía en tubo cuadrado de 1". Incluye anticorrosivo y esmalte. Dimensiones: 4,02 m x 0,42 m.	UND		222.688,00		1,69	376.342,72
27,42	Suministro e instalación de reja metálica en tubo cuadrado de 3/4" para el despacho de comida. Incluye bisagras, sistema de seguridad, malla antimosquitos, anticorrosivo y esmalte.	UND		97.350,00		1,00	97.350,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27.43	Suministro e instalación de ventanas tipo bancario en tubo cuadrado de 3/4". Incluye malla antimosquitos, anticorrosivo y pintura.	M2		95.963,00		3,49	334.910,87
27.44	Reparación de puertas en mal estado incluyendo cambio en tramos de peinazos.	UND		47.940,00		2,00	95.880,00
27.45	Suministro e instalación de marco y puerta con luceta C18 (2,7-2,4x1,00. Incluye chapa chapa, bisagras y anticorrosivo.	UND		376.490,00		3,00	1.129.470,00
27.46	Suministro e instalación de marco en lámina C18 para puerta (0,90 - 0,75). Incluye anticorrosivo, bisagras y anclaje.	UND		86.284,00		4,00	345.136,00
27.47	Suministro e instalación de ventana tipo reja similar a la existente en el comedor.	M2		121.678,00		8,94	1.087.801,32
27.48	Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 80 x 40 x 2,0 mm.	ML		18.994,00		74,32	1.411.634,08
27.49	Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 20 x 10 x 2,0 mm.	ML		14.158,00		61,95	877.088,10
27.50	Reparación de soportes de canal del aula múltiple. Incluye soldadura y pintura.	UND		17.460,00		1,00	17.460,00
27.51	Suministro e instalación de soportes de correas de cubierta para disminuir luz de carga en tubo rectangular 8 x 4 C 18 desarrollo 1,62 m.	UND		33.911,00		2,00	67.822,00
27.52	Suministro e instalación de cinta asfáltica para impermeabilización de culatas.	ML		21.359,00		44,75	955.815,25
27.53	Retiro y reinstalación de cocineta sala de profesores. Incluye acoples para poceta de lavaplatos.	UND		127.592,00		1,00	127.592,00
27.54	Reconstrucción de línea interna de gas con línea nueva desde la cocina hasta la panadería. Incluye desinstalación de la red existente, reubicación de válvulas de control y todo lo necesario para dejar funcionando el sistema.	ML		35.918,00		39,12	1.405.112,16
27.55	Construcción de poyos para mesón en cocina y despensa en concreto de 2.500 psi.	M2		40.499,00		5,66	229.224,34
27.56	Suministro y aplicación de esmalte para guardaescobas en cemento. Incluye resanes	ML		4.608,00		393,81	1.814.676,48
27.57	Construcción de placa de piso e= 0,08 m en concreto de 2.500 psi.	M2		38.294,00		52,20	1.998.946,80
	SUBTOTAL				\$241.051.148		\$268.742.648
	ADMINISTRACIÓN	%	18,00%		\$43.389.207		\$48.373.677
	IMPREVISTOS	%	2,00%		\$4.821.023		\$5.374.853
	UTILIDADES	%	5,00%		\$12.052.557		\$13.437.132
	VALOR TOTAL				\$301.313.935		\$335.928.310

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

4. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En el segundo período de ejecución se ha ejecutado y se está cobrando obra pactada con las modificaciones protocolizadas en el OTROSI N° 2.

Las actividades de obra que se están cobrando en el acta de recibo parcial de obra N° 2 son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	Desmante de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	UN	14,00	12.500,00	175.000,00
1.4	Demolición concreto reforzados, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado	M3	1,74	245.000,00	426.300,00
1.7	Demolición de enchape y revoque sobre muro, Incluye retiro de escombros.	M2	29,74	8.500,00	252.790,00
1.8	Desmante de cubierta existente sin estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera.	M2	197,40	8.100,00	1.598.940,00
1.12	Demolición muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros	M2	41,46	13.200,00	547.272,00
1.13	Demolición de placa pisos concreto hasta 20 cm, incluye retiro.	M2	41,56	24.100,00	1.001.596,00
1.14	Cerramiento provisional en tela Verde H : 2.00 mts aprox., Incluye madera, anclaje en caneca.	ML	4,00	20.000,00	80.000,00
1.22	Corte de Concreto en piso con disco diamantado	ML	1,20	2.500,00	3.000,00
1.27	Demolición de pisos existentes con alistado, incluye retiro a sitio autorizado	M2	0,00	14.900,00	0,00
1.29	Demolición de pañete mal estado sobre muro, Incluye retiro de escombros.	M2	97,94	8.200,00	803.108,00
1.41	Retiro de escombros por viaje de 6 m3. Incluye cargue maquinaria pesada cargador o similar a volqueta de 6 m3+retiro y disposición final a sitio autorizado por el municipio.	UND	1,00	130.500,00	130.500,00
1.45	Desmante de cubierta existente con estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera.	M2	60,57	10.500,00	635.985,00
3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
3.1	Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" incluye accesorios y tapa pvc.	UN	1,00	37.500,00	37.500,00
3.2	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.	UN	1,00	22.000,00	22.000,00
3.5	Suministro e instalación de tubería de pvc de 6" RDE 21 presión. Incluye accesorios y pintura en alumol.	UN	0,00	74.500,00	0,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

3.8	Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 2" .Incluye accesorios.	UN	2,00	44.200,00	88.400,00
3.27	Desmonte monte de tanque de aguas existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	UN	0,00	23.100,00	0,00
3.30	Suministro e instalación de Punto agua fría PVC 1/2". Incluye accesorios y red funcionando.	UN	4,00	31.400,00	125.600,00
4	MAMPOSTERÍA				
4.1	Suministro e instalación de mampostería en tolete común. Incluye limpieza ladrillo.	M2	29,07	45.100,00	1.311.057,00
4.8	Pañete 1:4 Impermeabilizados en zona de ducha y fachada. Incluye filos, carteras y dilataciones.	M2	189,51	19.700,00	3.733.347,00
4.10	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.	M2	78,25	16.500,00	1.291.125,00
4.11	Remate sobre Muros viga alfajía, en concreto 2500 PSI ancho 0.25 a 0.4 m afinado, con gotero. incluye 3No3 e:	ML	0,00	34.200,00	0,00
4.20	Mesón cocina en granito pulido en concreto reforzado. Ver detalle (Parrilla en varilla 3/8" cada 15 cm. En ambos sentidos).	ML	11,30	139.000,00	1.570.700,00
4.23	Suministro e instalación de bloque ladrillo hueco No. 4 cara Rayada, incluye mortero de pega, andamios.	M2	0,00	28.600,00	0,00
7	ESTRUCTURAS				
7.9	Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentación, columna, vigas aéreas, zapatas, placas etc.	KG	543,94	3.050,00	1.659.017,00
7.12	Suministro y construcción placa maciza e=.07 concreto 3000 psi. Incluye formaleta.	M2	5,71	75.300,00	429.963,00
7.17	Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos no estructurales.	M3	8,68	498.000,00	4.322.640,00
8	CUBIERTAS				
8.5	Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. Incluye pintura y anticorrosivo.	ML	1,54	24.500,00	37.730,00
8.7	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	ML	21,85	16.100,00	351.785,00
8.9	Suministro e instalación de Correa en perfil metálicos estructurales de 10 x 4 cal.18 de acuerdo a medidas del fabrican	ML	57,15	21.700,00	1.240.155,00
8.21	Suministro e instalación de caballete en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	ML	21,24	16.100,00	341.964,00
8.26	Suministro e instalación cubierta metálica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	241,56	47.600,00	11.498.256,00
9	CIELOS RASOS				
9.3	Suministro e instalación Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estructura de soporte.	M2	414,58	40.500,00	16.790.490,00
10	IMPERMEABILIZACIONES				
10.2	Suministro e instalación Manto Foil de Aluminio FL 100, Pintado con Alumol Desarrollo L=.90 MTS, sobre muros.	ML	0,00	28.300,00	0,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

11	PISOS				
11.10	Suministro de guardaescoba altura 10 cm, incluye fragüe.	ML	30,88	11.500,00	355.120,00
11.13	Suministro y construcción de alizado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	M2	0,00	17.600,00	0,00
12	ENCHAPES				
12.5	Suministro e instalación de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluye bocel	M2	46,53	39.200,00	1.823.976,00
12.6	Suministro e instalación de cerámica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. Incluye bocel y fragüe.	M2	150,26	43.100,00	6.476.206,00
12.8	Suministro de Pintura Esmalte certificada NTC para zócalos, muros, ladrillo a la vista, incluye resane con masilla.	M2	493,00	10.900,00	5.373.700,00
12.10	Suministro e instalación de enchape con cerámica color cualquier formato para muros Zócalo, incluye bocel.	M2	0,00	33.600,00	0,00
14	CARPINTERÍA METÁLICA				
14.4	Suministro e insta. Marco y Puerta lámina C.20 (1.00-0.90*2.20), para acceso principal. Incluye chapa seguridad y antic	UN	2,00	190.000,00	380.000,00
14.7	Suministro e instalación de Ventana en lámina C.20. Incluye alfajía metálica y anticorrosivo con reja en tubo 3/4" cuad.	M2	0,00	149.800,00	0,00
14.24	Suministro e instalación puertas, divisiones baños, división orinal en acero inoxidable entamborado doble lamina, incluye estructura, puerta, anclaje piso y pared, pasadores.	M2	0,00	576.000,00	0,00
15	PINTURA				
15.1	Suministro y aplicación de estuco sobre muros, Incluye resane pañetes.	M2	140,29	5.800,00	813.682,00
15.2	Curado y arreglo de humedades en muros, incluye todo lo necesario para su correcta función.	M2	0,00	9.300,00	0,00
15.4	Suministro e instalación de pintura epóxica para muros, piso en concreto, incluye todo lo necesario para su terminado.	M2	50,53	24.300,00	1.227.879,00
15.8	Pintura esmalte certificada NTC correas, columnas, cerchas metálicas en la estructura de cubierta. incluye limpieza	ML	475,77	6.900,00	3.282.813,00
15.24	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros interiores y cielo rasos incluye. Resane Masilla acrílica.	M2	420,36	10.900,00	4.581.924,00
15.25	Suministro y aplicación de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas, ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	M2	553,19	11.700,00	6.472.323,00
15.26	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrílica o plástica.	M2	1.353,23	12.300,00	16.644.729,00
16	APARATOS SANITARIOS				
16.1	Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios.	UN	2,00	150.500,00	301.000,00
16.4	Suministro e instalación de Lavamanos especial sobreponer. Incluye grifería y accesorios de instalación.	UN	0,00	179.000,00	0,00
17	OBRAS EXTERIORES Y CANALIZACIONES				
17.14	Suministro y limpieza mediante rocería y retiro de material vegetal.	M2	0,00	2.100,00	0,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

18	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				
18.5	Limpieza de la red de aguas lluvias y residuales, incluye retiro de basuras con disposición final a sitio autorizada.	ML	2,70	3.800,00	10.260,00
18.7	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 2" Incluye accesorios.	ML	0,00	14.400,00	0,00
18.9	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño	UN	2,00	289.000,00	578.000,00
26	INSTALACIONEA ELÉCTRICAS				
26.16	Suministro e instalación luminaria LED de 9W incluye cable encauchetado 3x12 AWG	UN	1,00	35.700,00	35.700,00
26.20	Suministro e instalación de Salida toma GFCI. 20 A	UN	0,00	84.700,00	0,00
26.86	Suministro e instalación de línea a tierra con varilla de cobre 70micras 5/8"x2.44m con alambre de cobre	UN	0,00	77.900,00	0,00
26.91	Acometida en cable 3x12AWG. Incluye cable tub. EMT 3/4" y accesorios.	ML	0,00	14.800,00	0,00
#####	Desmante de red eléctrica existente, tomas, lámparas, interruptores mal estado.	UN	1,00	732.000,00	732.000,00
#####	Punto eléctrico para toma doble Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UN	0,00	84.100,00	0,00
#####	Punto eléctrico iluminación. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UN	67,00	70.300,00	4.710.100,00
#####	Punto eléctrico para interruptor doble. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT 1/2" y accesorios	UN	11,00	75.400,00	829.400,00
#####	Suministro e instalación tablero monofásico de 6 circuitos incluye 6 breaker enchufable 1x20A.	UN	0,00	484.000,00	0,00
#####	Suministro e instalación lámpara hermética 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	UN	11,00	112.000,00	1.232.000,00
27	ÍTEMS NO PREVISTOS				
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
27.1	Sub acometida trifásica para portería. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 + 1X12 AWG HFFR	ML	29,13	38.000,00	1.106.940,00
27.2	Sub acometida parcial trifásica subterránea. Incluye tubería PVC de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.	ML	0,00	46.000,00	0,00
27.3	Sub acometida trifásica para aire acondicionado. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 AWG HFFR	ML	78,60	38.000,00	2.986.800,00
27.4	Sub acometida eléctrica para sonido. Incluye tubería EMT de 1/2", cable monopolar 3x12 AWG HFFR	ML	0,00	38.000,00	0,00
27.5	Sub acometida parcial trifásica aérea para sala de Profesores. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.	ML	25,00	48.500,00	1.212.500,00
27.6	Suministro e instalación panel LED de sobreponer 45W, tub.EMT 1/2" monopolar 3x12 AWG HFFR.	UND	0,00	282.000,00	0,00
27.7	Punto eléctrico 110V(salida toma doble GFCI). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	4,00	87.000,00	348.000,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27.8	Punto eléctrico 110V(salida toma doble). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	72,00	61.100,00	4.399.200,00
27.9	Punto eléctrico para interruptor eléctrico sencillo. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR y accesorios.	UND	6,00	74.200,00	445.200,00
27.10	Punto eléctrico para video bind. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	5,00	86.000,00	430.000,00
27.11	Punto eléctrico para ventilador. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.	UND	4,00	86.000,00	344.000,00
	OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS				
27.12	Adecuación de tableros eléctricos. Incluye reubicación de circuitos viejos y la ubicación de nuevos circuitos con sus breakers.	UND	5,00	113.800,00	569.000,00
27,13	Adecuación de acometida eléctrica de reflectores. Incluye cambio de tubería EMT 1 1/4", percha, capacete, bushing y cableado de alimentación AWG # 8 hffr hasta el tablero de circuitos.	UND	1,00	228.400,00	228.400,00
27,14	Suministro e instalación de tomacorriente Levington con protector.	UND	19,00	51.812,00	984.428,00
27,15	Excavación manual sin clasificar, incluye todo factor y disposición final de material en escombrera autorizada.	M3	15,46	38.917,00	601.656,82
27,16	Demolición de concreto ciclópeo. Incluye bote de escombros.	M3	2,31	124.354,00	287.257,74
27,17	Demolición de cielorraso en madera, malla y pañete, icopor, drywall. Incluye retiro a sitio autorizado.	M2	397,65	13.008,00	5.172.631,20
27,18	Corte de muro con disco para la construcción de elementos de reforzamiento estructural	ML	108,90	7.680,00	836.352,00
27,19	Demolición, rectificación y perfilada de remates de culata en mortero 1:3 para adecuar las superficies a las nuevas cubiertas	ML	272,69	15.896,00	4.334.680,24
27,20	Mantenimiento de cubierta existente consistente en limpieza de teja, tapa gotera, m.o. Incluye cambio de tornillería.	M2	33,80	4.490,00	151.762,00
27,21	Suministro e instalación Manto Foil de Aluminio FL 100 de 3mm, Pintado con emulsión asfáltica, sobre placa en concreto.	M2	76,32	43.238,00	3.299.924,16
27,22	Alistado de superficie de muros para instalar enchape.	M2	121,66	4.280,00	520.704,80
27,23	Reparación de muros fracturados con grapas en varilla de 3/8". Incluye regata sobre muros, perforaciones para incrustar la grapa, pañete y estuco.	ML	16,90	16.414,00	277.396,60
27,24	Poda de árboles entre 0,0 y 5,0 m para despejar y propiciar mantenimiento de cubiertas.	UND	4,00	324.884,00	1.299.536,00
27,25	Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra.	M3	5,25	48.767,00	256.026,75
27,26	Solado en concreto de limpieza de 2500 PSI E:0.10 MTS	M2	10,39	369.635,00	3.840.507,65
27,27	Desmonte y monte de aparatos sanitarios: lavamanos, orinales, sanitarios. Incluye cambio de acoples y grifería.	UND	5,00	22.453,00	112.265,00
27,28	Suministro e instalación de punto sanitario de 4". Incluye accesorios	UND	2,00	56.162,00	112.324,00
27,29	Suministro e instalación de punto sanitario de 3". Incluye accesorios	UND	4,00	50.453,00	201.812,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27,30	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6". Incluye codos y uniones para retirar el descole de la viga canal del área de los salones	ML	3,50	49.223,00	172.280,50
27,31	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 4" Incluye accesorios.	ML	6,20	27.043,00	167.666,60
27,32	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 3" Incluye accesorios.	ML	5,40	15.248,00	82.339,20
27,33	Suministro e instalación de rejilla de piso 3x2 anticucarachas	UND	3,00	8.256,00	24.768,00
27,34	Suministro e instalación de válvulas de pozuelo de 2"	UND	1,00	14.680,00	14.680,00
27,35	Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC de 1/2".	ML	9,50	5.742,00	54.549,00
27,36	Reparación, adecuación y anclaje de puntos hidráulicos de 1/2". Incluye demolición y reconstrucción de muro, mortero y pañete.	UND	3,00	26.478,00	79.434,00
27,37	Suministro e instalación de canal en lámina HG C20 según diseño. Incluye Pintura base.	ML	3,50	40.233,00	140.815,50
27,38	Suministro e instalación de bajante A.LL.4". Incluye accesorios, demolición y reconstrucción de piso	ML	7,20	13.920,00	100.224,00
27,39	Rectificación de alineamientos y adecuación de bajantes de aguas lluvias de 4". Incluye accesorios PVC y abrazaderas.	UND	2,00	69.399,00	138.798,00
27,40	Limpieza de correas metálicas existentes. Incluye grata metálica y estopa.	UND	237,60	3.840,00	912.384,00
27.41	Suministro e instalación de persiana rectangular metálica para la cocina en lámina C18 para marco y celosía en tubo cuadrado de 1". Incluye anticorrosivo y esmalte. Dimensiones: 4,02 m x 0,42 m.	UND	1,69	222.688,00	376.342,72
27.42	Suministro e instalación de reja metálica en tubo cuadrado de 3/4" para el despacho de comida. Incluye bisagras, sistema de seguridad, malla antimosquitos, anticorrosivo y esmalte.	UND	1,00	97.350,00	97.350,00
27.43	Suministro e instalación de ventanas tipo bancario en tubo cuadrado de 3/4". Incluye malla antimosquitos, anticorrosivo y pintura.	M2	3,49	95.963,00	334.910,87
27.44	Reparación de puertas en mal estado incluyendo cambio en tramos de peinazos.	UND	2,00	47.940,00	95.880,00
27.45	Suministro e instalación de marco y puerta con luceta C18 (2,7-2,4x1,00. Incluye chapa chapa, bisagras y anticorrosivo.	UND	3,00	376.490,00	1.129.470,00
27.46	Suministro e instalación de marco en lámina C18 para puerta (0,90 - 0,75). Incluye anticorrosivo, bisagras y anclaje.	UND	4,00	86.284,00	345.136,00
27.47	Suministro e instalación de ventana tipo reja similar a la existente en el comedor.	M2	8,94	121.678,00	1.087.801,32
27.48	Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 80 x 40 x 2,0 mm.	ML	74,32	18.994,00	1.411.634,08
27.49	Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 20 x 10 x 2,0 mm.	ML	61,95	14.158,00	877.088,10
27.50	Reparación de soportes de canal del aula múltiple. Incluye soldadura y pintura.	UND	1,00	17.460,00	17.460,00
27.51	Suministro e instalación de soportes de correas de cubierta para disminuir luz de carga en tubo rectangular 8 x 4 C 18 desarrollo 1,62 m.	UND	2,00	33.911,00	67.822,00

EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

27.52	Suministro e instalación de cinta asfáltica para impermeabilización de culatas.	ML	44,75	21.359,00	955.815,25
27.53	Retiro y reinstalación de cocineta sala de profesores. Incluye acoples para poceta de lavaplatos.	UND	1,00	127.592,00	127.592,00
27.54	Reconstrucción de línea interna de gas con línea nueva desde la cocina hasta la panadería. Incluye desinstalación de la red existente, reubicación de válvulas de control y todo lo necesario para dejar funcionando el sistema.	ML	39,12	35.918,00	1.405.112,16
27.55	Construcción de poyos para mesón en cocina y despensa en concreto de 2.500 psi.	M2	5,66	40.499,00	229.224,34
27.56	Suministro y aplicación de esmalte para guardaescobas en cemento. Incluye resanes	ML	0,00	4.608,00	0,00
27.57	Construcción de placa de piso e= 0,08 m en concreto de 2.500 psi.	M2	0,00	38.294,00	0,00

COSTOS DIRECTOS	\$151.172.914,60
ADMINISTRACION 18%	\$27.211.124,63
IMPREVISTOS 2%	\$3.023.458,29
UTILIDADES 5%	\$7.558.645,73
VALOR TOTAL	\$188.966.143,25

5. CONTROL DE CALIDAD

La Contratista realizó los controles de calidad necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras objeto del presente contrato y del presente corte de obra.

6. CONCLUSIONES

La obra se está ejecutando de manera concordante con los diseños y especificaciones previstos, con los ajustes mencionados y los requerimientos puntuales particulares exigidos por la Entidad contratante.

Los ajustes que se realizaron enriquecieron la calidad de la obra y el fin integral para lo cual fue prevista.

En el próximo período de ejecución estará culminada la totalidad de la obra con los ajustes realizados.

EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

7. DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO

PRELIMINARES

Ítem 1.2 - Desmonte de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.





Ítem 1.4 - Demolición concreto reforzados, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 1.7 – Demolición de enchape y revoque sobre muro, Incluye retiro de escombros.

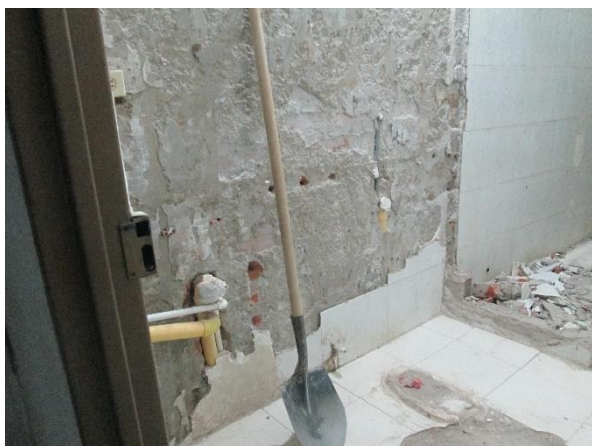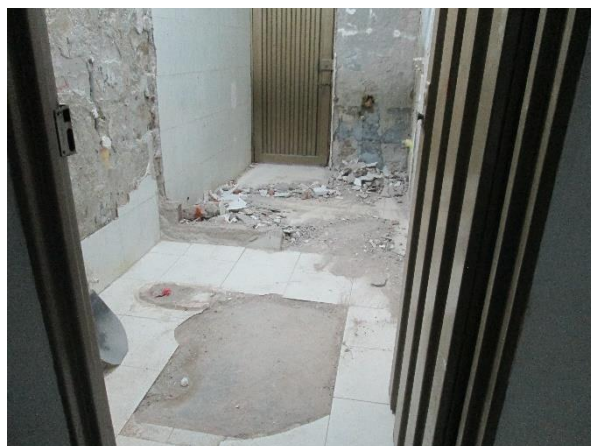

Ítem 1,8 – Desmonte de cubierta existente sin estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera.



Ítem 1.12 - Demolición muros e= 012- 015 mt, con retiro de escombros



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 1,13 – Demolición de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye retiro.



Ítem 1,14 – Cerramiento provisional en tela Verde H : 2.00 mts aprox., Incluye madera, anclaje en caneca.




Ítem 1,22 – Corte de Concreto en piso con disco diamantado.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 1,29 – Demolición de pañete mal estado sobre muro, Incluye retiro de escombros.

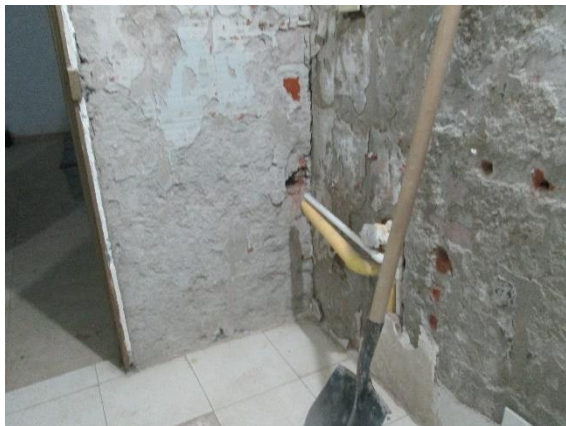

1.41 - Retiro de escombros por viaje de 6 m3. Incluye cargue maquinaria pesada cargador o similar a volqueta de 6 m3+retiro y disposición final a sitio autorizado por el municipio.



1.45 - Desmante de cubierta existente con estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombrera.




EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

3. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

3.1 - Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" incluye accesorios y tapa pvc..



3.2 - Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.

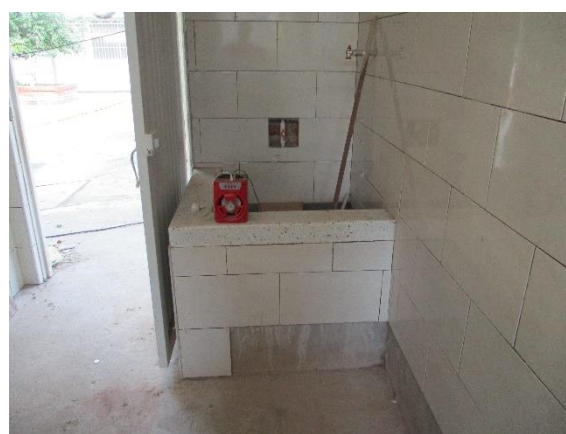

3.8 - Suministro e instalación de Punto sanitario PVC 2" .Incluye accesorios.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

3.30 - Suministro e instalación de Punto agua fría PVC 1/2". Incluye accesorios y red funcionando.



4. MAMPOSTERÍA

4.1.- Suministro e instalación de mampostería en tolete común. Incluye limpieza ladrillo.



4.8 - Pañete 1:4 Impermeabilizados en zona de ducha y fachada. Incluye filos, carteras y dilataciones.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

4.10 - Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.



4.20 - Mesón cocina en granito pulido en concreto reforzado. Ver detalle (Parrilla en varilla 3/8" cada 15 cm. En ambos sentidos).



4.23 - Suministro e instalación de bloque ladrillo hueco No. 4 cara Rayada, incluye mortero de pega, andamios.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

7. ESTRUCTURAS

Ítem 7.9 - Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentación, columna, vigas aéreas, zapatas, placas etc.



Ítem 7.12 - Suministro y construcción placa maciza e=0.07 concreto 3000 psi. Incluye formaleta..



Ítem 7.17 - Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos no estructurales.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

8. CUBIERTAS

Ítem 8.5 - Suministro e instalación de correa en C PHR de 160x60mm de 2.5 mm. Incluye pintura y anticorrosivo.



Ítem 8.7 - Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos).




Ítem 8.9 - Suministro e instalación de Correa en perfil metálicos estructurales de 10 x 4 cal.18 de acuerdo a medidas del fabrican.



EDELMIRA VARON CORONADO Ingeniera Civil

Ítem 8.21 – Suministro e instalación de caballete en lámina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos).

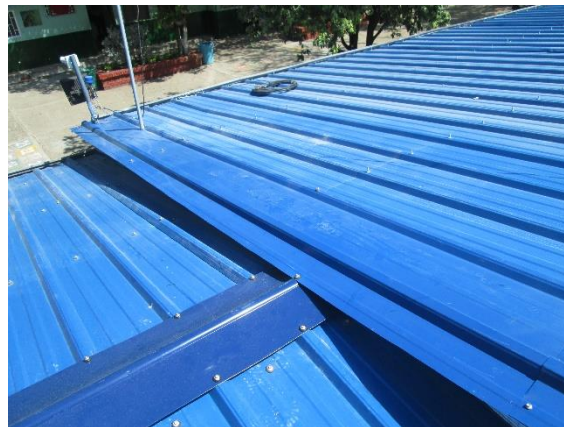

8.26 - Suministro e instalación cubierta metálica con trapezios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.



9. CIELOS RASOS

Ítem 9.3 - Suministro e instalación Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estructura de soporte.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil


11. PISOS

Ítem 11.10 - Suministro de guardaescoba altura 10 cm, incluye fragüe.



12. ENCHAPES

Ítem 12.5 - Suministro e instalación de enchape para Piso color Cerámica antideslizante trafico 5.incluye bocel.

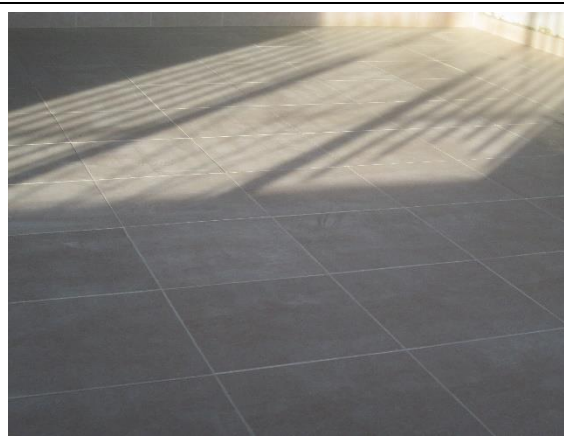

12.6 - Suministro e instalación de cerámica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. Incluye bocel y frague.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 12.8 - Suministro de Pintura Esmalte certificada NTC para zócalos, muros, ladrillo a la vista, incluye resane con masilla.



14. CARPINTERÍA METÁLICA

Ítem 14.4 - Suministro e insta. Marco y Puerta lámina C.20 (1.00-0.90*2.20), para acceso principal. Incluye chapa seguridad y anticorrosivo



15. PINTURA

Ítem 15.1 - Suministro y aplicación de estuco sobre muros, Incluye resane pañetes.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 15.4 - Suministro e instalación de pintura epoxica para muros, piso en concreto, incluye todo lo necesario para su terminado.



Ítem 15.8 - Pintura esmalte certificada NTC correas, columnas, cerchas metálicas en la estructura de cubierta. incluye limpieza.



Ítem 15.24 - Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros interiores y cielo rasos incluye. Resane Masilla acrílica.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 15.25 - Suministro y aplicación de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas, ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.



Ítem 15.26 - Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. Sobre muros exteriores incluye resane Masilla acrílica o plástica.



16. APARATOS SANITARIOS

Ítem 16.1 - Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

18. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

18.5 - Limpieza de la red de aguas lluvias y residuales, incluye retiro de basuras con disposición final a sitio autorizada.



Ítem 18.9 - Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño.



26. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem 26.16 - Suministro e instalación luminaria LED de 9W incluye cable encauchetado 3x12 AWG



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 26.100 - Desmonte de red eléctrica existente, tomas, lámparas, interruptores mal estado.



Ítem 26.103 - Punto eléctrico iluminación. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.



Ítem 26.104 - Punto eléctrico para interruptor doble. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT 1/2" y accesorios



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 26.116 - Suministro e instalación lámpara hermética 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG



27. ÍTEMS NO PREVISTOS

Ítem 27.1 - Sub acometida trifásica para portería. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 + 1X12 AWG HFFR



Ítem 27.3 - Sub acometida trifásica para aire acondicionado. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x12 AWG HFFR



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.5 - Sub acometida parcial trifásica aérea para sala de Profesores. Incluye tubería EMT de 3/4", cable monopolar 3x8 AWG + 1x8 AWG.



Ítem 27.7 - Punto eléctrico 110V (salida toma doble GFCI). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.



Ítem 27.8 - Punto electrico 110V(salida toma doble). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.9 - Punto eléctrico para interruptor eléctrico sencillo. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR y accesorios.



Ítem 27.10 - Punto eléctrico para video bind. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.



Ítem 27.11 - Punto eléctrico para ventilador. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

OTROS ÍTEMS NO PREVISTOS

Ítem 27.12 - Adecuación de tableros eléctricos. Incluye reubicación de circuitos viejos y la ubicación de nuevos circuitos con sus breakers.



Ítem 27.13 - Adecuación de acometida eléctrica de reflectores. Incluye cambio de tubería EMT 1 1/4", percha, capacete, bushing y cableado de alimentación AWG # 8 hffr hasta el tablero de circuitos.



Ítem 27.14 - Suministro e instalación de tomacorriente Levington con protector.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.15 - Excavación manual sin clasificar, incluye todo factor y disposición final de material en escombrera autorizada.



Ítem 27.16 - Demolición de concreto ciclópeo. Incluye bote de escombros.



Ítem 27.17 - Demolición de cielorraso en madera, malla y pañete, icopor, drywall. Incluye retiro a sitio autorizado. Ítem



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.18 - Corte de muro con disco para la construcción de elementos de reforzamiento estructural.



Ítem 27.19 - Demolición, rectificación y perfilada de remates de culata en mortero 1:3 para adecuar las superficies a las nuevas cubiertas



Ítem 27.20 - Mantenimiento de cubierta existente consistente en limpieza de teja, tapa gotera, m.o. Incluye cambio de tornillería.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.21 - Suministro e instalación Manto Foil de Aluminio FL 100 de 3mm, Pintado con emulsión asfáltica, sobre placa en concreto.



Ítem 27.22 - Alistado de superficie de muros para instalar enchape.



Ítem 27.23 - Reparación de muros fracturados con grapas en varilla de 3/8". Incluye regata sobre muros, perforaciones para incrustar la grapa, pañete y estuco.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.24 - Poda de árboles entre 0,0 y 5,0 m para despejar y propiciar mantenimiento de cubiertas.



27.25 - Relleno con Recebo compactado mecánicamente, incluye material y transporte a obra.



Ítem 27.26 - Solado en concreto de limpieza de 2500 PSI E:0.10 MTS



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.27 - Desmonte y monte de aparatos sanitarios: lavamanos, orinales, sanitarios. Incluye cambio de acoples y grifería.



Ítem 27.28 - Suministro e instalación de punto sanitario de 4". Incluye accesorios




Ítem 27.29 - Suministro e instalación de punto sanitario de 3". Incluye accesorios



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.30 - Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6". Incluye codos y uniones para retirar el descole de la viga canal del área de los salones.

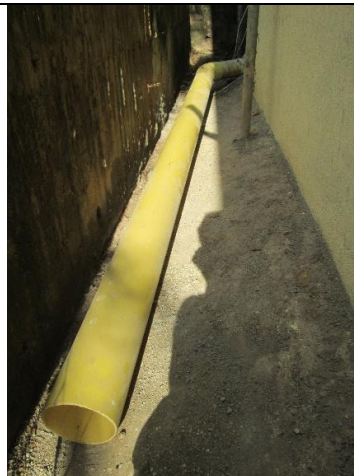

Ítem 27.31 - Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 4" Incluye accesorios.




Ítem 27.32 - Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 3" Incluye accesorios.





EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.33 - Suministro e instalación de rejilla de piso 3x2 anticucarachas

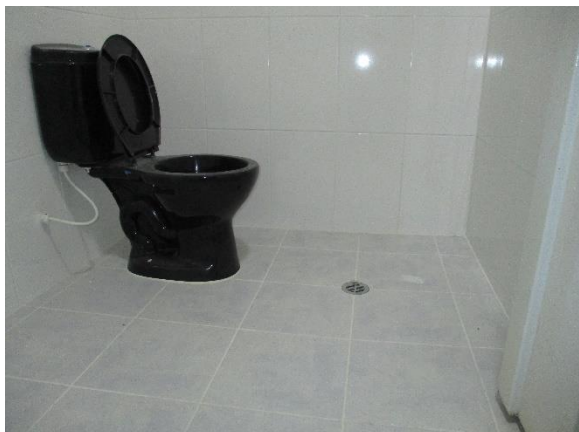

Ítem 27.34 - Suministro e instalación de válvulas de pozuelo de 2"

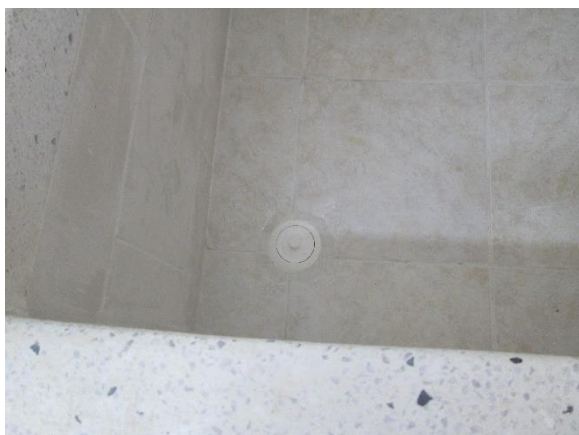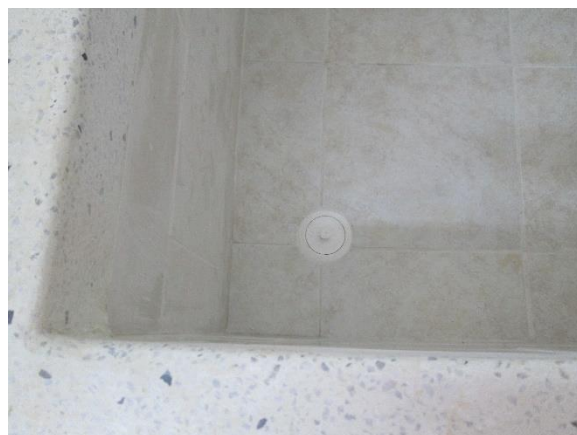

Ítem 27.35 - Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC de 1/2".



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.36 - Reparación, adecuación y anclaje de puntos hidráulicos de 1/2". Incluye demolición y reconstrucción de muro, mortero y pañete.



Ítem 27.37 - Suministro e instalación de canal en lámina HG C20 según diseño. Incluye Pintura base.



Ítem 27.38 - Bajante A.LL.4". Incluye accesorios, demolición y reconstrucción de piso.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.39 - Rectificación de alineamientos y adecuación de bajantes de aguas lluvias de 4". Incluye accesorios PVC y abrazaderas.



Ítem 27.40 - Limpieza de correas metálicas existentes. Incluye grata metálica y estopa.



Ítem 27.41 - Suministro e instalación de persiana rectangular metálica para la cocina en lámina C18 para marco y celosía en tubo cuadrado de 1". Incluye anticorrosivo y esmalte. Dimensiones: 4,02 m x 0,42 m.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.42 - Suministro e instalación de reja metálica en tubo cuadrado de 3/4" para el despacho de comida. Incluye bisagras, sistema de seguridad, malla antimosquitos, anticorrosivo y esmalte.



Ítem 27.43 - Suministro e instalación de ventanas tipo bancario en tubo cuadrado de 3/4". Incluye malla antimosquitos, anticorrosivo y pintura.



Ítem 27.44 - Reparación de puertas en mal estado incluyendo cambio en tramos de peinazos.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.45 - Suministro e instalación de marco y puerta con luceta C18 (2,7-2,4x1,00. Incluye chapa, bisagras y anticorrosivo.



Ítem 27.46 - Suministro e instalación de marco en lámina C18 para puerta (0,90 - 0,75). Incluye anticorrosivo, bisagras y anclaje.



Ítem 27.47 - Suministro e instalación de ventana tipo reja similar a la existente en el comedor.



EDELMIRA VARON CORONADO

Ingeniera Civil

Ítem 27.48 - Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 80 x 40 x 2,0 mm.



Ítem 27.49 - Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 20 x 10 x 2,0 mm.



Ítem 27.50 - Reparación de soportes de canal del aula múltiple Ítem 27.40 - Suministro e instalación de cinta asfáltica para impermeabilización de culatas.



EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.51 - Suministro e instalación de soportes de correas de cubierta para disminuir luz de carga en tubo rectangular 8 x 4 C 18 desarrollo 3,24 m.



Ítem 27.52 - Suministro e instalación de cinta asfáltica para impermeabilización de culatas.



Ítem 27.53 - Retiro y reinstalación de cocineta sala de profesores. Incluye acoples para poceta de lavaplatos.




EDELMIRA VARON CORONADO
Ingeniera Civil

Ítem 27.54 - Reconstrucción de línea interna de gas con línea nueva desde la cocina hasta la panadería. Incluye desinstalación de la red existente, reubicación de válvulas de control y todo lo necesario para dejar funcionando el sistema.



Ítem 27.55 - Construcción de poyos para mesón en cocina y despensa en concreto de 2.500 psi.




EDELMIRA VARON CORONADO
Contratista
