



Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

## INTRODUCCION.

El ministerio de Salud contrato con Constructora GED S.A.S la Adquisición e instalación de Fluxómetros y divisiones de las Baterías Sanitarias y la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos en las Sedes del Ministerio de conformidad a las especificaciones técnicas. El valor de cada bien o servicio ofertado es a todo costo, incluye: Suministro e Instalación, desmonte de lo existente y su correcto funcionamiento, mano de obra, transporte; cuyas actividades realizadas quedan evidenciadas como se muestra a continuación.



### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. DEMONTE DE FLUXOMETROS		84 UNIDADES
<p><b>ACTIVIDAD CONTRACTUAL:</b> <i>Desmonte de fluxómetro existente, incluye drenaje de la tubería, para eliminación de residuos existentes y el correcto funcionamiento de la válvula sanitaria. Incluye desmonte de 2 piezas de cerámica de enchape de 30 x 60.</i></p>		
ANTES	DESPUES	
		
		



Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESARIOS PARA TUBERIA HIDRAULICA EXISTENTE		84 UNIDADES
<p><b>ACTIVIDAD CONTRACTUAL:</b> <i>Adquisición e instalación de accesorios a la tubería hidráulica existente, para la instalación de la válvula sanitaria. Los accesorios pueden variar, según el punto sanitario. - 2 bujes de 2" a 1" ¼.</i></p>		
ANTES	DESPUES	

6



Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

<b>3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH.</b>		<b>84 UNIDADES</b>
<b>ACTIVIDAD CONTRACTUAL: Adquisición e instalación de válvula institucional sanitaria desempotrar Tipo Push.</b>		
<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>	
		
		



<b>4. DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO</b>	<b>6 M2</b>
--	-------------

*Desmante de divisiones de baño batería sanitaria mujeres piso mezzanina, incluye acopio en un sitio destinado por la entidad para su retiro por parte del contratista (cotizado en el último ítem)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>5. ADQUISICION E INSTALACION PUERTA DERECHA</b>	<b>2 UNIDADES</b>
--	-------------------

*Adquisición e instalación puerta derecha fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entaborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 \* 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>6. ADQUISICION E INSTALACION PUERTA IZQUIERDA</b>	<b>1 UNIDAD</b>
--	-----------------

**Adquisición e instalación puerta izquierda fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 \* 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)**

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>7. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DIVISIONES</b>	<b>2 UNIDADES</b>
---	-------------------

*Adquisición e instalación división fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,47\*1,60 m (incluye accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

8. AQUISICION E INSTALACION DE PARED		2 UNIDADES
<p><i>Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,21*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)</i></p>		
ANTES	DESPUES	
		



<b>9. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE EN LAMINA</b>	<b>1 UNIDAD</b>
---	-----------------

*Adquisición e instalación de frente íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,49\* 1,76 m (incluye accesorios y tornillería)*

<i>ANTES</i>	<i>DESPUES</i>
--------------	----------------





Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.


10. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE PARED		1 UNIDAD
<i>Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,29*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)</i>		
ANTES	DESPUES	
		



<b>11. DESMONTE DE DIVISIONES BAÑOS MEZZANINES</b>	<b>7 M2</b>
--	-------------

*Desmante de divisiones de baño batería sanitaria hombres piso mezzanine, incluye acopio en un sitio destinado por la entidad para su retiro por parte del contratista (cotizado en el último ítem)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------

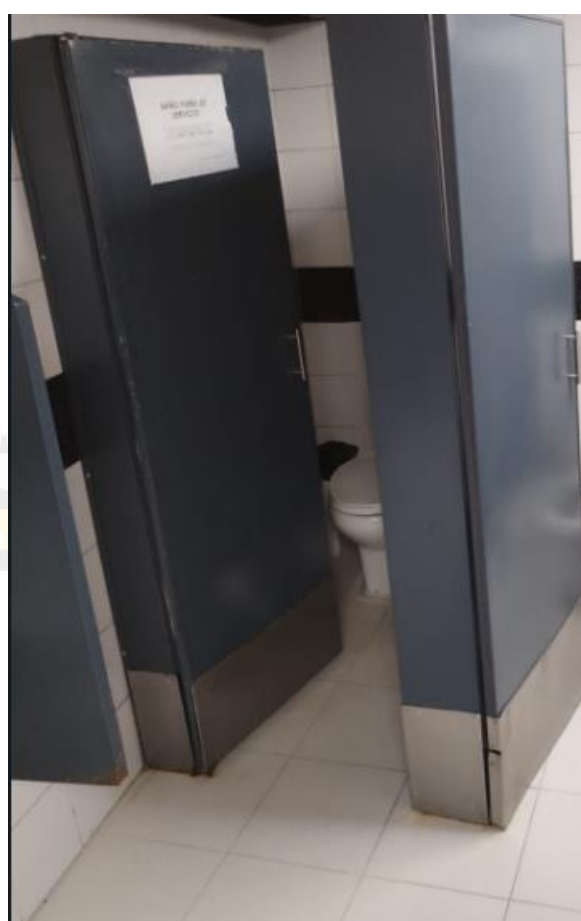




<b>12. ADQUISICION E INSTALACION PUERTA</b>	<b>1 UNIDAD</b>
---	-----------------

*Adquisición e instalación puerta derecha fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 \* 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------

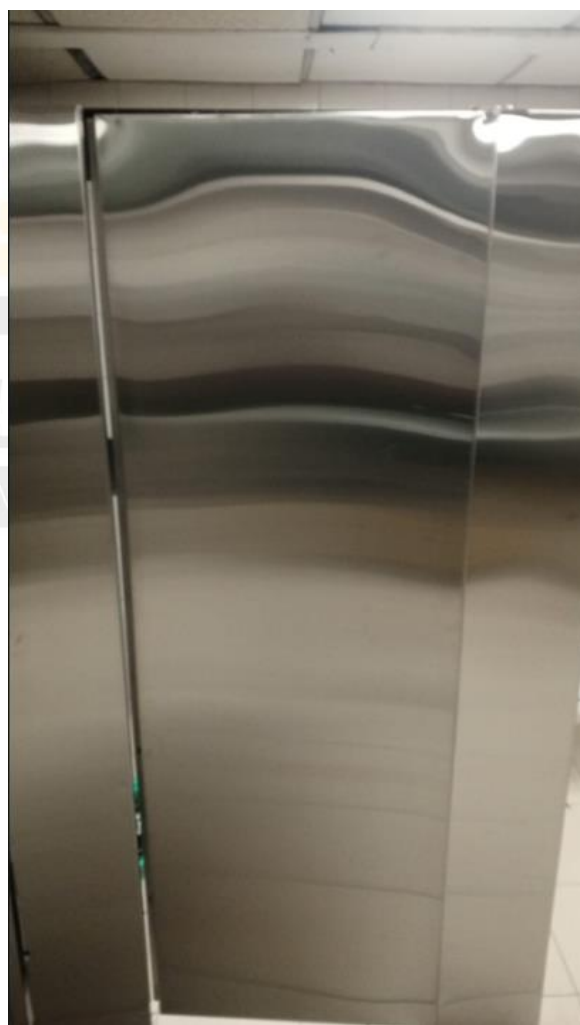



<b>13. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE PARED</b>	<b>2 UNIDAD</b>
--	-----------------

*Adquisición e instalación puerta izquierda fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado. La puerta con cerrador o pasador en acero inoxidable y bisagras tipo pivote de 0,59 \* 1,70 m (incluye herrajes, accesorios y tornillería))*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

<b>14. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE PARED</b>	<b>2 UNIDAD</b>
<p><i>Adquisición e instalación división fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,47*1,60 m (incluye accesorios y tornillería)</i></p>	
<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
	



<b>15. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE PARED</b>	<b>1 UNIDAD</b>
--	-----------------

*Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,14\*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>16. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE PARED</b>	<b>1 UNIDAD</b>
--	-----------------

*Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,18\*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>17. ADQUISICION E INSTALACION DE FRENTE PARED</b>	<b>1 UNIDAD</b>
--	-----------------

*Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,43\*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>18. ADQUISICION E INSTALACION DE FRETE PARED</b>	<b>1 UNIDAD</b>
---	-----------------

*Adquisición e instalación de frente pared fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 0,11.5\*1,76 m (incluye accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------





<b>19. ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISION DE ORINAL</b>	<b>3 UNIDAD</b>
--	-----------------

*Adquisición e instalación de división de orinal fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable calibre 22 tipo 304 /2b resistente a los ácidos. Con interior entamborado en poliuretano inyectado de 1,00\*0,80 (incluye accesorios y tornillería)*

<b>ANTES</b>	<b>DESPUES</b>
--------------	----------------

