

1. DATOS GERNERALES DEL CONTRATO

NO. DE ORDEN DE SERVICIOS:	IPVO- 029-2025
CONTRATANTE	TIERRA SUA SAS
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CV-ITBOY-0172 DE 2025 CELEBRADO ENTRE INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY Y TIERRASUA S.A.S
VALOR INICIAL:	MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTES (\$ 1.909.410.876,75)
ADICIONAL No. 1	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$378,606,573.56 M/CTE.).
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y UNA CENTESIMAS (\$ 2.288.017.450,31 M/CTE)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PRORROGA No. 1	Tiempo: 45 DÍAS Fecha: 14 enero 2026
PRORROGA No. 2	Tiempo: 60 DÍAS Fecha: 27 febrero 2026
PRORROGA No. 3	Tiempo: 30 DÍAS Fecha: 29 abril 2026
PLAZO TOTAL:	CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DIAS
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1	Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICIO NO. 1	Fecha: 14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	30 DE MAYO DE 2026
ESTADO ACTUAL	En ejecución

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN
1	ACTIVIDADES PREPARATORIAS Y DE MANTENIMIENTO	
1,1	Retiro de elementos	
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	Und
1,20	Adecuación de elementos	
1.2.01	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	Und
2,00	DEMARCAACION Y SENALIZACIÓN HORIZONTAL	
2,10	Demarcación lineal	
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML
2,20	Demarcación de pictogramas	
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2
2,30	Dispositivos y elementos de seguridad vial	
2.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND
2.3.02	SUMINISTRO EE INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES D = 10 CM. H = 25 CM. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y/O ANCLAJE).	UND
2.3.03	CONSTRUIR BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2 CM DE ALTURA, CONFORMADAS POR GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA CON ANCHO MÍNIMO DE 25 CM	M2
3,00	SENALIZACIÓN VERTICAL	
3,10	Señales simples y dobles	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN

3.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND
3.1.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 60CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND
3.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND
3.1.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 75CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND
3.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO DE 0.90 X 1.13 M. (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS.	UND
3,2	Otras señales	
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND
3.2.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND
3.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50M. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	ML
4	OTROS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	
4,1	Elementos temporales de obra	
4.1.01	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS- BARRERAS PLÁSTICAS (MALETINES)	UND
4.1.02	DISPOSITIVO DE CANALIZACIÓN EN OBRAS - DELINEADORES TUBULARES	UND

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el presente periodo, comprendido entre el 14 de enero y el 27 de marzo de 2026, se ejecutaron actividades en los municipios de Corrales, Ramiriquí, Ciénega, Cuitiva, Monguí, Floresta, Tobasía, Belén, Sogamoso y Duitama. En estas localidades se desarrollaron labores de retiro, mantenimiento y reposición de señales de tránsito existentes, así como la implementación de nueva señalización vertical y horizontal.

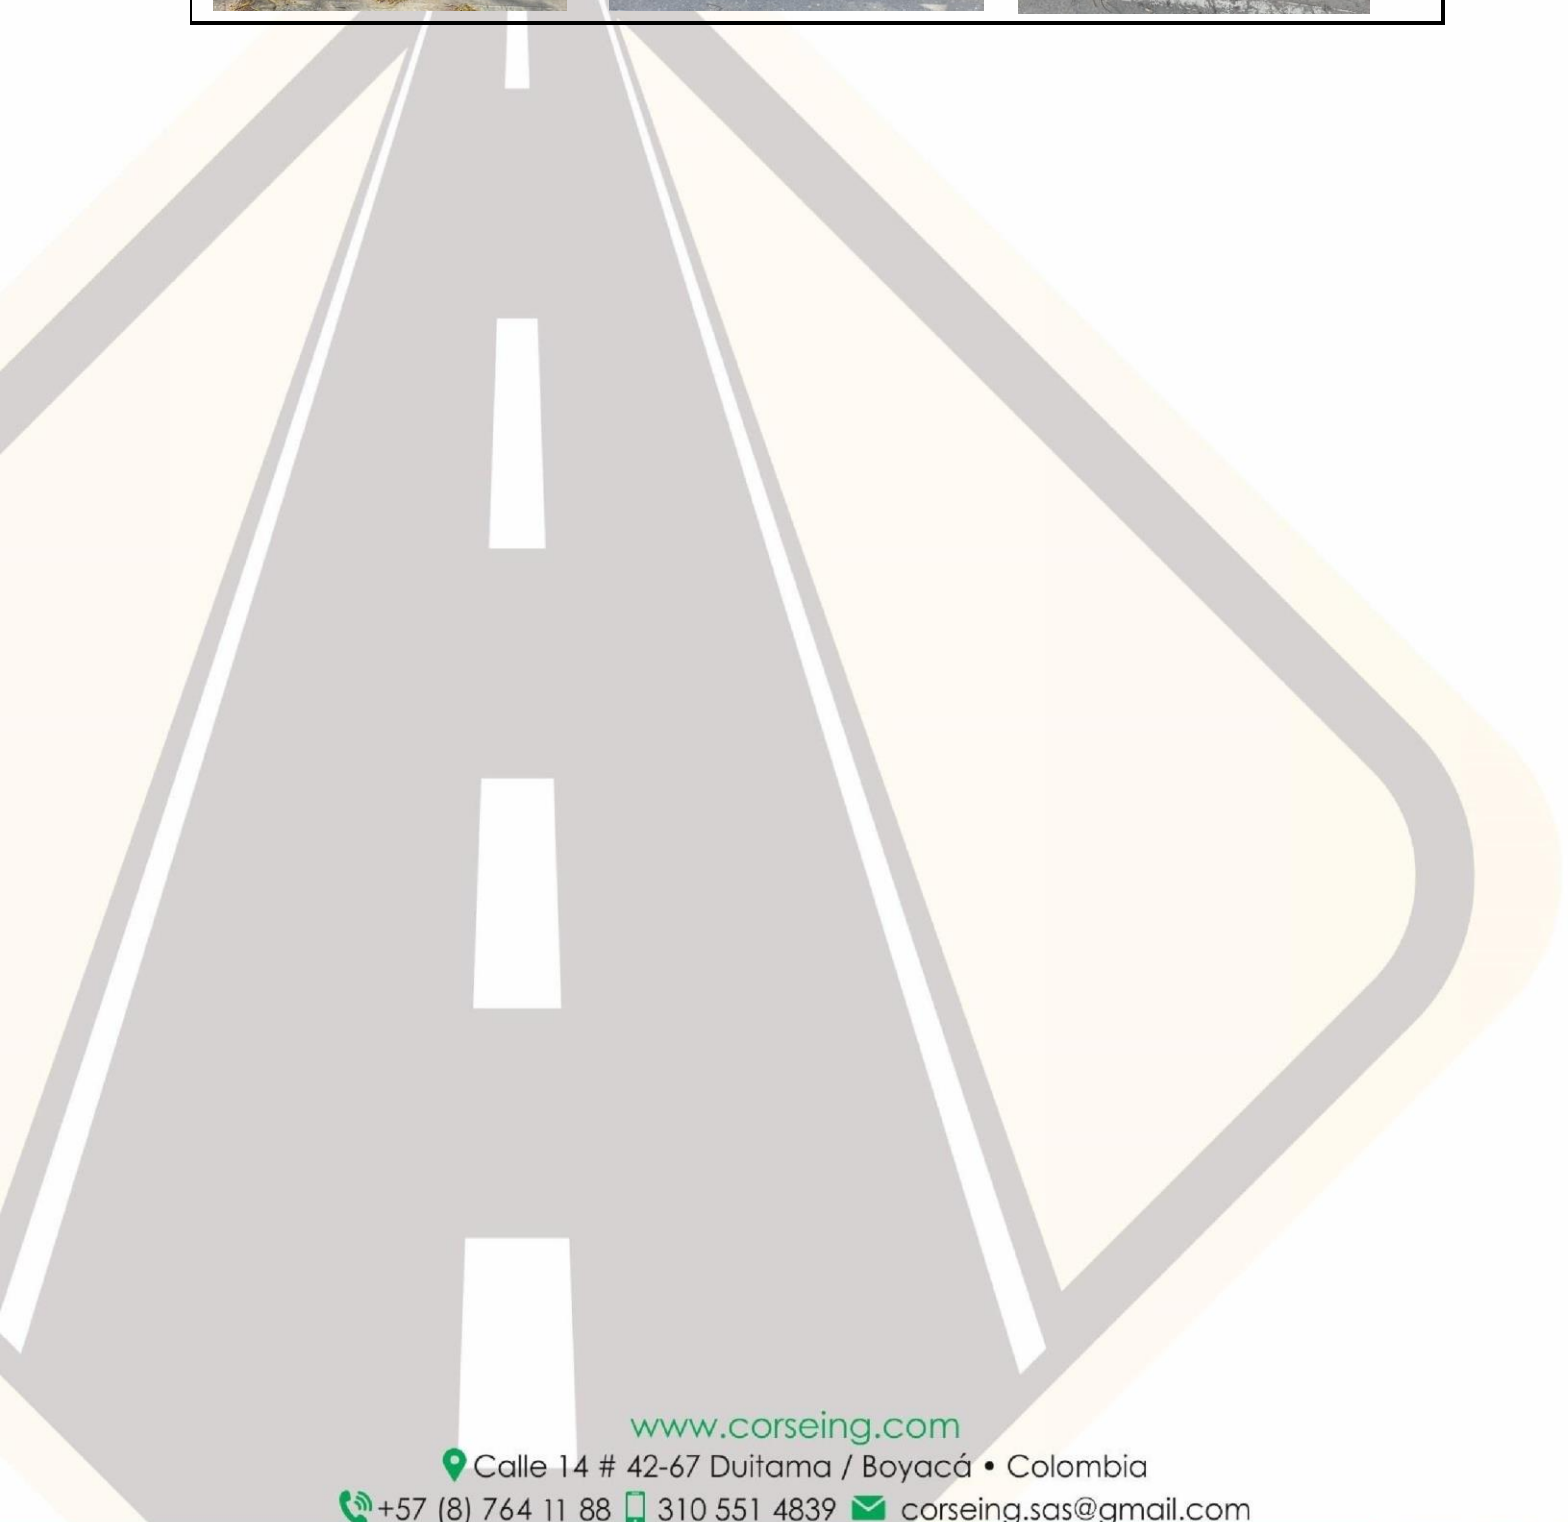
Las actividades se llevaron a cabo con base en los diseños y especificaciones técnicas suministrados enfocándose su alcance en la implementación en campo. De igual manera, durante la ejecución se tuvieron en cuenta los lineamientos técnicos establecidos en el Manual de Señalización Vial 2024, procurando la adecuada instalación, ubicación y visibilidad de los dispositivos de señalización

Las actividades ejecutadas, junto con sus respectivas cantidades, se describen a continuación:

• CUITIVA

CUITIVA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	40
	  		
1.2.01	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	Und	2
	 		
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	ML	1997,5
	 		

2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	1997,5
 14/02/2026 11:50:19 a. m. 5.5793474N 72.967279W 3-75 Calle 2ª Cultiva Boyacá		 14/02/2026 12:06:55 p. m. 5.5807013N 72.9664260W 3-75 Calle 2ª Cultiva Boyacá W 116.02733 2m/smm	
3.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	3
			
			
3.1.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 60CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND	4
			
			
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	30



www.corseing.com

📍 Calle 14 # 42-67 Duitama / Boyacá • Colombia

☎ +57 (8) 764 11 88 📱 310 551 4839 ✉ corseing.sas@gmail.com



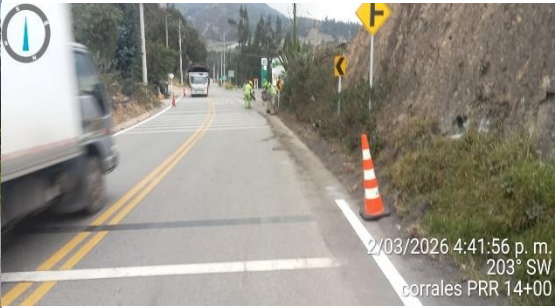
• CUITIVA PUNTO CRITICO

CUITIVA - PUNTO CRITICO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	59
			
1.2.01	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	Und	2
			
3.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	18
			
3.1.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 75CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16	UND	2

	(INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)		
			
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	36
			

• **CORRALES**

CORRALES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	15
			
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	813,6
 			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	813,6
 			
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	77,6

	 29/01/2026 12:51:52 p. m. 5.82768808N 72.84081594W 202° S 4e195 Calle 7 Corrales Boyacá	 2/03/2026 4:41:56 p. m. 203° SW corrales PRR 14+00	
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIA. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	71,06
	 29/01/2026 12:49:42 p. m. 5.82768808N 72.84081594W 202° S 4e195 Calle 7 Corrales Boyacá	 29/01/2026 12:49:42 p. m. 5.82768808N 72.84081594W 202° S 4e195 Calle 7 Corrales Boyacá	
2.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	90
	 2/03/2026 5:46:41 p. m. 191° S corrales PRR 14+00  2/03/2026 5:50:17 p. m. 189° S corrales PRR 14+00  2/03/2026 5:50:30 p. m. 177° S corrales PRR 14+00  2/03/2026 5:46:34 p. m. 57° NE corrales PRR 14+00		
3.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	5

					
3.1.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 60CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)			UND	5
					
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).			UND	8
					

• CIENEGA A RAMIRIQUI

CIENEGA A RAMIRIQUI			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	8
  			
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	12.441,5
   			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	12.441,5
  			
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	37,08

	 21/03/2026 7:52:04 a. m. 5.3993453N 73.3279455W Ramiriquí Boyacá		
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	37,08
	 21/03/2026 10:36:05 a. m. 5.4002047N 73.3241994W Ramiriquí - Cienega Ramiriquí Boyacá		
3.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	26
	 26 Feb 2026 08:58:56 a.m. 5.3993453N 73.3279455W Ramiriquí - Cienega Ramiriquí Boyacá 26 Feb 2026 09:51:29 a.m. 5.4002047N 73.3241994W Ramiriquí - Cienega Ramiriquí Boyacá 26 Feb 2026 10:16:25 a.m. 5.4002047N 73.3241994W Ramiriquí - Cienega Ramiriquí Boyacá 26 Feb 2026 10:41:29 a.m. 5.4002047N 73.3241994W Ramiriquí - Cienega Ramiriquí Boyacá		
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	42



www.corseing.com

📍 Calle 14 # 42-67 Duitama / Boyacá • Colombia

☎ +57 (8) 764 11 88 📠 310 551 4839 ✉ corseing.sas@gmail.com

• DUITAMA ZONA ESCOLAR

DUITAMA ZONA ESCOLAR			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	7
 			
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	2135.6
  			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	2135.6
   			

2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	275.97
			
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIA. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	185.41
			
2.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	228
			
3.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	UND	8

					
3.1.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 60CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)			UND	3
 16/02/2026 12:24:58 p.m. 5.79029239N 73.04751799W 252° W Duitama Boyacá				 16/02/2026 12:34:35 p.m. 5.79576548N 73.05124022W 66° NE Duitama Boyacá	
3.2.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL SR - SP - SI DE 60 CM CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)			UND	8
				 16/02/2026 12:31:08 p.m. 5.78967309N 73.04805195W 246° SW Km 3 Paipa-Duitama Duitama Boyacá	

• MONGUI

MONGUI			
ITEM	DECRIPCCION	UND	CANTIDAD
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	6122.5
			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	6162.5
			

- DUITAMA DOLLARCITY

DUITAMA DOLLARCITY			
ITEM	DECRIPCCION	UND	CANTIDAD
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	422.8
			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	422.8
			

• BELEN

BELEN			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	3
			
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	1604,92
			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	1604,92
			
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	115,763

			
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	85,161
			
3.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	1
			
3.1.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 75CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND	2



www.corseing.com

📍 Calle 14 # 42-67 Duitama / Boyacá • Colombia

☎ +57 (8) 764 11 88 📠 310 551 4839 ✉ corseing.sas@gmail.com

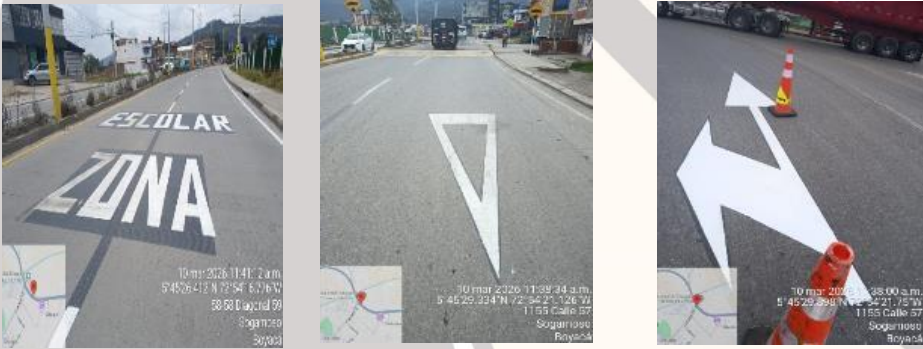
• **SOGAMOSO**

SOGAMOSO GUSTAVO JIMENEZ			
ITEM	DECRIPCCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	30
			
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	ML	1744
			
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIA	ML	1744
			

www.corseing.com

📍 Calle 14 # 42-67 Duitama / Boyacá • Colombia

☎ +57 (8) 764 11 88 📠 310 551 4839 ✉ corseing.sas@gmail.com

2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	238.153
			
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIA. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	159.32
			
3.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	20
			
3.1.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 75CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND	2

			
3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	8
			

- FLORESTA – ALTO DE TOBASIA

FLORESTA- ALTO TOBASIA			
ITEM	DECRIPCCION	UND	CANTIDAD
1.1.01	RETIRAR SEÑALES VERTICALES (INCLUYE PEDESTAL Y TABLERO) CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS Y DOBLES)	UND	6
 			
2.1.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO 15 CM, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	ML	16198.7

	 4/02/26 14:31 Santa Rosa de Viterbo-Tobiasia Floresta Boyacá		 4/02/26 16:55 Santa Rosa de Viterbo-Tobiasia Floresta Boyacá
2.1.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	16198.7
	 7/02/2026 3:38:23 p.m. Floresta Boyacá		 6/02/2026 10:20:32 a.m. Santa Rosa de Viterbo-Tobiasia Floresta Boyacá
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	153.582

			
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	126.53
			
3.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	38

		
3.1.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 75CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND 11
		

- FLORESTA PUNTO CRITICO

FLORESTA PUNTO CRITICO			
ITEM	DECRIPCCION	UND	CANTIDAD
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	73,24
 3/02/2026 5:57:17 p. m. 5.85305216N 72.92802375W 274° W Tobasía-Floresta Floresta Boyacá			
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	60,772

			
3.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 x 75 CM.	UND	4
			
3.1.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑAL DOBLE DE 75CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 (INCLUYE PEDESTAL SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)	UND	2



3.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 0.40M X 0.50 M. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE POSTE METÁLICO).	UND	6
			

- **FLORESTA ZONA ESCOLAR**

FLORESTA ZONA ESCOLAR			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
2.2.01	SUMINISTRAR Y APLICAR IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	M2	96,36
  2/07/2024 4:10:15 p. m. 5.85865719N 72.91870713W 347 ft # 3-31 Carrera 4 Floresta Boyacá			
2.2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	63,623
 2/07/2024 4:10:15 p. m. 5.85865719N 72.91870713W 347 ft # 3-31 Carrera 4 Floresta Boyacá			
