

RICARDO GELVEZ MORENO
INGENIERO CIVIL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA – PGIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO LP-SI-017-2023

**PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA
CALLE 28, ENTRE AVENIDA 0 Y AVENIDA 1E DEL
BARRIO LA CORDIALIDAD, DEL MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTANDER**

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	6
1. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS	6
1.1 RECURSO HUMANO	6
1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO	7
COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA	8
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8
1 KIT ELEMENTO DE PROTECCION: EL KIT INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO POR PERSONA, PERSONAL OPERTAIVO DE LOS FRENTES DE OBRA (NCLUYE CASCO DE SEGURIDAD GUANTE DE CARNAZA O GUANTE DE CAUCHO, LENTE DE PROTECCION Y UNIFORME DE IDENTIFICACION DE LA OBRA) DURANTE EL TIEMPO TOTAL DE LA OBRA, CANTIDAD = NUMERO DE PERSONAL ESTIMADO EN OBRA UND 7,00	8
3 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO: EXAMENES DE INGRESO Y/O EGRESO QUE INCLUYE AGUEDEZA VISUAL TALLA Y PESO TENSION ARTERIAL CEROLOGIA PARA TODO EL PERSONAL EXCEPTO PERSONA DE TRABAJO EN ALTURA, CANTIDAD = NUMERO ESTIMADO DE PERSONAL EN OBRA. UND 5,00	9

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

GESTIÓN DOCUMENTAL Y PRODUCTOS.....	14
1 ELABORACIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
UND 1,00.....	14
3 PLANOS RECORD PAVIMENTO (DIGITALIZACION Y PLOTEO) UND 1,00	
19	
3.1 Plano de topografía antes de intervención.....	19
3.2 Perfiles de terreno antes de intervención.....	20
3.3 Plano récord de topografía obra terminada	21
3.4 Perfiles de corte de pavimento terminado.....	22
3.5 Perfiles área de corte para cálculo de volúmenes	23
DISEÑO Y CONTROL DE MEZCLAS.....	24
1 DISEÑO MEZCLA CONCRETO HIDRÁULICO PESO NORMAL F'C: 21MPA	
Y 17.5 MPA UND 2,00	24
2 ENSAYOS BÁSICOS EN ARENAS PARA DISEÑO DE MEZCLAS:	
HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRÍA Y MODULO DE FINURA,	
COLORIMETRÍA, EQUIVALENTE DE ARENA, PESO ESPECIFICO Y	
ABSORCIÓN, MASAS UNITARIAS SUELTAS Y COMPACTACIÓN UND 2,00	
28	
3 ENSAYOS BÁSICOS EN TRITURADOS PARA DISEÑO DE MEZCLAS:	
HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRÍA, DESGASTE MAQUINA DE LOS	
ÁNGELES, PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN, MASAS UNITARIAS	
SUELTAS Y COMPACN UND 2,00.....	36

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

4 TRANSPORTE DE MUESTRAS Y/O MATERIAL PARA ENSAYOS UND 4,00.....	52
ENSAYOS DE RESISTENCIA	53
1 MUESTREO Y ENSAYOS SOBRE CILINDROS DE CONCRETO A EDADES DE 3, 7, 14 Y 28 DÍAS, PARA DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (NTC-673) UND 20,00.....	53
CONTROL DE COMPACTACIÓN.....	54
1 ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO (INV-13 E-142) PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE COMPACTACIÓN DE LOS MATERIALES DE RELLENO UND 4,00	54
2 ENSAYOS DE DENSIDAD SECA IN SITU (CONO ARENA) PARA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO UND 4,00.....	55
CONCLUSION	56

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

INTRODUCCIÓN

En el presente informe de cierre del Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO, describe un conjunto de acciones que se han desarrollado en cumplimiento de las especificaciones del CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-SI-017-2023 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 28, ENTRE AVENIDA 0 Y AVENIDA 1E DEL BARRIO LA CORDIALIDAD, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER el cual se inició el día 05 de febrero de 2.024.

Durante el desarrollo de las actividades se implementaron actividades de carácter técnico y administrativas, ceñidas a los parámetros establecidos en las normas técnicas.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 28, ENTRE AVENIDA 0 Y AVENIDA 1E DEL BARRIO LA CORDIALIDAD, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

CONTRATO DE OBRA: NO LP-SI-017-2023

CONTRATISTA: RICARDO GELVEZ MORENO

INTERVENTORIA: OBRAINCOL SAS R/L ROSSANA YARUMA CONTRERAS LEMUS

SUPERVISIÓN: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

1.1 RECURSO HUMANO

Estimativo personal involucrado en la ejecución de los trabajos:

- Ingeniero director de obra
- Ingeniero auxiliar de residencia
- Ayudantes de obra
- Maestro de obra

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pissarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO

- Estación topográfica
- Nivel de precisión
- Retrocargador (Pajarita)
- Rodillo compactador
- Motoniveladora
- Volqueta
- Vibrador (benitin)
- Compactador de Plancha pequeña (canguro)
- Motobomba
- Herramienta menor

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 KIT ELEMENTO DE PROTECCION: EL KIT INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO POR PERSONA, PERSONAL OPERTAIVO DE LOS FRENTE DE OBRA (NCLUYE CASCO DE SEGURIDAD GUANTE DE CARNAZA O GUANTE DE CAUCHO, LENTE DE PROTECCION Y UNIFORME DE IDENTIFICAION DE LA OBRA) DURANTE EL TIEMPO TOTAL DE LA OBRA, CANTIDAD = NUMERO DE PERSONAL ESTIMADO EN OBRA UND 7,00

Se efectuó entrega de kits de protección descrito, a los trabajadores de la obra.



Imagen 1 y 2 evidencia del personal con su respectiva dotación.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

3 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO Y EGRESO: EXAMENES DE INGRESO Y/O EGRESO QUE INCLUYE AGUEDEZA VISUAL TALLA Y PESO TENSION ARTERIAL CEROLOGIA PARA TODO EL PERSONAL EXCEPTO PERSONA DE TRABAJO EN ALTURA, CANTIDAD = NUMERO ESTIMADO DE PERSONAL EN OBRA. UND 5,00

Se adjunta copia de los exámenes realizados al personal.

 CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL
LICENCIA S.O. No. 004893
EXAMEN DE INGRESO
ENFASIS OSTEO MUSCULAR


FECHA 02/02/2024	HORA 06:44:09	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
EMPRESA 31214502-6 LUIS ALBERTO GARCIA		
NOMBRE SANTOS APARICIO DIAZ		
CC. 1090391009 DE CUCUTA		
CARGO OPERERO		
DIRECCION CALLE 14 AVENIDA 52 NUMERO 52-50 BARRIO ANTONA SANTOS		
TELEFONO NO TIENE CELULAR 3105879463 EDAD 35 GENERO M RH A+		
A.F.P. PORVENIR A.R.L. SURA E.P.S. NUEVA EPS		
EXAMENES MEDICOS: EXAMEN FISICO COMPLETO, TALLA, PESO, PRESION ARTERIAL, PRUEBAS DE COORDINACION, EXPLORACION DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MUSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES); PRUEBA PARA TUNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDONITIS TENDONOVITIS Y TENDONITIS DE MUÑECA, PRUEBAS DINAMICAS DE COLUMNA, EXPLORACION DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEO TENDINOSOS, EXPLORACION DE ALTERACIONES DE FLEJ Y VARGES, EXPLORACION DE HERNIAS.		
AUDIOMETRIA NO	EXAMEN DE VOZ NO	OPTOMETRIA NO
PSICOLOGIA NO	RX TORAX NO	RX COLUMNA NO
ELECTROCARDIOGRAMA NO		
Espirometria NO		
LADROPATIA		
OTROS EXAMENES		
CONCEPTO DE APTITUD SIN RESTRICCION PARA EL CARGO		
RECOMENDACIONES: REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS.		
INGRESA AL SVE N/A		
ENFASIS OSTEO MUSCULAR		
Certifico que toda la informacion suministrada en este documento es verdadera y no oculta informacion sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen. Se entrega al trabajador la informacion de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periodo y/o retorno) dando cumplimiento a la Resolucion 2346 de 2007 Art. 10 y Resolucion 6312 de 2015 y las normas que la modifican, adonde, sustituyan o derroquen, con la unica finalidad en la promoci6n de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevencion y control de alteraciones de la salud.		
		
		
ANGELA MARIA BARRIOS ROJAS MD. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REG. MEDICO 3376 LICENCIA S.O. 005238		
SANTOS APARICIO DIAZ CC: 1090391009 *1090391009020220		
CALLE 21A NO. 06-75 BARRIO EL ROSAL Tel. 5460755 CELULAR 3160253447 - 3042470156 - Febrero 02 de 2024 - 11:04:01 Page 1/2-24- Versión 01		

Imagen 3 evidencia Examen de ingreso.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004893

EXAMEN DE INGRESO

ENFASIS OSTEO MUSCULAR

FECHA 02/02/2024		HORA 09:37:04		CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	
EMPRESA 31214502-6 LUIS ALBERTO GARCIA					
NOMBRE ELDER STEVEN MANCHEGO GARCIA					
CC: 1090465415 DE LOS PATIOS					
CARGO OBRERO					
DIRECCION CALLE 4 AVENIDA 9 # 4154 BARRIO SEVILLA					
TELEFONO NO TIENE CELULAR 3114507829 EDAD 40 GENERO M RH O*					
A.P.P. OTRO A.R.L. SUR A P.1. NUEVA EPS					
EXAMENES MEDICOS: EXAMEN PSICO FISICO COMPLETO, TAMBALÉ VISUAL, SISTEMA CARDIO PULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MUSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECAS, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TUNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENDINOVITIS Y TRASTORNOS DE MUÑERO, PRUEBAS DINAMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEO TENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y UNGÜES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS					
AUDIOMETRIA	NO	EXAMEN DE VOZ	NO	OPTOMETRIA	NO
PSICOLOGIA	NO	RX TORAX	NO	RX COLUMNA	NO
ESPIROMETRIA NO					
ELECTROCARDIOGRAMA NO					
LABORATORIO					
OTROS EXAMENES					
CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO					
RECOMENDACIONES: ADECUADO MANEJO DE CARGAS, IMPLIMENTE UNA ADECUADA HIGIENE POSTURAL, REALICE PAUSAS ACTIVAS COMPLEMENTARIAS, USAR ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y/O PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIFICOS DE SU LABOR, CAPACITACIÓN EN RESGOS ASOCIADOS A SU LABOR, FOMENTE EL AUTOCUIDADO Y ESTABLEZCA HABITOS DE VIDA SALUDABLES.					
INGRESA AL SVE Biomecánico					
ENFASIS OSTEO MUSCULAR					



RUBY LOZADA

RUBY LORENA LOZADA MUÑOZ
MD. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REG. MEDICO 1030643060 LICENCIA S.O. 1359

ELDER STEVEN MANCHEGO GARCIA
CC: 1090465415

*1090465415020220

CALLE 21A NO. 05-75 BARRIO EL ROSAL, TEL: 5469755, CELULAR 3160253447 - 3042470156 - Febrero 02 de 2024 - 11:04:29 Page 12 de 14 Versión 01

Imagen 4 evidencia Examen de ingreso

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



Progresando
en Salud **IPS**

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004893

EXAMEN DE INGRESO

ENFASIS OSTEO MUSCULAR

FECHA 02/02/2024 HORA 15:30:15		CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	
EMPRESA 91214502-6 LUIS ALBERTO GARCIA			
NOMBRE EDWIN ALEJANDRO MENDEZ VEGA			
CC 1005037798	DE LOS PATIOS		
CARGO OBRERO			
DIRECCION CALLE 2 11 A 20 MONTEBELLO 2 LOS PATIOS			
TELEFONO	CELULAR 3203361134	EDAD 20	GENERO M RH O+
A.F.P. OTRO	A.R.L. SURA	E.F.S. SALUDVIDA	
EXAMENES MEDICOS: EXAMEN FISICO COMPLETO, TAMBALE VISUAL, SISTEMA CARDIO PULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MUSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES); PRUEBA PARA TUNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDONITIS, TENDONAVITIS Y TRASTORNOS DE MUÑECA, PRUEBAS DINAMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEO TENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VAGOS, EXPLORACIÓN DE HERNIAS			
AUDIOMETRIA NO	EXAMEN DE VOZ NO	OPTOMETRIA NO	VISIOMETRIA NO
PSICOLOGIA NO	RX TORAX NO	RX COLUMNA NO	ELECTROCARDIOGRAMA NO
LABORATORIO			
OTROS EXAMENES			
CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO			
RECOMENDACIONES: REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, IMPLEMENTAR AUTOCUIDADO, PRACTICAR ESTILO DE VIDA SALUDABLE, CANTABILITACIÓN EN RESIGUOS ASOCIADOS A SU LABOR			
INFORMES AL SVE N/A			
ENFASIS OSTEO MUSCULAR			



Se certifica que toda la información suministrada en este documento es verdadera y no oculta información sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen. Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periodo y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007 Art. 10 y Resolución 0312 de 2015 y las normas que la modifican, adición, sustitución o derogan, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Tajaira

EDITH YAJAIRA ANAVITARTE CORRE
MD. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REG. MEDICO 2894 LICENCIA S.O. 00392

EDWIN ALEJANDRO MENDEZ VEGA
CC: 1005037798

* 10050377980202024

CALLE 27 A NO. 08-75 BARRIO EL ROSAL Tel. 5460755, CELULAR 3160293447 - 3042470156 - Febrero 02 de 2024 - 15:30:56 Pagina 1PMD-240 Versión 01

Imagen 5 evidencia Examen de ingreso

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



Progresando
en Salud

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004893

EXAMEN DE INGRESO

ENFASIS OSTEO MUSCULAR

FECHA 02/02/2024	HORA 16:28:50	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
EMPRESA 91214502-6 LUIS ALBERTO GARCIA		
		
NOMBRE WILSON OSMAR SERRANO PARRA		
CC 1093734063 DE VILLA ROSARIO		
CARGO OBRERO		
DIRECCION MANZANA O LOTE 24 BARRIO VALLES DEL MIRADOR		
TELEFONO NO TIENE	CELULAR 3203607367	EDAD 19 GENERO M RH O+
A.F.P. OTRO	A.R.L. SURA	E.P.S. NUEVA EPS
EXAMENES MEDICOS: EXAMEN FISICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIO PULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACION, EXPLORACION DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MUSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES); PRUEBA PARA TUNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENDINOPATIAS Y TRASTORNOS DE MUÑEQUERO, PRUEBAS DINAMICAS DE COLUMNA, EXPLORACION DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEO TENDINOSOS, EXPLORACION DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARGES, EXPLORACION DE HERNIAS.		
AUDIOMETRIA NO	EXAMEN DE VOZ NO	OPTOMETRIA NO
PSICOLOGIA NO	RX TORAX NO	RX COLUMNA NO
LABORATORIO		
OTROS EXAMENES		
CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCION PARA EL CARGO		
RECOMENDACIONES: REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, IMPLEMENTAR AUTOCUIDADO, PRACTICAR ESTILO DE VIDA SALUDABLE, CAPACITACION EN RIESGOS ASOCIADOS A SU LABOR, PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA COVID-19, DE ACUERDO A LA EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL REALIZADA HOY NO PRESENTA EN EL MOMENTO NINGUN TIPO DE SIGNO O SINTOMA RELACIONADO CON LA ENFERMEDAD COVID-19, SIN EMBARGO, SU ACTUAL ESTADO DE SALUD NO GARANTIZA QUE EN DIAS POSTERIORES NO PUEDA PRESENTAR SIGNOS O SINTOMAS RELACIONADOS CON DICHA ENFERMEDAD.		
INGRESA AL SVE N/A		
ENFASIS OSTEO MUSCULAR		

Certifico que toda la informacion suministrada en este documento es verdadera y no oculta informacion sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen.
Se entrega al trabajador la informacion de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periodo y/o retorno), dando cumplimiento a la Resolucion 2346 de 2017, Art. 10 y Resolucion 0312 de 2015 y las normas que la modifican, adicionen, sustituyan o derroquen, con la unica finalidad en la promocion de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevencion y control de alteraciones de la salud.

Tajaira

EDITH YAJAIRA ANAVITARTE CORRE
MD. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REG. MEDICO 2894 LICENCIA S.O. 00392

WILSON OSMAR SERRANO PARRA
CC : 1093734063

10937340630202202

CALLE 21A NO 06-75 BARRIO EL ROSAL Tel: 5469755, CELULAR 3160253447 - 3042470156 - Febrero 02 de 2024 - 16:29:01 Pagina 1/1 REG-3-01 Versión 01

Imagen 6 evidencia Examen de ingreso

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. N° 004893

EXAMEN DE INGRESO

ENFASIS OSTEO MUSCULAR

FECHA 02/02/2024 HORA 16:38:12		CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	
EMPRESA 912145024 LUIS ALBERTO GARCIA			
NOMBRE BRAYAN ANDRES ZAPATA MENDOZA			
CC: 1090508322 DE CUCUTA			
CARGO OBRERO			
DIRECCION BARRIO SAN RAFAEL			
TELÉFONO NO TIENE CELULAR 3137552592 EDAD 29 GÉNERO M RH O-			
A.F.P. OTRO A.R.L. SURA E.P.S. OTRO			
EXÁMENES MÉDICOS: EXÁMEN FÍSICO COMPLETO: TÁCTIL, VISUAL, SISTEMA CARDIO PULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MUSCULO TUBERO HUMEROS, MUÑECA, MANOS, TRÁPEZIO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES; PRUEBA PARA TUNEL DEL CARPO; PRUEBA PARA TENDINITIS, TENDOSINOVITIS Y TRAUMATISMOS DE MUÑEY; PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA; EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEO TENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VÁRICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.			
AUDIOMETRIA	NO	EXAMEN DE VOZ	NO
PSICOLOGIA	NO	RX TORAX	NO
		RX COLUMNA	NO
		ELECTROCARDIOGRAMA	NO
LABORATORIO			
OTROS EXÁMENES			
CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO			
RECOMENDACIONES: ACTIVIDAD FÍSICA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, VALORACIÓN ANUAL POR OPTOMETRIA, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.			
INGRESA AL SVE NA			
ENFASIS OSTEO MUSCULAR			
<p>Declaro que toda la información suministrada en este documento es verdadera y no oculto información sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen.</p> <p>Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro) dando cumplimiento a la Resolución 2348 de 2007 Art. 10 y Resolución 6312 de 2019 y las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o derroquen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.</p>			

JUAN VIANEY ARIAS SANCHEZ
MD. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REG. MEDICO 4857 LICENCIA S.O. 002790

BRAYAN ANDRES ZAPATA MENDOZA
CC: 1090508322

*10905083220202202

CALLE 21A NO. 0075 BARRIO EL ROSAL Tel: 5860755 CELULAR 3190253447 - 3042470756 - Febrero 02 de 2024 - 16:38:40 | Página 2 de 2 | Versión 01

Imagen 7 evidencia Examen de ingreso

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

GESTIÓN DOCUMENTAL Y PRODUCTOS

1 ELABORACIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UND 1,00

Se elabora manual de mantenimiento, se imprime en hojas tamaño carta para entregar a la entidad.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-SI-017-2023

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA
CALLE 28, ENTRE AVENIDA 0 Y AVENIDA 1E DEL
BARRIO LA CORDIALIDAD, DEL MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTANDER

MANUAL DE CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



Imagen 8 evidencia Manual de conservación, Operación y Mantenimiento

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

2 IMPRESIÓN, FORMATOS, REGISTRO DE INFORMACIÓN, CAPACITACIONES Y
MANTENIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SIGC EJE DE CALIDAD MES 3,00

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo				
FORMATO:	FT-SST-015			
ASISTENCIA CAPACITACION				
Fecha:				
Versión:	001			
Página 1 de 1				
Ciudad	Lugar			
Los Patios	01128 Av. O-AT rodal			
DD	MM			
06	07			
AA	24			
ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción				
Charla de seguridad	✓ - Manipulación manual de cargas			
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓ - Uso de EPP			
Seminario / Taller / Curso				
Capacitación y Entrenamiento en SST	✓			
Capacitación específica al cargo				
Otra				
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Carlos Américo Díaz	1090341009	Ayudante	Carlos Díaz
2	Eladio Severo Pacheco	1090485415	Ayudante	Eladio Pacheco
3	Edmar Alejandro Hender	10901034298	Ayudante	Edmar Hender
4	Wilson Osorio Serrano	1092734003	Ayudante	Wilson Serrano
5	Bryan Andrés Zapata	1090508377	Ayudante	Bryan Zapata
6	Luis Alberto Gómez	91214501	Ayudante	Luis Gómez
7	Bryan Páez	1093290978	Presidente	Bryan Páez
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
Observaciones:				
Persona responsable de la actividad				
Nombre		Firma		
Diana Hilena Ortiz		Diana Hilena Ortiz		

Imagen 9 evidencia Lista de asistencia a capacitación

Durante el desarrollo de la obra se imprimen los formatos de registros de capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de SIGC

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



Imagen 10 evidencia del personal recibiendo capacitación de SSST



Imagen 11 Señalización de Camilla y Botiquín de primeros auxilios

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



Imagen 12 Señalización Ruta de Evacuación



Imagen 13 Señalización Uso de EPP

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL



Imagen 14 Señalización Sustancias Toxicas

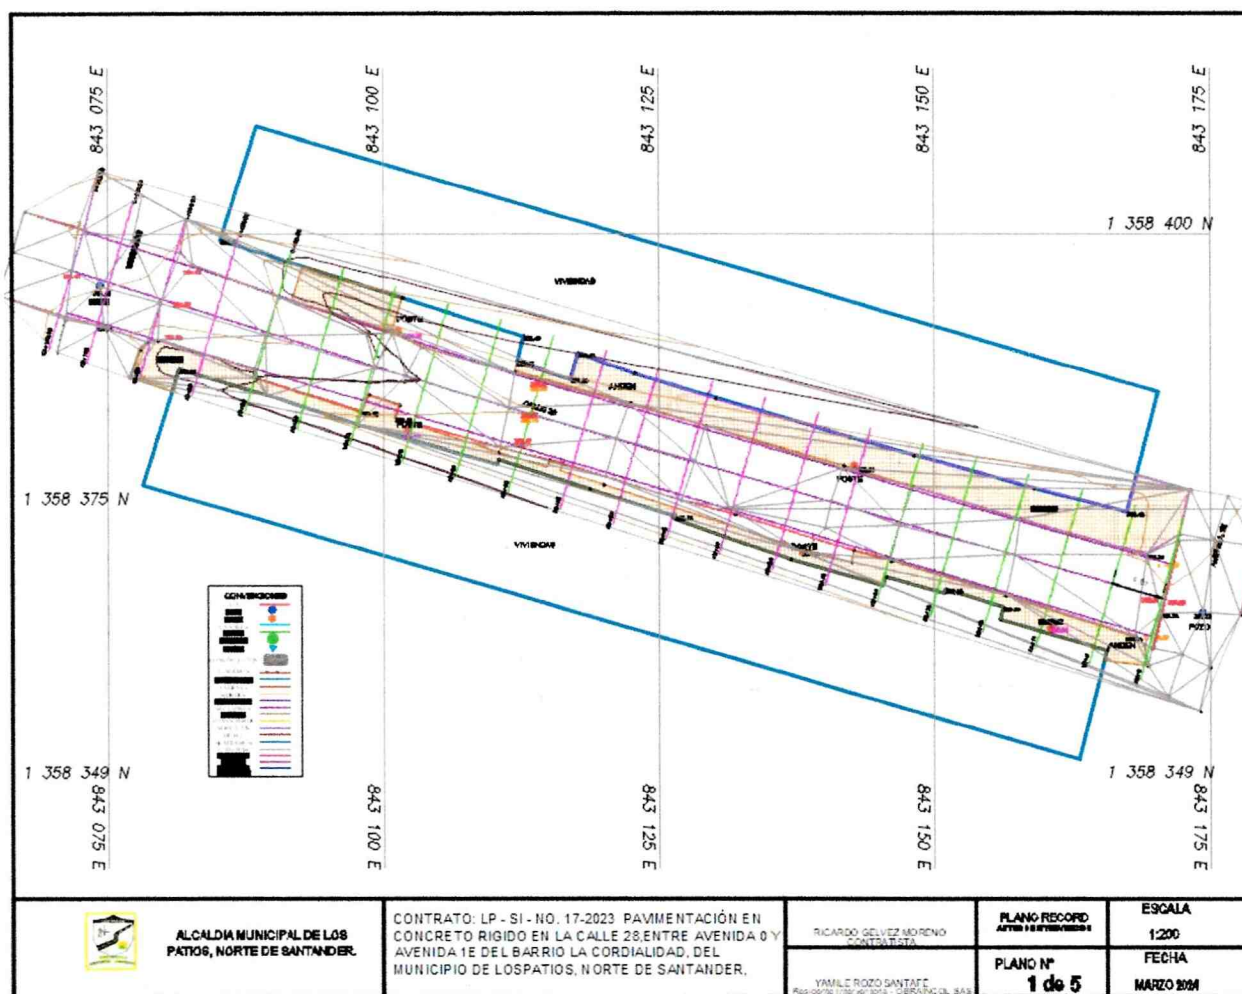
RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

3 PLANOS RECORD PAVIMENTO (DIGITALIZACION Y PLOTEO) UND 1,00

Se elabora plano récord de obra ejecutada, se Plotea para entregar a la entidad. Entregando cinco planos correspondientes a :

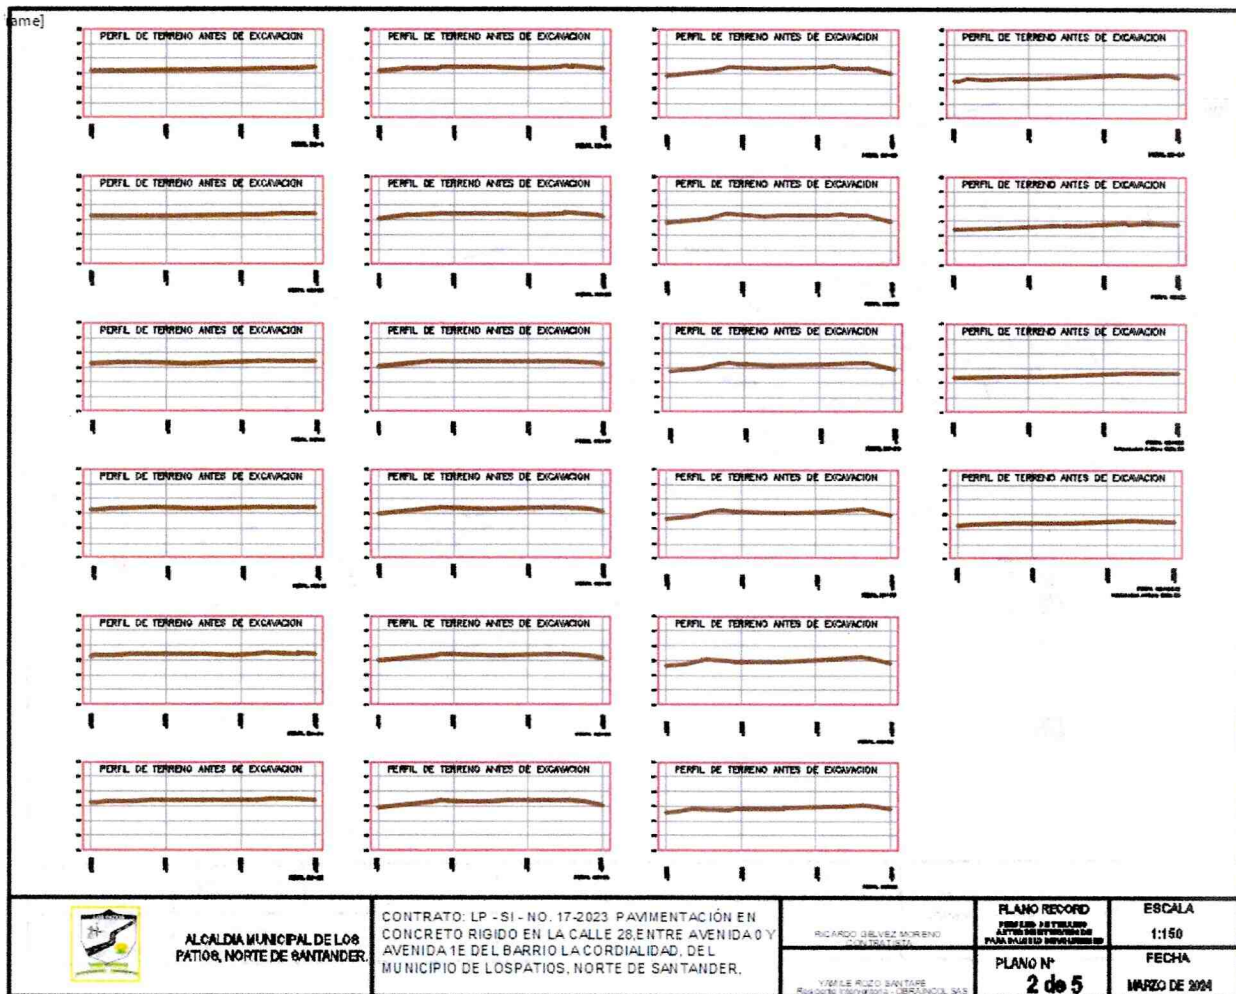
3.1 Plano de topografía antes de intervención



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

3.2 Perfiles de terreno antes de intervención

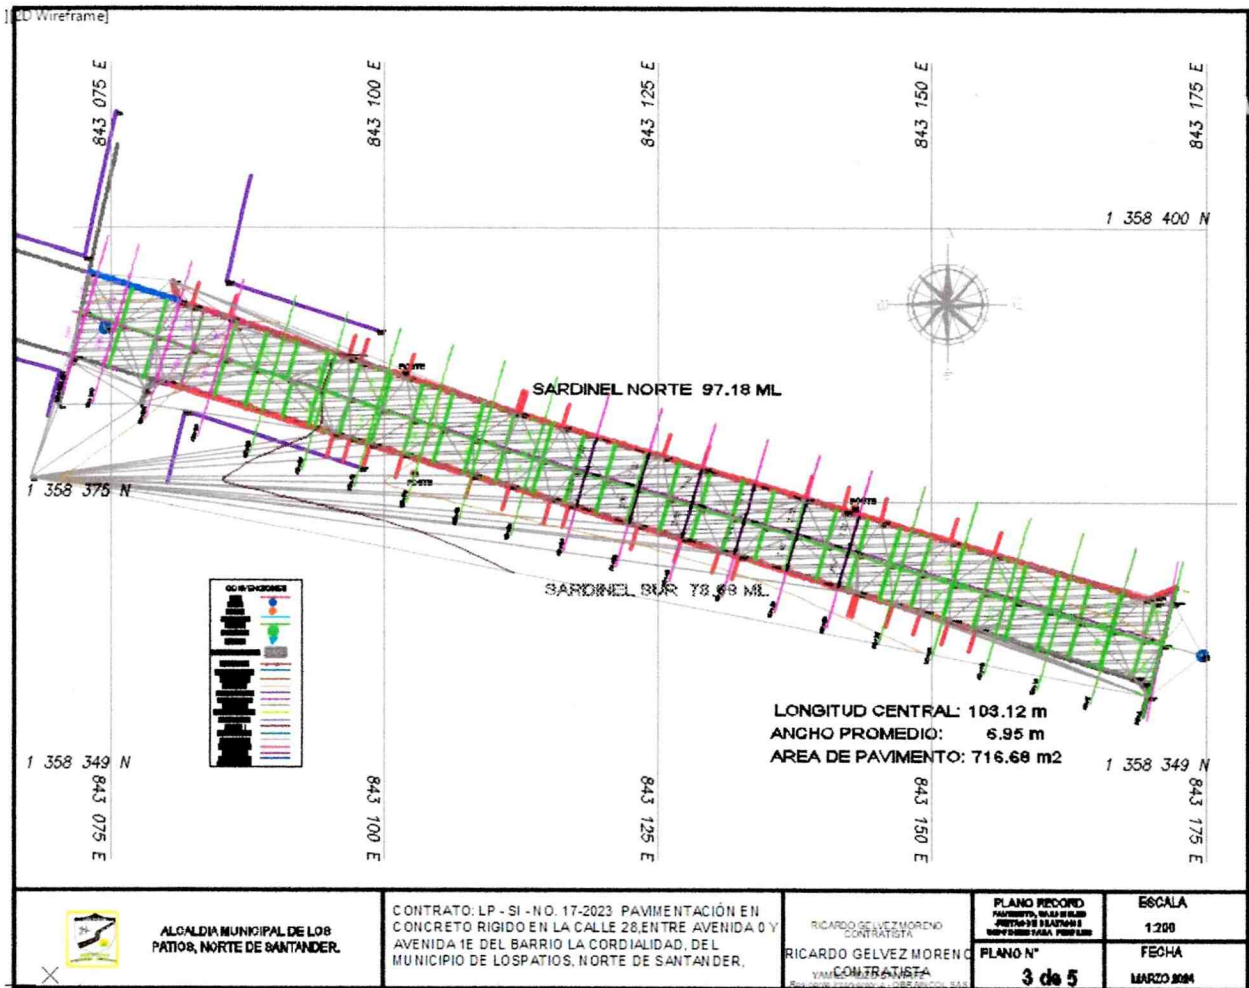


Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

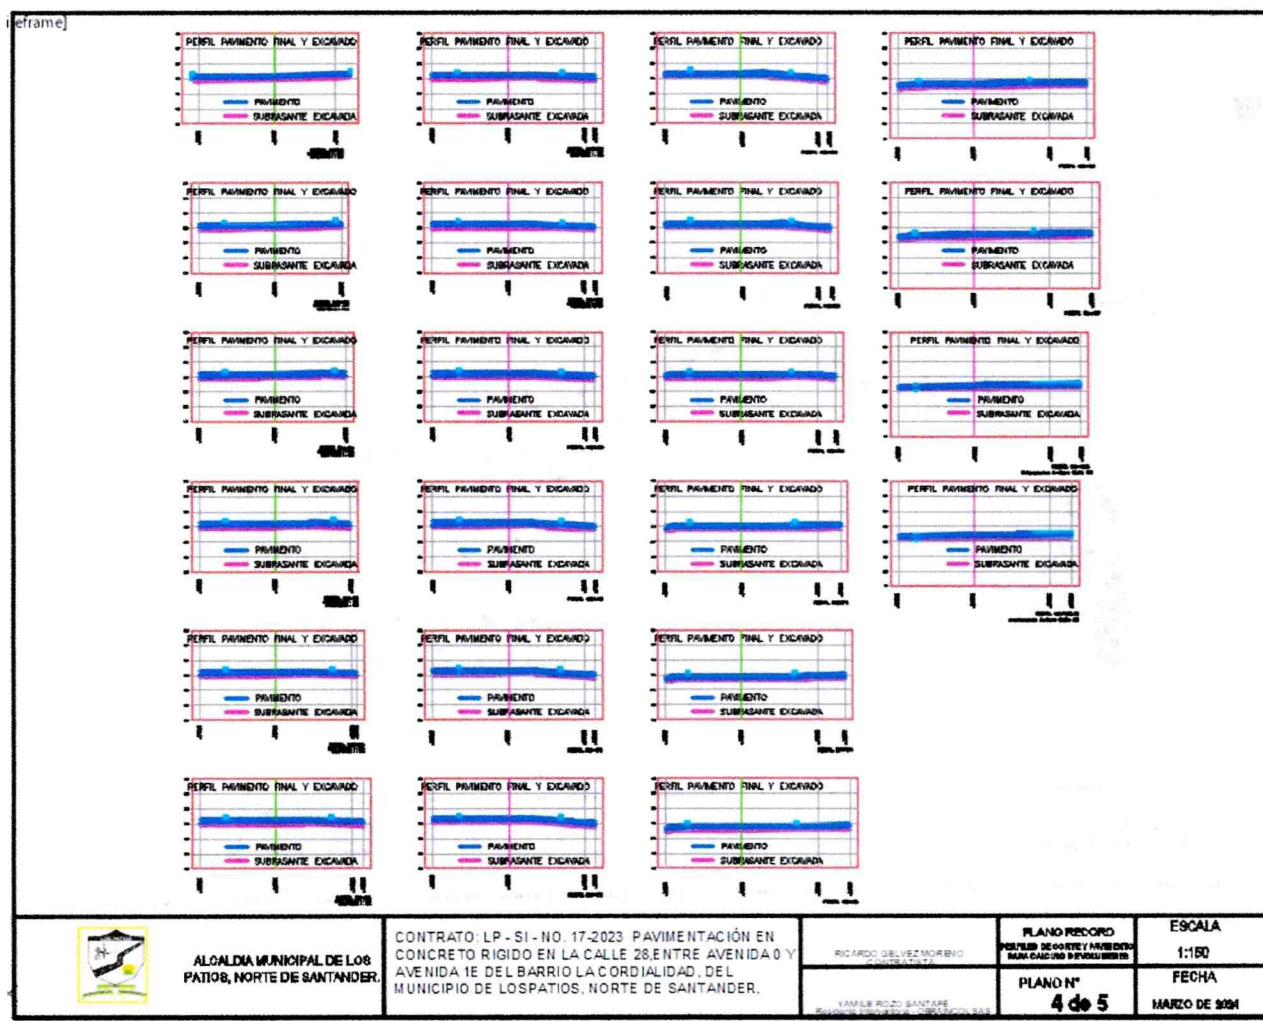
3.3 Plano récord de topografía obra terminada



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

3.4 Perfiles de corte de pavimento terminado

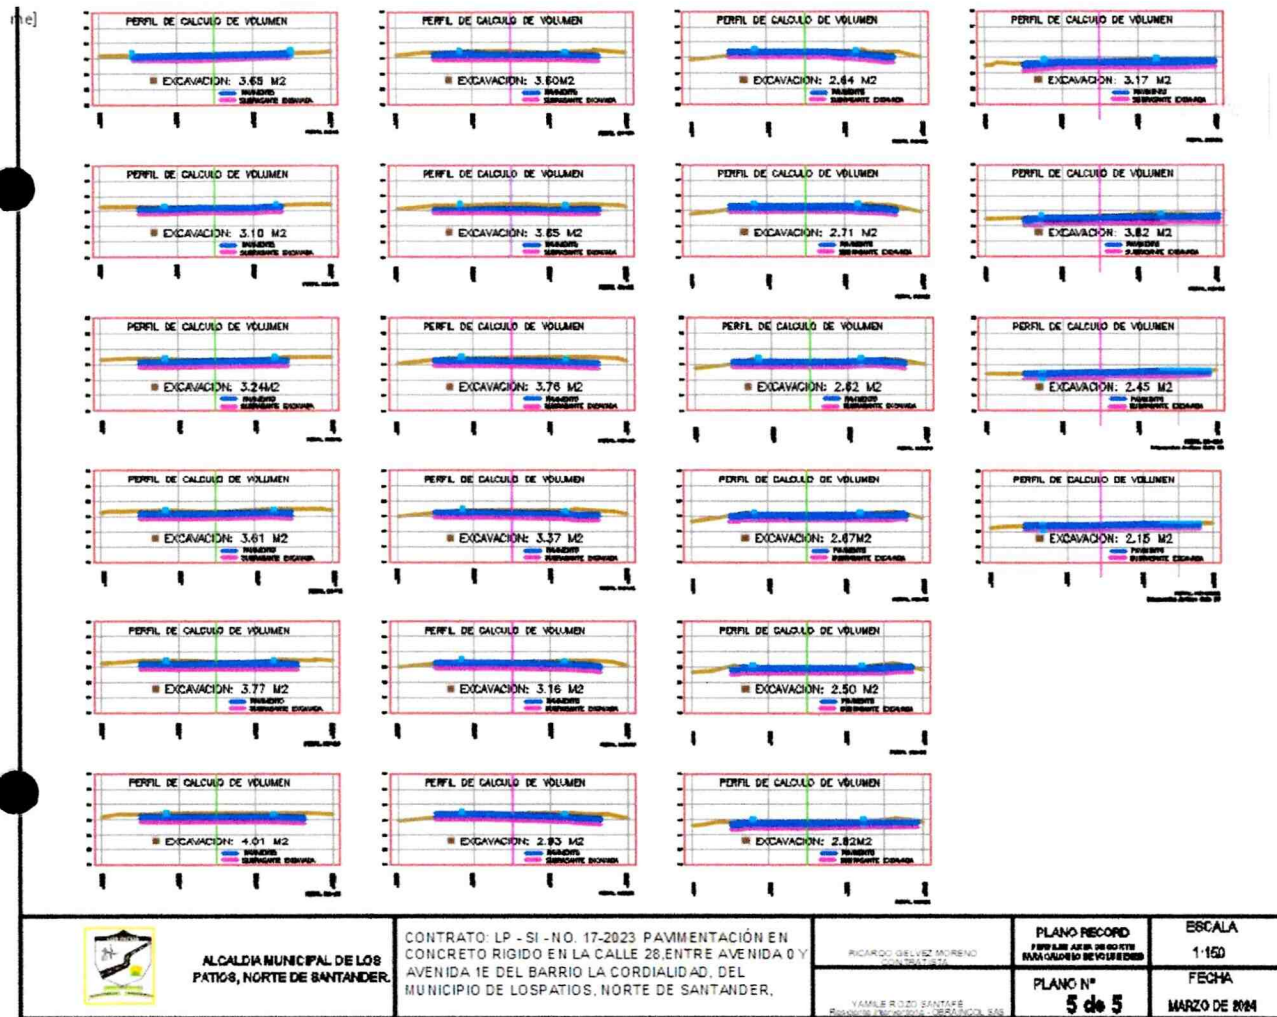


Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pizarreal de los Patios Norte de Santander
 Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

3.5 Perfiles área de corte para cálculo de volúmenes



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

DISEÑO Y CONTROL DE MEZCLAS

1 DISEÑO MEZCLA CONCRETO HIDRÁULICO PESO NORMAL F'C: 21MPA Y 17.5 MPA UND 2,00

Se contrata el diseño de mezcla para concreto de 21MPA

CONCRETOS E INVERSIONES JELITE S.A.S.

FICHA TÉCNICA DE CONCRETO EN ESTADO FRESCO

CONCRETO MR-45

DESCRIPCION

Este tipo de concreto es la mejor opción para la construcción de superficies de rodamiento, como los pavimentos y pisos industriales, especialmente para resistir esfuerzos a flexión, impuestos por el peso de vehículos en las estructuras de pavimento.

Dependiendo de las dimensiones y cantidad del refuerzo del elemento que se va a construir se especifica el tipo de agregado requiriendo y sus proporciones:

- Agregado medio 3/4"
- Agregado estándar máx. 1"

Este tipo de concreto es la mejor opción para la construcción de diferentes elementos y estructuras, entre los que se encuentran:

- Pisos industriales
- Estacionamientos
- Autopistas
- Carreteras
- Puntos de maniobra
- Plataformas

VANTAJAS

Es un producto de la más alta calidad, lo que garantiza uniformidad del concreto en el elemento a construir, reduciendo los costos de construcción en obra.

Permite el ahorro en materia prima y mano de obra, el costo final de la obra es menor obteniendo una mayor utilidad al proyecto.

A diferencia de otros tipos de concreto, el MR tiene una relación gravimétrica con las masas, como consecuencia se tiene una mayor resistencia a la flexión, abrasión y desgaste superficial. Por esta razón es ideal para ser utilizado en zonas de tránsito intenso, como cualquier superficie de rodamiento.

DISEÑO DE CONCRETO MR-45

ARENA	36%
PIEDRA	45%
CEMENTO	13%
AGUA	5,85%
RETARDANTE	0,08%
PLASTIFICANTE	0,11%
AIRE	2,00%
RELACION A/C	0,4%

Diseños de mezcla fabricados bajo las Normas NTC 121 Y NTC 321

tios Norte de Santander

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

CONCRETOS E INVERSIONES JELITE S.A.S.

FICHA TÉCNICA DE CONCRETO EN ESTADO FRESCO

CONCRETO MR 45

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO EN OBRA

- ❖ No se debe adicionar agua, cemento, aditivos o cualquier otro material al concreto en la obra ya que esto alterará su diseño.
- ❖ El concreto que haya empezado el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse, ni utilizarse en caso de demoras en obra.
- ❖ La elaboración y curado de las muestras debe hacerse según NTC 550 (ASTM C31). El curado específicamente debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes y permanecer completamente sumergidas en agua hasta la edad de falla.
- ❖ Las muestras de concreto se deben evaluar a flexión de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 2871 (ASTM C78) y para la resistencia a la compresión de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673 (ASTM C39).
- ❖ Para mejores resultados, se deben cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones existentes para los procedimientos de colocación, vibrado, manejo, curado, protección y control del concreto en obra (como referencia se sugieren la NSR 10 y ACI 318).
- ❖ Para asegurar la calidad de su concreto deben utilizarse, de acuerdo a las condiciones climáticas, barreras de viento, polsombra, carpas, con el fin de proteger el concreto a edades tempranas.

MÉTODOS DE CURADO

Se han desarrollado algunos métodos y materiales que ayudan de manera directa o indirecta al proceso de curado, como barreras de viento y sol, retardantes de evaporación y sellantes.

- ❖ Barreras de viento y sol: se recomienda cuando la tasa de evaporación es alta y la superficie de exposición es grande, como losas de pavimentos de concreto.
- ❖ Selladores o sellantes: son compuestos que al entrar en contacto con el concreto forman una película que endurece y sella. Ayudan a curar el concreto, minimizan la generación de polvo, brindan mayor durabilidad al concreto, protegen contra daños causados por la penetración de líquidos, y algunos mejoran la apariencia brindándole color y brillo.

El aserrado de las juntas se iniciará en el momento que el concreto pueda soportar el peso de la máquina y del operador de la misma sin que queden marcas en la superficie de la losa, se inicia con el aserrado transversal y posteriormente se realiza el aserrado longitudinal, se hará según el detalle en planos para el proyecto. El aserrado se debe realizar antes de que se presenten agrietamientos descontrolados.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

	INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO. CONCRETOS E INVERSIONES JELITE SAS	FECHA: 15/02/2024 N° INFORME: 1190
---	---	---

INFORMACIÓN GENERAL DE LABORATORIO
N° de informe: 1190
Informe realizado por: Concretos e inversiones Jelite SAS
Localización: Anillo vial a 100 m del Puente Garcia Herreros
Fecha de emisión del informe: 15/02/2024

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Solicitante- Contratista: RICARDO GELVEZ MORENO
Nombre del proyecto: RICARDO GELVEZ MORENO
Localización del proyecto: LOS PATIOS

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo de muestra: VIGUETAS 610X150x500
Muestra realizada por: Empresa: ☒ Cliente: ☐ Otro: ☐
N° de muestras: 2

INFORMACIÓN DE ENSAYO
Localización del ensayo CONCRETOS JELITE
Fecha de realización del ensayo: 19/01/2024
Temperatura ambiente del sitio: 28°C
Humedad del sitio: 68%

Condiciones especiales: MR 45 KG/CM2		
Tipo de muestra	Tipo de ensayo	Fecha de muestras
VIGUETAS 610x150x150 mm	FLEXO-TRACCIÓN PARA VIGUETAS DE CONCRETO CARGA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ - NORMA INV E 414-13/ NTC 2871	A PARTIR 19/01/2024

LABORATORISTA AUTORIZADO:
Nombre: Ing. José Colmenares
Cargo: Jefe de Planta


JEFE DE PLANTA

CONCRETOS E INVERSIONES JELITE S.A.S.
ANILLO VIAL ORIENTAL A 100 m DEL PUENTE GARCIA HERREROS

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

	INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO CONCRETOS E INVERSIONES JELITE SAS	FECHA 15/02/2024
		N° INFORME 1190

OBRA	VIGUETAS	REMISION	PRODUCTO	FECHA		EDAD (DIAS)	SLUMP	ALTURA	LARGO	RESISTENCIA		TIPO DE FALLA
				ELABORADO	ROTURA					KG/CM2	%	
CJCUC 24 23	3066 VIGA	3066	45 MR	12/01/2024	19/01/2024	7 DIAS	6"	150	610	42.5	94.44	TR CENTRAL
					26/01/2024	14 DIAS		150	610	51.7	114.89	TR CENTRAL
CJCUC 24 27	3073 VIGA	3073	45 MR	13/01/2024	20/01/2024	7 DIAS	6"	150	610	44.6	99.11	TR CENTRAL
					27/01/2024	14 DIAS		150	610	48	106.67	TR CENTRAL
CJCUC 24 29	3078 VIGA	3078	45 MR	15/01/2024	22/01/2024	7 DIAS	6"	150	610	34.9	77.56	TR CENTRAL
					29/01/2024	14 DIAS		150	610	45.1	100.22	TR CENTRAL
CJCUC 24 35	3091 VIGA	3091	45 MR	17/01/2024	24/01/2024	7 DIAS	6"	150	610	38	84.44	TR CENTRAL
					31/01/2024	14 DIAS		150	610	74.5	165.56	TR CENTRAL
CJCUC 24 42	3115 VIGA	3115	45 MR	19/01/2024	26/01/2024	7 DIAS	6"	150	610	40.4	89.78	TR CENTRAL
					02/02/2024	14 DIAS		150	610	47	104.44	TR CENTRAL
CJCUC 24 45	3127 VIGA	3127	45 MR	20/01/2024	27/01/2024	7 DIAS	6"	150	610	41.6	92.44	TR CENTRAL
					03/02/2024	14 DIAS		150	610	49.8	110.67	TR CENTRAL

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
 Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

2 ENSAYOS BÁSICOS EN ARENAS PARA DISEÑO DE MEZCLAS: HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRÍA Y MODULO DE FINURA, COLORIMETRÍA, EQUIVALENTE DE ARENA, PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN, MASAS UNITARIAS SUELTAS Y COMPACTACIÓN UND 2,00

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 Ingeniería + Control 2011 ISO/IEC 17025:2017 19-LAB-014	 ONAC ACREDITADO	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
		LABORATORIO	
		INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Nº Informe: 805-2023

LABORATORIO:	INGENIERIA + CONTROL 2011 SAS
DIRECCION:	CALLE 25 #8-42 LOS PATIOS - NTE DE SANTANDER
SOLICITANTE:	TRANSMATERIALES S.A.
PROYECTO:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO
DIRECCION:	MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
SITIO DEL ENSAYO:	CALLE 25 #8-42 LOS PATIOS - NTE DE SANTANDER
PROYECTO:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:	OL 3910
REFERENCIA /TIPO:	ARENA DE TRITURACIÓN
CONDICIONES DE LA MUESTRA:	LA MUESTRA NO REQUIERE DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DEL ENSAYO
USO DE LA MUESTRA:	N.A.

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE		
MATERIAL	FUENTE	ENSAYOS /NORMA DE ENSAYO
ARENA DE TRITURACIÓN	PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES	INV E-122: 2013 CONTENIDO DE HUMEDAD
		INV E-213: 2013 ANALISIS GRANULOMETRICO
		INV E-133: 2013 EQUIVALENTE DE ARENA

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO:
ENSAYO ACREDITADO
SI
SI
NO

FECHA DE RECEPCION: 2023-08-30
FECHA DE ENSAYO: 2023-08-30
FECHA DEL INFORME: 2023-09-06

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

SIETE (07)

FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR TÉCNICO
Nº. 900-410 635 0

IVAN ENRIQUE RANGEL VERA
DIRECTOR TÉCNICO

Página 1 de 7

Consulte aquí nuestros
certificados de calibración



Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

Página 29 de 56

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL


  <p>ISO/ IEC 17025:2017 19-LAB-014</p>	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
	LABORATORIO	
	INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Nº Informe: 805-2023

RESUMEN DE ENSAYOS

ENSAYO REALIZADO	NORMA INVIAS	ARENA TRITURADA	
1. Granulometría	E-213. 2013	%	ART. 630-2022
1/2" (12,5 mm)		-	-
3/8" (9,5 mm)		100	100
No 4 (4,75 mm)		95	95 - 100
No 8 (2,36 mm)		75	80 - 100
No 16 (1,18 mm)		57	50 - 85
No 30 (0,60 mm)		42	25 - 60
No 50 (0,30 mm)		26	5 - 30
No 100 (0,15 mm)		8	0 - 10
2. Módulo de Finura		2,97	2,3 - 3,1
3. Humedad Natural (%)	E-122. 2013	6	-
4. Equivalente de Arena (%)	E-133. 2013	79	-
5. Colorimetría	E-212. 2013	2	≤3


DIRECTOR TÉCNICO
 NIT. 900.410.635.0

- * Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados.
- * Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- * El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados, ni de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados (por ejemplo: fuente de la muestra).
- * Los resultados aplican para las muestras tal como se recibieron.
- * Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
- * Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio, o en su defecto la firma digital.

Página 2 de 7

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

Página 30 de 56

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL


  ISO / IEC 17025:2017 19-LAB-014	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
	LABORATORIO	
	INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Nº Informe: 805-2023

RESUMEN DE ENSAYOS

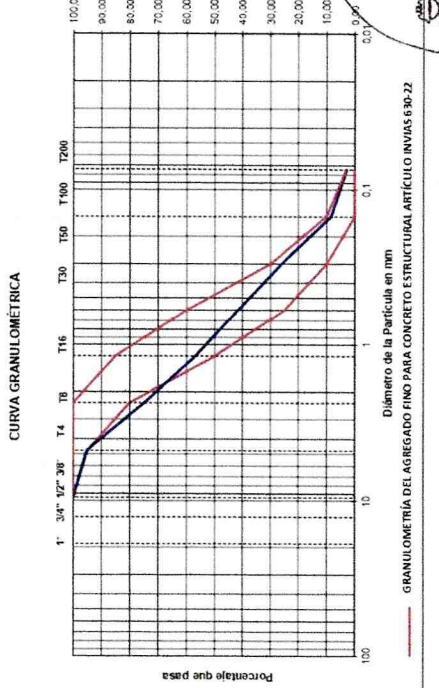
NORMA	ENSAYO	EQUIPOS UTILIZADOS	CODIGOS
INV E- 213	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	*Balanza Electronica *Balanza Portatil *Horno Digital *Serie de Tamices	*A-00125 *A-00043 *A-00021 *A-00132
INV E- 122	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DE CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELO.	*Horno Digital *Balanza Electronica	*A-00021 *A-00125
INV E- 133	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS	*Agitador *Dispositivo de Lectura *Horno Digital *Balanza *Tamiz N°4	A-00022 *A-00015 *A-00021 *A-00010 *A-00132-3


INGENIERIA + CONTROL 2011
DIRECTOR TÉCNICO
Nº. 900 410 635 0

- * Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados.
- * Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- * El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados, ni de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados (por ejemplo: fuente de la muestra).
- * Los resultados aplican para las muestras tal como se recibieron.
- * Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
- * Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio, o en su defecto la firma digital.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 ISO/IEC 17025:2017 19-LAB-014				FORMATO		CÓDIGO: F-MLA-06/07	
LABORATORIO		INFORME DE ENSAYO					
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS INV - E 213: 2013							
N° Informe: 805-2023							
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORIE DE SANTANDER TEL: 9802179							
Proyecto: PLANITA TRANSMATERIALES - AVILLO VIAL ORIENTAL VIA A LA CARCEL MODELO				Fecha de Informe: 2023-09-06			
Solicitante: MUNICIPIO DE CUCUTA - NORIE DE SANTANDER				No. de Orden: OL 3910			
Situación: TRANSMATERIALES S.A				Fecha de recolección: 2023-08-30			
Fuente: ARENA DE TRITURACION				Fecha de recepción: 2023-08-30			
Descripción: PLANITA MÓVIL TRANSMATERIALES				Fecha de ensayo: 2023-09-05			
Descripción: N/A							
Note: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.							
Masa Total (g) 809.50		Masa Pasa No. 4 (g) 771.10		Masa Fracción fina (g) 771.10			
GRAVAS		ARENA		LIMO Y/O ARCILLA			
							
CURVA GRANULOMÉTRICA							
Dímetro de la Partícula en mm							
GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL ARTÍCULO INVIAS 6.90.22							
AUTORIZO							
ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA							
DIRECTOR TÉCNICO							
FIRMA Y SELLO							
DIRECTOR TÉCNICO							
N° 900-410 635-0							
FIRMA Y SELLO							
N° 900-410 635-0							

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio

Página 5 de 7

Verificación de la información de este informe en: verificacion@ingenieriacontrol.com
Página 33 de 56

de Santander

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 Ingeniería + Control 2011 SAS	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-03/06																												
	LABORATORIO																													
	INFORME DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV E-133: 2013																													
N° Informe: 805-2023																														
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179																														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Proyecto: <u>PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO</u></td> <td style="width: 20%;">Fecha de informe: <u>2023-09-06</u></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td><u>MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER</u></td> <td>N° de Orden: <u>OL 3910</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solicitante: <u>TRANSMATERIALES S.A.</u></td> <td>Fecha de recolección: <u>2023-09-06</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Situación: <u>ARENA DE TRITURACIÓN</u></td> <td>Fecha de recepción: <u>2023-08-30</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fuente: <u>PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES</u></td> <td>Fecha de ensayo: <u>2023-09-06</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descripción: <u>N.A.</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Proyecto: <u>PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO</u>	Fecha de informe: <u>2023-09-06</u>		<u>MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER</u>	N° de Orden: <u>OL 3910</u>		Solicitante: <u>TRANSMATERIALES S.A.</u>	Fecha de recolección: <u>2023-09-06</u>		Situación: <u>ARENA DE TRITURACIÓN</u>	Fecha de recepción: <u>2023-08-30</u>		Fuente: <u>PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES</u>	Fecha de ensayo: <u>2023-09-06</u>		Descripción: <u>N.A.</u>												
Proyecto: <u>PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO</u>	Fecha de informe: <u>2023-09-06</u>																													
<u>MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER</u>	N° de Orden: <u>OL 3910</u>																													
Solicitante: <u>TRANSMATERIALES S.A.</u>	Fecha de recolección: <u>2023-09-06</u>																													
Situación: <u>ARENA DE TRITURACIÓN</u>	Fecha de recepción: <u>2023-08-30</u>																													
Fuente: <u>PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES</u>	Fecha de ensayo: <u>2023-09-06</u>																													
Descripción: <u>N.A.</u>																														
Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Prueba</th> <th style="width: 15%;">1</th> <th style="width: 15%;">2</th> <th style="width: 15%;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura solución (°C)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>Lectura de Arcilla (ml)</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">122</td> <td style="text-align: center;">121</td> </tr> <tr> <td>Lectura de Arena (ml)</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> <tr> <td>Equivalente de Arena</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">78</td> </tr> <tr> <td>PROMEDIO %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">79</td> </tr> <tr> <td>Especificación: % mínimo</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			Prueba	1	2	3	Temperatura solución (°C)	22			Lectura de Arcilla (ml)	124	122	121	Lectura de Arena (ml)	98	94	94	Equivalente de Arena	80	78	78	PROMEDIO %	79			Especificación: % mínimo			
Prueba	1	2	3																											
Temperatura solución (°C)	22																													
Lectura de Arcilla (ml)	124	122	121																											
Lectura de Arena (ml)	98	94	94																											
Equivalente de Arena	80	78	78																											
PROMEDIO %	79																													
Especificación: % mínimo																														
OBSERVACIONES:																														
AUTORIZO ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA		 DIRECTOR TÉCNICO NIT. 900.410.635.0																												
DIRECTOR TÉCNICO		FIRMA Y SELLO																												

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.

Página 6 de 7

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 Ingeniería + Control SAS	FORMATO LABORATORIO	CÓDIGO: F-MLA-05/05
	INFORME DE ENSAYO PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS O CONCRETOS INV E- 212: 2013	
	N° Informe: 805-2023	
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179		
Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER		
Solicitante: TRANSMATERIALES S.A.		Fecha de Informe: 2023-09-06
Situación: ARENA DE TRITURACIÓN		No. de Orden: OL 3910
Fuente: PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES		Fecha de recolección: 2023-08-30
Descripción: N/A		Fecha de recepción: 2023-08-30
		Fecha de ensayo: 2023-09-02
Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.		
ENSAYO REALIZADO CON NORMA: INV E-212: 2013 ☒ NTC 127: 2000 ☐		
METODO DE LOS VIDRIOS DE COLORES DE REFERENCIA		
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA PRUEBA	RESULTADO OBTENIDO COLOR DE REFERENCIA PLACA ORGANICA	
	No 1	
	No 2	X
	No 3	
	No 4	
	No 5	
OBSERVACIONES:		
AUTORIZO ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA		
DIRECTOR TÉCNICO		 DIRECTOR TÉCNICO NIT. 900.410.632.0 FIRMA Y SELLO

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
 Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.

Página 7 de 7

FIN DE INFORME

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

3 ENSAYOS BÁSICOS EN TRITURADOS PARA DISEÑO DE MEZCLAS: HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRÍA, DESGASTE MAQUINA DE LOS ÁNGELES, PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN, MASAS UNITARIAS SUELTAS Y COMPACTO UND 2,00

 Ingeniería + Control 2011 <small>ISO 9001:2015 CERTIFICADO</small>	 ONAC ACREDITADO <small>ISO / IEC 17025:2017 19-LAB-014</small>	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
		LABORATORIO	
		INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Nº Informe: 795-2023

LABORATORIO:	INGENIERIA + CONTROL 2011 SAS
DIRECCION:	CALLE 25 #8-42 LOS PATIOS - NTE DE SANTANDER
SOLICITANTE:	TRANSMATERIALES S.A.
PROYECTO:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO
DIRECCION:	MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
SITIO DEL ENSAYO:	CALLE 25 #8-42 LOS PATIOS - NTE DE SANTANDER
PROYECTO:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:	OL 3914
REFERENCIA / TIPO:	TRITURADO DE 3/4"
CONDICIONES DE LA MUESTRA:	LA MUESTRA NO REQUIERE DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DEL ENSAYO
USO DE LA MUESTRA:	N.A.

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE		
MATERIAL	FUENTE	ENSAYOS / NORMA DE ENSAYO
TRITURADO DE 3/4"	PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES	INV E-122: 2013 CONTENIDO DE HUMEDAD
		INV E-213: 2013 ANALISIS GRANULOMETRICO
		INV E-218: 2013 DESGASTE

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO:
ENSAYO ACREDITADO
SI
SI
SI

FECHA DE RECEPCION: 2023-08-30
FECHA DE ENSAYO: 2023-08-30
FECHA DEL INFORME: 2023-09-05

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

SEIS (06)

FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR TÉCNICO
Nº. 900 410 632 0

IVAN ENRIQUE RANGEL VERA
DIRECTOR TÉCNICO

Página 1 de 6

Avenida 9 Calle 10 Sur RDA 94 Barrio Pisareal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com
Pagina 36 de 56

Consulte aquí nuestros
certificados de
calibración



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

  ISO/ IEC 17025:2017 19-LAB-014	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
	LABORATORIO	
	INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

N° Informe: 795-2023

RESUMEN DE ENSAYOS

ENSAYO REALIZADO	NORMA INVIAS	TRITURADO 3/4"	
1. Granulometría	E-213: 2013	%	ART. 630-2022
3/4" (25 mm)		100	100
1/2" (12,5 mm)		53	90 - 100
3/8" (9,5 mm)		7	40 - 70
No 4 (4,75 mm)		1	0 - 15
No 8 (2,36 mm)		1	0 - 5
No 16 (0,85 mm)		1	-
No 30 (0,60 mm)		1	-
No 50 (0,30 mm)		1	-
No 100 (0,15 mm)		0,4	-
2. Humedad Natural (%)	E-122: 2013	1	-
3. Desgast Máquina de Los Ángeles (%)	E-218: 2013	36	≤ 40

Ingeniería+Control S.A.S.
DIRECTOR TÉCNICO
NM. 900 410 635 0

- * Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados.
- * Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- * El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados, ni de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados (por ejemplo: fuente de la muestra).
- * Los resultados aplican para las muestras tal como se recibieron.
- * Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
- * Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio, o en su defecto la firma digital.

Página 2 de 6

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL


  ISO / IEC 17025:2017 19-LAB-014	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
	LABORATORIO	
	INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

N° Informe: 795-2023

RESUMEN DE ENSAYOS

NORMA	ENSAYO	EQUIPOS UTILIZADOS	CODIGOS
INV E- 213	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	*Balanza Electronica *Balanza Portatil *Horno Digital *Serie de Tamices	*A-00125 *A-00043 *A-00021 *A-00132
INV E- 122	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DE CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELO.	*Horno Digital *Balanza Electronica	*A-00021 *A-00125
INV E- 218	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES	*Maquina de los Angeles *Horno Digital *Balanza Electronica *Tamiz de ¾" *Tamiz de ½" *Tamiz de ¼"	*A-00019 *A-00021 *A-00125 *A-00132-9 *A-00132-5



Ingeniería + Control 2011

* Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados.

* Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

* El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados, ni de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados (por ejemplo: fuente de la muestra).

* Los resultados aplican para las muestras tal como se recibieron.

* Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.

* Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio, o en su defecto la firma digital.

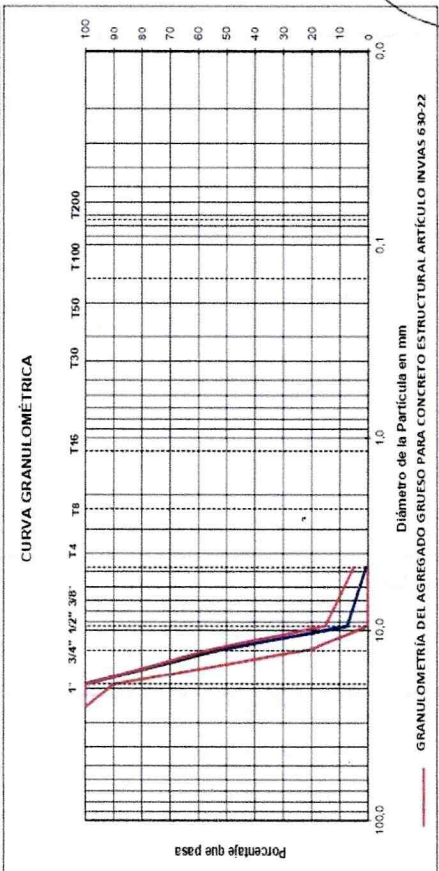
Página 3 de 6

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

Página 38 de 56

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

FORMATO		CÓDIGO: F-MLA-06/07			
LABORATORIO					
INFORME DE ENSAYO					
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUOSOS Y FINOS INV - E 213: 2013					
N° Informe: 795-2023					
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8-42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179					
Proyecto:	PLANTA TRANSMATERIALES - AHILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO	Fecha de Informe: 2023-09-05			
Solicitante:	MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	No. de Orden: OL 3914			
Situación:	TRITURADO DE 3/4"	Fecha de recolección: 2023-08-30			
Fuente:	PLANTA MOVIL TRANSMATERIALES	Fecha de recepción: 2023-08-30			
Descripción:	N.A.	Fecha de ensayo: 2023-09-05			
Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.					
Masa Total (g)	2265.90	Masa Pasa No. 4 (g)	16.20	Masa Fracción fina (g)	16.20
CURVA GRANULOMÉTRICA					
					
Dímetro de la Partícula en mm					
GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL ARTÍCULO INVIAS 6.30-22					
Módulo de Finura					
Gravos % 99.3					
Arenas % 0.7					
Finos % 0.0					
AUTORIZO					
ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA					
DIRECTOR TÉCNICO					
FIRMA Y SELLO					
DIRECTOR TÉCNICO					
N° 900 410 635 0					

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA CONTROL 2011 SAS.
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.

Página 5 de 6

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 		FORMATO LABORATORIO INFORME DE ENSAYO		CÓDIGO: F-MLA-07/08	
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1 1/2") Y MAYORES DE 19 mm (3/4") POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES INV E-218: 2013 / INV E- 219: 2013 / NTC 98: 2019					
N° Informe: 795-2023					
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179					
Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO Municipio: MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER Solicitante: TRANSMATERIALES S.A. Situación: TRITURADO DE 3/4" Fuente: PLANTA MOVIL TRANSMATERIALES Descripción: N/A					
Fecha de Informe: 2023-09-05 No. de Orden: OL 3914 Fecha de recolección: 2023-08-30 Fecha de recepción: 2023-08-30 Fecha de ensayo: 2023-09-05					
Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.					
NORMA DE ENSAYO:		NTC 98: 2019		☐	
NORMA DE ENSAYO:		INV E-219:2013		☐	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI		☐	
NO		☒		☒	
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?		SI</			

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

  <p>ISO / IEC 17025:2017 19-LAB-014</p>	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
	LABORATORIO	
	INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

N° Informe: 810-2023

LABORATORIO:	INGENIERIA + CONTROL 2011 SAS
DIRECCION:	CALLE 25 #8-42 LOS PATIOS - NTE DE SANTANDER
SOLICITANTE:	TRANSMATERIALES S.A.
PROYECTO:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO
DIRECCION:	MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER
SITIO DEL ENSAYO:	CALLE 25 #8-42 LOS PATIOS - NTE DE SANTANDER
PROYECTO:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:	OL 3917
REFERENCIA /TIPO:	BASE GRANULAR
CONDICIONES DE LA MUESTRA:	LA MUESTRA NO REQUIERE DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DEL ENSAYO
USO DE LA MUESTRA:	N.A.

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE		
MATERIAL	FUENTE	ENSAYOS /NORMA DE ENSAYO
BASE GRANULAR	PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES	INV E-122: 2013 CONTENIDO DE HUMEDAD
		INV E-213: 2013 ANALISIS GRANULOMETRICO
		INV E-125: 2013 LIMITE LIQUIDO
		INV E-126: 2013 LIMITE PLÁSTICO
		INV E-218: 2013 DESGASTE
		INV E-133: 2013 EQUIVALENTE DE ARENA
		INV E-235: 2013 AZUL METILENO
		INV E-148: 2013 CBR

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO:
ENSAYO ACREDITADO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

FECHA DE RECEPCION: 2023-08-30
FECHA DE ENSAYO: 2023-08-31
FECHA DEL INFORME: 2023-09-06

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

DIEZ (10)

FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR TÉCNICO
NIT. 900.410.635.0

IVAN ENRIQUE RANGEL VERA
DIRECTOR TÉCNICO

Página 1 de 10

Consulte aquí nuestros certificados de calibración



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL


 Ingeniería + Control 2011 <small>ISO/IEC 17025:2017 19-LAB-014</small>	 ONAC ACREDITADO ISO/ IEC 17025:2017 19-LAB-014	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
		LABORATORIO	
		INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

N° Informe: 810-2023

RESUMEN DE ENSAYOS

ENSAYO REALIZADO	NORMA INVIAS	BASE GRANULAR	ARTÍCULO 330-22 INVIAS		
			CLASE A	CLASE B	CLASE C
1. Granulometria	E-213. 2013	%			
1 1/2"		99	100		
1"		77	70 - 100		
3/4"		65	60 - 90		
1/2"		54	-		
3/8"		49	45 - 75		
No 4		41	30 - 60		
No 10		35	20 - 45		
No 40		24	10 - 30		
No 60		16	-		
No 100		14	-		
No 200		7,4	5 - 15		
2. Humedad Natural (%)	E-122. 2013	4	-		
3. Limite Liquido (%)	E-125. 2013	NL	-	-	≤ 25
4. Indice de Plasticidad (%)	E-126. 2013	NP	0,00	0,00	≤ 3
6. Desgaste (%)	E-218. 2013	40	≤ 35	≤ 40	≤ 40
7. Equivalente de Arena (%)	E-133. 2013	28	≥ 30	≥ 30	≥ 30
8. Azul Metileno	E-235. 2013	2,99	≤ 10	≤ 10	≤ 10
9. C.B.R. (%)	E-148. 2013	110	≥ 95	≥ 80	≥ 80


 DIRECTOR TÉCNICO
 N° 900 410 635 0

- * Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados.
- * Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- * El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados, ni de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados (por ejemplo: fuente de la muestra).
- * Los resultados aplican para las muestras tal como se recibieron.
- * Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
- * Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio, o en su defecto la firma digital.

Página 2 de 10

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 <small>ISO / IEC 17025:2017 19-LAB-014</small>	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-95/03
	LABORATORIO	
	INFORME DE RESULTADOS	

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Nº Informe: 810-2023

RESUMEN DE ENSAYOS

NORMA	ENSAYO	EQUIPOS UTILIZADOS	CODIGOS
INV E- 213	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO	*Balanza Electronica *Balanza Portatil *Horno Digital *Serie de Tamices	*A-00125 *A-00043 *A-00021 *A-00132
INV E- 122	DETERMINACIÓN EN EL LABORATORIO DE CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE SUELO.	*Horno Digital *Balanza Electronica	*A-00021 *A-00125
INV E- 125	Determinación del límite líquido de los suelos	*Balanza Electronica *Horno Digital *Cazuela Casagrande	*A-00124 *A-00021 *A-00467
INV E- 126	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS	*Balanza Electronica *Horno Digital *Tamiz N° 40	*A-00124 *A-00021 *A-00132-13
INV E- 142	RELACIONES DE HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	*Martillo Compactador *Tamiz 3/4" *Horno Digital *Pie de rey *Balanza *Horno Digital	*A-00303 *A-00132-9 *A-00021 *A-00139 *A-00043
INV E- 148	CBR DE LOS SUELOS COMPACTADOS DEL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRAS INALTERADAS	*Martillo Compactador *Balanza *Tamiz 3/4"	*A-00303 *A-00043 *A-00132-9


Ingeniería + Control SAS
DIRECTOR TÉCNICO
 NN. 900 410 635 0

* Este informe expresa fielmente el resultado de los ensayos realizados.

* Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

* El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los resultados, ni de la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados (por ejemplo: fuente de la muestra)


* Los resultados aplican para las muestras tal como se recibieron.

* Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.

* Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio, o en su defecto la firma digital.

Página 3 de 10

Ingeniería + Control | 2011



ISO/IEC 17025:2017
19-LAB-014

FORMATO	LABORATORIO	INFORME DE ENSAYO
---------	-------------	-------------------

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS INV E-213: 2013

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179

Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO

MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
TRANSMATERIALES S.A.

Solicitante: TRANSMATERIALES S.A.
Situación: BASE GRANULAR

Situación: BASE GRANULAR

Fuente: PLANTA MOVIL TRANSMATERIALES

Fecha Informe:	2023-09-06
N° de Orden:	OL 3917
Fecha de recolección:	2023-08-30
Fecha de recepción:	2023-08-30
Fecha de ensayo:	2023-09-06

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Masa Total (g): 10238,40

Masa Pasa No. 4 (g):	4172,00
----------------------	---------

Masa Fracción Fina (g):

757.10

LL (%): NL SUCS: GP-GM))."

UCS:

GP-GM)),."

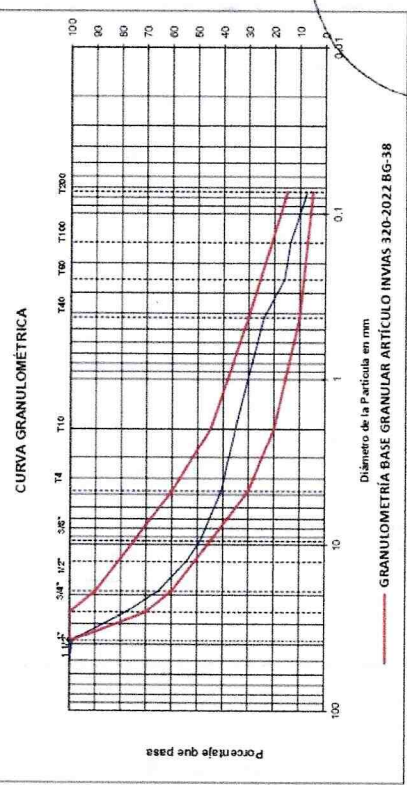
[illegible]

1

GRAVAS	ARENA	LIMO Y/O ARCILLA

ARENA

IMO Y/O ARCILLA



Diámetro de la Partícula en mm

AUTORIZÓ

ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA

DIRECTOR TÉCNICO

FIRMA Y SELLO

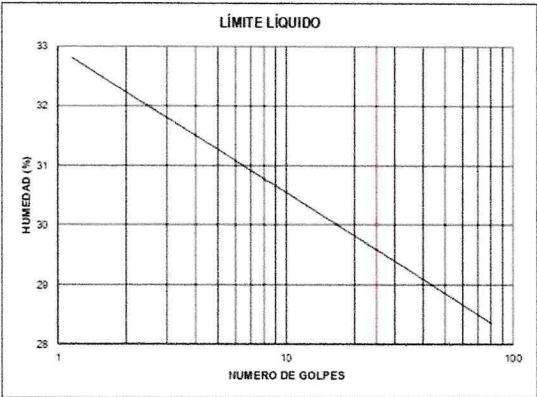

DIRECTOR TÉCNICO
NW. 900.410.6350

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS

Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

  ISO/IEC 17025:2017 19-LAB-014	FORMATO	CÓDIGO: F-MLA-02/08																																																																													
	LABORATORIO																																																																														
	INFORME DE ENSAYO																																																																														
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS INV E-125: 2013 / INV E-126: 2013																																																																															
N° Informe: 810-2023																																																																															
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5902179																																																																															
Proyecto:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO																																																																														
Solicitante:	TRANSMATERIALES S.A.																																																																														
Situación:	BASE GRANULAR	Fecha de Informe: 2023-09-06																																																																													
Fuente:	PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES	N° de Orden: OL 3917																																																																													
Descripción:	N.A.	Fecha de recolección: 2023-08-30																																																																													
		Fecha de recepción: 2023-08-30																																																																													
		Fecha de ensayo: 2023-09-06																																																																													
Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LÍMITE LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>No. de golpes</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Recipiente No</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Masa Recipiente (g)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Masa Suelo Húmedo (g)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Masa Suelo Seco (g)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Humedad (%)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GRADACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Grava (%)</td><td>59.3</td></tr> <tr><td>Arena (%)</td><td>33.4</td></tr> <tr><td>Finos (%)</td><td>7.4</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LÍMITE PLÁSTICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Recipiente No</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Masa Recipiente (g)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Masa Suelo Húmedo (g)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Masa Suelo Seco (g)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Humedad (%)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>ENSAYO - UNIDAD DE MEDICIÓN</th> <th>RESULTADO</th> <th>INCERTIDUMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LÍMITE LÍQUIDO - %</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LÍMITE PLÁSTICO - %</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ÍNDICE DE PLASTICIDAD - %</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <div>  </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>METODO UTILIZADO: MANUAL</td><td></td></tr> <tr><td>MATERIAL NO LÍQUIDO</td><td></td></tr> <tr><td>MATERIAL NO PLÁSTICO</td><td></td></tr> </tbody> </table>			LÍMITE LÍQUIDO				No. de golpes				Recipiente No				Masa Recipiente (g)				Masa Suelo Húmedo (g)				Masa Suelo Seco (g)				Humedad (%)				GRADACIÓN		Grava (%)	59.3	Arena (%)	33.4	Finos (%)	7.4	LÍMITE PLÁSTICO			Recipiente No			Masa Recipiente (g)			Masa Suelo Húmedo (g)			Masa Suelo Seco (g)			Humedad (%)			RESULTADOS			ENSAYO - UNIDAD DE MEDICIÓN	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	LÍMITE LÍQUIDO - %			LÍMITE PLÁSTICO - %			ÍNDICE DE PLASTICIDAD - %			OBSERVACIONES		METODO UTILIZADO: MANUAL		MATERIAL NO LÍQUIDO		MATERIAL NO PLÁSTICO	
LÍMITE LÍQUIDO																																																																															
No. de golpes																																																																															
Recipiente No																																																																															
Masa Recipiente (g)																																																																															
Masa Suelo Húmedo (g)																																																																															
Masa Suelo Seco (g)																																																																															
Humedad (%)																																																																															
GRADACIÓN																																																																															
Grava (%)	59.3																																																																														
Arena (%)	33.4																																																																														
Finos (%)	7.4																																																																														
LÍMITE PLÁSTICO																																																																															
Recipiente No																																																																															
Masa Recipiente (g)																																																																															
Masa Suelo Húmedo (g)																																																																															
Masa Suelo Seco (g)																																																																															
Humedad (%)																																																																															
RESULTADOS																																																																															
ENSAYO - UNIDAD DE MEDICIÓN	RESULTADO	INCERTIDUMBRE																																																																													
LÍMITE LÍQUIDO - %																																																																															
LÍMITE PLÁSTICO - %																																																																															
ÍNDICE DE PLASTICIDAD - %																																																																															
OBSERVACIONES																																																																															
METODO UTILIZADO: MANUAL																																																																															
MATERIAL NO LÍQUIDO																																																																															
MATERIAL NO PLÁSTICO																																																																															
AUTORIZÓ		 DIRECTOR TÉCNICO N° 900 410 635 0																																																																													
ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA.																																																																															
DIRECTOR TÉCNICO		FIRMA Y SELLO																																																																													

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERÍA+CONTROL 2011 SAS
 Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.


Página 6 de 11

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
 Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

Página 47 de 56

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 INGENIERÍA y CONTROL S.A. <small>ISO/IEC 17025:2017 19-LAB-014</small>	 ONAC <small>ACREDITADO</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">FORMATO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LABORATORIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INFORME DE ENSAYO</td> </tr> </table>	FORMATO	LABORATORIO	INFORME DE ENSAYO																																																																																																																																																																																								
FORMATO																																																																																																																																																																																													
LABORATORIO																																																																																																																																																																																													
INFORME DE ENSAYO																																																																																																																																																																																													
CÓDIGO: F-MLA-07/09																																																																																																																																																																																													
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1 1/2") Y MAYORES DE 19 mm (3/4") POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES INV E-218: 2013 / INV E- 219: 2013.																																																																																																																																																																																													
N° Informe: 810-2023																																																																																																																																																																																													
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 #8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179																																																																																																																																																																																													
Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO Solicitante: MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER Situación: TRANSMATERIALES S.A. Fuente: BASE GRANULAR Descripción: PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">NORMA DE ENSAYO:</td> <td style="width: 10%;">INV E-219:2013</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">INV E-218:2013</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>TRITURACIÓN EN LABORATORIO?</td> <td>SI</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>NO</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>			NORMA DE ENSAYO:	INV E-219:2013	☐	INV E-218:2013	☒	TRITURACIÓN EN LABORATORIO?	SI	☐	NO	☒																																																																																																																																																																																	
NORMA DE ENSAYO:	INV E-219:2013	☐	INV E-218:2013	☒																																																																																																																																																																																									
TRITURACIÓN EN LABORATORIO?	SI	☐	NO	☒																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Prueba</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> <tr> <td>Gradación usada</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Esferas</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. de Revoluciones</td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Masa muestra seca antes del ensayo (g)</td> <td>5022.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Masa muestra seca después del ensayo (g)</td> <td>2997.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pérdida (g)</td> <td>2024.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Desgaste</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especificación: % menor que</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Prueba	1	2	3	4	5	6	Gradación usada	A						No. Esferas	12						No. de Revoluciones	500						Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)	-						Masa muestra seca antes del ensayo (g)	5022.1						Masa muestra seca después del ensayo (g)	2997.5						Pérdida (g)	2024.6						% Desgaste	40						Especificación: % menor que	-																																																																																																																										
Prueba	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																							
Gradación usada	A																																																																																																																																																																																												
No. Esferas	12																																																																																																																																																																																												
No. de Revoluciones	500																																																																																																																																																																																												
Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)	-																																																																																																																																																																																												
Masa muestra seca antes del ensayo (g)	5022.1																																																																																																																																																																																												
Masa muestra seca después del ensayo (g)	2997.5																																																																																																																																																																																												
Pérdida (g)	2024.6																																																																																																																																																																																												
% Desgaste	40																																																																																																																																																																																												
Especificación: % menor que	-																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">TAMANO DEL TAMIZ</th> <th colspan="7">MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">PASA</th> <th colspan="2">RETENIDO EN</th> <th colspan="7">GRADACIONES A USAR</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>Pulgadas</th> <th>mm</th> <th>Pulgadas</th> <th colspan="4">INVIAS E-218</th> <th colspan="3">INVIAS E-219</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>75.0</td> <td>3"</td> <td>63.0</td> <td>2 1/2"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2500 ± 50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63.0</td> <td>2 1/2"</td> <td>50.0</td> <td>2"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2500 ± 50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50.0</td> <td>2"</td> <td>37.5</td> <td>1 1/2"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000 ± 50</td> <td>5000 ± 50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>37.5</td> <td>1 1/2"</td> <td>25.0</td> <td>1"</td> <td>1250 ± 25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000 ± 25</td> <td>5000 ± 25</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>1"</td> <td>19.0</td> <td>3/4"</td> <td>1250 ± 25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000 ± 25</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>3/4"</td> <td>12.5</td> <td>1/2"</td> <td>1250 ± 10</td> <td>2500 ± 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.5</td> <td>1/2"</td> <td>9.5</td> <td>3/8"</td> <td>1250 ± 10</td> <td>2500 ± 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.5</td> <td>3/8"</td> <td>6.3</td> <td>1/4"</td> <td></td> <td></td> <td>2500 ± 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.3</td> <td>1/4"</td> <td>4.75</td> <td>No. 4</td> <td></td> <td></td> <td>2500 ± 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.75</td> <td>No. 4</td> <td>2.36</td> <td>No. 8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5000 ± 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>5000 ± 10</td> <td>5000 ± 10</td> <td>5000 ± 10</td> <td>5000 ± 10</td> <td>10000 ± 100</td> <td>10000 ± 75</td> <td>10000 ± 50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">No. ESFERAS</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">No. REVOLUCIONES</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> </table>			TAMANO DEL TAMIZ				MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)							PASA		RETENIDO EN		GRADACIONES A USAR							mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	INVIAS E-218				INVIAS E-219							A	B	C	D	E	F	G	75.0	3"	63.0	2 1/2"					2500 ± 50			63.0	2 1/2"	50.0	2"					2500 ± 50			50.0	2"	37.5	1 1/2"					5000 ± 50	5000 ± 50		37.5	1 1/2"	25.0	1"	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25	25.0	1"	19.0	3/4"	1250 ± 25						5000 ± 25	19.0	3/4"	12.5	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10						12.5	1/2"	9.5	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10						9.5	3/8"	6.3	1/4"			2500 ± 10					6.3	1/4"	4.75	No. 4			2500 ± 10					4.75	No. 4	2.36	No. 8				5000 ± 10				TOTAL				5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	10000 ± 100	10000 ± 75	10000 ± 50	No. ESFERAS				12	11	8	6	12	12	12	No. REVOLUCIONES				500	500	500	500	1000	1000	1000
TAMANO DEL TAMIZ				MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)																																																																																																																																																																																									
PASA		RETENIDO EN		GRADACIONES A USAR																																																																																																																																																																																									
mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	INVIAS E-218				INVIAS E-219																																																																																																																																																																																					
				A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																																																			
75.0	3"	63.0	2 1/2"					2500 ± 50																																																																																																																																																																																					
63.0	2 1/2"	50.0	2"					2500 ± 50																																																																																																																																																																																					
50.0	2"	37.5	1 1/2"					5000 ± 50	5000 ± 50																																																																																																																																																																																				
37.5	1 1/2"	25.0	1"	1250 ± 25					5000 ± 25	5000 ± 25																																																																																																																																																																																			
25.0	1"	19.0	3/4"	1250 ± 25						5000 ± 25																																																																																																																																																																																			
19.0	3/4"	12.5	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10																																																																																																																																																																																								
12.5	1/2"	9.5	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10																																																																																																																																																																																								
9.5	3/8"	6.3	1/4"			2500 ± 10																																																																																																																																																																																							
6.3	1/4"	4.75	No. 4			2500 ± 10																																																																																																																																																																																							
4.75	No. 4	2.36	No. 8				5000 ± 10																																																																																																																																																																																						
TOTAL				5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	5000 ± 10	10000 ± 100	10000 ± 75	10000 ± 50																																																																																																																																																																																			
No. ESFERAS				12	11	8	6	12	12	12																																																																																																																																																																																			
No. REVOLUCIONES				500	500	500	500	1000	1000	1000																																																																																																																																																																																			
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN: _____ % DESGASTE _____																																																																																																																																																																																													
OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> AUTORIZÓ ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> DIRECTOR TÉCNICO NIT. 900.410.655.0 FIRMA Y SELLO </td> </tr> </table>			AUTORIZÓ ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA	DIRECTOR TÉCNICO NIT. 900.410.655.0 FIRMA Y SELLO																																																																																																																																																																																									
AUTORIZÓ ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA	DIRECTOR TÉCNICO NIT. 900.410.655.0 FIRMA Y SELLO																																																																																																																																																																																												

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA-CONTROL, 2011 SAS.
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.


Página 7 de 10

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com

Página 48 de 56

RICARDO GELVEZ MORENO


INGENIERO CIVIL

 Ingeniería + Control 2011 SAS	FORMATO		CÓDIGO: F-MLA-03/06																												
	LABORATORIO																														
	INFORME DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV E-133: 2013																														
N° Informe: 810-2023																															
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Proyecto:</td> <td style="width: 45%;">PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO</td> <td style="width: 15%;">Fecha de informe:</td> <td style="width: 25%;">2023-09-06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER</td> <td>N° de Orden:</td> <td>OL 3917</td> </tr> <tr> <td>Solicitante:</td> <td>TRANSMATERIALES S.A.</td> <td>Fecha de recolección:</td> <td>2023-08-30</td> </tr> <tr> <td>Situación:</td> <td>BASE GRANULAR</td> <td>Fecha de recepción:</td> <td>2023-08-30</td> </tr> <tr> <td>Fuente:</td> <td>PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES</td> <td>Fecha de ensayo:</td> <td>2023-09-02</td> </tr> <tr> <td>Descripción:</td> <td>N.A.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Proyecto:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO	Fecha de informe:	2023-09-06		MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER	N° de Orden:	OL 3917	Solicitante:	TRANSMATERIALES S.A.	Fecha de recolección:	2023-08-30	Situación:	BASE GRANULAR	Fecha de recepción:	2023-08-30	Fuente:	PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES	Fecha de ensayo:	2023-09-02	Descripción:	N.A.						
Proyecto:	PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO	Fecha de informe:	2023-09-06																												
	MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER	N° de Orden:	OL 3917																												
Solicitante:	TRANSMATERIALES S.A.	Fecha de recolección:	2023-08-30																												
Situación:	BASE GRANULAR	Fecha de recepción:	2023-08-30																												
Fuente:	PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES	Fecha de ensayo:	2023-09-02																												
Descripción:	N.A.																														
<p>Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Prueba</th> <th style="width: 15%;">1</th> <th style="width: 15%;">2</th> <th style="width: 15%;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura solución (°C)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>Lectura de Arcilla (ml)</td> <td style="text-align: center;">241</td> <td style="text-align: center;">240</td> <td style="text-align: center;">245</td> </tr> <tr> <td>Lectura de Arena (ml)</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">71</td> </tr> <tr> <td>Equivalente de Arena</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td>PROMEDIO %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td>Especificación: % mínimo</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> OBSERVACIONES: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> </div>				Prueba	1	2	3	Temperatura solución (°C)	22			Lectura de Arcilla (ml)	241	240	245	Lectura de Arena (ml)	65	63	71	Equivalente de Arena	27	27	29	PROMEDIO %	28			Especificación: % mínimo			
Prueba	1	2	3																												
Temperatura solución (°C)	22																														
Lectura de Arcilla (ml)	241	240	245																												
Lectura de Arena (ml)	65	63	71																												
Equivalente de Arena	27	27	29																												
PROMEDIO %	28																														
Especificación: % mínimo																															
AUTORIZO		DIRECTOR TÉCNICO																													
ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA		 Ing. Ricardo Gelvez Moreno NIT. 900.410.635.0																													
DIRECTOR TECNICO		FIRMA Y SELLO																													

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien autoriza y el sello del laboratorio.

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

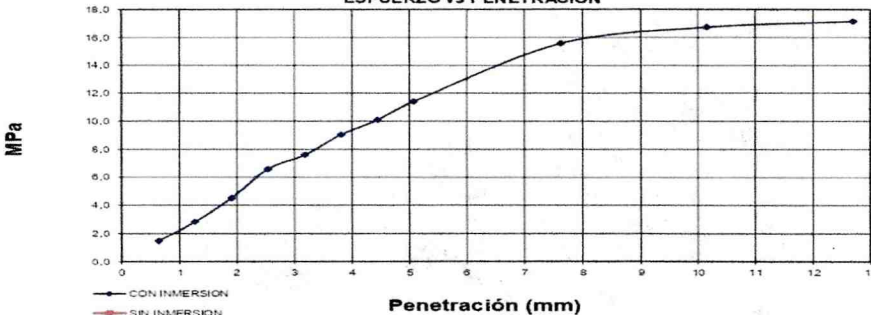






 Ingeniería + Control 2011 SAS	FORMATO	F-MLA-90/03																				
	LABORATORIO																					
	INFORME DE ENSAYO VALOR DE AZUL METILENO EN AGREGADOS FINOS INV E-235: 2013																					
N° Informe: 810-2023																						
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179																						
Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VÍA A LA CÁRCEL MODELO MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER																						
Solicitante: TRANSMATERIALES S.A.		Fecha de Informe: 2023-09-06																				
Situación: BASE GRANULAR		N° de orden: OL 3917																				
Fuente: PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES		Fecha de recolección: 2023-08-30																				
Descripción: N.A.		Fecha de recepción: 2023-08-30																				
		Fecha de ensayo: 2023-09-06																				
Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Muestra N°</th> <th style="width: 15%;">1</th> <th style="width: 15%;">2</th> <th style="width: 15%;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Masa de la muestra de ensayo, M1 (g)</td> <td style="text-align: center;">200,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volumen total añadido de la solución colorante, V1 (ml)</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volumen de la solución colorante absorbido por la caolinita, V' (ml)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor de Azul Metileno (g/kg)</td> <td style="text-align: center;">2,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Muestra N°	1	2	3	Masa de la muestra de ensayo, M1 (g)	200,5			Volumen total añadido de la solución colorante, V1 (ml)	60			Volumen de la solución colorante absorbido por la caolinita, V' (ml)	0			Valor de Azul Metileno (g/kg)	2,99		
Muestra N°	1	2	3																			
Masa de la muestra de ensayo, M1 (g)	200,5																					
Volumen total añadido de la solución colorante, V1 (ml)	60																					
Volumen de la solución colorante absorbido por la caolinita, V' (ml)	0																					
Valor de Azul Metileno (g/kg)	2,99																					
OBSERVACIONES:																						
AUTORIZO ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA		 DIRECTOR TÉCNICO NN. 900.410.635.0 FIRMA Y SELLO																				

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA+CONTROL 2011 SAS.
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien aprueba y el sello del laboratorio.

Página 9 de 10

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

 Ingenieria + Control 2011 <small>CONSTRUCCION PUNTO</small>	FORMATO LABORATORIO INFORME DE ENSAYO CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INVE-148: 2013	CÓDIGO: F-MLA-24/06																																																																																																																																															
	N° Informe: 810-2023																																																																																																																																																
	LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CALLE 25 # 8 - 42 PATIO CENTRO - LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER TEL: 5802179																																																																																																																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VIA A LA CÁRCEL MODELO Solicitante: MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER Situación: TRANSMATERIALES S.A. Fuente: BASE GRANULAR Descripción: PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Fecha de Informe: 2023-09-06 N° de Orden: OL 3917 Fecha de recolección: 2023-08-30 Fecha de recepción: 2023-08-30 Fecha de ensayo: 2023-09-06 </td> </tr> </table>			Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VIA A LA CÁRCEL MODELO Solicitante: MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER Situación: TRANSMATERIALES S.A. Fuente: BASE GRANULAR Descripción: PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.	Fecha de Informe: 2023-09-06 N° de Orden: OL 3917 Fecha de recolección: 2023-08-30 Fecha de recepción: 2023-08-30 Fecha de ensayo: 2023-09-06																																																																																																																																													
Proyecto: PLANTA TRANSMATERIALES - ANILLO VIAL ORIENTAL VIA A LA CÁRCEL MODELO Solicitante: MUNICIPIO DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER Situación: TRANSMATERIALES S.A. Fuente: BASE GRANULAR Descripción: PLANTA MÓVIL TRANSMATERIALES Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.	Fecha de Informe: 2023-09-06 N° de Orden: OL 3917 Fecha de recolección: 2023-08-30 Fecha de recepción: 2023-08-30 Fecha de ensayo: 2023-09-06																																																																																																																																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No Recipiente</td><td style="text-align: right;">332</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">465,40</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo (g)</td><td style="text-align: right;">440,40</td></tr> <tr><td>Masa recipiente (g)</td><td style="text-align: right;">59,90</td></tr> <tr><td>Humedad(%)</td><td style="text-align: right;">6,57</td></tr> </table> </td> <td style="width: 33%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Masa Molde + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">12623</td></tr> <tr><td>Masa del Molde (g)</td><td style="text-align: right;">7450</td></tr> <tr><td>Masa suelo + Agua (g)</td><td style="text-align: right;">5173</td></tr> <tr><td>Densidad Máxima suelo húmedo (g/cm³)</td><td style="text-align: right;">2,263</td></tr> <tr><td>Densidad Seca (g/cm³)</td><td style="text-align: right;">2,123</td></tr> </table> </td> <td style="width: 33%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">DATOS DEL MOLDE</td></tr> <tr><td>MOLDE:</td><td style="text-align: right;">32JO</td></tr> <tr><td>Altura:</td><td style="text-align: right;">12,6 cm</td></tr> <tr><td>Diámetro:</td><td style="text-align: right;">15,2 cm</td></tr> <tr><td>Área:</td><td style="text-align: right;">181,5 cm²</td></tr> <tr><td>Volumen:</td><td style="text-align: right;">2286,4 cm³</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">PESAS DE SOBRECARGA</td></tr> <tr><td>CANTIDAD:</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>MASA (g):</td><td style="text-align: right;">4538</td></tr> <tr><td>IDENTIFICACIÓN:</td><td style="text-align: right;">N.A.</td></tr> </table> </td> <td style="border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Norma de Compactación</td></tr> <tr><td>Método usado en la compactación:</td><td style="text-align: right;">INV E-142: 2013</td></tr> <tr><td>Material retenido en Tamiz 3/4":</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> <tr><td>Material sustituido para el ensayo</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No Recipiente</td><td style="text-align: right;">332</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">465,40</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo (g)</td><td style="text-align: right;">440,40</td></tr> <tr><td>Masa recipiente (g)</td><td style="text-align: right;">59,90</td></tr> <tr><td>Humedad(%)</td><td style="text-align: right;">6,57</td></tr> </table>	No Recipiente	332	Masa recipiente + suelo + agua (g)	465,40	Masa recipiente + suelo (g)	440,40	Masa recipiente (g)	59,90	Humedad(%)	6,57	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Masa Molde + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">12623</td></tr> <tr><td>Masa del Molde (g)</td><td style="text-align: right;">7450</td></tr> <tr><td>Masa suelo + Agua (g)</td><td style="text-align: right;">5173</td></tr> <tr><td>Densidad Máxima suelo húmedo (g/cm³)</td><td style="text-align: right;">2,263</td></tr> <tr><td>Densidad Seca (g/cm³)</td><td style="text-align: right;">2,123</td></tr> </table>	Masa Molde + suelo + agua (g)	12623	Masa del Molde (g)	7450	Masa suelo + Agua (g)	5173	Densidad Máxima suelo húmedo (g/cm³)	2,263	Densidad Seca (g/cm³)	2,123	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">DATOS DEL MOLDE</td></tr> <tr><td>MOLDE:</td><td style="text-align: right;">32JO</td></tr> <tr><td>Altura:</td><td style="text-align: right;">12,6 cm</td></tr> <tr><td>Diámetro:</td><td style="text-align: right;">15,2 cm</td></tr> <tr><td>Área:</td><td style="text-align: right;">181,5 cm²</td></tr> <tr><td>Volumen:</td><td style="text-align: right;">2286,4 cm³</td></tr> </table>	DATOS DEL MOLDE		MOLDE:	32JO	Altura:	12,6 cm	Diámetro:	15,2 cm	Área:	181,5 cm²	Volumen:	2286,4 cm³	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">PESAS DE SOBRECARGA</td></tr> <tr><td>CANTIDAD:</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>MASA (g):</td><td style="text-align: right;">4538</td></tr> <tr><td>IDENTIFICACIÓN:</td><td style="text-align: right;">N.A.</td></tr> </table>		PESAS DE SOBRECARGA		CANTIDAD:	2	MASA (g):	4538	IDENTIFICACIÓN:	N.A.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Norma de Compactación</td></tr> <tr><td>Método usado en la compactación:</td><td style="text-align: right;">INV E-142: 2013</td></tr> <tr><td>Material retenido en Tamiz 3/4":</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> <tr><td>Material sustituido para el ensayo</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> </table>	Norma de Compactación		Método usado en la compactación:	INV E-142: 2013	Material retenido en Tamiz 3/4":	12%	Material sustituido para el ensayo	12%																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No Recipiente</td><td style="text-align: right;">332</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">465,40</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo (g)</td><td style="text-align: right;">440,40</td></tr> <tr><td>Masa recipiente (g)</td><td style="text-align: right;">59,90</td></tr> <tr><td>Humedad(%)</td><td style="text-align: right;">6,57</td></tr> </table>	No Recipiente	332	Masa recipiente + suelo + agua (g)	465,40	Masa recipiente + suelo (g)	440,40	Masa recipiente (g)	59,90	Humedad(%)	6,57	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Masa Molde + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">12623</td></tr> <tr><td>Masa del Molde (g)</td><td style="text-align: right;">7450</td></tr> <tr><td>Masa suelo + Agua (g)</td><td style="text-align: right;">5173</td></tr> <tr><td>Densidad Máxima suelo húmedo (g/cm³)</td><td style="text-align: right;">2,263</td></tr> <tr><td>Densidad Seca (g/cm³)</td><td style="text-align: right;">2,123</td></tr> </table>	Masa Molde + suelo + agua (g)	12623	Masa del Molde (g)	7450	Masa suelo + Agua (g)	5173	Densidad Máxima suelo húmedo (g/cm³)	2,263	Densidad Seca (g/cm³)	2,123	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">DATOS DEL MOLDE</td></tr> <tr><td>MOLDE:</td><td style="text-align: right;">32JO</td></tr> <tr><td>Altura:</td><td style="text-align: right;">12,6 cm</td></tr> <tr><td>Diámetro:</td><td style="text-align: right;">15,2 cm</td></tr> <tr><td>Área:</td><td style="text-align: right;">181,5 cm²</td></tr> <tr><td>Volumen:</td><td style="text-align: right;">2286,4 cm³</td></tr> </table>	DATOS DEL MOLDE		MOLDE:	32JO	Altura:	12,6 cm	Diámetro:	15,2 cm	Área:	181,5 cm²	Volumen:	2286,4 cm³																																																																																																															
No Recipiente	332																																																																																																																																																
Masa recipiente + suelo + agua (g)	465,40																																																																																																																																																
Masa recipiente + suelo (g)	440,40																																																																																																																																																
Masa recipiente (g)	59,90																																																																																																																																																
Humedad(%)	6,57																																																																																																																																																
Masa Molde + suelo + agua (g)	12623																																																																																																																																																
Masa del Molde (g)	7450																																																																																																																																																
Masa suelo + Agua (g)	5173																																																																																																																																																
Densidad Máxima suelo húmedo (g/cm³)	2,263																																																																																																																																																
Densidad Seca (g/cm³)	2,123																																																																																																																																																
DATOS DEL MOLDE																																																																																																																																																	
MOLDE:	32JO																																																																																																																																																
Altura:	12,6 cm																																																																																																																																																
Diámetro:	15,2 cm																																																																																																																																																
Área:	181,5 cm²																																																																																																																																																
Volumen:	2286,4 cm³																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">PESAS DE SOBRECARGA</td></tr> <tr><td>CANTIDAD:</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>MASA (g):</td><td style="text-align: right;">4538</td></tr> <tr><td>IDENTIFICACIÓN:</td><td style="text-align: right;">N.A.</td></tr> </table>		PESAS DE SOBRECARGA		CANTIDAD:	2	MASA (g):	4538	IDENTIFICACIÓN:	N.A.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Norma de Compactación</td></tr> <tr><td>Método usado en la compactación:</td><td style="text-align: right;">INV E-142: 2013</td></tr> <tr><td>Material retenido en Tamiz 3/4":</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> <tr><td>Material sustituido para el ensayo</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> </table>	Norma de Compactación		Método usado en la compactación:	INV E-142: 2013	Material retenido en Tamiz 3/4":	12%	Material sustituido para el ensayo	12%																																																																																																																															
PESAS DE SOBRECARGA																																																																																																																																																	
CANTIDAD:	2																																																																																																																																																
MASA (g):	4538																																																																																																																																																
IDENTIFICACIÓN:	N.A.																																																																																																																																																
Norma de Compactación																																																																																																																																																	
Método usado en la compactación:	INV E-142: 2013																																																																																																																																																
Material retenido en Tamiz 3/4":	12%																																																																																																																																																
Material sustituido para el ensayo	12%																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3"></th><th colspan="3">ANTES DE INMERSION</th><th colspan="3">DESPUES DE INMERSION 96H</th><th colspan="2">CALCULO DE LA EXPANSION</th></tr> <tr> <th>Tiempo</th><th>Penetración (mm)</th><th>Esfuerzo Referencia MPa</th><th>Carga kN</th><th>Esfuerzo MPa</th><th>CBR %</th><th>Carga kN</th><th>Esfuerzo MPa</th><th>CBR %</th><th colspan="2">Datos iniciales</th></tr> <tr> <td>0,5</td><td>0,64</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,880</td><td>1,5</td><td></td><td>Fecha:</td><td>2023-09-02</td></tr> <tr> <td>1,0</td><td>1,27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,530</td><td>2,8</td><td></td><td>Lectura:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1,5</td><td>1,91</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,875</td><td>4,5</td><td></td><td colspan="2">Datos finales</td></tr> <tr> <td>2,0</td><td>2,54</td><td>6,9</td><td></td><td></td><td></td><td>12,895</td><td>6,6</td><td>95,2</td><td>Fecha:</td><td>2023-09-06</td></tr> <tr> <td>2,5</td><td>3,18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14,890</td><td>7,6</td><td></td><td>Lectura:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3,0</td><td>3,81</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17,725</td><td>9,0</td><td></td><td colspan="2">Tiempo transcurrido:</td></tr> <tr> <td>3,5</td><td>4,45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19,800</td><td>10,1</td><td></td><td colspan="2">Expansion:</td></tr> <tr> <td>4,0</td><td>5,08</td><td>10,3</td><td></td><td></td><td></td><td>22,360</td><td>11,4</td><td>110,6</td><td colspan="2">4 DIAS</td></tr> <tr> <td>4,5</td><td>7,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30,550</td><td>15,6</td><td></td><td colspan="2">0,00%</td></tr> <tr> <td>5,0</td><td>10,16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,850</td><td>16,7</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>5,5</td><td>12,70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33,640</td><td>17,1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> </table>						ANTES DE INMERSION			DESPUES DE INMERSION 96H			CALCULO DE LA EXPANSION		Tiempo	Penetración (mm)	Esfuerzo Referencia MPa	Carga kN	Esfuerzo MPa	CBR %	Carga kN	Esfuerzo MPa	CBR %	Datos iniciales		0,5	0,64					2,880	1,5		Fecha:	2023-09-02	1,0	1,27					5,530	2,8		Lectura:	0	1,5	1,91					8,875	4,5		Datos finales		2,0	2,54	6,9				12,895	6,6	95,2	Fecha:	2023-09-06	2,5	3,18					14,890	7,6		Lectura:	0	3,0	3,81					17,725	9,0		Tiempo transcurrido:		3,5	4,45					19,800	10,1		Expansion:		4,0	5,08	10,3				22,360	11,4	110,6	4 DIAS		4,5	7,62					30,550	15,6		0,00%		5,0	10,16					32,850	16,7				5,5	12,70					33,640	17,1			
			ANTES DE INMERSION			DESPUES DE INMERSION 96H			CALCULO DE LA EXPANSION																																																																																																																																								
Tiempo	Penetración (mm)	Esfuerzo Referencia MPa	Carga kN	Esfuerzo MPa	CBR %	Carga kN	Esfuerzo MPa	CBR %	Datos iniciales																																																																																																																																								
0,5	0,64					2,880	1,5		Fecha:	2023-09-02																																																																																																																																							
1,0	1,27					5,530	2,8		Lectura:	0																																																																																																																																							
1,5	1,91					8,875	4,5		Datos finales																																																																																																																																								
2,0	2,54	6,9				12,895	6,6	95,2	Fecha:	2023-09-06																																																																																																																																							
2,5	3,18					14,890	7,6		Lectura:	0																																																																																																																																							
3,0	3,81					17,725	9,0		Tiempo transcurrido:																																																																																																																																								
3,5	4,45					19,800	10,1		Expansion:																																																																																																																																								
4,0	5,08	10,3				22,360	11,4	110,6	4 DIAS																																																																																																																																								
4,5	7,62					30,550	15,6		0,00%																																																																																																																																								
5,0	10,16					32,850	16,7																																																																																																																																										
5,5	12,70					33,640	17,1																																																																																																																																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No Recipiente</td><td style="text-align: right;">264</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">718,7</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo (g)</td><td style="text-align: right;">675,8</td></tr> <tr><td>Masa Recipiente (g)</td><td style="text-align: right;">66,9</td></tr> <tr><td>% Humedad</td><td style="text-align: right;">7,0</td></tr> </table> </td> <td style="width: 40%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PENETRACIÓN (mm)</th><th>Esfuerzo MPa</th><th>CBR% Corregido</th></tr> <tr><td>2,54</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5,08</td><td></td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No Recipiente</td><td style="text-align: right;">264</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">718,7</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo (g)</td><td style="text-align: right;">675,8</td></tr> <tr><td>Masa Recipiente (g)</td><td style="text-align: right;">66,9</td></tr> <tr><td>% Humedad</td><td style="text-align: right;">7,0</td></tr> </table>	No Recipiente	264	Masa recipiente + suelo + agua (g)	718,7	Masa recipiente + suelo (g)	675,8	Masa Recipiente (g)	66,9	% Humedad	7,0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PENETRACIÓN (mm)</th><th>Esfuerzo MPa</th><th>CBR% Corregido</th></tr> <tr><td>2,54</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5,08</td><td></td><td></td></tr> </table>	PENETRACIÓN (mm)	Esfuerzo MPa	CBR% Corregido	2,54			5,08																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>No Recipiente</td><td style="text-align: right;">264</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo + agua (g)</td><td style="text-align: right;">718,7</td></tr> <tr><td>Masa recipiente + suelo (g)</td><td style="text-align: right;">675,8</td></tr> <tr><td>Masa Recipiente (g)</td><td style="text-align: right;">66,9</td></tr> <tr><td>% Humedad</td><td style="text-align: right;">7,0</td></tr> </table>	No Recipiente	264	Masa recipiente + suelo + agua (g)	718,7	Masa recipiente + suelo (g)	675,8	Masa Recipiente (g)	66,9	% Humedad	7,0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PENETRACIÓN (mm)</th><th>Esfuerzo MPa</th><th>CBR% Corregido</th></tr> <tr><td>2,54</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5,08</td><td></td><td></td></tr> </table>	PENETRACIÓN (mm)	Esfuerzo MPa	CBR% Corregido	2,54			5,08																																																																																																																															
No Recipiente	264																																																																																																																																																
Masa recipiente + suelo + agua (g)	718,7																																																																																																																																																
Masa recipiente + suelo (g)	675,8																																																																																																																																																
Masa Recipiente (g)	66,9																																																																																																																																																
% Humedad	7,0																																																																																																																																																
PENETRACIÓN (mm)	Esfuerzo MPa	CBR% Corregido																																																																																																																																															
2,54																																																																																																																																																	
5,08																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Expansión en 4 días</td><td style="text-align: right;">0,00%</td><td>CLASIFICACIÓN S.U.C.S.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr> <td>% Agua Absorbida</td><td style="text-align: right;">0,5</td><td>LÍMITE LÍQUIDO</td><td style="text-align: right;">NL</td></tr> <tr> <td>Densidad Seca g/cm³</td><td style="text-align: right;">2,123</td><td>LÍMITE PLÁSTICO</td><td style="text-align: right;">NP</td></tr> <tr> <td>C.B.R</td><td style="text-align: right;">110,6</td><td>ÍNDICE DE PLASTICIDAD</td><td style="text-align: right;">NP</td></tr> </table>			Expansión en 4 días	0,00%	CLASIFICACIÓN S.U.C.S.	-	% Agua Absorbida	0,5	LÍMITE LÍQUIDO	NL	Densidad Seca g/cm³	2,123	LÍMITE PLÁSTICO	NP	C.B.R	110,6	ÍNDICE DE PLASTICIDAD	NP																																																																																																																															
Expansión en 4 días	0,00%	CLASIFICACIÓN S.U.C.S.	-																																																																																																																																														
% Agua Absorbida	0,5	LÍMITE LÍQUIDO	NL																																																																																																																																														
Densidad Seca g/cm³	2,123	LÍMITE PLÁSTICO	NP																																																																																																																																														
C.B.R	110,6	ÍNDICE DE PLASTICIDAD	NP																																																																																																																																														
GRÁFICA ESFUERZO vs PENETRACIÓN																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES: MUESTRA COMPACTADA A 56 GOLPES.																																																																																																																																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">AUTORIZO</td></tr> <tr><td colspan="2">ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA</td></tr> <tr><td colspan="2">DIRECTOR TÉCNICO</td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">DIRECTOR TÉCNICO</td></tr> <tr><td colspan="2">FIRMA Y SELLO</td></tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">AUTORIZO</td></tr> <tr><td colspan="2">ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA</td></tr> <tr><td colspan="2">DIRECTOR TÉCNICO</td></tr> </table>	AUTORIZO		ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA		DIRECTOR TÉCNICO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">DIRECTOR TÉCNICO</td></tr> <tr><td colspan="2">FIRMA Y SELLO</td></tr> </table>			DIRECTOR TÉCNICO		FIRMA Y SELLO																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">AUTORIZO</td></tr> <tr><td colspan="2">ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA</td></tr> <tr><td colspan="2">DIRECTOR TÉCNICO</td></tr> </table>	AUTORIZO		ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA		DIRECTOR TÉCNICO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">DIRECTOR TÉCNICO</td></tr> <tr><td colspan="2">FIRMA Y SELLO</td></tr> </table>			DIRECTOR TÉCNICO		FIRMA Y SELLO																																																																																																																																					
AUTORIZO																																																																																																																																																	
ING. IVAN ENRIQUE RANGEL VERA																																																																																																																																																	
DIRECTOR TÉCNICO																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																	
DIRECTOR TÉCNICO																																																																																																																																																	
FIRMA Y SELLO																																																																																																																																																	

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin previa autorización de INGENIERIA + CONTROL 2011 SAS
Este documento es válido cuando lleve la firma de quien aprueba y el Sello del laboratorio

Página 10 de 10 FIN DE INFORME

Avenida 9 Calle 10 Sur KDX 94 Barrio Pisarreal de los Patios Norte de Santander
 Celular 3204964131, Correo: construpunto@hotmail.com
Pagina 51 de 56

RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

4 TRANSPORTE DE MUESTRAS Y/O MATERIAL PARA ENSAYOS
UND 4,00



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

ENSAYOS DE RESISTENCIA

1 MUESTREO Y ENSAYOS SOBRE CILINDROS DE CONCRETO A EDADES DE 3, 7, 14 Y 28 DÍAS, PARA DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (NTC-673) UND 20,00

En obra se realizaron ensayos de cilindros para concretos, para realizar la respectiva prueba de resistencia a la compresión



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

CONTROL DE COMPACTACIÓN

1 ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO (INV-13 E-142) PARA CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE COMPACTACIÓN DE LOS MATERIALES DE RELLENO UND 4,00

Se realizaron los ensayos de laboratorio para determinar el Proctor modificado para conocer el parámetro de compactación, para poder usar como referencia para los ensayos de densidades.



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

2 ENSAYOS DE DENSIDAD SECA IN SITU (CONO ARENA) PARA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO UND 4,00

Durante el desarrollo de la obra se realizaron los ensayos de densidades a la base en la vía donde se harían los pavimentos.



RICARDO GELVEZ MORENO

INGENIERO CIVIL

CONCLUSION

De esta forma se ha dado cumplimiento al ítem contratado denominado para el PLAN DE GESTION DE OBRA – PGIO. En el CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-SI-017-2023denominado PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 28, ENTRE AVENIDA 0 Y AVENIDA 1E DEL BARRIO LA CORDIALIDAD, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER



Ricardo Gelvez Moreno
Contratista
