

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 6

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO
OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINAMICA EN
LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL
ARROYO LEON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

PERIODO DE EJECUCION

DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 02 DE ENERO
DE 2026



**CONSORCIO
RECUPERACIÓN
HIDRÁULICA**

**CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA
CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025**

Contenido

1. INTRODUCCION.....	5
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	7
2.1 Localización	7
2.2 Actividades Por Ejecutar	9
2.2.1 Localización, trazado y replanteo	9
2.2.2 Limpieza para recuperación ambiental	9
2.2.3 Retiro y disposición final de residuos	10
2.2.4 Limpieza para recuperación ambiental	10
2.2.4 Especificaciones Técnicas Componente Socioambiental	10
Fitoplancton y Zooplancton.....	12
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	14
3.2 Presupuesto del Proyecto	16
3.3 Cronograma del Proyecto	22
3.3 Personal del Contratista	23
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA	23
6. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	34
5.2 Información General.....	34
5.2 Presupuesto de la Interventoría	35
5.3 Personal de la Interventoría	37
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA.....	37
6.2 Actividades Técnicas.....	37
6.2 Seguimiento a la Ejecución	46
6.3 COMPONENTE SST	47
6.3.1 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.....	48
6.3.3 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD.....	48
6.4 COMPONENTE SOCIAL	49
6.4.1 COMPONENTE SOCIAL.....	49
6.4.2 PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.....	50
6.4.3 PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.....	51
PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.....	51
6.4.4 PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA	52
CONCLUSIONES SOCIALES.....	52
6.5 COMPONENTE AMBIENTAL	52
6.5.1 PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE HABITAT	53
6.5.1.1 PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA	54
6.5.1.2 PROGRAMA DE REVEGETACION	55
6.5.1.3 PROGRAMA ABIOTICO	55
6.5.1.4 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO	56
6.5.1.5 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO	56
6.5.1.6 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.....	56
6.5.1.7 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS.....	57
6.5.1.8 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR TRÁNSITO VEHICULAR	57

6.5.1.9 PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	58
6.5.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA	58
6.5.2.1 PROGRAMA DE RESTAURACION PAISAJISTICA.....	58
6.5.3 PROGRAMAS SOCIALES	58
6.5.4 PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.....	58
6.5.5 PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD ...	58
6.5.6 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	58
7. Pagos Realizados	59
7.1 Pagos realizados al Contratista	59
7.2 Pagos realizados a la Interventoría	59
8. CONCLUSIONES.....	59
9. ANEXOS:	60

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Parámetros a evaluar	11
Tabla 2: Coordenadas de estaciones de monitoreo	12
Tabla 3: Información del Contratista de obra	15
Tabla 4: Presupuesto del Proyecto	16
Tabla 5: Tabla de Hitos según programación	23
Tabla 6: Personal del Contratista	23
Tabla 7: Información de Interventoría	35
Tabla 8: Presupuesto de la Interventoría	36
Tabla 9: Personal de la Interventoría	37
Tabla 10: CHARLAS REPORTADAS POR EL CONTRATISTA	38
Tabla 11: INSPECCIONES DE SEGURIDAD	48
Tabla 12: INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	49
Tabla 13: INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	49
Tabla 14: INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	49
Tabla 15: COMPONENTE SOCIAL	50
Tabla 16: COMPONENTE SOCIAL	50
Tabla 17: INDICADORES INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS	50
Tabla 18: PROGRAMA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	50
Tabla 19: INDICADORES	50
Tabla 20: MANIFESTACIONES CIUDADANAS	51
Tabla 21: PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	51
Tabla 22: INDICADORES PERMISOS A PREDIOS	51
Tabla 23: INDICADORES ACTAS DE VECINDAD	51
Tabla 24: PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA	52
Tabla 25: PERSONAL DE MONICIÓN DEL TOTUMO	60
Tabla 26: COMPONENTE AMBIENTAL	53
Tabla 27: PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HABITAT	54
Tabla 28: Pagos al Contratista	59
Tabla 29: Pagos a la Interventoría	59

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Ubicación de Puerto Colombia en Colombia	7
Ilustración 2: Ubicación de Arroyo Leon	7
Ilustración 3: Ubicación de Piojo Colombia	8
Ilustración 4: Localización de la Ciénaga del Totumo	8
Ilustración 5: Sección Típica de Diseño	9
Ilustración 6: Ubicación de Puntos de Muestreo Ciénaga del Totumo	12
Ilustración 7: Gantt de Seguimiento	22
Ilustración 8: Curva de Avance	47

1. INTRODUCCION

El recurso agua, su planificación y gestión, ocupa un lugar prioritario en la agenda mundial por su situación de escasez, contaminación e impactos directos del cambio climático. Por tanto, proteger el agua en cada región, y en este caso en el Departamento del Atlántico que es de los más afectados por la sequía, se hace esencial. El cuidado, el ordenamiento de cuencas y cuerpos de agua específicos, su preservación y en muchos casos su recuperación, es una de las principales tareas de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

Junto con los recursos hídricos, en un proceso armónico y codependiente, se encuentra el ordenamiento ambiental de los recursos naturales y el territorio. Esenciales para que los usos de las poblaciones vecinas a los cuerpos de agua puedan armonizar con su protección. Asimismo, van de la mano en un proceso de gestión ambiental consistente y armónico, la gestión de riesgos, soporte de las decisiones sobre el suelo y la naturaleza de un territorio, y el manejo de los vertimientos que contaminan las aguas, suelos y vegetación. A su vez el término capital natural hace referencia a los recursos naturales como plantas, minerales, animales, aire o petróleo de la biosfera, vistos como medios de producción de bienes y servicios ecosistémicos: Producción de oxígeno, depuración natural del agua, prevención de la erosión, polinización y servicios recreativos en sí. Es una mirada dinámica, novedosa sobre el patrimonio natural, de tal forma que se inserta en la visión moderna de la gestión y funciones de la naturaleza para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Involucra la dinámica de protección, recuperación y preservación de este capital a partir de su identificación específica, su simbología de respeto colectivo y su potencialización.

En virtud de lo anterior la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, ha venido implementando acciones encaminadas a la recuperación hídrica de la Ciénaga de Mallorquín, las cuales fueron priorizadas a partir del Plan de Acción 2024 – 2027, “Por un Ambiente Sin Fronteras”, en los que se establecieron un conjunto de intervenciones que contribuirían a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones aledañas de la zona ante eventos climatológicos extremos. Entre las cuales se encuentran la limpieza y recuperación ambiental del Arroyo León afluente de la ciénaga de Mallorquín.

Para la vigencia 2025 se tiene contemplado continuar con las labores de limpieza y recuperación ambiental del Arroyo León en dos sectores el No. 1 o tramo principal 3100 metros (desde la Vía a la Playa y la Cra 51 B aguas arriba) y adicionalmente el brazo del mismo desde la Cra 51B hasta su conexión 1.492 metros lineales aguas abajo, conforme las secciones propuestas por la Universidad del Magdalena producto del Convenio No. 005 del 2024 , cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES, HIDRODINÁMICOS Y MORFODINÁMICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CIÉNAGAS DE MALLORQUÍN, MANATÍES Y BALBOA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

Así mismo, producto del Contrato No. 471 del 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR EL ESTUDIO HIDROSEDIMENTOLÓGICO DE LA CIÉNAGA TOTUMO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CUERPOS DE AGUA ASOCIADOS A LA CUENCA DE LOS ARROYOS DIRECTOS AL MAR CARIBE”, se establecieron las acciones para la recuperación de la hidrodinámica de la Ciénaga del Totumo a través de la interconexión de la misma con sus diferentes sectores, específicamente mediante la remoción de vegetación (biota)

acuática en el sector del Rodeo, el cual se encuentra colmatado de elodea. En este sentido, se requiere realizar las intervenciones necesarias que permitan garantizar el adecuado flujo e interconexión hidrodinámica de dicho hidrosistema (Ciénaga del Totumo), ubicado en la jurisdicción del Municipio de Piojó; toda vez que una adecuada regulación hídrica permitiría mantener el volumen de agua suficiente para la supervivencia de la flora y fauna de este cuerpo de agua, en épocas de sequías y además mitigar los riesgos por inundación en épocas de invierno.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- en ejercicio de las funciones que le asignan la ley 99 de 1993 en su ánimo de conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente, en el Departamento del Atlántico, ejecuta políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplimiento y aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se encuentra localizado en la región caribe en el departamento del Atlántico en la jurisdicción de los municipios de Puerto Colombia y Piojó.

En primer lugar, Puerto Colombia está ubicada a 15 km de la capital del departamento del Atlántico, Barranquilla, está ubicada en las coordenadas geográficas 10°59'2" de latitud Norte y a 74° 57' 2" de longitud Oeste, con una altitud promedio de 15 m s. n. m. Su extensión aproximada es de 93 km² y con temperatura media de 27,8 °C.



Ilustración 1: Ubicación de Puerto Colombia en Colombia

La ubicación específica de las intervenciones de mantenimiento y limpieza del Arroyo León son las siguientes:



Ilustración 2: Ubicación de Arroyo León

Seguido se encuentra el Municipio de Piojó ubicado a 61 km de la capital del departamento del Atlántico, Barranquilla, está ubicada en las coordenadas geográficas 10°45'01" de latitud Norte y a 75° 06' 27" de longitud Oeste, con una altitud promedio de 516 m s. n. m. Su extensión aproximada es de 256 km² y con temperatura media de 27,3 °C.



Ilustración 3: Ubicación de Piojo Colombia

En la jurisdicción de este municipio están ubicado el CIENAGA DEL TOTUMO la cual se realizará mantenimiento a través de la extracción de vegetación acuática en 4.85 Ha, se muestra su ubicación:



Ilustración 4: Localización de la Ciénaga del Totumo

2.2 Actividades Por Ejecutar

A continuación, se detallan la secuencia de actividades que el contratista se compromete a ejecutar siguiendo los buenos prácticas de ingeniería y de una manera lógica y ordenada.

2.2.1 Localización, trazado y replanteo

(Incluye Topógrafos, cadeneros y equipos de medición)

Este ítem, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto tanto en agua como en tierra, con el fin de que las obras queden en las coordenadas diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localización, es importante que la topografía, se rija por las referencias de planimetría y altimetría suministradas en el proyecto, a través de puntos fijos y BM existentes en donde se realizó el levantamiento inicial. El trazado se deberá ejecutar siguiendo estrictamente los planos, en donde se encuentra todo lo relacionado a ejes, centros y paramentos de las obras. También se deberá tener en cuenta dentro de este ítem la demarcación de los puntos.

Se deberá contar como mínimo personal requerido un topógrafo con licencia vigente y dos cadeneros o ayudantes de topografía. Como mínimo equipo requerido una estación total y GNSS RTK.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será metros cuadrados (m²) de localización, trazado y replanteo de comisión topográfica, cumpliendo con lo establecido en el presente documento.

2.2.2 Limpieza para recuperación ambiental

La limpieza consiste en el conjunto de las actividades de excavar y reconformar los taludes del Arroyo León afluente a la Ciénaga de Mallorquín. Las secciones de excavación deben realizarse según lo indicado en las secciones transversales tipo que se presentan a continuación:




Ilustración 5: Sección Típica de Diseño

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación. Se deben garantizar los niveles y secciones de fondos de los caños y anchos propuestos.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico (m³), justificado en las carteras topográficas, de cálculo manual o digital con software. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto.

2.2.3 Retiro y disposición final de residuos

Esta actividad corresponde a la disposición final del material retirado por limpieza para recuperación ambiental del arroyo. Dicha disposición se deberá llevar a cabo en un sitio autorizado.

De igual forma, dentro del desarrollo del contrato, para optimizar las actividades de limpieza, retiro y disposición, y cumplir cabalmente con el objeto del contrato, el Contratista de Obra podrá analizar otras alternativas de disposición del material. Para este fin, a su cuenta y riesgo, deberá realizar los estudios técnicos y ambientales y trámites pertinentes a través de la Autoridad Ambiental, para lograr las modificaciones y/o ajustes de los permisos y/o Planes de Manejo correspondientes, cumpliendo con toda la normatividad vigente.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cúbico por Kilometro (m³-Km), incluye todo lo necesario para el retiro y disposición final de los residuos producto de la limpieza para recuperación ambiental del arroyo sujetos de intervención en el proyecto.

3. 2. 4 Limpieza para recuperación ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas

La limpieza consiste en el conjunto de las actividades de extraer y acopiar en las orillas la vegetación acuática (elodea) en la Ciénaga del Totumo mediante el uso de retroexcavadora sobre planchón, de acuerdo con las áreas propuestas para lograr la interconexión hidrodinámica del sector del Rodeo con el cuerpo principal de la Ciénaga del Totumo.

Medida y forma de pago: La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), justificado en las carteras topográficas, de cálculo manual o digital con software. El trabajo de extracción se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto.

2.2.4 Especificaciones Técnicas Componente Socioambiental

Toma de muestras, almacenamiento, procesamiento, embalaje y cadena de custodia para los análisis de calidad de agua de la Ciénaga del Totumo.

La toma de las muestras de agua se deberá realizar de la siguiente manera:

1. Preparación del muestreo.
2. Preparación de los envases para la toma de muestra.
3. Preparación de las hojas de cadena de custodia.
4. Coordinación para el transporte de las muestras.
5. Preparación del equipo de muestreo (guantes, GPS, cámara fotográfica, coolers, etc.)
6. Preparación del equipo de análisis In Situ.

7. Preparación de los equipos de seguridad (flotadores, gafas).
8. Organización de la logística para la campaña de muestreo (transporte terrestre y lancha).

Análisis de Calidad del Agua

Para la toma de muestras de los parámetros físicoquímicos y microbiológicos, para realizar el análisis de calidad del agua y determinar el estado del cuerpo de agua, se determinaron tres (3) puntos de muestreo dentro de la Ciénaga del Totumo (Ver Figura 1 y precisados con coordenadas en la Tabla 2), donde se tomarán los parámetros físicoquímicos por cada punto, se realizarán los muestreos en el cuerpo de agua previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada mes, una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

En cada muestreo se analizarán los parámetros físicoquímicos descritos en la Tabla 1, que son necesarios para establecer los índices de calidad ICOMI, ICOMO, ICOSUS e ICOTRO:

Tabla 1: Parámetros a evaluar

PARÁMETROS	
Temperatura	Sólidos totales
Salinidad	Sólidos suspendidos
Oxígeno disuelto	Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)
pH	Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Turbidez	Nitratos
Clorofila	Nitrógeno Total
Grasas y aceites	Alcalinidad
Ortofosfatos	Tensoactivos (SAAM)
Fósforo	Coliformes termotolerantes
Dureza	Coliformes totales



Ilustración 6: Ubicación de Puntos de Muestreo Ciénaga del Totumo

Tabla 2: Coordenadas de estaciones de monitoreo

COORDENADAS ESTACIONES MONITORE CIENAGA DEL TOTUMO		
ESTACIÓN	LATITUD (N)	LONGITUD (O)
Punto No. 1	10° 42' 52.16"	75° 14' 56.73"
Punto No. 2	10° 43' 04.46"	75° 14' 47.79"
Punto No. 3	10° 42' 48.89"	75° 14' 44.19"

Fitoplancton y Zooplancton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del fitoplancton y zooplancton en cada punto de muestreo se deberán tomar muestras de agua de la zona fótica utilizando una botella de Van Dorn de 2,2 Lt. Las muestras se deberán depositar en frascos plásticos de 250 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para el análisis cualitativo y cuantitativo (Rice et al., 2017). Si la muestra contiene una elevada densidad y/o materia orgánica es conveniente diluir la muestra con agua del sitio de muestreo. Las muestras conservadas con Lugol/Etanol se deberán conservar protegidas de la luz y en un lugar fresco (<15°). Para determinaciones cuantitativas, se tomará un mililitro (1ml) de la muestra, el cual será depositado en una cámara de conteo Sedgwick-Rafter que limita el área y volumen, y permite calcular las densidades poblacionales mediante cuantificación en bandas, después de un periodo de asentamiento

Perifiton

Para determinar la diversidad, composición, y estructura del Perifiton las muestras deberán ser tomadas dependiendo de la disponibilidad de los sustratos naturales (Roca, Tronco, Macrófitas, Lodo) que se puedan encontrar en la Ciénaga de Mallorquín. Estas muestras serán tomadas mediante un raspado con un cuadrante de área determinada

(9 x 9 cm) en las zonas litorales del cuerpo de agua. Se deberán tomar muestras de cada sustrato posible y se depositarán en frascos plásticos de 100 ml debidamente rotulados, con una solución preservante para su posterior análisis cualitativo y cuantitativo.

Macroinvertebrados bentónicos En los cuerpos lénticos es común tomar muestras de bentos, mediante la utilización de un equipo adecuado (tomador de muestras tipo draga) que permita llegar hasta el fondo del cuerpo de agua tomando la muestra de material béntico. El sedimento se podrá tamizar directamente en campo, con un tamiz de 300 μ m para disminuir la materia orgánica o sedimento dentro de la muestra o tamizar en el laboratorio certificado por el IDEAM al momento de procesar la muestra. El área para muestrear para que sea representativa deberá ser de 0.1m². El material se deberá envasar en frascos plásticos de 500 ml o 1L de boca ancha o en bolsas plásticas de cierre hermético, se narcotizarán y se fijara con abundante alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante y se debe rotular cada una de las muestras colectadas (Rice et al., 2017).

Macroinvertebrados asociados a Macrófitas

De acuerdo con la presencia de macrófitas en el cuerpo de agua en estudio se deberá realizar un transecto sobre el parche de las macrófitas de dimensiones conocidas (de ser posible mínimo 10 metros) y se deberá llevar a cabo un barrido con la red tipo D por debajo de las macrófitas, colectando los macroinvertebrados que se encuentren presentes en las raíces de las mismas. De no ser posible pasar la red tipo D por debajo de las macrófitas se puede sacar la planta del agua y sacudirla sobre a red D o Surber y de esta manera recuperar los macroinvertebrados que se encuentren asociados. Si no es posible demarcar transectos por la distribución de las macrófitas, se podrán demarcar áreas definidas con ayuda de un cuadrante o teniendo en cuenta el área de la red. Para preservar las muestras se deberá agregar alcohol al 70% hasta que la muestra quede sumergida, evitando el exceso de preservante (APHA, 2017).

Ictiofauna

La caracterización de la ictiofauna de la Ciénaga del Totumo se realizará mediante la utilización del enfoque de metabarcodin que permite documentar y/o caracterizar la diversidad de especies en el ecosistema y puede tener una mejor cobertura para identificar taxones raros dentro del ecosistema (Pavan-Kumar et al., 2015).

Todos los análisis de parámetros hidrobiológicos descritos se realizarán en tres (3) puntos de muestreo dentro de la Ciénaga del Totumo (correspondientes a los establecidos en las Figuras 1 y precisados con coordenadas en la Tabla 2), donde se realizarán los muestreos por cada punto previo al inicio de actividades para establecer la línea base y los siguientes muestreos de los parámetros en referencia se realizarán al finalizar cada dos meses (de manera bimensual), una vez concluidas las actividades se llevará a cabo el muestreo final.

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General

La siguiente tabla contempla los datos principales del contratista de obra:

Contratista	CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO
Participantes	COMPAÑÍA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S – 90,00% EMSAAC INGENIERIA S.A.S. - (10,00%)
Representante Legal	CESAR AUGUSTO CARO PINILLA, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.140.843.698 expedida en Barranquilla
Contrato No.	0281 de 2025
Objeto	“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”
Valor Inicial	\$ 6.163.657.461,00
Adiciones	\$ 2.101.266.178,96
Valor Total	\$ 8.264.923.639,96
Plazo Inicial de Ejecución	6 meses
Plazo adicional	2 meses
Plazo Definitivo	8 meses
Fecha de Inicio	3 de julio de 2025
Fecha de Terminación Programada	28 de febrero de 2026
COMPONENTE ADMINISTRATIVO	
Pagos Parciales	Mediante actas de recibo parcial por avance, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría Externa, de conformidad con el sistema de PRECIOSUNITARIOS.
Origen de los Recursos	Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)
COMPONENTE JURIDICO	
El Contratista Toma la Póliza con la compañía de SEGUROS DEL ESTADO SA, un seguro de cumplimiento para entidades estatales No. 85-44-101139045; y seguros de responsabilidad civil con la misma entidad, SEGUROS DEL ESTADO SA, con numero de Póliza 85-40-101064073, que ampara los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratita en virtud del OTROSÍ No. 2 del contrato de Obra No 0281 de 2025, a continuación, se detallan los amparos:	

Amparo	Valor	Vigencias	
		Inicio	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 826.492.364,00	03/07/2025	03/09/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 413.246.182,00	03/07/2025	02/03/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 1.652.984.727,99	02/01/2026	02/01/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 569.400.000,00	03/07/2025	02/31/2026

Tabla 3: Información del Contratista de obra

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. 0281 DE 2025, fue suscrita el día 03 de julio de 2025 entre el Supervisor de la Entidad Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto.

Posteriormente se suscribe Otro Si No. 1 el 21 de noviembre 2025 con el objeto de adicionar DOS MIL CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/L (\$2.101.266.178,96), por solicitud de Entidad Contratante de ampliar alcance de intervenciones en el Arroyo León aguas arriba.

Se suscribe Otro Si No. 2 el 29 de diciembre 2025 donde se genera AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR DOS (2) MESES, con el objeto de incluir obras de protección en sectores erosionados por el caudal del Arroyo León.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



3.2 Presupuesto del Proyecto

El contratista ejecutara el proyecto en base a la oferta económica presentada que a continuación se detalla:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON				
1.01	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	m2	68,880.00	\$ 1,556.00	\$ 107,177,280.00
1.02	Limpieza para Recuperación Ambiental	m3	91,219.00	\$ 21,802.00	\$ 1,988,756,638.00
1.03	Retiro y Disposición Final de Residuos	m3 - km	907,173.00	\$ 1,343.00	\$ 1,218,333,339.00
1.04	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	m3	9,660.00	\$ 43,929.00	\$ 424,354,140.00
2	CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO				
2.01	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	m2	48,500.00	\$ 1,146.00	\$ 55,581,000.00
2.02	Movilización Terrestre de Equipos	Und	1.00	\$ 20,397,500.00	\$ 20,397,500.00
2.03	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	m2	48,500.00	\$ 17,492.00	\$ 848,362,000.00
2.04	Desmovilización Terrestre de Equipos	Und	1.00	\$ 20,397,500.00	\$ 20,397,500.00
3	CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL				
3.01	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Coliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales).	Muestra	21	\$ 1,126,141.00	\$ 23,648,961.00
3.02	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna).	Muestra	12	\$ 2,855,551.00	\$ 34,266,612.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 4,741,274,970.00
ADMINISTRACIÓN (22%)					1.043.080.493
IMPREVISTOS (2%)					\$142.238.249
UTILIDAD (5%)					\$237.063.749
COSTO TOTAL					\$6.163.657.461

Tabla 4: Presupuesto del Proyecto

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



3.2.1. PRESUPUESTO DE OBRA MODIFICATIVA No. 1 – ADICIONAL

El 21 de noviembre de 2025, se suscribe modificatorio al contrato de obra No. 1, en el cual se adicionan **DOSMIL CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MTE \$2.101.266.178,96** y cuyas cantidades y valores definitivos a ejecutar se relacionan a continuación:

PRESUPUESTO						ADICIONAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON						
1.01	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	m2	68.880,00	\$ 1.556,00	\$ 107.177.280,00	112.589,47	\$ 175.189.210,13
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	91.219,00	\$ 21.802,00	\$ 1.988.756.638,00	126.059,24	\$ 2.748.343.550,48
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	907.173,00	\$ 1.343,00	\$ 1.218.333.339,00	1.091.825,06	\$ 1.466.321.060,95
1.04	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	m3	9.660,00	\$ 43.929,00	\$ 424.354.140,00	21.970,14	\$ 965.126.174,63
2	CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO						
2.01	Localizacion, Replanteo y Control Topográfico en Cienaga	m2	48.500,00	\$ 1.146,00	\$ 55.581.000,00	48.500,00	\$ 55.581.000,00
2.02	Movilizacion Terrestre de Equipos	Und	1,00	\$ 20.397.500,00	\$ 20.397.500,00	1,00	\$ 20.397.500,00
2.03	Limpieza para Recuperacion Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	m2	48.500,00	\$ 17.492,00	\$ 848.362.000,00	48.500,00	\$ 848.362.000,00
2.04	Desmovilizacion Terrestre de Equipos	Und	1,00	\$ 20.397.500,00	\$ 20.397.500,00	1,00	\$ 20.397.500,00
3	CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL						
3.1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Coliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales).	Muestra	21	\$ 1.126.141,00	\$ 23.648.961,00	21	\$ 23.648.961,00
3.2	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna).	Muestra	12	\$ 2.855.551,00	\$ 34.266.612,00	12	\$ 34.266.612,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 4.741.274.970,00		\$ 6.357.633.569,20
ADMINISTRACION (22%)					\$ 1.043.080.493,00		\$ 1.398.679.385,22
IMPREVISTO (3%)					\$ 142.238.249,00		\$ 190.729.007,08
UTILIDAD (5%)					\$ 237.063.749,00		\$ 317.881.678,46
COSTO TOTAL					\$ 6.163.657.461,00		\$ 8.264.923.639,96

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



3.2.2. PRESUPUESTO SEGÚN MODIFICATIVA No. 2

Se suscribe balance modificadorio No. 2, con el objetivo de incluir ítems de precios no previstos, para las obras de protección en el arroyo león

PRESUPUESTO						ADICIONAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON						
1.01	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	m2	68.880,00	\$ 1.556,00	\$ 107.177.280,00	112.589,47	\$ 175.189.210,13
1.02	Limpieza para Recuperacion Ambiental	m3	91.219,00	\$ 21.802,00	\$ 1.988.756.638,00	111.655,24	\$ 2.434.307.542,48
1.03	Retiro y Disposicion Final de Residuos	m3 - km	907.173,00	\$ 1.343,00	\$ 1.218.333.339,00	429.723,44	\$ 577.118.580,15
1,04	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	m3	9.660,00	\$ 43.929,00	\$ 424.354.140,00	33.100,29	\$ 1.454.062.661,73
2	CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO						
2.01	Localizacion, Replanteo y Control Topográfico en Cienaga	m2	48.500,00	\$ 1.146,00	\$ 55.581.000,00	48.500,00	\$ 55.581.000,00
2.02	Movilizacion Terrestre de Equipos	Und	1,00	\$ 20.397.500,00	\$ 20.397.500,00	1,00	\$ 20.397.500,00
2,03	Limpieza para Recuperacion Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	m2	48.500,00	\$ 17.492,00	\$ 848.362.000,00	48.500,00	\$ 848.362.000,00
2,04	Desmovilizacion Terrestre de Equipos	Und	1,00	\$ 20.397.500,00	\$ 20.397.500,00	1,00	\$ 20.397.500,00
3	CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL						
3,1	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), 10. Demanda Química de Oxígeno (DQO), 11. Nitratos, 12. Nitrógeno Total, 13. Grasas y Aceites, 14. Ortofosfatos, 15. Fósforo, 16. Dureza, 17. Alcalinidad, 18. Tensoactivos (SAAM), 19. Coliforme termotolerantes y 20. Coliformes totales).	Muestra	21	\$ 1.126.141,00	\$ 23.648.961,00	21	\$ 23.648.961,00
3,2	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna).	Muestra	12	\$ 2.855.551,00	\$ 34.266.612,00	12	\$ 34.266.612,00
NP	CAPÍTULO IV - NO PREVISTO						
NP-1	suministro e instalación de geotextil tejido biaxial en poliéster de alta tenacidad	m2		\$ 32.507,00		1.731,95	\$ 56.300.521,70
NP-2	suministro e instalación de bolsas tipo big bags en colipolmetro de alto desempeño de 1x1x1 para izaje, incluye excavación y conformación de material	Und		\$ 765.118,00		860,00	\$658.001.480,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 4.741.274.970,00		\$ 6.357.633.569,20
ADMINISTRACION (22%)					\$ 1.043.080.493,00		\$ 1.398.679.385,22
IMPREVISTO (3%)					\$ 142.238.249,00		\$ 190.729.007,08
UTILIDAD (5%)					\$ 237.063.749,00		\$ 317.881.678,46
COSTO TOTAL					\$ 6.163.657.461,00		\$ 8.264.923.639,96

El Contrato de Obra No. 0281 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA y el Consorcio Ambiental del Atlántico, tiene por objeto “Realizar las acciones para garantizar la hidrodinámica en la Ciénaga del Totumo y la limpieza y recuperación ambiental del Arroyo León en el departamento del Atlántico”.

Este contrato se enmarca dentro del Plan de Acción Institucional 2024–2027 “Por un Ambiente sin Fronteras”, que contempla la recuperación integral de cuerpos hídricos estratégicos en el territorio departamental, priorizando aquellos que presentan afectaciones por sedimentación, pérdida de conectividad y riesgos de inundación.

La ejecución del contrato inició formalmente el 3 de julio de 2025, con una inversión inicial de \$6.163.657.461 y un plazo de seis (6) meses, comprendiendo intervenciones principales en dos frentes:

Frente 1: Ciénaga del Totumo (municipio de Piojó).

Frente 2: Arroyo León (municipio de Puerto Colombia).

Dentro del Frente Arroyo León, se estableció la limpieza y recuperación ambiental en el tramo comprendido entre la Vía a la Playa y la Carrera 51B, incluyendo además un brazo lateral de 1.510 metros lineales. Estas labores han permitido mejorar la capacidad hidráulica del cauce y mitigar el riesgo de desbordamientos en sectores adyacentes.

Sin embargo, durante la ejecución y seguimiento de las obras, y a partir de una solicitud realizada por la Alcaldía de Puerto Colombia a la CRA, y el recorrido posterior realizado por las partes implicadas en el proyecto, se evidenció que el tramo aguas arriba del punto de intervención presenta condiciones que deben ser mejoradas con el fin de evitar inundaciones en comunidades asentadas aguas arriba.

Ante esta situación, la Alcaldía de Puerto Colombia remitió un informe técnico formal a la CRA, solicitando la ampliación del alcance de la intervención hacia el sector superior del Arroyo León, con el fin de lograr una mejora integral del sistema de drenaje y prevenir afectaciones por inundaciones en las comunidades ubicadas en la parte media y alta de la cuenca.

El informe municipal fue evaluado por el equipo técnico de la CRA, determinándose que la intervención propuesta es necesaria y complementaria al objeto contractual vigente, dado que la efectividad de las obras actuales depende del comportamiento hidráulico del tramo aguas arriba.

Cabe resaltar que la CRA cuenta con los diseños ejecutivos y estudios técnicos de los tramos solicitados (1.430 metros de canal principal y 520 metros de canal secundario), elaborados previamente dentro del marco de los estudios hidrológicos e hidráulicos desarrollados por la Universidad del Magdalena en el Convenio No. 005 de 2024, lo que respalda la viabilidad técnica y madurez del proyecto para su ejecución.

Durante la ejecución de los trabajos surgió la necesidad de esta adicionar al presupuesto actividades no previstas dentro del contrato y necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los trabajos ejecutados, por tanto, se presenta requerimiento técnico y funcional, orientado a garantizar que las inversiones ya ejecutadas cumplan plenamente su objetivo hidráulico y ambiental. La no ejecución del tramo aguas arriba generaría una limitación operativa en el comportamiento del sistema, manteniendo zonas de represión de caudal y potenciales puntos de desbordamiento, con riesgo directo para la población y las infraestructuras urbanas cercanas.

Con el fin de mitigar esta situación y evitar el constante retorno del material al lecho, se consideró técnicamente necesario proyectar el aumento de la proporción de los taludes a 1.50:1 en las zonas inestables detectadas”, adicionalmente se determina la necesidad de incorporar nuevos ítems no previstos para atender de manera integral la problemática y garantizar una solución constructiva adecuada a las condiciones reales del terreno. Los ítems creados corresponden a medidas de control de erosión basadas en geosintéticos y estructuras de contención livianas, alineadas con las recomendaciones del diagnóstico técnico. Entre los nuevos ítems se incluyen:

1. Instalación de geotextil tejido, colocado como refuerzo estructural en las capas inferiores, permitiendo una mayor resistencia mecánica frente a las cargas hidráulicas y evitando la migración de partículas finas.
2. Implementación de geocontenedores estructurales tipo jumbobag, diseñados para instalarse en puntos críticos donde se requiere un refuerzo adicional para contener el material y estabilizar los laterales del cauce, ofreciendo soporte rígido y durabilidad ante la erosión.

Estas soluciones, descritas en los planos técnicos y especificaciones constructivas, se proyectan como un sistema integral de protección de taludes cuyo objetivo es detener la erosión lateral, recuperar la geometría del canal y asegurar su estabilidad en el tiempo. La incorporación de estos ítems y medidas constructivas especializadas fue informada formalmente en los oficios mencionados, dejando constancia de la necesidad técnica y del alcance de las intervenciones a ejecutar para restablecer las condiciones hidráulicas y estructurales del tramo afectado.

Estos ítems corresponden a actividades asociadas al mejoramiento geométrico, hidráulico y estructural del canal, así como a la protección de taludes y control de erosión.

Los nuevos ítems NP-1 y NP-2 se describen a continuación, junto con su justificación técnica y su pertinencia dentro del alcance contractual.

- “NP-1: Suministro e instalación de geotextil tejido biaxial en poliéster de alta tenacidad”: Este ítem se incorpora debido a la necesidad de reforzar el terreno natural y mejorar la capacidad portante de las superficies intervenidas. Durante los trabajos de Limpieza Y Recuperación Ambiental se evidenciaron sectores con suelos de baja cohesión y zonas propensas a deformaciones diferenciales, lo cual implicaba riesgos para la estabilidad de los jarillones del canal.

El geotextil biaxial, fabricado en poliéster de alta tenacidad, permite incrementar la resistencia a la tracción en ambas direcciones, controlar deformaciones y mejorar el desempeño mecánico del sistema suelo-estructura. Su inclusión asegura una mayor durabilidad, estabilidad lateral y soporte adecuado para las capas superiores de material granular, reduciendo riesgos de fallas por asentamientos o erosión interna.

- “NP-2: Suministro E Instalación De bolsas tipo Big Bags colipolimetro de alto desempeño De 1x1x1 Para Izaje”. Este ítem surge como respuesta a la necesidad de implementar un sistema de contención flexible y eficiente en sectores donde las condiciones hidráulicas y geotécnicas generan socavación o pérdida de material.

La formaleta textil big bags constituyen un sistema de confinamiento que, una vez llenado con mezcla o material adecuado, actúa como barrera estructural preventiva ante erosión en taludes o bordes del canal.

Su geometría y composición permiten adaptarse a las irregularidades del terreno, distribuir las cargas de manera uniforme y formar un recubrimiento resistente que protege contra el impacto directo del flujo, especialmente en zonas donde la velocidad del agua o la pendiente podrían generar deslizamientos o desprendimientos de suelo.

La adición de estos ítems permite atender condiciones reales de campo no previstas inicialmente, pero que resultan determinantes para asegurar la estabilidad y operación eficiente del canal. Cada uno de ellos contribuye a mejorar la protección estructural del sistema, evitar procesos erosivos y garantizar que la sección hidráulica mantenga su capacidad de conducción ante crecientes o eventos climáticos adversos. Adicionalmente, su inclusión asegura que las actividades cumplan con los estándares técnicos y ambientales aplicables, incorporando soluciones de refuerzo y protección que optimizan el rendimiento global del proyecto.

Durante el desarrollo de los trabajos se corroboró la existencia de zonas críticas entre las abscisas:

- Tramo entre las abscisas K0+310 a K0+410
- Tramo entre las abscisas K0+610 a K0+790
- Tramo entre las abscisas K1+040 a K1+140 costado izquierdo
- Tramo entre las abscisas K0+070 a K1+120 costado derecho

Allí, se evidencian afectaciones significativas asociadas a la inestabilidad de taludes y pérdida de sección hidráulica, producto de procesos erosivos activos. Estas áreas efectivamente constituyen puntos prioritarios de intervención, toda vez que comprometen la conducción del flujo y la integridad geométrica del canal.

De acuerdo con el análisis técnico presentado por el contratista, y conforme a lo observado por esta Interventoría, se confirma que el tramo auxiliar corresponde a un canal artificial originalmente concebido como estructura de alivio, cuya geometría no fue diseñada para soportar caudales permanentes de alta magnitud. Se verifica además que el material predominante del cauce y los taludes —arenoso y altamente erosionable— ha contribuido a procesos de socavación y reincorporación constante de sedimentos, afectando el desempeño hidráulico del sistema.

Asimismo, esta Interventoría constató que la mayor carga hidráulica está siendo derivada hacia el brazo auxiliar, debido a la sedimentación y obstrucción que se presenta aguas arriba en la zona de bifurcación, generada principalmente por la acumulación de residuos en la trampa de basuras administrada por la ADI. Esta alteración en el reparto de caudales ha generado un esfuerzo desproporcionado sobre el canal auxiliar, cuyas condiciones geométricas (solera de 5 m y taludes 1.25:1) son menores frente al canal principal (solera de 6 m y taludes 1.50:1).

3.3 Cronograma del Proyecto

El contratista presenta con base en la adición, el cronograma de obra el cual se adapta a las condiciones y términos del contrato, por lo cual será insumo para la gestión de control y seguimiento. A continuación, se presenta cuadro con los hitos y el diagrama de Gantt.




Ilustración 7: Gantt de Seguimiento

ACTIVIDADES	\$ 8,264,923,639.95	Comienzo	Fin
ACTA DE INICIO	\$ 0.00	jue 03/07/25	sáb 28/02/26
ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIAL	\$ 0.00	jue 03/07/25	jue 03/07/25
COMPONENTE SOCIAL	\$ 0.00	jue 03/07/25	mié 09/07/25
SOCIALIZACIONES	\$ 0.00	mar 15/07/25	sáb 26/07/25
ACTAS DE VECINDAD	\$ 0.00	mar 15/07/25	vie 18/07/25
ACTAS DE ENTORNO	\$ 0.00	lun 21/07/25	sáb 26/07/25
CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON	\$ 6,032,881,392.84	lun 21/07/25	sáb 26/07/25
Localizacion, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	\$ 227,745,973.17	mar 15/07/25	sáb 28/02/26
Limpieza para Recuperacion Ambiental	\$ 3,164,599,805.22	mar 15/07/25	mié 31/12/25
Retiro y Disposicion Final de Residuos	\$ 750,254,154.20	mié 30/07/25	vie 27/02/26
Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	\$ 1,890,281,460.25	mié 13/08/25	sáb 28/02/26
CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO	\$ 1,228,159,400.00	mié 13/08/25	mié 25/02/26
Localizacion, Replanteo y Control Topográfico en Cienaga	\$ 72,255,300.00	mar 15/07/25	mié 18/02/26
Movilizacion Terrestre de Equipos	\$ 26,516,750.00	mar 15/07/25	mié 31/12/25
Limpieza para Recuperacion Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	\$ 1,102,870,600.00	lun 28/07/25	mar 29/07/25
Desmovilizacion Terrestre de Equipos	\$ 26,516,750.00	mié 03/09/25	mié 31/12/25

CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL	\$ 1,003,882,847.11	mar 17/02/26	mié 18/02/26
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno)	\$ 30,743,649.30	lun 14/07/25	sáb 28/02/26
Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna).	\$ 44,546,595.60	sáb 19/07/25	lun 05/01/26
NO PREVISTOS	\$ 928,592,602.21	lun 14/07/25	lun 05/01/26
suministro e instalación de geotextil tejido biaxial en poliéster de alta tenacidad	\$ 73,190,678.21	mar 27/01/26	sáb 28/02/26
suministro e instalación de bolsas tipo big bags en colipolímico de alto desempeño de 1x1x1 para izaje, incluye excavación y conformación de material	\$855,401,924.00	mar 27/01/26	sáb 28/02/26

Tabla 5: Tabla de Hitos según programación

3.3 Personal del Contratista

El contratista para el desarrollo de las actividades dispuso en obra del siguiente personal el cual cumple con los pliegos de condiciones con los requerimientos mínimos. A continuación, se detallan los profesionales:

Tabla 6: Personal del Contratista

NOMBRE	CARGO	PROFESION	CEDULA
Yesid de Jesús Barcasnegras Amor	Director de obra	Ingeniero Civil	73.167.715
Eduardo de Jesús Guzmán Arias	Residente de obra	Ingeniero Civil	9.178.072
Henry Alberto Santiago Oyuela	Profesional Experto Ambiental	Ingeniero Ambiental	72.005.323
Jhoryella Arenales Lobo	Profesional de Calidad	Especialista en Sistemas integrados de Gestión	1.140.871.808
Cesar Augusto Caro Pinilla	Profesional PGIO	Especialista en Administración	1.140.843.698
Alberto Tejera Higgins	Ingeniero Apoyo No. 1	Ingeniero Civil	1.044.392.990
Andrian Josue Arroyo Arrieta	Ingeniero Apoyo No. 2	Ingeniero Civil	1.193.065.301
Karolain Fontalvo Quintero	Residente SST	Profesional en SST	1.045.731.886
Liceth Carolina Maestre Bermúdez	Profesional Social	Comunicadora Social	1.065.659.538

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 02 enero de 2026, el consorcio Ambiental del Atlántico realizo las siguientes actividades del contrato de obra No, 0281 de 2025. Las cuales se dejan consignadas en el presente informe día a día.

Miércoles 03 de diciembre de 2025

- Se realiza actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+000 hasta K0+100, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Se realizan trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, en canal completo entre las abscisas K1+230 hasta K1+180, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Continúan actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.
- Se realiza seguimiento a las actividades de desmovilización de maquinaria utilizada en el frente de ciénaga del totumo

Semana No. 23 del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2025

Jueves 04 de diciembre de 2025.

- Se realizan actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+300, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K1+180 hasta K1+050, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de las partes, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Se realiza la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.
- La interventoría entrega solicitud de modificativa No. 2 y solicitud de prórroga por un periodo de 2 meses calendario para la culminación de las obras.

Viernes 05 de diciembre de 2025.

- Se realizan actividades de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+400, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente

entre las abscisas K1+050 hasta K0+900, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Continúa la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Sábado 06 de diciembre de 2025.

- Se llevan a cabo trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+900 hasta K0+800, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Salen de obra 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Domingo 07 de diciembre de 2025.

- No se realizan actividades.

Lunes 08 de diciembre de 2025

- No se programan actividades

Martes 09 de diciembre de 2025.

- Se realizan actividades de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+520, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Se llevan a cabo trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+800 hasta K0+700, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Continúa la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

- se realizó solicitud de permiso a predios en zonas de club alto lago, además se emitió oficio dirigido a la concesión ruta costera solicitando permiso para la limpieza debajo de los puentes sobre la calle 46 (vía al mar)

Miércoles 10 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+700 hasta K0+600, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Semana No. 24 del 11 al 17 de diciembre de 2025

Jueves 11 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+600 hasta K0+500, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Viernes 12 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+500 hasta K0+400, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero

ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Sábado 13 de diciembre de 2025.

- Se realiza mantenimiento a maquinaria que está llevando a cabo las labores de limpieza en el tramo adicional
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante,
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material

Domingo 14 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 15 de diciembre de 2025.

- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+300, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proviene del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras

Martes 16 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Continúa la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de

576 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras

Miércoles 17 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+200 hasta K0+100, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

Semana No. 25 del 18 al 24 de diciembre de 2025

Jueves 18 de diciembre de 2025.

- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante
- Continúa la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material

Viernes 19 de diciembre de 2025.

- Se ejecutan nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+400 y K0+500, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Sábado 20 de diciembre de 2025.

- Se realiza mantenimiento a maquinaria que está llevando a cabo las labores de limpieza en el tramo adicional
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante,
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Domingo 21 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 22 de diciembre de 2025.

- Se ejecutan nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+300 y K0+400, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- - Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- - Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras

Martes 23 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Se ejecutan nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+200 y K0+300, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras.

Miércoles 24 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Se ejecutan nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+100 y K0+200, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material.

Semana No. 26 del 25 al 31 de diciembre de 2025

Jueves 25 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Viernes 26 de diciembre de 2025.

- Se realizan trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+50, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. **Nota:** se realiza nuevamente la intervención en esta zona, debido a que se constató con la comisión de topografía que no se había cumplido cabalmente los diseños establecidos.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

sábado 27 de diciembre de 2025.

- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+050 hasta K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. **Nota:** se realiza nuevamente la intervención en esta zona, debido a que se constató con la comisión de topografía que no se había cumplido cabalmente los diseños establecidos.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

Domingo 28 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 29 de diciembre de 2025.

- continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+000 hasta K0+080, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Martes 30 de diciembre de 2025.

- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+080 hasta K0+150, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Miércoles 31 de diciembre de 2025.

- Se realiza actividades de trazado y replanteo en los tramos adicionales del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+150 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en

concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 16 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 256 m³ de material.

Jueves 01 de enero de 2026.

- No se programan actividades

Viernes 02 de enero de 2026.

- No se programan actividades

RESUMEN ITEMS EJECUTADOS

Ítem 1.1. Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo.

Las actividades para este mes comprendieron la intervención de las abscisas del tramo auxiliar en el sector adicional entre las abscisas K0+000 al K0+520 respectivamente, logrando una cobertura total del proyecto en los sectores establecidos.

Además, durante el presente periodo se ejecutaron labores de topografía orientadas a realizar el control y seguimiento detallado de los volúmenes de material intervenido en las actividades de limpieza y recuperación ambiental. Estas mediciones permitieron verificar con precisión los avances en la remoción de sedimentos, residuos y otros elementos presentes en el cauce y áreas adyacentes, asegurando la correspondencia entre lo proyectado en los diseños y lo realmente ejecutado en campo. Asimismo, la información recolectada constituye un insumo fundamental para el control de cantidades de obra, la elaboración de informes técnicos y la trazabilidad del proceso constructivo.

Ítem 1.2. Limpieza para Recuperación Ambiental.

Con el desarrollo de la actividad se buscó restablecer la capacidad hidráulica y funcional del arroyo, mediante la ejecución de labores de limpieza general y retiro de materiales contaminantes acumulados a lo largo de su cauce. Estas acciones fueron orientadas a mejorar las condiciones ambientales del entorno y a reducir los riesgos de desbordamiento durante la temporada invernal, garantizando la adecuada conducción de las aguas pluviales.

Para la ejecución de los trabajos se contó con el apoyo de maquinaria amarilla, principalmente retroexcavadoras y volquetas, equipos que permitieron desarrollar las actividades de manera eficiente, segura y controlada, tanto en el fondo como en las márgenes del canal.

Durante el proceso se efectuó la recolección y retiro mecánico de basuras, residuos sólidos, escombros y sedimentos depositados en el lecho del arroyo, los cuales fueron acopiados temporalmente en las zonas designadas dentro del proyecto, cumpliendo con las normas ambientales y de seguridad vigentes. Estas labores contribuyeron

significativamente a eliminar obstrucciones que afectaban la circulación del flujo y a optimizar la capacidad hidráulica del cauce.

De manera complementaria, se realizó el perfilamiento de los taludes en el costado izquierdo, buscando su adecuada conformación de acuerdo con las pendientes y geometrías establecidas en los diseños aprobados. Con ello se garantizó la estabilidad estructural del tramo intervenido y la integración armónica de la obra con las condiciones proyectadas.

Las intervenciones comprendieron el tramo principal adicional en el canal desde la abscisa K0+000 al K1+230, en costado izquierdo y del K0+000 al K0+200 en costado derecho, cumpliendo con el perfilado y conformación de la sección transversal, asegurando el manejo adecuado del material producto de la limpieza conforme a la normativa ambiental vigente.

Ítem 1.3. Retiro y Disposición Final de Residuos

La actividad de retiro, transporte y disposición final de los residuos generados en la obra se lleva a cabo con el apoyo de volquetas asignadas al proyecto, las cuales movilizan materiales producto de las labores constructivas, tales como residuos de vegetación, suelos removidos y demás desechos no peligrosos. Dichos materiales son trasladados hasta un botadero autorizado (pósitos), ubicado a una distancia promedio de 15 km, el cual cuenta con licencia ambiental vigente y permisos expedidos por la autoridad competente, garantizando de esta manera una gestión ambientalmente segura y conforme a la normatividad aplicable.

Durante este último mes se retiró el material de más sacado de las zonas del arroyo en el brazo auxiliar y arroyo principal en los tramos contractuales, en este periodo se sacó un total de 696 viajes, por lo que a la fecha en lo que va de ejecución se han retirado de obra 1307 viajes, cada uno con una capacidad de 16 m³, lo que corresponde a un volumen total transportado de 20912 m³. logrando transportar a sitio autorizado un total de 251728 m³·km.

Ítem 1.4. Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado.

La gestión de los materiales producto de la obra se ha realizado a través de su traslado y disposición en el botadero autorizado Los Pósitos, sitio que cuenta con licencia ambiental vigente y habilitación para la recepción de este tipo de residuos. Este procedimiento inicia con la carga y transporte del material desde el frente de obra hasta el lugar de disposición, donde es sometido a un proceso de control que incluye el pesaje en báscula y el registro en el sistema interno del botadero. Como resultado, se expide una tirilla o comprobante oficial en el cual se consigna la cantidad de toneladas recibidas, documento que se constituye en el soporte técnico y administrativo de la adecuada disposición de los residuos. Este mecanismo garantiza la trazabilidad del material, el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y de las obligaciones contractuales.

Cabe resaltar que, a la fecha, se ha evacuado un volumen acumulado aproximado de 20912 m³, lo que evidencia un manejo responsable y verificable de los materiales generados durante la ejecución de la obra.

Ítem 1.5. Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas.

La actividad de Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón se desarrolla con el propósito de restablecer la capacidad hidráulica y mejorar las condiciones ambientales del cuerpo de agua intervenido.

El procedimiento inicia con el desplazamiento del personal operativo y los equipos de apoyo, entre ellos el planchón, el cual sirve como plataforma flotante para facilitar el acceso y retiro de la vegetación acuática que obstruye el flujo natural del canal de comunicación entre los dos cuerpos de agua. Sobre el planchón se emplean maquinaria amarilla, en este caso una excavadora Cat 320DL.

Una vez retirada la vegetación, el material es acarreado cuidadosamente hacia las orillas, donde se realiza el acopio temporal en zonas previamente definidas dentro del área del proyecto, garantizando que no se afecte la fauna. Posteriormente, se efectúa la limpieza del área de trabajo, asegurando que quede libre de elementos que puedan obstaculizar la corriente

6. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.2 Información General

Contratista	CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRAULICA
Representante Legal	FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.065.629.241 expedida en Valledupar
Contrato No.	0280 de 2025
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINAMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO LEON EN EL DEPARTAMENTO DE L ATLANTICO"
Valor Inicial	\$ 396.766.230,00
Adicional	\$ 132.337.520,00
Valor Definitivo	\$ 529.021.640,00
Plazo Inicial	6 meses
Prórroga	2 meses
Plazo definitivo	8 meses
Fecha de Inicio	03 de julio de 2025
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2025
COMPONENTE ADMINITRATIVO	

Pagos Parciales	LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato así: En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por un multiplicador.		
Origen de los Recursos	Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)		
COMPONENTE JURIDICO			
El Contratista Toma la Póliza con la compañía de Seguros del Estado SA, un seguro de cumplimiento para entidades estatales No. 11-44-101245325; a continuación, se detallan los amparos:			
Amparo	Valor	Vigencias	
		Inicio	Terminación
Cumplimiento del contrato	\$ 39.676.623,00	03/07/2025	03/07/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 19.838.311,50	03/07/2025	03/01/2029
Calidad del Servicio	\$ 79.353.246,00	03/07/2025	03/01/2027

Tabla 7: Información de Interventoría

5.2 Presupuesto de la Interventoría

En la tabla a continuación se presenta el presupuesto ofertado por la interventoría

PRESUPUESTO					
DESCRIPCIÓN	CANT.	MESES	DEDIC.	SUELDO	VAOR PARCIAL
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
A.1 PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	6	50%	\$ 6,700,000	\$ 20,100,000.00
Residente de Interventoría	1	6	100%	\$ 5,000,000	\$ 30,000,000.00
Profesional Ambiental	1	6	25%	\$ 6,000,000	\$ 9,000,000.00
Ingeniero de Apoyo a la Supervisión	1	6	100%	\$ 3,520,000	\$ 21,120,000.00
A.2 PERSONAL TECNICO					
Profesional SISO de Interventoría	1	6	100%	\$ 2,300,000	\$ 13,800,000.00
SUBTOTAL PERSONAL					\$ 94,020,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR					2.40
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					\$ 225,648,000.00
B. OTROS COSTOS DIRECTOS					
DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES	6	\$7,000,000.00	\$ 42,000,000.00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025
CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



Seguimiento y Control Topográfico. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye bastón y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye bastón y trípode), Nivel de precisión (Incluye: bastón y trípode))	MES	6	\$10,011,500.00	\$ 60,069,000.00
Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES	6	\$ 950,000.00	\$ 5,700,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				\$ 107,769,000.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS				\$ 333,417,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA-19%)				\$ 63,349,230.00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA				\$ 396,766,230.00

Tabla 8: Presupuesto de la Interventoría

Presupuesto actualizado según adición No. 1:

PRESUPUESTO OFICIAL							
DESCRIPCION	CANT.	MESES	DISP.	SUELDO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						H-M	VALOR
A.1 PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoria	1.00	6.00	50%	\$ 6,700,000	\$ 20,100,000.00	8.00	\$ 26,800,000
Residente de Interventoria	1.00	6.00	100%	\$ 5,000,000	\$ 30,000,000.00	8.00	\$ 40,000,000
Profesional Ambiental	1.00	6.00	25%	\$ 6,000,000	\$ 9,000,000.00	8.00	\$ 12,000,000
Ingeniero de Apoyo a la Supervision	1.00	6.00	100%	\$ 3,520,000	\$ 21,120,000.00	8.00	\$ 28,160,000
A.2 PERSONAL TECNICO							
Profesional SISO de Interventoria	1.00	6.00	100%	\$ 2,300,000	\$ 13,800,000.00	8.00	\$ 18,400,000
SUBTOTAL PERSONAL					\$ 94,020,000.00		\$ 125,360,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR					2.40		2.40
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					\$ 225,648,000.00		\$ 300,864,000.00
B. OTROS COSTOS DIRECTOS							
DESCRIPCION	UNIDAD		CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR
Alquiler de Vehículo (Incluye conductor, combustible y mantenimiento)	MES		6.00	\$ 7,000,000.00	\$ 42,000,000.00	8.00	\$ 56,000,000

Seguimiento y Control Topográfico. (Incluye: Un Topógrafo, Un Cadenero y Equipos de Medición: Sistema GNSS - RTK Base y Rover (Incluye bastón y trípode), Estación Total Topográfica (Incluye bastón y trípode), Nivel de precisión (Incluye: bastón y trípode))	MES	6.00	\$10,011,500.00	\$ 60,069,000.00	8.00	\$ 80,092,000
Informes, papelería, reproducción de documentos, planos y fotografías.	MES	6.00	\$ 950,000.00	\$ 5,700,000.00	8.00	\$ 7,600,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				\$ 107,769,000.00		\$ 143,692,000.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS				\$ 333,417,000.00		\$ 444,556,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA-19%)				\$ 63,349,230.00		\$ 84,465,640.00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA				\$ 396,766,230.00		\$ 529,021,640.00

Tabla 9a: Presupuesto de la Interventoría

5.3 Personal de la Interventoría

De acuerdo con el pliego de condiciones se dispuso en obra del siguiente personal de interventoría:

NOMBRE	CARGO	PROFESION	CEDULA
Manuel de Jesús Rodríguez Gómez	Director de Interventoría	Ingeniero Civil	8.726.301
Fabio Andrés Martínez Yancy	Residente de Interventoría	Ingeniero Civil	1.065.629.241
Eyleen Tatiana Pérez Maestre	Profesional Experto Ambiental	Ingeniero Ambiental	1.065608.102
Félix Joaquín Vides de la Hoz	Ingeniero Apoyo Supervisión	Ingeniero Civil	7.571.034
Claudia Patricia Arévalo Ariza	Profesional SST	Profesional SST	57.434.997

Tabla 10: Personal de la Interventoría

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

6.2 Actividades Técnicas

A continuación, relacionamos las actividades que por parte de la interventoría se han desarrollado en el periodo de estudio el cual va desde el 03/12/2025 al 02/01/2026:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2025 y el 02 enero de 2026, se realizó seguimiento y control a las siguientes actividades:

Miércoles 03 de diciembre de 2025

- Se realiza seguimiento y control a actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+000 hasta K0+100, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Se realiza seguimiento y control a trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, en canal completo entre las abscisas

K1+230 hasta K1+180, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Continúa seguimiento y control actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Se realiza seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.
- Se realiza seguimiento a las actividades de desmovilización de maquinaria utilizada en el frente de ciénaga del totumo

Semana No. 23 del 04 de diciembre al 10 de diciembre de 2025

Jueves 04 de diciembre de 2025.

- Se realizan seguimiento y control a actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+300, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Continúa seguimiento y control a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K1+180 hasta K1+050, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento y control a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de las partes, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Se realiza seguimiento a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.
- La interventoría entrega solicitud de modificativa No. 2 y solicitud de prórroga por un periodo de 2 meses calendario para la culminación de las obras.

Viernes 05 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento y control a actividades de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+400, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K1+050 hasta K0+900, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio

- Continúa la seguimiento a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Sábado 06 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+900 hasta K0+800, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Se verifica la salida de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Domingo 07 de diciembre de 2025.

- No se realizan actividades.

Lunes 08 de diciembre de 2025

- No se programan actividades

Martes 09 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a las actividades de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+520, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.
- Se realiza seguimiento y control a trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+800 hasta K0+700, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Continúa seguimiento a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.
- Se realizó acompañamiento a solicitud de permiso a predios en zonas de club alto lago, además se emitió oficio dirigido a la concesión ruta costera solicitando permiso para la limpieza debajo de los puentes sobre la calle 46 (vía al mar)

Miércoles 10 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Se lleva a cabo seguimiento y control a trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+700 hasta K0+600, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Se verifica la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Semana No. 24 del 11 al 17 de diciembre de 2025

Jueves 11 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+600 hasta K0+500, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Viernes 12 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+500 hasta K0+400, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Sábado 13 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante,
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material

Domingo 14 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 15 de diciembre de 2025.

- Continúa seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+300, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proviene del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras

Martes 16 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Continua seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras.

Miércoles 17 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+200 hasta K0+100, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

Semana No. 25 del 18 al 24 de diciembre de 2025

Jueves 18 de diciembre de 2025.

- Continúa seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante
- Continua verificación a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material

Viernes 19 de diciembre de 2025.

- Se verifica nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+400 y K0+500, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Sábado 20 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante,
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Domingo 21 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 22 de diciembre de 2025.

- Se verifica nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+300 y K0+400, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras

Martes 23 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Se hace seguimiento nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+200 y K0+300, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras.

Miércoles 24 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades

ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.

- Se realiza seguimiento nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+100 y K0+200, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material.

Semana No. 26 del 25 al 31 de diciembre de 2025

Jueves 25 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Viernes 26 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+50, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. **Nota:** se realiza nuevamente la intervención en esta zona, debido a que se constató con la comisión de topografía que no se había cumplido cabalmente los diseños establecidos.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.

Sábado 27 de diciembre de 2025.

- Continúan seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+050 hasta K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto. **Nota:** se realiza nuevamente la intervención en esta zona, debido a que se constató con la comisión de topografía que no se había cumplido cabalmente los diseños establecidos.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.

- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

Domingo 28 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 29 de diciembre de 2025.

- Continúan seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+000 hasta K0+080, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Martes 30 de diciembre de 2025.

- Continúan seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+080 hasta K0+150, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Miércoles 31 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a las actividades de trazado y replanteo en los tramos adicionales del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+150 hasta K0+200, mediante el uso de

retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 16 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 256 m³ de material.

Jueves 01 de enero de 2026.

- No se programan actividades

Viernes 02 de enero de 2026.

- No se programan actividades

6.2 Seguimiento a la Ejecución

El contratista Durante el periodo comprendido entre el 03 de diciembre y el 02 de enero de 2026, se realizó el seguimiento correspondiente al avance del proyecto. Este corresponde al Informe mensual No. 6. El contrato de obra, identificado con el número 0281 de 2025 ejecutado por la firma CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO, presenta un valor total de \$ 8.264.923.639,96 COP.

Antes de continuar con la descripción el avance es preciso decir que el contrato de obra fue formalizado con inicio en SECOP II el 03 de julio de 2025 teniendo fecha de finalización el día 28 de febrero de 2025.

Durante el mes de diciembre de 2025, el proyecto de obra presentó un avance físico de acuerdo con los trabajos en campo que progresan con un ritmo constante y organizado, logrando así una progresión acumulativa significativa en la ejecución contractual.

Habiendo transcurridos 26 semanas del contrato se tiene que el avance alcanzo el 70.49%. también es necesario decir que el avance físico ejecutado está por debajo del avance físico programado, que se proyectaba en un 67.73%, esta diferencia representa un adelanto físico del orden de 2.76 puntos porcentuales. las principales actividades del mes fueron Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo y Ciénaga (seguimiento); Limpieza para Recuperación Ambiental; Retiro y Disposición Final de Residuos; Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado; Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas y componente de monitoreo ambiental.

Las principales actividades del mes fueron Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo y Ciénaga; Limpieza para Recuperación Ambiental; Retiro y Disposición Final de Residuos; Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado; Movilización Terrestre de Equipos; Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas.




Ilustración 8: Curva de Avance

6.3 COMPONENTE SST

El presente documento contiene el informe de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al período entre el 03 de diciembre y el 02 de enero del 2026, en el cual se evidencia la efectividad y el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, necesarias para el buen desarrollo del proyecto denominado: “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” bajo el contrato de obra No. 0281 de 2025.

En este Informe, se hace una descripción de las actividades realizadas por el contratista de obra “CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO”, de tal manera que le permita tener a la entidad contratante, una visión general del desarrollo del contrato, en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, además determina el alcance del sistema de Gestión, las responsabilidades de los diferentes participantes del proyecto, que

permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, el contratista realizó las inducciones a todo el personal que ingresó durante este periodo cumpliendo así con el procedimiento de inducción y reinducción de CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO.

Esta interventoría, verifico que el contratista realizara el pago de la seguridad social (ARL, EPS, CCF, AFP) de todo el personal. Se anexa las afiliaciones a seguridad social correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026 del personal de obra, tanto profesionales como obreros.

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO cumple con la entrega de dotación al personal: Camisas industriales y pantalón industrial, además cumple con la entrega de los EPP al personal para la ejecución de manera segura de sus actividades diarias, se evidencia que el personal hace buen uso de los elementos de protección personal ya que estos están en buen estado, se llevan a cabo los mantenimientos y almacenamiento de los mismos, se realizan inspecciones mensuales con la finalidad de prevenir cualquier incidente o accidente de trabajo.

Los EPP utilizados en obra son:

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Gafas de seguridad
- Tapa bocas según lo amerite
- Protectores auditivos según lo amerite

6.3.1 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO realiza inspecciones preventivas a todas las herramientas y equipos utilizados en la obra cumpliendo con el programa de inspecciones para la obra, con la finalidad de evitar accidentes e incidentes de trabajo producidos por las mismas:

Inspecciones	Periodicidad
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de botiquines y camillas	Mensual
Inspección de maquinaria pesada	Diario
Inspección de EPP	Mensual

Tabla 11: INSPECCIONES DE SEGURIDAD

6.3.3 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

En el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, se presentaron cero (0) accidentes de trabajo y cero (0) incidentes laborales, durante la ejecución de actividades de obra en el proyecto que tiene por objeto: “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

DESCRIPCIÓN	TOTAL
No. De accidentes laborales	0
Días de incapacidad por accidentes laborales	0
No. De incidentes laborales	0

Tabla 12: INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

OMPORTAMIENTO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO	
Personal	17
Horas extras	0.0
Total personal	17

Tabla 13: INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

INCAPACIDADES Y DIAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL- AGOSTO 2025	
No. Incapacidad por EG	0
Días de ausentismo por EG	0
Horas de ausentismo por EG	0
Ausentismo por EG	0.00%
TASA DE AUSENTISMO POR EG	0.00%

Tabla 14: INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

6.4 COMPONENTE SOCIAL

Desde el componente social de esta interventoría, se realiza la verificación del cumplimiento del Plan de Gestión Social del Proyecto, asegurando que las acciones de participación ciudadana, socialización, atención a quejas, reclamaciones y manejo de conflictos se implementen de manera efectiva, oportuna y conforme a la normativa vigente y a los compromisos adquiridos con cada una de las comunidades interesadas.

6.4.1 COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Reunión extraordinaria (ACTA 08)	El día 09 de diciembre se realizó reunión informativa, con el ingeniero Jairo Vergara de Ruta Costera, con el fin de informar a acerca de la limpieza del arroyo en los puentes ubicadas en la abscisa k280 y k320.
2. Reunión de socialización (Acta 10)	El día 04 de diciembre de 2025 se realizó reunión de socialización del proyecto con Juan David Cabarcas. Director jurídico de alto Lago, en el desarrollo de la reunión se informaron las especificaciones del proyecto en esta zona específica del arroyo León.
3. Oficios Sociales	El día 04 de diciembre de 2025 se realizó reunión de socialización del proyecto con Juan David Cabarcas. Director jurídico de

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
Actividades Realizadas	Observaciones
	alto Lago, en el desarrollo de la reunión se informaron las especificaciones del proyecto en esta zona específica del arroyo León.

Tabla 15: COMPONENTE SOCIAL

INDICADORES

SOCIALIZACIONES		
REALIZADAS	PROGRAMADAS	EFICIENCIA %
07	07	100%

Tabla 16: INDICADORES INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS

6.4.2 PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Atención a la comunidad	Se continua con los canales de comunicación activos, por medio de los cuales se mantiene el contacto informativo con cada uno de los interesados en el proyecto. medios de comunicación oficiales: Correo electrónico: consorcioambientaldelatlantico@gmail.com Línea telefónica: 3162267333
2. Queja.	En el desarrollo de este periodo, no se recibieron manifestaciones ciudadanas. A la fecha cada una de las PQRS, recepcionadas se encuentran cerradas.
3.	Durante este periodo, el consorcio Ambiental del Atlántico, realizo la donación de árboles a la comunidad del frente de obra de la Ciénega el Totumo. Cerrando a conformidad por parte de los beneficiarios.

Tabla 17: PROGRAMA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

INDICADORES

Tipología	SI (Solicitud Información)	R(Reclamos)	P(Peticiones)	Q(Quejas)	S(Sugerencias)
Solución		RP(Reparación)	I(Indemnización)	EV(Escrito, Verbal)	D(Donación o servicio)

Tabla 18: INDICADORES

Manifestaciones ciudadanas				
Periodo	PQRS atendidas	PQRS solucionadas	Eficiencia %	Eficiencia global %
03/08/2025 – 02/09/2025	2	2	100%	100%
03/09/2025 – 02/10/2025	1	1	100%	100%
Total	3	3	100%	100%

Tabla 19: MANIFESTACIONES CIUDADANAS

6.4.3 PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Permiso de ingreso a predio.	<p>En el desarrollo de este periodo, se diligenciaron (3) tres permisos a predios en Arroyo León, los cuales se requirieron con la finalidad de aperturar el ingreso de maquinaria y personal a estas zonas. A continuación, se relaciona la información de los propietarios y encargados de predios:</p> <p>✓ Fecha: 03 diciembre de 2025 Nombre: Armando de la Rosa Ubicación: Vía Puerto Colombia.</p> <p>✓ Fecha: 27 diciembre de 2025 Nombre: Wilson Antonio Marriaga Ubicación: km 30 vía prosperidad.</p> <p>✓ Fecha: 27 diciembre de 2025 Nombre: Wilson Antonio Marriaga Ubicación: km 30 vía prosperidad</p>

Tabla 20: PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

INDICADORES

PERMISOS A PREDIOS		
REQUERIDOS	FIRMADOS	EFICIENCIA %
11	11	100%

Tabla 21: INDICADORES PERMISOS A PREDIOS

ACTAS DE VECINDAD		
VISITADOS	TOTALES	EFICIENCIA %
0	0	0 %

Tabla 22: INDICADORES ACTAS DE VECINDAD

6.4.4 PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Ingreso de personal	A la fecha de este corte se continua con la vinculación de un trabajador del área de influencia del frente de obra Ciénaga del Totumo, a la fecha este consorcio se encuentra a la espera del certificado de residencia, el cual ya fue solicitado a los líderes de esta zona. Además, se realizó la contratación mensual de una embarcación la cual está a disposición del proyecto, generando así, ingresos a la comunidad del área de influencia.

Tabla 23: PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

INDICADORES

VINCULACION PERSONAL		
CONTRATADOS	REQUERIDOS	EFICIENCIA %
01	01	100%

CONCLUSIONES SOCIALES

Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento satisfactorio a las actividades sociales programadas, garantizando la correcta gestión de los permisos de ingreso a predios y el desarrollo de las socializaciones de avance de obra. Estas acciones permitieron mantener una comunicación clara y oportuna con los actores involucrados, fortaleciendo la confianza y el relacionamiento comunitario. En consecuencia, se contribuyó al desarrollo adecuado del proyecto, asegurando el respeto por los acuerdos establecidos y el acompañamiento social necesario para la continuidad de las actividades constructivas.

6.5 COMPONENTE AMBIENTAL

El presente informe se genera con el fin de realizar al Plan de Manejo Ambiental (PMA) desarrollado en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA y el CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO**, como parte del proyecto denominado **“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIÉNAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**.

Desde el componente ambiental, se abordan aspectos clave como el manejo de residuos, calidad del agua, suelo, aire, control de ruido, protección de la fauna y la flora, seguridad industrial, señalización, y monitoreo ambiental. Se establecen programas y procedimientos orientados a garantizar la sostenibilidad de las intervenciones, minimizando la afectación a los ecosistemas intervenidos. Desde el componente social, se incorpora estrategias para la participación de las comunidades locales, la socialización de las actividades, la educación ambiental, la prevención de conflictos, y el fortalecimiento del tejido social en las zonas de influencia. Se reconoce la importancia de la interacción con las comunidades, la inclusión de sus percepciones y la promoción

de un diálogo abierto que permita desarrollar el proyecto en armonía con las dinámicas sociales y culturales del territorio.

El siguiente informe se describen las actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, desde la firma del acta de inicio hasta la fecha de corte del presente documento, en ese orden se describen los programas ambientales y las medidas establecidas en el tiempo comprendido desde el **03 de diciembre al 02 de enero del 2026**:

Programa	Proyecto		Código
BIOTICO	1	Programa de protección y conservación de hábitat	FMB1.1
	2	Programa de conservación de flora	FMB-1.2
	3	Programa de revegetación	FMB-1.3
ABIOTICO	4	Programa de emisiones atmosféricas de material particulado, gases y vapores	FMA-2.1
	5	Programa de manejo ambiental del recurso suelo	FMA-2.2
	6	Programa de manejo ambiental del recurso hídrico	FMA-2.3
	7	Programa de manejo ambiental de los residuos sólidos	FMA-2.4
	8	Programa de manejo ambiental de los residuos líquidos	FMA-2.5
	9	Programa de mitigación de los impactos por tránsito vehicular	FMA-2.6
	10	Programa de mitigación para el transporte de materiales y equipos	FMA-2.7
	11	Programa para el manejo de campamentos de obra	FMA-2.8
PAISAJISTICO	12	Programa restauración paisajística	FMP-3
SOCIECONOMICO	14	Programa de información y comunicación	FMS-4.1
	15	Programa de vinculación de mano de obra no calificada	FMS-4.2
	16	Programa de levantamiento de actas de vecindad	FMS-4.3
	17	Programa de atención y participación comunitaria	FMS-4.4

Tabla 24: COMPONENTE AMBIENTAL

6.5.1 PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE HABITAT

Durante el período evaluado, el Contratista desarrolló jornadas de capacitación ambiental dirigidas al personal técnico y operativo vinculado al proyecto, incluyendo operadores de maquinaria, auxiliares de campo y demás integrantes del equipo de obra. En el marco de sus funciones contractuales, esta Interventoría realizó seguimiento a dichas actividades, verificando su ejecución, contenido temático y cobertura del personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.

Las capacitaciones tuvieron como propósito fortalecer la sensibilización y conciencia ambiental del personal, así como mejorar sus competencias en la adecuada gestión ambiental del proyecto. Dentro de los temas abordados se incluyen:

- Manejo y control de la calidad del aire.
- Clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y residuos generados en obra.
- Conservación de flora y fauna presentes en el área de influencia.
- Implementación de medidas de control ambiental asociadas a actividades constructivas con potencial impacto sobre el entorno.

La Interventoría verificó que estas jornadas contribuyen al cumplimiento de los compromisos ambientales contractuales y al fortalecimiento de la cultura ambiental en obra, promoviendo prácticas responsables y el adecuado desempeño ambiental del proyecto.

6.5.1.1 PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA

En el marco de las actividades relacionadas con el componente forestal, esta Interventoría realizó seguimiento a las acciones implementadas por el Contratista para garantizar la protección y el manejo adecuado de la fauna silvestre presente en el área de intervención.

Como parte de la gestión adelantada por el Contratista, se evidencia la planificación y caracterización previa del área de influencia, proceso mediante el cual se identificó la vegetación objeto de intervención, las posibles zonas con importancia ecológica y la presencia de especies asociadas. Esta Interventoría verificó que dicha caracterización permitió orientar las actividades de obra minimizando impactos sobre el entorno natural. Se constató que las áreas intervenidas corresponden principalmente a sectores con vegetación rastrera o especies tapizantes, donde las labores de limpieza se ejecutaron de manera manual, reduciendo el riesgo de afectación a especies arbóreas o de mayor relevancia ecológica.

Asimismo, esta Interventoría verificó la realización de jornadas de sensibilización dirigidas al personal operativo, incluyendo operadores de maquinaria y trabajadores de obra, enfocadas en la identificación y manejo responsable de especies vegetales y fauna asociadas, promoviendo prácticas preventivas durante la ejecución de las actividades constructivas.

De igual manera, se realizó verificación en campo de las intervenciones ejecutadas en zonas aledañas al arroyo, constatando que las labores se desarrollaron alrededor de los árboles y especies presentes, sin afectar su estabilidad ni generar impactos negativos sobre su desarrollo, tal como se evidencia en el registro fotográfico adjunto.

En conclusión, durante el período evaluado, esta Interventoría ejerció control y seguimiento a las actividades del componente forestal, verificando que las intervenciones se ejecutaran bajo criterios de prevención, protección y manejo ambiental responsable.

6.5.1.2 PROGRAMA DE REVEGETACION

Durante el período evaluado, esta Interventoría realizó seguimiento a la implementación de medidas y preventivas adelantadas por el Contratista, orientadas a garantizar la conservación y supervivencia de las especies vegetales presentes en la zona de intervención del proyecto Arroyo León.

Como parte de este seguimiento, se efectuarán recorridos de inspección en el área de obra, con el fin de verificar el estado de la cobertura vegetal existente y constatar la correcta aplicación de medidas preventivas que eviten afectaciones a la vegetación durante el desarrollo de las actividades constructivas. De igual manera, se verificó la realización de jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal operativo, orientadas a fortalecer la conciencia y promover prácticas ambientales responsables en campo.

Se deja constancia de que, a la fecha, el proyecto Arroyo León no contempla actividades de siembra de nuevas especies vegetales dentro de su alcance ambiental. No obstante, esta Interventoría verificó que el Contratista manifestó su disposición para ejecutar dichas actividades de manera oportuna, en caso de que sean incorporadas dentro de las obligaciones ambientales del proyecto, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos establecidos por la autoridad ambiental competente.

Por otra parte, en el marco del proyecto Ciénaga de la Virgen, esta Interventoría realizó seguimiento a una jornada de siembra de mangle desarrollada a manera de donación, la cual se llevó a cabo en atención a una solicitud presentada por la comunidad del área de influencia, con el propósito de contribuir a la restauración y fortalecimiento del ecosistema.

Se verificó que la actividad de siembra fue ejecutada con la participación del personal de la zona, promoviendo la vinculación de la comunidad local. Asimismo, se constató que los individuos vegetales utilizados fueron adquiridos a través de la asociación de pescadores del área de influencia directa, fortaleciendo la participación comunitaria y aportando al desarrollo socioambiental del territorio.

En conclusión, esta Interventoría ejerció control y seguimiento a las acciones relacionadas con la conservación vegetal y actividades de restauración ambiental, verificando que las mismas se desarrollaran bajo criterios de protección ambiental, participación comunitaria y cumplimiento de la normatividad vigente.

6.5.1.3 PROGRAMA ABIOTICO

PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES.

Durante el período evaluado, la interventoría efectuó seguimiento a la documentación asociada a la retroexcavadora empleada en las actividades del proyecto, verificando la tarjeta de propiedad, el certificado de compra y la declaración de importación, y confirmando el cumplimiento de los requisitos establecidos para su correcta operación en obra.

Así mismo, se evidenció que durante el período en referencia se continúan desarrollando actividades de evacuación de material producto de las labores de limpieza hacia el sitio de disposición final, razón por la cual fue requerida la utilización de volquetas en el frente de trabajo.

Adicionalmente, la interventoría corroboró que el equipo contó con las inspecciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la verificación del extintor, botiquín y el estado general de la maquinaria y los vehículos asociados, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para una operación adecuada y responsable

6.5.1.4 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO

Durante el período evaluado, esta Interventoría realizó seguimiento a las actividades de carga, transporte y disposición final de los sedimentos extraídos en el frente de obra del Arroyo León, verificando que el material fue trasladado al relleno sanitario Los Pocitos, conforme a los procedimientos establecidos y con soporte documental ambiental.

Igualmente, se efectuó control a las labores de reconformación de taludes, realizadas con material apto proveniente de la limpieza del cauce, con el fin de reducir procesos erosivos y mejorar la estabilidad de las márgenes intervenidas.

De manera complementaria, se verificó la culminación de las intervenciones en la Ciénaga del Totumo, específicamente en el retiro de cobertura vegetal invasora, constatando que estas acciones contribuyen a mejorar la dinámica hidrológica, optimizar el flujo hídrico y favorecer la recuperación ambiental del ecosistema.

En general, la Interventoría evidencia que las actividades ejecutadas durante el período evaluado se desarrollaron bajo criterios de control técnico y cumplimiento ambiental.

6.5.1.5 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO

Durante el período evaluado, esta Interventoría verificó que el Contratista mantuvo la prohibición de vertimientos directos de aguas residuales o contaminadas.

Se constató la instalación y adecuada operación de una cabina sanitaria en el frente de obra para la recolección de residuos líquidos.

La Interventoría realizó control a la frecuencia de mantenimiento ya los soportes documentales del servicio prestado, verificando la trazabilidad de la gestión realizada. Estas acciones contribuyen a prevenir la contaminación del recurso hídrico, minimizar los riesgos sanitarios y asegurar la implementación de buenas prácticas ambientales durante la ejecución del proyecto. En los anexos del presente informe se incluyen los registros de mantenimiento suministrados.

6.5.1.6 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Durante el período evaluado, esta Interventoría realizó seguimiento a la gestión de residuos sólidos en el frente de obra Arroyo León, verificando la instalación y uso adecuado de un punto ecológico conformado por canecas de colores blanco, negro, verde y rojo, en cumplimiento del Código de Colores establecido en la Resolución 2184 de 2019.

Se constató que los residuos generados son acopiados temporalmente en el campamento ambiental y posteriormente entregados a la empresa recolectora Triple A con una frecuencia de tres (3) veces por semana. Asimismo, se realizaron inspecciones periódicas para verificar el correcto uso, mantenimiento y estado de los puntos ecológicos. Durante el período evaluado no se registró la disposición final adicional de

residuos, dado que no se generaron volúmenes extraordinarios.

De igual manera, se verificó la ejecución de jornadas permanentes de orden y aseo, debidamente registradas en los formatos correspondientes, los cuales reposan en los anexos del presente informe como soporte del cumplimiento ambiental.

En el frente de obra Ciénaga del Totumo, debido a las condiciones de difícil acceso y la inexistencia de campamento fijo, la Interventoría verificó la implementación de alternativas para el manejo adecuado de los residuos. El personal operativo recibió capacitación en buenas prácticas ambientales y se proporcionó bolsas resistentes para la recolección temporal de residuos, las cuales son trasladadas posteriormente a la oficina principal del proyecto para su disposición en los puntos ecológicos autorizados.

Estas acciones permiten prevenir la disposición inadecuada de residuos en el área de intervención, proteger el ecosistema de la ciénaga y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

6.5.1.7 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS

Durante el período evaluado, esta Interventoría verificó que en el frente de obra Arroyo León se mantuvo instalada una cabina sanitaria para la adecuada gestión de los residuos líquidos de tipo doméstico generados por el personal de obra, garantizando condiciones sanitarias apropiadas en el área de intervención.

Se constató que el mantenimiento y la disposición final de los residuos recolectados son responsabilidad de la empresa proveedora del servicio, mientras que en la oficina central del proyecto se dispone de un baño adicional, al cual se le realizan mantenimientos periódicos. Asimismo, se realizó seguimiento a las capacitaciones impartidas al personal operativo sobre el manejo adecuado y disposición final de los residuos líquidos.

Además, esta Interventoría verificó que se mantiene la prohibición expresa de lavado de maquinaria y equipos dentro del área de obra, reforzando con los operadores la importancia de prevenir posibles afectaciones a los ecosistemas y evitar la generación de vertimientos contaminantes.

En el frente de obra Ciénaga del Totumo, debido a las condiciones operativas y la localización del sitio de intervención, no se cuenta con cabina sanitaria fija. No obstante, la Interventoría constató la implementación de medidas alternativas de control, tales como la programación de jornadas de trabajo por tiempos definidos y el manejo controlado de los residuos líquidos domésticos, garantizando el cumplimiento de condiciones mínimas de salubridad y protección ambiental.

6.5.1.8 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR TRÁNSITO VEHICULAR

Durante el período evaluado, esta Interventoría verificó la documentación legal y técnica de la maquinaria y vehículos del proyecto, incluyendo tarjetas de propiedad, declaraciones de importación, GPS, guías de movilización, SOAT y revisión técnico-mecánica.

Asimismo, se realizaron inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), revisando el estado de extintores, botiquines y condiciones generales de operación de los equipos.

En los frentes Arroyo León y Ciénaga del Totumo no se presenta tránsito interno; Sin

embargo, en el acceso al frente Arroyo León se verificó la instalación de señalización preventiva y el apoyo de un paletero para regular el ingreso y salida de volquetas, garantizando la seguridad vial en la zona.

6.5.1.9 PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

Para el desplazamiento de vehículos, como volquetas y camionetas, el encargado de logística del Consorcio asigna las rutas y verifica que cada vehículo cuente con tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes. Esta documentación es revisada y validada por los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del componente ambiental antes del inicio de actividades, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y de seguridad aplicables.

Adicionalmente, antes del inicio diario de labores, se realizan inspecciones preoperacionales junto con el profesional de SST, con el fin de verificar el estado de los equipos y vehículos y programar oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

6.5.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA

Arroyo León, constatando la instalación de una carpa que funciona como punto de emergencia, dotada con botiquín, camilla y extintor, en cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad.

Asimismo, se verificó la instalación de dos puntos ecológicos, cabinas sanitarias y mobiliario (sillas y mesas) para la atención del personal y de la comunidad. El área cuenta igualmente con señalización informativa orientada a reforzar las medidas de seguridad, organización y gestión ambiental en el lugar.

6.5.2.1 PROGRAMA DE RESTAURACION PAISAJISTICA

Durante el período de seguimiento, la interventoría constató la adopción de acciones por parte del contratista orientadas a la protección y preservación de la cobertura vegetal existente en el área de intervención del Arroyo León. Dichas acciones incluyeron recorridos periódicos de verificación en campo y jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, enfocadas en fortalecer la conciencia ambiental y promover el desarrollo de las actividades constructivas bajo criterios de respeto y cuidado de la vegetación presente.

Se precisa que, a la fecha, el alcance del proyecto no contempla la ejecución de actividades de siembra o establecimiento de nuevas especies vegetales. Sin embargo, la interventoría deja constancia de que, en el evento de que esta medida sea incorporada como parte de los compromisos ambientales del proyecto, el contratista ha expresado su disponibilidad para su implementación oportuna, en cumplimiento de los lineamientos técnicos, ambientales y normativos que resulten aplicables.

7. Pagos Realizados

7.1 Pagos realizados al Contratista

Hasta el corte del presente informe se encuentra en trámite el acta de cobro No. 4, correspondiente al periodo comprendido del 03 de Octubre de 2025 a 02 de Noviembre de 2025, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

INFORME FINANCIERO					
Valor total del contrato			\$ 8.264.923.639,96	100%	
Anticipo			N/A	0%	
Concepto	Valor Acta	%	Valor neto recibido	Fecha de pago	Estado
ACTA No. 1	\$ 655,616,446.70	7.93%	\$ 655,616,446.70		PAGADO
ACTA No. 2	\$1,096,144,183.2	13.26%	\$ 1.751.760.629,90		PAGADO
ACTA No. 3	\$937,125,174.06	11.34%	\$ 2.688.885.803,96		TRAMITE
ACTA No. 4	\$1.147.573.059.00	13.88%	\$ 3.836.458.862,96		TRAMITE
ACTA No. 5	\$ 774.096.555,75	9.37%	\$ 4.610.555.418,71		TRAMITE
TOTAL	\$ 4.610.555.418,71	55.78%			

Tabla 25: Pagos al Contratista

7.2 Pagos realizados a la Interventoría

Hasta el corte del presente Informe se encuentra en trámite el acta de cobro No. 4, correspondiente al periodo comprendido del 03 de noviembre de 2025 a 02 de diciembre de 2025, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

INFORME FINANCIERO					
Valor total del contrato			\$ 529,021,640.00	100%	
Anticipo			N/A	0%	
Concepto	Valor Acta	%	Valor neto recibido	Fecha de pago	Estado
ACTA No. 1	\$ 66,114,020,00	12.50%	\$ 66,114,020,00		PAGADO
ACTA No. 2	\$ 66,114,020.00	12.50%	\$ 132,228,040.00		PAGADO
ACTA No. 3	\$ 66,114,020.00	12.50%	\$ 198,342,060.00		TRAMITE
ACTA No. 4	\$ 66,114,020.00	12.50%	\$ 264,456,080.00		TRAMITE
ACTA No. 5	\$ 66,114,020.00	12.50%	\$ 330,570,100.00		TRAMITE
TOTAL	\$ 330,570,100.00	62.49%		-	

Tabla 26: Pagos a la Interventoría

8. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido del presente informe por solicitud de la Alcaldía de Puerto Colombia, se adicionan al contrato la intervención de 1.430 metros de canal principal y 520 metros de canal secundario, con el fin de garantizar la hidrodinámica y el correcto funcionamiento de los trabajos contratados.
- Habiendo, ajustando el flujo de inversión, conforme a la reprogramación aprobada, habiendo transcurrido 26 semanas del contrato se tiene que el avance alcanzo el

70.49%. también es necesario decir que el avance físico ejecutado está por debajo del avance físico programado, que se proyectaba en un 67.73%, esta diferencia representa un adelanto físico del orden de 2.76 puntos porcentuales. las principales actividades del mes fueron Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo y Ciénaga (seguimiento); Limpieza para Recuperación Ambiental; Retiro y Disposición Final de Residuos; Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado; Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas y componente de monitoreo ambiental.

- Las intervenciones en el Arroyo León han permitido recuperar progresivamente la capacidad hidráulica de su cauce, mediante labores de limpieza, perfilado y disposición final de residuos en sitios autorizados, contribuyendo a la mitigación de riesgos por desbordamientos y mejorando las condiciones ambientales del entorno.
- El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se implementó de manera continua, con capacitaciones, jornadas preventivas y protocolos de intervención que fortalecieron la cultura de autocuidado y redujeron los riesgos laborales asociados a la obra.
- La gestión social y de relacionamiento institucional permitió el acercamiento efectivo con propietarios de predios, actores comunitarios y entidades públicas, logrando acuerdos y permisos necesarios para garantizar el acceso de maquinaria y la ejecución sin mayores contratiempos.

9. ANEXOS:

ANEXO 1. ACTAS DE COMITES SEMANALES
ANEXO 2. INFORMES SEMANALES
ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 4. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
ANEXO 5. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
ANEXO 6. SEGUIMIENTO SST
ANEXO 7. SEGUIMIENTO SOCIAL
ANEXO 8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ANEXO 9. BITACORA DE OBRA
ANEXO 10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA
ANEXO 11. PLANOS Y CARTERAS TOPOGRAFICAS

ANEXO 1. ACTAS DE COMITES SEMANALES



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(3 de DICIEMBRE de 2025)**

CONTRATO DE OBRA No.	0281 - 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0280 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Ing. Manuel Rodríguez Gómez	Director de interventoría – Consorcio recuperación hidráulica.	
Ing Fabio Martínez Yancy	Residente de interventoría – Consorcio recuperación hidráulica.	
Eduardo Guzmán	Residente de obra – Consorcio Ambiental del Atlántico	
Alberto Tejera Higgins	Ingeniero de apoyo – Consorcio Ambiental del Atlántico	
Karolain Fontalvo	Profesional SST - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Liceth Maestre Bermúdez	Profesional Social - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Henry Santiago Oyuela	Profesional ambiental - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Eyleen Tatiana Pérez Maestre	Profesional ambiental - Consorcio recuperación Ambiental	

II. OBJETO

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se tienen los siguientes compromisos del comité anterior.



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(3 de DICIEMBRE de 2025)**

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Se solicita mantenimiento al baño portable en obra.	CONTRATISTA	CUMPLIDO

IV. ORDEN DEL DIA

1. Componente técnico
2. Componente Ambiental
3. Componente SST
4. Componente Social
5. Propositiones y otros.

V. TEMAS TRATADOS

La interventoría da inicio al **comité de obra Nro. 19** siendo las **10:10 am** exponiendo las actividades y situaciones realizadas hasta la fecha

Componente técnico.

- El componente técnico inicia con el residente de interventoría realizando un recuento del avance que se tiene obra, en donde presenta un porcentaje programado del 58.65% y un ejecutado del 59.38%. teniendo un atraso del 0.73%.
- Contratista indica que se iniciaron labores de trazado y replanteo del tramo adicional, así como traslado de maquinaria e inicio de las labores de limpieza para la recuperación ambiental correspondiente. Se realizan los trabajos entre las abscisas del adicional del tramo principal K1+230 a K0+700.
- Se avanza de manera satisfactoria en las intervenciones del limpieza y recuperación ambiental de la ciénaga del totumo en la Zona 2 de 2.00 Ha, se realiza el trasiego de la vegetación extraído hacia las orillas.
- Se avanza con actividades de trazado y replanteo. La interventoría solicita al Contratista aumentar el personal de limpieza manual para mejorar rendimientos de trazado y replanteo.
- Contratista informa que los rendimientos han mermado significativamente en la limpieza del arroyo por la presencia de residuos sólidos, lluvias y dificultades de acceso de las maquinarias.



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(3 de DICIEMBRE de 2025)**

- Interventoría solicita que se implemente un plan de contingencia para contrarrestar afectaciones que dejaron las lluvias.

Componente Socio Ambiental SST

Interventoría solicita dar cumplir estrictamente con el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Se solicita ampliar las campañas de socialización

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Aumento de (2) personas para cadeneros	CONTRATISTA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo comité queda definido para el 10 de diciembre de 2025 a las 9:00 am.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 0281 de 2025



PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA



ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20 (17 de DICIEMBRE de 2025)

CONTRATO DE OBRA No.	0281 - 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0280 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Ing. Manuel Rodríguez Gómez	Director de interventoría – Consorcio recuperación hidráulica.	
Ing Fabio Martínez Yancy	Residente de interventoría – Consorcio recuperación hidráulica.	
Eduardo Guzmán	Residente de obra – Consorcio Ambiental del Atlántico	
Alberto Tejera Higgins	Ingeniero de apoyo – Consorcio Ambiental del Atlántico	
Karolain Fontalvo	Profesional SST - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Liceth Maestre Bermúdez	Profesional Social - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Henry Santiago Oyuela	Profesional ambiental - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Eyleen Tatiana Pérez Maestre	Profesional ambiental - Consorcio recuperación Ambiental	

II. OBJETO

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se tienen los siguientes compromisos del comité anterior.


ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(17 de DICIEMBRE de 2025)

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO

IV. ORDEN DEL DIA

1. Componente técnico
2. Componente Ambiental
3. Componente SST
4. Componente Social
5. Propositiones y otros.

V. TEMAS TRATADOS

La interventoría da inicio al **comité de obra Nro. 20** siendo las **9:30 am** exponiendo las actividades y situaciones realizadas hasta la fecha

Componente técnico.

- El componente técnico inicia con el residente de interventoría realizando un recuento del avance que se tiene obra, en donde presenta un porcentaje programado del 74.09% y un ejecutado del 65.92%. teniendo un atraso del 8.17%.
- Contratista manifiesta que los atrasos se deben a los problemas que existen con los poseedores presentes aguas abajo, por lo que enviaron una propuesta de modificativa o balance con la cual busca dar solución a la problemática de erosión que presentan algunos tramos del brazo o tramo auxiliar, recordemos que entre las abscisas K1+980 al K3+000 la comunidad no dejo ejecutar las actividades previstas en el contrato.
- Contratista indica que se iniciaron labores de trazado y replanteo del tramo adicional, así como traslado de maquinaria e inicio de las laboreas de limpieza para la recuperación ambiental correspondiente. Se realizan los trabajos entre las abscisas del adicional del tramo principal K0+600 a K0+100.
- Se finaliza la actividad en ciénaga del totumo. Se solicita control SST en el proceso de desmovilización de los equipos y maquinaria.
- Se avanza con actividades de trazado y replanteo. La interventoría solicita al Contratista aumentar el personal de limpieza manual para mejorar rendimientos de trazado y replanteo.



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(17 de DICIEMBRE de 2025)**

- Contratista informa que los rendimientos han mermado significativamente en la limpieza del arroyo por la presencia de residuos sólidos, lluvias y dificultades de acceso de las maquinarias.
- Interventoría solicita que se implemente un plan de contingencia para contrarrestar afectaciones que dejaron las lluvias.

Componente Socio Ambiental SST

Interventoría solicita dar cumplir estrictamente con el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Se solicita a Contratista campañas de limpieza en la vía en los puntos de salida de volquetas, dado que se evidencia que estas arrojan material y pueden ocasionar accidentes a la comunidad.

Se solicita ampliar las campañas de socialización

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Personal de limpieza en los puntos de salida de volquetas	CONTRATISTA
Paletero permanente en los puntos de salidas de volquetas.	CONTRATISTA
Revisión y presentación de modificativa a Entidad	INTERVENTORIA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo comité queda definido para el 24 de diciembre de 2025 a las 9:00 am.



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(24 de DICIEMBRE de 2025)**

CONTRATO DE OBRA No.	0281 - 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0280 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

I. PARTICIPANTES	CARGO	Firma
Ing. Manuel Rodríguez Gómez	Director de interventoría – Consorcio recuperación hidráulica.	
Ing Fabio Martínez Yancy	Residente de interventoría – Consorcio recuperación hidráulica.	
Eduardo Guzmán	Residente de obra – Consorcio Ambiental del Atlántico	
Alberto Tejera Higgins	Ingeniero de apoyo – Consorcio Ambiental del Atlántico	
Karolain Fontalvo	Profesional SST - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Liceth Maestre Bermúdez	Profesional Social - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Henry Santiago Oyuela	Profesional ambiental - Consorcio Ambiental del Atlántico	
Eyleen Tatiana Pérez Maestre	Profesional ambiental - Consorcio recuperación Ambiental	

II. OBJETO

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se tienen los siguientes compromisos del comité anterior.



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(24 de DICIEMBRE de 2025)**

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
Personal de limpieza en los puntos de salida de volquetas	CONTRATISTA	CUMPLIDO
Pailetero permanente en los puntos de salidas de volquetas.	CONTRATISTA	CUMPLIDO
Revisión y presentación de modificativa a Entidad	INTERVENTORIA	CUMPLIDO

IV. ORDEN DEL DIA

1. Componente técnico
2. Componente Ambiental
3. Componente SST
4. Componente Social
5. Propositiones y otros.

V. TEMAS TRATADOS

La interventoría da inicio al **comité de obra Nro. 21** siendo las **10:00 am** exponiendo las actividades y situaciones realizadas hasta la fecha

Componente técnico.

- El componente técnico inicia con el residente de interventoría realizando un recuento del avance que se tiene obra, en donde presenta un porcentaje programado del 85.76% y un ejecutado del 67.91%. teniendo un atraso del 17.84%.
- Los atrasos presentados corresponden a que entre las abscisas K1+980 a K3+000 la comunidad permitió o se opuso a la ejecución de las actividades previstas en el contrato.
- La Entidad evalúa la inclusión de ítems no previstos para control de erosión en el tramo anexo o brazo.
- Contratista indica que se iniciaron labores de trazado y replanteo del tramo adicional, así como traslado de maquinaria e inicio de las labores de limpieza para la recuperación ambiental correspondiente. Se realizan los trabajos entre las abscisas del adicional del tramo principal K0+600 a K0+100.



**ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(24 de DICIEMBRE de 2025)**

- Se avanza con actividades de trazado y replanteo. La interventoría solicita al Contratista aumentar el personal de limpieza manual para mejorar rendimientos de trazado y replanteo.
- Interventoría solicita que se implemente un plan de contingencia para contrarrestar afectaciones que dejaron las lluvias.

Componente Socio Ambiental SST

Interventoría solicita dar cumplir estrictamente con el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Se solicita a Contratista campañas de limpieza en la vía en los puntos de salida de volquetas, dado que se evidencia que estas arrojan material y pueden ocasionar accidentes a la comunidad.

Se solicita ampliar las campañas de socialización

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Personal de limpieza en los puntos de salida de volquetas	CONTRATISTA
Paletero permanente en los puntos de salidas de volquetas.	CONTRATISTA
Revisión y presentación de modificativa a Entidad	INTERVENTORIA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo comité queda definido para el 31 de diciembre de 2025 a las 9:00 am.

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			Versión 001	
				Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA

jueves, 11 de diciembre de 2025

PERIODO No.

23

DEL

04/12/2025

AL

10/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO No.:

0280 DE 2025

CONTRATO No.:

0281 DE 2025

PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:

SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

PLAZO INICIAL CONSTRUCCION:

SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:

3 de julio de 2025

FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:

3 de julio de 2025

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

**FECHA DE REINICIACIÓN:

**FECHA DE REINICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:

31 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:

31 de diciembre de 2025

PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ACTUALIZADO:

181.00

PLAZO ACTUALIZADO:

181.00

PLAZO TRANSCURRIDO:

160 [EQUIVALE AL]

88.4%

PLAZO TRANSCURRIDO:

160 [EQUIVALE AL]

88.4%

VALOR INICIAL :

\$

396,766,230.00

VALOR INICIAL :

\$

6,163,657,461.00

VALOR ADICION(ES):

\$

-

VALOR ADICION(ES):

\$

2,101,266,178.00

VALOR ACTUALIZADO:

\$

396,766,230.00

VALOR ACTUALIZADO:

\$

8,264,923,639.00

VALOR PAGADO:

\$

132,255,410.00

VALOR PAGADO:

\$

1,751,760,629.90

VALOR POR PAGAR:

\$

264,510,820.00

VALOR POR PAGAR:

\$

8,264,923,639.00

SUPERVISOR CRA:

PEDRO SARMIENTO ARIZA

INTERVENTOR:

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	03/07/2025	03/07/2025	-
2	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025		
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	11/12/2025		
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	30/12/2025		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	30/12/2025		
7	CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO	31/12/2025		
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025	03/12/2025	
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025	02/09/2025	-4.00
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025		
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	24/12/2025	03/12/2025	
12	CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL	31/12/2025	03/12/2025	
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3.	31/12/2025	03/12/2025	
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3.	31/12/2025	03/12/2025	
15	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	31/12/2025		
Plazo del proyecto en días		181		

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 5,536,586,755.58	66.99%	-5.38%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 5,091,581,499.14	61.60%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Debido a los problemas presentados con los poseedores presentes aguas abajo, el contratista envió una propuesta de modificativa o balance con la cual busca dar solución a la problemática de erosión que presentan algunos tramos del brazo auxiliar, recordemos que entre las abscisas K1+980 al K3+000 la comunidad no dejó ejecutar las actividades previstas en el contrato. por lo que en estos momentos se evalúa la inclusión de estos recursos en las obras de protección para el control de la erosión

- Para esta semana se reflejan algunos atrasos en la programación de obra, los cuales se deben en mayor parte a la no ejecución de los recursos por la negación de la comunidad como se menciona en el anterior situación, además de las lluvias que afectaron en el mes anterior, estos atrasos ya están haciendo que el proyecto presente una ejecución negativa.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Solicitar al contratista un ajusta y plan de accion que ayuden a disminuir los atrasos que se estan presentando	Contratista de obra	16/12/2025

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra el día 04 de diciembre de 2025, se están considerando la inclusión de 2 ítem nuevos o no previstos los cuales se generarían con el fin de poder llevar a cabo las protecciones de las zonas del tramo auxiliar en donde se están generando erosiones

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

6.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 04 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+300, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K1+180 hasta K1+050, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio

- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

- La interventoría entrega solicitud de modificativa No. 2 y solicitud de prorroga por un periodo de 2 meses calendario para la culminación de las obras.

Viernes 05 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+400, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K1+050 hasta K0+900, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio

- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		Versión 001
			Fecha Aprobación 2020-11-24

FECHA	PERIODO No.	23	DEL	04/12/2025	AL	10/12/2025
<p>Sábado 06 de Diciembre de 2025.</p> <p>- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+900 hasta K0+800, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.</p> <p>- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio</p> <p>- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material</p> <p>Domingo 07 de diciembre de 2025 No se realizan Labores - día Festivo.</p> <p>Lunes 08 de diciembre de 2025. No se realizan Labores - día Festivo.</p> <p>Martes 09 de Diciembre de 2025.</p> <p>- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+520, se toman puntos en talud izquierdo, derecho y fondo del arroyo y se definen lineamientos topográficos.</p> <p>- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+800 hasta K0+700, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.</p> <p>- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio</p> <p>- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.</p> <p>- el contratista realizo solicitud de permiso a predios en zonas de club alto lago, ademas se emito ofico dirigido a la concesion ruta costera solicitando permiso para la limpieza debajo de los puentes sobre la calle 46 (vía al mar)</p> <p>Miércoles 10 de Diciembre de 2025.</p> <p>- Se realiza seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha , en el tramo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe.</p> <p>- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+700 hasta K0+600, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.</p> <p>- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio</p> <p>- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.</p>						

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

 <p>Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+900</p>	 <p>Vista de maquinaria desde la abscisa K1+180 trabajos en ambos costados</p>	 <p>Maquinaria en tramo adicional para limpieza para recuperación ambiental, específicamente en abscisa K1+080 Talud izquierdo Tramo Adicional</p>
 <p>Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+700</p>	 <p>Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+850</p>	 <p>Trazado y replanteo inicial en barzo auxiliar K0+400 tramo adicional</p>

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		Versión 001	
			Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA

jueves, 18 de diciembre de 2025

PERIODO No.

24

DEL

11/12/2025

AL

17/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLANTICO

CONTRATO No.:

0280 DE 2025

CONTRATO No.:

0281 DE 2025

PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:

SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

PLAZO INICIAL CONSTRUCCION:

SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:

3 de julio de 2025

FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCION:

3 de julio de 2025

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

**FECHA DE REINICIACIÓN:

**FECHA DE REINICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:

31 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCION:

31 de diciembre de 2025

PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ADICIONAL:

PLAZO ACTUALIZADO:

181.00

PLAZO ACTUALIZADO:

181.00

PLAZO TRANSCURRIDO:

167 | EQUIVALE AL 92.3%

PLAZO TRANSCURRIDO:

167 | EQUIVALE AL 92.3%

VALOR INICIAL :

\$ 396,766,230.00

VALOR INICIAL :

\$ 6,163,657,461.00

VALOR ADICION(ES):

\$ -

VALOR ADICION(ES):

\$ 2,101,266,178.00

VALOR ACTUALIZADO:

\$ 396,766,230.00

VALOR ACTUALIZADO:

\$ 8,264,923,639.00

VALOR PAGADO:

\$ 132,255,410.00

VALOR PAGADO:

\$ 1,751,760,629.90

VALOR POR PAGAR:

\$ 264,510,820.00

VALOR POR PAGAR:

\$ 8,264,923,639.00

SUPERVISOR CRA:

PEDRO SARMIENTO ARIZA

INTERVENTOR:

CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.

*** DESCRIPCIÓN DEL HITO

FECHA PROGRAMADA

FECHA FINALIZACION DE ACTIVIDADES

DÍAS

1

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)

03/07/2025

03/07/2025

-

2

CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON

31/12/2025

3

Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo

31/12/2025

4

Limpieza para Recuperación Ambiental

11/12/2025

5

Retiro y Disposición Final de Residuos

30/12/2025

6

Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado

30/12/2025

7

CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO

31/12/2025

8

Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga

31/12/2025

9

Movilización Terrestre de Equipos

29/08/2025

10

Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas

30/12/2025

11

Desmovilización Terrestre de Equipos

24/12/2025

12

CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL

31/12/2025

13

Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3.

31/12/2025

14

Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3.

31/12/2025

15

ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)

31/12/2025

Plazo del proyecto en días

181

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.

No.

INDICADORES

VALORES

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO

1

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.

\$ 6,123,730,702.58

74.09%

2

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.

\$ 5,448,523,499.14

65.92%

-8.17%

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

- Debido a los problemas presentados con los poseedores presentes aguas abajo, el contratista envió una propuesta de modificativa o balance con la cual busca dar solución a la problemática de erosión que presentan algunos tramos del brazo auxiliar, recordemos que entre las abscisas K1+980 al K3+000 la comunidad no dejó ejecutar las actividades previstas en el contrato. por lo que en estos momentos se evalúa la inclusión de estos recursos en las obras de protección para el control de la erosión

- Para esta semana se reflejan algunos atrasos en la programación de obra, los cuales se deben en mayor parte a la no ejecución de los recursos por la negación de la comunidad como se menciona en el anterior situación, además de las lluvias que afectaron en el mes anterior, estos atrasos ya están haciendo que el proyecto presente una ejecución negativa.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

Solicitar al contratista un ajusta y plan de accion que ayuden a disminuir los atrasos que se estan presentando

Contratista de obra

16/12/2025

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra el día 04 de diciembre de 2025, se están considerando la inclusión de 2 ítem nuevos o no previstos los cuales se generarían con la finalidad de poder llevar a cabo las protecciones de las zonas del tramo auxiliar en donde se están presentando erosiones en los taludes.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

6.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 11 de Diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+600 hasta K0+500, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio

- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Viernes 12 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+500 hasta K0+400, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio

- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		Versión 001	
				Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 18 de diciembre de 2025	PERIODO No.	24	DEL	11/12/2025	AL	17/12/2025
-------	---------------------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

Sábado 13 de Diciembre de 2025.

- Se realiza mantenimiento a maquinaria que esta llevando a cabo las labores de limpieza en el tramo adicional

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante,

- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material

Domingo 14 de diciembre de 2025

No se realizan Labores - día Festivo.

Lunes 15 de diciembre de 2025.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+400 hasta K0+300, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.

- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proviene del tramo auxiliar en donde se encontro mayor volumen de sedimento y basuras

Martes 16 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.

- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, proviene del tramo auxiliar en donde se encontro mayor volumen de sedimento y basuras

Miércoles 17 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.

- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+200 hasta K0+100, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio

- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+400	Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+420	Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+650
Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+300	Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+150	Seuimiento a Trazado y replanteo incial en barzo auxiliar K0+400 tramo adicional

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001	
					Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	viernes, 26 de diciembre de 2025	PERIODO No.	25	DEL	18/12/2025	AL	24/12/2025
-------	----------------------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y CORREGIMIENTO DE LOMA DE ARENA JURISDICCIÓN ATLÁNTICO					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:		0280 DE 2025		CONTRATO No.:		0281 DE 2025	
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		SEIS (06) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:		3 de julio de 2025		FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:		3 de julio de 2025	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		31 de diciembre de 2025		FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		31 de diciembre de 2025	
PLAZO ADICIONAL:				PLAZO ADICIONAL:			
PLAZO ACTUALIZADO:		181.00		PLAZO ACTUALIZADO:		181.00	
PLAZO TRANSCURRIDO:		174 EQUIVALE AL 96.1%		PLAZO TRANSCURRIDO:		174 EQUIVALE AL 96.1%	
VALOR INICIAL :		\$ 396,766,230.00		VALOR INICIAL :		\$ 6,163,657,461.00	
VALOR ADICION(ES):		\$ -		VALOR ADICION(ES):		\$ 2,101,266,178.00	
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 396,766,230.00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 8,264,923,639.00	
VALOR PAGADO:		\$ 132,255,410.00		VALOR PAGADO:		\$ 1,751,760,629.90	
VALOR POR PAGAR:		\$ 264,510,820.00		VALOR POR PAGAR:		\$ 8,264,923,639.00	
SUPERVISOR CRA:		PEDRO SARMIENTO ARIZA		INTERVENTOR:		CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.				
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	DÍAS
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	03/07/2025	03/07/2025	-
2	CAPÍTULO I - RECUPERACION ARROYO LEON	31/12/2025		
3	Localización, Trazado, Replanteo y Control Topográfico en Arroyo	31/12/2025		
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	11/12/2025		
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	30/12/2025		
6	Tarifa de Recibo de Basura en Botadero Autorizado	30/12/2025		
7	CAPÍTULO II - RECUPERACION CIENAGA DEL TOTUMO	31/12/2025		
8	Localización, Replanteo y Control Topográfico en Ciénaga	31/12/2025		
9	Movilización Terrestre de Equipos	29/08/2025		
10	Limpieza para Recuperación Ambiental mediante retiro de vegetación (biota) acuática sobre planchón, incluye acarreo y acopio en orillas	30/12/2025		
11	Desmovilización Terrestre de Equipos	24/12/2025		
12	CAPÍTULO III - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL	31/12/2025		
13	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico-Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3.	31/12/2025		
14	Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3.	31/12/2025		
15	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	31/12/2025		
Plazo del proyecto en días		181		

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 7,087,851,420.58	85.76%	-17.84%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 5,613,023,499.14	67.91%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS				

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES	
Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra el día 04 de diciembre de 2025, se estan considerando la inclusion de 2 item nuevos o no Previstos los cuales se generarian con el fin de poder llevar a cabo las protecciones de las zonas del tramo auxiliar en donde se estan generando erosiones	

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA	
6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA	
Jueves 18 de Diciembre de 2025.	
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+000, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.	
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante	
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material	
Viernes 19 de diciembre de 2025.	
•Se ejecutan nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+400 y K0+500, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.	
•Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio	
•Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material.	

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				Versión 001	
						Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	viernes, 26 de diciembre de 2025	PERIODO No.	25	DEL	18/12/2025	AL	24/12/2025
-------	----------------------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

Sábado 20 de Diciembre de 2025.

- Se realiza mantenimiento a maquinaria que está llevando a cabo las labores de limpieza en el tramo adicional mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 320 m³ de material.

Domingo 21 de diciembre de 2025
No se realizan Labores - día Festivo.

Lunes 22 de diciembre de 2025.

- Se ejecutan nuevamente los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+300 y K0+400, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material, proveniente del tramo auxiliar en donde se encontró mayor volumen de sedimento y basuras

Martes 23 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante.
- Seguimiento y control a la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 576 m³ de material, provien del tramo auxiliar en donde se encontro mayor volumen de sedimento y basuras

Miércoles 24 de Diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento actividad de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+100 y K0+200, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido de obra y reunión en sitio
- Seguimiento y control a la evacuación de 20 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

		
Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+050 costado izquierdo	Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+100 costado izquierdo	Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+150 costado izquierdo
		
Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+420 costado izquierdo	Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+480 costado izquierdo	Seguimiento al traslado de residuos a botadero, por medio de volquetas doble troque de 16 m3


FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE

[illegible]

 		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		Versión 001	
				Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	viernes, 2 de enero de 2026	PERIODO No.	26	DEL	25/12/2025	AL	31/12/2025
-------	-----------------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

sábado 27 de diciembre de 2025.

- Se hace seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del Arroyo León, específicamente en el costado izquierdo, entre las abscisas K0+050 y K0+000, mediante el uso de retroexcavadora. Lo anterior obedece a un replanteo topográfico, el cual evidenció la necesidad de realizar un mayor corte del talud para cumplir con las condiciones geométricas y técnicas del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 28 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 448 m³ de material.

Domingo 28 de diciembre de 2025.

- No se programan actividades

Lunes 29 de diciembre de 2025.

- Continúan los trabajos seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+000 hasta K0+080, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Martes 30 de diciembre de 2025.

- Continúan seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+150 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 512 m³ de material

Miércoles 31 de diciembre de 2025.

- Se realiza seguimiento a las actividades de trazado y replanteo en los tramos adicionales del arroyo león, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto a cierre del presente informe, se definen lineamientos topográficos y se demarcan zonas de corte.
- Seguimiento a los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición del tramo principal del arroyo león, específicamente en el costado derecho específicamente entre las abscisas K0+150 hasta K0+200, mediante el uso de retroexcavadoras. Las actividades incluyen Limpieza recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce con geometría trapezoidal, en concordancia con las especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.
- Se realiza seguimiento a las actividades del PMA, Plan SST y sociales por parte de contratista e interventoría.
- Seguimiento y control a la evacuación de 16 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, destinados al transporte de material de residuos sólidos hacia el botadero ECOWORKS ING LTDA ubicado a una distancia aproximada de 10 kilómetros, logrando la disposición final de 256 m³ de material.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

 <p>Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+050</p>	 <p>Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+100 costado izquierdo</p>	 <p>Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+200 costado derecho</p>
 <p>Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+180 costado derecho</p>	 <p>Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+150 costado derecho</p>	 <p>Seguimiento al traslado de residuos a botadero, por medio de volquetas doble troque de 16 m3</p>


FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY- ING RESIDENTE

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+900



Vista de maquinaria desde la abscisa K1+180 trabajos en ambos costados



Maquinaria en tramo adicional para limpieza para recuperación ambiental, específicamente en abscisa K1+080 Talud izquierdo Tramo Adicional



Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+700



Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+850



Seguimiento y control a trazado y replanteo inicial en brazo auxiliar K0+400 tramo adicional



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+400



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+420



Seguimiento a limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+650



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+050 costado izquierdo



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+100 costado izquierdo



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+150 costado izquierdo



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+420 costado izquierdo



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+480 costado izquierdo



Seguimiento al traslado de residuos a botadero, por medio de volquetas doble troque de 16 m³



Limpieza para recuperación mecánica, perfilado y conformación de la sección transversal en el costado izquierdo del tramo principal (adicional) del arroyo León en la abscisa K0+050



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+200 costado derecho



Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+180 costado derecho




Seguimiento a limpieza para la recuperación ambiental en el adicional del tramo principal, específicamente en la abscisa K0+150 costado derecho



Seguimiento al traslado de residuos a botadero, por medio de volquetas doble troque de 16 m3

ANEXO 4. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

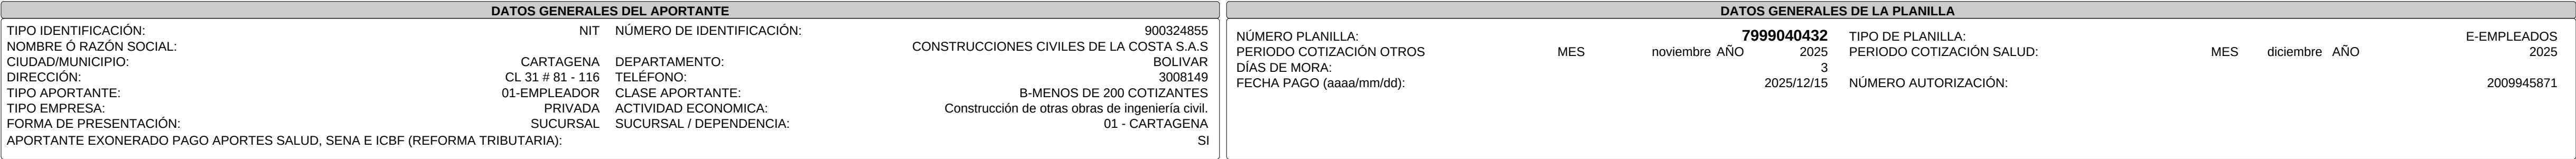

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 0	\$ 911.200	\$ 1.800		\$ 913.000	
230201	230201- PROTECCION	4	\$ 706.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 706.200	\$ 1.400		\$ 707.600	
231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 964.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 964.400	\$ 1.900		\$ 966.300	
230301	230301-PORVENIR	11	\$ 2.316.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	\$ 0	\$ 2.316.000	\$ 4.400		\$ 2.320.400	
SUBTOTALES:											\$ 4.897.800	\$ 9.500		\$ 4.907.300

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 184.300	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 184.300	\$ 400	\$ 0	\$ 184.700
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 57.000	\$ 200	\$ 0	\$ 57.200
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 39.900	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 39.900	\$ 100	\$ 0	\$ 40.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 171.000	\$ 400	\$ 0	\$ 171.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 241.300	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 241.300	\$ 500	\$ 0	\$ 241.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 171.000	\$ 400	\$ 0	\$ 171.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 57.000	\$ 200	\$ 0	\$ 57.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 114.000	\$ 300	\$ 0	\$ 114.300
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 190.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 190.000	\$ 400	\$ 0	\$ 190.400
SUBTOTALES:													\$ 1.225.500	\$ 2.900	\$ 0	\$ 1.228.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			VALOR PAGADO	
	NOMBRE		NÚMERO	AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA		DESCUENTO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 2.130.900	\$ 2.130.900	\$ 4.100	\$ 0	\$ 2.135.000
SUBTOTALES:										\$ 2.130.900	\$ 4.100	\$ 0	\$ 2.135.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	6	\$ 207.100	\$ 400	\$ 207.500
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	18	\$ 1.018.400	\$ 2.000	\$ 1.020.400
SUBTOTALES:			\$ 1.225.500	\$ 2.400	\$ 1.227.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURO SOCIAL					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT					IBC
1	CC 1003563237	MORELO CORREA BENJAMIN FERNANDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1010124277	REUTER ANGLICO KATRIN RENATE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1042444516	PAREJO GARCIA EDUIN ALBERTO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	08	21																230301-PORVENIR	14	\$ 664.300	\$ 106.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 106.300	EPS037-NUEVA EPS	14	\$ 664.300	\$ 26.600	\$ 0	\$ 26.600	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	\$ 664.300		\$ 46.300	14	\$ 664.300	CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1044431656	CANTILLO BOHORQUEZ ROICER ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	24																	231001-COLFOND OS	7	\$ 332.150	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	7	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 13.300	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	\$ 332.150		\$ 23.200	7	\$ 332.150	CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1047400307	NAIZIR ALTAMAR ANGEL DE JESUS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLEADOR				EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN											
6	CC 1047406718	GUZMAN RODRIGUEZ ANDY	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	05																	230201-PROTECCIÓN	26	\$ 1.233.700	\$ 197.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 197.400	EPS037-NUEVA EPS	26	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 0	\$ 49.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	\$ 1.233.700	\$ 85.900	26	\$ 1.233.700	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 49.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7	CC 1047494424	IBAÑEZ ARIAS BRAYAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
8	CC 1129488512	ROCA MARTINEZ DAIRO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	24																	230201-PROTECCIÓN	7	\$ 332.150	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.200	EPS002-SALUD TOTAL	7	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 13.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	\$ 332.150	\$ 23.200	7	\$ 332.150	\$CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	CC 1143394978	HERRERA AHUMADA POLICARPO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIASAS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	CC 1193139097	LOPEZ MARTINEZ BRAYAN DAVID	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 1235043790	LORDUY BARRIOS ANA MARIA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 19792949	ALVAREZ CELUAN EDUARDO NELSON	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
13	CC 72045245	GALINDO DE ALBA FERNANDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14	CC 72139615	MARQUEZ BENITEZ OSCAR OMAR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
15	CC 72151617	MONTAÑO BERDUGO ALVARO SEGUNDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
16	CC 73144082	DAZA MOLINA JOSE CARLOS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
17	CC 73157635	LAMBIS AGUAS EDGARDO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	\$CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
18	CC 73267145	MARTINEZ BALLESTAS LUIS ROBERTO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	21																	230301-PORVENIR	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	MUTUAL SER EPS-S	21	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450	\$ 69.400	21	\$ 996.450	\$CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ANEXO 5. PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901958877	2	CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CARRERA 71 94 23 APTO 810 TORRE 3		3012009031		F.MARTINEZ@AFATOP.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36362352	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.295.500	98.200	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36362352	2026-01-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 7571034	VIDES DE LA HOZ FELIX JOAQUIN	3.520.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.520.000	563.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	3.520.000	140.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.520.000	140.800	3.520.000	245.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.089.800	S	5711001
2	CC 8726301	RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL DE JESUS	3.350.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	3.350.000	134.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.350.000	134.000	3.350.000	233.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	5	501.200	S	5711001
3	CC 57434997	AREVALO ARIZA CLAUDIA PATRICIA	2.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.300.000	368.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.300.000	92.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5711001
4	CC 72341633	LOBELO CAMPBELL JAIR ALBERTO	1.423.500	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
5	CC 1065608102	PEREZ MAESTRE EYLEEN TATIANA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
6	CC 1065629241	MARTINEZ YANCY FABIO ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.000.000	800.000	0	0	EPS SURA-EPS010	5.000.000	200.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5711001
7	CC 1121042629	ALVAREZ BRITO JEISON DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901958877	2	CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CARRERA 71 94 23 APTO 810 TORRE 3		3012009031		F.MARTINEZ@AFATOP.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36362352	E	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.295.500	98.200	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36362352	2026-01-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.167.000	18.517.000	18.517.000	18.517.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.426.800	0	45.800	0	2.472.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.267.800	0	23.900	0	1.291.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	4.300	0	232.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	931.200	0	17.600	0	948.800
EPS(Administradoras: 4)				7	740.800	0	14.100	0	754.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	92.000	0	1.800	0	93.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	200.000	0	3.800	0	203.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	140.800	0	2.700	0	143.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	308.000	0	5.800	0	313.800
ARP(Administradoras: 1)				7	1.288.900	0	24.300	0	1.313.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	1.288.900	0	24.300	0	1.313.200
CCF(Administradoras: 1)				7	740.800	0	14.000	0	754.800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	7	740.800	0	14.000	0	754.800
Gran Total					5.197.300	0	98.200	0	5.295.500

ANEXO 6. SEGUIMIENTO SST INTERVENTORIA

		SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICCA			Código: SST-F- 01 Versión: 01 Fecha aprobación: 02/07/2025						
LUGAR:		FECHA: 14/01/2026										RESPONSABLE: CLAUDIA AREVALO									
PROYECTO:		ARROYO LEON Y CENAGA DEL TOTUMO																			
		REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINAMICA EN LA CENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																			
		LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																			
		SEMANA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2025																			
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:	
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X				
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X				
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X				
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X				
	¿Existe un documento para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X				
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X				
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X				
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X				
	¿Existe un documento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X				
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se evidencian las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral?			X			X			X			X			X				X	Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X				X	Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X				
EPP	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X				
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X				
	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X			X			X			X				
	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X				
INSPECCIONES	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X				
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X																			

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICCA		Código: SST-F - 01 Versión: 01 Fecha aprobación: 02/07/2025							
FECHA: 14/01/2026					RESPONSABLE: CLAUDIA AREVALO														
LUGAR:					ARROYO LEON Y CIENAGA DEL TOTUMO														
PROYECTO:					REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO														
SEMANA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025					LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES:		
					SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?							X			X			X			X		
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?							X			X			X			X		
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?							X			X			X			X		
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?							X			X			X			X		
	¿Existe un documento para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?							X			X			X			X		
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con inspección de señalización?							X			X			X			X		
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?							X			X			X			X		
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Se cuenta con un plan de comunicación?							X			X			X			X		
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?							X			X			X			X		
	¿Existe un documento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?							X			X			X			X		
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?							X			X			X			X		
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con ATS?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?							X			X			X			X		
	¿Se evidencian las acciones correctivas?							X			X			X			X		
	¿Se realizan pausas activas?							X			X			X			X		
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral?								X			X			X			X	Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?								X			X			X			X	Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?							X			X			X			X		
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?							X			X			X			X		
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?							X			X			X			X		
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?							X			X			X			X		
EPP	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?							X			X			X			X		
	¿Cuenta con la matriz de EPP?							X			X			X			X		
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?							X			X			X			X		
INSPECCIONES	¿Existe un programa de inspección de los EPP?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?							X			X			X			X		
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricas?								X			X			X			X	No se cuenta con equipos electricos
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?							X			X			X			X		
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?							X			X			X			X		
ORDEN Y ASEO	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?							X			X			X			X		
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?							X			X			X			X		
	¿Cuenta con puntos ecológicos?							X			X			X			X		
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?							X			X			X			X		
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?							X			X			X			X		
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puestos de trabajo?							X			X			X			X		
	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados y organizados?							X			X			X			X		
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo							X			X			X			X		
								X			X			X			X		

Firma del contratista 

CC: 1045731886

Firma del Inspector HSE 

CC: 00494997


El responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Durante este periodo El contratista Consorcio Ambiental del atlántico cumplió con todas las actividades establecidas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Algunas de las prácticas destacadas incluyen:


charlas de 5 min y capacitaciones a todo el personal en la obra
Entrega de elementos de protección personal
Inspecciones de seguridad de maquinaria.

-Durante este periodo NO se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo durante la ejecución de las actividades en ninguno de los frentes de obra.

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST		CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICCA		Código: SST-F - 01 Versión: 01 Fecha aprobación: 02/07/2025																
FECHA: 14/01/2026		RESPONSABLE: CLAUDIA AREVALO																		
LUGAR:		ARROYO LEON Y CIENAGA DEL TOTUMO																		
PROYECTO:		REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																		
SEMANA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X			X			X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existe un documento para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X			X			X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Existe un documento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se evidencian las acciones correctivas?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X			X			X			X			
¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral?			X			X			X			X			X			X	Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales	
¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X			X			X			X			X	Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales	
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X			X			X			X			
¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X			X			X			X				
EPP	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X			X			X			X			
INSPECCIONES	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricos?			X			X			X			X			X			X	No se cuenta con equipos electricos
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X			X			X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X			X			X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puestos de trabajo?	X			X			X			X			X			X			
	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados y organizados?	X			X			X			X			X			X			
	¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X			X			X			X			
Firma del contratista 		Firma del Inspector HSE 																		
CC: 1045731886		CC: 00494997																		
El responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.																				
OBSERVACIONES GENERALES:																				
<p>Durante este periodo El contratista Consorcio Ambiental del atlántico cumplió con todas las actividades establecidas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Algunas de las prácticas destacadas incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> charlas de 5 min y capacitaciones a todo el personal en la obra Entrega de elementos de protección personal -Inspecciones de seguridad de maquinaria. <p>-Durante este periodo NO se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo durante la ejecución de las actividades en ninguno de los frentes de obra.</p>																				

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICCA		Código: SST-F - 01 Versión: 01 Fecha aprobación: 02/07/2025							
FECHA: 14/01/2026				RESPONSABLE: CLAUDIA AREVALO															
LUGAR:				ARROYO LEON Y CIENAGA DEL TOTUMO															
PROYECTO:				REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO															
SEMANA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025				LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		OBSERVACIONES:			
				SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		SI	NO	NA
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?	X			X			X					X			X			
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?	X			X			X					X			X			
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	X			X			X					X			X			
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?	X			X			X					X			X			
	¿Existe un documento para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?	X			X			X					X			X			
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con inspección de señalización?	X			X			X					X			X			
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?	X			X			X					X			X			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Se cuenta con un plan de comunicación?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?	X			X			X					X			X			
	¿Existe un documento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?	X			X			X					X			X			
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con ATS?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?	X			X			X					X			X			
	¿Se evidencian las acciones correctivas?	X			X			X					X			X			
	¿Se realizan pausas activas?	X			X			X					X			X			
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral?		X			X			X					X			X		Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?		X			X			X					X			X		Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?	X			X			X					X			X			
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?	X			X			X					X			X			
EPP	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?	X			X			X					X			X			
	¿Cuenta con la matriz de EPP?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?	X			X			X					X			X			
INSPECCIONES	¿Existe un programa de inspección de los EPP?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricos?		X			X			X					X			X		No se cuenta con equipos electricos
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?	X			X			X					X			X			
ORDEN Y ASEO	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinaria y/o equipos?	X			X			X					X			X			
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y Aseo?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?	X			X			X					X			X			
	¿Cuenta con puntos ecológicos?	X			X			X					X			X			
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?	X			X			X					X			X			
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?	X			X			X					X			X			
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puestos de trabajo?	X			X			X					X			X			
	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados y organizados?	X			X			X					X			X			
¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo	X			X			X					X			X				

Firma del contratista 
 CC: 1045731886

Firma del Inspector HSE 
 CC: 00494997

El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.

OBSERVACIONES GENERALES:

Durante este periodo El contratista Consorcio Ambiental del atlántico cumplió con todas las actividades establecidas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Algunas de las prácticas destacadas incluyen:

- charlas de 5 min y capacitaciones a todo el personal en la obra
- Entrega de elementos de protección personal
- Inspecciones de seguridad de maquinaria.

-Durante este periodo NO se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo durante la ejecución de las actividades en ninguno de los frentes de obra.

 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SST										CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICCA		Código: SST-F - 01 Versión: 01 Fecha aprobación: 02/01/2025												
FECHA: 14/01/2026				RESPONSABLE: CLAUDIA AREVALO																				
LUGAR:				ARROYO LEON Y CIENAGA DEL TOTUMO																				
PROYECTO:				REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO																				
SEMANA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2025				LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES:		
				SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
REQUISITOS LEGALES	¿Se ha socializado las políticas de SST.		X			X				X														
	¿Se cuenta con matriz de requisitos legales?		X			X				X														
	¿Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización?		X			X				X														
	¿Existe la identificación de los requisitos legales, matriz ambiental y de otra índole?		X			X				X														
	¿Se cuenta con acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST?		X			X				X														
	¿Se cuenta con un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?		X			X				X														
PLAN DE EMERGENCIA	¿Existen un documento de SST para mejoramiento continuo?		X			X				X														
	¿Existe un documento para la evolución y valoración de emergencia y la implementación de medidas de control necesarias?		X			X				X														
	¿Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones?		X			X				X														
	¿Se cuenta con inspección de botiquín y camilla?		X			X				X														
	¿Se cuenta con inspección de señalización?		X			X				X														
	¿Existe un programa de brigada para la prevención conformada, capacitada y dotada?		X			X				X														
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	¿Se cuenta con un plan de comunicación?		X			X				X														
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo?		X			X				X														
	¿Existe un documento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo?		X			X				X														
	¿Se ha implementado medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados?		X			X				X														
	¿Se realizan charlas de riesgo y peligros?		X			X				X														
	¿Se cuenta con ATS?		X			X				X														
	¿Se cuenta con verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores?		X			X				X														
	¿Se evidencias las acciones correctivas?		X			X				X														
	¿Se realizan pausas activas?		X			X				X														
	¿Se realizan reporte de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral?			X			X				X													Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
GESTIÓN DE LA SALUD	¿Se realizan Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?			X			X				X													Durante este periodo no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales
	¿Se cuenta Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud?		X			X				X														
	¿Se ha realizado de Evaluaciones Médicas Ocupacionales?		X			X				X														
	¿Se ha realizado inducciones y reinducciones?		X			X				X														
	¿Realizar las actividades de Promoción y Prevención en Salud?		X			X				X														
	¿Se cuenta restricciones y recomendaciones médico/laborales?		X			X				X														
EPP	¿Se cuenta medición del ausentismo por causa médica?		X			X				X														
	¿Cuenta con la matriz de EPP?		X			X				X														
	¿Se ha realizado reporte diario de monitoreo y seguimiento de estado de los EPP?		X			X				X														
INSPECCIONES	¿Existe un programa de inspección de los EPP?		X			X				X														
	¿Se cuenta con un programa de inspecciones?		X			X				X														
	¿Se ha verificado las inspecciones de seguimiento y monitoreo de las herramientas manuales?		X			X				X														
	¿Se cuenta con Preoperacional de equipos eléctricos?			X			X				X													No se cuenta con equipos electricos
	¿Se ha realizado las inspecciones de Botiquín de primeros auxilios?		X			X				X														
	¿Se ha realizado las inspecciones de extintores?		X			X				X														
ORDEN Y ASEO	¿Se ha realizado las inspecciones de maquinarias y/o equipos?		X			X				X														
	¿Se ha realizado las inspecciones de orden y aseo?		X			X				X														
	¿Se cuenta con un programa de orden y aseo?		X			X				X														
	¿Cuenta con puntos ecológicos?		X			X				X														
	¿Cuenta con programa de manejo de residuos?		X			X				X														
	¿Se cuenta con puntos de acopio de material e insumos?		X			X				X														
	¿Se realiza seguimiento diario aleatorio de los puestos de trabajo?		X			X				X														
	¿Los campamentos se encuentran debidamente señalizados y organizados?		X			X				X														
¿Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación del orden y aseo		X			X				X															

Firma del contratista  CC: 1045731886	Firma del Inspector HSE  CC: 00494997
El Responsable de HSE no validará el permiso si esta lista de chequeo no ha sido diligenciada totalmente o si verifica el no cumplimiento de todas las recomendaciones.	
OBSERVACIONES GENERALES: Durante este periodo El contratista Consorcio Ambiental del atlántico cumplió con todas las actividades establecidas en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Algunas de las prácticas destacadas incluyen: charlas de 5 min y capacitaciones a todo el personal en la obra Entrega de elementos de protección personal Inspecciones de seguridad de maquinaria. -Durante este periodo NO se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo durante la ejecución de las actividades en ninguno de los frentes de obra.	

ANEXO 6. SEGUIMIENTO SST CONTRATISTA

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

INFORME DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Contrato de obra No. 0281 de 2025

Objeto “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”



PERIODO

Del 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026


Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ASPECTOS TECNICOS	4
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO	4
2.2.1 FRENTE CIÉNAGA DEL TOTUMO – PIOJO.....	5
2.2.2 FRENTE ARROYO LEÓN – PUERTO COLOMBIA.	5
3. SEGUIMIENTO AL SG-SST	6
3.1 ACTIVIDADES DEL SG-SST	6
3.2 INDUCCION AL PERSONAL.....	7
3.3 PERSONAL EN OBRA	7
3.4 SEGURIDAD SOCIAL	8
3.5 EXAMENES MEDICOS	8
3.6 CHARLAS Y CAPACITACIONES	8
4. SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP	9
5. MAQUINARIA Y EQUIPOS.....	10
6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD	11
7. ATENCION DE EMERGENCIAS	11
8. SEÑALIZACION EN LA OBRA	12
9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	13
10. ANEXOS.....	16

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

CONTROL DE SEGUIMIENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
6	14/ENE/2026	Informe de implementación del SG-SST

ELABORADO POR	APROBADO POR
	
Karolain Fontalvo Quintero Profesional SST Consorcio Ambiental del Atlántico	Cesar Caro Pinilla Representante Legal Consorcio Ambiental del Atlántico

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al período entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, en el cual se evidencia la efectividad y el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, necesarias para el buen desarrollo del proyecto denominado: **“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”** bajo el contrato de obra No. **0281 de 2025**.

En este Informe, se hace una descripción de las actividades realizadas por “CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO”, de tal manera que le permita tener a la entidad contratante, una visión general del desarrollo del contrato, en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, además determina el alcance del sistema de Gestión, las responsabilidades de los diferentes participantes del proyecto, que permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en:

- Realizar las intervenciones necesarias que permitan garantizar el adecuado flujo e interconexión hidrodinámica de dicho hidrosistema (Ciénaga del Totumo), ubicado en la jurisdicción del Municipio de Piojó; toda vez que una adecuada regulación hídrica permitiría mantener el volumen de agua suficiente para la supervivencia de la flora y fauna de este cuerpo de agua, en épocas de sequías y además mitigar los riesgos por inundación en épocas de invierno.

2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 0281 contempla la intervención en dos frentes de obra ubicados en los municipios de Puerto Colombia y Piojó, los cuales hacen parte del departamento del atlántico, los cuales se describen a continuación



Imagen 1. vista general departamento del atlántico.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

2.2.1 Frente Ciénaga del Totumo – Piojó.

La Ciénaga del Totumo se sitúa en el extremo sur del Atlántico, justo en la línea divisoria con el departamento de Bolívar, compartida entre los municipios de Piojó (Atlántico) y Santa Catalina (Bolívar), particularmente en los corregimientos de Loma de Arena, Pueblo Nuevo y Galerazamba.

La mayor parte del espejo de agua se ubica dentro de la jurisdicción del municipio de piojó y tiene un área aproximada de 1.200 hectáreas. La Ciénaga del Totumo es un cuerpo lagunar marino, pero también se retroalimenta del drenaje de arroyos provenientes de las colinas y cerros adyacentes.



Imagen 2 y 3. vista general de zonas a intervenir dentro de la ciénaga del totumo

2.2.2 Frente Arroyo León – Puerto Colombia.

El arroyo León se encuentra localizado en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, en la región Caribe colombiana. Este cuerpo de agua es un canal natural que recoge las aguas lluvias provenientes de las zonas altas del municipio y drena hacia el mar Caribe, cumpliendo una función ecológica e hidráulica importante

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

para el entorno urbano y rural.

El recorrido del arroyo atraviesa sectores estratégicos del municipio, incluyendo áreas residenciales que, durante la temporada invernal, se ven afectadas por desbordamientos y procesos de erosión. Debido a esta problemática, se ha identificado la necesidad de intervenir técnicamente parte de su cauce para mitigar riesgos y mejorar las condiciones ambientales y de saneamiento del entorno.

La intervención se centrará específicamente en el tramo comprendido entre la carrera 51B y la vía Sabanilla – La Playa, zona que presenta condiciones críticas en cuanto al manejo de aguas pluviales y acumulación de sedimentos. Este segmento ha sido priorizado por su cercanía a zonas urbanizadas y su impacto directo en la infraestructura vial y la calidad de vida de la comunidad.



Imagen 4. vista general de zonas a intervenir dentro del arroyo León

3. SEGUIMIENTO AL SG-SST

3.1 ACTIVIDADES DEL SG-SST

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO, conocedor de las obligaciones establecidas en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó del 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, la ejecución de las siguientes

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

actividades de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo así con lo establecido en el plan de trabajo:

3.2 INDUCCION AL PERSONAL

Durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, se realizaron inducciones a todo el personal que ingresó durante este periodo cumpliendo así con el procedimiento de inducción y reinducción de CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO.

En la inducción se tratan los siguientes temas:

- Presentación de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
- Política SST.
- Política de prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco.
- Política de prevención de acoso laboral
- Objetivos y metas SST.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Funcionamiento del Copasst.
- Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia.
- Matriz de Peligros, Riesgos y Controles.
- Procedimientos de trabajo seguro aplicables según el cargo.
- Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales.

Ver anexo 1. Registros de inducción del personal.

3.3 PERSONAL EN OBRA

Por parte de SST se realiza el registro diario de asistencia del personal de obra incluyendo el personal profesional, técnicos, obreros, visitantes y demás personal de obra.

Ver anexo 2. Listado de personal.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

3.4 SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO realizó el pago de la seguridad social (ARL, EPS, CCF, AFP) de todo el personal. Se anexa la planilla de seguridad social correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, del personal de obra, tanto profesionales como obreros.

Ver anexo 3. Seguridad social.

3.5 EXAMENES MEDICOS

En el **CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO**, Durante este periodo NO se presentaron ingresos nuevos, por lo tanto no se realizaron exámenes médicos ocupacionales.

3.6 CHARLAS Y CAPACITACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, se llevaron a cabo las charlas de 5 minutos a todo el personal tanto directo como subcontratistas, generando la cultura de seguridad y autocuidado en la ejecución de la obra. Con esto se da cumplimiento al cronograma de charlas y capacitación con el fin en la prevención de accidentes labores y enfermedades derivadas de sus actividades fortaleciendo las costumbres, hábitos y la cultura de seguridad en la ejecución de la obra. Donde recordamos el autocuidado y las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo.

Ver anexo 5. Registros de charlas y capacitaciones en SST.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		



Imágenes 5, 6, 7 y 8 Evidencias de las charlas y capacitaciones.

4. SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO cumple con la entrega de dotación al personal: Camisas industriales y pantalón industrial, además cumple con la entrega de los EPP al personal para la ejecución de manera segura de sus actividades diarias, se evidencia que el personal hace buen uso de los elementos de protección personal ya que estos están en buen estado, se llevan a cabo los mantenimientos y almacenamiento de los mismos, se realizan inspecciones mensuales con la finalidad de prevenir cualquier incidente o accidente de trabajo.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

Los EPP utilizados en obra son:

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Gafas de seguridad
- Tapa bocas según lo amerite
- Protectores auditivos según lo amerite

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO utilizó los siguientes equipos para la ejecución del proyecto:

- RETROEXCAVADORAS:

Arroyo León	Ciénaga del Totumo
Caterpillar 320D2- Mod 2014	Caterpillar 320D2- Mod 2014
Caterpillar 320D-Mod 2013	
Caterpillar 320GX-Mod 2022	



Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

Ver anexo 6. Documentación de Caterpillar 320DH-Mod 2013

Ver anexo 7. Documentación de Caterpillar 320D2- Mod 2014

Ver anexo 8. Documentación de Caterpillar 320GX

Ver anexo 9. Documentación de Caterpillar 320D2- Mod 2014

6. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO realiza inspecciones preventivas a todas las herramientas y equipos utilizados en la obra cumpliendo con el programa de inspecciones para la obra, con la finalidad de evitar accidentes e incidentes de trabajo producidos por las mismas:

Inspecciones	Periodicidad
Inspección de extintores	Mensual
Inspección de botiquines y camillas	Mensual
Inspección de maquinaria pesada	Diario
Inspección de EPP	Mensual

Ver Anexo 10. Inspección botiquín y camilla.

Ver Anexo 11. Inspección CAT320D.

Ver Anexo 12. Inspección CAT320D.

Ver Anexo 13. Inspección CAT320gx

Ver Anexo 14. Inspección CAT320D2

Ver Anexo 15. Inspección de volquetas.

7. ATENCION DE EMERGENCIAS

Para la atención de emergencias dentro de la obra CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO cuenta con los siguientes elementos:

(1) Camillas

(1) Botiquines

(3) Extintores multipropósito de 20 Libras

(1) Kit de derrame

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Imágenes 11, 12, 13 y 14 Evidencias de equipos de emergencias.

8. SEÑALIZACION EN LA OBRA

En cumplimiento a las medidas de prevención y control, en el frente de obra de Arroyo León, se cuenta con señalización en la obra, para así garantizar medidas óptimas de seguridad tanto para el personal vinculado al proyecto, como para los usuarios afectados por las obras.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Imágenes 15, 16, 17 y 18 Evidencias de señalización en la obra.

9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

En el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2025 al 02 de enero del 2026, se presentaron cero (0) accidentes de trabajo y cero (0) incidentes laborales, durante la ejecución de actividades de obra en el proyecto que tiene por objeto: **“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN**



Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

DESCRIPCIÓN	TOTAL
No. De accidentes laborales	0
Días de incapacidad por accidentes laborales	0
No. De incidentes laborales	0

COMPORTAMIENTO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO	
Personal	17
Horas extras	0.0
Total personal	17

INCAPACIDADES Y DIAS DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL	
No. Incapacidad por EG	0
Días de ausentismo por EG	0
Horas de ausentismo por EG	0
Ausentismo por EG	0.00%
TASA DE AUSENTISMO POR EG	0.00%

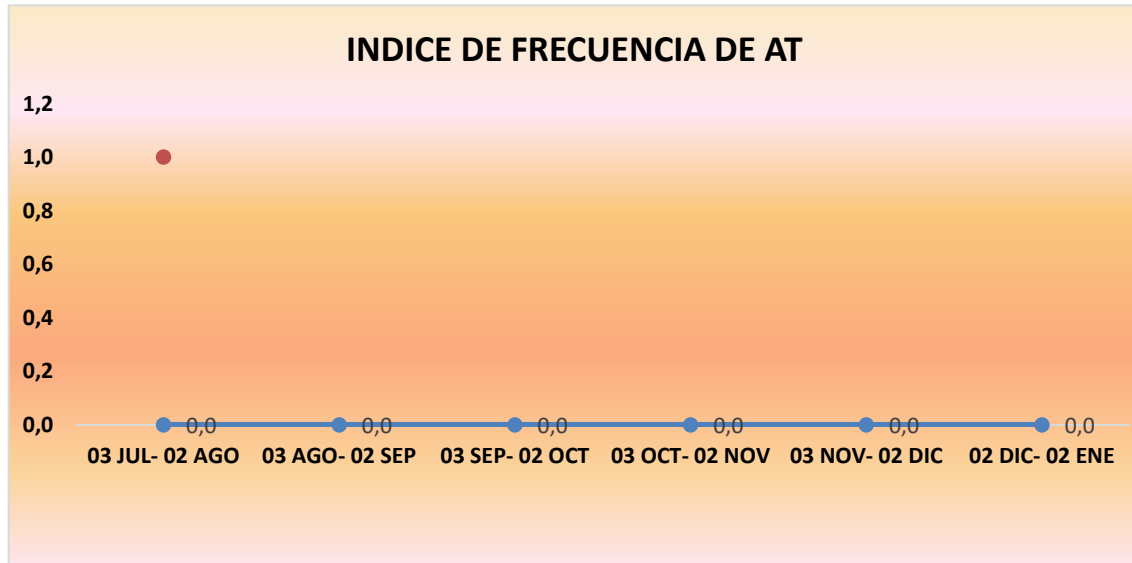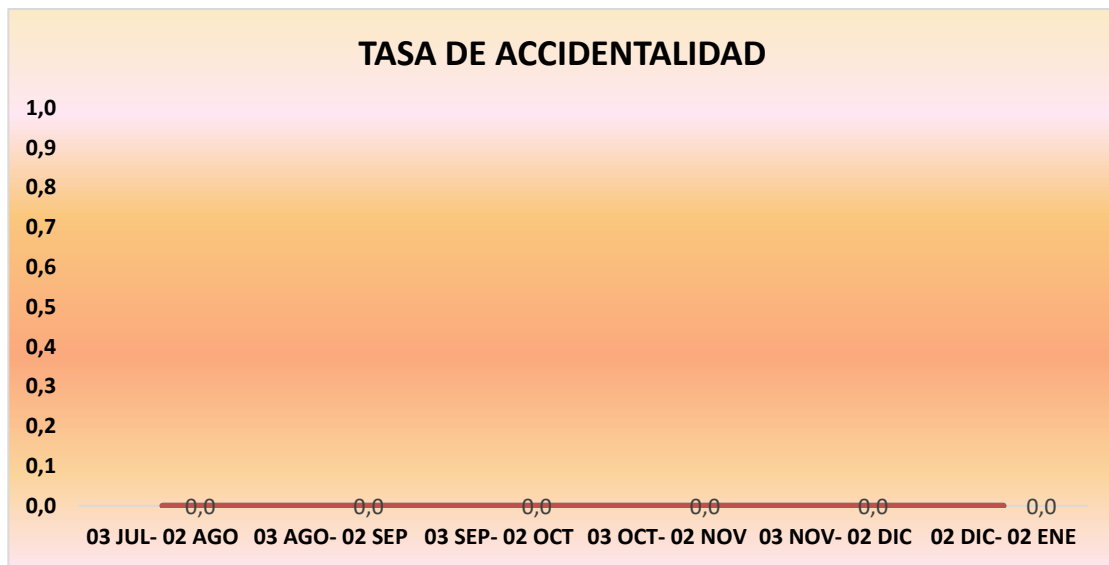

Ver anexo 16. Indicadores HSE.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

10. ANEXOS

- Anexo 1.** Inducción del personal nuevo.
- Anexo 2.** Listado de personal en obra.
- Anexo 3.** Seguridad social.
- Anexo 4.** Registros de charlas y capacitaciones SST.
- Anexo 5.** Documentación de Caterpillar 320D2-Mod 2013.
- Anexo 6.** Documentación de Caterpillar 320D- Mod 2013.
- Anexo 7.** Documentación de Caterpillar 320GX-Mod 2022.
- Anexo 8.** Documentación de Caterpillar 320D2-Mod 2014.
- Anexo 9.** Inspección de botiquín y camilla.
- Anexo 10.** Inspección de extintores.
- Anexo 11.** Inspección CAT320D.
- Anexo 12.** Inspección CAT320D.
- Anexo 13.** Inspección CAT320gx
- Anexo 14.** Inspección CAT320D2-2014
- Anexo 15.** Inspección de volquetas
- Anexo 16.** Indicadores HSE.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

INDUCCIÓN DEL PERSONAL



REGISTRO DE INDUCCIÓN / RE-INDUCCIÓN AL PERSONA.

Código: SST-F-01

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

DIA	MES	AÑO
18	12	2025

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre Completo	José Rodrigo Ramírez Cantillo
Identificación	2950717
Jefe inmediato	Alberto Tejeda
Cargo	Operador

1. INFORMACION BASICA DEL SG-SST

Marcar con una X en las casillas que se va cumpliendo en el proceso de inducción

ITEM	DESCRIPCION	
1	Presentación de la empresa	✓
2	Reglamento interno de trabajo	✓
3	Perfil del cargo	✓
4	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
5	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
6	Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas	✓
7	Política de Prevención del acoso laboral	✓
8	Objetivos del SG-SST	✓
9	Funciones y responsabilidad en el SG-SST	✓
10	Mecanismos de participación, comunicación y consulta	✓
11	Procedimientos de trabajos seguro y formatos pertinentes	✓
12	Matriz de Peligros, Riesgos y Controles	✓
13	Matriz de Requisitos Legales en SST y otros	✓
14	Programas de Gestión del SG (Prioritarios, PVE, Promoción y Prevención)	✓
15	Planes de Emergencia	✓
16	Vigía SST o COPASST	✓
17	Comité de Convivencia Laboral	✓
18	Brigadas de Emergencia	✓
19	Procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras	✓
20	Procedimiento de reporte de accidentes e incidentes de trabajo	✓

Firma del responsable del SG-SST

2. INFORMACION DEL PUESTO DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	
1	Perfil del cargo	
2	Procedimientos del cargo	
3	Responsabilidades del cargo	
4	Formatos/ registros	

Firma de jefe inmediato

José Ramírez
Firma del trabajador

Este registro es válido por un año tiempo después del cual debe recibir re-inducción.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6	
Versión 6		

LISTADO DEL PERSONAL



CONTROL DE PERSONAL DE OBRA



PROYECTO: REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO


ID	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO
CONTRATISTA			
1	Yesid de Jesus Barcasnegras Amor	73167715	Director de obra
2	Eduadro Alfonso Guzman	9178072	Residente de obra
3	Henry Alberto Santiago Oyuela	72005323	Ingeniero Ambiental
4	Andrian Josue Arroyo Arrieta	1193065301	Ingeniero de apoyo 2
5	Cesar Caro Pinilla	1140843698	Profesional PGIO
6	Alberto Carlos Tejera Higgins	1044392990	Ingeniero de apoyo
7	Jhoryella Arenales Lobo	1140871808	Profesional de calidad
8	Lizeth Carolina Maestre Bermudez	1065659538	Profesional Social
9	Karolain Fontalvo Quintero	1045731886	Profesional SST
10	Deivis de Jesus España Martinez	73377879	Cadenero
11	Humberto Rafael Escorcia Trejo	72233471	
OPERARIOS, VOLQUETAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
12	Jose Carlos Daza	9044508	Operador excavadora
13	Benjamin Fernando Morelo Correa	1003563237	Operador excavadora
14	Dairo Rafael Roca Martinez	1129488512	Operador excavadora
15	Roicer Alexander Cantillo Bohorquez	1044431656	Operador excavadora
16	Jose Rodrigo Ramirez Cantillo	2950717	Operador excavadora
17	Alvaro Segundo Montaña Berdugo	72151617	Supervisor Maquinaria

* ESTE FORMATO DEBE IR ACOMPAÑADO CON EL SOPORTE DEL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES

FIRMA PROFESIONAL SST

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

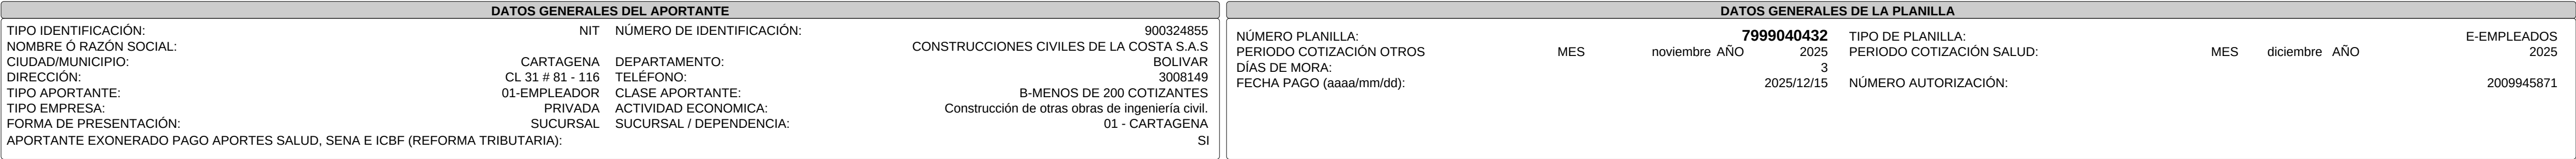


TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 0	\$ 911.200	\$ 1.800	\$ 913.000	
230201	230201- PROTECCION	4	\$ 706.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 706.200	\$ 1.400	\$ 707.600	
231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 964.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 964.400	\$ 1.900	\$ 966.300	
230301	230301-PORVENIR	11	\$ 2.316.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	\$ 0	\$ 2.316.000	\$ 4.400	\$ 2.320.400	
SUBTOTALES:										\$ 4.897.800	\$ 9.500	\$ 4.907.300	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 184.300	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 184.300	\$ 400	\$ 0	\$ 184.700
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 57.000	\$ 200	\$ 0	\$ 57.200
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 39.900	\$ 0	\$ 100	\$ 0	\$ 39.900	\$ 100	\$ 0	\$ 40.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 171.000	\$ 400	\$ 0	\$ 171.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 241.300	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 241.300	\$ 500	\$ 0	\$ 241.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 171.000	\$ 400	\$ 0	\$ 171.400
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 57.000	\$ 200	\$ 0	\$ 57.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 114.000	\$ 300	\$ 0	\$ 114.300
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 190.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 190.000	\$ 400	\$ 0	\$ 190.400
SUBTOTALES:													\$ 1.225.500	\$ 2.900	\$ 0	\$ 1.228.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			VALOR PAGADO	
	NOMBRE		NÚMERO	AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA		DESCUENTO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 2.130.900	\$ 2.130.900	\$ 4.100	\$ 0	\$ 2.135.000
SUBTOTALES:									\$ 2.130.900	\$ 4.100	\$ 0	\$ 2.135.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	6	\$ 207.100	\$ 400	\$ 207.500
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	18	\$ 1.018.400	\$ 2.000	\$ 1.020.400
SUBTOTALES:			\$ 1.225.500	\$ 2.400	\$ 1.227.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURO SOCIAL					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT					IBC
1	CC 1003563237	MORELO CORREA BENJAMIN FERNANDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1010124277	REUTER ANGLUO KATRIN RENATE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1042444516	PAREJO GARCIA EDUIN ALBERTO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	08	21																230301-PORVENIR	14	\$ 664.300	\$ 106.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 106.300	EPS037- NUEVA EPS	14	\$ 664.300	\$ 26.600	\$ 0	\$ 26.600	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	\$ 664.300		\$ 46.300	14	\$ 664.300	CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 26.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1044431656	CANTILLO BOHORQUEZ ROICER ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	24																	231001-COLFOND OS	7	\$ 332.150	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	7	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 13.300	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	\$ 332.150		\$ 23.200	7	\$ 332.150	CCF06-COMBARRANQUILLA	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1047400307	NAIZIR ALTAMAR ANGEL DE JESUS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

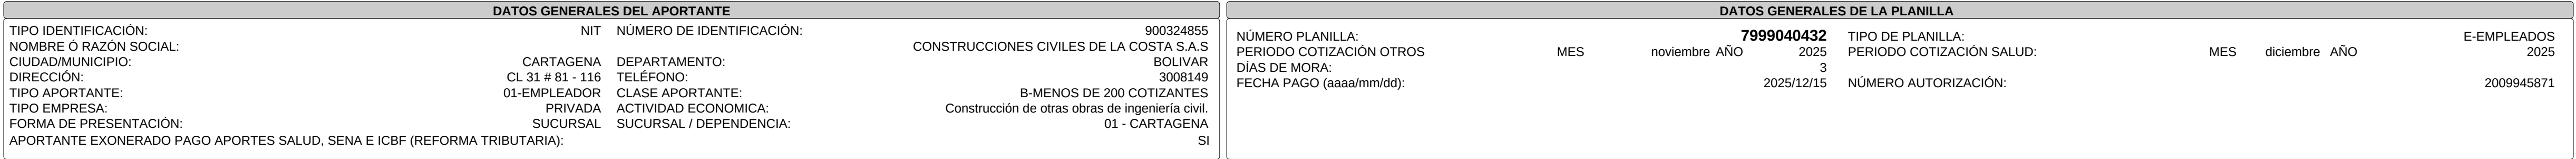

2025/12/15 3:56 PM USUARIO: SOI CC45593888

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901960293	8	CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 66 75 76		3156283321		CESAR.CARO@COTRAING.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35813612	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.578.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	35813612	2026-01-23	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 9178072	GUZMAN ARIAS EDUARDO ALFONSO	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.500.000	880.000	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	5.500.000	220.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.702.800	S	5711001
2	CC 72005323	SANTIAGO OYUELA HENRY ALBERTO	3.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.300.000	528.000	0	0	EPS SURA- EPS010	3.300.000	132.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	3.300.000	132.000	3.300.000	229.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.021.700	S	5711001
3	CC 72233471	ESCORCIA TREJO HUMBERTO RAFAEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS- 231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
4	CC 73167715	BARCASNEGRAS AMOR YESID DE JESUS	3.950.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	3.950.000	632.000	0	0	SANTAS- EPS005	3.950.000	158.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	3.950.000	158.000	3.950.000	275.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.223.000	S	5711001
5	CC 73377879	ESPAÑA MARTINEZ DEIBIS DE JESUS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	1.423.500	57.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
6	CC 1044392990	TEJERA HIGGINS ALBERTO CARLOS	5.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.300.000	848.000	0	0	EPS SURA- EPS010	5.300.000	212.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	5.300.000	212.000	5.300.000	368.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.640.900	S	5711001
7	CC 1045731886	FONTALVO QUINTERO KAROLAIN	2.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0	0	EPS SURA- EPS010	2.300.000	92.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5711001
8	CC 1065659538	MAESTRE BERMUDEZ LIZETH CAROLINA	2.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0	0	EPS SURA- EPS010	2.300.000	92.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5711001
9	CC 1140843698	CARO PINILLA CESAR AUGUSTO	2.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.200.000	352.000	0	0	EPS SURA- EPS010	2.200.000	88.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5711001
10	CC 1140871808	ARENALES LOBO JHORYELLA	4.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.400.000	704.000	0	0	EPS SURA- EPS010	4.400.000	176.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	4.400.000	176.000	4.400.000	306.300	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.362.300	S	5711001
11	CC 1193065301	ARROYO ARRIETA ANDRIAN JOSUE	5.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.300.000	848.000	0	0	EPS SURA- EPS010	5.300.000	212.000	COMBARRA NQUILLA- CCF06	5.300.000	212.000	5.300.000	368.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	1.640.900	S	5711001

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901960293	8	CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
8-1	CRA 66 75 76		3156283321		CESAR.CARO@COTRAING.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35813612	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.578.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	35813612	2026-01-23	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.397.000	37.397.000	37.397.000	37.397.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	5.983.600	0	0	0	5.983.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	859.800	0	0	0	859.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.584.000	0	0	0	1.584.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.312.000	0	0	0	3.312.000
EPS(Administradoras: 4)				11	1.496.000	0	0	0	1.496.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	7	1.004.000	0	0	0	1.004.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	2	277.000	0	0	0	277.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	158.000	0	0	0	158.000
ARP(Administradoras: 1)				11	2.603.200	0	0	0	2.603.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	2.603.200	0	0	0	2.603.200
CCF(Administradoras: 1)				11	1.496.000	0	0	0	1.496.000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	11	1.496.000	0	0	0	1.496.000
Gran Total					11.578.800	0	0	0	11.578.800



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, JOSE RODRIGO RAMIREZ CANTILLO identificado(a) con CC 2950717 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA LTDA - NI. 900324855	Fecha de inicio de cobertura: 18-12-2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5 Actividad Económica: 5711001

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 26 día(s) del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.
NIT. 800.011.553-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 320 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.
Bogotá | +57 (601) 810 8194 | Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.
Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autoregulación.

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Airap León - Ciénaga Totumo

TEMA: Manipulación manual de cargas

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA

FACILITADOR: Karolín Fontalvo

FECHA: 3/12/2025

HORA INICIAL: 7:10am HORA FINAL: 7:20am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Ing de Apoyo	<i>[Signature]</i>
2	1065608102	Eugen Pérez	Uso Ambiental	<i>[Signature]</i>
3	1003563237	Benjamin Moreno	operador	<i>[Signature]</i>
4	1.140.871.808	Joyells Le S.	prot. de calidad	<i>[Signature]</i>
5	73167915	Yeriel Barroniega	Director de obra	<i>[Signature]</i>
6	73.144.082	JOSE DAZA MOLINA	operador	<i>[Signature]</i>
7	72233471	Humberto Escobar	cadenero	<i>[Signature]</i>
8	73377879	Robis España	cadenero	<i>[Signature]</i>
9	1.140.843.698	Cesar Augusto Cavo P.	PGSD	<i>[Signature]</i>
10	1.065.659.538	Licth Macstric B.	Profesional social	<i>[Signature]</i>
11	9178072	Eduardo Guzman	Residente	<i>[Signature]</i>
12	1193065301	Andrian Arroyo	Ing apoyo 2	<i>[Signature]</i>
13	1044431656	Rolcer Cantillo	operador	<i>[Signature]</i>
14	72 005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	<i>[Signature]</i>
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Karolín F.
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León - Cienega Totumo

FECHA: 5/12/2025

TEMA: Uso correcto de EPP

HORA INICIAL: 10:00am HORA FINAL: 10:15am

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA ☒

FACILITADOR: Karolain Fatabo

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1.140.871.808	Thompson Arezales J.	Prof. de calidad	Thompson
2	1.140.843.698	Osar Caw Puulla	P650	Osar
3	10443929910	AIBERTO TEXERA HIGGINS	Ing de Apoyo	Alberto Higgin
4	1066608102	Elyen Perez Martin	Ing Ambiental	Elyen
5	9178072	Edcardo Gomez	Residente	Edcardo
6	1.065.659.538	Liceth Maestre B.	Profesional Social	Liceth B
7	73167915	Yenel Bascaynegra	Director de obra	Yenel B
8	1003563237	Benjamin Moreno	Operador	Benjamin M
9	72253471	Humberto Erosca	cadenero	Humberto E
10	1129488512	Dairo Martinez	Operador	Dairo M
11	7337879	Deivas Espinoza	cadenero	Deivas E
12	1044431656	Rocero Cantillo	Operador	Rocero Cantillo
13	77.144.082	Jose Daza Molina	operador	Jose Daza
14	72.005.323	Henny Santiago	Ing ambiental	Henny S
15	1103065301	Andrian Areyo	Ing apoyo	Andrian A.
16				
17				
18				
19				
20				

Karolain Fatabo
Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Ameyo ledn - Venaga tolimaFECHA: 9/12/2025TEMA: Orden y limpieza en el trabajoHORA INICIAL: 1:00pm HORA FINAL: 1:15pmTIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

CHARLA

FACILITADOR: Karolain Fontalva

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Ing de Apoyo	Alberto Tejera H
2	1193065301	Andrian Ameyo	Ing apoyo 2	Andrian A.
3	1044431656	ROICER Cantillo	Operador	Roicer Cantillo
4	1.140.871.808	Jhonells Ameyo S	prof. de calidad	Jhonells S
5	1140.843658	Cesar Cavo Puchka	P670	Cesar C
6	1066608102	Eyleen Perez M.	Ing Amb Instructor	Eyleen P
7	1003563237	Benjamin Moreno	Operador	Benjamin M
8	9178072	Eduardo Gomez	Residente	Eduardo G
9	1129488512	Dairo Martinez	Operador	Dairo M.
10	73167915	Yeriel Bascuñegros	Director de obra	Yeriel B
11	72.005.323	Henny Santiago	Ing ambiental	Henny S.
12	73.144.082	Jose Daza Molina	Operador	Jose Daza
13	73377879	Derlis Espinoza	cadenero	Derlis E
14	1.065.654.538	Liceth Maestre Barmdez	Profesional Social	Liceth M
15	72233471	Humberto Gironcia	cadenero	Humberto G.
16				
17				
18				
19				
20				

Karolain F.

Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León - Ciénaga Tolú

TEMA: Señalización y delimitación

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

CHARLA

FACILITADOR: Kardain Fontalvo

FECHA: 13/12/2025

HORA INICIAL: 2:30pm HORA FINAL: 2:45pm

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1066608102	Gulken Pérez	amb Interventor	Gulken P.
2	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M.
3	1.140.871.808	Jhonells Araya	prof de colab.	Jhonells A.
4	1140843658	Cesar Ciro Quintanilla	PEIU	Cesar C.
5	1044392990	ABERTO TEJERA HIGGINS	Ing de Apoyo	Aberto Tejera
6	9178072	Edwardo Gorman	Residente	Edwardo G.
7	73167915	Yesid Bouscarnegras	Director de obra	Yesid B.
8	1044431656	Roliver Cantillo	operador	Roliver Cantillo
9	72.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
10	1129488512	Dairo Martínez	operador	Dairo M.
11	73377879	Reibis Espinoza	cadenero	Reibis E.
12	1.065.659.538	Lizeth Maestre B.	Profesional Social	Lizeth M.
13	77233471	Humberto Escarcia	cadenero	Humberto E.
14	73.164.082	JOSE DAZA MOLINA	operador	JOSE DAZA
15	1193065301	Andrew Araya	Ing apoyo	Andrew A.
16				
17				
18				
19				
20				

Kardain F.

Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arraigo León - Ciénaga Totumo

FECHA: 16/12/2025

TEMA: Seguridad en Extracciones

HORA INICIAL: 10:30am HORA FINAL: 10:45am

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

CHARLA ☒

FACILITADOR: Kardain Fontellu

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1140.843.698	Cesar Augusto Caro Puilla	P610	
2	1.140.271.808	Shoyella Jul D.	prof de calidad	
3	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Iny de Apoyo	
4	1065608102	Elyken Perez M.	Iny Amba Intovar	
5	9178072	Eduardo Geyman	Residente	
6	1003563237	Benjamin Moreno	operador	
7	72.005.323	Henny Santiago	Iny ambiental	
8	1044431656	Roicer Cantillo	operador	
9	72233471	Humberto Escorcia	codinero	
10	73167915	Yeniel Basorunegras	Director de obra	
11	1129488512	Rairo Martinez	operador	
12	1103065301	Andrian Arayo	Iny apoyo	
13	73377879	Deibis Espora	codinero	
14	72.144.082	Jose DAZA Molina	operador	
15	1065.659.538	Liceth Maestre B.	Profesional social.	
16				
17				
18				
19				
20				

Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León - Ciénaga blanda
TEMA: uso de herramientas Manuales
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA ☒
FACILITADOR: Karolisa Fontalvo

FECHA: 18/12/2023
HORA INICIAL: 3:00pm HORA FINAL: 3:15pm

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1065608102	Liceth Mestric Bermudez	Ing. Interventora	Liceth Mestric
2	1065.659538	Liceth Mestric Bermudez	Profesional Social	Liceth Mestric
3	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
4	9178072	Edoardo Guzman	Residente	Edoardo G
5	1140-871-208	Shonyella Arenales J.	prof de calidad	Shonyella J.
6	1140-843698	Cesar Cano Rullia	P6TD	Cesar C
7	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Ing de Apoyo	Alberto Tejera
8	1044431656	Roliver Cantillo	operador	Roliver Cantillo
9	72.005.323	Henry Santiago	ing ambiental	Henry S.
10	73377879	Reibag Espinosa	codeniro	Reibag E.
11	73167915	Yesid Bascaynegra	Director de obra	Yesid B.
12	72233471	Humberto Escarcia	codeniro	Humberto E.
13	1129485512	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
14	1193065301	Andrian Arroyo	Ing apoyo 2	Andrian A.
15	2950717	Jose Rodrigo	Operador	Jose Romero
16				
17				
18				
19				
20				

Karolisa F

Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Aircep León- Ciénaga Totuma
TEMA: Seguridad en operación de maquinaria
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA ☒
FACILITADOR: Karolain Fontalvo

FECHA: 20/12/2025
HORA INICIAL: 3:00pm HORA FINAL: 3:10pm

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1066606102	Fylen Perez M	Ing Amb Intervent	Enk f3
2	112 9488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
3	1044431656	Roxer Cantillo	operador	Roxer Cantillo
4	1044392990	AIBERTO TEJERA HIGGINS	ING DE APOYO	Alberto Tejera
5	1.140813658	Oscar Corro Puello	POD	Oscar Corro
6	1.140.871.808	Jhoyells Lul S	prof de calidad	Jhoyells
7	1065.659.538	Liceth Maestre	profesional social	Liceth Maestre
8	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
9	9178072	Eduardo Guzman	Residente	Eduardo G
10	72005.323	Henry Santayo	Ing ambiental	Henry S.
11	73167915	Yenel Boucaneayron	Director de obra	Yenel B
12	7337879	Derlis Espora	cadenero	Derlis E.
13	72233471	Humberto Escorcia	cadenero	Humberto E.
14	2950717	Jose Ramirez	Operador	Jose Ramirez
15	1193085301	Andrian Ameyo	Ing apoyo 2	Andrian A.
16				
17				
18				
19				
20				

Karolain F.

Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Airap León - Cieneguita

FECHA: 23/12/2025

TEMA: Inspecciones de ejidos y herramientas

HORA INICIAL: 9:00am HORA FINAL: 9:15am

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA

FACILITADOR: Karolain Fontalvo

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1140843658	Cesar Caw Parilla	P6 PD	
2	1068609102	Eyleen Perez M.	Ing Amb Interu.	
3	2950712	José Romeros	Operador	
4	1044392970	ALBERTO TEJERA HIGGINS	ING DE APOYO	
5	1129498512	Dairo Martinez	operador	
6	9178072	Edvardo Gayman	Residente	
7	72.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	
8	1.540.871.808	Thayalla Arceval L	prof de calidad	
9	1044431656	Rolicer Cantillo	operador	
10	73167915	Yeriel Bascamnegron	Director de obra	
11	1003563237	Benjamin Moreno	operador	
12	73377879	Delos Espinoza	cadenero	
13	1193065301	Andrian Arago	Ing apoyo 2	
14	72233471	Humberto Escorcia	cadenero	
15	1065.659.538	Liceth Maestre B.	Profesional social.	
16				
17				
18				
19				
20				

Karolain J.
Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León - Ciénaga Loma

TEMA: Riesgos por vibración

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACION CHARLA ☒

FACILITADOR: Karolain Fontellu

FECHA: 26/12/2025

HORA INICIAL: 11:30am HORA FINAL: 11:45am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1065608102	Eileen Perez M.	Ing Amb inter.	Eileen P.
2	1.140.871.808	Shayella L. S.	prof de calidad	Shayella L.
3	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M.
4	1065.659538	Liceth Mestres B.	Profesional social	Liceth M.
5	1044392990	ALBERTO TEJERA	Ing DE Apoyo	Alberto T.
6	1044431656	Roliver Cantillo	operador	Roliver C.
7	1140843698	Osar Ciro Puella	P610	Osar C.
8	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
9	9178072	Edgardo Gayman	Residente	Edgardo G.
10	71233471	Humberto Escobar	cadenero	Humberto E.
11	2050717	Jose Ramon	Operador	Jose R.
12	73377879	Reiba Espinoza	cadenero	Reiba E.
13	77.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
14	1193065301	Andrian Arayo	Ing apoyo	Andrian A.
15	73167915	Yessid Bascuñegros	Director de obra	Yessid B.
16				
17				
18				
19				
20				

Karolain F.

Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Airap León- Ciénaga Totumo
TEMA: Fatiga laboral y personas activas
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA
FACILITADOR: Kardain Fontalvo

FECHA: 30/12/2025
HORA INICIAL: 4:00pm HORA FINAL: 4:10pm

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	917 8072	Eduardo Guzman	Residente	Eduardo G
2	1.065.659.538	Liceth Maestre B.	Profesional social	Liceth B.
3	1140.871.808	Shayella Araya J.	prof de calidad	Shayella A
4	1065602102	Eyleen Perez M.	Ing Amb Inter.	Eyleen P
5	13enjamn M	1003563237	Operador	Benjamin M
6	1044392990	ALBERTO TEJERA HIGGINS	Ing de Apoyo	Alberto H
7	1044431656	Rolcer Cantillo	Operador	Rolcer Cantillo
8	1140.843.698	Cesar Augusto Geo Pincha	PGSD	Cesar P
9	73167915	Yesael Boyeanegray	Director de obra	Yesael B.
10	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
11	72233471	Humberto Escorcia	codenero	Humberto E
12	2950717	Jose Ramon	Operador	Jose Ramon
13	72.005.323	Ammy Santiago	Ing ambiental	Ammy S.
14	73377879	Derlis Espina	codenero	Derlis E.
15	1193065301	Andrian Araya	Ing apoyo 2	Andrian A
16				
17				
18				
19				
20				

Kardain F.
Firma Responsable

Consortio Ambiental del Atlántico	<p>INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6</p>	
Versión 6		

DOCUMENTACIÓN CAT 320D2



TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.

RFC: 830.141.109-1

Carrera 7 # 156-78 Torre 2 Piso 12 - North Point

Teléfono: 2088900



TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. Certifica que el vehículo relacionado a continuación está dotado con PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA

Contrato:	03-195227		
Proyecto:	Particular	Fecha instalación:	19/oct./2023
Compañía Ordenadora:	Construcciones Civiles De La Costa Ltda		
Fecha:	21/may./2025		
Sistema:	PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA	Producto:	PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Identificación:	RFC	900324855
Nombre:	Construcciones Civiles De La Costa Ltda	
Dirección:	KR 81 A 31 210 URB NIRVANA CS 1 BR EL EDEN	
Teléfonos:	3108289391	Teléfonos 2: 3108289391
Email:	operacionesccltda@gmail.com	

DATOS DEL USUARIO (Usuario Habitual)

RFC:	900324855
Nombre:	CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA LTDA
Dirección:	KR 81 A 31 210 URB NIRVANA CS 1 BR EL EDEN
Teléfonos:	3008149177

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca:	CATERPILLAR	Color:	Amarillo
Clase:	EXCAVADORA	Modelo:	CATERPILLAR CONSTRUCCION 320D2
Placa:	MC009882	Año:	2014
Carrocería/Chasis:	CAT0320DCTMF00460	Motor:	D7A06183
Renovación Hasta:	28/nov./2025	Revisión Hasta:	01/dic./2025

DATOS DEL SERVICIO

Fecha instalación:	29/nov./2024	Fecha renovación:	28/nov./2025
Marca Dispositivo:	SKT300	IMEI:	863457050317393-
		Serial GPS:	191917
Empresa Operadora:	TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.	Serie M.A.:	TRKR00000000MC009882

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS:

El sistema monitoreo y gestión DETEKTOR GPS, es una herramienta que permite administrar y controlar vehículos, contando con una aplicación diseñada en la cual se visualiza la información transmitida de acuerdo al plan adquirido.
El sistema DETEKTOR CAZADOR, es diseñado para el rastreo y localización de vehículos hurtados. Nuestro servicio se apalanca en un equipo que transmite una señal de radio frecuencia con su propio ID, permitiendo su seguimiento, gracias a nuestra red de activación y detección única en el país.
Con DETEKTOR CAZADOR, podrá acceder a beneficios importantes en primas de hurto, ya que contamos con alianzas en las mayores aseguradoras del mercado.
El sistema DETEKTOR TELEMETRIA, es una tecnología que permite monitorear de manera remota y en tiempo real medidas de variables críticas de un proceso, almacenarlas, generar alertas y producir informes en forma automática.
La tecnología GPS instalada y aceptada por el SUSCRIPTOR, cumple con las condiciones técnicas que se fijan en el Artículo 2 de la Resolución N° 02086 del 30/05/14, en concordancia con el Decreto N° 723 del 10/04/14, la cual está sujeta a la cobertura de transmisión de acuerdo al plan escogido por el SUSCRIPTOR.



FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO AUTORIZADO

21/05/2025 14:09:28z





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 15903

Nº. DE REGISTRO
MC009882

MARCA
CATERPILLAR

LÍNEA
320D2

AÑO MODELO
2014

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
EXCAVADORA

Nº. SERIE
CAT0320DCTMF00460

COLOR(ES)
AMARILLO

Nº. MOTOR
D7A06183

RODAJE
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

19200 Kg

ALTO

2830 mm

ANCHO

2490 mm

LARGO

7610 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

HERRERA Y DURAN LTDA

IDENTIFICACIÓN

NIT 890.404.029

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

FECHA REGISTRO

21-10-2014

FECHA EXPEDICIÓN

23-05-2016

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

482014000417536

FECHA DE LEVANTE

11/10/2014



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000013446

**JOSE
JOSE**



DIAN

Privada

500

2014

Downloaded from ascelibrary.org by TUFTS UNIVERSITY on 06/01/15. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

4. <http://www.ck12.org>

482014000417536-5

[illegible]

Recherche Internet des 2014-2014 01:25:54

20140872160723

Consortio Ambiental del Atlántico	<p>INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6</p>	
Versión 6		

DOCUMENTACIÓN CAT 320D



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 99286

No. DE REGISTRO

MC034457

MARCA

CATERPILLAR

LINEA

320D

AÑO MODELO

2013

TIPO DE MAQUINARIA

CONSTRUCCION

CLASE

EXCAVADORA

No. SERIE

CAT0320DHFAL10408

COLOR(ES)

AMARILLO

No. MOTOR

GDC72782

RODAJE

ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

19200 Kg

ALTO

3050 mm

ANCHO

2800 mm

LARGO

9460 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA

IDENTIFICACIÓN

NIT 900.324.855

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

FECHA REGISTRO
26-02-2016

FECHA EXPEDICIÓN
10-06-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN
482013000435066

FECHA DE LEVANTE
25/10/2013



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000048108

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

DOCUMENTACIÓN CAT 320D2-2014



NWSEA

Declaración de Importación

Aceptación : 352022000077262-5
 Subartida : 8429520000

Página 1 de 2

Continuum of development from primary to tertiary markets, driven by

[illegible]

352022000077262-5



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 95210

No. DE REGISTRO
MC431298

MARCA
CATERPILLAR

SERIE
320CX

AÑO MODELO
2022

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
EXCAVADORA

No. OTIN
CAT632BJSYWF10418

COLOR/ES
AMARILLO

No. MOTOR
2V231B08

FLUIDO
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
18000 Kg

ALTO
3200 mm

ANCHO
2810 mm

LARGO
9600 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 800.903.938

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
ET PROYECTOS SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.546.455

LIBERTACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO
18-03-2022

FECHA EXPIRACIÓN
18-03-2022

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

IMPORTACIÓN 352022000077262

FECHA DE LEVANTE
16/02/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TMO7000020124

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

DOCUMENTACIÓN CAT 320GX



TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.

RFC: 830.141.109-1

Carrera 7 # 156-78 Torre 2 Piso 12 - North Point

Teléfono: 2088900



TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. Certifica que el vehículo relacionado a continuación está dotado con PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA

Contrato:	03-195227		
Proyecto:	Particular	Fecha instalación:	19/oct./2023
Compañía Ordenadora:	Construcciones Civiles De La Costa Ltda		
Fecha:	21/may./2025		
Sistema:	PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA	Producto:	PAQUETE DETEKTOR GPS ANUAL MAQUINARIA AMARILLA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Identificación:	RFC	900324855
Nombre:	Construcciones Civiles De La Costa Ltda	
Dirección:	KR 81 A 31 210 URB NIRVANA CS 1 BR EL EDEN	
Teléfonos:	3108289391	Teléfonos 2: 3108289391
Email:	operacionesccltda@gmail.com	

DATOS DEL USUARIO (Usuario Habitual)

RFC:	900324855
Nombre:	CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA COSTA LTDA
Dirección:	KR 81 A 31 210 URB NIRVANA CS 1 BR EL EDEN
Teléfonos:	3008149177

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca:	CATERPILLAR	Color:	Amarillo
Clase:	EXCAVADORA	Modelo:	CATERPILLAR CONSTRUCCION 320D2
Placa:	MC009882	Año:	2014
Carrocería/Chasis:	CAT0320DCTMF00460	Motor:	D7A06183
Renovación Hasta:	28/nov./2025	Revisión Hasta:	01/dic./2025

DATOS DEL SERVICIO

Fecha instalación:	29/nov./2024	Fecha renovación:	28/nov./2025
Marca Dispositivo:	SKT300	IMEI:	863457050317393-
		Serial GPS:	191917
Empresa Operadora:	TRACKER DE COLOMBIA S.A.S.	Serie M.A.:	TRKR00000000MC009882

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS:

El sistema monitoreo y gestión DETEKTOR GPS, es una herramienta que permite administrar y controlar vehículos, contando con una aplicación diseñada en la cual se visualiza la información transmitida de acuerdo al plan adquirido.
El sistema DETEKTOR CAZADOR, es diseñado para el rastreo y localización de vehículos hurtados. Nuestro servicio se apalanca en un equipo que transmite una señal de radio frecuencia con su propio ID, permitiendo su seguimiento, gracias a nuestra red de activación y detección única en el país.
Con DETEKTOR CAZADOR, podrá acceder a beneficios importantes en primas de hurto, ya que contamos con alianzas en las mayores aseguradoras del mercado.
El sistema DETEKTOR TELEMETRIA, es una tecnología que permite monitorear de manera remota y en tiempo real medidas de variables críticas de un proceso, almacenarlas, generar alertas y producir informes en forma automática.
La tecnología GPS instalada y aceptada por el SUSCRIPTOR, cumple con las condiciones técnicas que se fijan en el Artículo 2 de la Resolución N° 02086 del 30/05/14, en concordancia con el Decreto N° 723 del 10/04/14, la cual está sujeta a la cobertura de transmisión de acuerdo al plan escogido por el SUSCRIPTOR.



FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO AUTORIZADO

21/05/2025 14:09:28z





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 15903

Nº. DE REGISTRO
MC009882

MARCA
CATERPILLAR

LINEA
320D2

AÑO MODELO
2014

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
EXCAVADORA

Nº. SERIE
CAT0320DCTMF00460

COLOR(ES)
AMARILLO

Nº. MOTOR
D7A06183

RODAJE
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO

19200 Kg

ALTO

2830 mm

ANCHO

2490 mm

LARGO

7610 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

HERRERA Y DURAN LTDA

IDENTIFICACIÓN

NIT 890.404.029

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

FECHA REGISTRO

21-10-2014

FECHA EXPEDICIÓN

23-05-2016

FECHA VENCIMIENTO

ORIGEN

IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN

482014000417536

FECHA DE LEVANTE

11/10/2014



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000013446

**JOSE
JOSE**

Consortio Ambiental del Atlántico	<p>INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6</p>	
Versión 6		

INSPECCIONES DE BOTIQUINES Y CAMILLAS



MINISTERIO DE SALUD
C.R.A.
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN

FORMATO
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

CODIGO: 887-F-47

VERSION: 01

FECHA: 02/01/2025

Nombre de quien inspecciona:	Kardario Sotillo Q	Fecha de inspección:	15/12/2025
Ubicación del botiquín:	Cuando del turno	Ubicación camilla:	
Marque con una X según las condiciones observadas:			
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	✓	NO
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	✓	NO
Localizado en lugar visible?	SI	✓	NO
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	✓	NO

Buena	B	Regular	R	-	Mala	M	-	No tiene	NT	No aplica	NA
-------	---	---------	---	---	------	---	---	----------	----	-----------	----

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES								
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios		B	R	M	NT	NA	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓					5	
2	Gautes de látex / nitrilo	✓					1	
3	Lodopovidona solución	✓					1	
4	Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓					1	
5	Gasa estéril	✓					1	
6	Venda elástica	✓					1	
7	Tapabocas	✓					1	
8	Españadrapo micropore	✓					1	
9	Algodón	✓					1	
10	Curas	✓					1	
11	Bajalenguas	✓					1	
12	Parches oculares					✓		
13	Termómetro de mercurio o digital					✓		
14	Tijera trauma	✓					1	
15	Linterna	✓					1	
16	Alcohol acético	✓					1	
17	Tensiómetro					✓		

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlos (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA						
Descripción del elemento		B	R	M	NT	NA
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sujetadores para agente	✓				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Otras observaciones:



Otras observaciones:

Consortio Ambiental del Atlántico	<p>INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6</p>	
Versión 6		

INSPECCIONES DE EXTINTORES



INSPECCION DE EXTINTORES

CINCPAC-557-F-09

VERSION: 01

FHS2-M-07072025

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

CARGO: Inspector SST

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NT: NO TIENE N/A: NO APLICA

FECHA: 18/12/2025

HORA: 9:45am

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANÓMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANQUERA	BOQUILLA	MANGA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipropósito	Av. León	2016	06-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

OBSERVACIONES:

FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: *Karlaio F.*



INSTITUTO
REGISTRAL Y
CATRAL
C.R.A.

INSPECCION DE EXTINTORES

COORD. SST-F-28

VERSION: 01

FECHA: 03/07/2015

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karokain Fontalvo A.

CARGO: Inspector SST

FECHA: 19/12/2025

HORA: 3:00pm

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NT: NO TIENE N/A: NO APLICA

Nº	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR									OBSERVACIONES	
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANEJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO		VISIBILIDAD
1	<u>Multiproposito</u>	<u>Cuencpo Totumo</u>	<u>20lb</u>	<u>06-2026</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
OBSERVACIONES:															
FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCION: <u>Karokain F.</u>															


Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

INSPECCION DE VOLQUETAS



PCCA: 0000770079

Libero Mingo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
	STOP						✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDALES Y MANILLAS.					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDALES Y MANILLAS						✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS					✓		✓		✓		✓			
	REVERSA						✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (IMPEDIA, SIN ROTURA, SIN OPERACIÓN) LUBRICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD					✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, INFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓			
	SIN RUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNICO MECANICA						✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:																



REC'D: 03/09/2023

5: *Agave* M. *exalt.*[illegible]

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-12

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL:	22/12/2025	AL:	27/12/2025	PROTECTOR:	Arap León											
PLACA:	TUB 946	MODELO:	2015	OPERADOR:	Oscar Benitez	RESPONSABLE:	Karidán Finkler									
S: Buenos M: malo																
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNCIONAN	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HERILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PELDAÑOS Y MANILAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANILAS		✓		✓		✓				✓		✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDO A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Oscar B	Oscar B	Oscar B						Oscar B	Oscar B				
FIRMA INSPECTOR SST:			Karidán F	Karidán F	Karidán F						Karidán F	Karidán F				



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLUQUETA

College 551.F.12

VERSION: 01

FECNA 02/01/2005

SEMANA DEL: 29/12/2015
PLACA: TV6 946

AL: 02/1/2026
MODELO: 2015

PROYECTO:	Arraigamiento
OPERADOR:	Orlando Benitez

RESPONSABLE: Karbin Fontalvo

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
	STOP		✓		✓		✓									
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDALOS Y MANILLAS.	✓		✓		✓									
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓									
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓									
	ESTADO DE PEDALOS Y MANILLAS		✓		✓		✓									
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS	✓		✓		✓									
	REVERSA		✓		✓		✓									
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓									
	RETROVISOR		✓		✓		✓									
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	DEBE ESTAR EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓									
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓									
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓									
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓									
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓									
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓									
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓									
	EXTINTOR		✓		✓		✓									
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓									
	REVISIÓN TECNOMECANICA		✓		✓		✓									
FIRMA OPERADOR:			García		García		García		García		García					
FIRMA INSPECTOR SST:			Karchin		Karchin		Karchin		Karchin		Karchin					



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL: 3/12/2025
PLACA: TVB 947

AL: 6/12/2025
MODELO: 2015

PROYECTO: Arrap León
OPERADOR: Eduardo Alvarez

RESPONSABLE: Karolain Fariello

B: bueno M: malo

B. DATOS DE: FECHA																	
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS					✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓				
	STOP						✓		✓		✓		✓				
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PELDAÑOS Y MANEJOS.					✓		✓		✓		✓				
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓				
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON						✓		✓		✓		✓				
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANEJOS						✓		✓		✓		✓				
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS					✓		✓		✓		✓				
	REVERSA						✓		✓		✓		✓				
ESPEJOS	LATERALES DERECHA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD					✓		✓		✓		✓				
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓				
LIMPIA BRIGAS	DERECHA/ ATRAS	PLUNILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓				
ELANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD DE CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm					✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓				
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓				
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION						✓		✓		✓		✓				
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓				
	SIN FUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME					✓		✓		✓		✓				
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓				
DOCUMENTADO ON	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓				
	REVISION TECNOMECANICA						✓		✓		✓		✓				
FIRMA OPERADOR:																	
FIRMA INSPECTOR SST:																	

Eduardo A. Alvarez
Karolain Fariello

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TVB 947

MODELO: 2015

OPERADOR: Edmundo Alvaréz


RESPONSABLE: Karolín Fontalvo

El buque Mi moto

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y	✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON	AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, Peldaños	✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE Peldaños Y MANIJAS	Y MANIJAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR	NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PULMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR	EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Edmundo A. Alvaréz						Karolín F. Fontalvo							
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolín F. Fontalvo						Karolín F. Fontalvo							



FECHA: 01/07/2015.

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASEIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PELDAROS Y MANILLAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANILLAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:																



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLOQUETA

CSG-958-4.12

VERBODEN 31

REC'D: 01/07/2019

SEMANA DEL: 9/10/2005

AL: 13/12/2025

PROYECTO: Arroz Leche

PLACA: 116943

MODELO:	2015
---------	------

OPERADOR: Eduardo Alvarez

RESPONSABLE: Kardin Fortoliva

Re: Search to PM: initial

E. SANCHEZ / Rocio																	
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓						
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓						
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDAÑOS Y MANGAS.			✓		✓		✓		✓		✓				
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓						
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓		✓		✓						
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANGAS		✓		✓		✓		✓		✓						
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS			✓		✓		✓		✓		✓				
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)			✓		✓		✓		✓		✓				
	IZQUIERDA		✓		✓		✓		✓		✓						
LIMPIEZA	DEBAJO/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓				
GUARDA	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO (NO DEFORMADA), SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm			✓		✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓						
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓						
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓						
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓						
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME			✓		✓		✓		✓		✓				
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓						
DOCUMENTACION	SCAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓				
	REVISION TECNICO MECANICA		✓		✓		✓		✓		✓						
FIRMA OPERADOR:			Edmundo A. Echazabal / Edmundo A. Echazabal / Edmundo A. Echazabal / Edmundo A. Echazabal / Edmundo A. Echazabal														
FIRMA INSPECTOR SST:			Karhin F. Karhin F. / Karhin F. Karhin F. / Karhin F. Karhin F. / Karhin F. Karhin F. / Karhin F. Karhin F.														



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-12

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/07/2025

SEMANA DEL: 6/12/2025

AL: 6/12/2025

PROYECTO: Anillo León

PLACA: TV6 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andry Guzmán Rodríguez

RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CONTENIDOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBERILLAS. (LUBRICA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS)					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
	STOP						✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDAÑOS Y MANILLAS.					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS						✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS					✓		✓		✓		✓			
	REVERSA						✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (CORRECCIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)					✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, INDEFORMACIÓN, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2MM					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERIVANTE					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE FOLIOS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNICO MECANICA						✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:							Andry G		Andry G		Andry G		Andry G			
FIRMA INSPECTOR SSE:							Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

VERSION: 01

RECIN: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLAC: TV8 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andlys Goeman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolén Fortaluz Q

B: Bueno M: Malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO. VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANILLAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS		✓		✓		✓				✓		✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DCH/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DE/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
GLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SE SI VER FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LÍQUIDO HIDRÁULICO DIRECCIÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUÍN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Andlys G		Andlys G		Andlys G				Andlys G		Andlys G			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolén F		Karolén F		Karolén F				Karolén F		Karolén F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-12

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL: 8/12/2025

AL: 13/12/2025

PROYECTO: Airport León

PLACA: TUB 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andrys Guzmán Rodríguez

RESPONSABLE: Karolín Fontalvo Q.

8: turno M: noche

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCE	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP				✓		✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDAÑOS Y MANILLAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS				✓		✓		✓		✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA				✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DERECHOS	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR				✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRÁS	ILLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	Verificar Sin cortes, pinchaduras, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 3mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE				✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO				✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	ROTORUM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL ROTORUM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR				✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA				✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Andrys G.		Andrys G.		Andrys		Andrys G.		Andrys G.		Andrys G.			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolín F.		Karolín F.		Karolín F.		Karolín F.		Karolín F.		Karolín F.			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-12

VERSION: 01

FECHA: 06/07/2025

SEMANA DEL: 29/12/2025

AL: 2/12/2026

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TUB 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andys Guzman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolín Farblus Q.

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, (LIBERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIDAS)	✓		✓		✓						✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓						✓			
	STOP		✓		✓		✓						✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (BOMBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDALOS Y MANIJAS.	✓		✓		✓						✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓						✓			
	CITADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓						✓			
	ESTADO DE PEDALOS Y MANIJAS		✓		✓		✓						✓			
FRENOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS	✓		✓		✓						✓			
	REVERSA		✓		✓		✓						✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPieza, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓						✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓						✓			
LIMPIA BRISA	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓						✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓						✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓						✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓						✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓						✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓						✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓						✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓						✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓						✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓						✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓						✓			
	REVISION TECNICA/CAMICA		✓		✓		✓						✓			
FIRMA OPERADOR:			Andys G		Andys G		Andys G					Andys G		Andys G		
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolín F		Karolín F		Karolín F					Karolín F		Karolín F		



INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VOLUME 11

VOLUME 11

2019年11月29日

8-10 years: 1.5% (range 0-3%)

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-11
Versión: 01
Fecha: 02/02/2025

SEMANA DEL:	3/12/2025	AL:	6/12/2025	PROYECTO:	Arroyo León														
PLACA:	TUC 042	MODELO:	2015	OPERADOR:	Angel Nazari Altamir														
				RESPONSABLE:	Kardain Fontelo														
				B: bueno M: malo															
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS					✓		✓		✓		✓						
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓						
	STOP						✓		✓		✓		✓						
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDALIEROS Y MANILLAS.					✓		✓		✓		✓						
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓						
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON						✓		✓		✓		✓						
	ESTADO DE PEDALIEROS Y MANILLAS						✓		✓		✓		✓						
PITOS	FRONTAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS					✓		✓		✓		✓						
	REVERSA						✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS	LA DERECHA DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)					✓		✓		✓		✓						
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓						
LIMPIA BRIGAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm					✓		✓		✓		✓						
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓						
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓						
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓						
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION						✓		✓		✓		✓						
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓						
	SIN FUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓						
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DEBRAMÉ					✓		✓		✓		✓						
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓						
DOCUMENTACION	3CAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLITAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓						
	REVISION TECNOMECANICA						✓		✓		✓		✓						
FIRMA OPERADOR:																			
FIRMA INSPECTOR SST:			Angel Nazari Altamir Kardain Fontelo																



FILE# 010071025

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 361–367

[illegible]



REC'D-01/07/2025

B: buena M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP				✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDALEROS Y MANIJAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDALEROS Y MANIJAS				✓		✓		✓		✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA				✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR				✓		✓		✓		✓		✓			
LAMPARAS BRISAS	DERECHA/ATRAS	FLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE				✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO				✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE SERRAME			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR				✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA				✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Angel Navez													
FIRMA INSPECTOR SST:			Karlaín F													



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

Versión: 01

Fecha: 01/07/2020

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TVC 042

MODELO: 2015

OPERADOR: Angel Nazir Altamir

RESPONSABLE: Kordain Fortalvo

B: bueno M: male

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PULGONES Y MANGUERA.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PULGONES Y MANGUERA		✓		✓		✓				✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTO	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ.	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
ILANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LARRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR.	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORDONES		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DESEMBAQUE	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:			Kordain F	Kordain F	Kordain F				Kordain F	Kordain F						



FDC#A-01/07/2025

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
	STOP		✓		✓		✓									
REVISION INTERNA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR	✓		✓		✓									
	CINTURON DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON	✓		✓		✓									
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON	(HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDAÑOS Y MANGUAS.	✓		✓		✓									
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANGUAS		✓		✓		✓									
INTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTOS	✓		✓		✓									
	REVERSA		✓		✓		✓									
ESPEJOS	LATERALES DCH/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓									
	RETROVISOR		✓		✓		✓									
LIMPIA BRILLAS	DE/IZQ/ATRÁS	PLUQUILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓									
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN COSTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓									
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓									
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓									
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓									
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓									
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE PARRANDE	✓		✓		✓									
	EXTINTOR		✓		✓		✓									
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓									
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓									
FIRMA OPERADOR:			Angel Nieves		Angel Nieves		Angel Nieves									
FIRMA INSPECTOR SST:			Karthim F		Karthim F		Karthim F									

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

INSPECCION RETROEXCAVADORA CAT 320D2



MINISTERIO DE
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-13

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 3/19/2025

INSPECTOR: Jose Daza

AREA: Arraigo León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
FITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Jose Daza

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fontalvo



MINISTERIO DE
TRANSPORTE
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-P-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 5/12/2025

INSPECTOR: Jose Doraci

AREA: Arranque

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariña

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	SECUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FLUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: J. Doraci

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fariña



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-33

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 03

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 9/12/2025

INSPECTOR: Jose Dorado

AREA: Ataraje León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontelari

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NI: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	ILUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DIR/IZQ/ ATRÁS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Jose Dorado

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fontelari

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-12 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025			INSPECTOR: Jose Daza		
AREA: Arraig León			PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fombalio		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 300 D2		MODELO: 2014	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LOCADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN PURGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Daza					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobin F.					

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: IST-F-11 Versión: 01 Fecha: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Jose David			
AREA: Arraigal León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariño			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 300 D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LUZ ADICIONAL		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PI. MILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose David					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fariño					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: IST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/2025		INSPEC. OR: Jose Doraci			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VÍDEO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEBRACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRIGAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Doraci					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código SST-F-13		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025		INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme N/A: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER./ IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER./IZQ. ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Ramirez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-13	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/01/2025	
FECHA DE INSPECCION: 20/12/2025		INSPECTOR: Jose Rodolfo Ramirez			
AREA: Arrap León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Farfán			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Oxidador		MARCA: MT 320D2		MODELO: 2014	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VORIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIQUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHO/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: <i>Jose Ramirez</i>					
FIRMA DE RESPONSABLE: <i>Karolín Farfán</i>					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 23/12/2025

ÁREA: Arroyo León

INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELBDO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MÉCANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

José Ramirez

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain F

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>CENTRO REGISTRAL DE ARICA</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 26/12/2005		INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez			
AREA: Airap León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: MT-300 D2	MODELO: 2014		
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP			☒	
	LIQUADORA		☒		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURON DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIUECO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZD	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	FLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Ramirez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolén F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SSF-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: JORGE RODRIGO RAMIREZ			
AREA: Arroyo Leon		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	UCUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELUCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHA/IZQUIERDA ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: JORGE RAMIREZ					
FIRMA DEL RESPONSABLE: KARLAÍN FONTALVO					

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

INSPECCION RETROEXCAVADORA CAT 320D

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULATORIA DE ASISTENCIA</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSIÓN: 01	
				FECHA: 03/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 3/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
ÁREA: Cienaga Istmo		PERSONA RESPONSABLE: Karelito F. Fariña			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 300D		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforma NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP		☒		
	LUCIADORA		☒		
CABINA	ASENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARE Y TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURON DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLI MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			☒
	TRASERAS				☒
MÉCANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karelito F. Fariña					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SSF-F-11

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSIÓN: 03

FECHA: 02/02/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 5/12/2025

INSPECTOR: Benjamin Moreno

AREA: Cerro del Talamo

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fortino

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme SA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI GRABADO) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	FLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Benjamin Moreno

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain Fortino

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 03/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Aerodromo Toluca		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fendler			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karlaín Fendler					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD C.R.A.		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Carga Torero		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUECO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) Y UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontalvo					

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SSR-F-01	
FECHA DE INSPECCIÓN: 13/12/2025		INSPECTOR: Benjamín Moreno		VERSION: 03	
ÁREA: Carga Látex		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Jaramila		FECHA: 02/07/2025	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP		☒		
	LICUADORA		☒		
CABINA	ASENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamín Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Jaramila					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Genigra Totumo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontelva			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIQUILCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontelva					

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-23			
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01			
FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025		FECHA: 02/07/2025			
AREA: <u>Manejo Terreno</u>	INSPECTOR: <u>Benjamin Moreno</u>	PERSONA RESPONSABLE: <u>Karolina Fontello</u>			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: <u>excavadora</u>	MARCA: <u>CAT 320 D</u>	MODELO: <u>2013</u>			
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: <u>N/A</u>					
FIRMA DE OPERADOR: <u>Benjamin Moreno</u> FIRMA DE RESPONSABLE: <u>Karolina Fontello</u>					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-13 Versión: 03 Fecha: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 20/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Generador Torneo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Lombardo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUZ ADICIONAL		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIMUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Lombardo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-J-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 01/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 23/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Gerencia Técnica		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 D	MODELO: 20B		
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontalvo					

 C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE M. AQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION:	26/12/2025	INSPECTOR:	Benjamin Moreno		
AREA:	Canga Toleno	PERSONA RESPONSABLE:	Karolina Tonello		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO:	excavadora	MARCA:	CAT 320 D		
		MODELO:	2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELUCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: P/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolina Tonello		



MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSION: 06

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025

INSPECTOR: Benjamín Moreno

AREA: Cerroja Totumo

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Forbulo

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUZADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI DEFORMACION) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Benjamín Moreno

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

Karolén F

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

INSPECCION RETROEXCAVADORA CAT 320GX

SEGURO		C.R.A.		SEGURO		C.R.A.	
SEGURO				C.R.A.			
SEGURO				C.R.A.			
SEGURO				C.R.A.			
FECHA DE INSPECCION: 3/12/2025				INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Area 600				PERSONA RESPONSABLE: Karolyn Fortaluo			
EQUIPO: Excavadora				MARCA: CAT 320 EX			
				MODELO: 2022			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica							
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO				
			C	NC	NA		
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓				
	TRASERAS		✓				
	STOP		✓				
	LICUADORA		✓				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VEHICULO.	✓	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓				
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓				
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓				
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓				
	REVERSA		✓				
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓				
	RETROVISOR		✓				
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓				
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓		
	TRASERAS				✓		
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓				
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓				
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓				
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓				
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓				
	EXTINTOR		✓				
	KIT DE DERRAME		✓				
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓				
Observaciones: N/A							
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez							
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolyn F							

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
FECHA DE INSPECCION: 8/12/2025		INSPECTOR: Dario Martinez			
AREA: Arran leon		PERSONA RESPONSABLE: Karoben Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA				
CABINA	ASIEN TO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIEN TO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLAQUILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
FIRMA DE OPERADOR: Dario Martinez	FIRMA DE RESPONSABLE: Karoben F				

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: 557-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Martinez			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 EX		MODELO: 2022	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEBULLA DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Karlaín Fontalvo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Darío Martínez			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Darío Martínez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Ayacucho		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 EX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEOPRECIPITACION) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
UMPIA BRISAS	DEBAJO/ATRAS	PUJILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-14	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 03	
				FECHA: 02/07/2023	
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Martinez			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 EX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIJADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENNO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PELLICULA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F					



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025

INSPECTOR: Darro Martinez

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fariako

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 G

MODELO: 2022

C: conforme NC: no conforma NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
UMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR:

Darro Martinez

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Karobin F

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Versión: 01	
				Fecha: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MÁRCA: CAT 320 GX		MODELO: 2022	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUECO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHA/IZQUIERDA ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELLEROS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CILINDRADA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARRETERA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 23/12/2025

INSPECTOR: Dairo Martinez

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo

B. INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Osmadora

MARCA: B20 SX CAT

MODELO: 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ENCUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DELANTO/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL FLUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARCA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR:

Dairo Martinez

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Karolén F.

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-01	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 26/12/2025		INSPECTOR: Darío Martínez			
AREA: Arrasado		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalba			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEMS A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	D/LANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	CUADRO			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUECO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	D/LANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMINOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA C/JOHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL FLUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARRA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Darío Martínez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/05/2015	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arraigo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fonblau			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 GX	MODELO: 2017		
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LECUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEBILLO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERAZO/ ATRÁS	PLACA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA			
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME IMPLEMENTACION DEL SG- SST No. 6	
Versión 6		

INSPECCION RETROEXCAVADORA CAT 320D2-2014

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCIÓN: 3/12/2025		INSPECTOR: Rolcer Contillo			
AREA: Amop León		PERSONA RESPONSABLE: Karobén Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320 DII	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEULCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
RITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rolcer Contillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobén F					

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-13 Versión: 01 Fecha: 01/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 05/12/2025		INSPECTOR: Róger Cantillo			
ÁREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Fariña			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 DII		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO. VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Róger Cantillo			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Fariña		

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 03/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Rainer Contrillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolina Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 DH	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
FITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: NA					
FIRMA DE OPERADOR: Rainer Contrillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolina F.					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD C.R.A.		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01		FECHA: 03/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Rober Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 DH	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	UCUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rober Cantillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobin F.					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Pacer Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolyn Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320DII	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNCIONAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PAÑUELO TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Pacer Cantillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolyn F.					

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE AVIACIÓN</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/2025		INSPECTOR: Róger Castillo			
ÁREA: Aireop León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 320C-DH	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme I/R: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DEL OPERADOR: Róger Castillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Fontalvo					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-4-11

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 03/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 18/12/2025

AREA: Arroyo León

INSPECTOR: Róger Cantillo

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fariña

EQUIPO: excavadora

MARCA: CAT 320 D4

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme TA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Róger Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fariña



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 03/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/12/2025

INSPECTOR: Racer Cantillo

ÁREA: Arramp León

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 DH

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Racer Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain F

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-31 Versión: 01 Fecha: 02/07/2023	
FECHA DE INSPECCIÓN: 23/12/2023		INSPECTOR: Roxas Cantillo			
ÁREA: Aitaya León		PERSONA RESPONSABLE: Karoben Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 D4		MODELO: 2013	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP			☒	
	LIQUADORA		☒		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLAQUILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Roxas Cantillo FIRMA DEL RESPONSABLE: Karoben F					



C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 26/12/2025

AREA: Ancoy Leon

INSPECTOR: Rocio Cantillo

PERSONA RESPONSABLE: Karolena Cantillo

EQUIPO: Excavadora

INFORMACION DEL EQUIPO

MARCA: CAT 300 DH

MODELO: 20B

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARRILLAS, TEXTIL ENTRE OTROS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PL. MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Rocio Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolena Cantillo



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/12/2025

INSPECTOR: Racer Castillo

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fariello

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 DH

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACIÓN	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Racer Castillo






FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolén Fariello

Consortio Ambiental del Atlántico	<p>INFORME IMPLEMENTACION DEL SG-SST No. 6</p>	
Versión 6		

INDICADORES HSE

	MATRIZ DE AT y EL 2025 CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO				CODIGO: SST-MT-03														
					VERSION: 01														
					FECHA: AÑO 2025														
Objetivo: El Formato de Indicadores de accidentes de trabajo y ausentismo es una evidencia del Procedimiento para el reporte, investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades laborales; tiene como proposito realizar el análisis de los indicadores de accidentalidad y ausentiso con el fin de establecer las medidas de intervención necesarias: Estos indicadores tendran fundamento de																			
INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL 2020																			
MES	NUMERO DE TRABAJADORES	DIAS DE INACAPACIDAD			DIAS PROGRAMADOS AL MES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS MES	DIAS DE INACAPACIDAD	NUMERO DE ACCIDENTES	CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD LABORAL	CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL (Nuevos y antiguos)	INDICADORES								
		ENFERMEDAD COMÚN	ACCIDENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD LABORAL							AUSENTISMO POR CAUSAS MEDICAS	INDICE DE FRECUENCIA	SEVERIDAD ACCIDENTALIDAD	PROPORCION DE ACCIDENTES MORTALES	PREVALENCIA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA ENFERMEDAD LABORAL	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES	TASA DE ACCIDENTALIDAD	META
03 JUL- 02 AGO	12	0	0	0	27	2592	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,00
03 AGO- 02 SEP	18	0	0	0	24	3456	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,00
03 SEP- 02 OCT	21	0	0	0	26	4368	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,00
03 OCT- 02 NOV	25	0	0	0	25	5000	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,00
03 NOV- 02 DIC	23	0	0	0	24	4416	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,00
02 DIC- 02 ENE	17	0	0	0	23	3128	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,00
ACUMULADO	116	0	0	0	149	22960	0	0			0,00	0,0	0,00	#DIV/0!			0,00	0,0	



ANEXO 7. SEGUIMIENTO SOCIAL INTERVENTORIA

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025
CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA
INSPECCIÓN MENSUAL SOCIAL**

FECHA DEL PERIODO: 03 de diciembre de 2025 – 02 de enero de 2025						
1. INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO DE OBRA No.: 0281 de 2025					CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO.	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINAMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipios de Piojó y Puerto Colombia.						
FRENTE DE OBRA: Arroyo León – Ciénaga del Totumo						
INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA						
2. OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN						
Desde el componente social de esta interventoría, se realiza la verificación del cumplimiento del Plan de Gestión Social del Proyecto, asegurando que las acciones de participación ciudadana, socialización, atención a quejas, reclamaciones y manejo de conflictos se implementen de manera efectiva, oportuna y conforme a la normativa vigente y a los compromisos adquiridos con cada una de las comunidades interesadas.						
3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN INSPECCIONES ANTERIORES						
COMPROMISO					ESTADO	
N/A					N/A	
1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD						
Ítem	Eje Social	Si	No	N. A	Indique evidencia u Observación (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque
1	Reuniones de inicio			X	N-A.	Cumplido
2	Reuniones con líderes		X		N-A	Cumplido
3	Reuniones extraordinarias	X			Se realizaron dos reuniones informativas, requeridas para la continuación de la limpieza en arroyo León, estas fueron dirigidas e empleados de la ruta costera y proyecto alto lago, vía Puerto Colombia.	Cumplido
4	Reunión final de obra			X	N-A	N-A
2. DIVULGACIÓN						
5	Valla publicitaria	X			Se instalo en el inicio del proyecto	Cumplido
6	Volantes de información		X			N-A
7	Volantes de invitación			X	N-A	N-A


**CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025
CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA
INSPECCIÓN MENSUAL SOCIAL**

8	Oficios	X			Se realizó el envío de oficios sociales, referentes a solicitudes de permisos a predios, para continuar con el avance de obra.	Cumplido
9	Cartelera Informativas en el PAC			X	Se divulga de viva voz entre la comunidad	N-A
3 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE PREDIOS						
10	Levantamiento de actas de vecindad		X		N-A	N-A
4. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA						
11	Establecer un punto de atención comunitaria	X			km 7 Puerto Colombia	Cumplido
12	Atención y solución a las PQRS presentadas		X		En este periodo no se recepcionaron manifestaciones ciudadanas	Cumplido
13	Reuniones con los funcionarios de las alcaldías, e instituciones de servicios públicos.		X		N-A	N-A
5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.						
14	Charlas educativas			X		N-A
15	A personal de cuadrilla y administrativo			X	.	N-A
6. PROGRAMA VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA						
16	Contratación de mano de obra no calificada residente al área adyacente	x			se continua con el personal de MONC, vinculado en la Ciénaga el Totumo.	Cumplido
7. OBSERVACIONES ADICIONALES						
No. De ítemOBSERVACIONES						
En el desarrollo de la programación social, el contratista ha dado cumplimiento a cada uno de los programas sociales.						
9. LISTADO DE COMPROMISOS						
COMPROMISOSFECHA						
N/A						
CONTRATISTAINTERVENTORIA						



CONTRATO DE INTERVENTORIA 0280 DE 2025
CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA
INSPECCIÓN MENSUAL SOCIAL



 Nombre Liceth Maestre Bermúdez Cargo Residente Social Firma	 Nombre Eyleen Pérez Maestre Cargo Profesional Ambiental Firma
---	--

ANEXO 7. SEGUIMIENTO SOCIAL CONTRATISTA

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME MENSUAL No. 6	
Versión 1		

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL

CONTRATO 0281 DE 2025.

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



CONTRATISTA
CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO DEL (03/12/25) AL (02/01/26)

BARRANQUILLA – DICIEMBRE DE 2025

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME MENSUAL No. 6	
Versión 1		

Tabla de contenido

1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:	3
FRENTE CIÉNAGA DEL TOTUMO – PIOJO.	3
FRENTE ARROYO LEÓN - PUERTO COLOMBIA.	4
2. PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL	6
PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	6
PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	8
PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	9
PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA	11
- INDICADORES	12
2. CONCLUSIONES SOCIALES.	12
3. ANEXOS SOCIALES.	12

1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

El contrato de obra No. 0281 contempla la intervención en dos frentes de obra ubicados en los municipios de Puerto Colombia y Piojó, los cuales hacen parte del departamento del atlántico, los cuales se describen a continuación

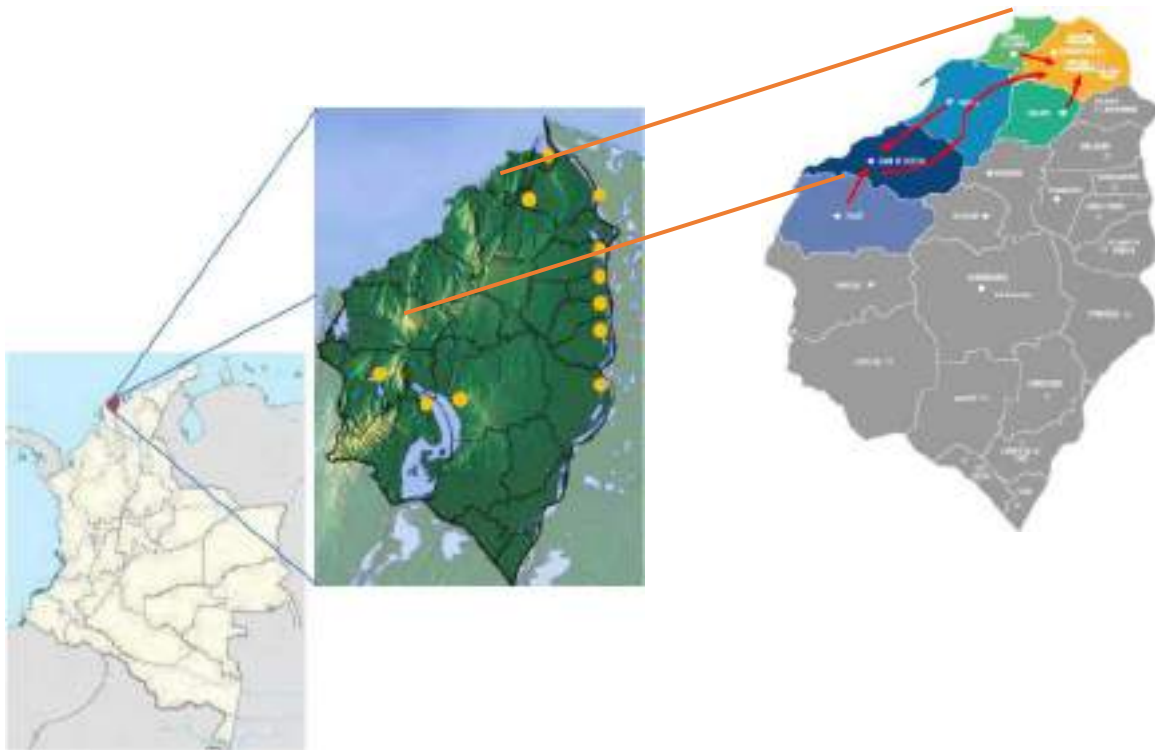


Ilustración 1 vista general departamento del Atlántico.

Frente Ciénaga del Totumo – Piojó.

La Ciénaga del Totumo se sitúa en el extremo sur del Atlántico, justo en la línea divisoria con el departamento de Bolívar, compartida entre los municipios de Piojó (Atlántico) y Santa Catalina (Bolívar), particularmente en los corregimientos de Loma de Arena, Pueblo Nuevo y Galerazamba.

La mayor parte del espejo de agua se ubica dentro de la jurisdicción del municipio de piojó y tiene un área aproximada de 1.200 hectáreas. La Ciénaga del Totumo es un cuerpo lagunar marino, pero también se retroalimenta del drenaje de arroyos provenientes de las colinas y cerros adyacentes.

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME MENSUAL No. 6	
Versión 1		



Ilustración 2 y 3. Vista general de zonas a intervenir dentro de la Ciénaga del Totumo

Frente Arroyo León - Puerto Colombia.

El arroyo León se encuentra localizado en el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, en la región Caribe colombiana. Este cuerpo de agua es un canal natural que recoge las aguas lluvias provenientes de las zonas altas del municipio y drena hacia el mar Caribe, cumpliendo una función ecológica e hidráulica importante para el entorno urbano y rural.

El recorrido del arroyo atraviesa sectores estratégicos del municipio, incluyendo áreas residenciales que, durante la temporada invernal, se ven afectadas por desbordamientos y procesos de erosión. Debido a esta problemática, se ha identificado la necesidad de intervenir técnicamente parte de su cauce para mitigar riesgos y mejorar las condiciones ambientales y de saneamiento del entorno.

La intervención se centrará específicamente en el tramo comprendido entre la carrera 51B y la vía Sabanilla – La Playa, zona que presenta condiciones críticas en cuanto al manejo de aguas pluviales y acumulación de sedimentos. Este segmento ha sido priorizado por su cercanía a zonas urbanizadas y su impacto directo en la infraestructura vial y la calidad de vida de la comunidad.



Ilustración 4. Ubicación y trazado del Arroyo León



Ilustración 5. Arroyo León, durante la intervención

2. PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Reunión informativa (ACTA 09)	El día 09 de diciembre se realizó reunión informativa, con el ingeniero Jairo Vergara de Ruta Costera, con el fin de informar a acerca de la limpieza del arroyo en los puentes ubicadas en la abscisa k280 y k320.
2. Reunión de socialización (ACTA 10)	El día 04 de diciembre de 2025 se realizó reunión de socialización del proyecto con Juan David Cabarcas. Director jurídico de alto Lago, en el desarrollo de la reunión se informaron las especificaciones del proyecto en esta zona específica del arroyo León.
3. Oficios sociales	<p>A continuación, se relacionan los oficios sociales enviados.</p> <p>1. CAA-39.12.2025 Solicitud de permiso e información para ejecución de limpieza Destinatario: Natalia Abello Gerente, Ruta Costera. Enviado: 09 diciembre 2025.</p>

- **REGISTRO FOTOGRAFICO**

Registro Fotografico- Informacion y comunicación – Divulgacion	
	
Ref. Reunión de socialización, Alto Lago.	Ref. Reunión de socialización, Alto Lago
	
Ref. Reunion Informativa, Ruta Costera.	Ref. Reunión Informativa, ruta costera.

- **INDICADORES**

SOCIALIZACIONES		
REALIZADAS	PROGRAMADAS	EFICIENCIA %
07	07	100%

PROGRAMA ATENCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Atención a la comunidad	Se continua con los canales de comunicación activos, por medio de los cuales se mantiene el contacto informativo con cada uno de los interesados en el proyecto. medios de comunicación oficiales: <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico: consorcioambientaladelatlantico@gmail.com - Línea telefónica: 3162267333
2.	En el desarrollo de este periodo, no se recibieron manifestaciones ciudadanas. A la fecha cada una de las PQRS, recepcionadas se encuentran cerradas.
3.	Durante este periodo, el consorcio Ambiental del Atlántico, realizo la donación de árboles a la comunidad del frente de obra de la Ciénega el Totumo. Cerrando a conformidad por parte de los beneficiarios.

- **Indicadores**

Tipología	SI (Solicitud Información)	R(Reclamos)	P(Peticiones)	Q(Quejas)	S(Sugerencias)
Solución	RP(Reparación)	I(Indemnización)	EV(Escrito, verbal)	D(Donación o servicio)	

Manifestaciones ciudadanas				
Periodo	PQRS atendidas	PQRS solucionadas	Eficiencia %	Eficiencia global %
03/08/2025 – 02/09/2025	2	2	100%	100%
03/09/2025 – 02/10/2025	1	1		
Total	3	3		

- Se anexa matriz de PQRS

Registro Fotográfico – Donación de árboles Ciénaga el Totumo



PROGRAMA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Permiso de ingreso a predio	<p>En el desarrollo de este periodo, se diligenciaron (3) tres permisos a predios en Arroyo león, los cuales se requirieron con la finalidad de aperturar el ingreso de maquinaria y personal a estas zonas. A continuación, se relaciona la información de los propietarios y encargados de predios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fecha: 03 diciembre de 2025 Nombre: Armando de la Rosa Ubicación: Vía Puerto Colombia. ✓ Fecha: 27 diciembre de 2025 Nombre: Wilson Antonio Marriaga Ubicación: km 30 vía prosperidad. ✓ Fecha: 27 diciembre de 2025 Nombre: Wilson Antonio Marriaga Ubicación: km 30 vía prosperidad

Registro Fotografico- permios de ingreso a predios.			
			
Ref. Permisos de Ingreso a Predio.		Ref. Permisos de Ingreso a Predio.	
			
Ref. Permisos de Ingreso a Predio.		Ref. Permisos de Ingreso a Predio.	
			
Ref. Permisos de Ingreso a Predio.		Ref. Permisos de Ingreso a Predio.	

Registro Fotografico- permisos de ingreso a predios.			
			
Ref. Permisos de Ingreso a Predio.		Ref. Permisos de Ingreso a Predio.	

- INDICADORES

PERMISOS A PREDIOS		
REQUERIDOS	FIRMADOS	EFICIENCIA %
11	11	100%

ACTAS DE VECINDAD		
VISITADOS	TOTALES	EFICIENCIA %
0	0	0%

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA	
Actividades Realizadas	Observaciones
1. Ingreso de personal	A la fecha de este corte se continua con la vinculación de un trabajador del área de influencia del frente de obra Ciénaga del Totumo, a la fecha este consorcio se encuentra a la espera del certificado de residencia, el cual ya fue solicitado a los lideres de esta zona. Además, se realizó la contratación mensual de una embarcación la cual está a disposición del proyecto,

	generando así, ingresos a la comunidad del área de influencia.
--	--

- INDICADORES

VINCULACION LABORAL		
CONTRATADOS	REQUERIDOS	EFICIENCIA %
01	01	100%

2. CONCLUSIONES SOCIALES

Durante el periodo evaluado se dio cumplimiento satisfactorio a las actividades sociales programadas, garantizando la correcta gestión de los permisos de ingreso a predios y el desarrollo de las socializaciones de avance de obra. Estas acciones permitieron mantener una comunicación clara y oportuna con los actores involucrados, fortaleciendo la confianza y el relacionamiento comunitario. En consecuencia, se contribuyó al desarrollo adecuado del proyecto, asegurando el respeto por los acuerdos establecidos y el acompañamiento social necesario para la continuidad de las actividades constructivas.

3. ANEXOS SOCIALES

- Acta N°9 reunión informativa
- Acta N°10 reunión de socialización
- Oficios sociales
- Permisos de ingreso a predios
- Matriz de PQRS



Proyectado por:
 Liceth Maestre Bermúdez
 Profesional social
 Consorcio Ambiental del Atlántico

Consortio Ambiental del Atlántico	ANEXOS INFORME 06	
Versión 1		

ACTA DE REUNIÓN 09 Y 10



ACTA DE REUNION		VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"		FECHA	09-12-2025

Número de acta:	09-11
Fecha:	09 Diciembre
Lugar:	Arroyo Leon 1
Municipio	Puerto Colombia
Tema	Socialización Limpieza de Puentes

OBJETIVO DE LA REUNION

Socialización Limpieza de Puentes

DESARROLLO: Se realiza reunión, en presencia del Señor Jairo Vergara, Coordinador de mantenimiento y Contratista de Obra, con el fin de socializar la limpieza de los puentes localizados en el tramo adicional del brazo auxiliar en arroyo Leon, Ubicados en las abscisas K 280 y K 320. En el desarrollo de la reunión se expone el proceso que hasta la fecha se lleva con el proyecto. El Ingeniero Jairo Vergara solicita que se envíe formalmente un oficio informativo de cada



una de las actividades a desarrollar por el
consorcio, y asimismo, iniciar la Supervisión del
mismo. Se le explica al Ingeniero Vergara que dentro
del alcance está la limpieza y recolección de residuos
de los Cameros de Arroyo Leon 1 y 2, en las seis
tramos: Arroyo Leon 1, comprende desde los puentes
de la 46 hasta la Ciénaga de la prespectiva
Arroyo Leon 2/tramo auxiliar: comprende desde el
puente de papeles hasta el nacimiento del brazo Arroyo.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
/	/	/
/	/	/
/	/	/

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO



Asistentes:

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD/ROL/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
ALBERTO TEJERA HIGGINS	CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO	3104050980	
Jairo Vergara Suarez	Ruta Costera	310615408	
Liceth Carolina Mestre Bermudez	Profesional social Consorcio Ambiental del Atlántico	3162267333	
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/



FIRMAS

Por el CONTRATISTA

Nombre: ALBERTO TEJERA HIGGINS

Entidad / Empresa: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Cargo / Rol: RESIDENTE DE OSEA

Firma: [Signature]

Por la INTERVENTORÍA

Nombre: Manuel Rodríguez

Entidad: CONSORCIO Recuperación Hidráulica

Cargo / Rol: DIR INTERVENTORÍA

Firma: [Signature]



ACTA DE REUNION		VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"		FECHA	

Número de acta:	10
Fecha:	4 Diciembre 2025
Lugar:	Alto Lago Residencias
Municipio	Puerto Colombia.
Tema	Socialización del proyecto.

OBJETIVO DE LA REUNION	Socialización y compromisos de la limpieza del Arroyo León.
------------------------	---

DESARROLLO:	Se da reunión a reunión de socialización en presencia de la Interventora, Contratista y el Señor Juan David Cárdenas, Director Jurídico del Alto Lago. Se inicia la reunión con la Intervención del Señor Juan David, el cual se muestra o manifiesta conformidad con el proyecto y hace saber que se encuentran prestos a colaborar y facilitar el Proyecto de limpieza, Sin embargo requiere que se establezcan compromisos en referencia al Procedimiento del material, específicamente en el tiempo de disposición del material.
-------------	--



El Ingeniero Fabio Martínez y Alberto Telera Socializan técnicamente el proyecto y las actividades que se llevarán a cabo en la zona.

Teniendo en cuenta lo anterior se programa reunión para el día martes 9 de diciembre en presencia de otros funcionarios interesados. y de esta manera Proceder a la firma del permiso a Ingreso a Predio.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO
/	/	/
/	/	/
/	/	/

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO



Asistentes:

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD/ROL/ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Liceth Maestre	Consorcio Ambiental del Atlántico	3162207332	<i>[Signature]</i>
Juan P. Cabanas <i>[Signature]</i>	Alto Lago Residencia	3023899808	<i>[Signature]</i>
ALBERTO TEJERA HIGGINS	Consorcio Ambiental del Atlántico	3104050980	<i>[Signature]</i>
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

Consortio Ambiental del Atlántico	ANEXOS INFORME 06	
Versión 1		

OFICIOS SOCIALES



Barranquilla, 09 de diciembre de 2025

CAA-39.12.202

Señora
Natalia Abello
Gerente
Ruta Costera
Ciudad

REF.: Contrato de obra No. 0281 de 2025 - Objeto “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

Asunto: Solicitud de permiso e información para ejecución de limpieza

Respetada señora Abello:

Por medio del presente, me permito informar que se ha programado la realización de labores de limpieza en los puentes ubicados sobre la Cra 46 (vía al mar) en el sector papiros. Estas actividades se llevarán a cabo con el fin de evitar obstrucciones que puedan generar inconvenientes en el flujo de aguas. A continuación, se detallan los sectores donde se efectuará dicha intervención:

1. Arroyo León 1: tramo comprendido desde el puente de la Calle 46 hasta la Circunvalar de la Prosperidad.
2. Arroyo León 2: tramo comprendido desde el puente de Papiros hasta el nacimiento del brazo auxiliar



Correo: consorcioambientaldelatlantico@gmail.com

Dirección: Carrera 66 No. 75 – 76

Nit: 901.960.293 - 8



En el anterior esquema se detallan los puntos mencionados y que son el objeto de esta solicitud; Estas actividades serán ejecutadas por el Consorcio Ambiental del Atlántico, como operador, y la CRA en su calidad de entidad contratante.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que dichos puentes se encuentran bajo la jurisdicción de Ruta Costera, solicitamos respetuosamente el permiso correspondiente por parte de la concesionaria para adelantar las labores de limpieza. Asimismo, requerimos conocer el procedimiento, lineamientos y requisitos establecidos por la gerencia para la ejecución de este tipo de intervenciones.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus indicaciones para proceder conforme a lo estipulado por esa entidad.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO.

Realizó: Liceth Maestre Bermúdez – Profesional Social.

Aprobó: Eduardo Guzmán – Residente de obra.

Consortio Ambiental del Atlántico	ANEXOS INFORME 06	
Versión 1		

PERMISOS DE INGRESO A PREDIOS

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO



4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a Armando De La Rosa, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO, al predio ubicado en Via Puerto Colombia, con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: 03 de diciembre 2025

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Armando de la Rosa

Firma: Armando de la Rosa

Cédula 8.675.001

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PERMISO DE INGRESO A PREDIO	VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	FECHA	

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- Nombre completo: Armando de la Rosa Herrera
- Cedula: 8675001
- Domicilio: Carrera 73A # 91-83
- Teléfono(s) de contacto: 3013860567
- Correo electrónico: armando.de.la.rosa.herrera@gmail.com

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- Fecha estimada de inicio de trabajos: ____ / ____ / ____
- Duración estimada de los trabajos: _____
- Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ☒):
 - Localización, trazado, replanteo y control topográfico.
 - Ejecución de obra
 - Instalación de maquinaria o equipo
 - Limpieza para recuperación ambiental
 - Registro filmico y Fotográfico
 - Retiro y disposición final de residuos
 - Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO



Cedula _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Nombre: _____

Cargo _____

Firma: _____

Cedula _____

 <p>C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico</p>	<p align="center">CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO</p> <hr/> <p align="center">PERMISO DE INGRESO A PREDIO</p>	
--	---	---

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-2025-003

OBJETO: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- Nombre completo: Jose Gregorio Hernandez Guzman
- Cedula: 8 619 657
- Domicilio: Finca la Milagrosa
- Teléfono(s) de contacto: 323 467 0899
- Correo electrónico: _____

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- Fecha estimada de inicio de trabajos: 27 / 12 / 2025
- Duración estimada de los trabajos: Hasta 28 febrero
- Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):
 - ☐ Localización, trazado, replanteo y control topográfico. ✓
 - ☐ Ejecución de obra ✓
 - ☐ Instalación de maquinaria o equipo ✓
 - ☐ Limpieza para recuperación ambiental ✓
 - ☐ Registro filmico y Fotográfico ✓
 - ☐ Retiro y disposición final de residuos ✓
 - ☐ Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

	<p align="center">CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO</p> <hr/> <p align="center">PERMISO DE INGRESO A PREDIO</p>	
---	---	---

4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Por medio del presente, el/la suscrito/a José Hernández (En cargo),
 autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el
 CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO, al predio ubicado en
Km 30 - Finca la Nibagosa Catado Aracho, con la
 finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: 29 Diciembre 2025 / Km 30

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: José Hernández

Firma: José Hernández

Cedula 8 649 657

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: ALBERTO TEJERA HIGGINS

Cargo INV. DE Apoyo

 <p>C.R.A. Corporación Ambiental Regional del Atlántico</p>	<p>CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO</p> <hr/> <p>PERMISO DE INGRESO A PREDIO</p>	 <p>CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO</p>
--	---	--

Firma: 

Cedula 1044 392990

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Nombre: Manuel Rodríguez

Cargo Dir. Interventoría

Firma: 

Cedula 8.726 301



PERMISO DE INGRESO A PREDIO	VERSION	01
OBJETO: "REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	FECHA	27/12/2020

1. DATOS DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

- Nombre completo: Wilson Antonio Pimiento Mamaga (Encargado)
- Cedula: 3725148
- Domicilio: Km 30 Vía Prosperidad
- Teléfono(s) de contacto: 301 744 1984
- Correo electrónico: _____

2. ESPECIFICACIONES DE LA OBRA EN EL PREDIO

- Fecha estimada de inicio de trabajos: 27 / 12 / 2025
- Duración estimada de los trabajos: 2 meses.
- Tipo de actividades a realizar en el predio (marcar con ✓):
 - Localización, trazado, replanteo y control topográfico. ✓
 - Ejecución de obra ✓
 - Instalación de maquinaria o equipo ✓
 - Limpieza para recuperación ambiental ✓
 - Registro filmico y Fotográfico ✓
 - Retiro y disposición final de residuos ✓
 - Otro (especificar): _____

3. OBSERVACIONES DEL PROPIETARIO DEL PREDIO (OPCIONAL)

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO
4. DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO



Por medio del presente, el/la suscrito/a Wilson Amienta Marriaga, autoriza el ingreso del personal técnico, operativo o administrativo relacionado con el CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO, al predio ubicado en Km 30 Vía prosperidad., con la finalidad de realizar las actividades descritas en este formato.

Declaro que otorgo mi consentimiento libre e informado para dicho ingreso.

Lugar y fecha: Km 30 Vía Puerto Colombia. / 27 diciembre 2025.

FIRMA DEL PROPIETARIO

Nombre: Wilson Amienta Marriaga

Firma: [Firma manuscrita]

Cedula 3725142

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre: Alberto Tejera Higgins

Cargo Ingeniero Civil

Firma: [Firma manuscrita]

CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO



Cedula _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Nombre: Manuel Rodríguez

Cargo: Dir. Interventoría

Firma: Manuel Rodríguez

Cedula 8.726.301.

Consortio Ambiental del Atlántico	ANEXOS INFORME 06	
Versión 1		

MATRIZ DE PQRS

MATRIZ DE PQRS														
N° de consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					P	Q	R	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
01	05/08/2025	L.M.C y Sociedad S.A.S. Propietario de predios Arroyo León	Km 7, Vía Pto Colombia	Solicitud de anulación de permiso a ingreso a predio en arroyo León, otorgado con anterioridad al consorcio Ambiental del Atlántico.				1	El Consorcio da por anulado el permiso otorgado y se inicia proceso con la familia para continuar con las actividades requeridas en el predio.				1	05- 08-2025
02	28/08/2025	L.M.C y Sociedad S.A.S. Propietario de predios Arroyo León	Km 7, Vía Pto Colombia	La familia, sugiere que se lleven a cabo una serie de condiciones para otorgar el permiso de ingreso a predio. Se anexan documentos en los que se exponen los requerimientos.				1	se realiza reunión en la modalidad virtual, en la cual se realiza la socialización del proyecto y se oficializa el permiso de ingreso a predio.					05- 09-2025
03	04/09/2025	L.M.C y Sociedad S.A.S. Propietario de predios Arroyo León	Km 7, Vía Pto Colombia	Informan que la maquinaria ingreso a su predio sin previa autorización de su parte.		1			El consorcio responde que efectivamente si hubo un ingreso advirtario de la máquina, debido a, un error de comunicación con el operador, pero que no se realizaron actividades y que de manera inmediata fue retirado del predio. Esta respuesta se envió por medio de correo electrónico en el oficio CAA-20.09.2025					04- 09-2025
Total						1		2					3	

Tipología R Reclamo; P Petición; Q Queja; S Sugerencia

Solución RP Reparación; I Indemnización; D Donación o servicio; E/V Escrita/verbal


OBSERVACIONES

Consortio Ambiental del Atlántico	ANEXOS	
Versión 1		



FIRMA PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA

Nombre: Liceth Maestre Bermúdez



Vo Bo INTERVENTORIA

Nombre: Fabio Martínez Yancy

ANEXO 8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERVENTORIA

FORMATO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDAS EN EL PMA DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PERIODO REPORTADO: del 03 de diciembre de 2025 al 02 de enero del 2026

FECHA DE INSPECCIÓN: 03 de enero de 2026

CONTRATO DE OBRA No.: 0281 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLANTICO

OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIÉNAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

del Arroyo León Atraviesa zonas urbanas y rurales del municipio de Barranquilla y sus alrededores. Su influencia directa se da en las áreas por donde cruza el cauce y donde se realizarán actividades de limpieza, recuperación y manejo de residuos. Afecta directamente cuerpos de agua como la Ciénaga de Mallorquín, por lo que también se considera parte del AID.

Ciénaga el Totumo es un ecosistema estratégico compartido entre los departamentos del Atlántico y Bolívar, donde se adelantarán acciones para mejorar la circulación del agua (hidrodinámica). Esta zona incluye cuerpos de agua, humedales y caminos rurales que serán intervenidos o podrían verse impactados directa o indirectamente. Las acciones sobre su hidrodinámica afectan de manera inmediata su equilibrio ecológico, por lo que todo su entorno acuático y terrestre cercano forma parte del área de influencia directa del proyecto.



Arroyo León



Ciénaga del Totumo

2. OBJETIVO

Llevar a cabo el seguimiento a las medidas de manejo ambiental definidas en los programas de manejo ambiental formulados por el Contratista de Obra en el Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad de prever, controlar y mitigar la generación de efectos adversos en el área de influencia del proyecto.

3. INSPECCIÓN GENERAL

Se debe diligenciar marcando con una "X" según corresponda en cada uno de los requerimientos descritos a continuación, de igual manera diligenciar los datos adicionales requeridos:

Información ambiental general asociada al proyecto sujeta de inspección	Si	No	NA	Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
Indicar el número de trabajadores en obra que se encuentran laborando durante el periodo reportado	X			Relación lista de personal en obra	Si
				Inspección en obra	Si
				Otros:	
¿Se requiere de licencia Ambiental para la ejecución del proyecto?		X		En caso de requerirse, especificar:	
¿El proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental y/o documento equivalente para el manejo y control de impactos ambientales?	X			Plan de manejo ambiental aprobado	Si
¿El Contratista de Obra dispone del personal encargado para la implementación del PMA en la Obra?	X			Indique Nombre Nombre:	
¿El Contratista de Obra cuenta con un cronograma de charlas y/o capacitaciones?	X			Cronograma de capacitaciones	Si
¿Se llevan a cabo charlas y/o capacitaciones al equipo de trabajo relacionadas con temáticas ambientales?	X			Lista de asistencia de capacitaciones	Si
				Registro Fotográfico de capacitación	Si
¿El Contratista de Obra dio a conocer al equipo de trabajo el alcance y las medidas de manejo a realizar en la obra mediante una jornada de socialización?	X			Lista de asistencia	Si
¿El Contratista de Obra cuenta con los insumos, materiales didácticos, personal, y recursos disponibles para la implementación del PMA?	X			Registros fotográficos	Si
¿Se encuentran ubicados en obras puntos ecológicos (canecas) para la disposición adecuada de los residuos sólidos generados?	X			Registros fotográficos	Si

4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN INSPECCIONES ANTERIORES						
COMPROMISO				ESTADO		
<ul style="list-style-type: none">• Instalación de puntos ecológicos acorde al código de colores establecidos en la resolución 2184 del 2019• Jornadas de orden y aseo• Desarrollo de capacitaciones y Charlas diarias en temas ambientales				CUMPLE		
5. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL DEFINIDOS EN EL PMA						
5.1. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HABITAT						
MEDIO BIÓTICO						
Objetivo: Minimizar los impactos ocasionados por la presencia del proyecto sobre la fauna y flora que habitan la zona circundante.						
Meta: Sensibilizar e informar al 100% del personal vinculado al proyecto acerca de la importancia de adoptar actitudes y comportamientos que promuevan la conservación de las especies silvestres						
Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) X 100 (1X1)*100= 100% (No. de especies encontradas / No. De especies trasladadas) x 100% (0/0)*100% = 0% Nota: Durante este periodo el contratista continua sin realizar traslado de especies, pero si se realizaron ahuyenta miento de fauna existente en la obra mediante sonidos fuertes y con ayuda de la maquinaria que generaba vibración en el agua.	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si



En el periodo mencionado en este informe, el contratista realizó capacitaciones ambientales que fomentaron sensibilización y conciencia sobre la gestión ambiental. Algunos temas mencionados fueron el almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, conservación de fauna y flora, control de la calidad del aire y la implementación de medidas de control ambiental. Se encuentra anexo el control de capacitaciones.

Durante el período evaluado, el contratista llevó a cabo actividades continuas de capacitación ambiental dirigidas al personal técnico y operativo vinculado al proyecto “Intervención del Arroyo León y la Ciénaga del Totumo”, involucrando a operadores de maquinaria, auxiliares de campo y demás miembros del equipo de obra, con el fin de fortalecer el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos.

5.2. PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA Y PROGRAMA DE REVEGETACIÓN

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Proteger la flora existente en el Área de Influencia directa e indirecta.

Meta: Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de flora

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas /No de capacitaciones programadas) $\times 100$ $(2/2) \times 100 = 100\%$ Nota: Hasta la fecha se continua sin realizar intervención de especies forestales.	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si



5.3 PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES DE AIRE

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo:

Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la ejecución de la obra.

Controlar la generación de ruido y material en suspensión que se genere durante la ejecución de la obra.

Meta:

Capacitar al 100% del personal de obra en el manejo de los equipos y maquinaria y en el uso adecuado de los elementos de protección individual.

Revisar el 100% de los certificados de gases de los vehículos vinculados al proyecto

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 (2/2) *100=110% Nota: Se realiza capacitación del control de la calidad de aire	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si
2	((No de inspecciones realizadas/ No de inspecciones a realizar) x100%) (8/8) *100=100% Nota: Equipos en obra: 4 excavadoras, 4 volquetas Caterpillar 320D2- Mod 2014 Caterpillar 320D-Mod 2013 Caterpillar 320GX-Mod 2022 Caterpillar 320D2- Mod 2014 4 volquetas para el traslado del material: TVB-946 TVB-947 TVB-950 TVC-042 Nota: El contratista realiza las inspecciones a las 4 excavadoras (3 en arroyo y 1 en la ciénaga)	X			Registro de inspecciones y preoperacionales	Si

3	<p>(No de certificados vigentes/ No. total, de certificados) x100%</p> <p>$(4/4) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Nota: certificados correspondientes a la tecno mecánica de las 4 volquetas</p>			X	Certificados de tecno mecánica de las volquetas	NO
---	---	--	--	---	---	----

Durante el período evaluado, se dio continuidad a la revisión de la documentación legal de los equipos utilizados en la ejecución de las obras, incluyendo tarjeta de propiedad, certificado de compra y declaración de importación de las retroexcavadoras y volquetas vinculadas al proyecto. En este mismo período, se reportó la salida de material producto de las labores de limpieza hacia el sitio de disposición final, lo que implicó el uso de volquetas. En consecuencia, a dichos vehículos se les efectuaron las respectivas inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, verificando la disponibilidad y estado de los extintores, botiquines y las condiciones generales de operación de los equipos y vehículos

A continuación, se presenta la evidencia fotográfica.



5.4 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Realizar e implantar acciones necesarias para prevenir, controlar, corregir y mitigar los posibles impactos que se presenten o potencialicen procesos de erosión, sedimentación que puedan afectar el suelo

Meta: Capacitar al 100% del personal del proyecto sobre el uso del suelo
Disponer el 100% del material sobrante de excavación en sitios autorizados
Monitorear los metales del 100% del material a retirar

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de capacitaciones desarrolladas/No. de capacitaciones programadas) x 100% (1/1) *100=100% Nota: El contratista realizo capacitación del manejo del suelo	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si
2	(m3 de material dispuesto en sitio de disposición final / m3 de material total a generar durante la limpieza y recuperación ambiental del arroyo) * 100% (20.912/33.100 /*100= 62.88% Nota: El Volumen de 33.100 m3, es el volumen proyectado a generar y disponer en el sitio de disposición final durante toda la ejecución del proyecto en la limpieza y recuperación ambiental del arroyo, durante este mes no se generó material, por lo tanto, se mantienen los mismos volúmenes del mes anterior.	X			Registro fotográfico y tirillas de botadero	Si

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con el cargue, transporte y disposición final de los sedimentos extraídos en el frente de obra del Arroyo León, verificando que el material resultante fuera trasladado al relleno sanitario **Los Pocitos** de acuerdo con los procedimientos establecidos y en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Dichas actividades se encuentran debidamente soportadas mediante la documentación ambiental aportada por el contratista y anexa al presente informe. De manera complementaria, se constató la continuidad de las labores de reconfiguración de taludes, utilizando material proveniente de las actividades de limpieza y recuperación del arroyo que cumplía con las condiciones técnicas y ambientales requeridas, con el propósito de reducir procesos erosivos, prevenir la pérdida de suelo y mejorar la estabilidad de las márgenes intervenidas.

Asimismo, la interventoría verificó la culminación de las intervenciones ejecutadas en la **Ciénaga del Totumo**, específicamente en las actividades de retiro y acopio de cobertura vegetal invasora, orientadas a mejorar la dinámica hidrológica del sistema y favorecer los procesos de recuperación ambiental del ecosistema. La ejecución de estas acciones permitió optimizar la conectividad del flujo hídrico, disminuir la obstrucción del espejo de agua y restablecer las condiciones naturales de intercambio en la ciénaga, en concordancia con los objetivos de restauración ambiental establecidos para el proyecto



5.5 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Garantizar el manejo adecuado de los residuos líquidos generados en proceso constructivo, evitando la contaminación del agua

Meta: Monitorear el 100% de la calidad agua de los caños y/o arroyos, antes durante y después de la ejecución de las actividades.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de Capacitaciones programadas) X 100% (1/1)*100=100% Quejas de la comunidad por vertimientos líquidos = 0 Nota: durante este periodo no se presentan quejas por vertimientos por parte de la comunidad	X			Formatos de capacitaciones Registro fotográfico.	Si

Durante este mes se continúan prohibiendo los vertidos directos de las aguas contaminadas a los cuerpos de agua, por tal motivo se realizó la instalación de una cabina de baño en el frente de obra, la cual recolecta los residuos líquidos domiciliarios y estos son recogidos por un vector para luego disponer en sitios autorizados.



5.6 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente por el mal manejo y disposición final de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto

Meta:

Capacitar al 100% del personal del proyecto en el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales.
Clasificar el 100% de los residuos sólidos desde la fuente
Instalar 100% de los puntos ecológicos en obra
Aprovechar el 100% de los residuos reutilizables

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de puntos instalados/No de puntos a instalar) x 100% (1/1) *100=100% Nota: El contratista mantiene un punto ecológico en obra	X			Registro fotográfico.	Si
2	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 (1/1) *100=100% Nota: El contratista realizo capacitación de manejo de los residuos sólidos y líquidos	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si
3	(Volumen de residuos generados / Volumen de residuos con disposición segura) X 100 (0/0) *100=0% Nota: teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores, no se han generado grandes volúmenes de residuos, solo se han generado bolsas plásticas estas son recogidas por el contratista y llevadas a la oficina principal, con el fin de disponerlos y sean recogidos por la Triple A			X	Registro fotográfico, certificado de disposición final	NO



En el frente de obra del Arroyo León, el contratista implementó puntos ecológicos para la separación de residuos, conforme al código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019. Considerando que los volúmenes de residuos generados durante la ejecución de las actividades son bajos, se realiza su recolección diaria y posterior traslado a la oficina principal del proyecto, donde son entregados a la empresa de recolección de residuos de la ciudad. Cabe destacar que, debido a que el personal no realiza consumo de alimentos en el frente de obra, la generación de residuos orgánicos es mínima.

Por su parte, en el frente correspondiente a la Ciénaga del Totumo, dadas las condiciones de difícil acceso y la inexistencia de un campamento fijo debido a la ubicación del área de intervención, se adoptaron medidas específicas para asegurar una adecuada gestión de los residuos generados. En este sentido, el personal operativo y los operadores de maquinaria fueron capacitados en buenas prácticas de manejo de residuos, haciendo énfasis en la prohibición de su disposición en el área de trabajo. Adicionalmente, a cada operador se le suministró una bolsa plástica resistente destinada a la recolección de los residuos generados durante la jornada, los cuales son trasladados posteriormente a la oficina principal del proyecto para su disposición final en los puntos ecológicos establecidos.

Estas acciones contribuyen a mantener las condiciones de limpieza del área intervenida, prevenir posibles afectaciones ambientales sobre la ciénaga y garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto.

5.7 PROGRAMA DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS POR TRANSITO VEHICULAR

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Minimizar cualquier impacto adverso sobre la calidad del aire dentro del área de influencia directa del proyecto generado por el tránsito vehicular

Meta:

Capacitar al 100% del equipo de trabajo de la obra en el control de la calidad del aire y posibles contaminantes al medio ambiente derivado de las actividades de la obra

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 (1/1)*100=100% Nota: el contratista complementa este programa con el programa de emisiones atmosféricas de material particulados ya que se implementan las mismas inspecciones porque es la misma maquinaria.	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	Si
2	(No de inspecciones realizadas/ No inspecciones programadas) x 100% (4/4)*100=100% Nota: (4 Volquetas, 4 excavadoras, 4 inspecciones ambientales)	X			Formatos de inspecciones	SI
3	Numero de señales instaladas en buen estado / número total de señales instaladas) * 100% (6/6) x 100% = 100% Nota: Se instala señalización acorde a lo planteado en el área SST y PMT	X			Señalizaciones instaladas en obra	Si

Durante el período objeto de evaluación, el contratista efectuó la verificación de la documentación legal y operativa de los equipos y vehículos vinculados al proyecto, incluyendo la revisión de tarjetas de propiedad, declaraciones de importación, certificados de funcionamiento del sistema GPS y guías de movilización correspondientes a la maquinaria amarilla. En el caso de los vehículos de transporte, se constató la vigencia de la tarjeta de propiedad, el SOAT y la revisión técnico-mecánica. De manera complementaria, se llevaron a cabo inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), las cuales contemplaron la revisión de extintores, botiquines y las condiciones generales de operación de cada equipo y vehículo evaluado.

En relación con la movilidad, se verificó que tanto en el frente de obra del Arroyo León como en la Ciénaga del Totumo no se registra tránsito peatonal ni vehicular, dado que estas áreas no corresponden a zonas habilitadas para circulación. Sin embargo, debido a la presencia de una vía principal en el acceso al proyecto Arroyo León, se implementó señalización vertical de carácter preventivo con el fin de alertar a los usuarios de la vía sobre las maniobras asociadas a las actividades de obra. Adicionalmente, se dispuso de un palettero encargado de regular el flujo vehicular durante el ingreso y salida de las volquetas, contribuyendo a la seguridad vial del área de influencia y a la mitigación de los riesgos derivados de la operación.



5.8 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS LIQUIDOS Y MATERIALES

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente por el mal manejo y disposición final de los residuos líquidos generados durante el desarrollo del proyecto

Meta:

Capacitar al 100% del equipo de trabajo de la obra en el manejo adecuado de los residuos sólidos y/o líquidos
Instalar 100% de los baños móviles

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100 (1/1)*100=100% Nota: El contratista capacita al personal de las 4 retroexcavadoras y de las 4 volquetas	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	NO
2	(No de baños instalados / No de baños a instalar) x 100% (1/1)*100=100% Nota: no se presentan vectores en el área de trabajo.	X			Registro fotográfico. Certificado de disposición de residuos líquidos	Si

Durante el período evaluado, la interventoría verificó que el contratista continúa haciendo uso de una cabina sanitaria en el frente de obra del Arroyo León, con el propósito de garantizar una adecuada gestión de los residuos líquidos de tipo doméstico y proporcionar condiciones sanitarias apropiadas al personal de obra. Se constató que la empresa proveedora de la cabina es responsable de realizar las actividades de mantenimiento y disposición final de los residuos generados. Adicionalmente, se evidenció que en la oficina central del proyecto se dispone de servicios sanitarios, a los cuales se les efectúan mantenimientos periódicos para asegurar su correcto funcionamiento.

En el frente de obra correspondiente a la Ciénaga del Totumo, y considerando las condiciones operativas, de acceso y la ausencia de un campamento fijo en el área de intervención, no se cuenta con la instalación de una cabina sanitaria. No obstante, la interventoría corroboró la implementación de medidas alternativas de control sanitario, tales como la planificación de jornadas de trabajo en tiempos definidos, con el fin de garantizar condiciones mínimas de salubridad y un manejo adecuado de los residuos líquidos domiciliarios.

Así mismo, durante la ejecución del proyecto se encuentra prohibido el lavado de maquinaria y equipos en los frentes de obra, situación que fue reiterada por el contratista al personal operativo. La interventoría verificó que, durante las actividades, se enfatiza a los operadores la importancia de la protección de los ecosistemas y la prevención de la generación de residuos que puedan ocasionar contaminación ambiental.



5.9 PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos

Meta:

Capacitar al 100% del equipo de trabajo en obra sobre el manejo de las maquinarias, equipos y vehículos.

Realizar el 100% de las inspecciones de control.

El 100% de los vehículos utilizados en el proyecto deberán contar con los equipos de prevención y seguridad reglamentados.

El 100% de los vehículos utilizados en el proyecto deberán contar con los certificados de emisión de gases, SOAT, revisión técnico-mecánica.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. de trabajadores capacitados / No. Total de trabajadores en transporte) X 100 (8/8)*100=100% Nota: Se capacita a todo el personal de obra pero para este indicador solo aplica el personal de las 4 retroexcavadora	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	NO
2	(No. de vehículos con tecnomecanica / No. Total, de vehículos usados) X 100% (4/4)100=100% Nota: Se revisa con apoyo del área SST en las inspecciones y revisión de la documentación de la maquinaria			X	Registros de mantenimiento y/o inspecciones.	NO

En relación con el desplazamiento de los vehículos vinculados al proyecto, tales como volquetas y camionetas, la interventoría constató que el responsable de logística del Consorcio asigna las rutas de movilización y verifica que cada vehículo cuente con tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes. Esta documentación es revisada y validada por los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del componente ambiental antes del inicio de las actividades, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y de seguridad aplicables.

Adicionalmente, se evidenció que de manera diaria, previo al inicio de las labores, se realizan inspecciones preoperacionales a los equipos y vehículos, en conjunto con la profesional de SST, con el objetivo de verificar su estado operativo y permitir la programación oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran.

5.10 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTO EN OBRA

MEDIO ABIÓTICO

Objetivo: Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal de obra.

Meta:

Capacitar al 100% del personal del proyecto sobre el uso de las instalaciones temporales del proyecto.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No. De campamentos a instalar/No. De campamentos instalados) x 100% 1/1*100=100% Nota: El contratista instala una carpa en la zona del campamento, este se va moviendo según el lugar de las actividades	X			Registro fotográfico.	Si

Durante el período evaluado, se adecuó un campamento en el frente de obra Arroyo León, el cual cuenta con carpa para atención de emergencias dotada con botiquín, camilla y extintor. Asimismo, se dispusieron puntos ecológicos, cabinas sanitarias y mobiliario básico para el personal. El área fue complementada con señalización informativa y preventiva, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, orden y atención en el frente de obra.



5.11 PROGRAMA DE REGEVETACION

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Proteger la flora existente en el Área de Influencia Directa e indirecta.

Meta:

Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de flora

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1) X 100% = 100%	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	SI

2	<p>No de individuos a sembrar / No individuos sembrados X100%</p> <p>(500/500) X 100% = 100%</p> <p>Nota: los especímenes sembrados hacen parte de una donación realizada por el consorcio a la comunidad con el fin de ayudar en la mejora del ecosistema interno de la ciénaga, estos fueron distribuidos en distintas zonas de acuerdo con el conocimiento de los pescadores y comunidad</p>	X			Registro fotográfico	SI
---	--	---	--	--	----------------------	----

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, el proyecto Arroyo León no contempla dentro de sus obligaciones ambientales la siembra de nuevas especies vegetales; sin embargo, se prevé la ejecución de actividades de siembra en caso de que estas sean requeridas como medida de manejo ambiental.

No obstante, la interventoría verificó la realización de una jornada de siembra de mangle, la cual se llevó a cabo como una acción voluntaria orientada a la restauración y fortalecimiento del ecosistema. Dicha actividad contó con el apoyo de personal de la zona, fomentando la participación de la comunidad local, así como la adquisición de los individuos vegetales a través de la asociación de pescadores del área de influencia.





5.12 PROGRAMA DE RESTAURACION PAISAJISTICA

MEDIO BIÓTICO

Objetivo: Proteger la flora existente en el Área de Influencia Directa e indirecta.

Meta:

Capacitar al 100% del personal de obra en mecanismos de protección de flora

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1) X 100% = 100% Nota: Este programa no aplica durante este periodo	X			Registro Asistencia capacitación. Registro fotográfico.	NO

Durante el período evaluado, se mantuvieron acciones orientadas a la protección y conservación de la vegetación existente en el área de intervención del Arroyo León, mediante recorridos de seguimiento y jornadas de sensibilización al personal de obra. A la fecha, el proyecto no contempla actividades de siembra; no obstante, en caso de ser requeridas, estas se ejecutarán conforme a lo establecido dentro de la componente ambiental.

5.13 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION

MEDIO SOCIOECONOMICO

Objetivo: Mantener informada y atender el llamado de la comunidad para minimizar las falsas expectativas y por ende conflictos con la misma.

Meta:

Implementar un sistema que permita atender y dar respuesta a las inquietudes, dudas y quejas de manera oportuna al 100% de las situaciones que se genere con las comunidades del área de influencia del proyecto.

Informar de la comunidad y actores involucrados los avances en la ejecución del proyecto.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas) X 100% 7/7*100 = 100% Nota: En el presente periodo del informe, se da cumplimiento a la totalidad de las (7) socializaciones programadas inicialmente. Durante este periodo, se llevó a cabo la socialización pendiente con la familia Carrascal, propietarios de un predio aledaño al proyecto.	X			Acta de reunión Registro fotográfico. Registros de asistencia.	Si
2	(No de Vallas instaladas / No vallas programadas) X 100 2/2*100 = 100% Nota: Se instalaron las dos Vallas del contrato	X			Volante informativo Valla informativa	Si

Reunión de socialización (ACTA 09)

Se reporta una reunión informativa con el ingeniero Jairo Vergara de **Ruta Costera** el 9 de diciembre de 2025 en el cual se informo acerca de la limpieza del arroyo en los puentes ubicados en la abscisa k280 y k320. Oficio presentado CAA-39.12.2025

Reunión de socialización (ACTA 10)

Se realizo reunión con el **director jurídico de Alto Lago**, Juan David Cabarcas, el día 04 de diciembre en donde se informaron sobre las especificaciones del proyecto en esta zona del arroyo León. Oficio presentado CAA-39.12.2025

Oficios sociales

A continuación, se relacionan los oficios sociales enviados.

1. CAA-39.12.2025

Solicitud de permiso e información para ejecución de limpieza

Destinatario: NATALIA ABELLO, GERENTE RUTA COSTERA

Enviado: 09 de diciembre de 2025

Registro Fotografico- Informacion y comunicación – Divulgacion



Ref. Reunión de socialización, Alto Lago



Ref. Reunión de socialización, Alto Lago



Ref. Reunión Informativa, Ruta Costera



Ref. Reunión Informativa, Ruta Costera

5.15 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Objetivo: Contratar personal de mano de obra calificada y no calificada de las zonas cercanas al proyecto.

Meta:

Vincular al 100% del personal no calificado que requiera la obra.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de personas contratadas/ No de personas requeridas) X 100%	X			Registro fotográfico personal de MOC	NO

5.15 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MEDIO SOCIOECONÓMICO

	1/1*100 = 0%					
	Nota: A la fecha solo se ha requerido una persona como mano de obra no calificada en la obra					

Con corte al presente período, se dio continuidad a la vinculación de mano de obra proveniente del área de influencia del frente Ciénaga del Totumo. Actualmente, el consorcio se encuentra a la espera del respectivo certificado de residencia, el cual ya fue gestionado ante los líderes comunitarios del sector. De igual manera, se llevó a cabo la contratación mensual de una embarcación para el desarrollo de las actividades del proyecto, lo que ha permitido fortalecer la participación local y generar ingresos directos a la comunidad del área de influencia.

5.16 PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Objetivo: Realizar levantamiento de actas de vecindad a los predios que se encuentren aledaños al área a intervenir.

Meta: Dejar registro 100% de los predios (viviendas, construcciones, servicios públicos) que se encuentren cerca del área del proyecto.

En el desarrollo de este programa se realizó el levantamiento de permisos a predios en el cual se especifican los datos de los mismos y así mismo permiten el ingreso al contratista a la ejecución de actividades.

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		
1	(No de permisos firmados / No de permisos requeridos) X 100 $11/11 \cdot 100 = 100\%$ Nota: Se da cumplimiento a la totalidad de los permisos a predios programados al inicio del proyecto	X			Formatos firmados por los propietarios de los predios	Si

Durante el período evaluado, la Interventoría verificó el diligenciamiento de tres (3) permisos de ingreso a predios localizados en el frente de obra Arroyo León, los cuales fueron gestionados por el contratista con el fin de habilitar el acceso de maquinaria y personal a las áreas requeridas para la ejecución de las actividades del proyecto.

De acuerdo con la documentación revisada, los permisos corresponden a los siguientes predios:

- Fecha: 03 de diciembre de 2025
Propietario: Armando de la Rosa
Ubicación: Vía Puerto Colombia.
- Fecha: 27 de diciembre de 2025
Propietario: Wilson Antonio Marriaga
Ubicación: Kilómetro 30, vía Prosperidad.
- Fecha: 27 de diciembre de 2025
Propietario: Wilson Antonio Marriaga
Ubicación: Kilómetro 30, vía Prosperidad.

La Interventoría constató que dichos permisos se encuentran debidamente diligenciados y permiten el desarrollo de las actividades previstas, garantizando el acceso legal y autorizado a los predios involucrados en el proyecto.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.

			
Ref. Permisos de Ingreso a Predio.		Ref. Permisos de Ingreso a Predio.	
			
Ref. Permisos de Ingreso a Predio.		Ref. Permisos de Ingreso a Predio.	

5.17 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Objetivo: Estar al pendiente de las inquietudes o dudas que manifieste la comunidad.

Meta:

Brindar respuesta dentro de los tiempos a todos los PQR que sean generados por la comunidad

Ítem	Indicador	Cumplimiento de Indicador			Indique evidencia (Registro fotográfico o documento soporte)	Marque (Si /No según sea el caso)
		Si	No	NA		

1	(No PQR solucionadas / No de PQR recepcionadas X 100% 3/3*100 = 0% Nota: Se da respuesta por parte de la interventoria	X			Formatos de respuestas de PQR	Si
2	(No de comités conformados / No de comités programados) X 100 0/0*100 = 0% Nota: no aplica durante este periodo			X	Actas de comités diligenciados	Si

Se continua con los canales de comunicación activos, por medio de los cuales se mantiene el contacto informativo con cada uno de los interesados en el proyecto.

medios de comunicación oficiales:

- Correo electrónico: consorcioambientaldelatlantico@gmail.com
- Línea telefónica: 3162267333

En el desarrollo de este periodo, cada una de las PQRS se encuentran cerradas. Se anexa matriz de PQRS

VER ANEXOS AMBIENTALES

CAPACITACIONES AMBIENTALES
CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
INSPECCIONES AMBIENTALES
DOCUMENTOS DE VOLQUETA
INSPECCIONES VOLQUETAS
INSPECCIONES RETRO
INSPECCIONES BOTIQUIN Y CAMILLA

ANEXOS SOCIALES (Ver informe social)

ACTA N°9 REUNIÓN INFORMATIVA
ACTA N°10 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN
OFICIOS SOCIALES
PERMISOS DE INGRESO A PREDIOS
MATRIZ DE PQRS

ANEXOS AMBIENTALES

CAPACITACIONES AMBIENTALES



INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES
C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y C/PACITACIONES

CODIGO 537-F-94

VERSION 01

FECHA

DATOS GENERALES

PROYECTO: Altop León - Chiriquí Tolumo
TEMA: Manejo de los residuos en obra
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA
FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 3/12/2025
HORA INICIAL: 8:30am HORA FINAL: 3:40am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1065659530	Liceth Maestre Bermudez	Profesional Social	Profesional 3
2	9178072	Edoardo Guzman	Residente	Edoardo G
3	73167915	Jesús Bascuñán	Director de obra	Jesús B
4	141843674	Rafael Luis Juilla	PRD	Rafael L
5	1644392940	Alvaro Texera	Ing apoyo	Alvaro T
6	73.144.081	Jose Daza Molina	Operador	Jose Daza
7	72.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S
8	1003563237	Benjamin Moreno	Operador	Benjamin M
9	1440371828	Thayella Lel	prof de calidad	Thayella L
10	1044431656	Rolker Cantillo	operador	Rolker Cantillo
11	72233471	Timoteo Escorcia	codinero	Timoteo E
12	73377879	Rolando España	codinero	Rolando E
13	1065604102	Gylen Perce	Ing Ambiental Inic	Gylen P
14	1193065301	Andrian Araya	Ing apoyo 2	Andrian A
15	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

COOQO: 557-F04

VERSION: 01

FECHA

DATOS GENERALES

PROYECTO: Ampliación - Mantenimiento
TEMA: Uso y ahorro del agua
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA ☐
FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 5/10/2025
HORA INICIAL: 11:00am HORA FINAL: 11:10am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	9178072	Edwardo Guzman	Residente	Edwardo G
2	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
3	1065659538	Liceth Maestre Bermudez	Prof. social	Liceth B
4	1068608102	Eileen Prazal	intervento.	Eileen P
5	7367915	Yesid Barcosegura	Director de obra	Yesid B
6	73144082	Jose Dnan Molina	operador	Jose Dnan
7	72733471	Arbeto Garcia	codenero	Arbeto G
8	1140843698	Desai Pava Aniba	P800	Desai P
9	1140871828	Shayella Araya S	mg de calidad	Shayella A
10	1193065301	Andres Prieto	Ing apoyo 2	Andres P
11	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
12	72.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
13	1044431656	Rocero Castillo	operador	Rocero Castillo
14	1044392990	Alberto Teyera	Ing apoyo	Alberto T
15	7337879	Reibis Espinoza	codenero	Reibis E
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-44

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arrap lech - Genaga TolmoFECHA: 13/12/2025TEMA: Condiciones al mango parrotulHORA INICIAL: 2:45pm HORA FINAL: 2:55pmTIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLAFACILITADOR: Henny Santiago

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1193065301	Andina Amayo	Iny arap 2	Andina A.
2	22005323	Henny Santiago	Eng ambiental	Henny S.
3	106560867	Eileen Paez d	Ing intern	Eileen P.
4	10441431656	Roliver Contrillo	operador	Roliver Contrillo
5	Cesar Cano Puylla CC 1140843658		P670	Cesar C.
6	1140871808	Shogella Arzola d	prof. de calidad	Shogella A.
7	33.144.082	Jose Dora Tolmo	operador	Jose Dora
8	7337879	Rebeca Espinoza	codenari	Rebeca E.
9	1065659.538	Luceth Maestre B	Profesora social	Luceth M.
10	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M.
11	72233471	Humberto Escobar	codenari	Humberto E.
12	9178072	Eduardo Guzman	Residente	Eduardo G.
13	1044392000	Alberto Tereza	Ing arap	Alberto T.
14	1129488	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
15	73167115	Yerald Barcenas	Docente de obra	Yerald B.
16				
17				
18				
19				
20				

Henny Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Proyecto Tecn - Ciénaga Tolima

FECHA: 16/12/2025

TEMA: Cuidado de la fauna

HORA INICIAL: 11:30am HORA FINAL: 11:40am

TIPO DE ACTIVIDAD: ☒ CAPACITACION ☐ CHARLA

FACILITADOR: Henry Santiago

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	9178072	Edoardo Guzman	Residente	Edoardo G
2	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
3	1110843658	Angel Caro Pineda	PGD	Angel C
4	1044392900	Alberto Tavera	Ing de grupo	Alberto T
5	1065608102	Glenn Forz	Log Int	Glenn F
6	1065654538	Leith Maestro Bermudez	Profesional Social	Leith M
7	72005323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S
8	1044431656	Rosier Cantillo	operador	Rosier Cantillo
9	1140871878	Manuel Angel de la Cruz	Ing de calidad	Manuel A
10	1193065301	Andrico Anaya	Ing civil 2	Andrico Anaya
11	73167915	Jesus Barrantes	Director de obra	Jesus B
12	73144082	Jose Daza Molina	operador	Jose Daza
13	72233471	Humberto Garcia	codinero	Humberto G
14	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
15	7337879	Rolando Espinal	codinero	Rolando E
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CÓDIGO: SST-F-44

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León - Ciénaga Tabma

TEMA: Abastecimiento de agua potable

FECHA: 18/10/2015

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

CHARLA

HORA INICIAL: 3:15pm HORA FINAL: 3:25pm

FACILITADOR: Henry Santiago

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	73167915	Yerald Bascuñenas	Director de obra	Yerald B.
2	1044302000	Alberto Fajera	Ing de apoyo	Alberto F.
3	1.140.871.808	Shayello Ayala	prof de calidad	Shayello A.
4	72233471	Humberto Escobar	codinero	Humberto E.
5	9178032	Edoardo Guzmán	Residente	Edoardo G.
6	1044431656	Rojer Cantillo	operador	Rojer Cantillo
7	8950717	José Ramiro	operador	José Ramiro
8	1129485512	Dairo Martínez	operador	Dairo M.
9	1.140.843.658	Pepe Pao Ruiz	P64V	Pepe P.
10	1.065.659.538	Liceth Maestre Bermúdez	Profesional social	Liceth M.
11	1065608107	Evelyn Pérez	ing Amb intr.	Evelyn P.
12	72.005.323	Henry Santiago	ing ambiental	Henry S.
13	1193065301	Andrés Araya	Ing apoyo 2	Andrés A.
14	1003563237	Benjamín Moreno	operador	Benjamín M.
15	73377879	Deibes Espinoza	codinero	Deibes E.
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

PROYECTO: Ampliación - Cerrado Nuevo
TEMA: Segregación Ambiental
TIPO DE ACTIVIDAD: ☒ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA
FACILITADOR: Henry Santiago

DATOS GENERALES

FECHA: 20/12/2025
HORA INICIAL: 3:10pm HORA FINAL: 3:20pm

DATOS DE LOS ASISTENTES				
ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	73167915	Yisel Bascarrigas	Directora de obra	
2	1.140.943.658	Cesar Cano Pualth	P650	
3	1003563237	Benjamin Moreno	operados	Benjamin M
4	1.140.871.808	Joselle Aguila S	prof de calidad	Joselle S
5	77.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S
6	1044431656	Rocel Cantillo	operador	Rocel Cantillo
7	9178022	Eduardo Guzman	Residente	Eduardo G
8	72233471	Humberto excoera	ordenero	Humberto E
9	1129485512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
10	1065654.538	Liceth Maestre B.	Profesional Social	Liceth B
11	1044392990	Martha Fejera	Ing arquitectura	Martha F
12	2950717	Jose Ramirez	Operador	Jose R
13	7357879	Dalys Espino	ordenero	Dalys E
14	1193085301	Andrian Araya	Ing apoyo 2	Andrian A
15	10660407	Gylcen Perez	ay inter	Gylcen P
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Amapachi - Ciénaga Tolima
 TEMA: Reservación de especies endémicas
 TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA
 FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 23/12/2023HORA INICIAL: 9:15am HORA FINAL: 9:25am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1140843658	Cesar Cao Puilla	PSO	
2	1044431656	Roliver Cantillo	operador	Roliver Cantillo
3	72005323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
4	1003563257	Benjamin Momo	operador	Benjamin M
5	1065659538	Licth Maestra Bermudez	Profesora Social	Licth M
6	5540871808	Shirley Arevalo	prot de calidad	Shirley A.
7	72233471	Humberto Escobar	codeney	Humberto E.
8	73167915	Yerid Boucannegon	Directora de obras	Yerid B.
9	1665608102	Eleen Perez	Ing. Inter.	Eleen P.
10	9178072	Eduardo Payman	Residente	Eduardo P.
11	73377079	Dorcas España	codinero	Dorcas E.
12	1193065301	Andrian Amaya	Ing. apogor	Andrian A.
13	2950717	José Ramirez	Operador	José R.
14	104430000	Shirley Jara	Ing. apogor	Shirley J.
15	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
 Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CÓDIGO SST-F44

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Anap Vch- Carga Tolero

TEMA: Manejo de Desechos sólidos

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA ☐

FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 26/12/2025

HORA INICIAL: 11:45am HORA FINAL: 11:55am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1065659538	Liceth McEstre Briz	Profesora Social	Liceth B.
2	72233471	Humberto Arango	cadenero	Humberto G.
3	134087188	Jorge Luis de la Cruz	prof. de salud	Jorge L.
4	1065602102	Eulcer Perez	Ing Ambiental	Eulcer P.
5	73167915	Jairal Bolcaynegua	Operador de obra	Jairal B.
6	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M.
7	1140813656	Pepo Caro Ruiz	PBTO	Pepo C.
8	72005323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
9	9178072	Edwardo Guzman	Residente	Edwardo G.
10	1044431656	Raicer Cantillo	operador	Raicer C.
11	2050717	José Ramírez	Operador	José R.
12	7337879	Rubén Espinoza	cadenero	Rubén E.
13	1193065301	Andrian Amaro	Ing civil	Andrian A.
14	112948512	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
15	1044582000	Alberto Tejera	Ing apaya	Alberto T.
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arrayo - Cuzco - Tarma
 TEMA: Control de contaminación del aire
 TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA
 FACILITADOR: Henny Santiago
 FECHA: 30/12/2025
 HORA INICIAL: 4:10pm HORA FINAL: 4:20pm

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1068608102	Cyteen Perez	Inq Amb Bot	Cyteen P
2	9178072	Eduardo Garman	Residente	Eduardo G
3	73577879	Deibis Espinoza	codonero	Deibis E
4	1193065301	Andron Araya	Inq apoyo	Andron A
5	1.140.843.675	Pesari Cano	PGSD	Pesari C
6	72233431	Humberto Escobar	codonero	Humberto E
7	8.340.871.808	Thonyello Arenah Soto	prof de calidad	Thonyello S
8	1044431656	Roliver Contrillo	operador	Roliver C
9	1044302000	Abelardo Tejeda	Inq apoyo	Abelardo T
10	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
11	73167415	Yeriel Bascunigra	Director de obra	Yeriel B
12	72.005.323	Henny Santiago	Inq ambiental	Henny S
13	2950717	Jose Roman	Operador	Jose R
14	1129488512	Dauro Martinez	Operador	Dauro M
15	1065659.538	Liceth Maestre Bermudez	Profesional Social	Liceth B
16				
17				
18				
19				
20				

Henny Santiago
 Firma Responsable

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO



EMPRESA

PROGRAMACIÓN DE ORDEN Y ASEO

CÓDIGO: F-MC-14-01

VIGENCIA: JULIO 03 de 2024

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 1

OBRA:				PERIODO:	3/dic/2025	AL:	2/ene/2026
SEMANA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (NOMBRE/ CARGO/ EMPRESA)	RECURSOS NECESARIOS	¿SE CUMPLE?		OBSERVACIONES	
				SI	NO		
01	Limpieza puntos ecologicos	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Bolsas de colores Recolector	X			
02	Jornada Orden y Aseo	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Limpiador Recolector Escoba	X			
03	Capacitación Manpower	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Video Bean, diapositivas	X			
04	Limpieza Campamento	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Recolector Bolsas	X			
05	Limpieza puntos ecologicos	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Bolsas de colores, Recolector	X			
DATOS	RESIDENTE DE OBRA		INSPECTOR HSEQ		RESPONSABLE AMBIENTAL		
NOMBRE	Alberto Tejera		Henry Santiago		Henry Santiago		
FIRMA							



INSPECCIONES AMBIENTALES

		EMPRESA			CODIGO: F-MC-10-28	
		INSPECCIÓN AMBIENTAL			VIGENCIA:	
					REVISIÓN: 1	PAGINA 1 DE 1
SEDE U OBRA:		Arrap León - Cienegras Tolono			FECHA DE INSPECCIÓN: 3/dic/2025 a 6/dic/2025	
CRITERIOS A INSPECCIONAR	CUMPLE			ACCIONES A TOMAR		
	SI	NO	NO APLICA			
1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?			X			
2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?	X					
3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?	X					
4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?	X					
5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?	X					
6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS?	X					
7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?	X					
8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?	X					
9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?			X			
10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS?			X			
11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.			X			
12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES?			X			
13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?			X			
OBSERVACIONES: N/A						
DATOS	RESPONSABLE DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN		RESPONSABLE DE LA OBRA		
NOMBRE	Henry Santiago	Henry Santiago		Alberto Teyera		
CARGO	Residente ambiental	Residente ambiental		Residente de obra		
FIRMA						



EMPRESA

INSPECCIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO: F-MC-10-26

VIGENCIA:

REVISIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1

SEDE U OBRA:

Amapa León - Cienega Tolima

FECHA DE
INSPECCIÓN:15/dic/2025 al
20/dic/2025

CRITERIOS A INSPECCIONAR

CUMPLE

SI

NO

NO
APLICA

ACCIONES A TOMAR

1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS
ASEADOS?

X

2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA
LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?

X

3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE
LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?

X

4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA
ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?

X

5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE
IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?

X

6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS
DEFINIDAS?

X

7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS
QUE PERMITAN REALIZAR ASECO?

X

8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA
ORDENADO Y ASEADO?

X

9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?

X

10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN
LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA
IDENTIFICADOS?

X

11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.

X

12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS,
PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE
COMBUSTIBLES?

X

13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?

X

OBSERVACIONES:

NA

DATOS

RESPONSABLE DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE

Henry Santiago

Henry Santiago

Alberto Tejera

CARGO

Residente ambiental

Residente ambiental

Residente de obra

FIRMA



EMPRESA

INSPECCIÓN AMBIENTAL

CODIGO: F-MC-10-26

VIGENCIA:

REVISIÓN: 1

PAGINA 1 DE 1

SEDE U OBRA:

Aisap León- Carapí Tolmo

FECHA DE
INSPECCIÓN:22/dic/2025 al
23/dic/2025

CRITERIOS A INSPECCIONAR

CUMPLE

SI

NO

NO
APLICA

ACCIONES A TOMAR

1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?
2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?
3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?
4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?
5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?
6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS?
7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?
8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?
9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?
10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS?
11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.
12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES?
13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?

OBSERVACIONES:

N/A

DATOS

RESPONSABLE DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE

Henry Santiago

Henry Santiago

Alberto Teyera

CARGO

Residente ambiental

Residente ambiental

Residente de obra

FIRMA



EMPRESA
INSPECCIÓN AMBIENTAL

CODIGO: F-MC-10-28

VIGENCIA:

REVISION: 1

PAGINA 1 DE 1

SEDE U OBRA:

Amop León - Ciénaga Tumo

FECHA DE
INSPECCIÓN:

29/dic/2023 a)
2/ene/2024

CRITERIOS A INSPECCIONAR

CUMPLE

SI NO NO
APLICA

ACCIONES A TOMAR

1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?

X

2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?

X

3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?

X

4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?

X

5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?

X

6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS?

X

7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?

X

8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?

X

9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?

X

10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS?

X

11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.

X

12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUcidas COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES?

X

13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?

X

OBSERVACIONES: N/A

DATOS

RESPONSABLE DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE

Henry Santiago

Henry Santiago

Alberto Tejeda

CARGO

Residente ambiental

Residente ambiental

Residente de obra


FIRMA

INSPECCIONES VOLQUETAS



PCCA: 0000770079

Libero Mingo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
	STOP						✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDALES Y MANILLAS.					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDALES Y MANILLAS						✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS					✓		✓		✓		✓			
	REVERSA						✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (IMPEDIA, SIN ROTURA, SIN OPACIDAD) LUBRICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD					✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, INFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓			
	SIN RUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNICO MECANICA						✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:																



REC'D: 03/09/2023

5: lower Mt. state

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUZES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS. CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL OINTURON (HERILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PELDAÑOS Y MANUAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRUCY AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANGAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPALD.	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ADOBE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BATIENTOS	DOR/DQZ ATRÁS	PLUMBILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
GUARDAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORRIEAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEMAN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEMAN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE SOBRANDE			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN ON	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SI ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TÉCNICA/CARGA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Karolain F Karolain F Karolain F Karolain F Karolain F													
FIRMA INSPECTOR SST:			Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Karolain F Karolain F Karolain F Karolain F Karolain F													

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-12

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL:	22/12/2025	AL:	27/12/2025	PROTECTOR:	Arap León											
PLACA:	TUB 946	MODELO:	2015	OPERADOR:	Oscar Benitez	RESPONSABLE:	Karidán Finkler									
S: bueno M: malo																
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNCIONAN	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HERILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PELDAÑOS Y MANILAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANILAS		✓		✓		✓				✓		✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDO A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Oscar B	Oscar B	Oscar B						Oscar B	Oscar B				
FIRMA INSPECTOR SST:			Karidán F	Karidán F	Karidán F						Karidán F	Karidán F				



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLUQUETA

College 551.F.12

VERSION: 01

FECNA 02/01/2005

SEMANA DEL: 29/12/2015
PLACA: TV6 946

AL: 02/1/2026
MODELO: 2015

PROYECTO:	Arraigamiento
OPERADOR:	Orlando Benitez

RESPONSABLE: Karbin Fontalvo

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
	STOP		✓		✓		✓									
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDALOS Y MANILLAS.	✓		✓		✓									
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓									
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓									
	ESTADO DE PEDALOS Y MANILLAS		✓		✓		✓									
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS	✓		✓		✓									
	REVERSA		✓		✓		✓									
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓									
	RETROVISOR		✓		✓		✓									
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓									
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓									
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓									
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓									
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓									
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓									
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓									
	EXTINTOR		✓		✓		✓									
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓									
	REVISIÓN TECNOMECANICA		✓		✓		✓									
FIRMA OPERADOR:			García		García		García		García		García					
FIRMA INSPECTOR SST:			Karchin		Karchin		Karchin		Karchin		Karchin					



FICHA: 02.052/1023

R: barren M: male

[illegible]



PCMA: 02/09/2025

B: Buena M: malo

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TVB947

MODELO: 2015

OPERADOR: Edmundo Alvaréz

RESPONSABLE: Karolán Fontalvo



El buque Mi moto

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, Peldaños Y MANIJAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE Peldaños Y MANIJAS		✓		✓		✓				✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRÁS	PULMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LÍQUIDO HIDRÁULICO DIRECCIÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSIÓN Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Edmundo A. Alvaréz						Karolán F. Fontalvo							
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolán F. Fontalvo						Karolán F. Fontalvo							



FECMA 01/07/2025

I: female M: male

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HERILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PELDAROS Y MANEJAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PELDAROS Y MANEJAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (UMPEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
UNIPNA BRIDAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMELA EN BUEN ESTADO, UMPEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECANICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			  													
FIRMA INSPECTOR SST:			  													



SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLUETA

CEC-95-0584, 12

WETTERSON: 31

RECEIVED: 01/07/2019

SEMANA DEL: 9/10/2005

AL: 13/12/2025

PROYECTO: Arroz Leche

PLACA: 106943

MODELO:	2015
---------	------

OPERADOR: Eduardo Alvarez

RESPONSABLE: Kordain Fortolun

Re: *Shaw v. Reno* - 11/2/99

E. BAKTO M: PAGO																	
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCEZ	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANEJAS.			✓		✓		✓		✓		✓				
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANEJAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS			✓		✓		✓		✓		✓				
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESPALDOS	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)			✓		✓		✓		✓		✓				
	RETROVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LIMPIEZA	DEBAJO/ ATRAS	PUMELA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓				
GUARDAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO (NO DEFORMADO, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm)			✓		✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FORMA DE VINCIONAMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME			✓		✓		✓		✓		✓				
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
DOCUMENTACIÓN	SGT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PISTAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓				
	REVISIÓN TECNICO MECANICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA OPERADOR:			Edmundo A. Echazabal, Edmundo A. Echazabal, Edmundo A. Echazabal, Edmundo A. Echazabal, Edmundo A. Echazabal														
FIRMA INSPECTOR SST:			Karibio F. Karibio F., Karibio F. Karibio F., Karibio F. Karibio F., Karibio F. Karibio F.														



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: 301-12

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/07/2025

SEMANA DEL: 6/12/2025

AL: 6/12/2025

PROYECTO: Anillo León

PLACA: TV6 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andry Guzmán Rodríguez

RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CONTENIDOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBERILLAS. (CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS)					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
	STOP						✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANILLAS.					✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS						✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS					✓		✓		✓		✓			
	REVERSA						✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (CORRECCIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)					✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, INDEFORMACIÓN, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2MM					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCIÓN						✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERIVANTE					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE FOLGAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TECNOCOMERCIAL						✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:							Andry G		Andry G		Andry G		Andry G			
FIRMA INSPECTOR SSE:							Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

VERSION: 01

RECIN: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLAC: TV8 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andlys Goeman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolén Fortino Q

B: Bueno M: Malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO. VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANILLAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS		✓		✓		✓				✓		✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DCH/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DE/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
PLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LÍQUIDO HIDRÁULICO DIRECCIÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUÍN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Andlys G		Andlys G		Andlys G				Andlys G		Andlys G			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolén F		Karolén F		Karolén F				Karolén F		Karolén F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-12

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL: 8/12/2025

AL: 13/12/2025

PROYECTO: Airport León

PLACA: TUB 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andys Guzman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolain Fontalvo Q.

8: turno M: noche

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCE	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP				✓		✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDAÑOS Y MANILLAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS				✓		✓		✓		✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA				✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DERE/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR				✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRÁS	ILLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	Verificar Sin cortes, pinchaduras, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 3mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE				✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO				✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	ROTORUM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL ROTORUM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR				✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA				✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR					Andys G		Andys G		Andys		Andys G		Andys G			
FIRMA INSPECTOR SST:					Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-1-12

VERSION: 01

FECHA: 06/07/2025

SEMANA DEL: 29/12/2025

AL: 2/12/2026

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TUB 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andys Guzman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolín Farblus Q.

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, (LIBERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIDAS)	✓		✓		✓						✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓						✓			
	STOP		✓		✓		✓						✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (BIELAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDALOS Y MANEJOS.	✓		✓		✓						✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓						✓			
	CITADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓						✓			
	ESTADO DE PEDALOS Y MANEJOS		✓		✓		✓						✓			
FRENOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS	✓		✓		✓						✓			
	REVERSA		✓		✓		✓						✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓						✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓						✓			
LIMPIA BRISA	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓						✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓						✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓						✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS. (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓						✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓						✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓						✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓						✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓						✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓						✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓						✓			
DOCUMENTACI ON	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓						✓			
	REVISION TECNICA/CAMION		✓		✓		✓						✓			
FIRMA OPERADOR:			Andys G		Andys G		Andys G				Andys G		Andys G			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolín F		Karolín F		Karolín F				Karolín F		Karolín F			

[illegible]



College: ISF # 12
Version: 11
FICHA: 01/07/2025

St. Ignace, Md. - 20685

[illegible]



ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDALeros Y MANIJAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDALeros Y MANIJAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPJLOS	LATERALES DERECHA / IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPieza, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DERECHA / ATRÁS	FUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZa Y PSTRUCCIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTEs, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOs, SEAN LoS ADECUADoS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQWIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQWIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE SERRAME			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAs Y SEGuros SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			<i>[Signature]</i>													
FIRMA INSPECTOR SST:			<i>[Signature]</i>													



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

Versión: 01

Fecha: 01/07/2020

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TVC 042

MODELO: 2015

OPERADOR: Angel Nazir Altamir

RESPONSABLE: Kordain Fortalvo

B: bueno M: male

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PULGONES Y MANGUERA.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PULGONES Y MANGUERA		✓		✓		✓				✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTO	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ.	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
ILANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LARRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR.	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORDONES		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DEARRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:			Kordain F	Kordain F	Kordain F				Kordain F	Kordain F						



FDC-4A 01/07/2025

M LUNES M MARTES M MIERCOLES M JUEVES M VIERNES M SABADO M DOMINGO																	
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓										
	TRASERAS		✓		✓		✓										
	STOP		✓		✓		✓										
REVISION INTERNA	AGENTES	VERIFICAR ESTADO DEL AGIENTO, VERIFICAR	✓		✓		✓										
	CINTURON DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON	✓		✓		✓										
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON	(HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PELDAÑOS	✓		✓		✓										
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANILLAS	Y MANILLAS.	✓		✓		✓										
RTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RTOS	✓		✓		✓										
	REVERSA		✓		✓		✓										
ESPEJOS	LATERALES DCH/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓										
	RETROVISOR		✓		✓		✓										
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRÁS	PLUJILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓										
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN COSTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓										
	TRASERAS		✓		✓		✓										
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓										
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓										
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓										
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓										
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓										
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL	✓		✓		✓										
	EXTINTOR	EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE PRIMEROS	✓		✓		✓										
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓										
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓										
FIRMA OPERADOR:			Angel Nieves		Angel Nieves		Angel Nieves				Angel Nieves						
FIRMA INSPECTOR SST:			Karlhin F		Karlhin F		Karlhin F				Karlhin F						

INSPECCIONES RETRO CAT 320D2



MINISTERIO DE
TRANSPORTE
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-13

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 3/19/2025

INSPECTOR: Jose Daza

AREA: Arraigo León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
FITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Jose Daza

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fontalvo



MINISTERIO DE
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-P-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 5/12/2025

INSPECTOR: Jose Doraci

AREA: Arranque

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariña

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	SECUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FLUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: J. Doraci

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fariña

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-33 VERSION: 03 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 9/12/2025		INSPECTOR: Jose Dorado			
AREA: Alajuela		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Fontelari			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D2		MODELO: 2014	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	ILUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Dorado					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Fontelari					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Codigo: SST-F-12 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025			INSPECTOR: Jose Daza		
AREA: Arraig León			PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fombalio		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 300 D2		MODELO: 2014	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LOCADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN PURGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Daza					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobin F.					

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: IST-F-11 Versión: 01 Fecha: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Jose David			
AREA: Arraigal León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariola			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 300 D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LUZ ADICIONAL		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	REJILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAMES	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAMES		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose David					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fariola					

		SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: ST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPEC. OR: Jose Dorca			
AREA: Airoto León		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 320 D2	MODELO: 2014			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VORIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEOPRECISIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRIGAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA.	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LARRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Dorca					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO	Código SST-F-13		
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MQUINARIA PESADA		VERSION: 01	FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION:	18/12/2025	INSPECTOR:	Jose Rodrigo Ramirez		
AREA:	Arraio León	PERSONA RESPONSABLE:	Karolén Fontalvo		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO:	Excavadora	MARCA:	CMT 320 D2		
		MODELO:	2014		
C: conforme NC: no conforme N/A: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Ramirez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-13	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/01/2025	
FECHA DE INSPECCION: 20/12/2025		INSPECTOR: Jose Rodolfo Ramirez			
AREA: Arrap León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Farfán			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Oxidador		MARCA: MT 320D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VORIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIQUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHO/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: <i>Jose Ramirez</i>					
FIRMA DE RESPONSABLE: <i>Karolín Farfán</i>					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 23/12/2025

ÁREA: Arrión León

INSPECTOR: José Rodrigo Ramírez

PERSONA RESPONSABLE: Karolán Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELBIDO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MÉCANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACIÓN	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

José Ramírez

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolán F

 SEGURO DE CARGA C.R.A. <small>Centro Registral de Alcobendas</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SS-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 26/12/2005		INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez			
AREA: Airap León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: MT-300 D2		MODELO: 2014	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP			☒	
	LIQUADORA		☒		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURON DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHEBILLO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZD	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZD/ ATRÁS	FLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Ramirez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolén F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SS1-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: JORGE RODRIGO RAMIREZ			
AREA: Arroyo Leon		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	UCUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELUCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHA/IZQUIERDA ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: JORGE RAMIREZ					
FIRMA DEL RESPONSABLE: KARLAÍN FONTALVO					

INSPECCIONES RETRO CAT 320D

 SEGURO DE CREDITO C.R.A. <small>Corporación de Riesgo</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 03/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 3/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Cienaga Istmo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain F. F. F.			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 300D	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforma NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUCIADORA		✓		
CABINA	ASENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARE Y TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLI MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: P/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F. F. F.		



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SSF-F-11

VERSIÓN: 03

FECHA: 02/02/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 5/12/2025

INSPECTOR: Benjamin Moreno

ÁREA: Cerro del Talamo

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fortino

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme SA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI GRABADO) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	FLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Benjamin Moreno

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain Fortino

 SEGURO SOCIAL C.R.A.		SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 03/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Aerodromo Toluca		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fendler			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karlaín Fendler					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD C.R.A.		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Carga Torero		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
(INFORMACION DEL EQUIPO)					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D		MODELO: 2013	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) Y UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontalvo					

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SSR-F-01	
FECHA DE INSPECCIÓN: 13/12/2025		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 03	
ÁREA: Carga Látex		INSPECTOR: Benjamín Moreno		FECHA: 02/07/2025	
EQUIPO: Excavadora		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Jaramila			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA: CAT 320 D		MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEOPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

 SEGURO C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA					
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Genigra Totumo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontelva			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D		MODELO: 2013	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIQUILCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontelva					

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-23			
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01			
FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025		FECHA: 02/07/2025			
AREA: Manapi Teleno	INSPECTOR: Benjamin Moreno	PERSONA RESPONSABLE: Karolina Fontello			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320 D	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme I.A: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolina Fontello					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-13 Versión: 03 Fecha: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 20/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Generador Torneo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Lombardo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUZ ADICIONAL		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIMUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE: Karolain Lombardo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-J-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 01/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 23/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Gerencia Técnica		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalba			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 D	MODELO: 20B		
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontalba					

 C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE M. AQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION:	26/12/2025	INSPECTOR:	Benjamin Moreno		
AREA:	Canga Toleno	PERSONA RESPONSABLE:	Karolina Tonello		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO:	excavadora	MARCA:	CAT 320 D		
		MODELO:	2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELUCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: P/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolina Tonello		

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 06	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: Benjamín Moreno			
AREA: Cerrojo Totono		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fajardo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUZADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI DEFORMACION) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamín Moreno					
FIRMA DE EL RESPONSABLE: Karolén Fajardo					

INSPECCIONES RETRO CAT 320GX

SEGURO		C.R.A.		SEGURO		C.R.A.	
SEGURO				C.R.A.			
SEGURO				C.R.A.			
SEGURO				C.R.A.			
FECHA DE INSPECCION: 3/12/2025				INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Area 600				PERSONA RESPONSABLE: Karolyn Fortaluo			
EQUIPO: Excavadora				MARCA: CAT 320 EX			
				MODELO: 2022			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica							
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO				
			C	NC	NA		
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓				
	TRASERAS		✓				
	STOP		✓				
	LICUADORA		✓				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARES TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VEHICULO.	✓	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓				
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓				
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓				
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓				
	REVERSA		✓				
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, SIN OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓				
	RETROVISOR		✓				
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓				
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓		
	TRASERAS				✓		
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓				
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓				
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓				
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓				
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓				
	EXTINTOR		✓				
	KIT DE DERRAME		✓				
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓				
Observaciones: N/A							
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez							
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolyn F							



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 8/12/2025

ÁREA: Arran León

EQUIPO: excavadora

INSPECTOR: Dario Martinez

PERSONA RESPONSABLE: Karoben Fontalvo

MARCA: UT 300-6X MODELO: 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUZ ADICIONAL				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHA/ATRÁS	PLACA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDALES Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Dario Martinez

FIRMA DE RESPONSABLE: Karoben F

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: 557-F-11 Version: 01 Fecha: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 9/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Martinez			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.6X		MODELO: 2022	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEBULLA DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLACILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: M/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 11/12/2025		INSPECTOR: Karlaín Fontalvo			
ÁREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Darío Martínez			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Darío Martínez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Ayacucho		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 EX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEOPRECIPITACION) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
UMPIA BRISAS	DEBAJO/ATRAS	PUJILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-14	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 03	
				FECHA: 02/07/2023	
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Martinez			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 EX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIJADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PELLICULA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F					



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025

INSPECTOR: Darro Martinez

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fariako

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 G

MODELO: 2022

C: conforme NC: no conforma NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIEN TO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTI HUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR:

Darro Martinez

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Karobin F

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSIÓN: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
ÁREA: Arroyo Viejo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MÁRCA: CAT 320 GX		MODELO: 2022	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUCADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUECO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELLEROS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CILINDRADA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACIÓN	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARRETERA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 23/12/2025

INSPECTOR: Dairo Martinez

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo

B. INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Osmadora

MARCA: B20 SX CAT

MODELO: 2022

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ENCUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDALES Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL FLUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARCA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-01	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 26/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martínez			
AREA: Arrasado		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalba			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEMS A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	D/LANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	CUADRO			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUECO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	D/LANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMINOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA C/JOHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL FLUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARRA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martínez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/05/2015	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fonblau			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 GX	MODELO: 2017		
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LECUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCOS DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERAZO/ ATRÁS	PLACA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA			
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					

INSPECCIONES RETRO CAT 320 DH

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCIÓN: 3/12/2025		INSPECTOR: Rolcer Contillo			
AREA: Amop León		PERSONA RESPONSABLE: Karobén Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320 DII	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEULCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
RITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rolcer Contillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobén F					

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-13 VERSION: 01 FECHA: 01/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 05/12/2025		INSPECTOR: Róger Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Fariña			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 DII	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforma NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO. VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Róger Cantillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Fariña					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Rainer Contrillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolina Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 DH	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
FITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: NA					
FIRMA DE OPERADOR: Rainer Contrillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolina F.					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO C.R.A.		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 03/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Róger Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 DH		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	UCUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Róger Cantillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobin F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Pacer Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolyn Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320D-H	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNCIONAN	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PAÑUELO TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTHUELO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Pacer Cantillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolyn F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 03	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/2025		INSPECTOR: Róger Castillo			
ÁREA: Aireop León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320C-DH		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme I/R: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DEL OPERADOR: Róger Castillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Fontalvo					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-4-11

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 03/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 18/12/2025

AREA: Arroyo León

INSPECTOR: Róger Cantillo

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fariña

EQUIPO: excavadora

MARCA: CAT 320 DH

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme TA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Róger Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fariña



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 03/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/12/2025

INSPECTOR: Racer Cantillo

ÁREA: Arramp León

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 DH

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Racer Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain F

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-31 Versión: 01 Fecha: 02/07/2023	
FECHA DE INSPECCIÓN: 23/12/2023		INSPECTOR: Roxas Cantillo			
AREA: Atitaya León		PERSONA RESPONSABLE: Karoben Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 D4		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLA MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Roxas Cantillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karoben F					



C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-P-11

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 26/12/2025

AREA: Amoy Leon

INSPECTOR: Rocio Cantillo

PERSONA RESPONSABLE: Karolena Cantillo

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 300 DH

MODELO: 20B

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARRILLAS, TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PL. MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Rocio Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolena Cantillo



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/12/2025

INSPECTOR: Racer Castillo

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karobón Fariello

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 DH

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACIÓN	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Racer Castillo

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karobón Fariello

INSPECCIONES BOTIQUIN Y CAMILLA



MINISTERIO DE SALUD
C.R.A.
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN

FORMATO
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

CODIGO: 887-F-47

VERSION: 01

FECHA: 02/01/2025

Nombre de quien inspecciona:	Kardario Sotillo Q	Fecha de inspección:	15/12/2025
Ubicación del botiquín:	Cuando del turno	Ubicación camilla:	
Marque con una X según las condiciones observadas:			
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	✓	NO
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	✓	NO
Localizado en lugar visible?	SI	✓	NO
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	✓	NO

Buena	B	Regular	R	-	Mala	M	-	No tiene	NT	No aplica	NA
-------	---	---------	---	---	------	---	---	----------	----	-----------	----

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES								
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios		B	R	M	NT	NA	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓					5	
2	Gautes de látex / nitrilo	✓					1	
3	Lodopovidona solución	✓					1	
4	Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓					1	
5	Gasa estéril	✓					1	
6	Venda elástica	✓					1	
7	Tapabocas	✓					1	
8	Españadrapo micropore	✓					1	
9	Algodón	✓					1	
10	Curas	✓					1	
11	Bajalenguas	✓					1	
12	Parches oculares					✓		
13	Termómetro de mercurio o digital					✓		
14	Tijera trauma	✓					1	
15	Linterna	✓					1	
16	Alcohol acético	✓					1	
17	Tensiómetro					✓		

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA						
Descripción del elemento		B	R	M	NT	NA
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sujetadores para agente	✓				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Otras observaciones:



MINISTERIO DE SALUD
C.R.A.
COSTA RICA

FORMATO
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

CODIGO 0017.07

VERSION 01

FECHA 02/07/2025

Nombre de quien inspecciona:	Karoline Fariñas Q	Fecha de inspección:	13/12/2025
Ubicación del botiquín:	Área 1037	Ubicación camilla:	
Marque con una X según las condiciones observadas:			
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI ☒ NO ☐	Localizado en lugar visible?	SI ☒ NO ☐
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI ☒ NO ☐	El botiquín se encuentra señalizado?	SI ☒ NO ☐

Bueno B - Regular R - Malo M - No tiene NT No aplica NA

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES							
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios		B	R	M	NT	NA	Cantidad
1	Estado del botiquín	☒					5
2	Guantes de látex / nitrilo	☒					1
3	Lodopovidona solución	☒					1
4	Solución salina 250 cc ó 500 cc	☒					1
5	Gasa estéril	☒					1
6	Venda elástica	☒					1
7	Tapebocas	☒					1
8	Esparadrapo micropore	☒					1
9	Algodón	☒					1
10	Curets	☒					1
11	Bajalenguas	☒					1
12	Parches oculares					☒	
13	Termómetro de mercurio o digital					☒	
14	Tijera trauma	☒					1
15	Linterna	☒					1
16	Alcohol séptico	☒					1
17	Tensiómetro					☒	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlos (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA						
Descripción del elemento		B	R	M	NT	NA
1	Instalación (Sitio de ubicación)	☒				
2	Señalización	☒				
3	Estado del soporte	☒				
4	Correas de seguridad	☒				
5	Sujetadores para agarre	☒				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	☒				

Otras observaciones:



FHS24A-072072025

CARGO: Inspector SST

HORA: 9:45am

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NT: NO TIENE N/A: NO APLICA

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANÓMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MARCA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipropósito	Av. León	20lb	06-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

OBSERVACIONES:

FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: *Karlaio F.*



INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE ELECTRICIDAD
C.R.A.

INSPECCION DE EXTINTORES

COORD. SST-F-28

VERSION: 01

FECHA: 03/07/2015

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karolain Fontalvo Q.

CARGO: Inspector SST

FECHA: 19/12/2025

HORA: 3:00pm

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NT: NO TIENE N/A: NO APLICA

Nº	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANEJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	<u>Multiproposito</u>	<u>Cuencap Totumo</u>	<u>20lb</u>	<u>06-2026</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
OBSERVACIONES:															
FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCION: <u>Karolain F.</u>															

ANEXO 8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL CONTRATISTA



INFORME N-6 SEGUIMIENTO PMA

***OBJETO: “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA
HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”***



**ENERO
2026**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS	3
1.1. Objetivo General.....	3
1.2. Objetivos Específicos	3
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	4
MEDIO BIOTICO	5
PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE HABITAT	5
PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA	6
PROGRAMA DE REVEGETACION	8
PROGRAMA ABIOTICO	9
PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES	9
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO.....	12
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO	14
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.....	15
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS	16
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR TRÁNSITO VEHICULAR.....	17
PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	19
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA.....	20
PROGRAMAS SOCIALES	21
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	21
PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.....	23
PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD.....	23
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	25



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

INTRODUCCIÓN

El presente informe se genera con el fin de realizar al Plan de Manejo Ambiental (PMA) desarrollado en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA** y el **CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO**, como parte del proyecto denominado **“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIÉNAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**.

Desde el componente ambiental, se abordan aspectos clave como el manejo de residuos, calidad del agua, suelo, aire, control de ruido, protección de la fauna y la flora, seguridad industrial, señalización, y monitoreo ambiental. Se establecen programas y procedimientos orientados a garantizar la sostenibilidad de las intervenciones, minimizando la afectación a los ecosistemas intervenidos.

Desde el componente social, se incorpora estrategias para la participación de las comunidades locales, la socialización de las actividades, la educación ambiental, la prevención de conflictos, y el fortalecimiento del tejido social en las zonas de influencia. Se reconoce la importancia de la interacción con las comunidades, la inclusión de sus percepciones y la promoción de un diálogo abierto que permita desarrollar el proyecto en armonía con las dinámicas sociales y culturales del territorio.

El siguiente informe se describen las actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, desde la firma del acta de inicio hasta la fecha de corte del presente documento, en ese orden se describen los programas ambientales y las medidas establecidas en el tiempo comprendido desde el **03 de diciembre al 02 de enero del 2026**.



OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Describir las principales acciones y actividades ambientales ejecutadas durante el proceso constructivo del proyecto cuyo objeto es **REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIÉNAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO** a fin de establecer los componentes naturales que serán afectados y en consecuencia plantear recomendaciones para la mitigación o eliminación de los posibles impactos que podrían verificarse con la ejecución del Proyecto.

1.2. Objetivos Específicos

- Establecer con detalle los programas correspondientes al control y seguimiento durante las diferentes etapas del proyecto de las medidas recomendadas, que corresponden al monitoreo ambiental durante la etapa de operación y mantenimiento;
- Desarrollar con detalle programas y/o medidas compensatorias o de mitigación de impactos ambientales negativos identificados en el área de influencia indirecta del estudio, incluido el fortalecimiento institucional correspondiente.



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se describen los programas ambientales a llevar a cabo durante la ejecución del proyecto:

Programa	Proyecto		Código
BIOTICO	1	Programa de protección y conservación de hábitat	FMB1.1
	2	Programa de conservación de flora	FMB-1.2
	3	Programa de revegetación	FMB-1.3
ABIOTICO	4	Programa de emisiones atmosféricas de material particulado, gases y vapores	FMA-2.1
	5	Programa de manejo ambiental del recurso suelo	FMA-2.2
	6	Programa de manejo ambiental del recurso hídrico	FMA-2.3
	7	Programa de manejo ambiental de los residuos sólidos	FMA-2.4
	8	Programa de manejo ambiental de los residuos líquidos	FMA-2.5
	9	Programa de mitigación de los impactos por tránsito vehicular	FMA-2.6
	10	Programa de mitigación para el transporte de materiales y equipos	FMA-2.7
	11	Programa para el manejo de campamentos de obra	FMA-2.8
PAISAJISTICO	12	Programa restauración paisajística	FMP-3
SOCIECONOMICO	14	Programa de información y comunicación	FMS-4.1
	15	Programa de vinculación de mano de obra no calificada	FMS-4.2
	16	Programa de levantamiento de actas de vecindad	FMS-4.3
	17	Programa de atención y participación comunitaria	FMS-4.4

MEDIO BIOTICO

PROGRAMA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE HABITAT

Durante el período evaluado, se desarrollaron jornadas de capacitación ambiental dirigidas al personal técnico y operativo del proyecto, incluyendo operadores de maquinaria, auxiliares de campo y demás integrantes del equipo de obra.

Estas actividades tuvieron como objetivo fortalecer la sensibilización y conciencia ambiental del personal, así como mejorar sus competencias para la adecuada gestión ambiental del proyecto, abordando temas relacionados con el manejo y control de la calidad del aire, la clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos y residuos generados en obra, la conservación de la flora y fauna presentes en el área de influencia, y la implementación de medidas de control ambiental asociadas a las actividades constructivas que puedan generar impactos al entorno.

Lo anterior contribuye al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y al fortalecimiento de la cultura ambiental dentro del desarrollo de las actividades constructivas, promoviendo prácticas responsables y la apropiación de los lineamientos ambientales por parte de todo el personal vinculado al proyecto.

A continuación, se presentan los registros fotográficos de la actividad.

	
Imagen 1: Capacitaciones ambientales	Imagen 2: Capacitaciones ambientales
Nombre del indicador:	Programa de protección y conservación de hábitat
Indicador de calificación:	<div style="text-align: center;"> <p>(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100%</p> <p>$(1/1) * 100\% = 100\%$</p> <p>(No. de especies encontradas / No. De especies trasladadas) x 100%</p> <p>$(0/0) * 100\% = 0\%$</p> </div>

	<p>Nota: Durante este periodo no se realizó el traslado de especies, pero si se realizaron ahuyenta miento de fauna existente en la obra mediante sonidos fuertes y con ayuda de la maquinaria que generaba vibración en el agua.</p>
--	---

PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA

En el marco de las actividades de aprovechamiento forestal, como contratista se han implementado acciones complementarias orientadas a asegurar la protección y el manejo adecuado de la fauna silvestre presente en el área de intervención. Para ello, se inició con la planificación y caracterización del área de influencia, proceso que permitió identificar la vegetación objeto de intervención, las zonas de importancia ecológica y la posible presencia de especies asociadas.

Es importante destacar que las áreas intervenidas corresponden principalmente a sectores con vegetación rastrera o especies tapizantes, en las cuales se ha realizado limpieza de manera manual. En este sentido, como contratista se ha garantizado la sensibilización del personal operativo, incluyendo operadores de maquinaria y trabajadores de obra, mediante jornadas de capacitación enfocadas en la identificación y el manejo responsable de estas especies vegetales, promoviendo prácticas respetuosas con el entorno durante la ejecución de las actividades.

Asimismo, para el contratista ha sido fundamental desarrollar las labores en las zonas aledañas al arroyo sin afectar los árboles ni las especies presentes en su entorno. Tal como se evidencia en el registro fotográfico incluido, las intervenciones se ejecutaron alrededor de estas especies, asegurando su estabilidad y evitando impactos negativos en su desarrollo.



Imagen 3: Conservación de especies existentes – Arroyo León



Imagen 4: Conservación de especies existentes - Arroyo León



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00



Imagen 5: Conservación de especies existentes en la ciénaga del Totumo



Imagen 6: Conservación de especies existentes en la ciénaga del Totumo



Imagen 7: Registro de capacitación

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de conservación de flora
Indicador de calificación:	<p>(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% $(2/2) * 100\% = 100\%$</p> <p>Nota: Hasta la fecha se continua sin realizar intervención de especies forestales. Por esta razón, se han reforzado las medidas de cuidado y protección de la vegetación existente mediante charlas de sensibilización y capacitación sobre su adecuado manejo.</p>

PROGRAMA DE REVEGETACION

Durante el período evaluado, se continuó implementando medidas y acciones preventivas orientadas a garantizar la conservación y supervivencia de las especies vegetales presentes en la zona de intervención del proyecto Arroyo León. Como parte de estas acciones, se realizaron recorridos de inspección en el área de obra para verificar el estado de la cobertura vegetal, así como jornadas de capacitación dirigidas al personal operativo, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de proteger y evitar afectaciones a la vegetación existente durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Es importante señalar que, a la fecha, el proyecto Arroyo León no contempla la siembra de nuevas especies vegetales; no obstante, en caso de que dicha actividad sea incorporada dentro de las obligaciones ambientales del proyecto, el contratista procederá a su ejecución de manera oportuna, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos establecidos por la autoridad ambiental competente.

Por otra parte, en el marco del proyecto Ciénaga de la Virgen, se llevó a cabo una jornada de siembra de mangle a manera de donación, bajo una solicitud presentada por la comunidad de la zona con el propósito de contribuir a la restauración y fortalecimiento del ecosistema, aportando a la conservación ambiental y al equilibrio ecológico del área intervenida.

La actividad de siembra fue ejecutada con el apoyo de personal de la zona, promoviendo la vinculación de la comunidad local, y la adquisición de los individuos vegetales se realizó a través de la asociación de pescadores del área de influencia directa, fortaleciendo la participación comunitaria y el desarrollo socioambiental del territorio.



Imagen 8: siembra de mangle



Imagen 9: siembra de mangle



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00



Imagen 10: siembra de mangle



Imagen 11: Registro de capacitación

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de revegetación
Indicador de calificación:	<p>No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1) X 100% = 100%</p> <p>No de individuos a sembrar / No individuos sembrados) X 100% (500/500) X 100% = 100%</p>

Nota: los especímenes sembrados hacen parte de una donación realizada por el consorcio a la comunidad con el fin de ayudar en la mejora del ecosistema interno de la ciénaga, estos fueron distribuidos en distintas zonas de acuerdo con el conocimiento de los pescadores y comunidad

PROGRAMA ABIOTICO

PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES

Durante el período evaluado, se continuó con la revisión de la documentación legal y técnica de la maquinaria y los

vehículos utilizados en la ejecución de las actividades de obra. En este sentido, se verificó la tarjeta de propiedad, el certificado de compra y la declaración de importación de las retroexcavadoras empleadas en el proyecto. Asimismo, se realizó la revisión de la documentación correspondiente a las volquetas encargadas del transporte de material hasta su sitio de disposición final, incluyendo tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnico-mecánica.

De manera complementaria, se llevaron a cabo inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), las cuales incluyeron la verificación del estado y vigencia de los extintores, la disponibilidad y condiciones de los botiquines, así como la evaluación del estado general de los equipos y vehículos utilizados en obra.

A continuación, se presenta la maquinaria reportada durante el período:



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

•3 Retroexcavadoras Arroyo León:

Caterpillar 320D2- Mod 2014

Caterpillar 320D-Mod 2013

Caterpillar 320GX-Mod 2022

•1 Retroexcavadoras Ciénaga:

Caterpillar 320D2- Mod 2014

• 4 volquetas para el traslado del material:

TVB-946

TVB-947

TVB-950

TVC-042



Imagen 12: Maquinaria utilizada en obra



Imagen 13: Maquinaria utilizada en obra



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00



Imagen 14: Maquinaria utilizada en obra



Imagen 15: Capacitación en obra

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de emisiones atmosféricas de material particulado, gases y vapores de aire.
Indicador de calificación:	<p>de $(\text{No de capacitaciones realizadas} / \text{No de capacitaciones programadas}) \times 100\%$ $(2/2) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Nota: Se realiza capacitación del control de la calidad de aire</p> <p>$(\text{No de inspecciones realizadas} / \text{No de inspecciones a realizar}) \times 100\%$ $(8/8) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Nota: Equipos en obra: 4 volquetas, 4 excavadoras Caterpillar 320D2- Mod 2014 Caterpillar 320D-Mod 2013 Caterpillar 320GX-Mod 2022 Caterpillar 320D2- Mod 2014</p> <p>4 volquetas para el traslado del material: TVB-946 TVB-947 TVB-950 TVC-042</p> <p>$(\text{No de certificados vigentes} / \text{No. total, de certificados}) \times 100\%$ $(4/4) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Nota: Los certificados son la tecno mecánica al día de las 4 volquetas.</p>


PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO

Durante el período evaluado, el contratista ejecutó las actividades de cargue, transporte y disposición final de los sedimentos extraídos en el frente de obra del Arroyo León. El material resultante fue trasladado al relleno sanitario **Los Pocitos**, de conformidad con los procedimientos establecidos y en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, lo cual se encuentra debidamente soportado mediante la documentación ambiental anexa al presente informe.

De manera complementaria, se continuó con las labores de reconformación de taludes, haciendo uso del material proveniente de las actividades de limpieza y recuperación del arroyo, siempre y cuando este cumpliera con las condiciones técnicas y ambientales requeridas para su aprovechamiento. Estas acciones tuvieron como finalidad reducir los procesos erosivos, prevenir la pérdida de suelo y mejorar la estabilidad de las márgenes intervenidas, contribuyendo a la recuperación y funcionalidad del cauce.

Además, se brindó continuidad y se dio finalidad a las intervenciones en la Ciénaga del Totumo, específicamente en las acciones de retiro y acopio de cobertura vegetal invasora. Estas actividades busco mejorar la dinámica hidrológica del sistema y favorecer los procesos de recuperación ambiental del ecosistema.

La ejecución de estos trabajos ha permitido optimizar la conectividad del flujo hídrico, disminuir la obstrucción del espejo de agua y restablecer las condiciones naturales de intercambio en la ciénaga, en cumplimiento de los objetivos de restauración ambiental definidos para el proyecto.





INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00



Imagen 18: Conformación de talud Arroyo León



Imagen 19: Registro de capacitación

Durante este periodo para evitar derrames de combustibles, todos equipos que puedan transportarse por sí solos se les suministro combustible en la estación de servicio más cercano en el área de trabajo y la maquinaria amarilla son abastecidos por medio de un carro cisterna.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre indicador:	del Programa de manejo ambiental del recurso suelo
Indicador calificación:	<p>de (No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1)*100% = 100%</p> <p>Nota: se realizó capacitación del manejo del suelo al personal de la obra</p> <p>(m3 de material dispuesto en sitio de disposición final / m3 de material total a generar durante la limpieza y recuperación ambiental del arroyo) * 100%</p> <p>(20.912/33.100)*100= 62.88%</p> <p>Nota: el Volumen de 33.100 m3, es el volumen proyectado a generar y disponer en el sitio de disposición final durante toda la ejecución del proyecto en la limpieza y recuperación ambiental del arroyo, durante este mes no se genero material, por lo tanto, se mantienen los mismos volúmenes del mes anterior</p>

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO

Durante el período evaluado, el contratista continuó garantizando la prohibición de vertimientos directos de aguas residuales o contaminadas a los cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Como medida de control, se mantuvo instalada una cabina sanitaria en el frente de obra para la recolección de los residuos líquidos de tipo doméstico generados por el personal, los cuales son retirados de manera periódica por un gestor autorizado, asegurando su transporte y disposición final en sitios avalados por la autoridad ambiental competente.

Esta gestión permite prevenir la contaminación de los recursos hídricos, garantizar la aplicación de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de la obra y fortalecer el control de los vertimientos asociados al proyecto. Finalmente, en los anexos del presente informe se incluyen los registros de mantenimiento de la cabina sanitaria, suministrados por la empresa prestadora del servicio.



Imagen 20: Cabina de baño en arroyo león



Imagen 21 : Registro de capacitación

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
Nombre indicador:	del	Programa de manejo ambiental del recurso hídrico.
Indicador calificación:	de	<p> $\left(\frac{\text{No de capacitaciones realizadas}}{\text{No de capacitaciones programadas}} \right) \times 100\%$ $(1/1) \times 100\% = 100\%$ </p> <p>Nota: Se realizo capacitación del manejo del recurso hídrico</p> <p>Quejas de la comunidad por vertimientos líquidos = 0</p> <p>Nota: no se han presentado quejas por vertimientos por parte de la comunidad</p>

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

En el frente de obra Arroyo León se cuenta con un punto ecológico conformado por cuatro canecas de colores blanco, negro, verde y rojo, en cumplimiento del Código de Colores establecido en la Resolución 2184 de 2019, destinado a la recolección temporal de los residuos sólidos generados en la obra.

Los residuos son acopiados en el campamento ambiental ubicado en la zona de intervención y posteriormente entregados a la empresa recolectora Triple A, con una frecuencia de tres veces por semana. Durante este periodo, se realizó inspección a los puntos ecológicos, verificando su correcto uso y mantenimiento.

Es importante resaltar que no se efectuó disposición final de residuos, dado que no se generaron residuos sólidos adicionales durante el desarrollo de las actividades.

Asimismo, se ejecutan jornadas permanentes de orden y aseo, las cuales son registradas en el formato correspondiente, incluido dentro de los anexos del presente informe, como evidencia del cumplimiento de las buenas prácticas ambientales en obra.

En el frente de obra Ciénaga del Totumo, dadas las condiciones de difícil acceso y la ausencia de un campamento fijo en el área de intervención, el contratista implementó medidas para garantizar el manejo adecuado de los residuos generados durante las actividades.

El personal operativo y de maquinaria recibió capacitación sobre las buenas prácticas en gestión de residuos, enfatizando la importancia de no disponerlos directamente en el área de trabajo. A cada operador se le suministró una bolsa plástica resistente para la recolección de los residuos generados durante la jornada, los cuales son trasladados posteriormente a la oficina principal del proyecto para su disposición final en los puntos ecológicos establecidos.

Estas acciones contribuyen a mantener la limpieza del área de intervención, prevenir afectaciones ambientales en la ciénaga y garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.



Imagen 22: Punto ecológico



Imagen 23: Registro de capacitación

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
Nombre indicador:	del	Programa de manejo ambiental de los residuos sólidos
Indicador calificación:	de	<p>(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1) x 100% = 100%</p> <p>Nota: Se realizo capacitación de la clasificación y manejo de los residuos sólidos y líquidos</p> <p>(Volumen de residuos generados. / volumen de residuos con disposición segura y responsable) x 100% (0/0) x 100% = 0%</p> <p>0 bolsas al mes aprovechables</p> <p>Nota: Durante este periodo no se generaron residuos teniendo en cuenta la cantidad de personal en obra es muy poco.</p> <p>(No de puntos instalados/No de puntos a instalar) x 100% (1/1)x 100% = 100%</p>



Imagen 24: Registro de capacitación

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS

Durante este periodo, en el frente de obra Arroyo León se mantuvo la presencia de una cabina sanitaria con el fin de gestionar de manera eficiente los residuos líquidos domiciliarios y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal de obra. El mantenimiento y disposición final de esta cabina es responsabilidad de la empresa suministradora, mientras que en la oficina central se dispone de un baño

adicional, al cual se le realizan mantenimientos periódicos. Adicionalmente, se llevaron a cabo capacitaciones al personal operativo sobre el manejo y disposición final de los residuos líquidos generados. Durante la ejecución del proyecto, se mantiene la prohibición de lavar maquinaria o equipos en el área de obra, reforzando a los operadores la importancia de proteger los ecosistemas y evitar la generación de residuos que puedan contaminar el entorno.

En el frente Ciénaga del Totumo, debido a las condiciones operativas y la localización del sitio de intervención, no se cuenta con la instalación de una cabina sanitaria. No obstante, se implementaron medidas alternativas de control sanitario, tales como la planificación de jornadas de trabajo por tiempos definidos, garantizando así el cumplimiento de las condiciones mínimas de salubridad y el manejo adecuado de los residuos líquidos de tipo doméstico.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de manejo ambiental de los residuos líquidos
Indicador de calificación:	<p>(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% $(1/1) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Nota: se realiza capacitación en el manejo de los residuos líquidos</p> <p>Presencia o ausencia de poblaciones de vectores: insectos culicídeos (culicinos y anofelinos), simúlidos y flebotomídeos y caracoles planorbídeos = Ausencia.</p> <p>Nota: no se presentan vectores en el área de trabajo.</p> <p>(No de baños instalados / No de baños a instalar) x 100% $(1/1 \times 100\% = 100\%$</p>

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR TRÁNSITO VEHICULAR

Durante este período el contratista llevó a cabo la revisión de la documentación de los equipos y vehículos presentes en el proyecto, verificando tarjetas de propiedad, declaraciones de importación, certificados de GPS y guías de movilización para la maquinaria amarilla. En cuanto a los vehículos, se verificaron la tarjeta de propiedad, el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Seguidamente, se realizaron las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), las cuales incluyeron la revisión del extintor, botiquín y el estado general de cada equipo y vehículo evaluado.

En el frente Arroyo León y en la Ciénaga del Totumo no se presenta tránsito peatonal ni vehicular, dado que no corresponde a una zona transitable. No obstante, en la entrada del proyecto Arroyo León, se encuentra una vía principal, lo que hace necesaria la instalación de señalización vertical preventiva para advertir a los usuarios viales sobre las maniobras de obra. Además, se cuenta con el apoyo de un palettero

encargado de regular el tráfico durante las maniobras de ingreso y salida de las volquetas, garantizando así la seguridad vial en el área de influencia y reduciendo los riesgos asociados a la operación.

	
Imagen 25: Capacitaciones realizadas en obra	Imagen 26: Señalización instalada en obra
	
Imagen 27: Señalización instalada en obra	Imagen 28: Señalización instalada en obra
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre indicador:	del Programa de mitigación de los impactos por tránsito vehicular
Indicador calificación:	<div> de </div> <div> (No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1) X 100% = 100% Nota: se complementa con el programa de emisiones atmosféricas de material particulados ya que se implementan las mismas inspecciones porque es la misma maquinaria. No de inspecciones desarrolladas / No. Inspecciones Programadas) X 100% (4/4) X 100% = 100% (4 volquetas, 4 excavadores, 4 inspecciones ambientales) Numero de señales instaladas en buen estado / número total de señales instaladas)* 100% </div>

	$(6/6) \times 100\% = 100\%$ <p>Nota: Se instala señalización acorde a lo planteado en el área SST y PMT (el PMT fue presentado para su aprobación ante la secretaria de Transito de Puerto Colombia)</p>
--	---

PROGRAMA DE MITIGACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

Para el desplazamiento de vehículos, como volquetas y camionetas, el encargado de logística del Consorcio asigna las rutas correspondientes y verifica que cada vehículo cuente con la tarjeta de propiedad, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes. Esta documentación es revisada y validada por los profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental antes de que el vehículo o equipo inicie actividades, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y de seguridad aplicables.

Adicionalmente, diariamente, antes del inicio de las actividades de obra, se realizan inspecciones preoperacionales junto con la profesional de SST, con el fin de verificar el estado actual de los equipos y vehículos, permitiendo programar oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		
Nombre del indicador:	de	Programa de mitigación para el transporte de materiales y equipos
Indicador de calificación:	de	$(N^{\circ} \text{ de trabajadores capacitados} / N^{\circ} \text{ total de trabajadores en transporte}) \times 100$ $8/8 \times 100 = 100\%$ <p>Nota: Se capacita al personal de las 4 retroexcavadoras y de las 4 volquetas</p> $(N^{\circ} \text{ de vehículos con tecno mecánica vigente} / N^{\circ} \text{ total de vehículos usados}) \times 100$ $4/4 \times 100 = 100\%$ <p>Nota: Se revisa con apoyo del área SST en las inspecciones y revisión de la documentación de la maquinaria.</p>

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA

Durante este periodo se adecuó una zona destinada a campamento en el frente de obra Arroyo León, la cual fue dotada con una carpa que alberga el punto de emergencia, equipado con botiquín, camilla y extintor. Asimismo, se instalaron dos puntos ecológicos, cabinas sanitarias, sillas y mesas para la atención de los trabajadores y de la comunidad. Adicionalmente, el área cuenta con señalización informativa que orienta y refuerza las medidas de seguridad y organización en el lugar.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de manejo para el campamento en obra
Indicador de calificación:	<p>(No. De campamentos a instalar/No. De campamentos instalados) x 100%</p> <p>1/1*100=100%</p> <p>Nota: Se Instala un campamento en obra, este se va moviendo según el lugar de las actividades</p>

PROGRAMA DE RESTAURACION PAISAJISTICA

Durante este periodo se implementaron medidas y acciones para garantizar la supervivencia de especies vegetales que se encuentran sembradas en la zona de intervención del arroyo León, se realizaron recorridos de obra y capacitaciones al personal de obra.

Cabe resaltar que hasta el momento el proyecto no contempla la siembra de especies, de ser incluido dentro de las actividades ambientales se implementaran de manera inmediata.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de restauración paisajística
Indicador de calificación:	<p>No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas) X 100% (1/1) X 100% = 100%</p> <p>Nota: Este programa no aplica durante este periodo</p>

PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Reunión informativa (ACTA 09)

El día 09 de diciembre se realizó reunión informativa, con el ingeniero Jairo Vergara de Ruta Costera, con el fin de informar a acerca de la limpieza del arroyo en los puentes ubicadas en la abscisa k280 y k320.

Reunión de socialización (ACTA 10)

El día 04 de diciembre de 2025 se realizó reunión de socialización del proyecto con Juan David Cabarcas. Director jurídico de alto Lago, en el desarrollo de la reunión se informaron las especificaciones del proyecto en esta zona específica del arroyo León.

Oficios sociales

A continuación, se relacionan los oficios sociales enviados.

1. CAA-39.12.2025

Solicitud de permiso e información para ejecución de limpieza

Destinatario: Natalia Abello Gerente, Ruta Costera.

Enviado: 09 diciembre 2025.



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

- REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro Fotografico- Informacion y comunicación – Divulgacion	
	
Ref. Reunión de socialización, Alto Lago.	Ref. Reunión de socialización, Alto Lago
	
Ref. Reunion Informativa, Ruta Costera.	Ref. Reunión Informativa, ruta costera.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de información y comunicación
Indicador de calificación:	<p>(No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas) X 100%</p> $7/7 * 100 = 100\%$ <p>Nota: En el presente periodo del informe, se da cumplimiento a la totalidad de las (6) socializaciones programadas inicialmente. Durante este periodo, se llevó a cabo la socialización pendiente con la familia Carrascal, propietarios de un predio aledaño al proyecto.</p> <p>(No de Vallas instaladas / No vallas programadas) X 100</p> $2/2 * 100 = 50\%$ <p>Nota: Se instalaron las dos vallas del contrato</p>

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

A la fecha de este corte se continuo con la vinculación de un trabajador del área de influencia del frente de obra Ciénaga del Totumo, a la fecha este consorcio se encuentra a la espera del certificado de residencia, el cual ya fue solicitado a los lideres de esta zona. Además, se realizó la contratación mensual de una embarcación la cual está a disposición del proyecto, generando así, ingresos a la comunidad del área de influencia.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de vinculación de mano de obra
Indicador de calificación:	$\frac{\text{No de personas contratadas}}{\text{No de personas requeridas}} \times 100\%$ $1/1 \times 100 = 100\%$ <p>Nota: A la fecha no se ha requerido la mano de obra no calificada en la obra</p>

PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

En el desarrollo de este periodo, se diligenciaron (3) tres permisos a predios en Arroyo león, los cuales se requirieron con la finalidad de aperturar el ingreso de maquinaria y personal a estas zonas. A continuación, se relaciona la información de los propietarios y encargados de predios:

- ✓ Fecha: 03 diciembre de 2025
Nombre: Armando de la Rosa Ubicación: Vía Puerto Colombia.
- ✓ Fecha: 27 diciembre de 2025
Nombre: Wilson Antonio Marriaga Ubicación: km 30 vía prosperidad.
- ✓ Fecha: 27 diciembre de 2025
Nombre: Wilson Antonio Marriaga Ubicación: km 30 vía prosperidad



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

Registro Fotografico- permisos de ingreso a predios.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

Registro Fotografico- permisos de ingreso a predios.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.



Ref. Permisos de Ingreso a Predio.

- INDICADORES

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de actas de vecindad
Indicador de calificación:	<p>(No de predios visitados con permiso / No de predios totales X 100%) $11/11 \times 100 = 100\%$</p> <p>Nota: No ha viviendas cercanas, se tramitan permisos a predios</p> <p>(No de permisos firmados / No de permisos requeridos) X 100 $11/11 \times 100 = 100\%$</p> <p>Nota: en el presente informe se adiciona el permiso e ingreso a predio de la familia Carrascal, el cual fue aprobado mediante reunión virtual, se llega a un consolidado de (7) siete permisos de ingreso a predio en Arroyo León.</p>

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Se continua con los canales de comunicación activos, por medio de los cuales se mantiene el contacto informativo con cada uno de los interesados en el proyecto.

medios de comunicación oficiales:

- Correo electrónico: consorcioambientaldelatlantico@gmail.com
- Línea telefónica: 3162267333

En el desarrollo de este periodo, no se recibieron manifestaciones ciudadanas. A la fecha cada una de las PQRS, recepcionadas se encuentran cerradas.

Durante este periodo, el consorcio Ambiental del Atlántico, realizó la donación de árboles a la comunidad del frente de obra de la Ciénega el Totumo. Cerrando a conformidad por parte de los beneficiarios.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
Nombre del indicador:	Programa de participación comunitaria
Indicador de calificación:	<p>(No PQR solucionadas / No de PQR recepcionadas X 100% $3/3 \times 100 = 100\%$</p> <p><i>Nota: Se dio respuesta por parte de la Interventoría.</i> (No de comités conformados / No de comités programados) X 100 $0/0 \times 100 = 0\%$</p> <p>Nota: No aplica durante este periodo.</p>

Registro Fotográfico – Donación de árboles Ciénega el Totumo	
	
Ref. Donación de árboles Ciénega el Totumo	

- **Se anexa matriz de PQRS**



INFORME SEGUIMIENTO PMA



Código:
PMA-
ALCT01
Versión: 00

VER ANEXOS AMBIENTALES

CAPACITACIONES AMBIENTALES
CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
INSPECCIONES AMBIENTALES
DOCUMENTOS DE VOLQUETA
INSPECCIONES VOLQUETAS
INSPECCIONES RETRO
INSPECCIONES BOTIQUIN Y CAMILLA

ANEXOS SOCIALES

ACTA N°9 REUNIÓN INFORMATIVA
ACTA N°10 REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN
OFICIOS SOCIALES
PERMISOS DE INGRESO A PREDIOS
MATRIZ DE PQRS



ANEXOS



CAPACITACIONES AMBIENTALES



INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES
C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y C/PACITACIONES

CODIGO 537-F-94

VERSION 01

FECHA

DATOS GENERALES

PROYECTO: Altop León - Chiriquí Tolumo
TEMA: Manejo de los residuos en obra
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA
FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 3/12/2025
HORA INICIAL: 5:30am HORA FINAL: 8:40am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1065659530	Liceth Maestre Bermudez	Profesional Social	Profesional 3
2	9178072	Eduardo Guzman	Residente	Eduardo G
3	73167915	Jesús Bascuñán	Director de obra	Jesús B
4	141884676	Rafael Luis Juilla	PRD	Rafael L
5	1644392990	Alvaro Texera	Ing apoyo	Alvaro T
6	73.144.082	Jose Daza Molina	Operador	Jose Daza
7	72.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S
8	1003563237	Benjamin Moreno	Operador	Benjamin M
9	1440371828	Thayella Lel	prof de calidad	Thayella L
10	1044431656	Rolker Cantillo	operador	Rolker Cantillo
11	72233471	Timberto Escorcia	codinero	Timberto C
12	73377879	Rolando España	codinero	Rolando E
13	1065604102	Gylen Perce	Ing Ambiental Int	Gylen P
14	1193065301	Andrian Araya	Ing apoyo 2	Andrian A
15	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

COOQO: 557-F04

VERSION: 01

FECHA

DATOS GENERALES

PROYECTO: Ampliación - Mantenimiento
TEMA: Uso y ahorro del agua
TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA ☐
FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 5/10/2025
HORA INICIAL: 11:00am HORA FINAL: 11:10am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	9178072	Edwardo Guzman	Residente	Edwardo G
2	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
3	1065659538	Liceth Maestre Bermudez	Prof. social	Liceth B
4	1068608102	Eileen Prazal	intervento.	Eileen P
5	7367915	Yesid Barcosegura	Director de obra	Yesid B
6	73144082	Jose Dnan Molina	operador	Jose Dnan
7	72753471	Arbeto Garcia	codenero	Arbeto G
8	1140843698	Desai Pava Aniba	P800	Desai P
9	1140871828	Shayella Araya I	mg de calidad	Shayella A
10	1193065301	Andres Prieto	Ing apoyo 2	Andres P
11	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
12	72.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
13	1044431656	Rocier Castillo	operador	Rocier Castillo
14	1044392990	Alberto Teyera	Ing apoyo	Alberto T
15	7337879	Reibus Espinoza	codenero	Reibus E
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-44

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arrap lech - Genaga TolmoFECHA: 13/12/2025TEMA: Condiciones al mango parrotulHORA INICIAL: 2:45pm HORA FINAL: 2:55pmTIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLAFACILITADOR: Henny Santiago

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1193065301	Andina Amayo	Iny arap 2	Andina A.
2	22005323	Henny Santiago	Eng ambiental	Henny S.
3	106560867	Eileen Paez d	Ing intern	Eileen P.
4	10441431656	Roliver Contrillo	operador	Roliver Contrillo
5	Cesar Cano Puylla CC 1140843658		P670	Cesar C.
6	1140871808	Shogella Arzola d	prof. de calidad	Shogella A.
7	33.144.082	Jose Dora Tolmo	operador	Jose Dora
8	7337879	Rebeca Espinoza	codenari	Rebeca E.
9	1065659.538	Liceth Maestre B	Profesora social	Liceth M.
10	1003563237	13 Benjamin Moreno	operador	Benjamin M.
11	72233471	Humberto Escobar	codenari	Humberto E.
12	9178072	Eduardo Guzman	Residente	Eduardo G.
13	1044392000	Alberto Tejeda	Ing arap	Alberto T.
14	1129488	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
15	73167115	Yerald Barcenas	Docente de obra	Yerald B.
16				
17				
18				
19				
20				

Henny Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Proyecto Tecn - Ciénaga Tolima

FECHA: 16/12/2025

TEMA: Cuidado de la fauna

HORA INICIAL: 11:30am HORA FINAL: 11:40am

TIPO DE ACTIVIDAD: ☒ CAPACITACION ☐ CHARLA

FACILITADOR: Henry Santiago

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	9178072	Edoardo Guzman	Residente	Edoardo G
2	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
3	1110843658	Angel Caro Puello	PGD	Angel C
4	1044392900	Alberto Tavera	Ing de grupo	Alberto T
5	1065602102	Glenn Forz	Log Int	Glenn F
6	1065654538	Leith Maestro Bermudez	Profesional Social	Leith M
7	72005323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S
8	1044431656	Rosier Cantillo	operador	Rosier Cantillo
9	1140871878	Manuel Angel de la Cruz	Ing de calidad	Manuel A
10	1193065301	Andrico Anaya	Ing civil	Andrico Anaya
11	73167915	Jesus Barrantes	Director de obra	Jesus B
12	73144082	Jose Daza Molina	operador	Jose Daza
13	72233471	Humberto Garcia	codinero	Humberto G
14	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
15	7337879	Rolando Espinal	codinero	Rolando E
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CÓDIGO: SST-F-44

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arroyo León - Ciénaga Tabma

TEMA: Abastecimiento de agua potable

FECHA: 18/10/2015

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN

CHARLA

HORA INICIAL: 3:15pm HORA FINAL: 3:25pm

FACILITADOR: Henry Santiago

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	73167915	Yerald Bascuñenas	Director de obra	Yerald B.
2	1044302000	Alberto Fajera	Ing de apoyo	Alberto F.
3	1540871808	Shayella Ayala	prof de calidad	Shayella A.
4	72233471	Humberto Escobar	codinero	Humberto E.
5	9178032	Edoardo Guzmán	Residente	Edoardo G.
6	1044431656	Rojer Cantillo	operador	Rojer Cantillo
7	8950717	José Ramiro	operador	José Ramiro
8	1129485512	Dairo Martínez	operador	Dairo M.
9	1140843658	Pepe Pao Ruiz	P6FD	Pepe P.
10	1065659538	Liceth Mestizo Bermúdez	Profesional social	Liceth M.
11	1065608107	Evelyn Pérez	ing Amb. intr.	Evelyn P.
12	72.005.323	Henry Santiago	ing ambiental	Henry S.
13	1193065301	Andrés Araya	Ing apoyo 2	Andrés A.
14	1003563237	Benjamín Moreno	operador	Benjamín M.
15	73377879	Deibes Espinoza	codinero	Deibes E.
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

PROYECTO: Ampliación - Cerrado Nuevo
TEMA: Segregación Ambiental
TIPO DE ACTIVIDAD: ☒ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA
FACILITADOR: Henry Santiago

DATOS GENERALES

FECHA: 20/12/2025
HORA INICIAL: 3:10pm HORA FINAL: 3:20pm

DATOS DE LOS ASISTENTES				
ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	73167915	Yisel Bascarrigas	Directora de obra	
2	1.140.943.658	Cesar Cano Pualth	P650	
3	1003563237	Benjamin Moreno	operados	Benjamin M
4	1.140.871.808	Joselle Suals J	prof de calidad	Joselle S
5	77.005.323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S
6	1044431656	Rocel Cantillo	operador	Rocel Cantillo
7	9178022	Eduardo Geyman	Residente	Eduardo G
8	72233471	Humberto excoera	ordenero	Humberto E
9	1129485512	Dairo Martinez	operador	Dairo M
10	1065654.538	Liceth Maestric B.	Profesional Social	Liceth B
11	1044392990	Marta Fejera	Ing ambiental	Marta F
12	2950717	Jose Ramirez	Operador	Jose R
13	7357879	Dalys Espino	ordenero	Dalys E
14	1193085301	Andrian Araya	Ing ambiental 2	Andrian A
15	10660407	Gylcen Perez	ay inter	Gylcen P
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Finap 641- Ciénaga Tolima
 TEMA: Reservación de especies endémicas
 TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN CHARLA
 FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 23/12/2023HORA INICIAL: 9:15am HORA FINAL: 9:25am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1140843658	Cesar Cao Puilla	PSO	
2	1044431656	Roliver Cantillo	operador	Roliver Cantillo
3	72005323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
4	1003563257	Benjamin Momo	operador	Benjamin M
5	1065659538	Licth Maestra Bermudez	Profesora Social	Licth M
6	5540871808	Shirley Arevalo	prot de calidad	Shirley A.
7	72233471	Humberto Escobar	codeney	Humberto E.
8	73167915	Yeriel Bourcunegon	Director de obras	Yeriel B.
9	1665608102	Eleen Perez	Ing inter.	Eleen P.
10	9178072	Eduardo Payman	Residente	Eduardo P.
11	73377079	Dorcas España	codinero	Dorcas E.
12	1193065301	Andrian Amayo	Ing apogor	Andrian A.
13	2950717	José Ramirez	Operador	José R.
14	1044300000	Shirley Jara	Ing apogor	Shirley J.
15	1129488512	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
 Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CÓDIGO SST-F44

VERSIÓN: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Anap Vch- Carga Tolero

TEMA: Manejo de Desechos sólidos

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA ☐

FACILITADOR: Henry Santiago

FECHA: 26/12/2025

HORA INICIAL: 11:45am HORA FINAL: 11:55am

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1065659538	Liceth McEstre Brz	Profesora Social	Liceth B.
2	72233471	Humberto Arango	cadenero	Humberto G.
3	134087188	Jorge Luis de	prof. de cult	Jorge L.
4	1065602102	Eulcer Perez	Ing Ambiental	Eulcer P.
5	73167915	Jairal Bolcaynegua	Operador de obra	Jairal B.
6	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M.
7	1140813656	Pepo Caro Ruiz	PBTO	Pepo C.
8	72005323	Henry Santiago	Ing ambiental	Henry S.
9	9178072	Edwardo Guzman	Residente	Edwardo G.
10	1044431656	Raicer Cantillo	operador	Raicer C.
11	2050717	José Ramírez	Operador	José R.
12	7337879	Rubén Espinal	cadenero	Rubén E.
13	1193065301	Andrian Amaro	Ing apoyo 2	Andrian A.
14	112948512	Dairo Martinez	operador	Dairo M.
15	1044582000	Alberto Tejera	Ing apoyo	Alberto T.
16				
17				
18				
19				
20				

Henry Santiago
Firma Responsable



C.R.A.

REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CODIGO: SST-F-04

VERSION: 01

FECHA:

DATOS GENERALES

PROYECTO: Arrayo - Cuzco - Tarma
 TEMA: Control de contaminación del aire
 TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA
 FACILITADOR: Henny Santiago
 FECHA: 30/12/2025
 HORA INICIAL: 4:10pm HORA FINAL: 4:20pm

DATOS DE LOS ASISTENTES

ITEM	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1068608102	Cyteen Perez	Inq Amb Bot	Cyteen P
2	9178072	Eduardo Garzon	Residente	Eduardo G
3	73577879	Deibis Espinoza	codonero	Deibis E
4	1193065301	Andron Araya	Inq apoyo	Andron A
5	1.140.843.675	Pesari Cano	PGSD	Pesari C
6	72233471	Humberto Escobar	codonero	Humberto E
7	8.340.871.808	Thonyello Arenas Soto	prof de calidad	Thonyello A
8	1044431656	Roliver Contrillo	operador	Roliver C
9	1044302000	Abelardo Tejeda	Inq apoyo	Abelardo T
10	1003563237	Benjamin Moreno	operador	Benjamin M
11	73167415	Yeriel Bascunigra	Director de obra	Yeriel B
12	72.005.323	Henny Santiago	Inq ambiental	Henny S
13	2950717	Jose Roman	Operador	Jose R
14	1129488512	Dairo Martinez	Operador	Dairo M
15	1065659.538	Liceth Maestre Bermudez	Profesional Social	Liceth M
16				
17				
18				
19				
20				

Henny Santiago
 Firma Responsable



PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO



EMPRESA

PROGRAMACIÓN DE ORDEN Y ASEO

CÓDIGO: F-MC-14-01

VIGENCIA: JULIO 03 de 2024

REVISIÓN: 0

PÁGINA: 1 de 1

OBRA:				PERIODO:		3/dic/2025		AL: 2/ene/2026	
SEMANA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES DE EJECUCIÓN (NOMBRE/ CARGO/ EMPRESA)	RECURSOS NECESARIOS	¿SE CUMPLE?		OBSERVACIONES			
				SI	NO				
01	Limpieza puntos ecologicos	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Bolsas de colores Recolector	X					
02	Jornada Orden y Aseo	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Limpiador Recolector Escoba	X					
03	Capacitación Manpower	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Video Bean, diapositivas	X					
04	Limpieza Campamento	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Recolector Bolsas	X					
05	Limpieza puntos ecologicos	Henry Santiago Ing ambiental Consortio Ambiental del Atlantico	Bolsas de colores, Recolector	X					
DATOS		RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR HSEQ		RESPONSABLE AMBIENTAL				
NOMBRE		Alberto Tejera	Henry Santiago		Henry Santiago				
FIRMA									



INSPECCIONES AMBIENTALES

		EMPRESA		CODIGO: F-MC-10-28	
		INSPECCIÓN AMBIENTAL		VIGENCIA:	
				REVISIÓN: 1	PAGINA 1 DE 1
SEDE U OBRA:		Arrap León - Cienegras Tolono		FECHA DE INSPECCIÓN: 3/dic/2025 a 6/dic/2025	
CRITERIOS A INSPECCIONAR	CUMPLE			ACCIONES A TOMAR	
	SI	NO	NO APLICA		
1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?			X		
2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?	X				
3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?	X				
4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?	X				
5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?	X				
6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS?	X				
7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?	X				
8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?	X				
9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?			X		
10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS?			X		
11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.			X		
12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES?			X		
13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?			X		
OBSERVACIONES: N/A					
DATOS	RESPONSABLE DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN		RESPONSABLE DE LA OBRA	
NOMBRE	Henry Sanabria	Henry Sanabria		Alberto Teyera	
CARGO	Residente ambiental	Residente ambiental		Residente de obra	
FIRMA					



EMPRESA

INSPECCIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO: F-MC-10-26

VIGENCIA:

REVISIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1

SEDE U OBRA:

Amapa León - Cienega Tolima

FECHA DE
INSPECCIÓN:15/dic/2025 al
20/dic/2025

CRITERIOS A INSPECCIONAR

CUMPLE

SI

NO

NO
APLICA

ACCIONES A TOMAR

1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS
ASEADOS?

X

2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA
LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?

X

3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE
LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?

X

4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA
ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?

X

5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE
IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?

X

6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS
DEFINIDAS?

X

7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS
QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?

X

8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA
ORDENADO Y ASEADO?

X

9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?

X

10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN
LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA
IDENTIFICADOS?

X

11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.

X

12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS,
PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE
COMBUSTIBLES?

X

13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?

X

OBSERVACIONES:

NA

DATOS

RESPONSABLE DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE

Henry Santiago

Henry Santiago

Alberto Tejera

CARGO

Residente ambiental

Residente ambiental

Residente de obra

FIRMA



EMPRESA

INSPECCIÓN AMBIENTAL

CODIGO: F-MC-10-26

VIGENCIA:

REVISIÓN: 1

PAGINA 1 DE 1

SEDE U OBRA:

Aisap León- Carapí Tolmo

FECHA DE
INSPECCIÓN:22/dic/2025 al
23/dic/2025

CRITERIOS A INSPECCIONAR

CUMPLE

SI

NO

NO
APLICA

ACCIONES A TOMAR

1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?
2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?
3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?
4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?
5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?
6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS?
7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?
8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?
9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?
10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS?
11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.
12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES?
13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?

OBSERVACIONES:

N/A

DATOS	RESPONSABLE DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE DE LA OBRA
NOMBRE	Henry Santiago	Henry Santiago	Alberto Teyera
CARGO	Residente ambiental	Residente ambiental	Residente de obra
FIRMA			



EMPRESA
INSPECCIÓN AMBIENTAL

CODIGO: F-MC-10-28

VIGENCIA:

REVISION: 1

PAGINA 1 DE 1

SEDE U OBRA:

Amop León - Ciénaga Tumo

FECHA DE
INSPECCIÓN:

29/dic/2023 a)
2/ene/2024

CRITERIOS A INSPECCIONAR

CUMPLE

SI NO NO
APLICA

ACCIONES A TOMAR

1. EL AREA DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN LOS PISOS ASEADOS?

X

2. EL AREA DE TRABAJO, SE CUENTA CON CANECAS PARA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS?

X

3. EN EL AREA DE TRABAJO SE REALIZA LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS?

X

4. LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS, SE REALIZA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS?

X

5. LAS CANECAS SE ENCUENTRA SEÑALIZADAS?, PERMITE IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR EN ELLA?

X

6. LOS COLORES DE LAS CANECAS CORRESPONDE A LAS DEFINIDAS?

X

7. EN EL AREA DE TRABAJO SE DISPONE DE ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ASEO?

X

8. EL BAÑO DEL AREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA ORDENADO Y ASEADO?

X

9. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA SEÑALIZADA?

X

10. LOS ENVASES Y/O CONTENEDORES QUE ALMACENAN LOS RESIDUOS PELIGROSO, SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS?

X

11. EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE ENCUENTRA ORDENADA.

X

12. LAS AREAS DE TRABAJO PRESENTAN MANCHAS, PRODUCIDAS COMO RESULTADOS DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES?

X

13. SE CUENTA CON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS?

X

OBSERVACIONES: N/A

DATOS

RESPONSABLE DEL TRABAJO

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE

Henry Santiago

Henry Santiago

Alberto Tejeda

CARGO

Residente ambiental

Residente ambiental

Residente de obra

FIRMA




INSPECCIONES VOLQUETAS



PCCA: 00/017/2021

Libero Mingo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
	STOP						✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDALES Y MANIJAS.					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDALES Y MANIJAS						✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS					✓		✓		✓		✓			
	REVERSA						✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, SIN OPACIDAD) LUBRICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD					✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, INFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓			
	SIN RUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNICO MECANICA						✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:																



REC'D: 03/09/2023

5: *Agave* M. *exalt.*

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUZES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS. CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL OINTURON (HERILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PELDAÑOS Y MANUAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRUCY AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PELDAÑOS Y MANUAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPALDO	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ADOBE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIEZA	DOR/DQZ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTE, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORRIAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL FERTILIZANTE Y EL ESTADO DEL KIT DE SOBRANO			✓		✓		✓		✓		✓			
	ELEMTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SI ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TÉCNICA/CÁRGA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Karolín F Karolín F Karolín F Karolín F Karolín F													
FIRMA INSPECTOR SST:			Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Oscar M Karolín F Karolín F Karolín F Karolín F Karolín F													

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-12

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROTECTOR: Arroyo León

PLACA: TVB 946

MODELO: 2015

OPERADOR: Oscar Benitez

RESPONSABLE: Karidán Finkler

S: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNCIONAN	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HERILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, Peldaños y manijas.	✓		✓		✓		FESTIVO		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓			✓		✓				
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓			✓		✓				
	ESTADO DE Peldaños y MANIJAS		✓		✓		✓			✓		✓				
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDO A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm.	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUE	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUE, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAM.	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Oscar B		Oscar B		Oscar B				Oscar B		Oscar B			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karidán F		Karidán F		Karidán F				Karidán F		Karidán F			



ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
	STOP		✓		✓		✓									
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PULGANCOS Y MANILLAS.	✓		✓		✓									
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓									
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓									
	ESTADO DE PULGANCOS Y MANILLAS		✓		✓		✓									
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS	✓		✓		✓									
	REVERSA		✓		✓		✓									
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓									
	RETROVISOR		✓		✓		✓									
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	REVISAR EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓									
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓									
	TRASERAS		✓		✓		✓									
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓									
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓									
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓									
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓									
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓									
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓									
	EXTINTOR		✓		✓		✓									
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓									
	REVISION TECNICO MECANICA		✓		✓		✓									
FIRMA OPERADOR:			García		García		García		García		García					
FIRMA INSPECTOR SST:			Karchin		Karchin		Karchin		Karchin		Karchin					



FICHA: 02/052/1029

B: bays; M: male

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TVB 947

MODELO: 2015

OPERADOR: Edmundo Alvaréz

RESPONSABLE: Karolín Fontalvo


El buque Mi moto

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y	✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN	AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, Peldaños	✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE Peldaños Y MANIJAS	Y MANIJAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTOS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DENTRO	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIEZA	DEBAJO/ATRÁS	PULMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LÍQUIDO HIDRÁULICO DIRECCIÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSIÓN Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Edmundo A. Alvaréz						Karolín F. Fontalvo							
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolín F. Fontalvo						Karolín F. Fontalvo							



4ECMA 01/07:2005

I: female M: male

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PELDAROS Y MANILLAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PELDAROS Y MANILLAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (UMPEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LAMPARA BRIDAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMELA EN BUEN ESTADO, UMPEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINGUIDOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINGUIDOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECANICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:																



SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLUETA

CEC-95-0584.12

WETTERSON: 31

RECEIVED: 01/07/2019

SEMANA DEL: 8/10/2005

AL: 13/12/2025

PROYECTO: Arroz Leche

PLACA: 106943

MODELO:	2015
---------	------

OPERADOR: Eduardo Alvarez

RESPONSABLE: Kordain Fortolun

Re: *Shaw v. Reno* - 11/2/99

E. BAKTO M: 1940																	
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	STOP		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANEJAS.			✓		✓		✓		✓		✓				
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANEJAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS			✓		✓		✓		✓		✓				
	REVERSA		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESPALDOS	LATERALES DERECHOS	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)			✓		✓		✓		✓		✓				
	RETROVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LIMPIEZA	DEBAJO/ ATRAS	PUMELA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓				
GUARDAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO (NO DEFORMADO, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm)			✓		✓		✓		✓		✓				
	TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FORMA DE VINCIONAMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME			✓		✓		✓		✓		✓				
	EXTINTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
DOCUMENTACIÓN	SGT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PONTAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓				
	REVISIÓN TECNICO MECANICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA OPERADOR:			Edmundo A. Echazabal														
FIRMA INSPECTOR SST:			Karibio F. Karibio F. Karibio F. Karibio F. Karibio F.														



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-12

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/07/2025

SEMANA DEL: 6/12/2025

AL: 6/12/2025

PROYECTO: Anillo León

PLACA: TV6 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andry Guzmán Rodríguez

RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CONTENIDOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBERILLAS. (LUBRIFICACIÓN SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS)					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
	STOP						✓		✓		✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANILLAS.					✓		✓		✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS						✓		✓		✓		✓			
PISTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PISTOS					✓		✓		✓		✓			
	REVERSA						✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) (CORRECCIÓN ACORDE A SU NECESIDAD)					✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR						✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, INFLACIÓN, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2MM					✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)					✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCIÓN						✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS						✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO						✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUEM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUEM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERIVAME					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR						✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE FOLIOS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE					✓		✓		✓		✓			
	REVISIÓN TECNOCOMERCIAL						✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR:							Andry G		Andry G		Andry G		Andry G			
FIRMA INSPECTOR SSE:							Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

VERSION: 01

RECIN: 02/07/2025

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLAC: TV8950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andrys Goeman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolén Fortino Q

El: Bueno M: Malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISIÓN INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO. VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, PEDAÑOS Y MANILLAS.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS		✓		✓		✓				✓		✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DCH/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DETRÁS/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
PLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LÍQUIDO HIDRÁULICO DIRECCIÓN		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUÍN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PÓLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:			Andrys G		Andrys G		Andrys G				Andrys G		Andrys G			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolén F		Karolén F		Karolén F				Karolén F		Karolén F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-12

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

SEMANA DEL: 8/12/2025

AL: 13/12/2025

PROYECTO: Airport León

PLACA: TUB 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andrys Guzmán Rodríguez

RESPONSABLE: Karolain Fontalvo Q.

8: turno M: noche

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCE	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	STOP				✓		✓		✓		✓		✓			
REVISION INTERNA	ASENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDAÑOS Y MANILLAS.			✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PEDAÑOS Y MANILLAS				✓		✓		✓		✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTO			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVERSA				✓		✓		✓		✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DERE/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
	RETROVISOR				✓		✓		✓		✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRÁS	ILLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	DELANTERAS	Verificar Sin cortes, pinchaduras, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 3mm			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)			✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE				✓		✓		✓		✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO				✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	ROTORUM	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL ROTORUM, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR				✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE			✓		✓		✓		✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA				✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA OPERADOR					Andrys G		Andrys G		Andrys		Andrys G		Andrys G			
FIRMA INSPECTOR SST:					Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F		Karolain F			



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-12

VERSION: 01

FECHA: 06/07/2025

SEMANA DEL: 29/12/2025

AL: 2/12/2026

PROYECTO: Arca de León

PLACA: TUB 950

MODELO: 2015

OPERADOR: Andys Guzman Rodriguez

RESPONSABLE: Karolín Farblus Q.

B: bueno M: malo

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, (LIBERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIDAS)	✓		✓		✓						✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓						✓			
	STOP		✓		✓		✓						✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (BIELAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PEDALOS Y MANILAS.	✓		✓		✓						✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓						✓			
	CITADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓						✓			
	ESTADO DE PEDALOS Y MANILAS		✓		✓		✓						✓			
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		✓		✓						✓			
	REVERSA		✓		✓		✓						✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPieza, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓						✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓						✓			
LIMPIA BRISA	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓						✓			
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓						✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓						✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS. (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓						✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓						✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓						✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓						✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓						✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		✓		✓						✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓						✓			
DOCUMENTACI ON	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓						✓			
	REVISION TECNICA/CAMICA		✓		✓		✓						✓			
FIRMA OPERADOR:			Andys G		Andys G		Andys G				Andys G		Andys G			
FIRMA INSPECTOR SST:			Karolín F		Karolín F		Karolín F				Karolín F		Karolín F			



INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

VOLUME 11

VOLUME 11

2019年11月29日

8-10 years: 1.00 million

[illegible]



FILE# 010072025

St. Ignace, Md.: private.

[illegible]

[illegible]



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

Código: SST-F-12

Versión: 01

Fecha: 01/07/2020

SEMANA DEL: 22/12/2025

AL: 27/12/2025

PROYECTO: Arroyo León

PLACA: TVC 042

MODELO: 2015

OPERADOR: Angel Nazir Altamir

RESPONSABLE: Kordain Fortalvo

B: bueno M: male

ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
	STOP		✓		✓		✓				✓		✓			
REVISION INTERNA	ASIENTOS	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMON, PULGONES Y MANGUERA.	✓		✓		✓				✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMON		✓		✓		✓				✓		✓			
	ESTADO DE PULGONES Y MANGUERA		✓		✓		✓				✓		✓			
PTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PTO	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVERSA		✓		✓		✓				✓		✓			
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ.	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	RETROVISOR		✓		✓		✓				✓		✓			
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓				✓		✓			
ILANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN CORTES, DEFORMACIONES, LARRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓				✓		✓			
	TRASERAS		✓		✓		✓				✓		✓			
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR.	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓				✓		✓			
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓				✓		✓			
	TENSION Y DESGASTE DE CORDONES		✓		✓		✓				✓		✓			
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓				✓		✓			
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DESEMBAQUE	✓		✓		✓				✓		✓			
	EXTINTOR		✓		✓		✓				✓		✓			
DOCUMENTACION	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓				✓		✓			
	REVISION TECNOMECANICA		✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA OPERADOR:																
FIRMA INSPECTOR SST:			Kordain F	Kordain F	Kordain F				Kordain F	Kordain F						



FDC-4A 01/07/2025

M LUNES M MARTES M MIERCOLES M JUEVES M VIERNES M SABADO M DOMINGO M																	
ITEM	CONCEPTO	CRITERIOS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		✓		✓										
	TRASERAS		✓		✓		✓										
	STOP		✓		✓		✓										
REVISIÓN INTERNA	AGENTES	VERIFICAR ESTADO DEL AGENTE, VERIFICAR	✓		✓		✓										
	CINTURÓN DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN	✓		✓		✓										
	ESTADO Y AJUSTE DEL TIMÓN	(HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL TIMÓN, Peldaños	✓		✓		✓										
	ESTADO DE Peldaños Y MANIJAS.	Y MANIJAS.	✓		✓		✓										
INTOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTOS	✓		✓		✓										
	REVERSA		✓		✓		✓										
ESPEJOS	LATERALES DCH/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		✓		✓										
	RETROVISOR		✓		✓		✓										
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRÁS	PLUJILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		✓		✓										
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO, PROFUNDIDAD, SIN COSTES, DEFORMACIONES, LABRADO NO INFERIOR A 2mm	✓		✓		✓										
	TRASERAS		✓		✓		✓										
MOTOR	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		✓		✓										
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		✓		✓										
	NIVEL LIQUIDO HIDRAULICO DIRECCION		✓		✓		✓										
	TENSIÓN Y DESGASTE DE CORREAS		✓		✓		✓										
	SIN FUGAS DEL FLUIDO		✓		✓		✓										
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓										
	EXTINTOR		✓		✓		✓										
DOCUMENTACIÓN	SOAT	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE POLIZAS Y SEGUROS SE ENCUENTRE VIGENTE	✓		✓		✓										
	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		✓		✓		✓										
FIRMA OPERADOR:			Angel Nieves		Angel Nieves		Angel Nieves				Angel Nieves						
FIRMA INSPECTOR SST:			Karlhin F		Karlhin F		Karlhin F				Karlhin F						



INSPECCIONES RETRO CAT 320D2



MINISTERIO DE
TRANSPORTE
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-13

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 3/19/2025

INSPECTOR: Jose Daza

AREA: Arraigo León

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
FITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Jose Daza

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fontalvo



MINISTERIO DE
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-P-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 5/12/2025

INSPECTOR: Jose Doraci

AREA: Arranque

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariña

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	SECUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FLUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

José Doraci

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain Fariña

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-33 VERSION: 03 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 9/12/2025		INSPECTOR: Jose Dorci			
AREA: Araya León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Fontelari			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D2		MODELO: 2014	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	ILUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Dorci					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Fontelari					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-12			
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSIÓN: 01			
		FECHA: 02/07/2025			
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Jose Daza			
AREA: Arrab León		PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fombalio			
INFORMACION DEL EQUIPO:					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 300 D2	MODELO: 2014			
C: conforme NC: no conforme *IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LOCADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN PURGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: MA					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Daza			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobin F.		

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: IST-F-11 Version: 01 Fecha: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Jose David			
AREA: Arraigal León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariño			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 300 D2		MODELO: 2014	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LUZ ADICIONAL		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PI. MILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAMIE	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAMIE		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose David					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fariño					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: IST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPEC OR: Jose Dorca			
AREA: Airoto León		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 320 D2	MODELO: 2014			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VORIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEOPRECISIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRIGAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA.	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LARRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Dorca		FIRMA DEL RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código SST-F-13		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025		INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme N/A: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER./IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER./IZQ. ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Jose Ramirez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-13	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/01/2025	
FECHA DE INSPECCION: 20/12/2025		INSPECTOR: Jose Rodolfo Ramirez			
AREA: Arrap León		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Farfán			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Oxidador		MARCA: MT 320D2		MODELO: 2014	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VORIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIQUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHO	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHO/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: <i>Jose Ramirez</i>					
FIRMA DE RESPONSABLE: <i>Karolín Farfán</i>					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 23/12/2025

ÁREA: Arroyo León

INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 D2

MODELO: 2014

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELBDO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MÉCANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

José Ramirez

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain F

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>CENTRO REGISTRAL DE ARICA</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 26/12/2005		INSPECTOR: Jose Rodrigo Ramirez			
AREA: Arica Leon		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320 D2	MODELO: 2014			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP			☒	
	LIQUADORA		☒		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURON DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZD	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	FLUMILLA EN BL, EN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: <i>José Ramírez</i>					
FIRMA DE RESPONSABLE: <i>Karolén Fontalvo</i>					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SS-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: JORGE RODRIGO RAMIREZ			
AREA: Arroyo Leon		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.D2	MODELO: 2014		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	UCUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELUCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERECHA/IZQUIERDA ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: JORGE RAMIREZ					
FIRMA DEL RESPONSABLE: KARLAÍN FONTALVO					



INSPECCIONES RETRO CAT 320D

 SEGURO DE CREDITO C.R.A. <small>Corporación de Riesgo</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SSF-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 03/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 3/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Cienaga Istmo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariña			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 300D	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforma NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUMIGADAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUCIADORA		✓		
CABINA	ASENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARE Y TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLI MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: P/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.		



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SSF-F-11

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSIÓN: 03

FECHA: 02/02/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 5/12/2025

INSPECTOR: Benjamin Moreno

AREA: Cerro del Talamo

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fortino

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme SA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI GRABADO) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	FLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Benjamin Moreno

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain Fortino

 SEGURO DE VIDA C.R.A.		SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 03/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Aerodromo Toluca		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fendler			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karlaín Fendler					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD C.R.A.		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Carga Torero		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
(INFORMACION DEL EQUIPO)					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme FA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) Y UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontalvo					

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SSR-F-01	
FECHA DE INSPECCIÓN: 13/12/2025		INSPECTOR: Benjamín Moreno		VERSION: 03	
ÁREA: Carga Látex		PERSONA RESPONSABLE: Karolín Jaramila		FECHA: 02/07/2025	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP		☒		
	LICUADORA		☒		
CABINA	ASENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamín Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolín Jaramila					

 SEGURO C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Genígena Totumo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontelva			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 D		MODELO: 2013	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIQUILCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MÉCANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontelva					

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-23			
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01			
FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025		FECHA: 02/07/2025			
AREA: <u>Manejo Terreno</u>	INSPECTOR: <u>Benjamin Moreno</u>	PERSONA RESPONSABLE: <u>Karolina Fontello</u>			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: <u>excavadora</u>	MARCA: <u>CAT 320 D</u>	MODELO: <u>2013</u>			
C: conforme NC: no conforma IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: <u>N/A</u>					
FIRMA DE OPERADOR: <u>Benjamin Moreno</u> FIRMA DE RESPONSABLE: <u>Karolina Fontello</u>					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-13 Versión: 03 Fecha: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 20/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Generador Torneo		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Lombardo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320D		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUZ ADICIONAL		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIMUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE: Karolain Lombardo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-J-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 01/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 23/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Gerencia Técnica		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalba			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 D	MODELO: 20B		
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fontalba					

 C.R.A. <small>Comisión Reguladora de Actividad</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE M. AQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 26/12/2025		INSPECTOR: Benjamin Moreno			
AREA: Canga Toleno		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Jorbal			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320 D	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELUCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: P/A					
FIRMA DE OPERADOR: Benjamin Moreno			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Jorbal		



MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSION: 06

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025

INSPECTOR: Benjamín Moreno

AREA: Cerroja Totemo

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Forbulo

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320D

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI DEFORMACION) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Benjamín Moreno

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE

Karolén F



INSPECCIONES RETRO CAT 320GX

SEGURO		C.R.A.		SEGURO		C.R.A.	
SEGURO				C.R.A.			
SEGURO				C.R.A.			
SEGURO				C.R.A.			
FECHA DE INSPECCION: 3/12/2025				INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Area 606				PERSONA RESPONSABLE: Karolyn Fortaluo			
EQUIPO: Excavadora				MARCA: CAT 920-EX			
				MODELO: 2022			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica							
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO				
			C	NC	NA		
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓				
	TRASERAS		✓				
	STOP		✓				
	LICUADORA		✓				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VEHICULO.	✓	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓				
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓				
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓				
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓				
	REVERSA		✓				
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, SIN OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓				
	RETROVISOR		✓				
UMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓				
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓		
	TRASERAS				✓		
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓				
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓				
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓				
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓				
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓				
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓				
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓				
	EXTINTOR		✓				
	KIT DE DERRAME		✓				
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓				
Observaciones: N/A							
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez							
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolyn F							

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
FECHA DE INSPECCION: 8/12/2025		INSPECTOR: Dario Martinez			
AREA: Arran leon		PERSONA RESPONSABLE: Karoben Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA				
CABINA	ASIEN TO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIEN TO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLAQUILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Dario Martinez FIRMA DE RESPONSABLE: Karoben F

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: 557-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Martinez			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.6X		MODELO: 2022	
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEBULLA DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Karlaín Fontalvo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Darío Martínez			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora	MARCA: CAT 320.6X	MODELO: 2022			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Darío Martínez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arica y León		PERSONA RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 EX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DERECHA/IZQUIERDA	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NEOPRECIPITACION) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
UMPIA BRISAS	DEBAJO/ATRAS	PUJILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karlaín Fontalvo					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-14	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 03	
				FECHA: 02/07/2023	
FECHA DE INSPECCION: 16/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Martinez			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 EX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LIJADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENNO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PELLICULA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELOTAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F					



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-F-11

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 18/12/2025

INSPECTOR: Darro Martinez

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fariako

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 G

MODELO: 2022

C: conforme NC: no conforma NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR:

Darro Martinez

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Karobin F

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 GX	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	LUCADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIREFLEJO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDALES Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CILINDRADA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARRETERA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 23/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fontalvo			
B. INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Osmadora		MARCA: 320 Gx CAT	MODELO: 2022		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DEBAJO/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PEDALES Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL FLUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARCA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-01	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCIÓN: 26/12/2025		INSPECTOR: Darío Martínez			
AREA: Arrasado		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalba			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320.6X		MODELO: 2022	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEMS A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	D./ LANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	SEÑALIZADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUECO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER./IZQ.	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER./IZQ./ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	D./ LANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMINOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA C/ JOHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL FLUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARRA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Darío Martínez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain F.					

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 02/05/2015	
FECHA DE INSPECCION: 30/12/2025		INSPECTOR: Dairo Martinez			
AREA: Arraigo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fonblau			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 GX	MODELO: 2017		
C: conforme NC: no conforme IA: no aplica					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP		✓		
	ILUMINADORA			✓	
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARETE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCOS DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DERAZO/ ATRÁS	PLACA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA			
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Dairo Martinez					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén F.					



INSPECCIONES RETRO CAT 320 DH

 C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-F-11		
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA	VERSION: 01		
			FECHA: 02/07/2025		
FECHA DE INSPECCIÓN: 3/12/2025		INSPECTOR: Rolcer Contillo			
AREA: Amop León		PERSONA RESPONSABLE: Karobén Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora	MARCA: CAT 320 DII	MODELO: 2013			
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHEBILLO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
RITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rolcer Contillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobén F					

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-13 VERSION: 01 FECHA: 01/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 05/12/2025		INSPECTOR: Rober Castiblanco			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fariña			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 DII	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforma NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO. VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL, ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	FELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rober Castiblanco			FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolain Fariña		

		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11	
		INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01	
				FECHA: 03/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 9/12/2025		INSPECTOR: Rainer Contrillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolina Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Excavadora		MARCA: CAT 320 DH	MODELO: 2013		
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PATE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
FITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS FITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: NA					
FIRMA DE OPERADOR: Rainer Contrillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolina F.					

 SEGURO DE VIDA Y SALUD EN EL TRABAJO C.R.A.		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 03/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 11/12/2025		INSPECTOR: Rober Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karobin Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 DH		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	UCUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NO OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rober Cantillo					
FIRMA DEL RESPONSABLE: Karobin F.					

 SEGURO DE VIDA C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-11 VERSION: 01 FECHA: 02/07/2025	
FECHA DE INSPECCION: 13/12/2025		INSPECTOR: Rocio Cantillo			
AREA: Arroyo León		PERSONA RESPONSABLE: Karolena Fontalvo			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320DII		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNCIONAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PAÑUELO TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Rocio Cantillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karolena F.					

 SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: SST-F-11			
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		VERSION: 01			
FECHA DE INSPECCIÓN: 16/12/2025		FECHA: 02/07/2025			
AREA: <u>Airway León</u>		INSPECTOR: <u>Rocío Carrillo</u>			
PERSONA RESPONSABLE: <u>Karolín Fontalvo</u>		INFORMACIÓN DEL EQUIPO:			
EQUIPO: <u>Excavadora</u>	MARCA: <u>CAT 320C-DH</u>	MODELO: <u>2013</u>			
<small>C: conforme NC: no conforme NA: no aplica</small>					
ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	☒		
	TRASERAS		☒		
	STOP			☒	
	LIQUADORA		☒		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	☒		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		☒		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		☒		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		☒		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	☒		
	REVERSA		☒		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	☒		
	RETROVISOR		☒		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ATRAS	PUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	☒		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			☒
	TRASERAS				☒
MECANICA	PEDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	☒		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		☒		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	☒		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		☒		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		☒		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		☒		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	☒		
	EXTINTOR		☒		
	KIT DE DERRAME		☒		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	☒		
Observaciones: <u>N/A</u>					
FIRMA COOPERADOR: <u>Rocío Carrillo</u>					
FIRMA DEL RESPONSABLE: <u>Karolín Fontalvo</u>					



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-4-11

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

VERSION: 01

FECHA: 03/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 18/12/2025

AREA: Arroyo León

INSPECTOR: Róger Cantillo

PERSONA RESPONSABLE: Karolén Fariña

EQUIPO: excavadora

MARCA: CAT 320 D4

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme TA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBRILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Róger Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolén Fariña



C.R.A.
COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 03/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/12/2025

INSPECTOR: Racer Cantillo

ÁREA: Arramp León

PERSONA RESPONSABLE: Karolain Fontalvo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320 DH

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Racer Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karolain F

 SEGURO C.R.A. <small>COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD</small>		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA		Código: SST-F-31 Versión: 01 Fecha: 02/07/2023	
FECHA DE INSPECCIÓN: 23/12/2023		INSPECTOR: Roxas Cantillo			
AREA: Atitaya León		PERSONA RESPONSABLE: Karoben Fontalvo			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: excavadora		MARCA: CAT 320 D4		MODELO: 2013	
C: conforme NC: no conforme NA: no aplica					
ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/ IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLI MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		
Observaciones: N/A					
FIRMA DE OPERADOR: Roxas Cantillo					
FIRMA DE RESPONSABLE: Karoben F					



C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-P-11

Versión: 01

Fecha: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCION: 26/12/2025

AREA: Amoy Leon

INSPECTOR: Rocio Cantillo

PERSONA RESPONSABLE: Karolena Cantillo

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 300 DH

MODELO: 20B

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ITEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LICUADORA				
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURON (HEBILLAS, PARRILLAS ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCION DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACION ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRAS	PL. MALLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISION		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACION	CERTIFICADO DE INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACION AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR: Rocio Cantillo

FIRMA DEL RESPONSABLE: Karolena Cantillo



COMISIÓN REGULADORA DE ACTIVIDAD
C.R.A.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA

Código: SST-F-11

VERSION: 01

FECHA: 02/07/2025

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/12/2025

INSPECTOR: Racer Castillo

AREA: Arroyo León

PERSONA RESPONSABLE: Karobón Fariello

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Excavadora

MARCA: CAT 320DII

MODELO: 2013

C: conforme NC: no conforme NA: no aplica

ELEMENTOS	ÍTEM A REVISAR	CRITERIOS	ESTADO		
			C	NC	NA
LUCES	DELANTERAS	FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLAS, CUBIERTA SIN ROTURA, LUCES NO FUNDIDAS	✓		
	TRASERAS		✓		
	STOP			✓	
	LIQUADORA		✓		
CABINA	ASIENTO	VERIFICAR ESTADO DEL ASIENTO, VERIFICAR ESTADO DE LAS PARTES DEL CINTURÓN (HEBILLAS, PARTE TEXTIL ENTRE OTRAS) Y AJUSTE Y EL ESTADO DEL VIDRIO.	✓		
	CINTURÓN DE SEGURIDAD		✓		
	ANTIHUELCO DE LA CABINA		✓		
	PROTECCIÓN DE LA CABINA (MALLA O VIDRIO)		✓		
PITOS	PRINCIPAL	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PITOS	✓		
	REVERSA		✓		
ESPEJOS	LATERALES DER/IZQ	VERIFICAR ESTADO (LIMPIEZA, SIN ROTURA, NI OPACIDAD) UBICACIÓN ACORDE A SU NECESIDAD	✓		
	RETROVISOR		✓		
LIMPIA BRISAS	DER/IZQ/ ATRÁS	PLUMILLA EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA Y ESTRUCTURA	✓		
LLANTAS	DELANTERAS	VERIFICAR SU ESTADO PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN			✓
	TRASERAS				✓
MECANICA	PELDAÑOS Y PASAMANOS	VERIFICAR EL ESTADO, Y ESTRUCTURA	✓		
	ESTADO DE LA CUCHARA Y SUS SOPORTES		✓		
HIDRAULICO	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	VERIFICAR QUE LOS NIVELES DE LOS FLUIDOS, SEAN LOS ADECUADOS (REPORTAR SI SE VEN FUGAS)	✓		
	NIVEL DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN		✓		
	NIVEL DEL SISTEMA HIDRAULICO		✓		
	NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE		✓		
EQUIPOS DE EMERGENCIA	BOTIQUIN	VERIFICAR EL ESTADO, ELEMENTOS DEL BOTIQUIN, FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR Y EL ESTADO DEL KIT DE DERRAME	✓		
	EXTINTOR		✓		
	KIT DE DERRAME		✓		
DOCUMENTACIÓN	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS DE CARGA	VERIFICAR CERTIFICACIÓN AVALADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	✓		

Observaciones: N/A

FIRMA DE OPERADOR

Racer Castillo

FIRMA DEL RESPONSABLE

Karobón Fariello



INSPECCIONES BOTIQUIN Y CAMILLA



MINISTERIO DE SALUD
C.R.A.
CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN

FORMATO
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

CODIGO: 887-F-47

VERSION: 01

FECHA: 02/01/2025

Nombre de quien inspecciona:	Kardario Sotillo Q	Fecha de inspección:	15/12/2025
Ubicación del botiquín:	Ciudad del Tumo	Ubicación camilla:	
Marque con una X según las condiciones observadas:			
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	✓	NO
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	✓	NO
Localizado en lugar visible?	SI	✓	NO
El botiquín se encuentra señalizado?	SI	✓	NO

Buena	B	Regular	R	-	Mala	M	-	No tiene	NT	No aplica	NA
-------	---	---------	---	---	------	---	---	----------	----	-----------	----

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES								
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios		B	R	M	NT	NA	Cantidad	Observaciones
1	Estado del botiquín	✓					5	
2	Gautes de látex / nitrilo	✓					1	
3	Lodopovidona solución	✓					1	
4	Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓					1	
5	Gasa estéril	✓					1	
6	Venda elástica	✓					1	
7	Tapabocas	✓					1	
8	Españadrapo micropore	✓					1	
9	Algodón	✓					1	
10	Curas	✓					1	
11	Bajalenguas	✓					1	
12	Parches oculares					✓		
13	Termómetro de mercurio o digital					✓		
14	Tijera trauma	✓					1	
15	Linterna	✓					1	
16	Alcohol acético	✓					1	
17	Tensiómetro					✓		

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA						
Descripción del elemento		B	R	M	NT	NA
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓				
2	Señalización	✓				
3	Estado del soporte	✓				
4	Correas de seguridad	✓				
5	Sujetadores para agente	✓				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Otras observaciones:



MINISTERIO DE SALUD
C.R.A.
COSTA RICA

FORMATO
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

CODIGO 0017.07

VERSION 01

FECHA 02/07/2025

Nombre de quien inspecciona:	Karoline Fariñas Q	Fecha de inspección:	13/12/2025
Ubicación del botiquín:	Área 1037	Ubicación camilla:	
Marque con una X según las condiciones observadas:			
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI ☒ NO ☐	Localizado en lugar visible?	SI ☒ NO ☐
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI ☒ NO ☐	El botiquín se encuentra señalizado?	SI ☒ NO ☐

Bueno B - Regular R - Malo M - No tiene NT No aplica NA

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES							
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios		B	R	M	NT	NA	Cantidad
1	Estado del botiquín	☒					5
2	Guantes de látex / nitrilo	☒					1
3	Lodopovidona solución	☒					1
4	Solución salina 250 cc ó 500 cc	☒					1
5	Gasa estéril	☒					1
6	Venda elástica	☒					1
7	Tapebocas	☒					1
8	Esparadrapo micropore	☒					1
9	Algodón	☒					1
10	Curets	☒					1
11	Bajalenguas	☒					1
12	Parches oculares					☒	
13	Termómetro de mercurio o digital					☒	
14	Tijera trauma	☒					1
15	Linterna	☒					1
16	Alcohol séptico	☒					1
17	Tensiómetro					☒	

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlos (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA						
Descripción del elemento		B	R	M	NT	NA
1	Instalación (Sitio de ubicación)	☒				
2	Señalización	☒				
3	Estado del soporte	☒				
4	Correas de seguridad	☒				
5	Sujetadores para agarre	☒				
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	☒				

Otras observaciones:



FHC24A-072072025

CARGO: Inspector SST

HORA: 9:45am

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NT: NO TIENE N/A: NO APLICA

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANÓMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANUERA	BOQUILLA	MANGA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipropósito	Av. León	20lb	06-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

OBSERVACIONES:

FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: *Karlaio F.*



INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE ELECTRICIDAD
C.R.A.

INSPECCION DE EXTINTORES

COORD. SST-F-28

VERSION: 01

FECHA: 03/07/2015

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Karolain Fontalvo Q.

CARGO: Inspector SST

FECHA: 19/12/2025

HORA: 3:00pm

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NT: NO TIENE N/A: NO APLICA


Nº	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR									OBSERVACIONES	
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANEJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO		VISIBILIDAD
1	<u>Multiproposito</u>	<u>Cuencop Totumo</u>	<u>20lb</u>	<u>06-2026</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
OBSERVACIONES:															
FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCION: <u>Karolain F.</u>															


ANEXO 9. BITACORA DE OBRA


Arroyo León

Se continúan actividades de limpieza y recuperación ambiental del tramo adicional del principal del arroyo León, específicamente entre las abscisas K1+330 a K1+230 costado derecho Ciénaga del Totumo.

Continúan trabajos de limpieza y recuperación ambiental en Sector 2 acceso al río, mediante el retiro de vegetación acuática, a través de excavación sobre plancher.

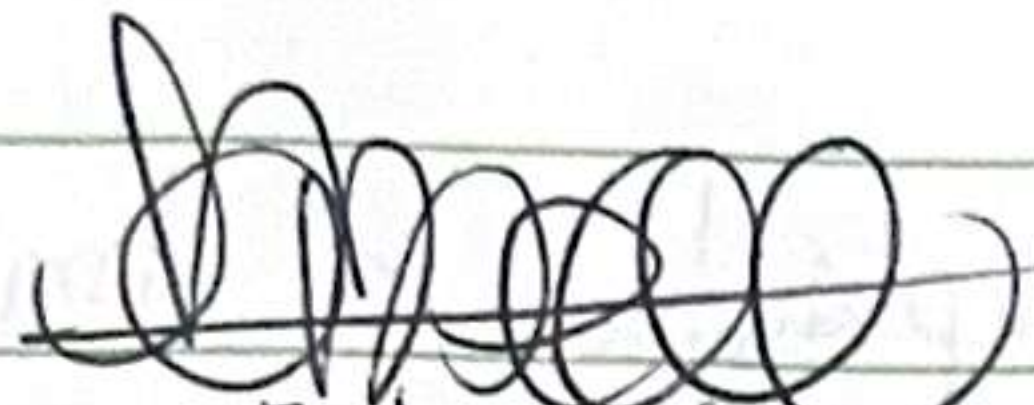
Res. Interventora


Res. de obra


Ing. de Apoyo

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Clima: seco

Maquinaria: (3) Excavadoras

(2) cadenero

Personal: (1) Res. de obra

(1) Ing. Ambiental

(1) Res. de interventora

(1) prof. Social

(1) Ing. de Apoyo

(2) Ayudantes

(2) Topógrafo


(3) Operadores


→ Arroyo León

Se realizó actividad de trazado y replanteo del adueño al tramo auxiliar (brazo) entre K0+000 hasta K0+100, puntos de falda izquierdo, derecho.

Se realizan trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adueño del tramo principal entre abscisas K1+230 hasta K1+180. Esto incluye limpieza, recuperación mecánica, conformación de la sección transversal del cauce.

Se hizo evacuación de 32 viajes en volquetes de 16 m³ cada uno destinadas al transporte de residuos sólidos hacia botadero ECONORCSING.


Res. de obra

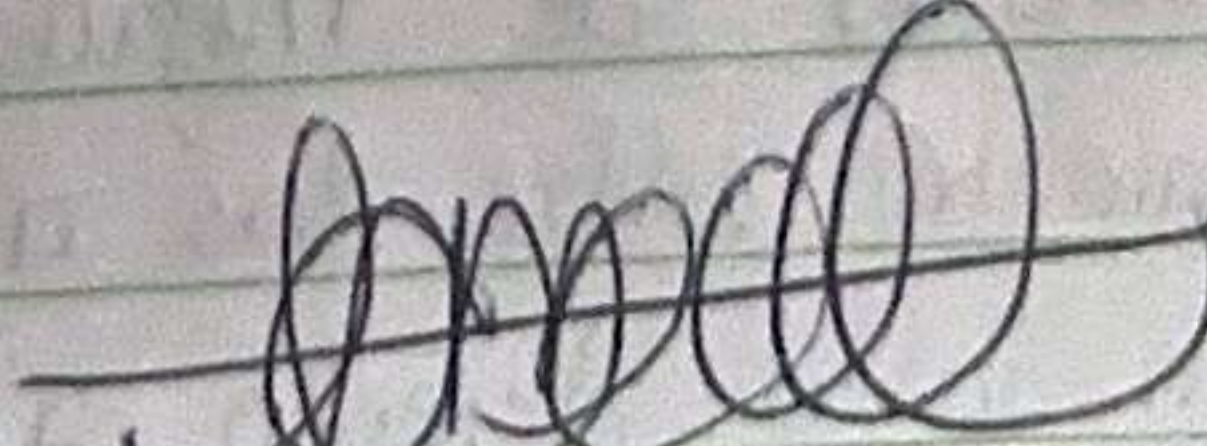
Res. de Inter


Ing. de Apoyo

Jueves, 04 de diciembre 2025

Clima: seco

Maquinaria: (3) Excavadoras, (4) Volquetas


Personal: (1) Res de obra (2) cadeneros
(1) Res de Inter (3) operadores
(2) Ing de Apoyo (1) Inspector
(2) Topografo (4) conductores


→ Arroyo León

* Se realizan actividades de trazado y replantes al tramo auxiliar, específicamente entre las abscisas K0+100 hasta K0+300, tomando puntos en talud izquierdo, derecho y fondo

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K1+180 a K1+050 costado izquierdo

* Salen de obra 32 viajes de 16 m³ con residuos de excavación sólidos y orgánicos; logrando disponer 512 m³


Res de Interventoría


Res de Obra


Ing de Apoyo

Viernes, 05 de diciembre 2025

Clima: seco

Maquinaria: (3) Excavadoras (4) Volquetas


Personal: (1) Res de obra (2) Cadenero (2) Ing Amb
(1) Res de Inter (3) operadores (2) prof SST
(2) Ing de Apoyo (1) Inspector (1) prof Social
(2) Topografos (4) conductores

→ Arroyo León

* Se realizan actividades de trazado y replanteo al tramo auxiliar, específicamente entre las abscisas K0+300 al K0+400 tomando puntos en talud derecho, izquierdo y fondo


* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental

en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K1+000 hasta K0+900, Mediante el uso de excavadora en costado Izquierdo
 * se evacuan 32 viajes de volqueta cada una de 16 m³ dispuestas en el botadero autorizado (Ecuavores) logrando disponer 512 m³ en total



Res de Interventoria

Eduardo Guzman
 Res de Obra



Ing de Apoyo

Sabado 06 de diciembre 2025

Clima: Seco

Maquinaria: (3) Excavadoras (4) Volquetas

Personal: (1) Res de obra (2) Caridenero

(1) Res de Inter (3) Operadores


(2) Ing de Apoy (1) Inspector

(2) Topografos (4) Condutores


→ Arroyo León

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K0+900 al K0+800 en costado izquierdo, mediante el uso de excavadoras
 * se realiza actividades del plan PMA, plan SST y sociales por parte de las partes involucradas


* se realiza la evacuación de 32 viajes de volquetas cada una de 16 m³ dispuestas en el botadero autorizado (Ecuavores) logrando disponer 512 m³ en total



Res de obra




Res de Interventoria




Ing de Apoyo

Domingo 07 de diciembre

Día No Laboral



Res de obra



Res de Interventoria



Ing de Apoyo

lunes 08 de diciembre 2025

Día no Laboral

Eduardo Logman
Res de obra

Res de interventoria

Inq de Apoyo

Martes 09 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras (4) Volquetas

Personal : (1) Res de obra (2) Caranero (2) prof ambiental
(1) Res de Inter (3) operador (2) prof SST
(2) Inq de Apoyo (4) Conductor (1) prof Social
(2) Topografos (1) Inspector

→ Arroyo León

* Se realizan Actividades de trazado y Replanteo de los Tramos Adicionales tramo Auxiliar, específicamente entre las abscisas K0+00 hasta K0+520, tomando puntos del talud izquierdo, Fondo y Derecho

* Se llevan a cabo trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K0+00 al K0+700, en costado izquierdo, utilizando excavadoras

* Se realiza seguimiento a las actividades del PMT, Plan SST y plan social

* Se realiza la evacuación de 32 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, logrando disponer 512 m³

Res de interventoria

Eduardo Logman
Res de obra

Inq de Apoyo

Miércoles 10 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras , (4) Volquetas


Personal : (1) Res de obra (2) Cadenero (2) Prof ambiental
 (1) Res de Interventoria (3) Operadores (2) Prof SST
 (2) Ing de apoyo (4) conductor (2) prof social
 (2) Topografos (1) Inspector

→ Arroyo León


* Se realiza seguimiento actividades de trazado y replanteo de la adición al tramo auxiliar con el fin de realizar seguimiento y control de cantidades ejecutadas hasta la fecha

* Trabajos de limpieza y recuperación ambiental en la adición Tramo principal, específicamente entre las abscisas K0+200 hasta K0+300 en costado izquierdo, mediante el uso de excavadoras


* Se realiza la evacuación de 32 viajes en Volquetas de 16 m³ cada una, logrando disponer 512 m³ de material, el cual fue llevado hasta un Botadero Autorizado



Res de Inter



Res de Obra



Ing de Apoyo

Jueves 11 de diciembre 2025


Clima : Soleado

Maquinaria : (3) excavadoras ; (4) Volquetas


Personal : (1) Res de obra (2) Cadeneros
 (1) Res de Inter (3) Operadores
 (2) Ing de Apoyo (4) conductor
 (2) Topografos (1) Inspector

→ Se llevan a cabo trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K0+600 al K0+500 en costado izquierdo, mediante el uso de excu


* Se realiza la evacuación de 32 viajes de Volquetas de 16 m³ cada una, logrando disponer un total de 512 m³ de Material a botadero autorizado



Res de Interventoría



Res de obra



Ing de Apoyo

Viernes, 12 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Personal : (1) Res de obra (3) Operadores

(1) Res de Inter (4) Conductores

(2) Ing de Apoyo (2) Cadeneros


(2) Topografo (1) Inspector

Maquinaria : (3) Excavadoras, (4) Volquetas


Arroyo León

* Continúan las actividades de limpieza y recuperación ambiental en el tramo Adicional, específicamente entre las abscisas K+500 hasta la K+400, en costado izquierdo utilizando excavadoras


* Se realiza la evacuación de 32 viajes de Volquetas cada una de 16 m³, logrando disponer 512 m³ de Material al botadero autorizado.



Res de Inter



Res de obra



Ing de Apoyo

Sábado, 13 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras, (4) Volquetas

Personal : (1) Res de obra (3) Operadores

(1) Res de Inter (4) Conductores

(2) Ing de Apoyo (2) Cadeneros


(2) Topografo (1) Inspector


Arroyo León

* No se realizan actividades de excavación debido al mantenimiento de la maquinaria

* Se realiza la evacuación de 20 viajes de Volquetas cada una de 16 m^3 , logrando disponer un total de 320 m^3 de residuos


Eduardo Guzmán
Res de Obra


Res de Interventoría



Ing de Apoyo

Domingo 14 de diciembre 2025

Día no laboral


Res de Interventoría

Eduardo Guzmán
Res de Obra


Ing de Apoyo

Lunes 15 de diciembre 2025

Clima: Soleado

Maquinaria: (3) Excavadora, (4) volquetas

Personal: (1) Res de Obra (3) operadores

(1) Res de Inter (4) Conductores

(2) Ing de Apoyo (2) cadeneros


(2) Topógrafo (1) Inspector


Arroyo León

* Continúan las actividades de limpieza y recuperación ambiental en el tramo Adicional, específicamente entre las abscisas K0+400 o hasta K0+300 en costado izquierdo utilizando excavadora

* Se realiza la evacuación de 36 viajes en Volquetas de 16 m^3 cada una, logrando disponer 576 m^3 de residuos provenientes del Tramo Auxiliar (Brazo) en donde se encontró mayor volumen

Eduardo Guzmán
Res de obra


Res de Interventoría


Ing de Apoyo

Martes, 16 de diciembre 2025

Clima: Soleado

Maquinaria: (3) Excavadora, (4) Volquetas

Personal: (1) Res de obra (1) Inspector

(1) Res de Inter (4) conductores


(2) Cadeneros (3) operadores


(2) Ing de Apoyo (2) Topografos

Arroyo León

* Se realiza Seguimiento actividades de frizado y replanteo del tramo Adicional que se está interviniendo, todo esto con el fin de realizar el control de cantidades ejecutadas hasta la fecha
* continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo Adicional, específicamente entre las abscisas K+300 al K+200, en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavador.
* Se realizó la evacuación de 36 viajes de Volquetas de 16 m³ cada una, logrando disponer 576 m³

Gerardo Guzman
Res de obra


Res de Interventoría


Ing de Apoyo

Miércoles, 17 de diciembre 2025

Clima: Soleado

Maquinaria: (3) Excavadoras (4) Volqueta

Personal: (1) Res de obra (1) Inspector

(1) Res de Inter (2) cadeneros

(2) Ing de Apoyo (3) operadores

(2) Topografo (4) Conductores

Arroyo León


* Se realiza seguimiento actividad de frizado y replanteo de la adición al tramo auxiliar (brazo) del arroyo León, con el fin de realizar seguimiento y control a las cantidades ejecutadas hasta la fecha y conocer el avance que lleva el proyecto. Al cierre del presente informe, se definen

logramientos topográficos y se demarcan zonas de corte

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre abscisas K0+200 al K0+100, en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavadora

* Se realizó la evacuación de 28 viajes de volqueta de 16m³ cada una, logrando disponer 448m³

Eduardo Lagman
Res de obra


Ros de Interventoría


Ing de Apoyo

Jueves 18 de diciembre de 2021

Clima: Soleado

Maquinaria: (3) excavadora, (4) volqueta


Personal: (1) Res de obra (1) Inspector
(1) Res de Inter (2) Cadenero
(2) Ing de Apoyo (3) Operadores
(2) Topógrafo (4) Conductores

Arroyo León

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K0+100 al K0+000, en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavadora

* Se realizó la evacuación de 36 viajes de volqueta de 16m³ cada una, logrando disponer 576m³

Eduardo Lagman
Res de obra


Ros de Interventoría


Ing de Apoyo

Viernes 19 de diciembre de 2021

Clima: Soleado

Maquinaria: (3) excavadora, (4) volquetas


Personal: (1) Res de obra (1) Inspector
(1) Res de Inter (2) Cadenero
(2) Ing de Apoyo (3) Operadores


(2) Topografo (4) Conductores

Arroyo León

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K0+500 al K0+400, en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavadora.

* Se realizó la excavación de 32 viajes de volqueta de $16m^3$ cada una, logrando disponer $512m^3$.

Eduardo Goyman
Res de obra

Res de Interventor


Ing de Apoyo

Sabado 20 de diciembre 2025

Clima: soleado

Maquinaria: (3) Excavadora (4) Volquetas

Personal: (1) Res de obra (1) Inspector

(1) Res de zócalo (2) Cadenero

(2) Topografo (3) operador

(2) Ing de Apoyo (4) Conductor


Arroyo León

* Se realiza mantenimiento a maquinaria que esta llevando a cabo las labores de limpieza en el tramo adicional.

* Se realizó la excavación de 32 viajes de volquetas de $16m^3$ cada una, logrando disponer $512m^3$.


Eduardo Goyman
Res de obra


Res de Interventor


Ing de Apoyo

Domingo 21 de diciembre 2025

Día no laboral

Eduardo Goyman
Res de obra

Res de Interventor


Ing de Apoyo

Lunes 22 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras , (4) Volquetas

Personal : (1) Res de obra (1) Inspector
 (1) Res de Inter (2) cadenero
 (2) Topografo (3) operador
 (2) Ing de Apoyo (4) conductor

Arroyo León

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional específicamente entre las abscisas K0+400 al K0+300, en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavadora

* Se realizó la evacuación de 36 viajes en volquetas de 16 m³ cada una, logrando disponer 576 m³

Edmundo Aguilar
Res de obra

[Signature]
Res de interventoria

[Signature]
Ing de Apoyo

Martes 23 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras , (4) Volquetas

Personal : (1) Res de obra (2) Ing de Apoyo (2) Prof Ambiental
 (1) Res de Inter (1) Inspector (2) Prof SST
 (2) Topografo (3) Operadores (1) Prof Social
 (2) Cadeneros (4) Conductores

Arroyo León

* Se realiza seguimiento actualizado de avance y replanteo del tramo adicional que se está interviniendo, todo esto con el fin de realizar el control de cantidades hasta la fecha

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional específicamente entre las abscisas K0+300 hasta K0+200 en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavadora

* Se realizó la evacuación de 36 viajes en volqueta

de $16m^3$ cada una, logrando disponer $576m^3$

Eduardo Luyman
Res de obra


Res de Interventoria


Ing de apoyo

Miércoles 24 diciembre 2025

Clima: Soleado

Maquinaria: (3) Excavadoras, (4) Volquetes

Personal: (1) Res de obra (1) Inspector
(1) Res de Refer (2) cadenero
(2) Ing de Apoyo (3) operador
(2) Topografo (4) Conductor


Arrayo León


* Se realiza seguimiento actividades de trazado y replanteo del tramo adicional que se está interviniendo, todo esto con el fin de realizar el control de controlables ejecutados hasta la fecha

* Continúan los trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisas K0+200 al K0+100, en costado izquierdo mediante el uso de retroexcavadora

* Se realizó la excavación de 20 volquetes de $16m^3$ cada una, logrando disponer ~~576~~ $320m^3$

Eduardo Luyman
Res de obra


Res de Interventoria



Ing de apoyo

Jueves, 25 de diciembre 2025

Día no Laboral

Eduardo Luyman
Res de obra

Res de Interventoria


Ing de apoyo

/ / / / /

Viernes 26 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria: (3) Excavadoras, (4) Volquetas

Personal : (1) Res de obra (1) Inspector

(1) Res de Inter (2) Codenero


(2) Ing de Apoyo (3) Operador


(2) Topografo (4) Conductor


Arroyo León

* Se realiza trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisa K0+100 al K0+050 en costado izquierdo mediante el uso de excavadoras

* Se realiza la evacuación de 32 viajes de Volquetas cada una de 16 m³ logrando disponer 512 m³


Res de Inter


Res de obra


Ing de Apoyo

Sábado 27 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadora, (4) Volquetas

Personal (1) Res de obra (1) Inspector

(1) Res de Inter (2) Codenero

(2) Ing de Apoyo (3) Operador

(2) Topografos (4) Conductor

Arroyo León


* Se realizan trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional, específicamente entre las abscisa K0+050 al K0+000 en costado izquierdo mediante el uso de excavadoras

* Se realiza la evacuación de 28 viajes de Volquetas

Cada una de 16 m³, logrando disponer 448 m³ de Material de residuos y excavaciones


Res de Inter

Eduardo Guzman
Res de obra


Ing de Apoyo

Domingo, 28 de diciembre 2025

Dia no Laboral

Res de Inter

Eduardo Guzman
Res de obra


Ing de Apoyo

Lunes, 29 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadora (4) Volquetas


Personal : (1) Res de obra (1) Inspector
(1) Res de Inter (2) Cadenero
(2) Topografo (3) operador
(2) Ing de apoyo (4) Conductor


Arroyo León

* Se realizan trabajos de limpieza y recuperacion ambiental en el tramo adicional de arroyo leon (principal), especificamente entre las abscisas K0+000 hasta K0+080 costado derecho mediante el uso de excavadoras

* Se realiza la evacuacion de 32 viajes de Material producto de las excavaciones, en Volquetas de 16m³ Cada una logrando evacuar 512 m³ de material

Eduardo Guzman
Res de obra

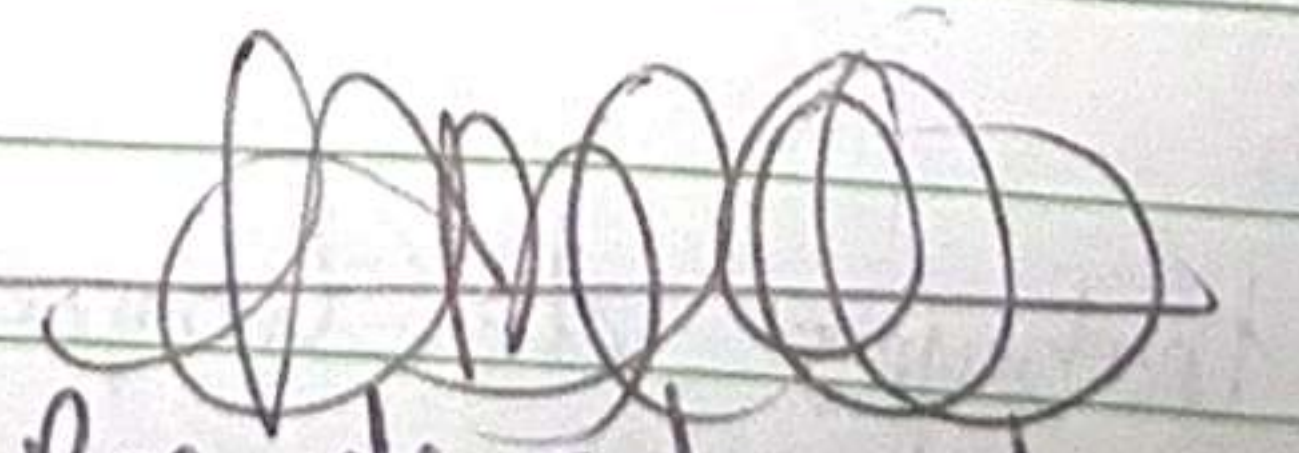
Res de Interventoria


Ing de Apoyo

Martes, 30 de diciembre de 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras , (4) Volquetas


Personal : (1) Res de obra (1) Inspector
(1) Res de Inter (2) Carcinero
(2) Topografo (3) operador
(2) Ing de Apoyo (4) Conductor


Arroyo León

* Se realizan trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional de arroyo León (principal) específicamente entre las abscisas K0+080 hasta K0+150 costado derecho mediante el uso de excavadoras

* Se realizó la evacuación de 32 Vapes de Material producto de las excavaciones, en volquetas de 16 m³ cada una logrando disponer 512 m³ de Material

Eduardo Laguarda
Res de obra


Res de Interventoría


Ing de Apoyo

Miércoles, 31 de diciembre 2025

Clima : Soleado

Maquinaria : (3) Excavadoras (4) Volquetas

Personal : (1) Res de obra (1) Inspector
(1) Res de Inter (2) Carcinero
(2) Topografo (3) operador
(2) Ing de Apoyo (4) Conductor

Arroyo León

* Se realiza trabajos de limpieza y recuperación ambiental en el tramo adicional del arroyo León (principal) específicamente entre las abscisas K0+150 al K0+200 costado derecho mediante el uso de excavadora

* Continua la evacuación de 16 ~~Volques~~ Volques de Material
 producto de excavaciones, en Volquetas de 16 m^3 Cada una
 Logrando evacuar 256 m^3

Eduardo Guzman
 Res de obra

~~Res de obra~~
 Res de obra

~~Ing de Apoyo~~
 Ing de Apoyo

JUEVES, 01 DE ENERO 2026

Día no laboral

~~Res de Inter~~
 Res de Inter

~~Res de Obra~~
 Res de Obra

~~Ing de Apoyo~~
 Ing de Apoyo.

Viernes, 02 de enero 2026

Día no laboral

~~Res de Inter~~
 Res de Inter

~~Res de Obra~~
 Res de Obra

~~Ing. de apoyo~~
 Ing. de apoyo.

ANEXO 10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

Id	Unidades	Cantidades	Duración	Costo	% completado	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	<div><div>J</div><div>Semestre 2, 2025</div><div><div>J</div><div>A</div><div>S</div><div>O</div><div>N</div><div>D</div><div>Semestre 1, 2026</div><div>E</div><div>F</div><div>M</div></div></div>												
1		0	181,5 días	\$ 8.264.923.639,95	77%	jue 3/07/25	sáb 28/02/26			<div><div></div><div>3/07</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>												
2		1	0 días	\$ 0,00	0%	jue 3/07/25	jue 3/07/25		3													
3		1	5 días	\$ 0,00	0%	jue 3/07/25	mié 9/07/25	2	5FC+4 días													
4		0	10 días	\$ 0,00	100%	mar 15/07/25	sáb 26/07/25		19CC+4 días													
5		2	4 días	\$ 0,00	100%	mar 15/07/25	vie 18/07/25	3FC+4 días	6FC+1 día;90													
6		0	5 días	\$ 0,00	100%	lun 21/07/25	sáb 26/07/25	5FC+1 día	7CC													
7		4	5 días	\$ 0,00	100%	lun 21/07/25	sáb 26/07/25	6CC	15													
8		0	172,5 días	\$ 6.032.881.392,84	76%	mar 15/07/25	sáb 28/02/26															
9	m2	112589,47	128 días	\$ 227.745.973,17	100%	mar 15/07/25	mié 31/12/25	5CC														
10	m3	111655,24	138 días	\$ 3.164.599.805,22	81%	mié 30/07/25	vie 27/02/26	15	11CC+10 día													
11	m3 - km	429723,44	129 días	\$ 750.254.154,20	57%	mié 13/08/25	sáb 28/02/26	10CC+10 días	12CC													
12	m3	33100,29	106 días	\$ 1.890.281.460,25	63%	mié 13/08/25	mié 25/02/26	11CC	17FF-5 días;16FF-42													
13		0	164,5 días	\$ 1.228.159.400,00	100%	mar 15/07/25	mié 18/02/26															
14	m2	48500	128 días	\$ 72.255.300,00	100%	mar 15/07/25	mié 31/12/25	5CC														
15	Und	1	2 días	\$ 26.516.750,00	100%	lun 28/07/25	mar 29/07/25	7	10													
16	m2	48500	90 días	\$ 1.102.870.600,00	100%	mié 3/09/25	mié 31/12/25	12FF-42 días														
17	Und	1	2 días	\$ 26.516.750,00	100%	mar 17/02/26	mié 18/02/26	12FF-5 días														
18		0	173 días	\$ 1.003.882.847,11	54%	lun 14/07/25	sáb 28/02/26															
19	Muestra	21	24 días	\$ 30.743.649,30	57%	sáb 19/07/25	lun 5/01/26	4CC+4 días	20FF													

Proyecto: Programacion Inicial
Fecha: vie 23/01/26

- Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
-
- Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

-
- Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

-
- Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso


-
- Progreso manual

ANEXO 11. PLANOS Y CARTERAS TOPOGRAFICAS


Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME MENSUAL No. 6	
Versión 1		

Anexo No. 10.9. Planos y carteras topográficas.


10.9.1. Planos de localización trazado y replanteo tramo adicional




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

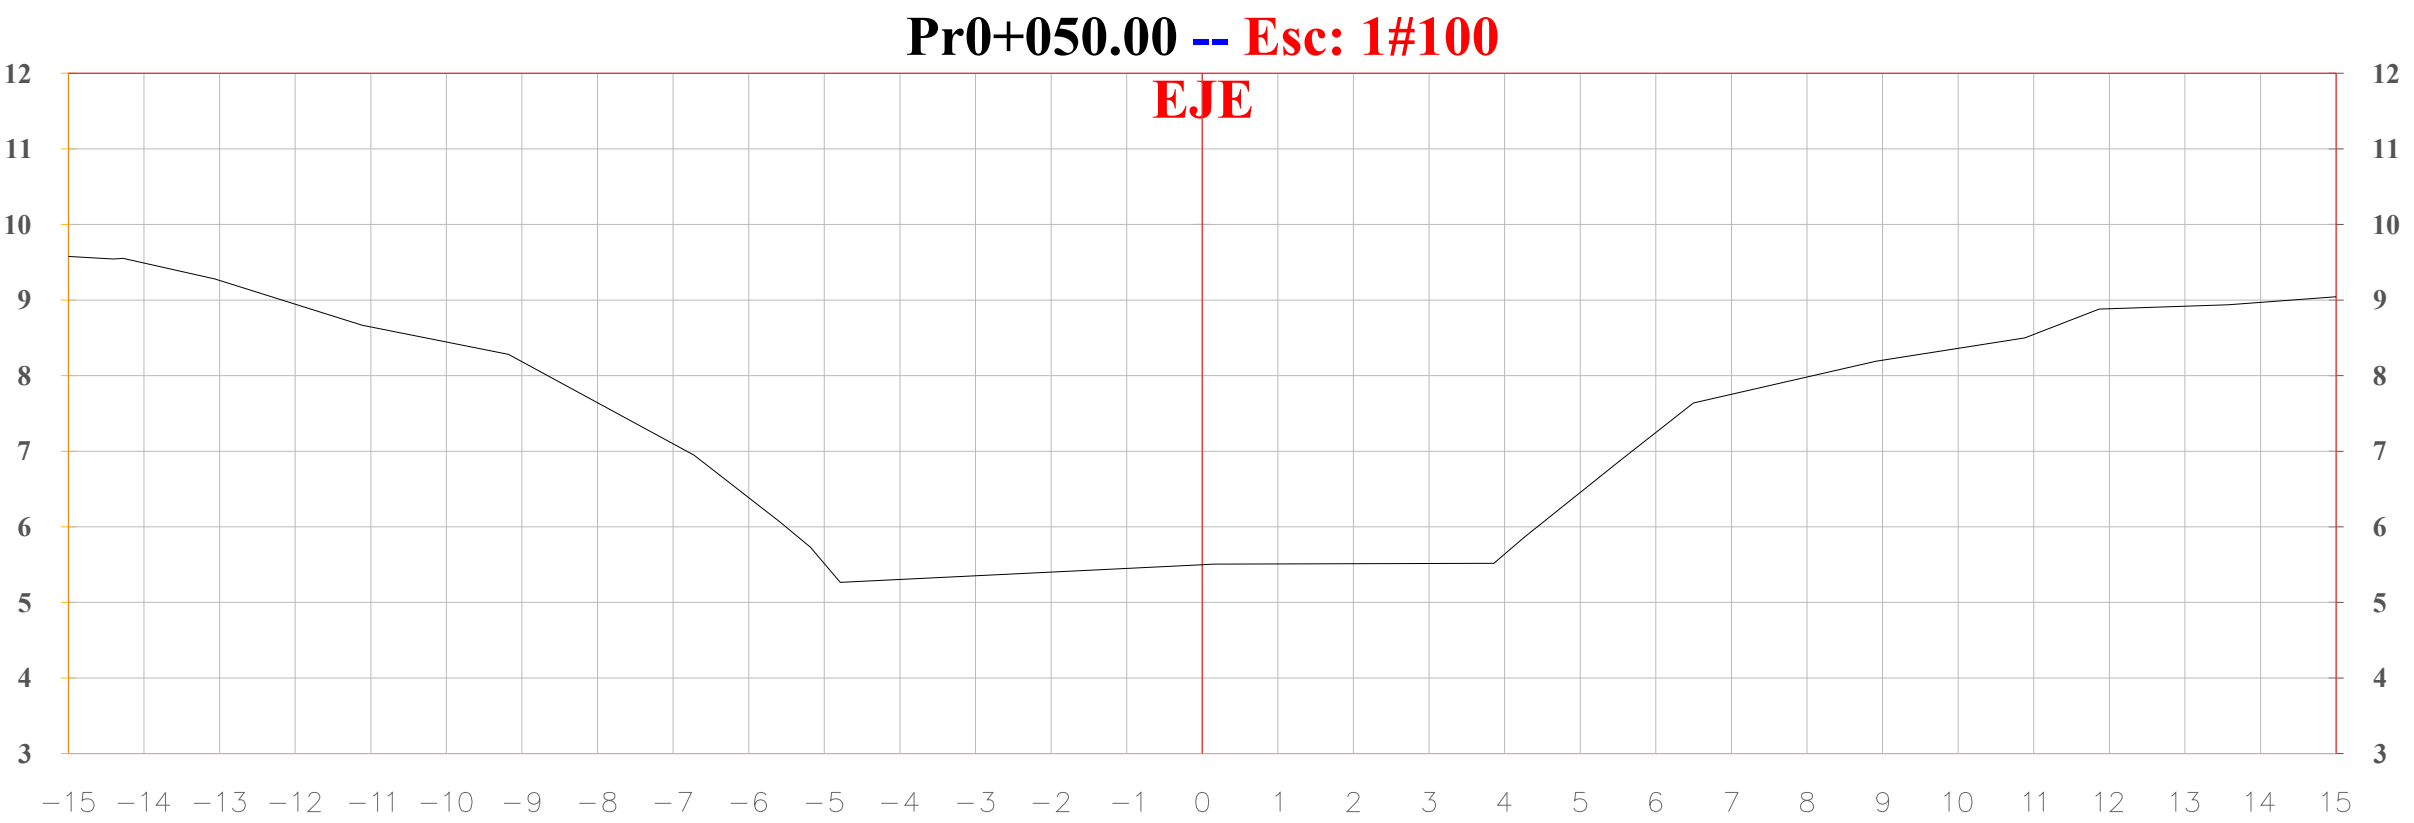

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

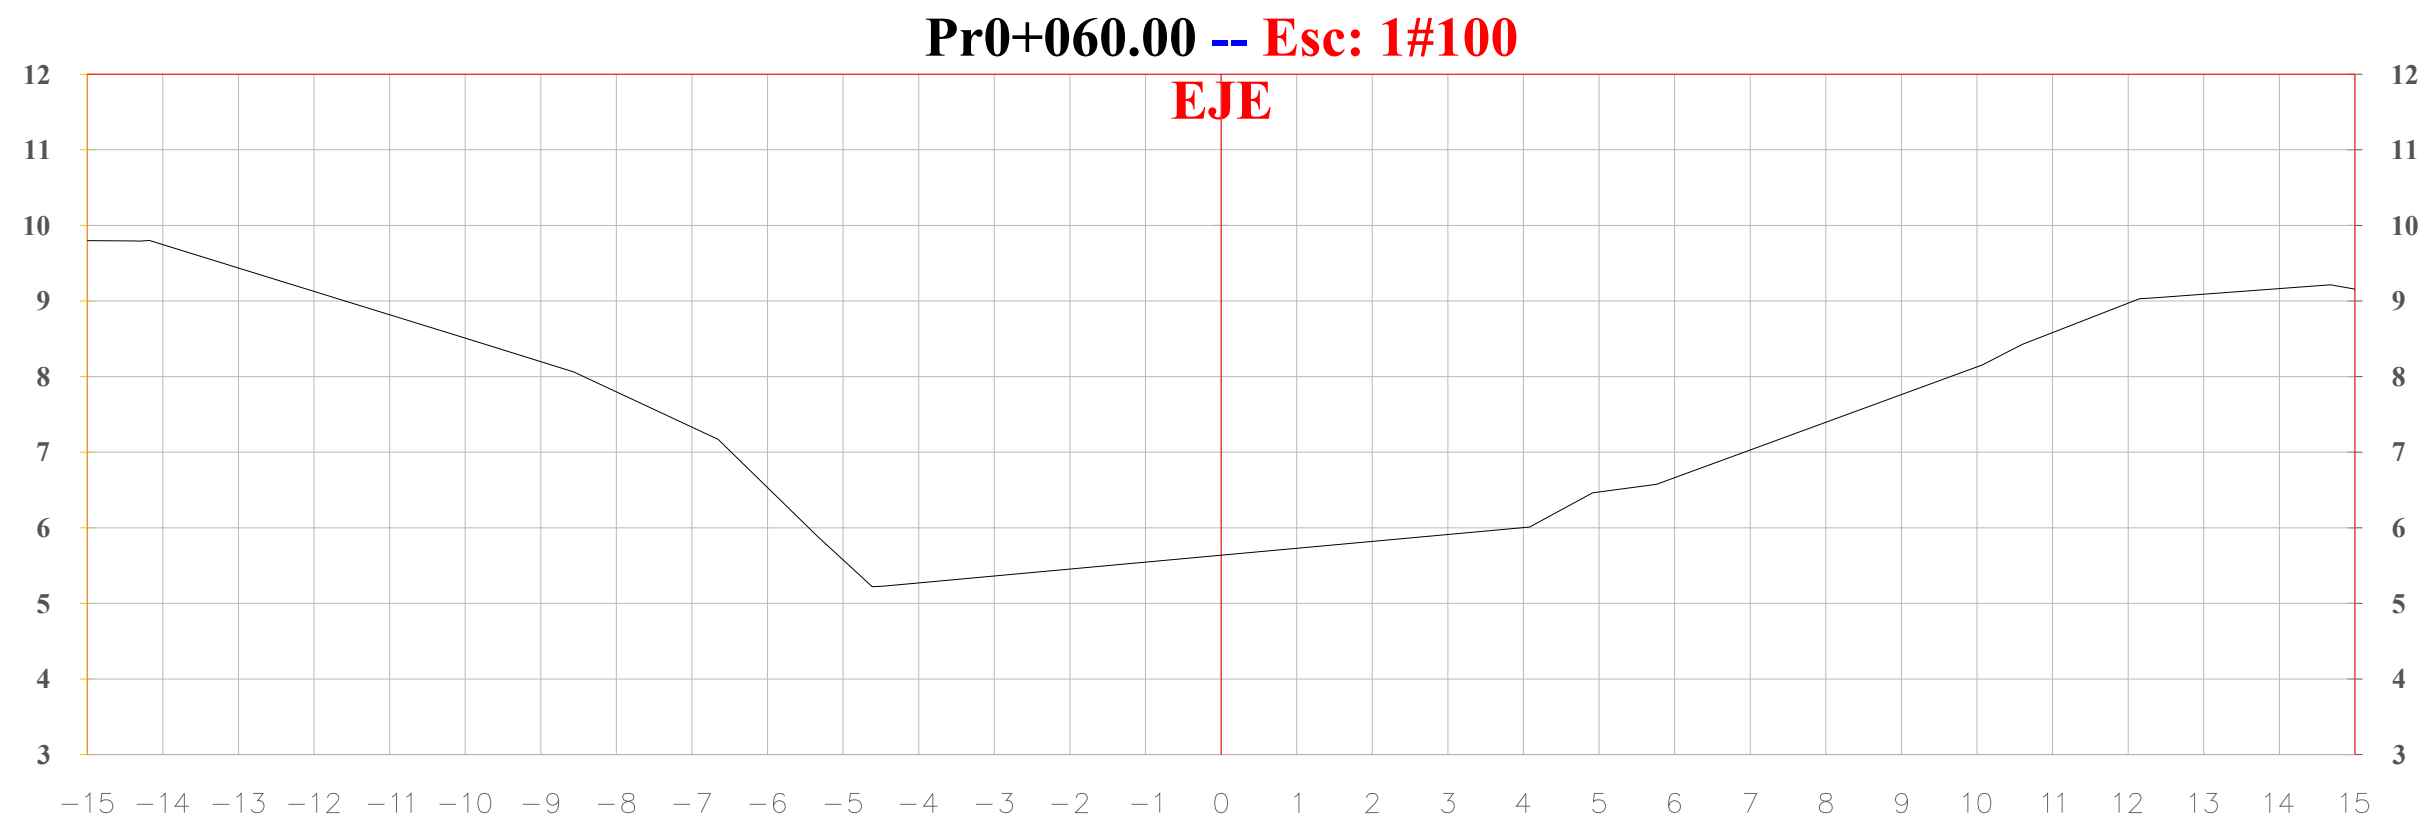

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

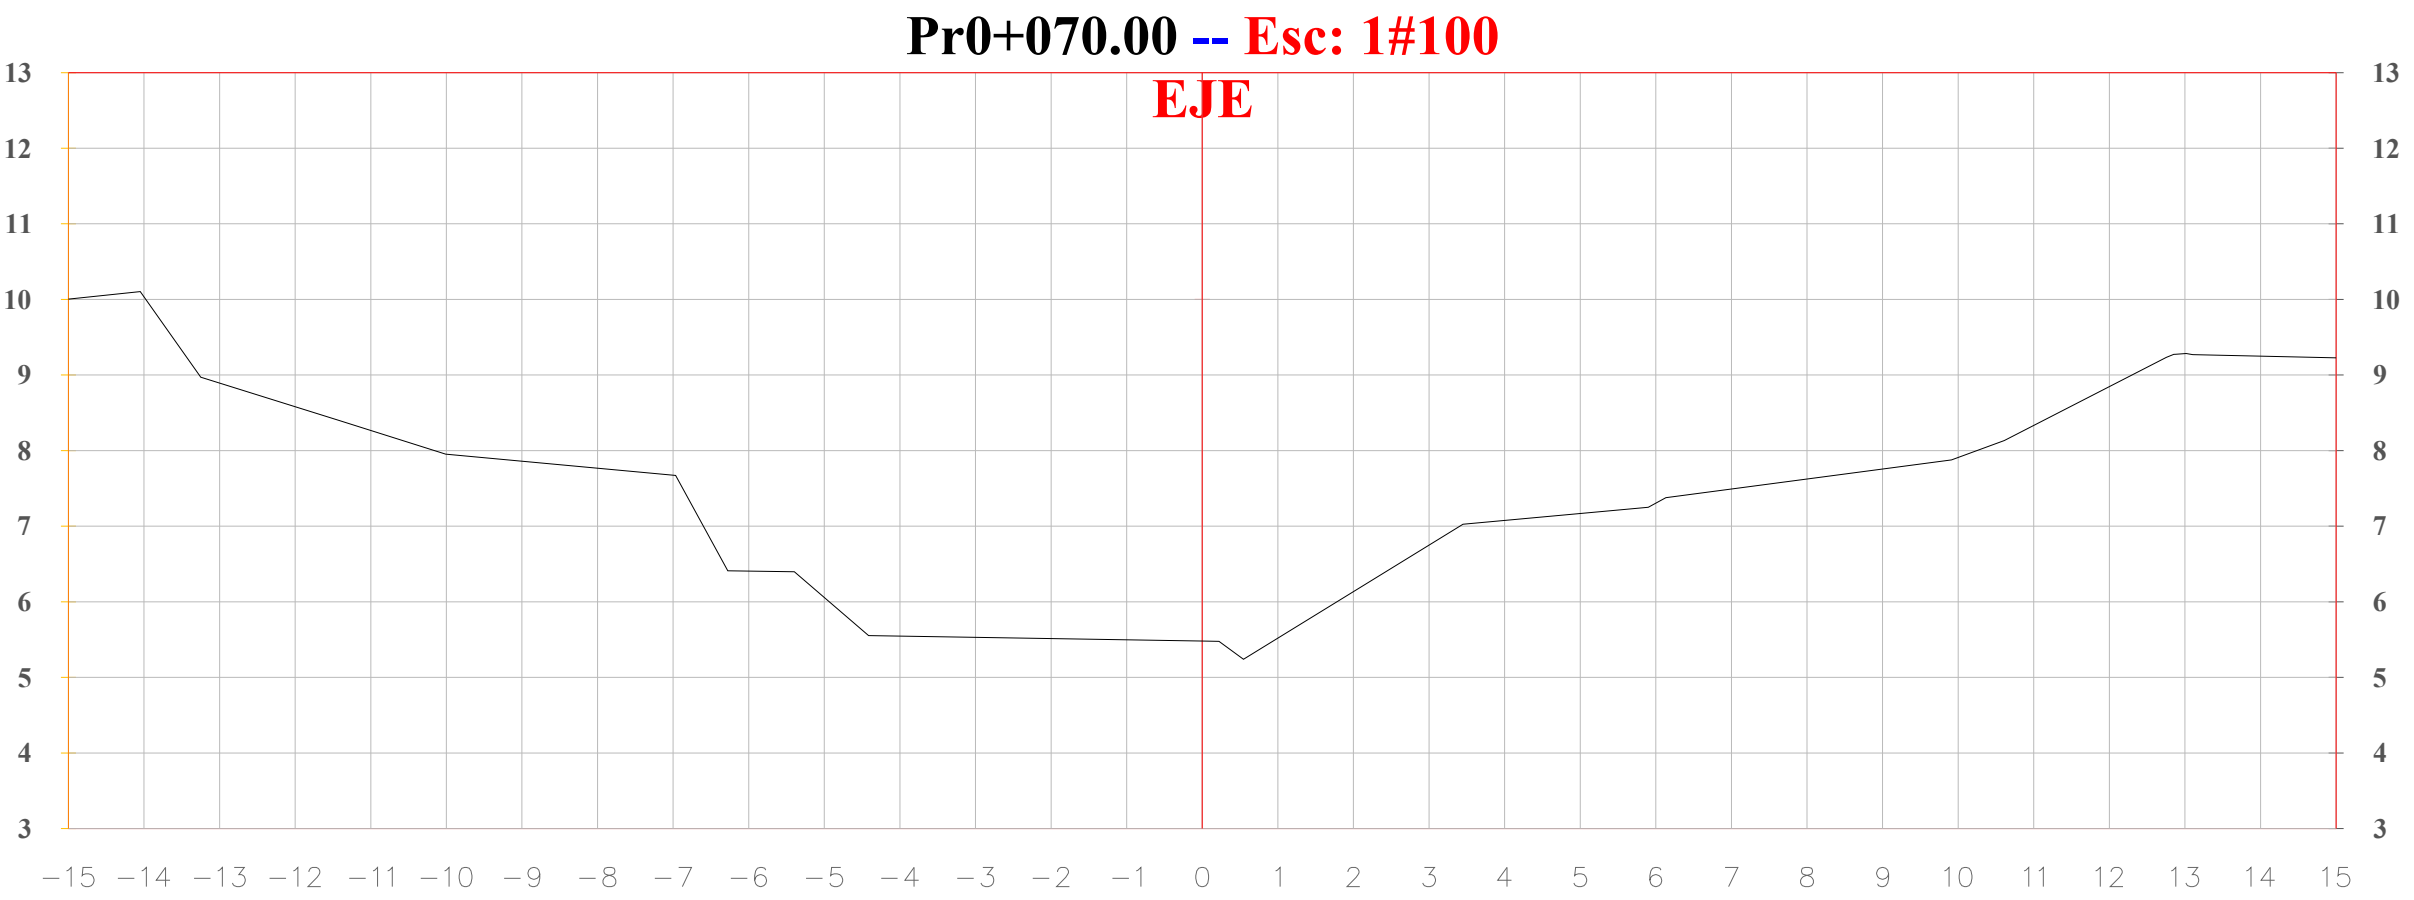

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
[Firma]
GRANIELLA LARREA SARRACENY FARRICA
Mat. Profesional 02-22799

Director de Obra:
[Firma]
YESSICA MARCELO GARCÍA JARAMA
Mat. Profesional 2302-001990617

Topógrafo Interventor:
[Firma]
Jesús A. BARRERA
Mat. Profesional 02-16073

Director de Interventoría:
[Firma]
MARCELO BERNARDO GONZÁLEZ
Mat. Profesional 0303-00156457

MODIFICACIONES	
I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

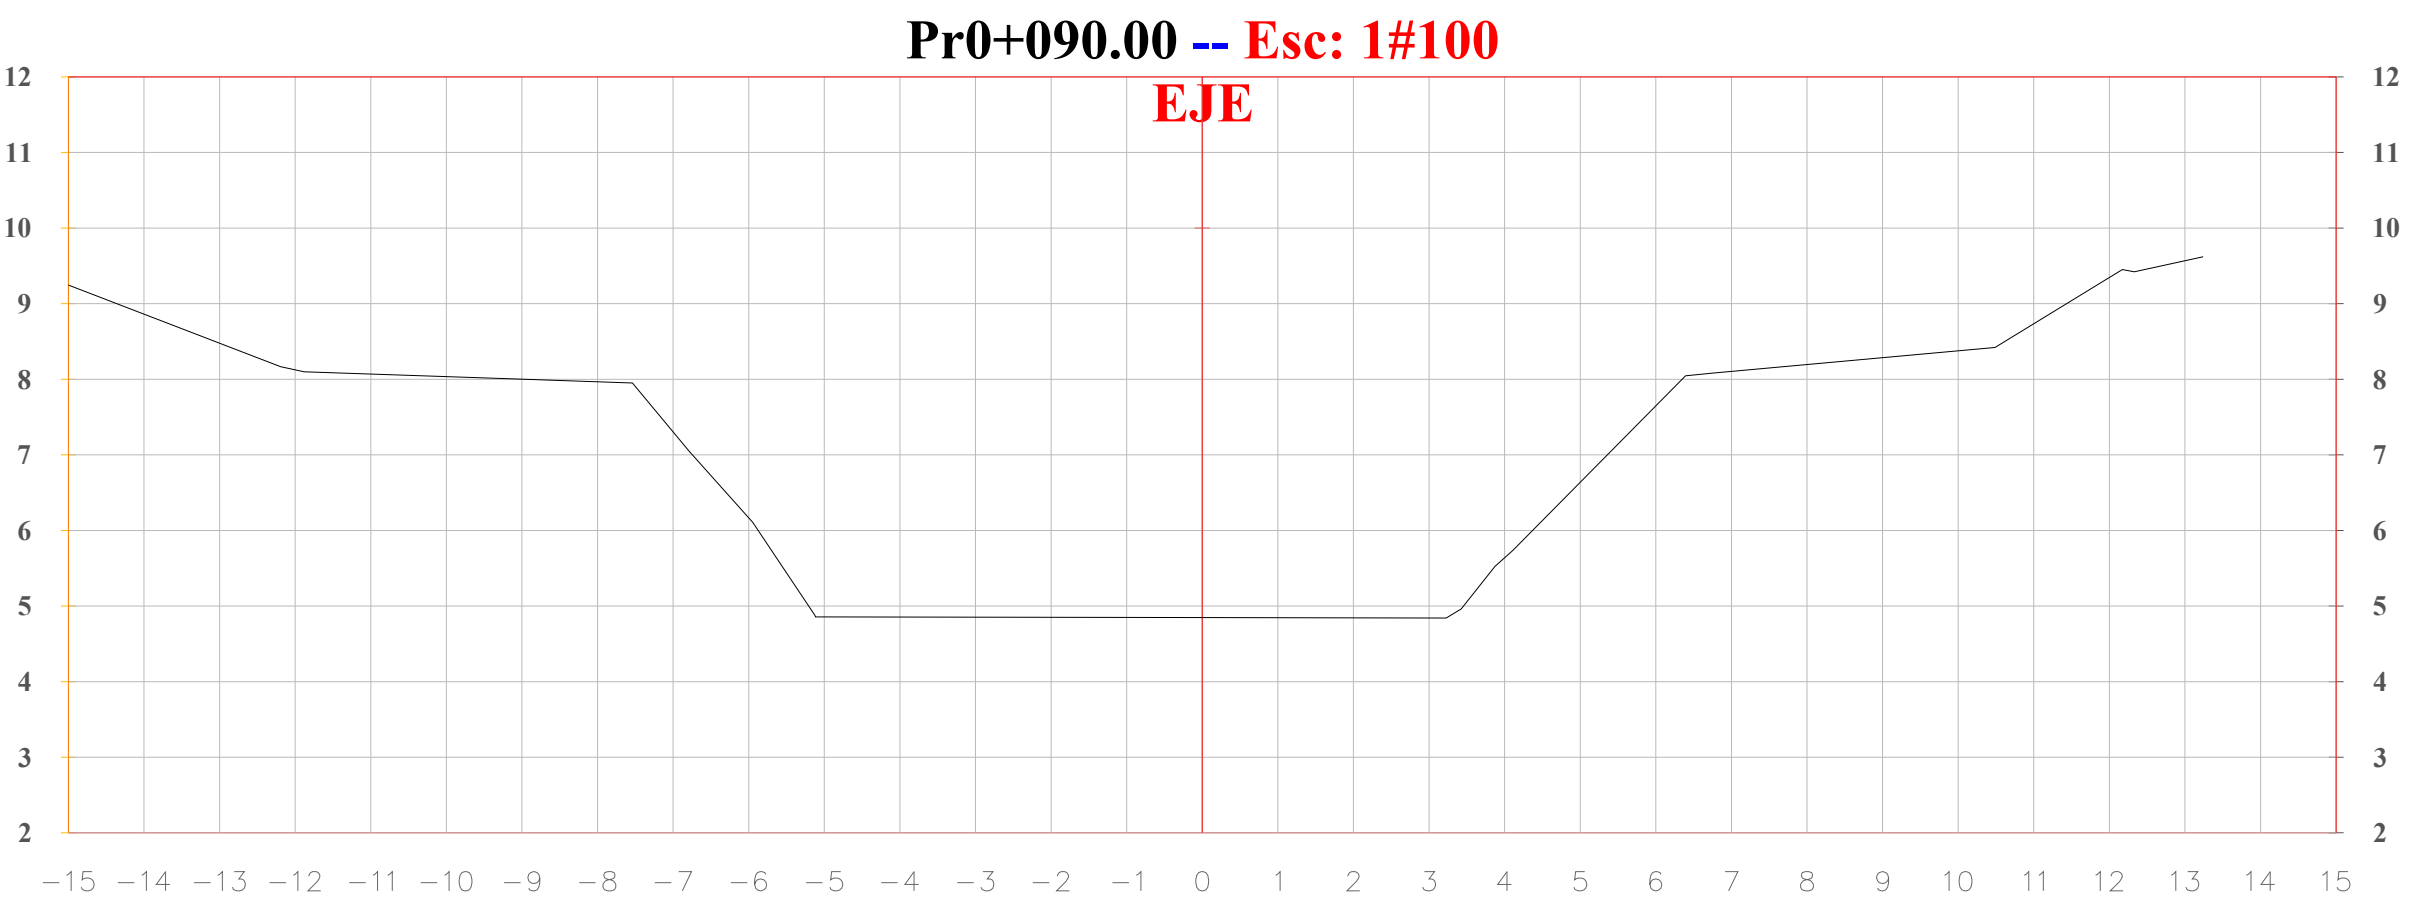


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

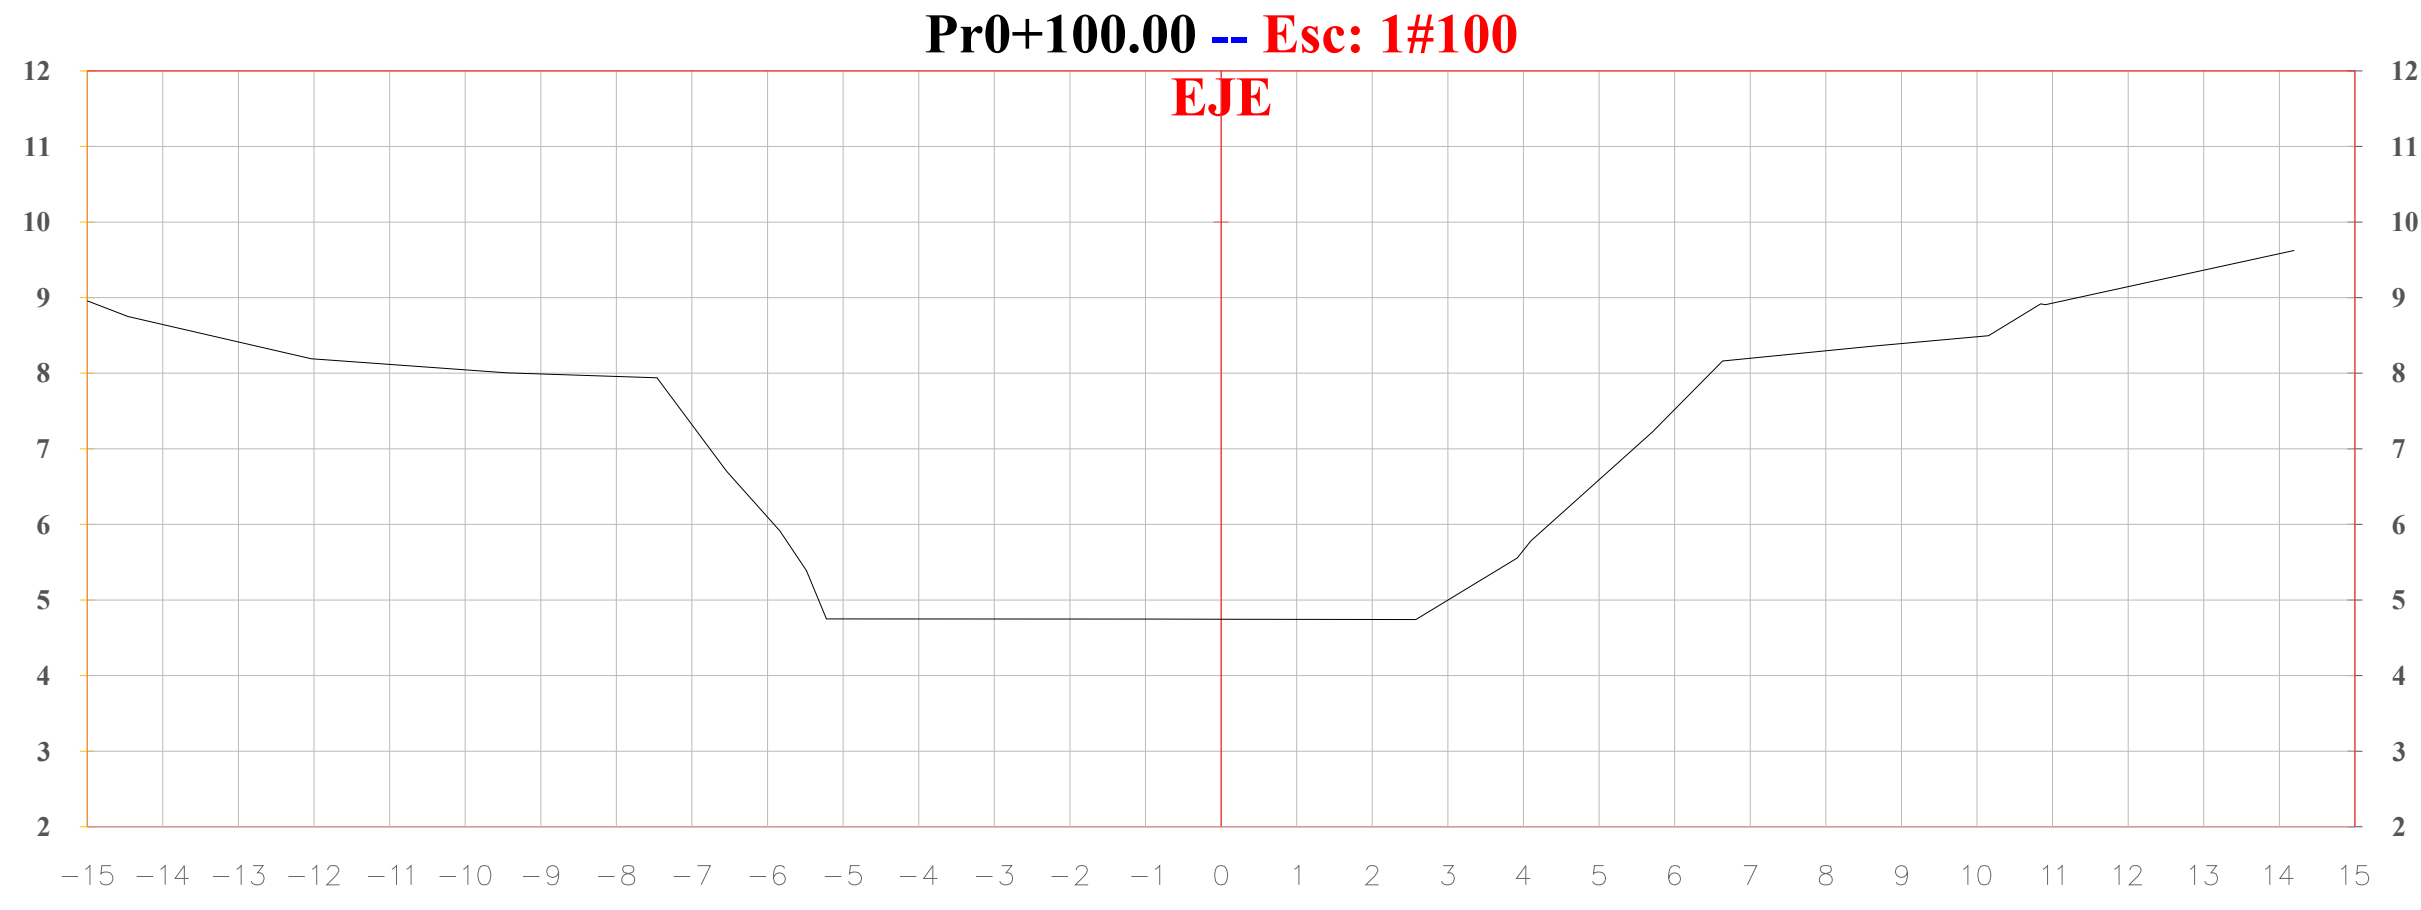


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

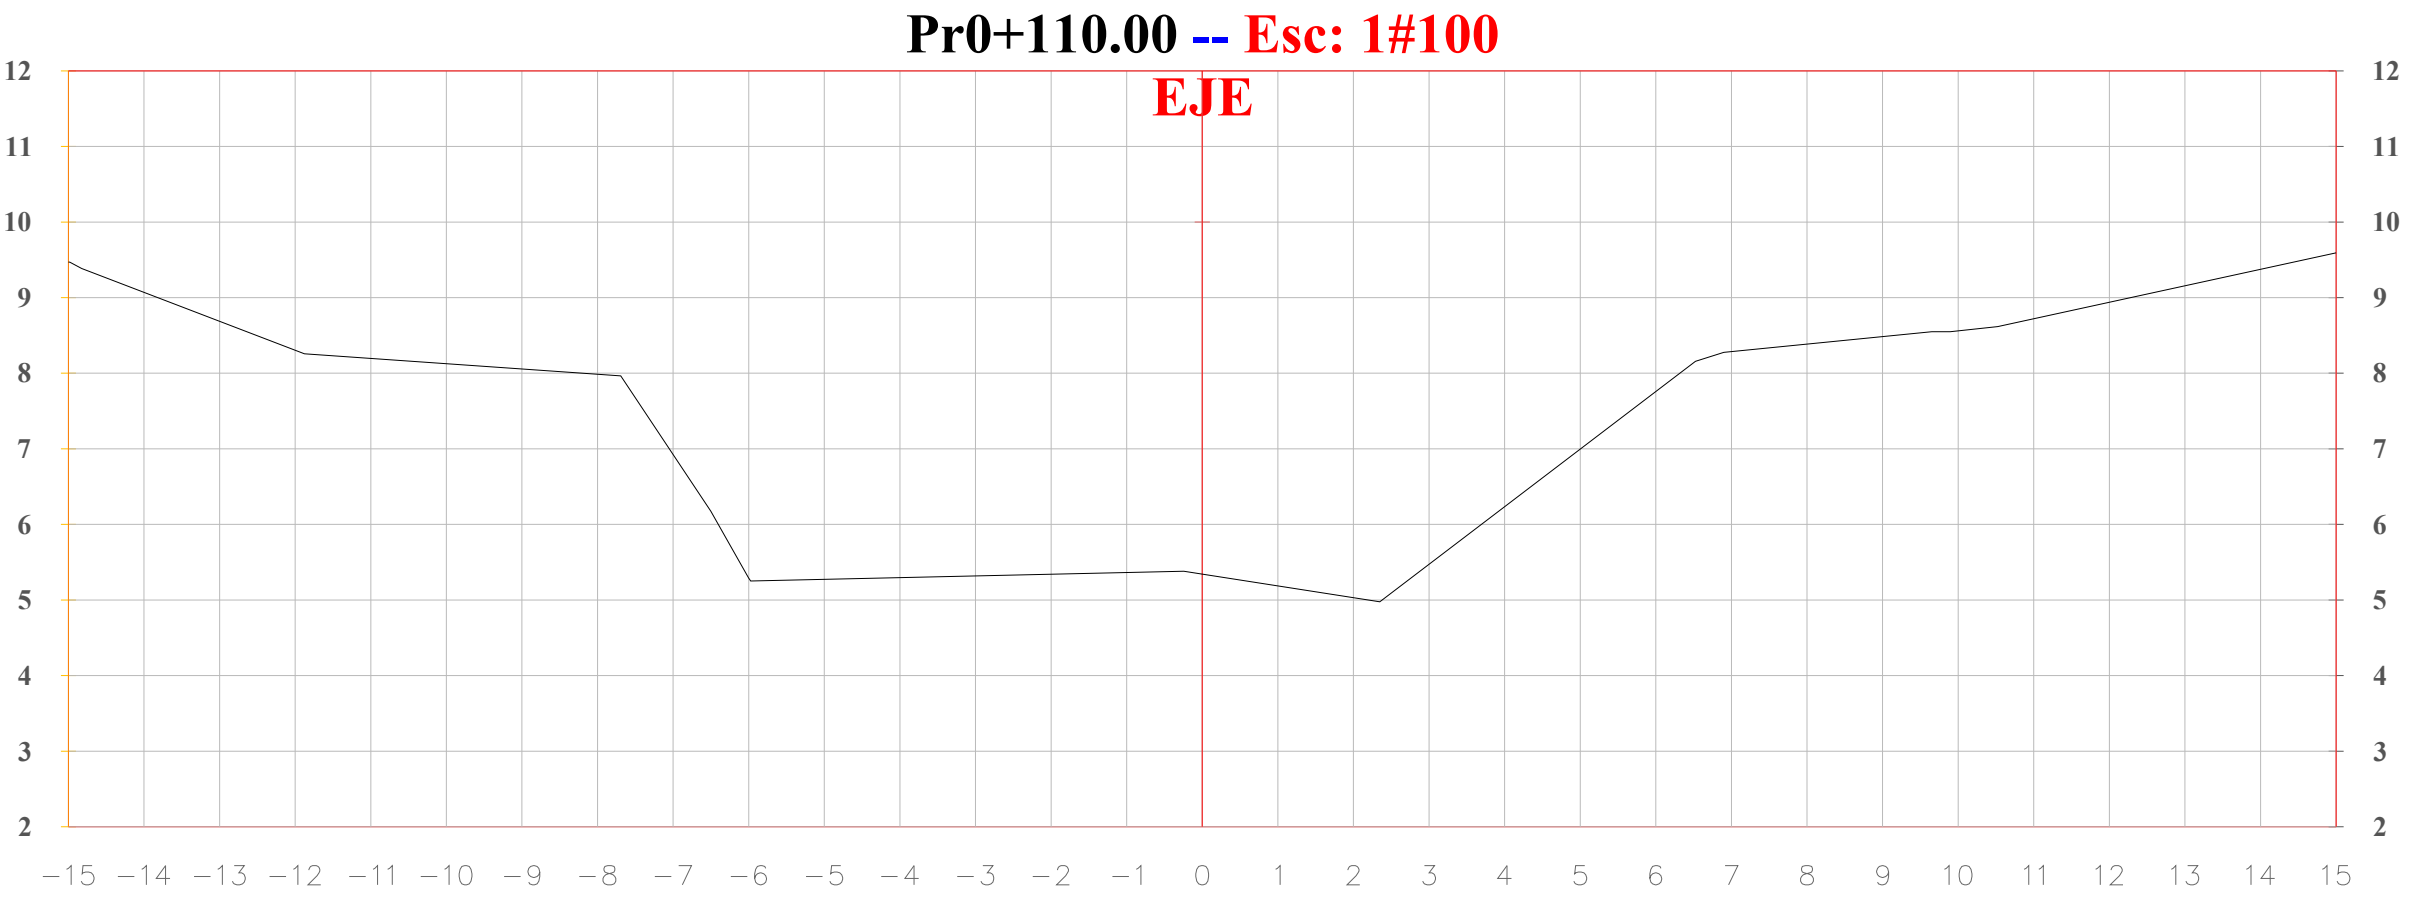

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

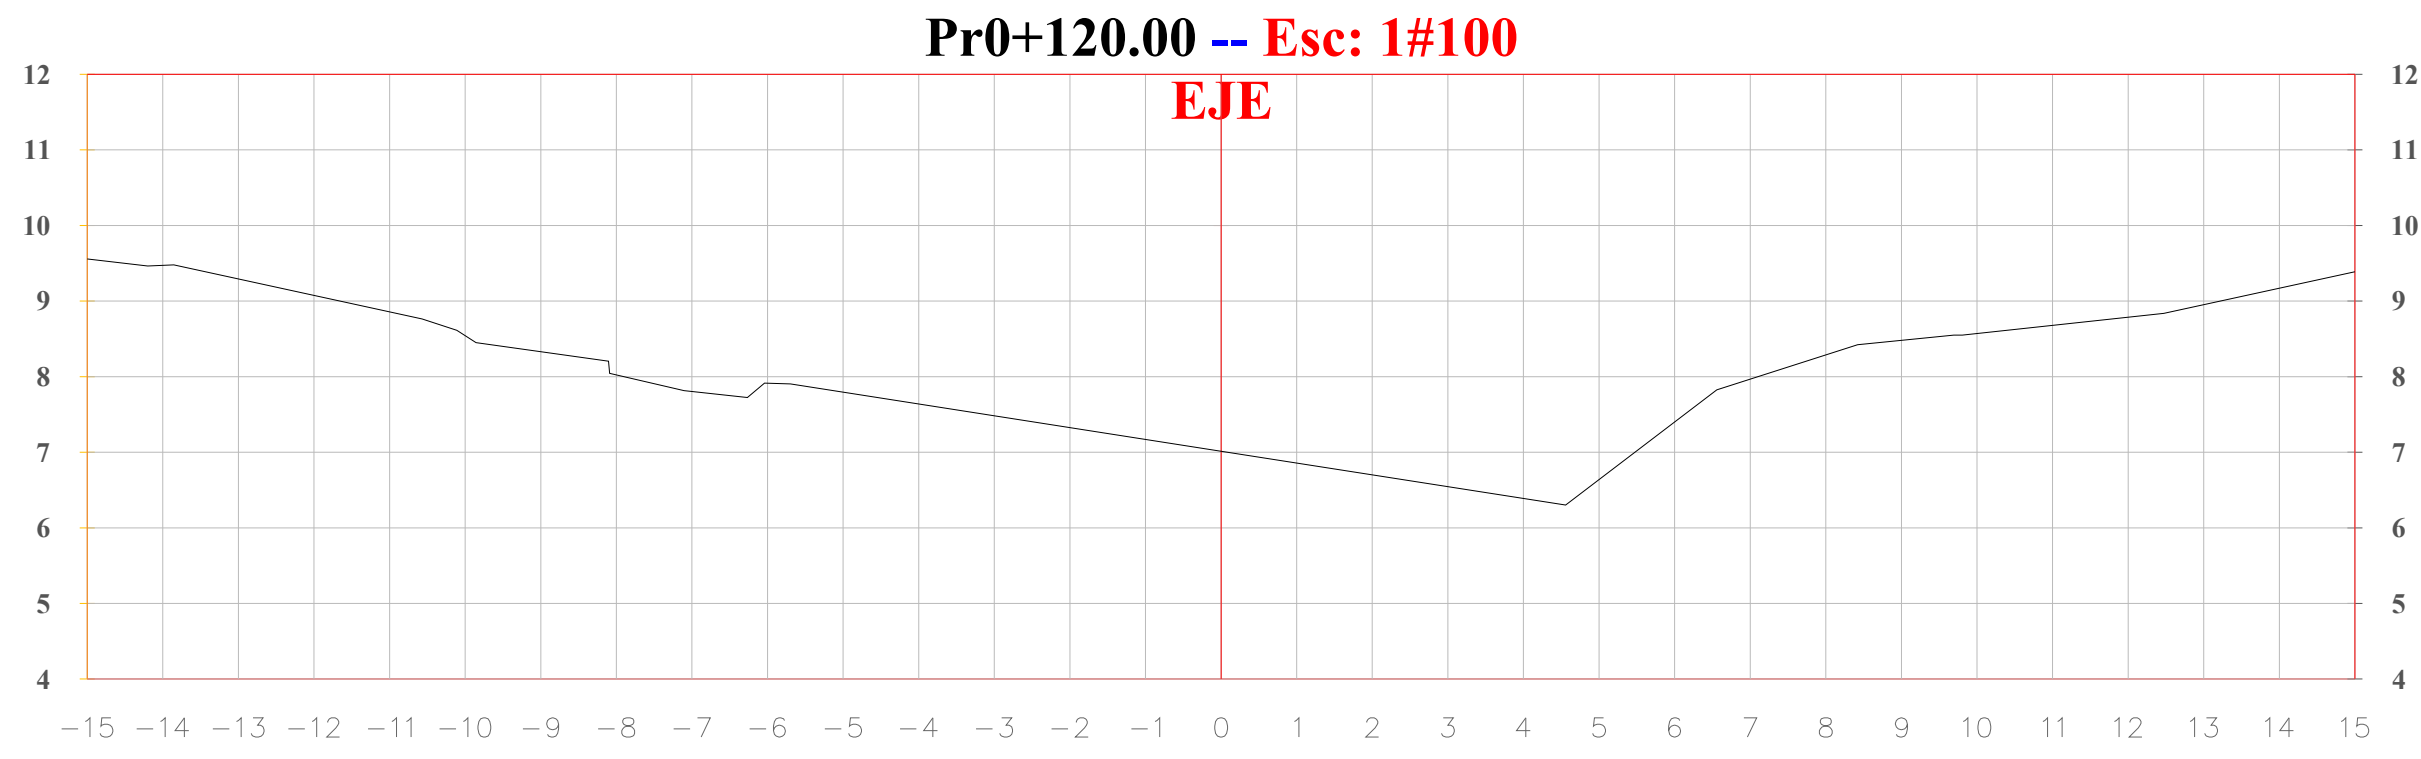

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

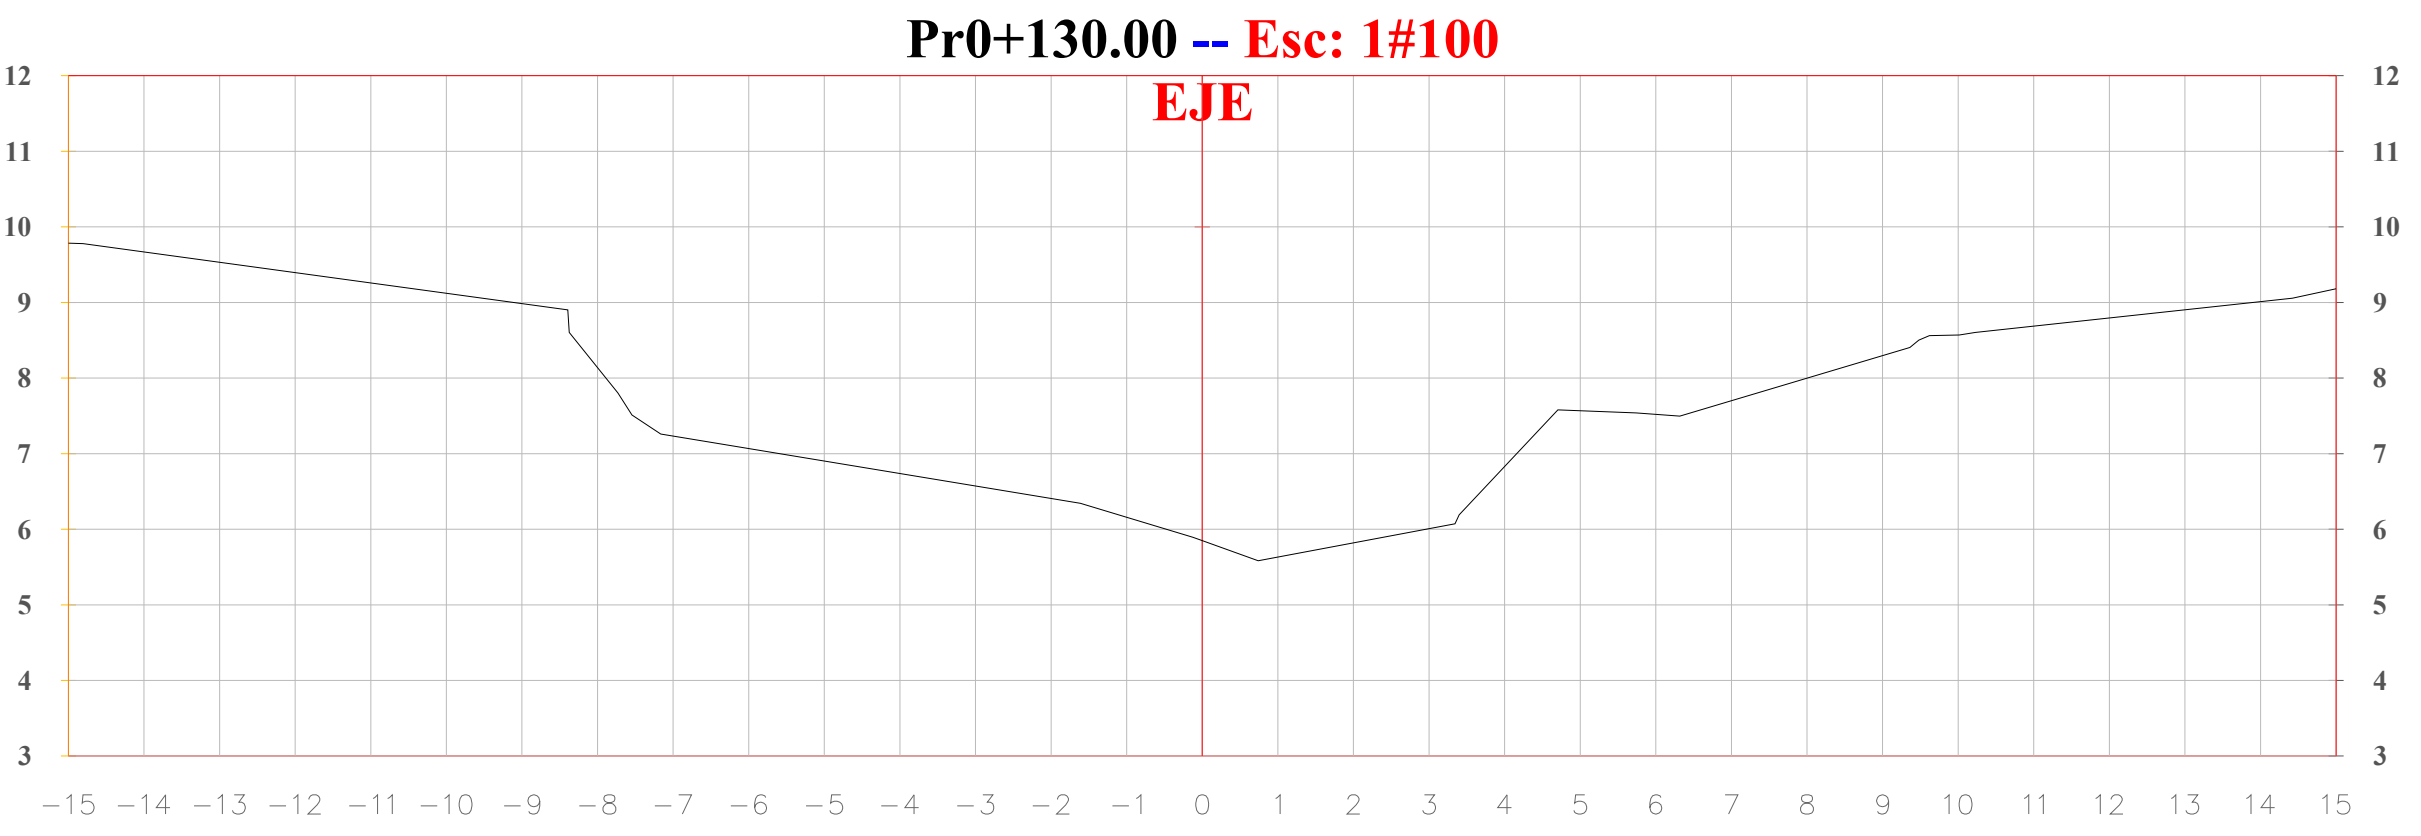

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCA SANCHEZ
Mat. Profesional 82.22799

Director de Obra:
YUSID MARCOLOTTI
Mat. Profesional 3320-991998017

Topógrafo Interventor:
Jorge R. RUIZ
Mat. Profesional 8323015475

Director de Interventoría:
MANUEL BERNARDO CORREA
Mat. Profesional 3323015475

MODIFICACIONES

I
II
III
IV
V



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026

ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

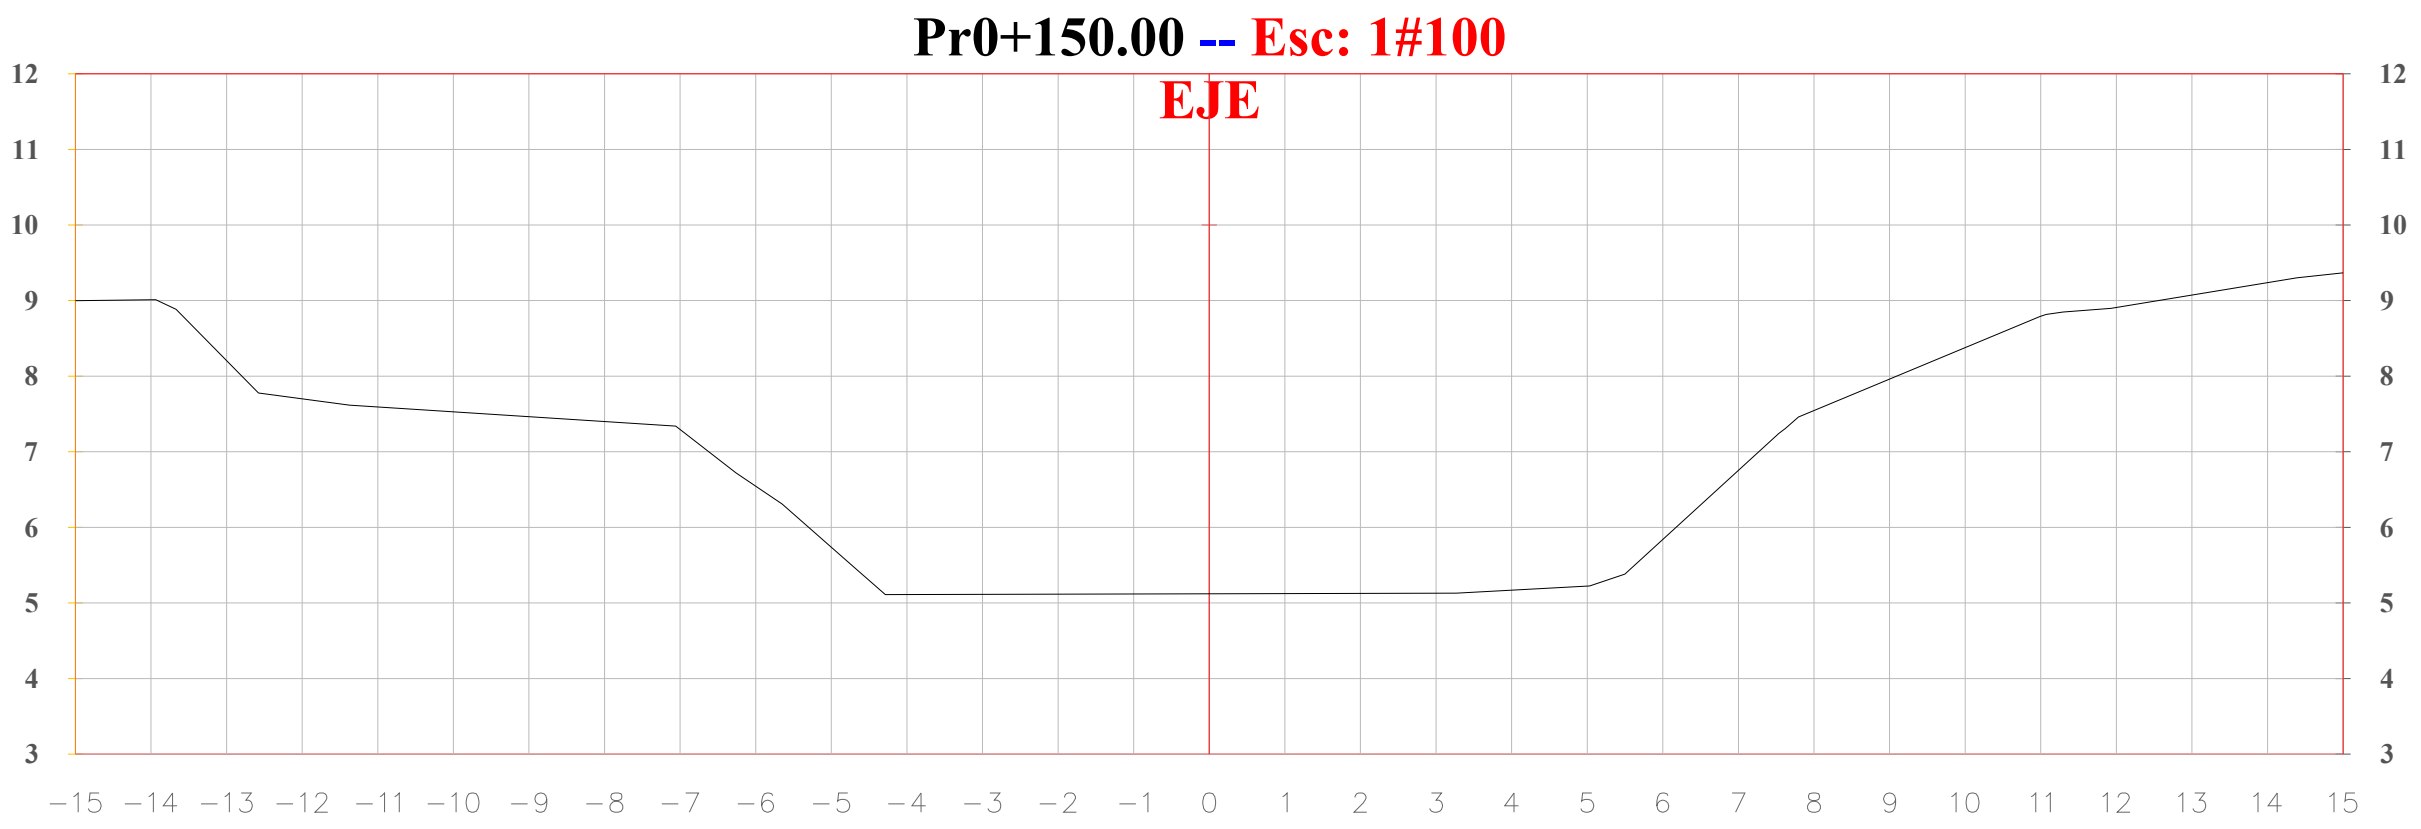


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

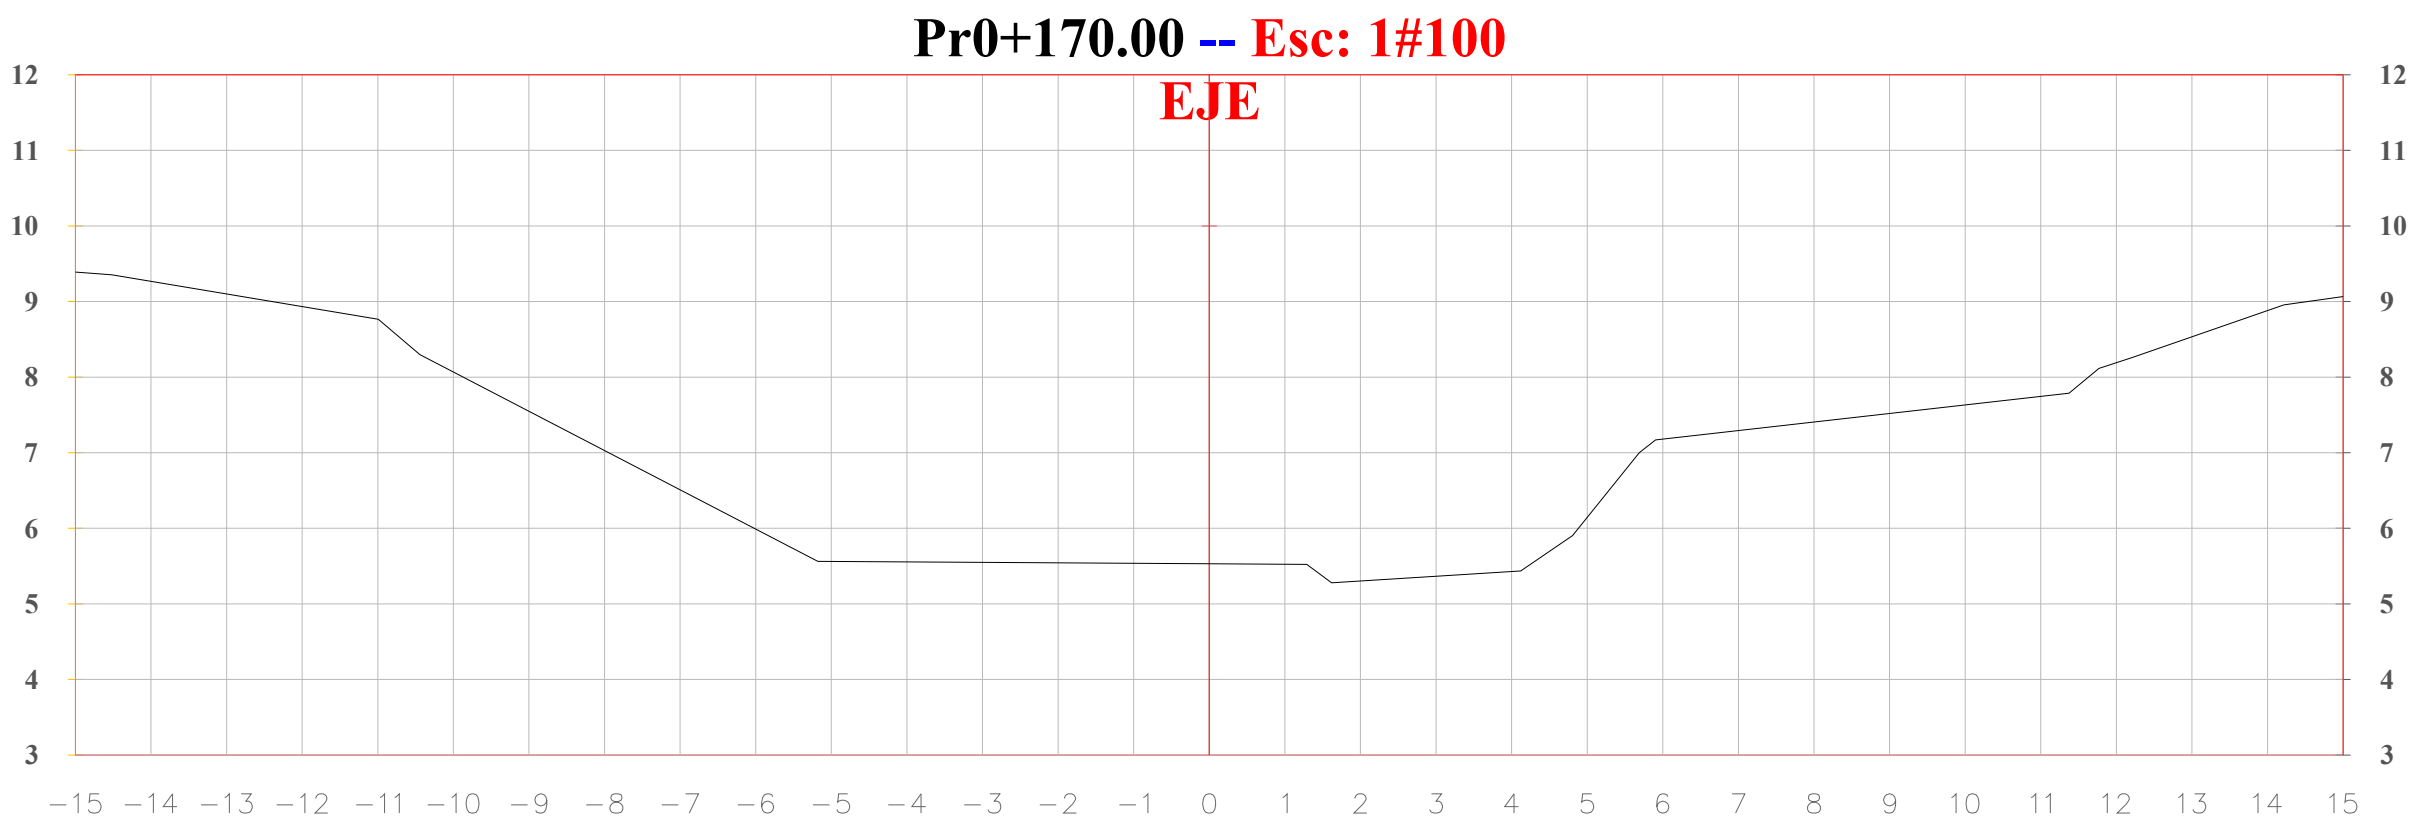

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

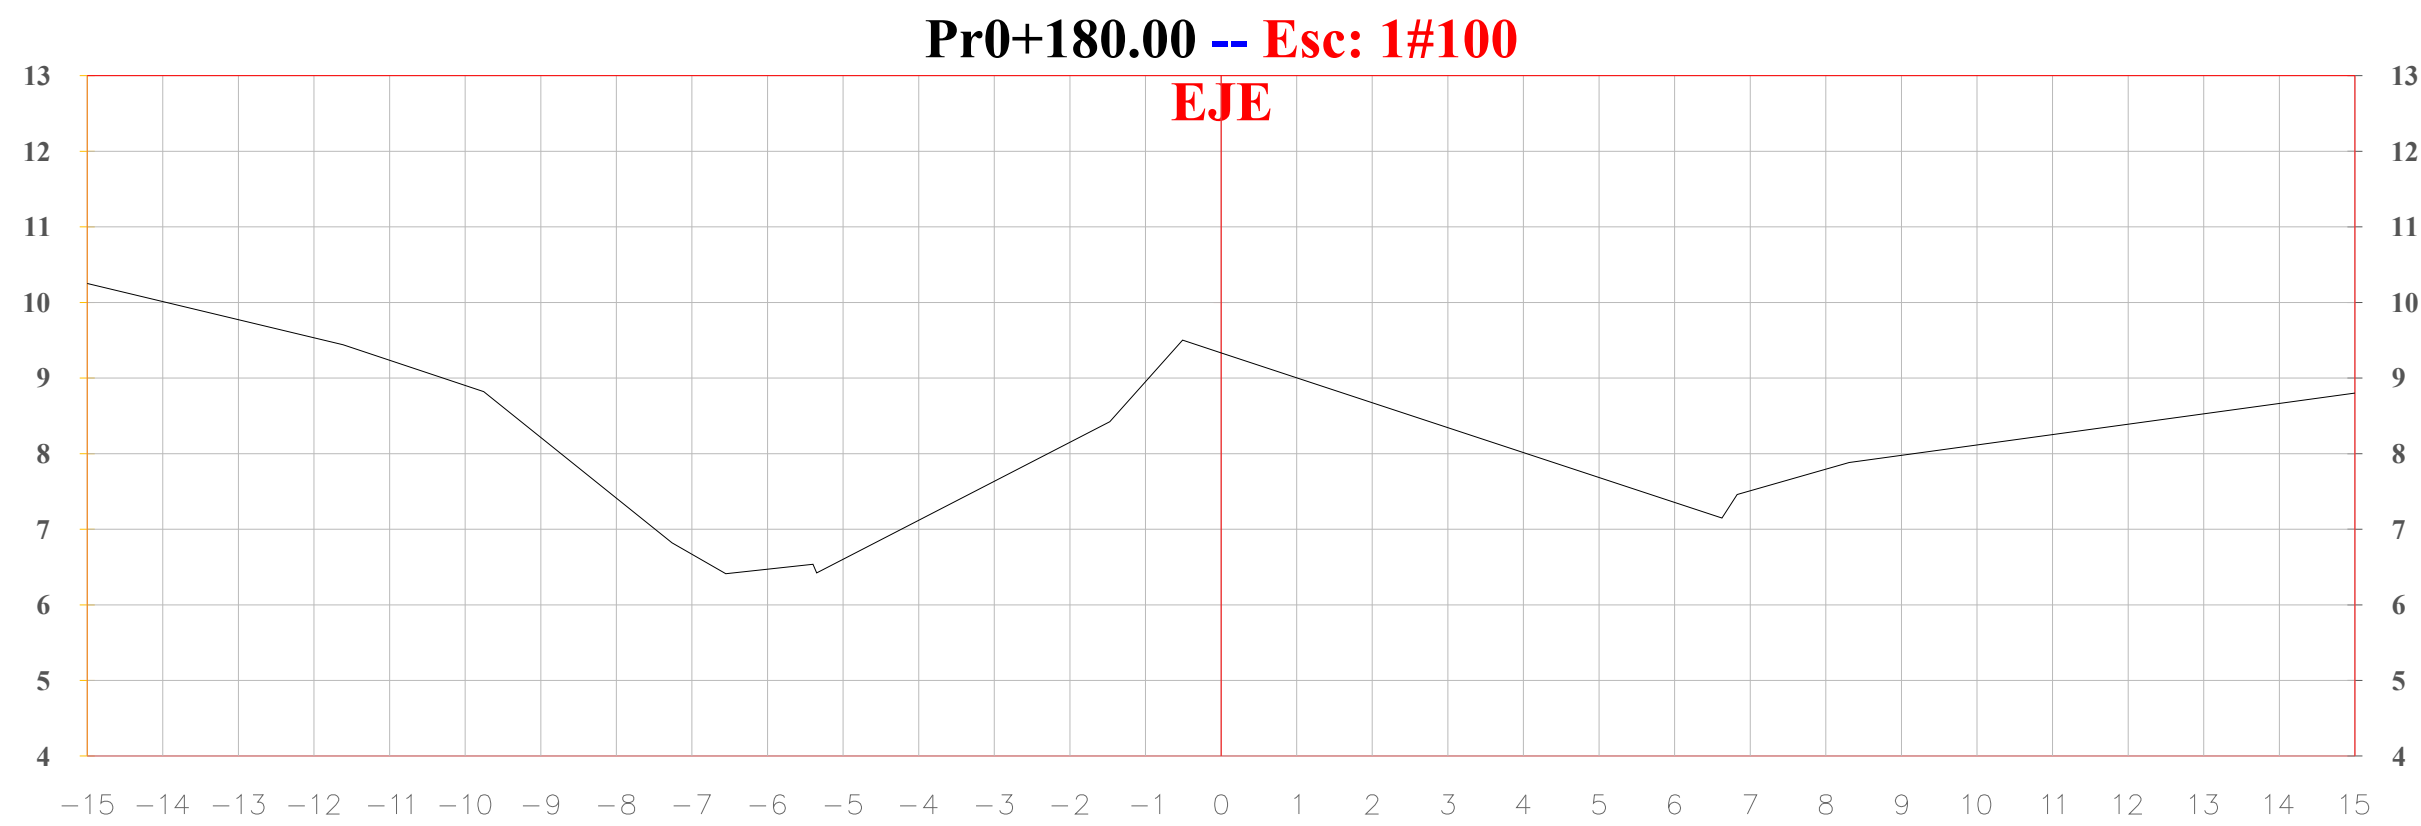

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

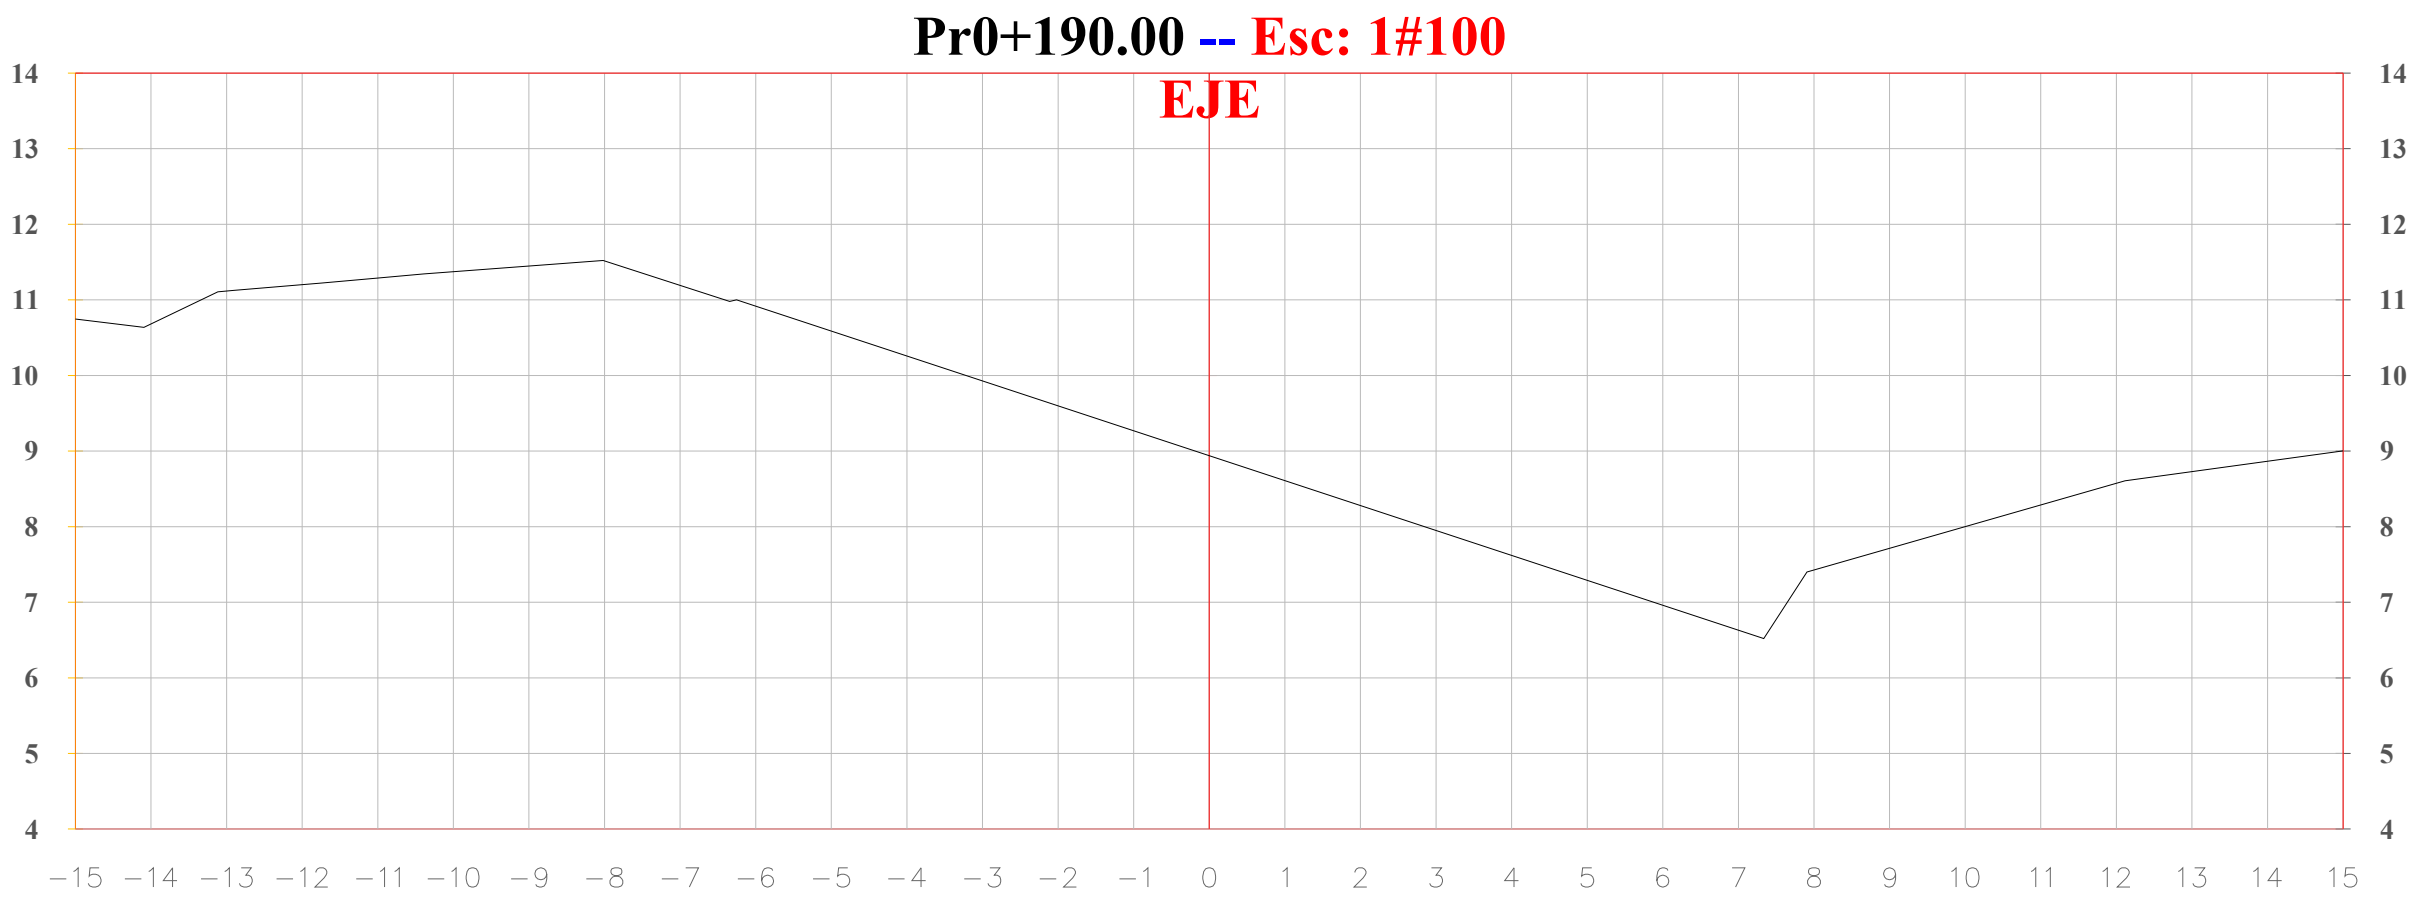

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
[Signature]
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Mat. Profesional: 8212799

Director de Obra:
[Signature]
YUSID MARCOLO GARCIA
Mat. Profesional: 3302091990017

Topógrafo Interventor:
[Signature]
Jesús RIVERA
Mat. Profesional: 8332616473

Director de Interventoría:
[Signature]
MANUEL BERNARDO GOMEZ
Mat. Profesional: 3302091990017

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:

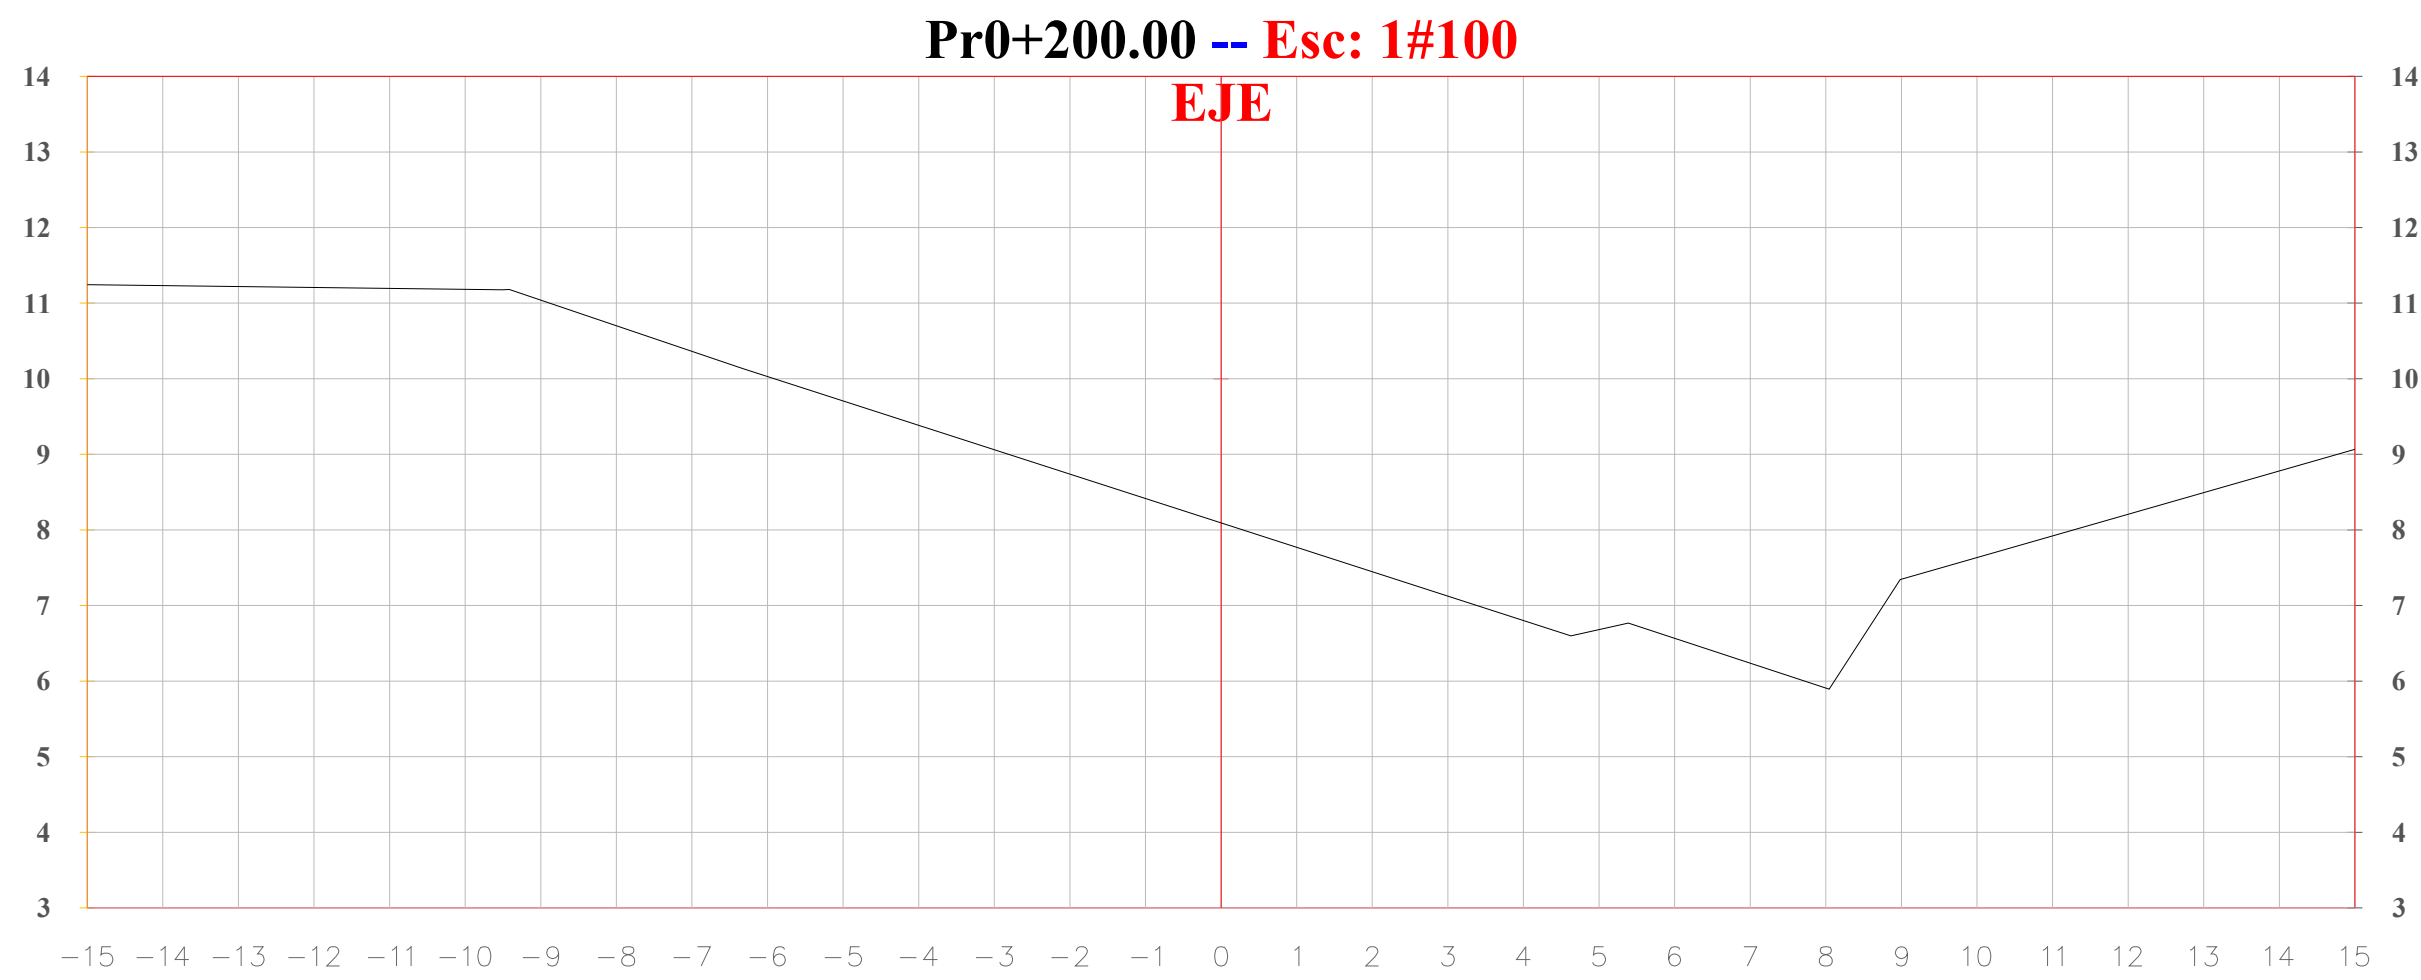


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

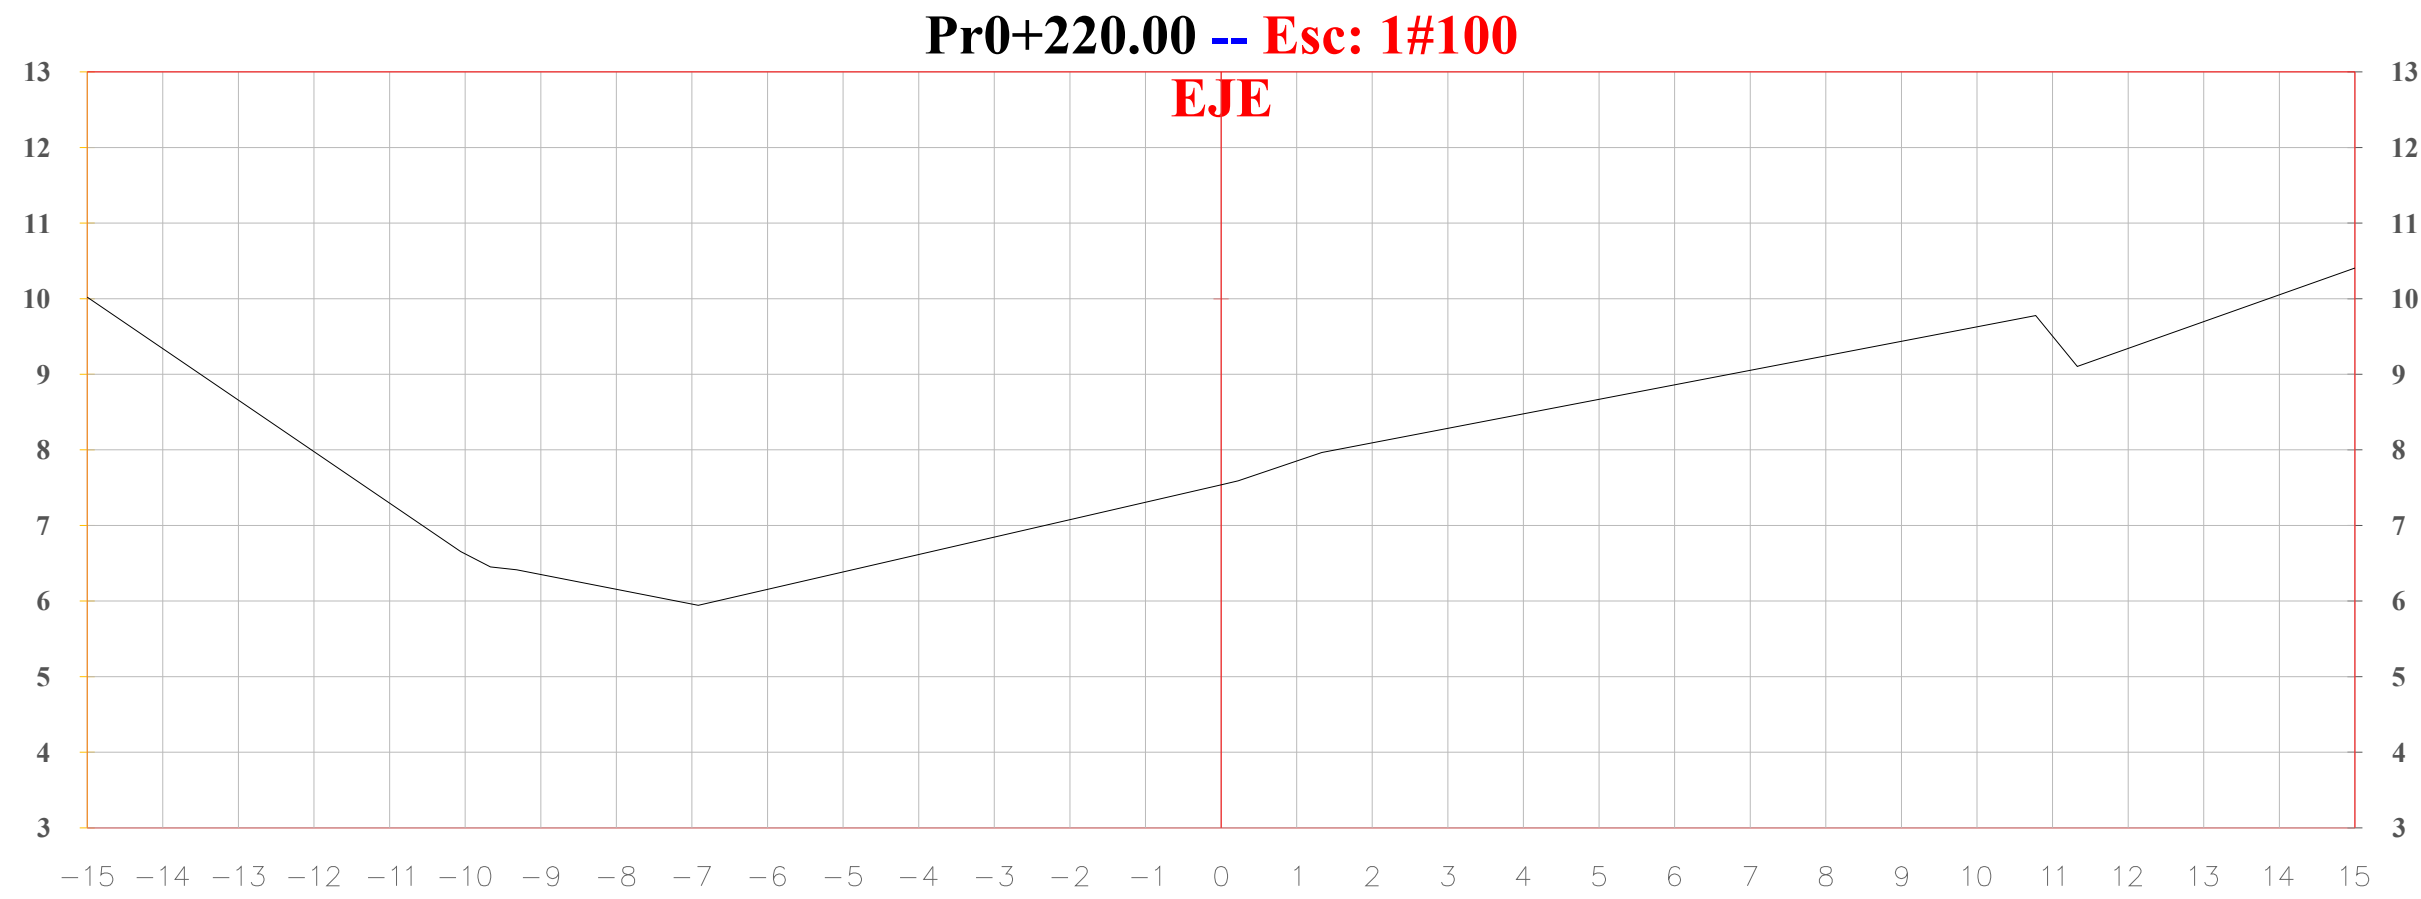


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

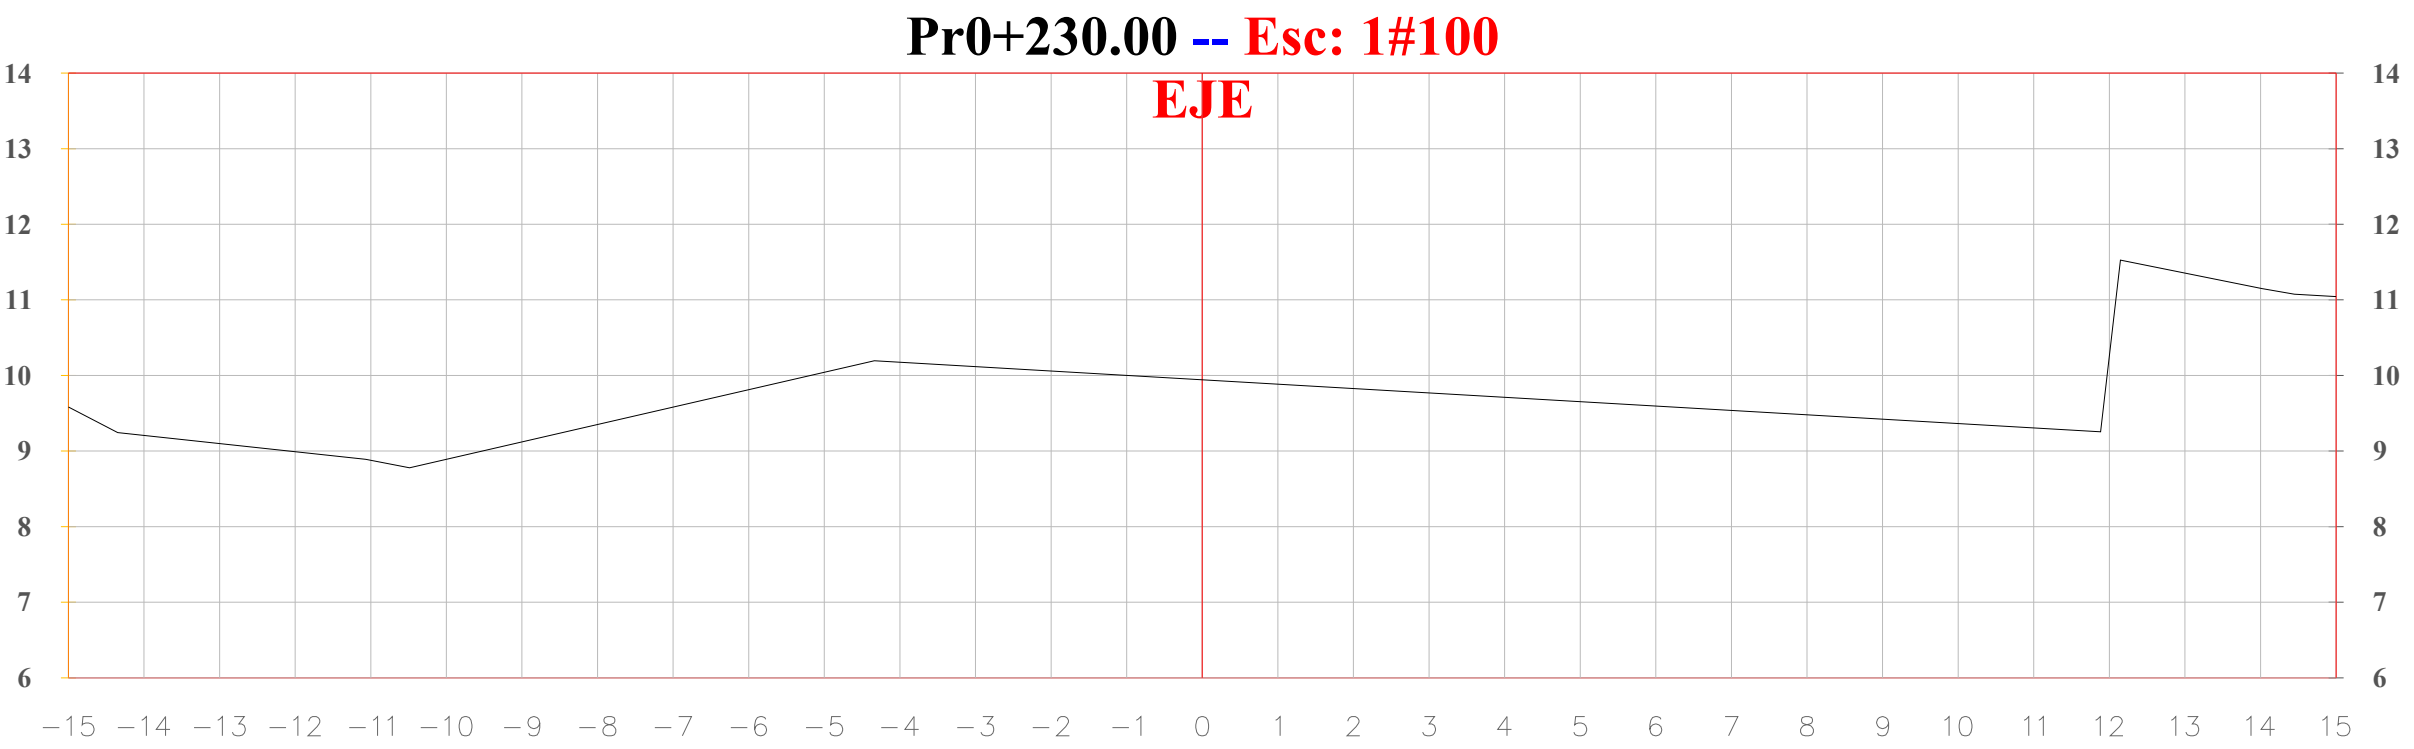

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

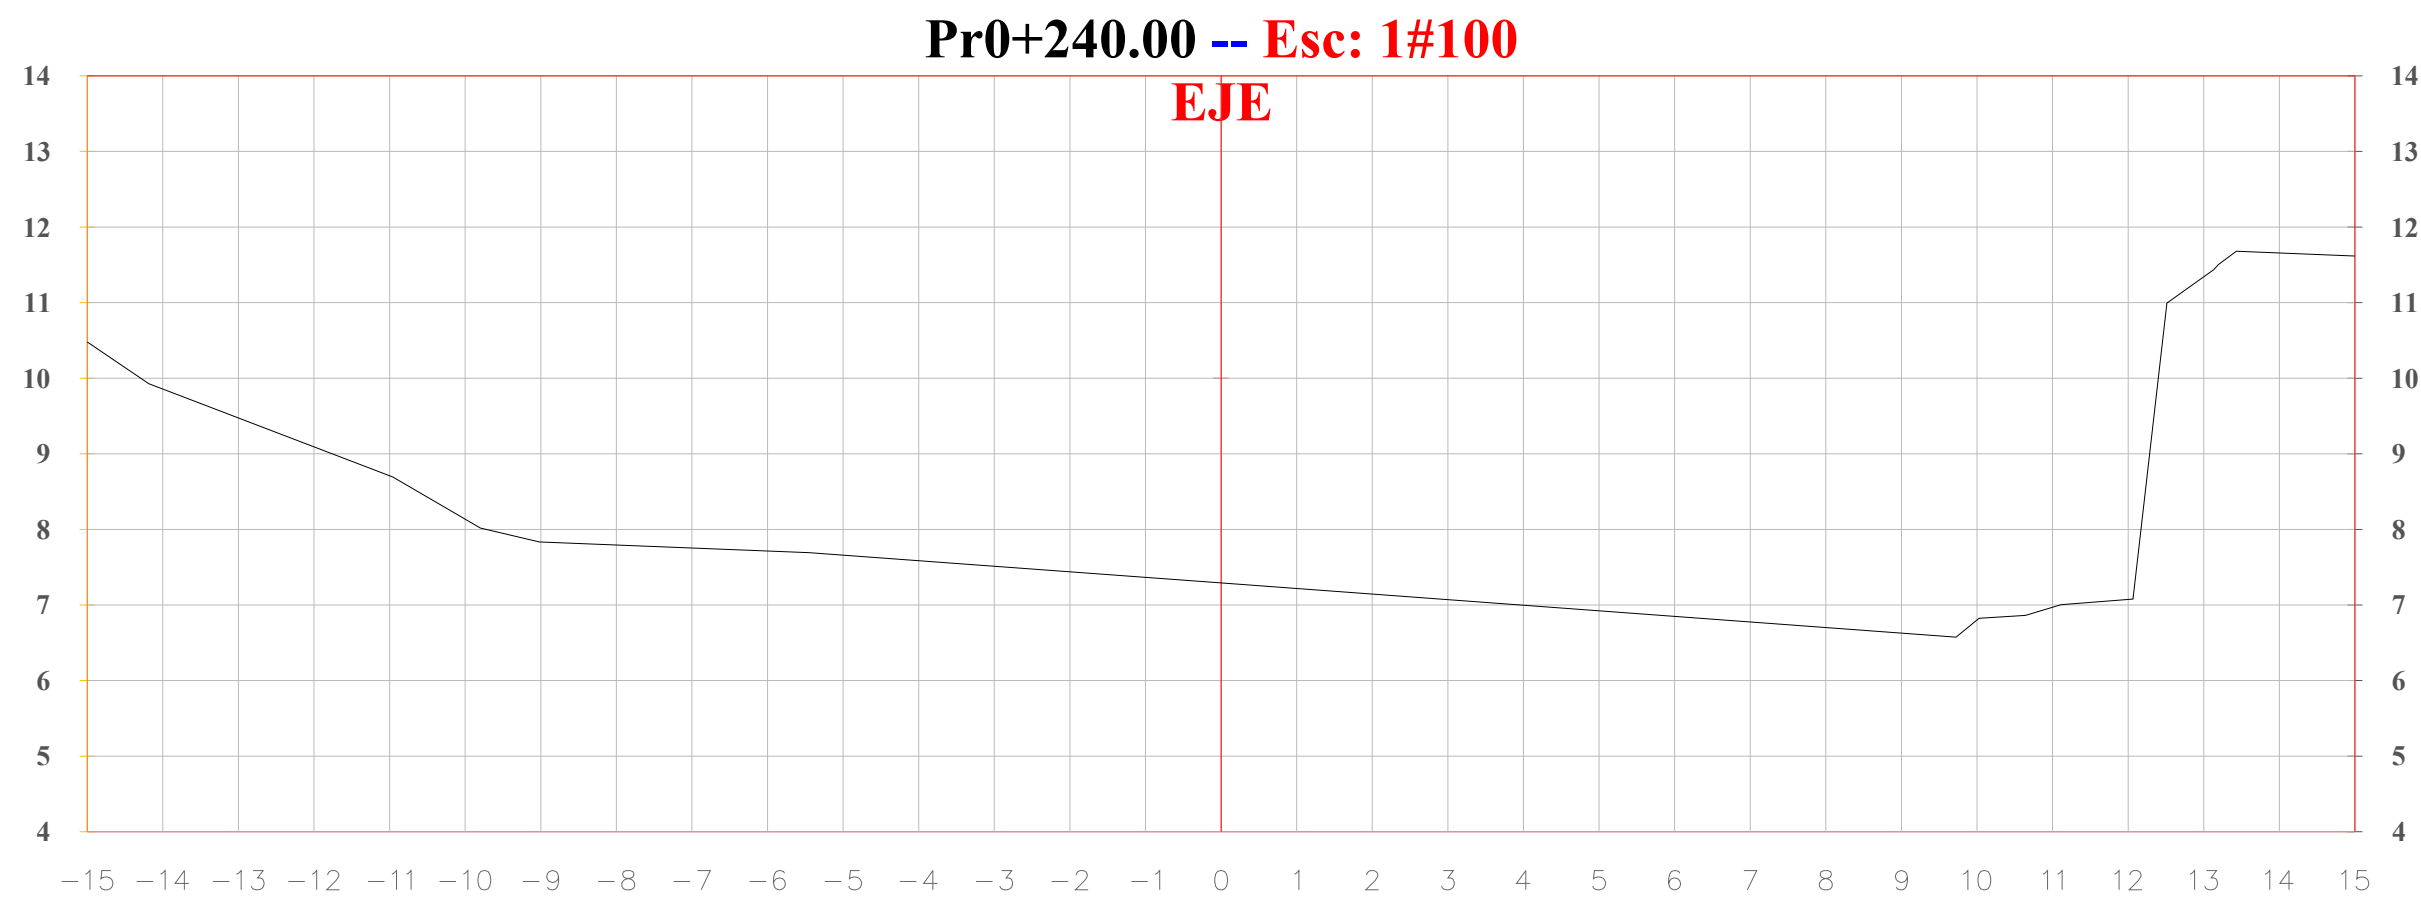

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

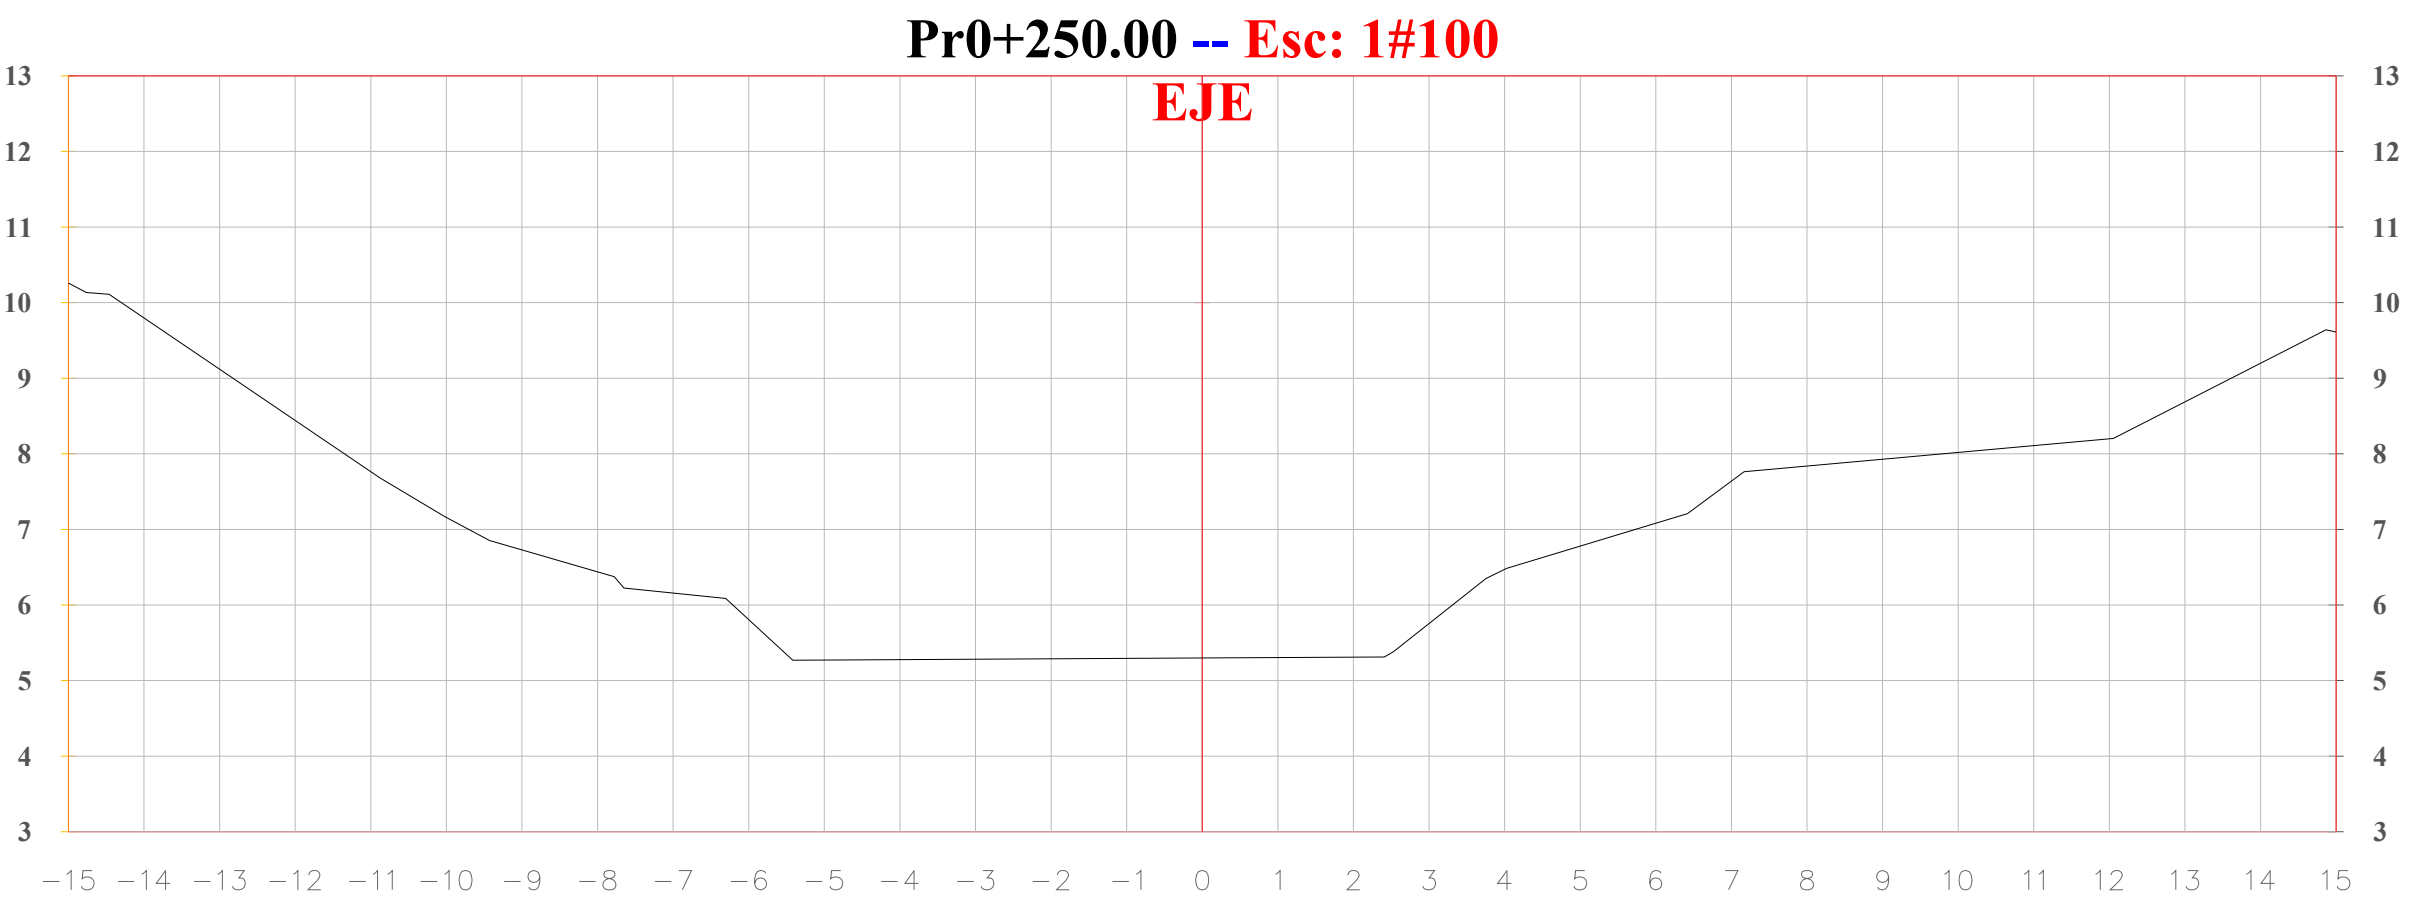

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
[Signature]
GRANIEL GARCÍA SÁNCHEZ FARIAS
Mat. Profesional: 8212799

Director de Obra:
[Signature]
YUSID MARICANTUQUE ARANDA
Mat. Profesional: 3302091990017

Topógrafo Interventor:
[Signature]
Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional: 8333016475

Director de Interventoría:
[Signature]
MARCELO BERNARDO CORREA
Mat. Profesional: 3302016475

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:

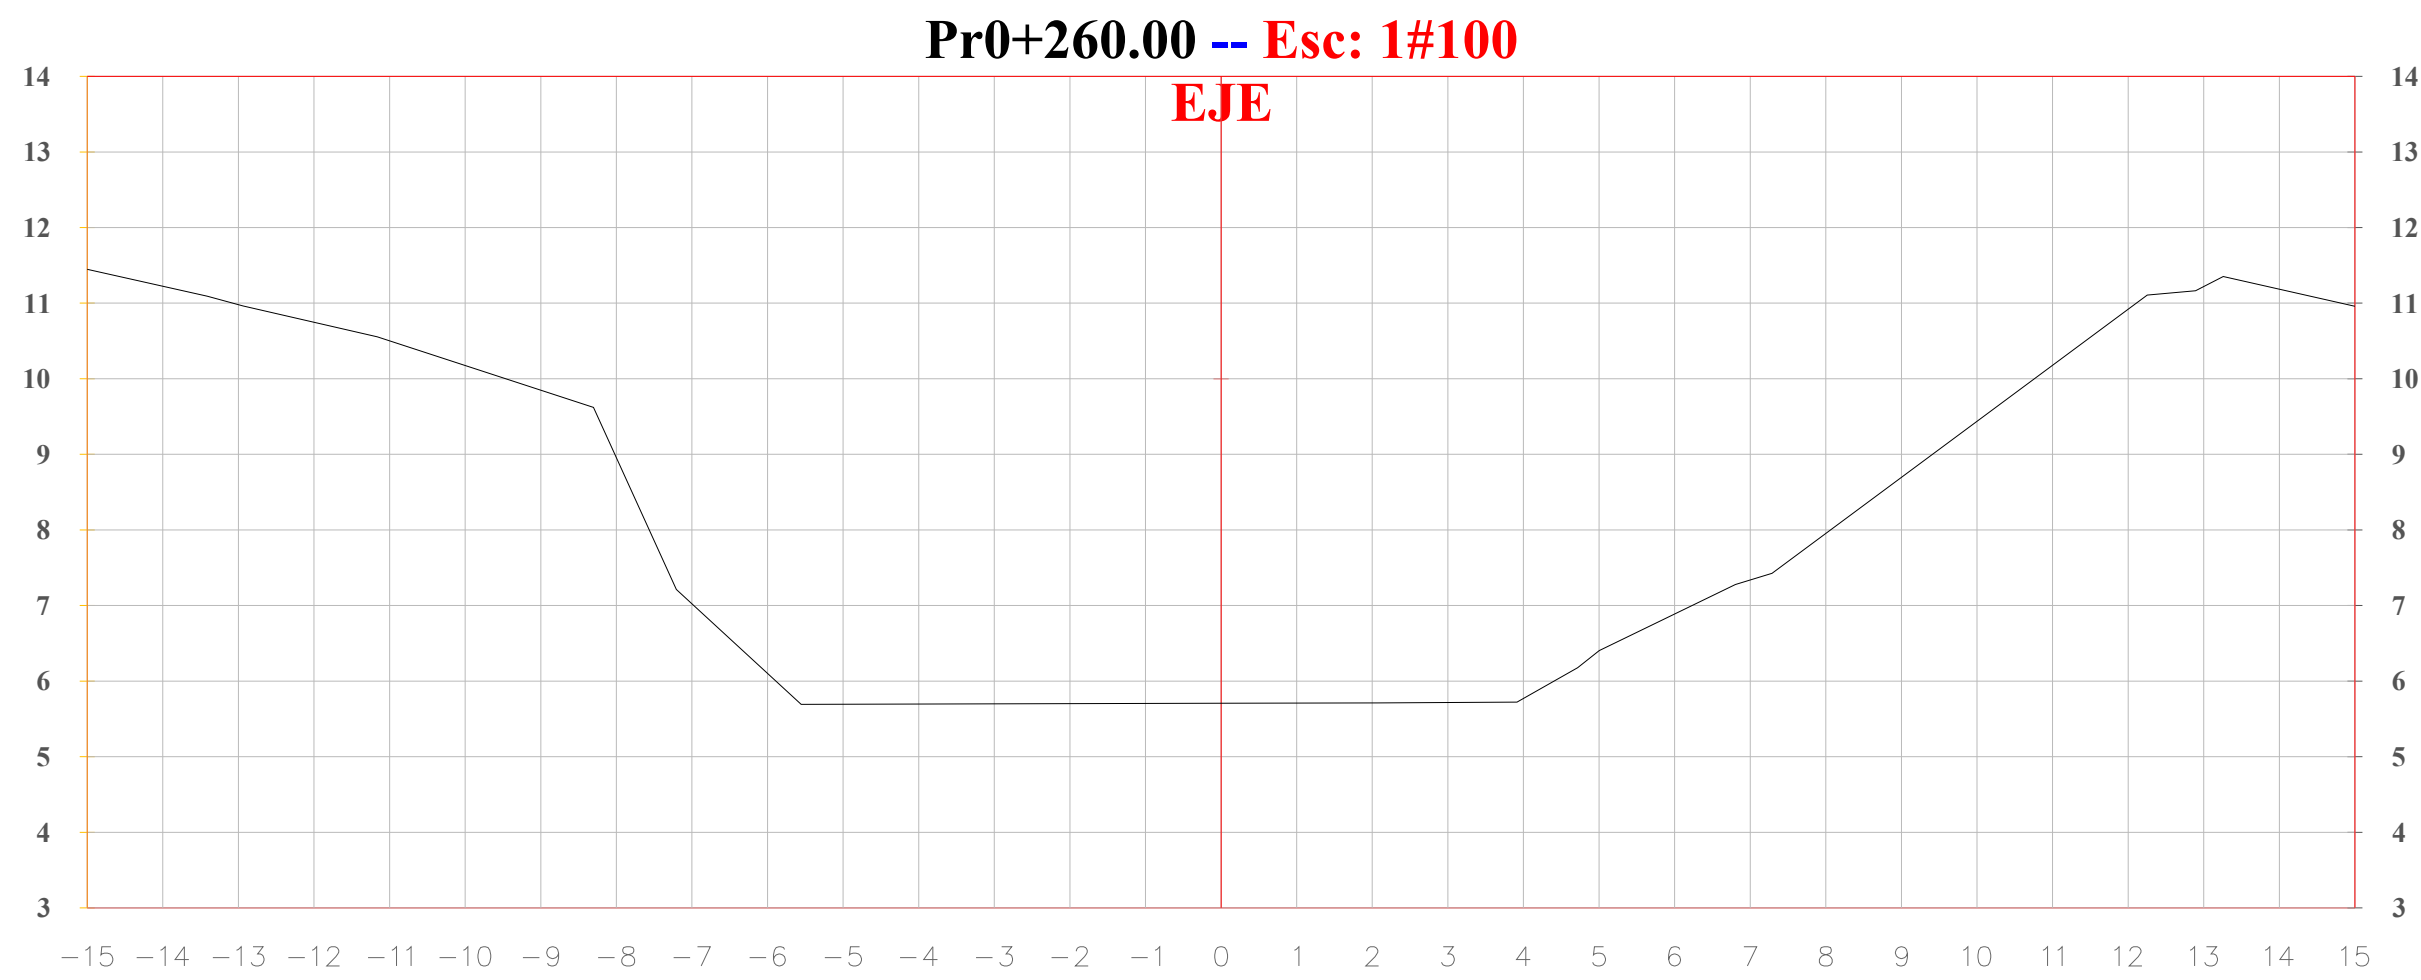


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

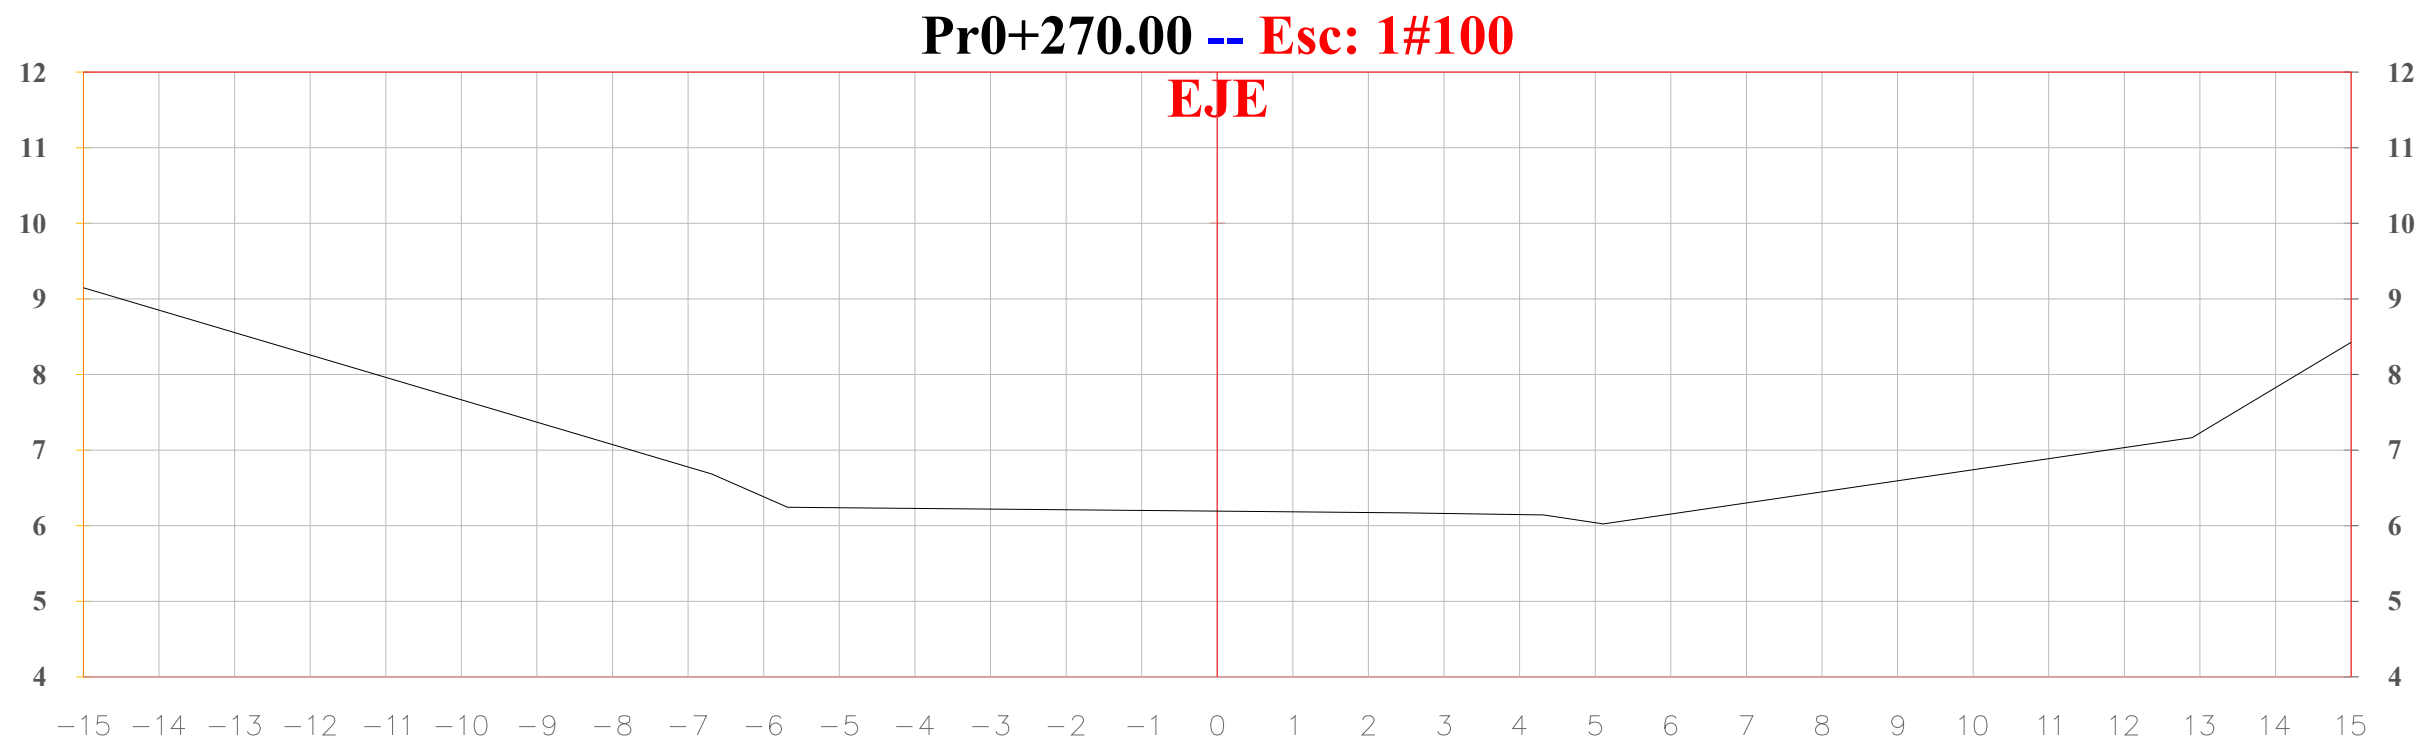


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

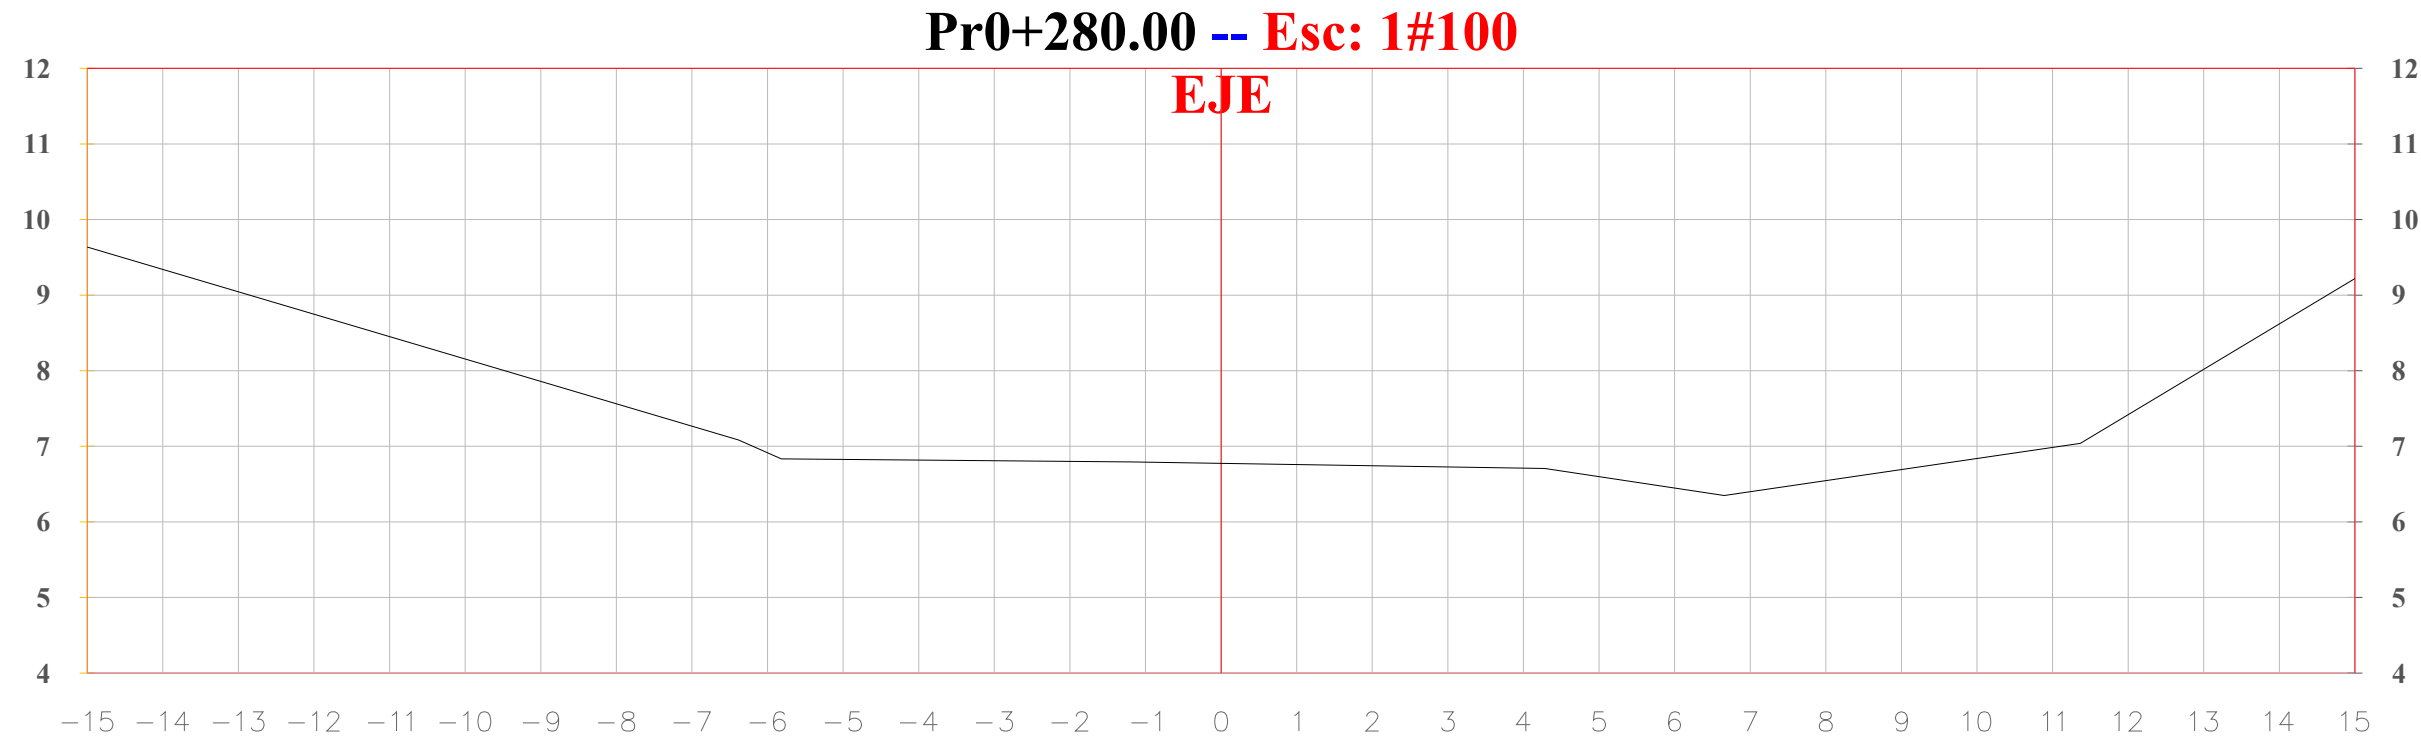


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

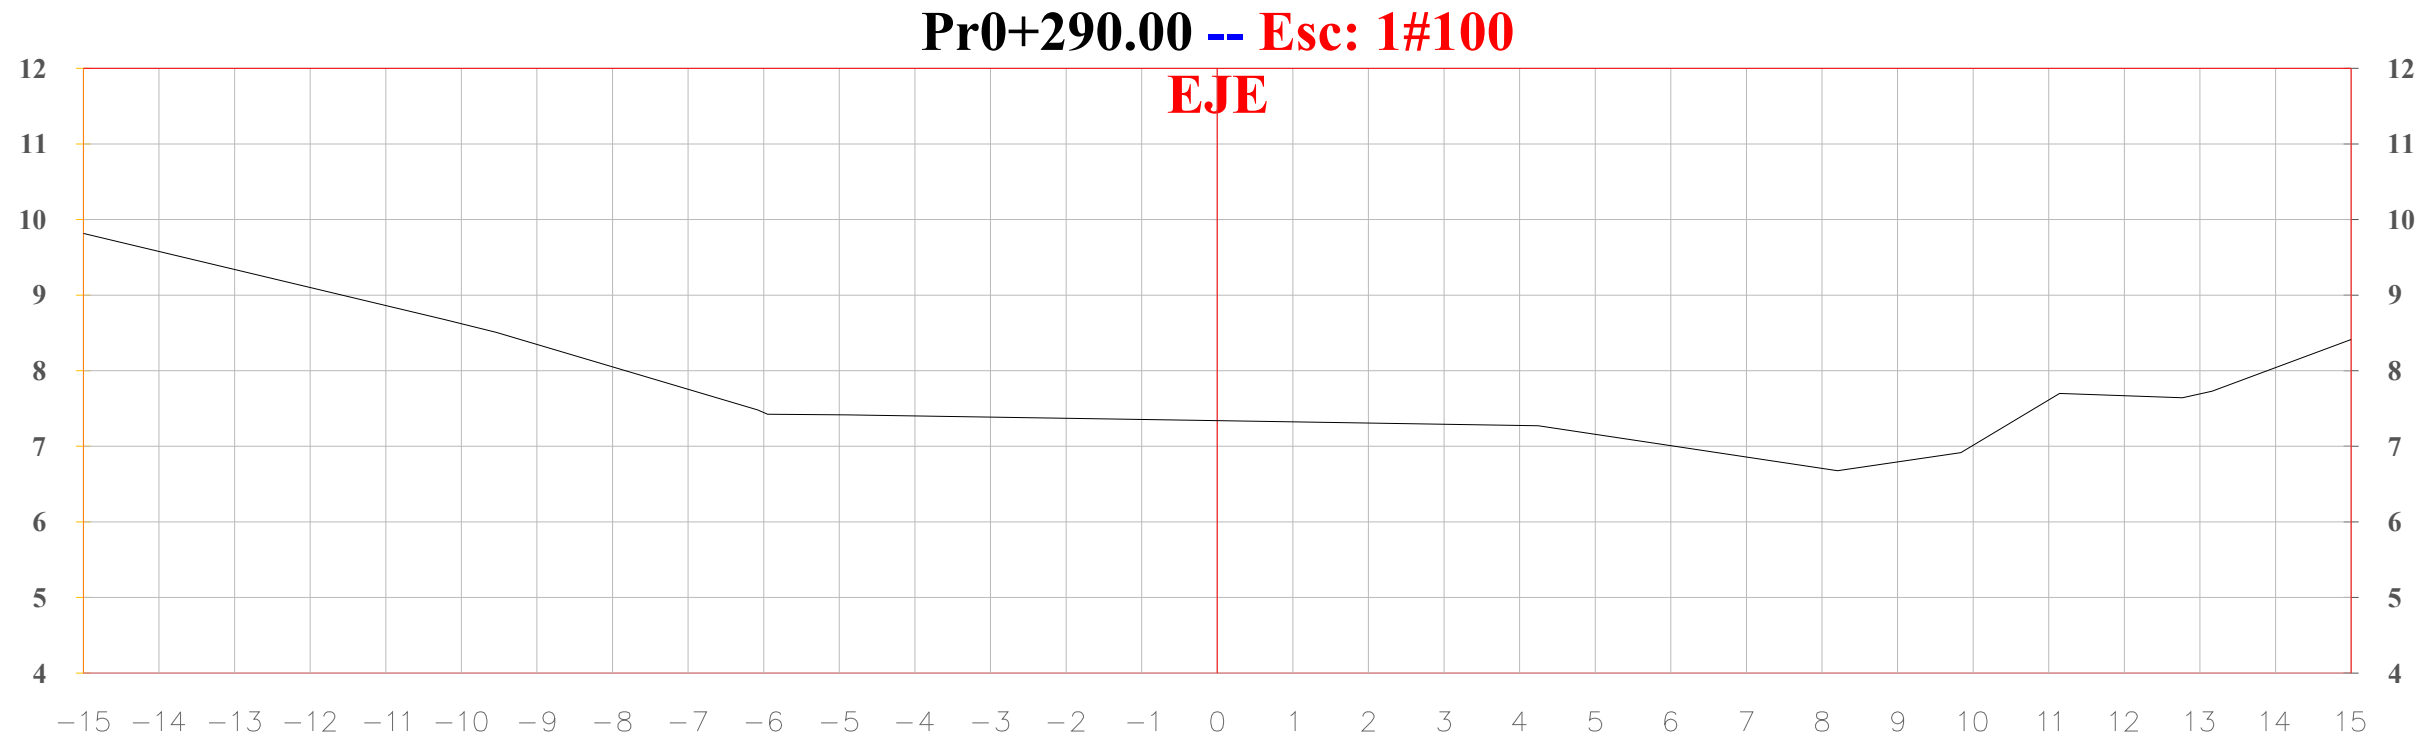

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

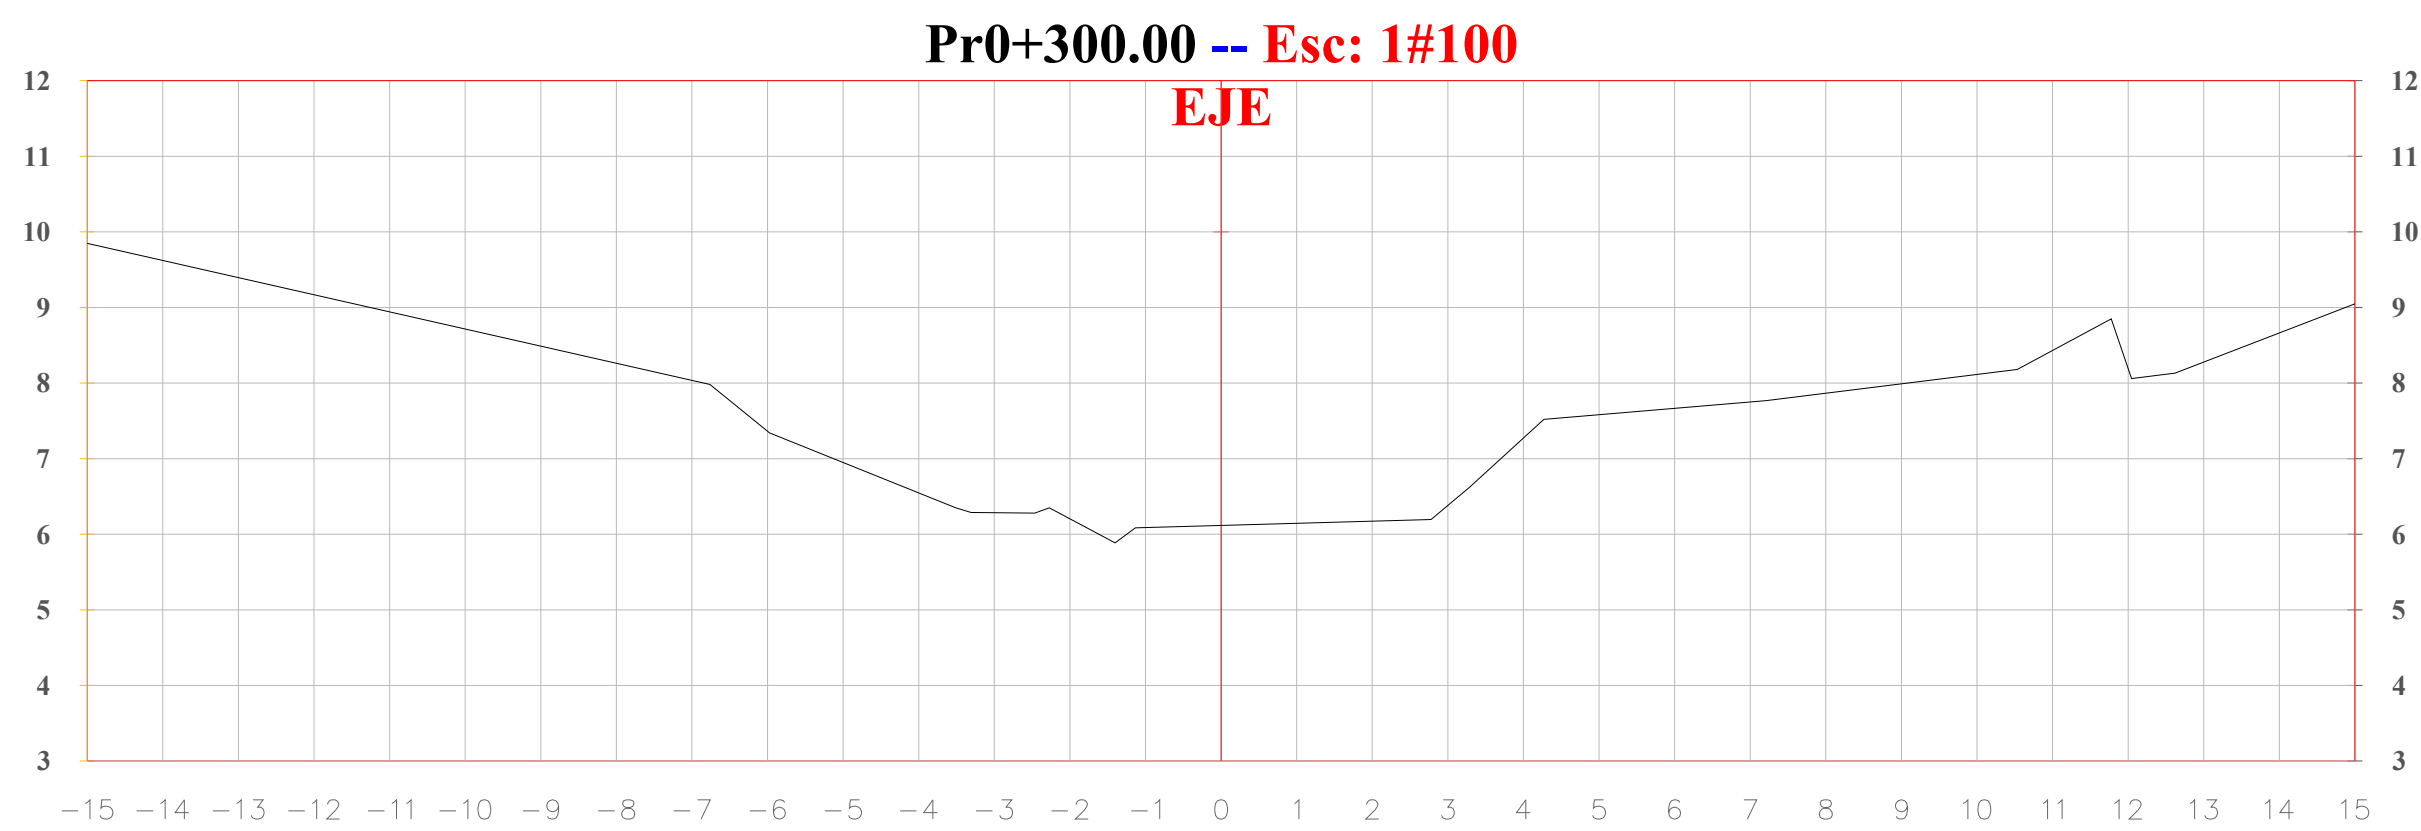

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

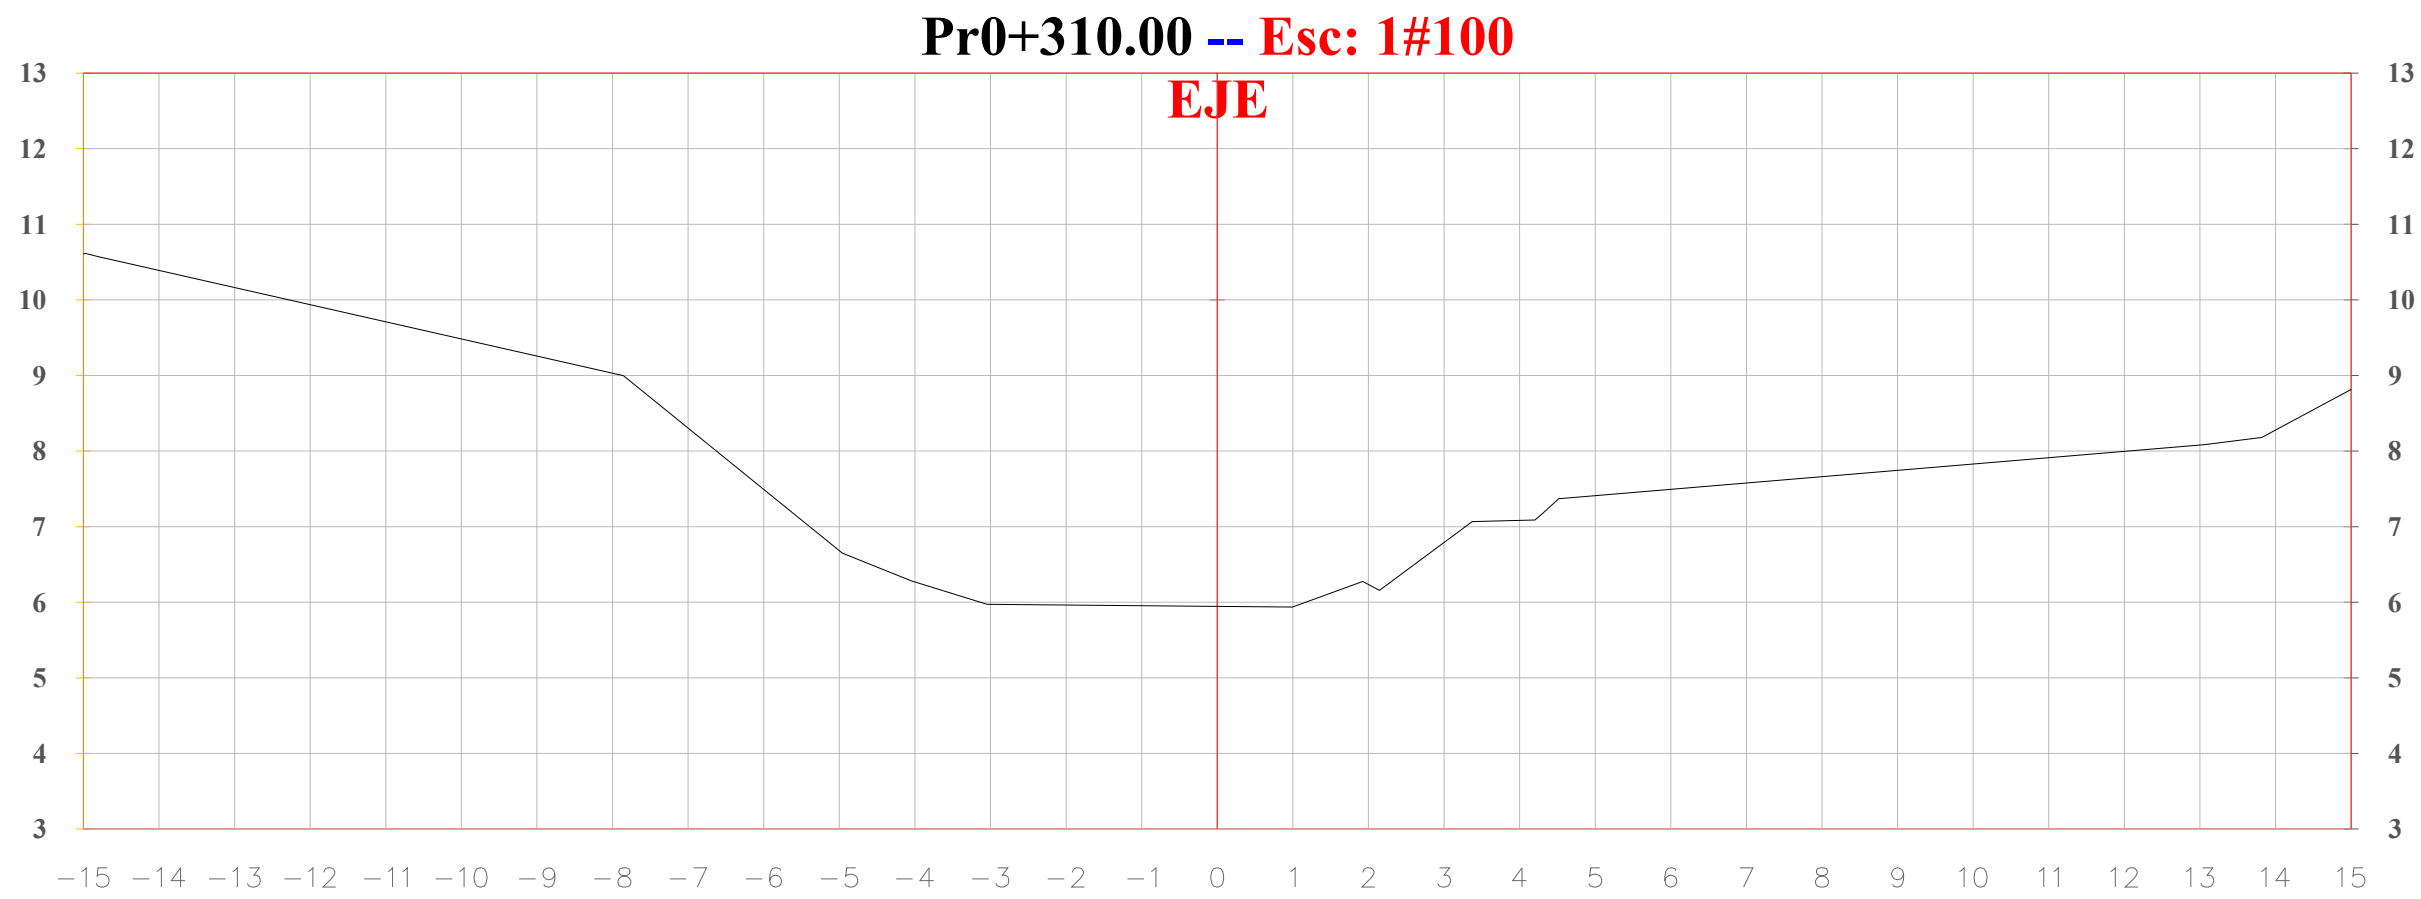

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LUIS SÁNCHEZ FARIAS
Mat. Profesional 82.22794

Director de Obra:
YUSO MARCELO GARCÍA SÁNCHEZ
Mat. Profesional 2320201900017

Topógrafo Interventor:
Jorge R. RIVERA
Mat. Profesional 8323015475

Director de Interventoría:
MANUEL BERNARDO GÓMEZ
Mat. Profesional 8323015475

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:

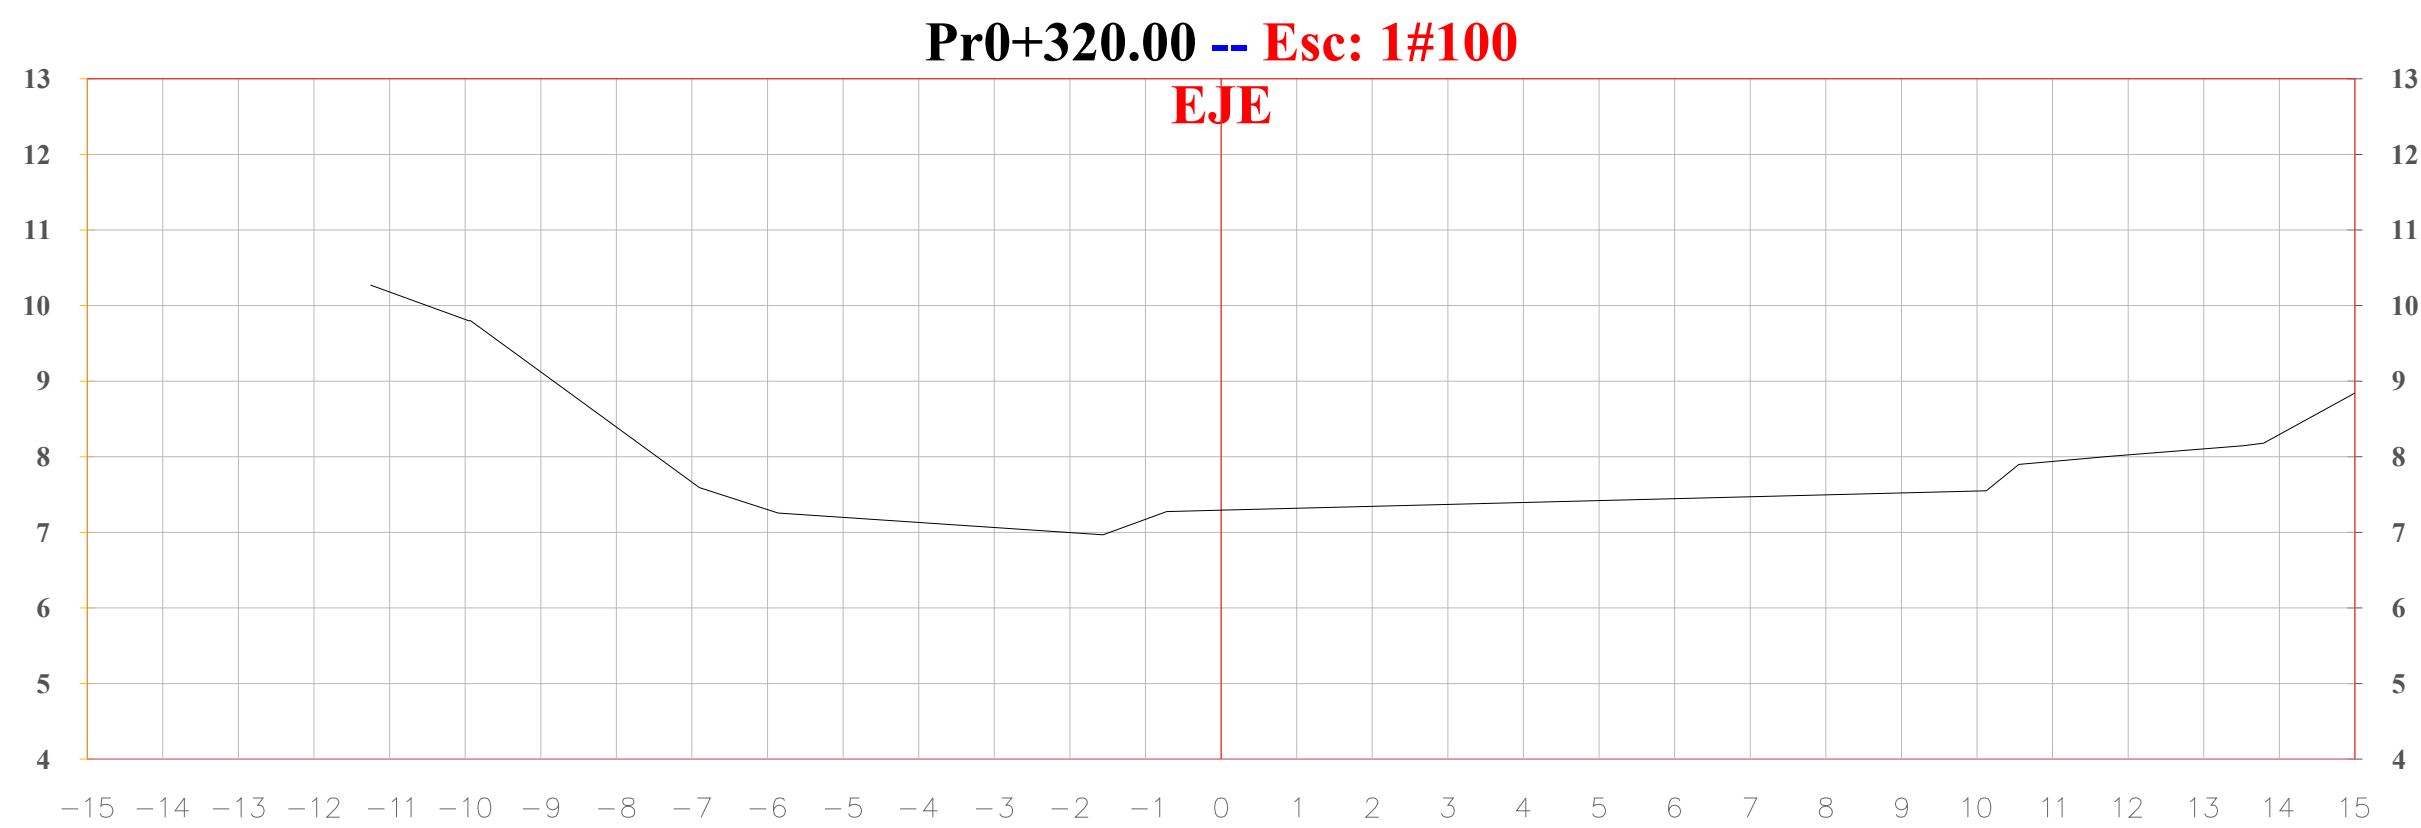


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

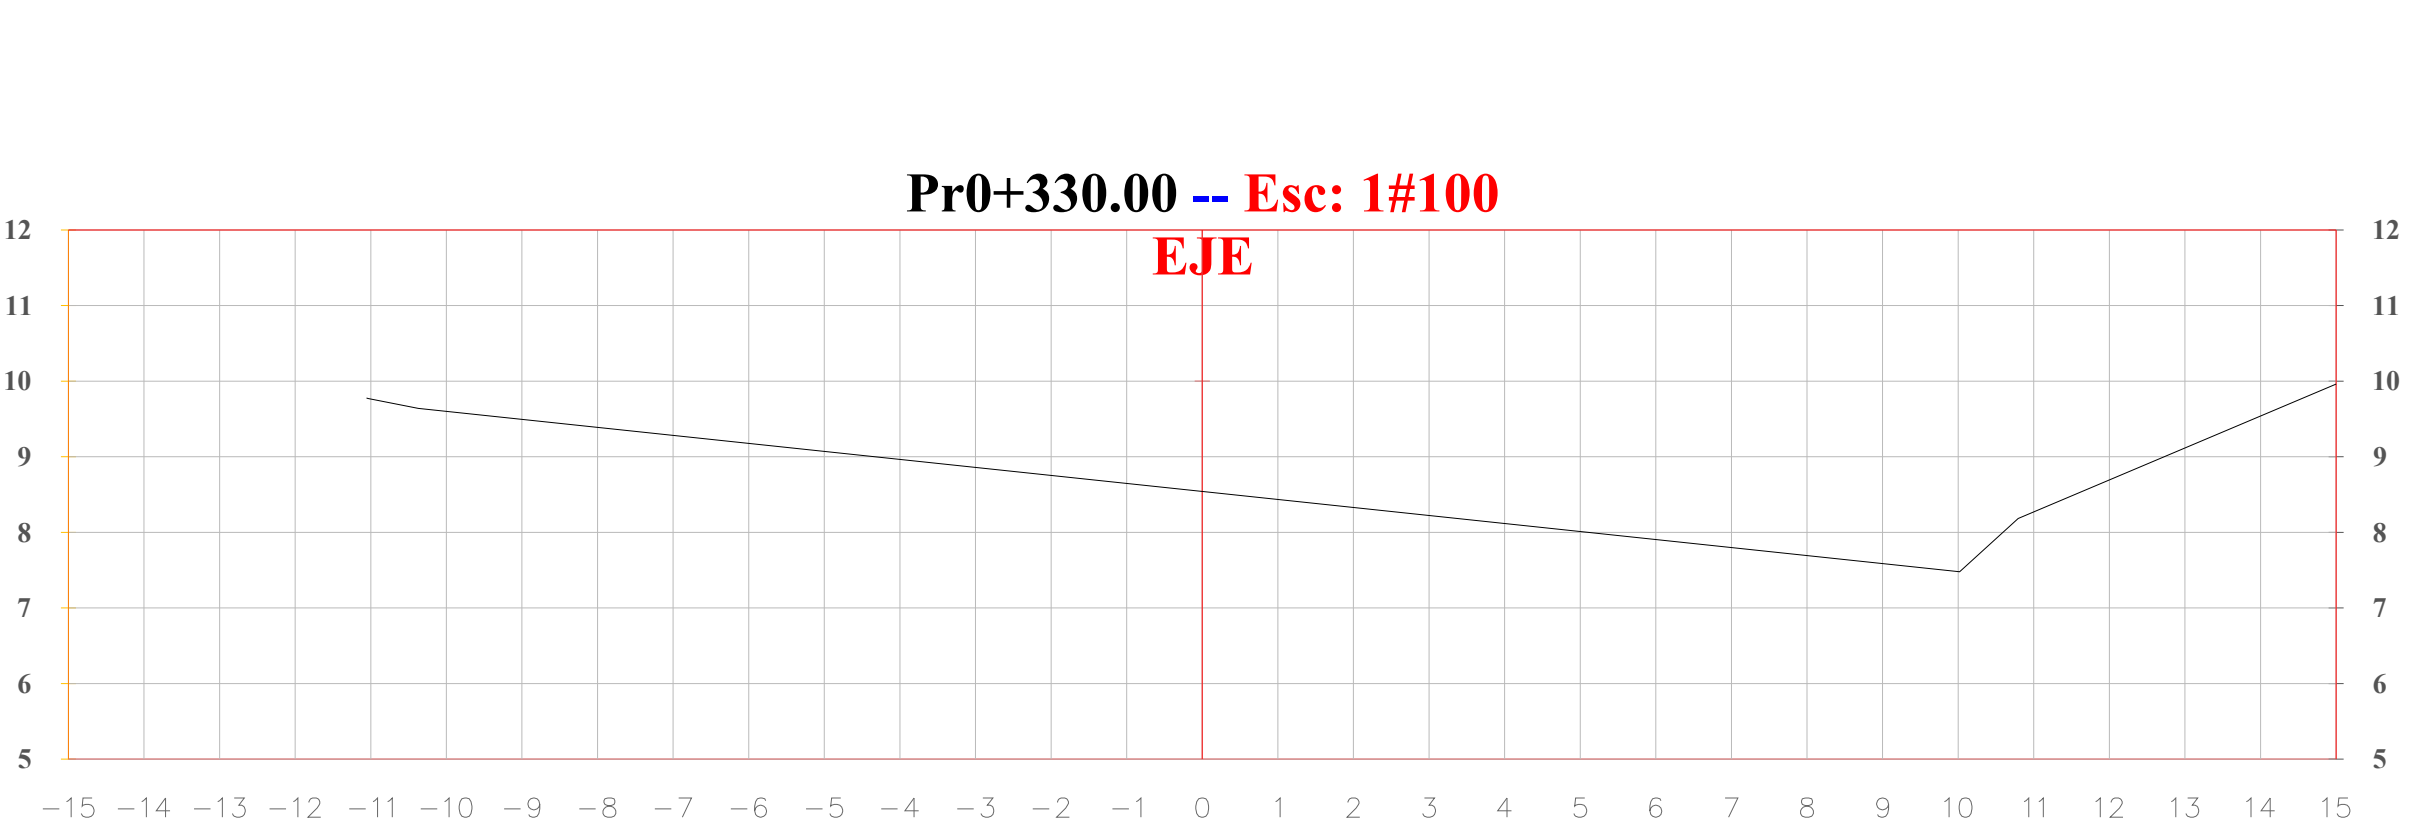


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

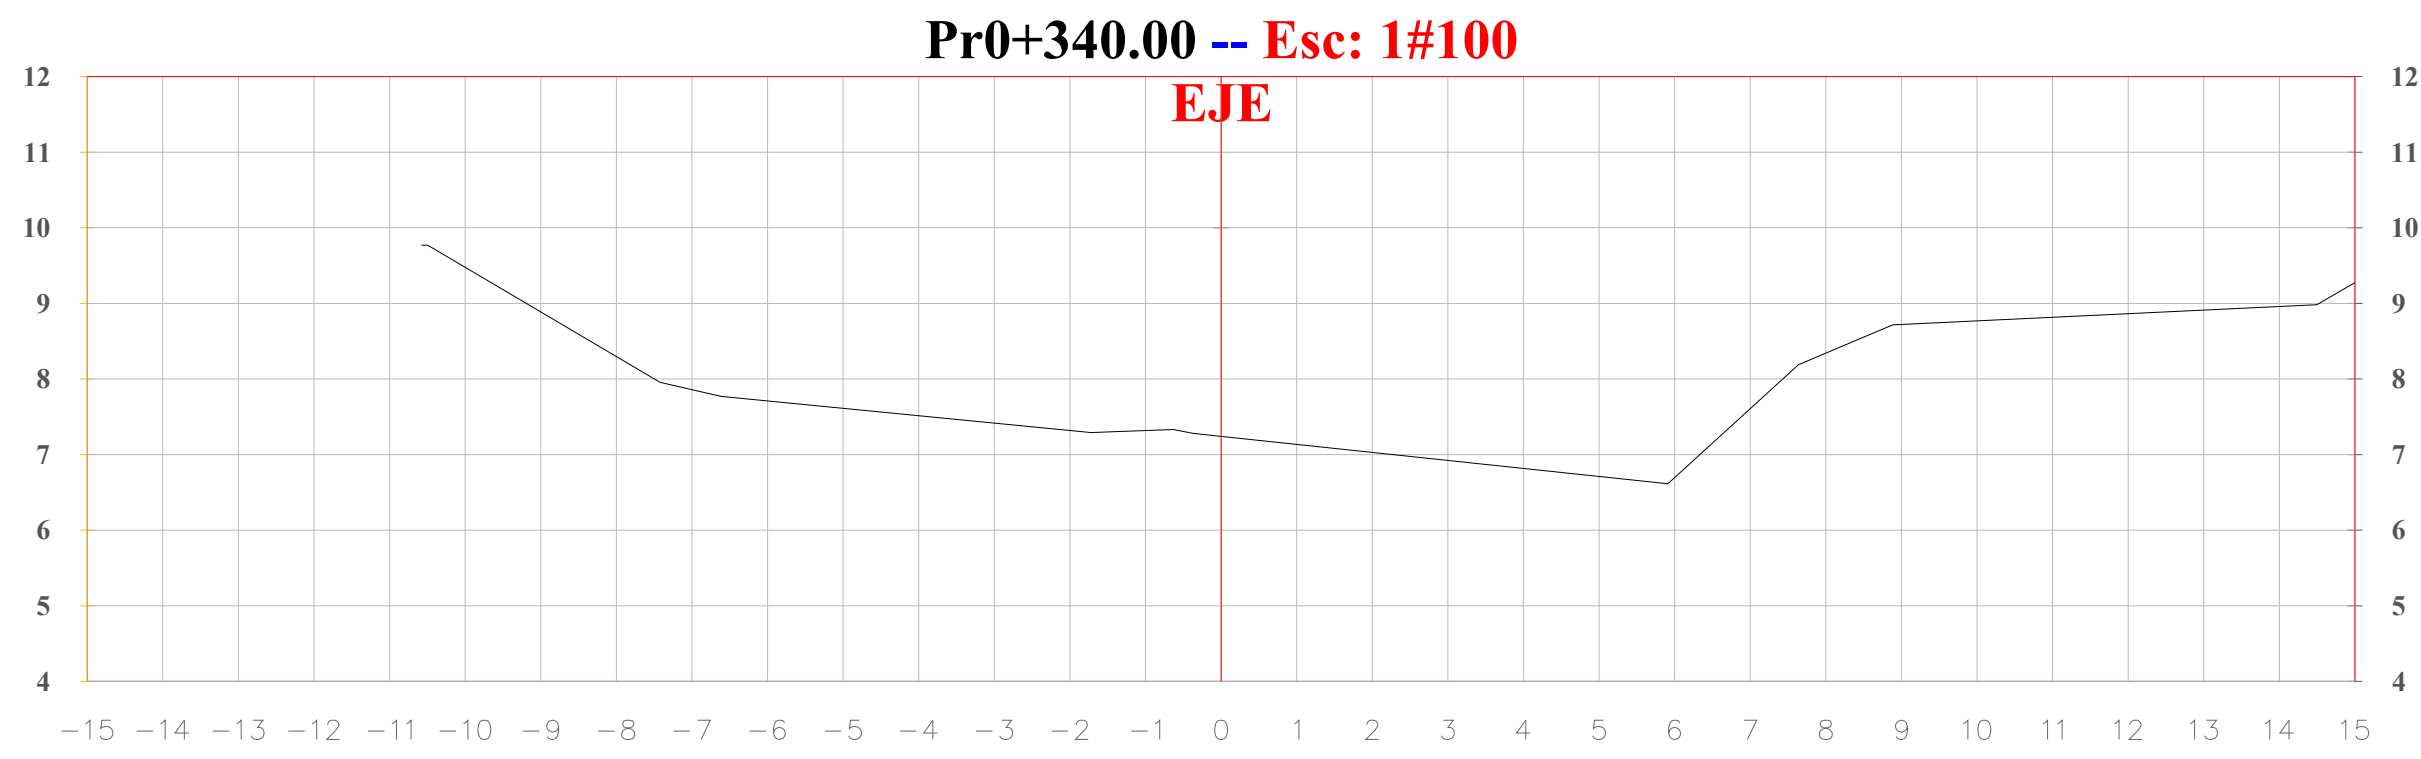


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

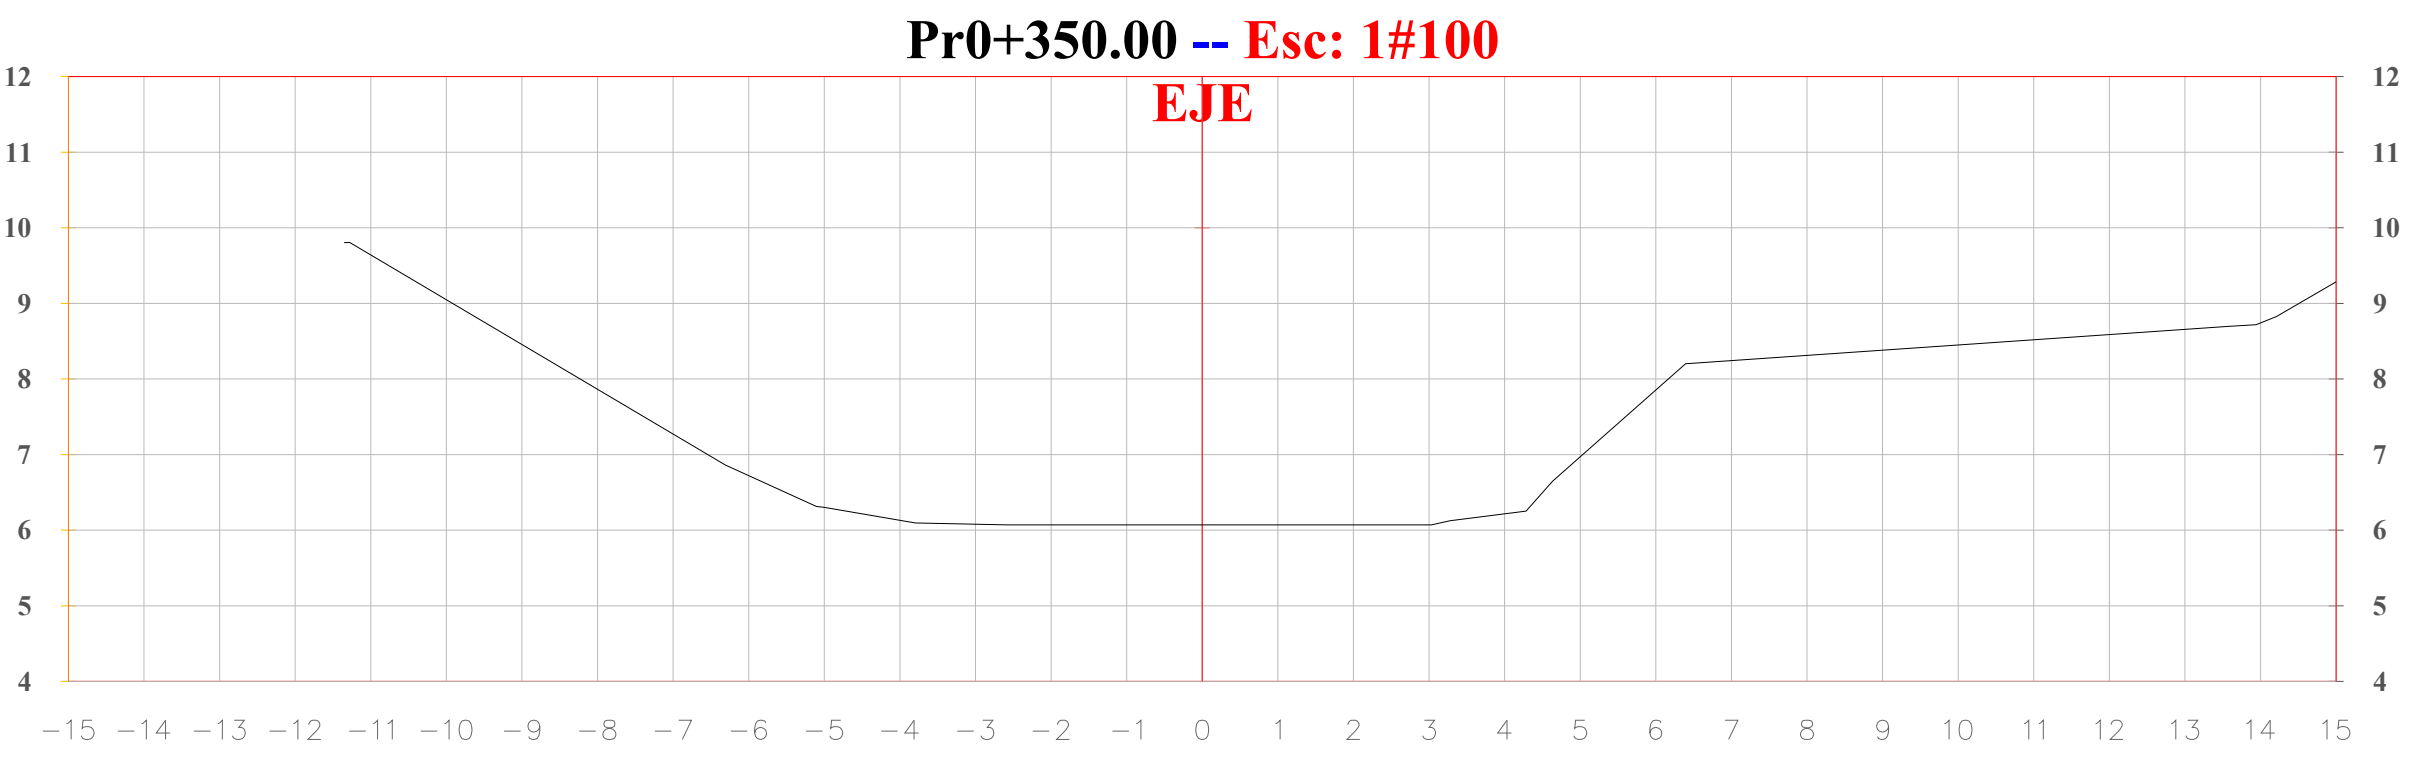


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

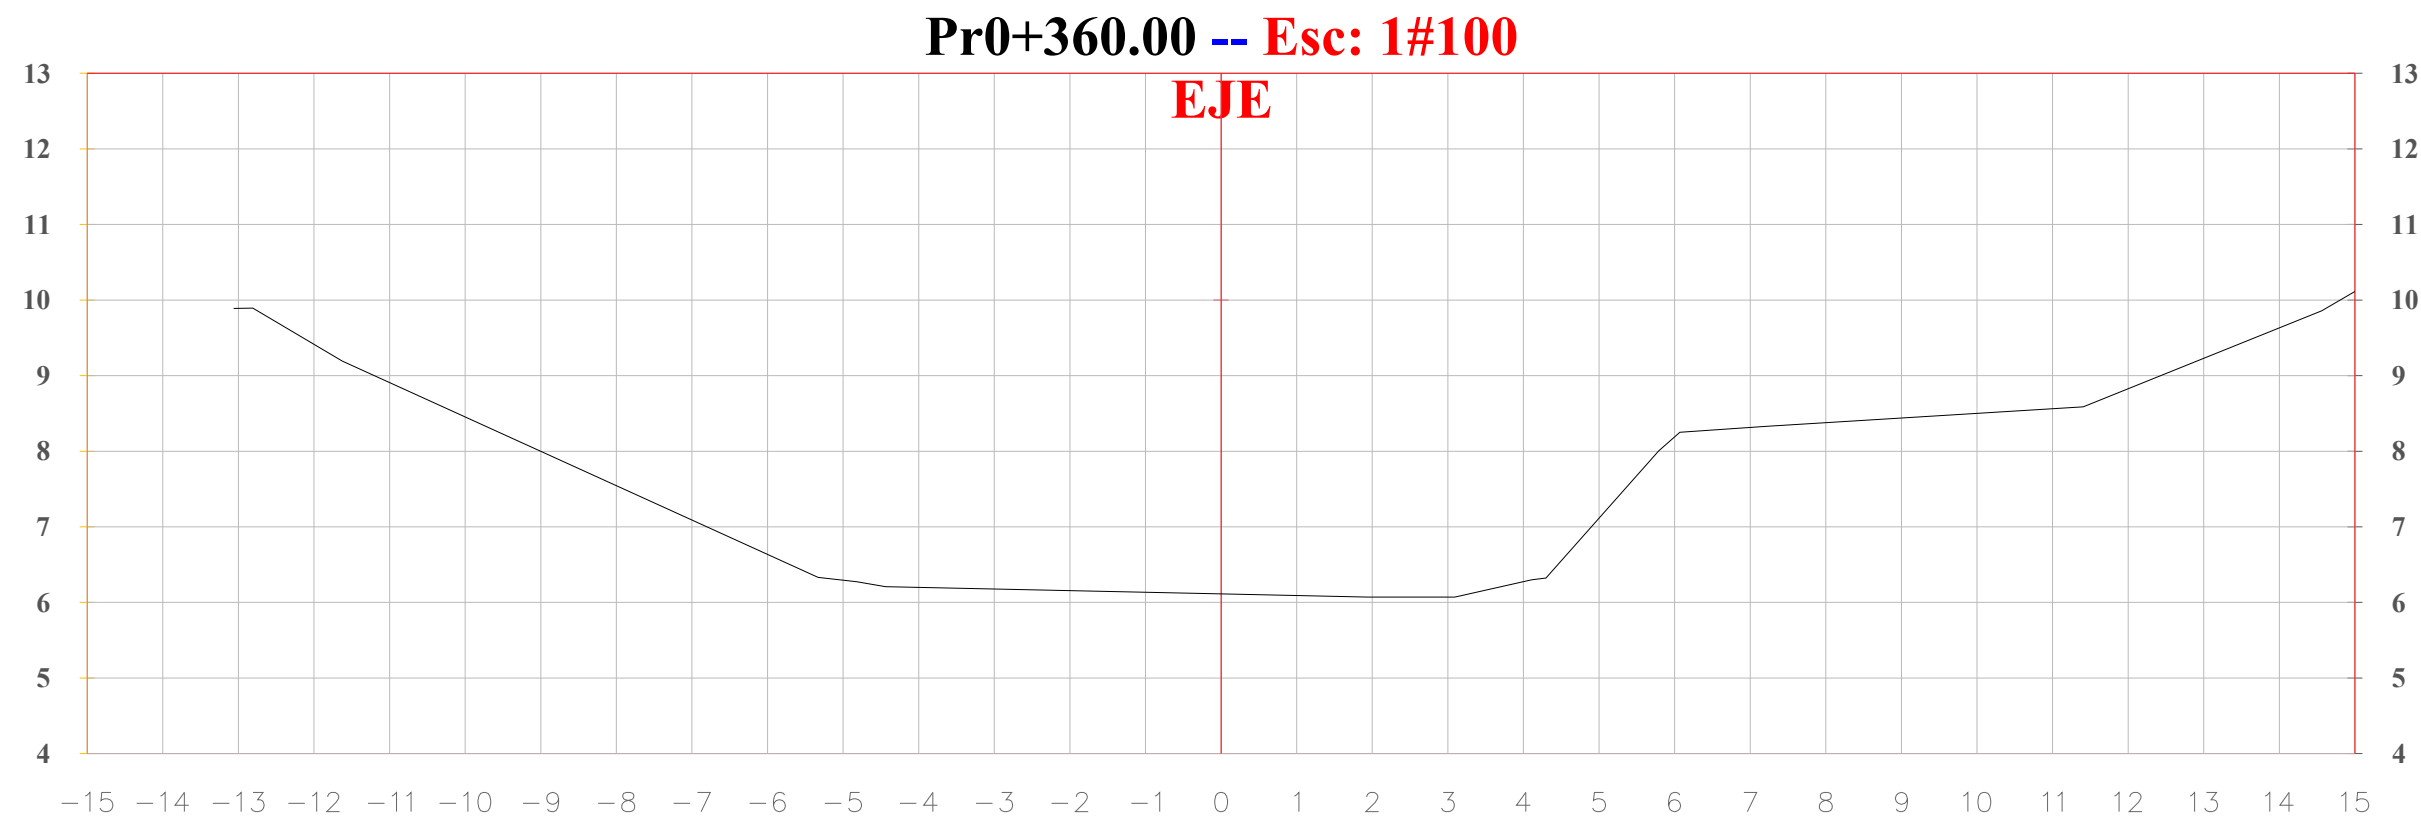


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

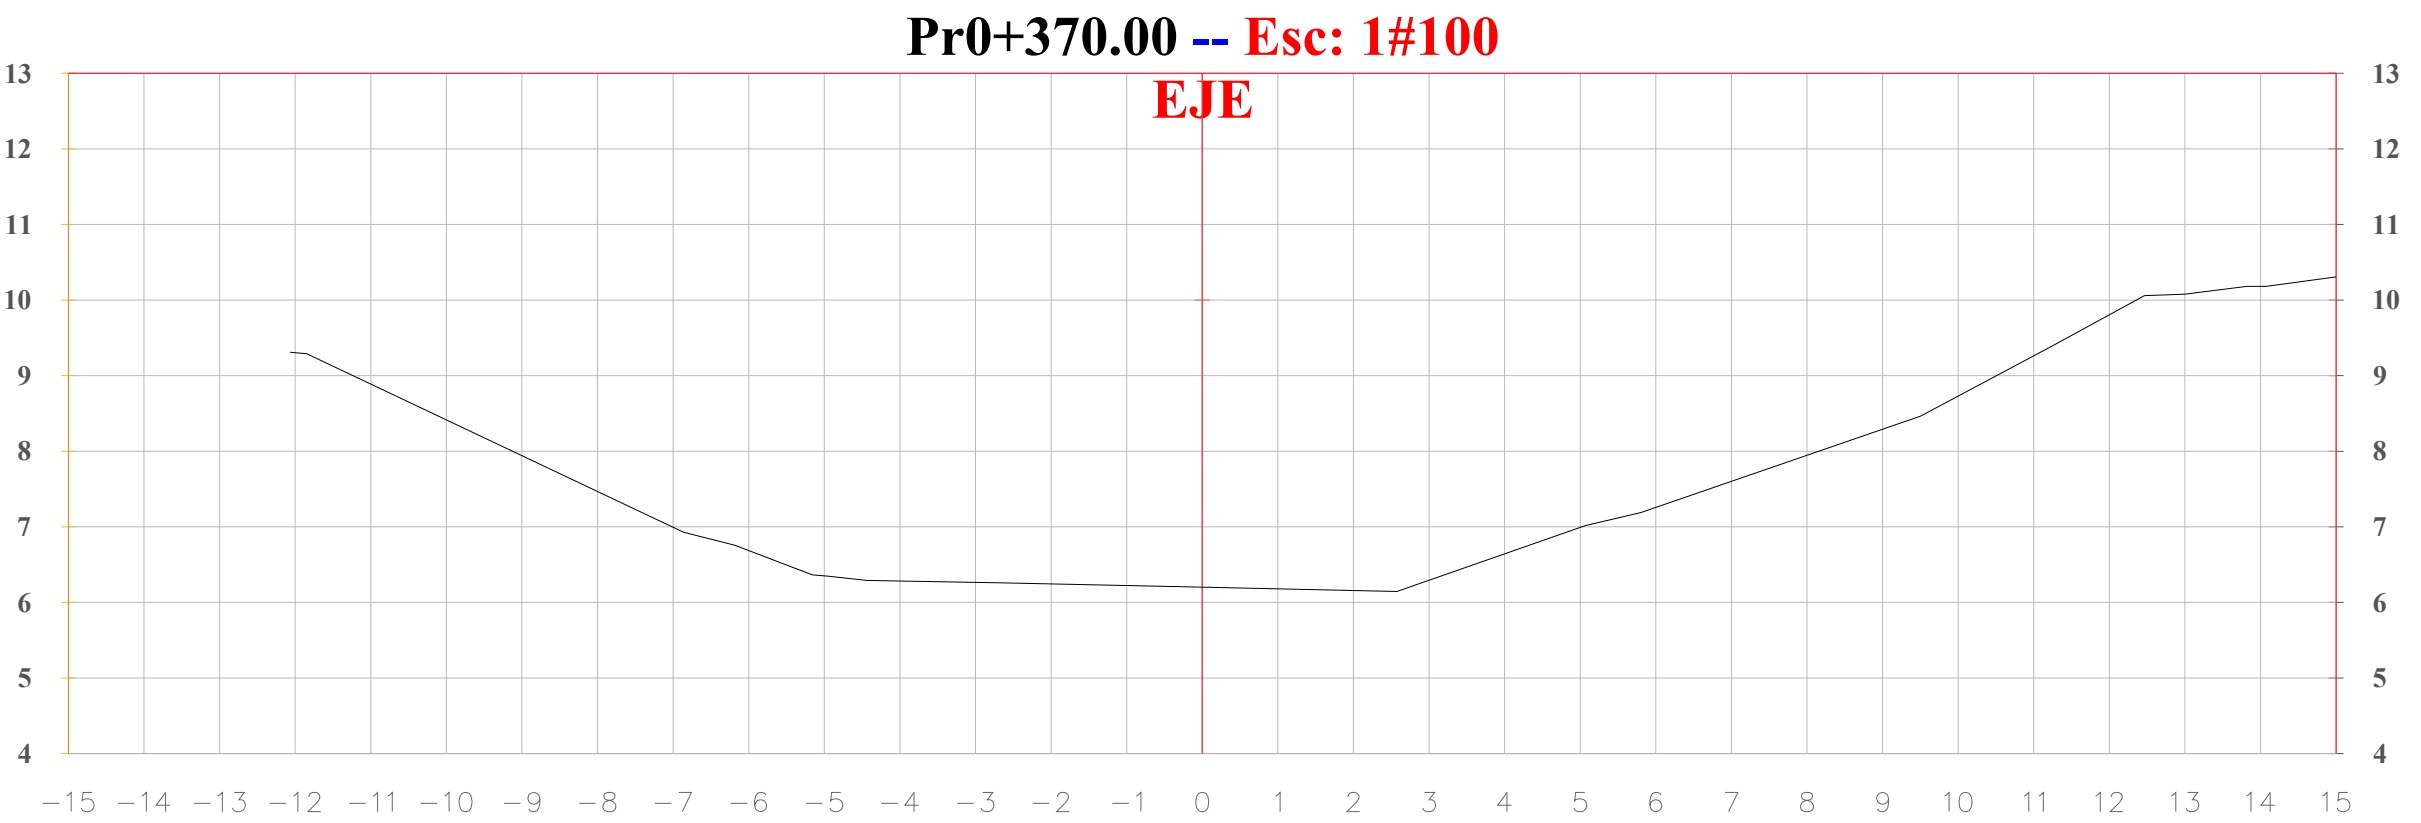

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

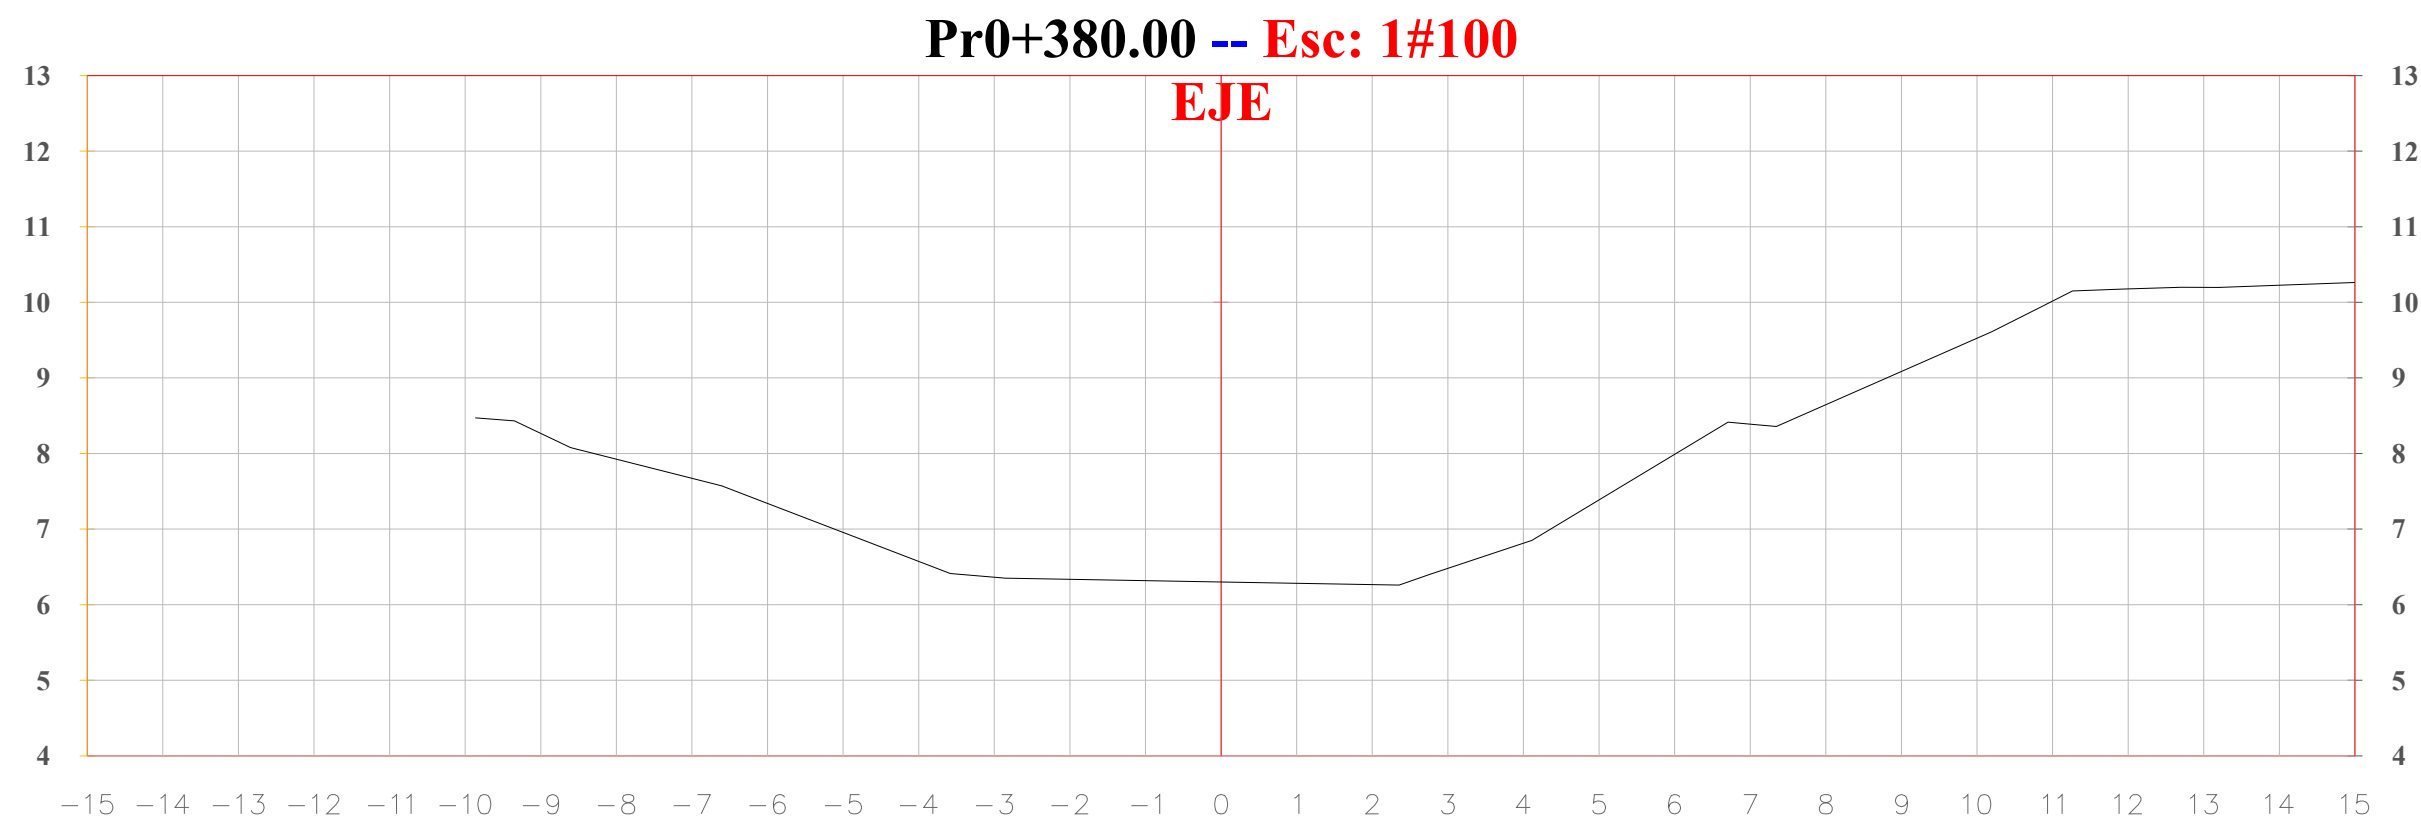

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

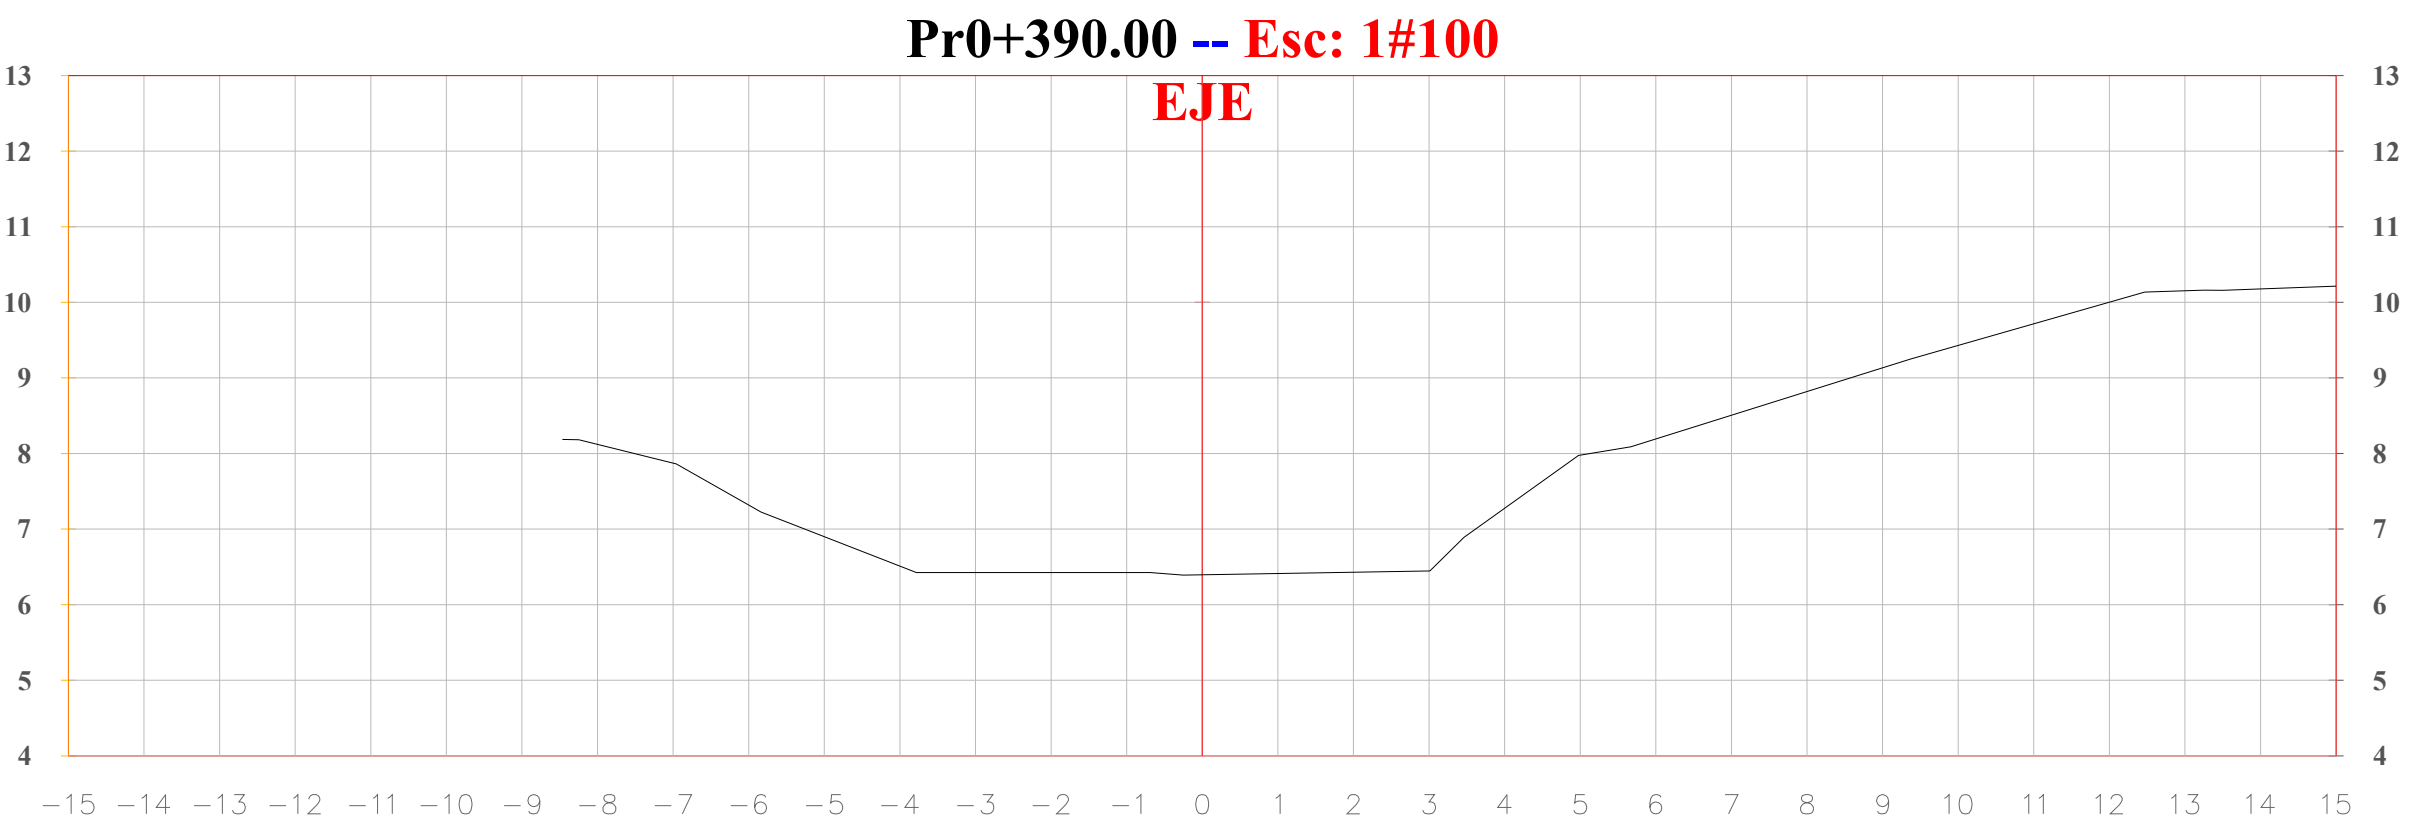

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
[Firma]
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Mat. Profesional 02-11799

Director de Obra:
[Firma]
YESSY MARCELO GARCIA
Mat. Profesional 1332-001990617

Topógrafo Interventor:
[Firma]
JESUS RIVERA
Mat. Profesional 02-16473

Director de Interventoría:
[Firma]
MANUEL BERNARDO GOMEZ
Mat. Profesional 0303015421

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:

PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

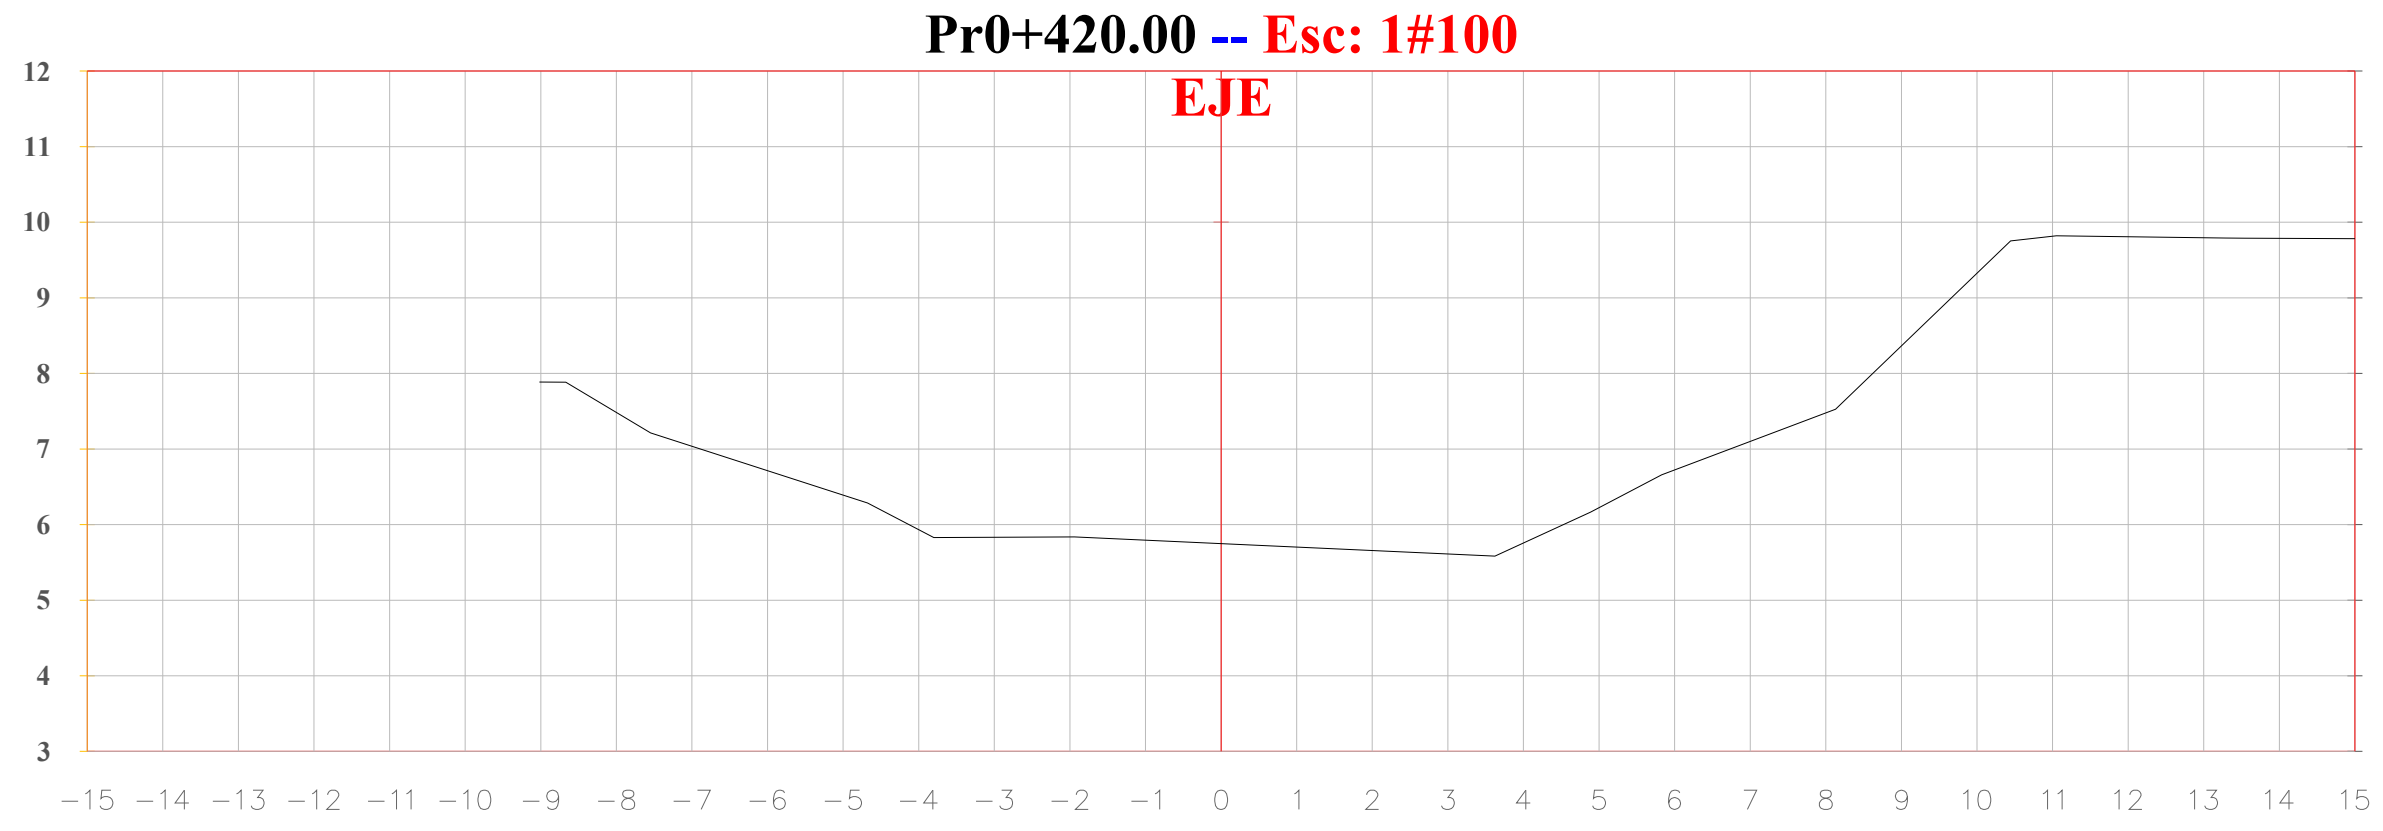


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

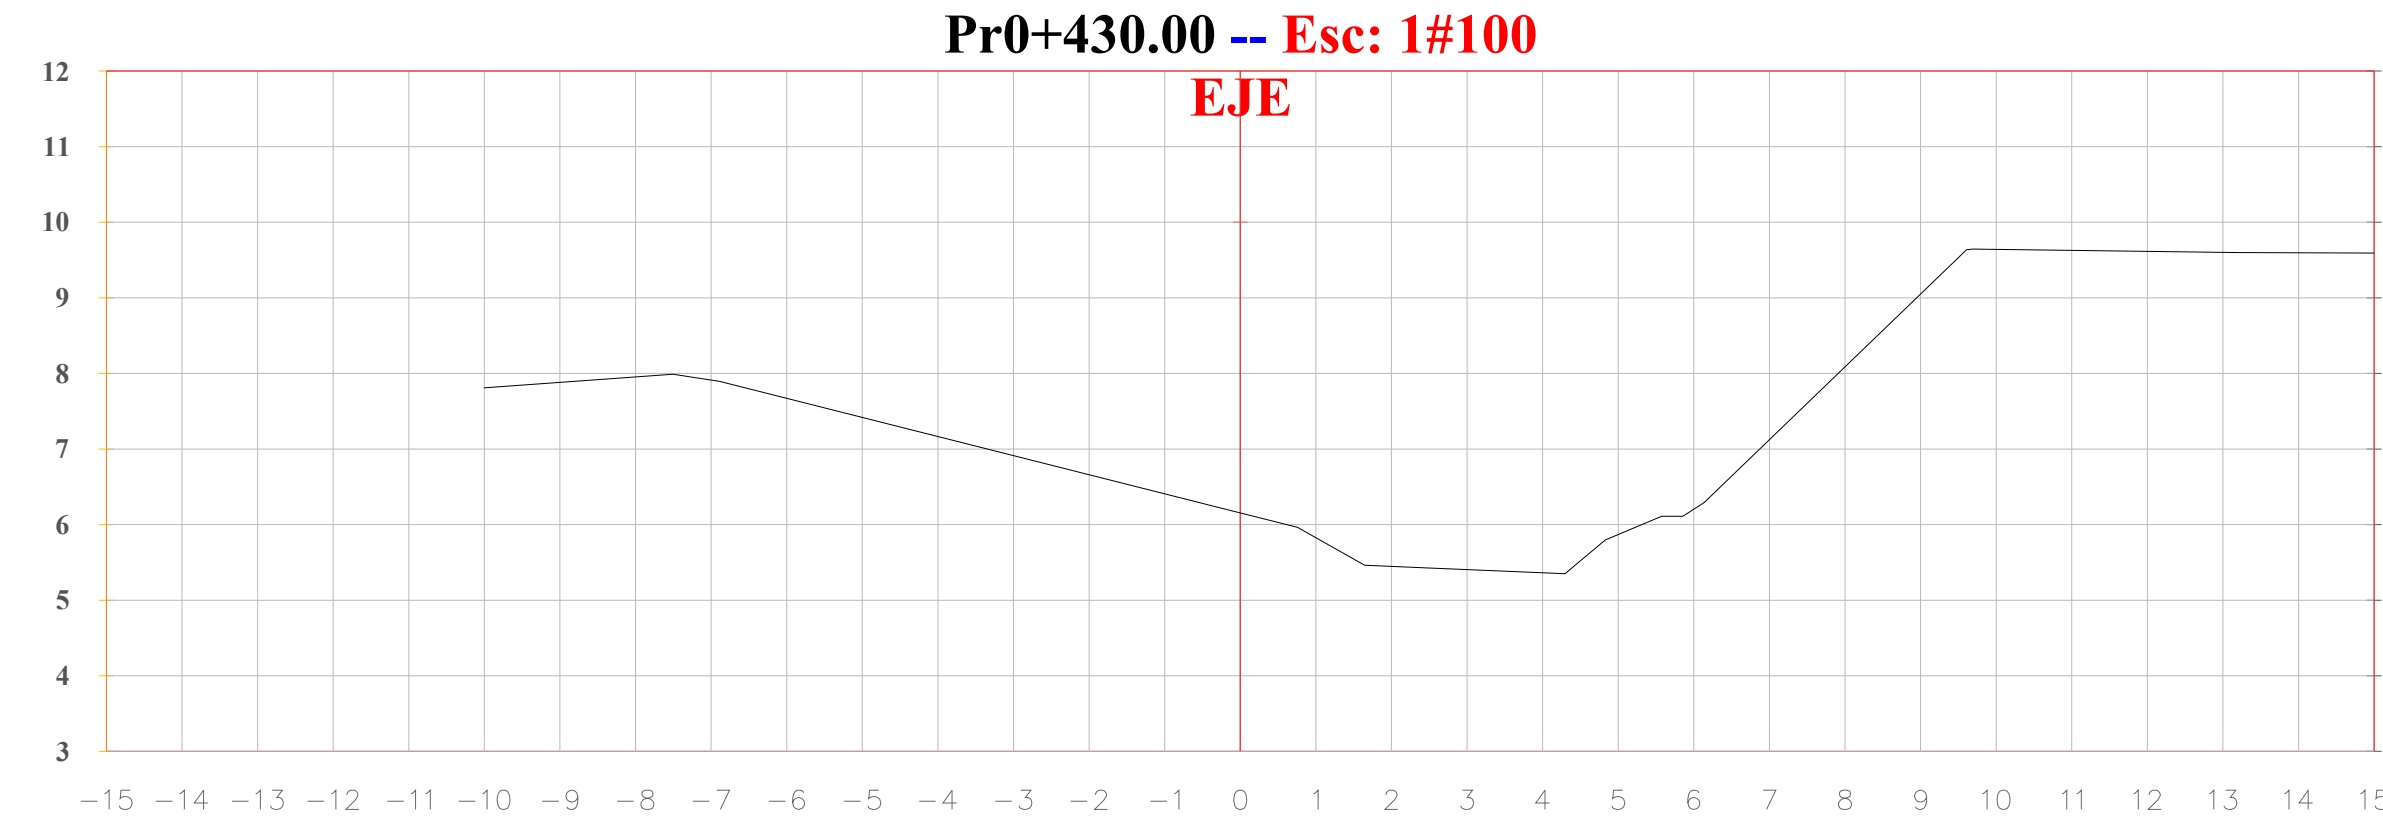


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

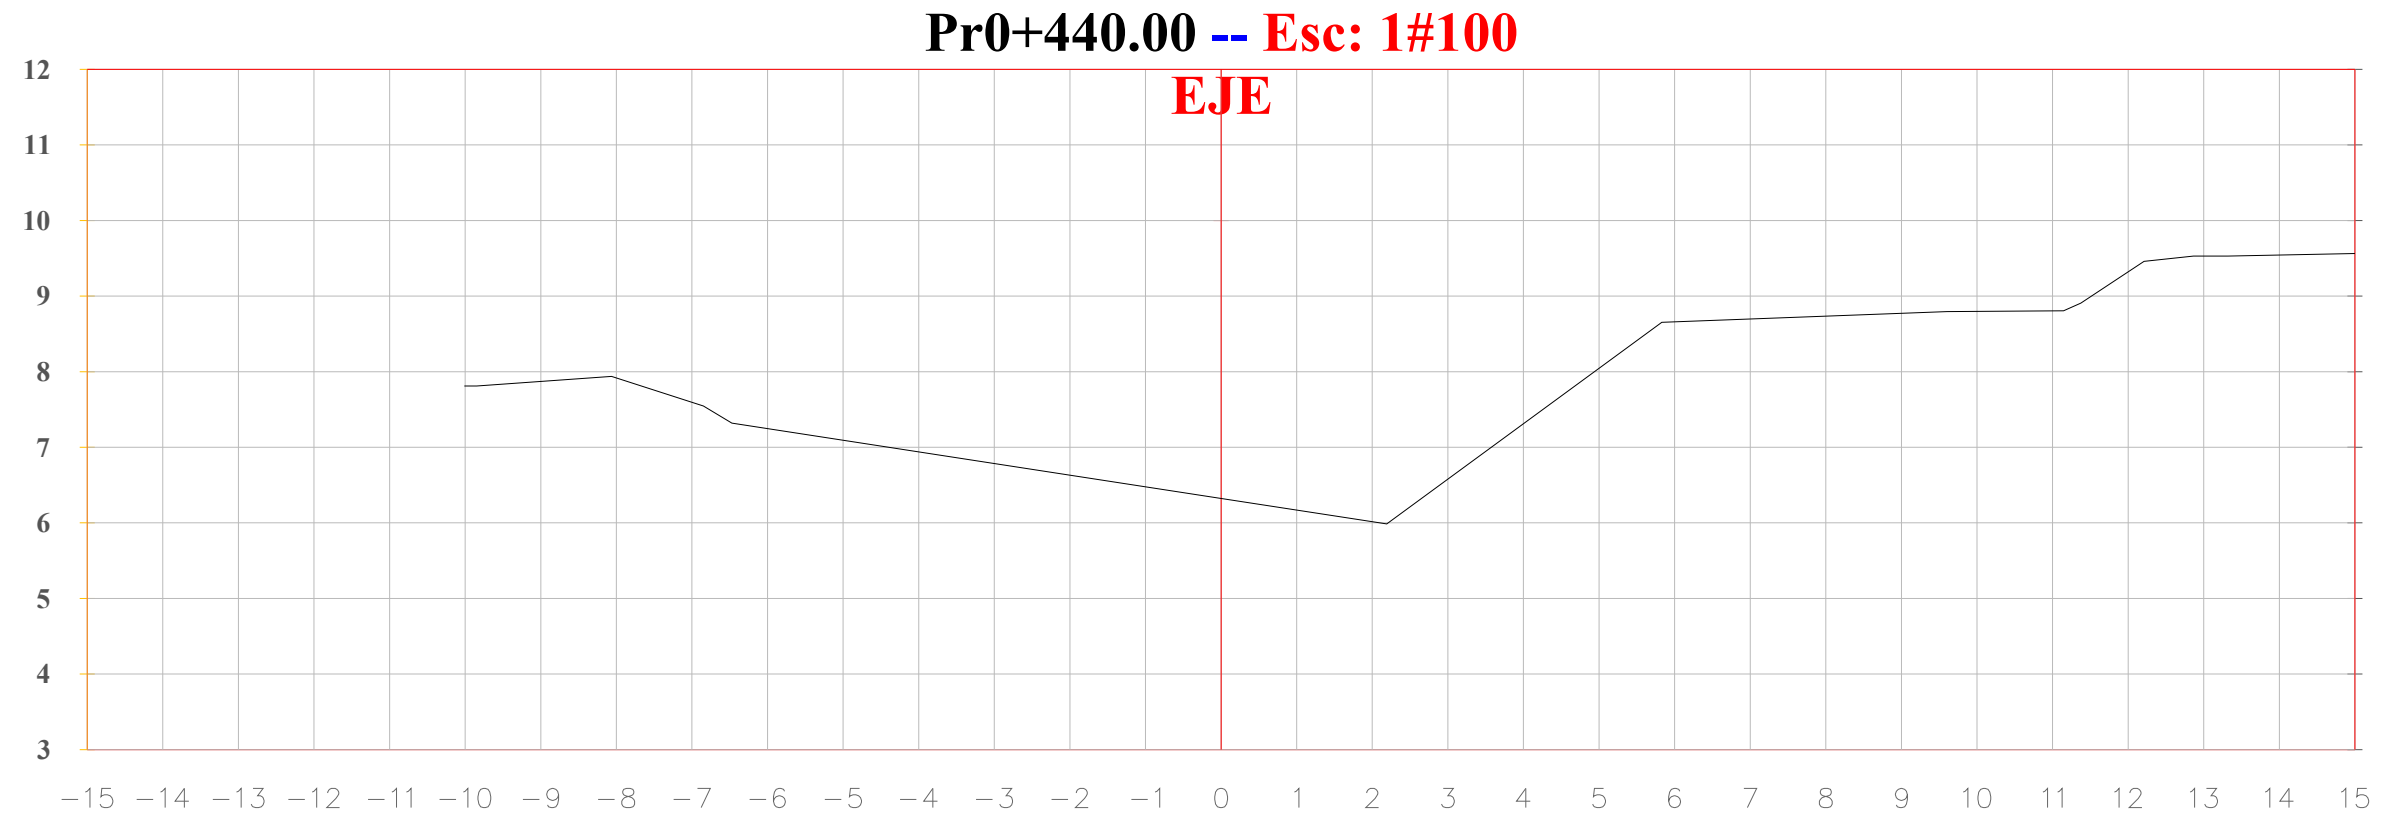

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

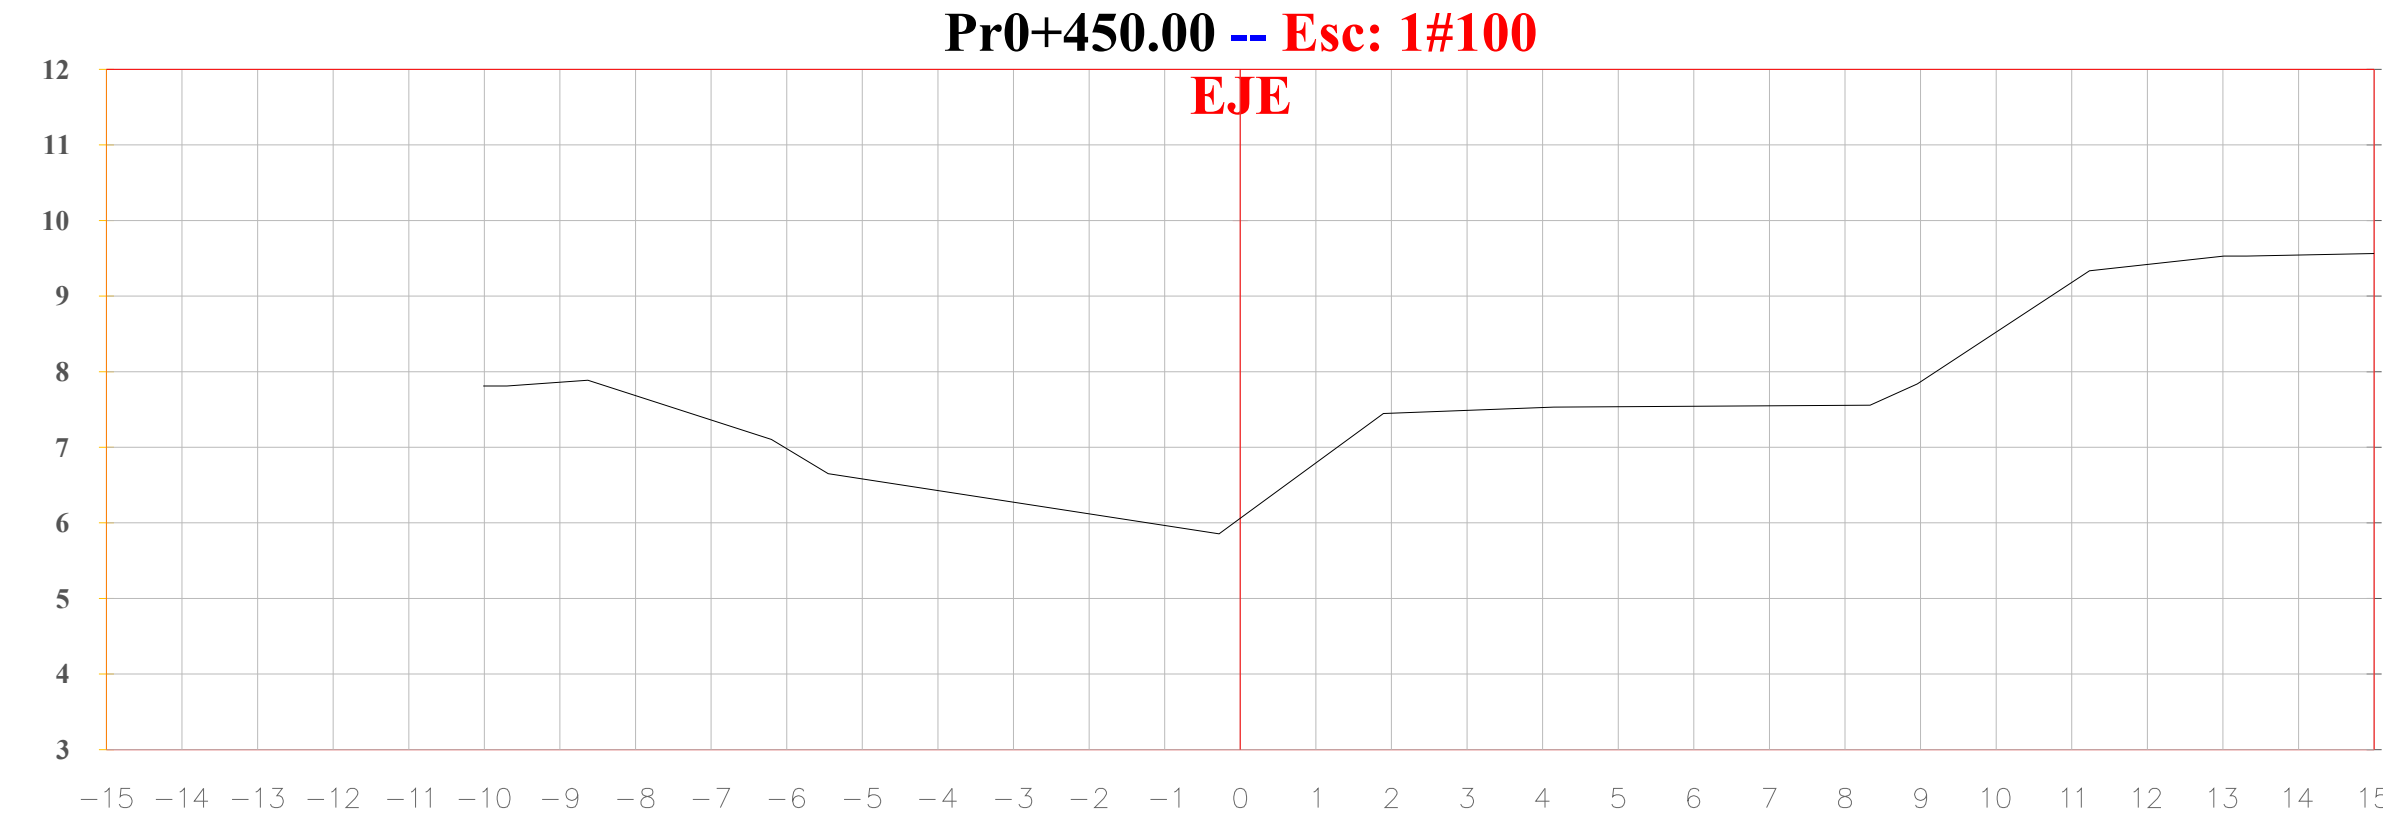


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

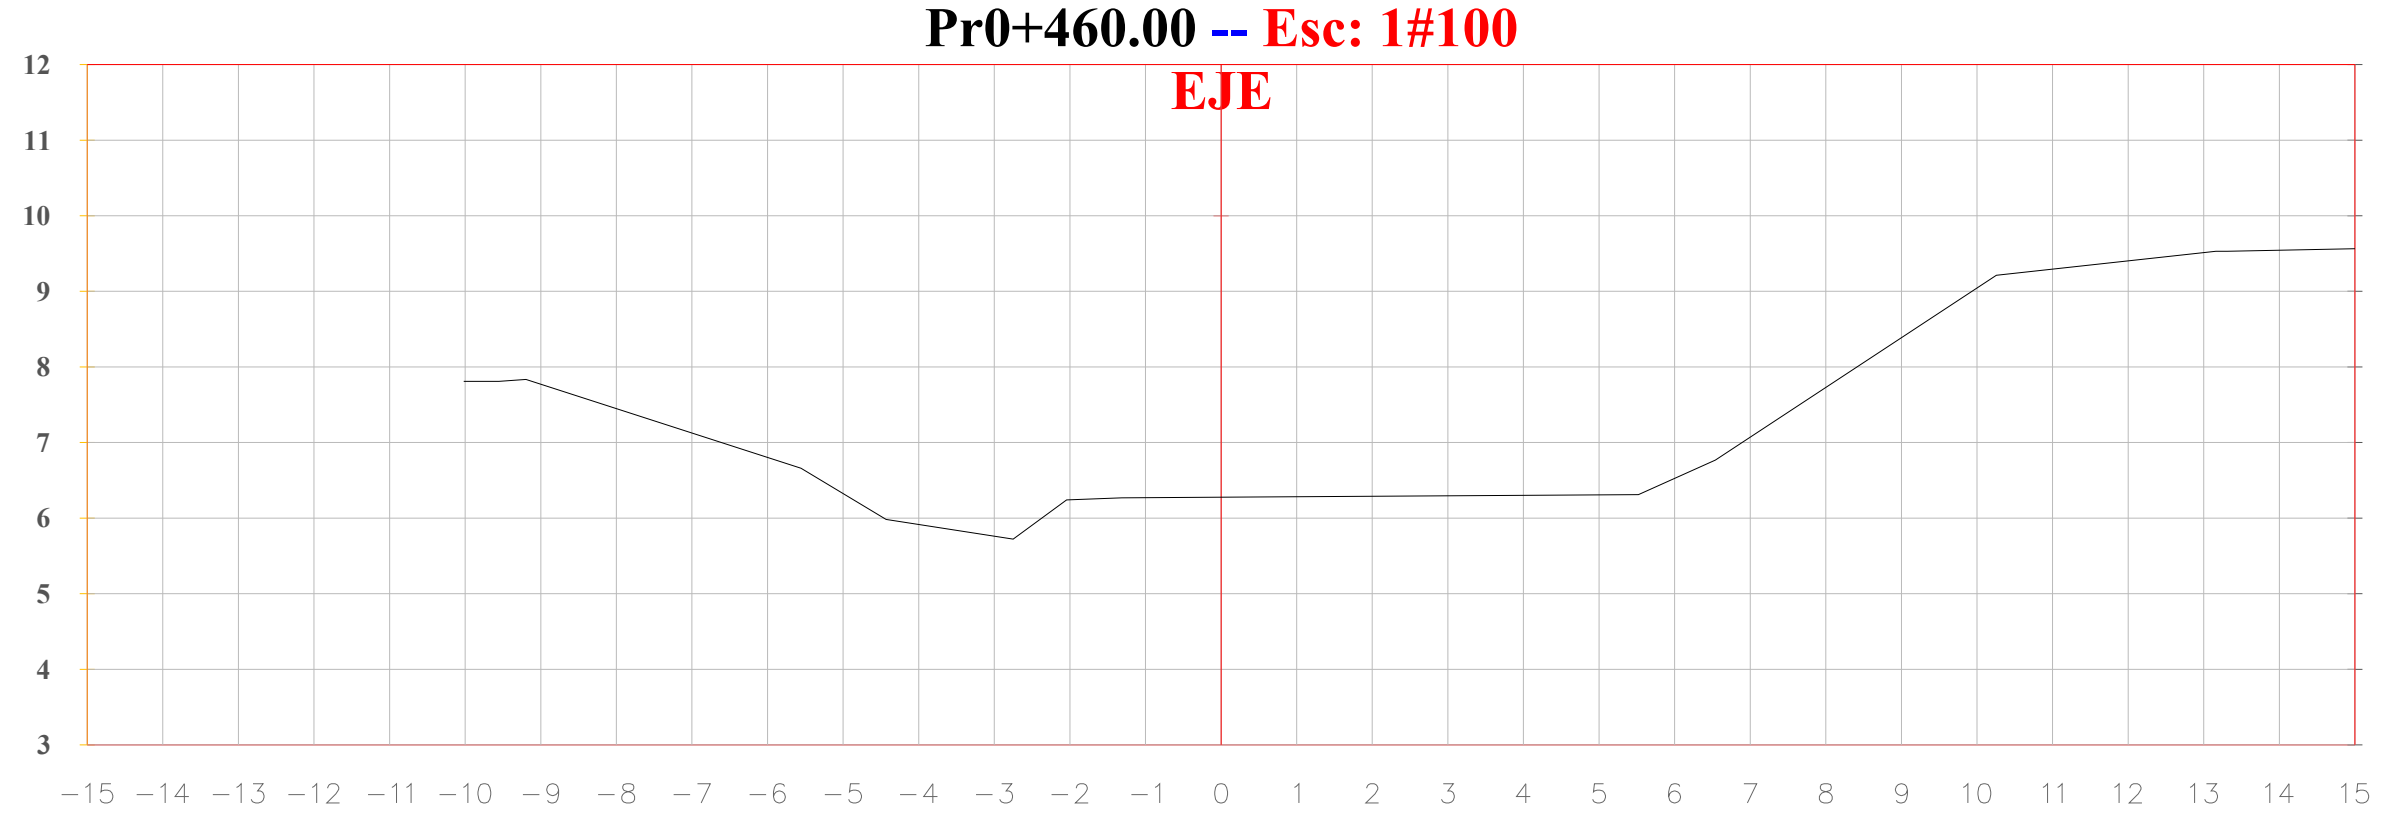


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

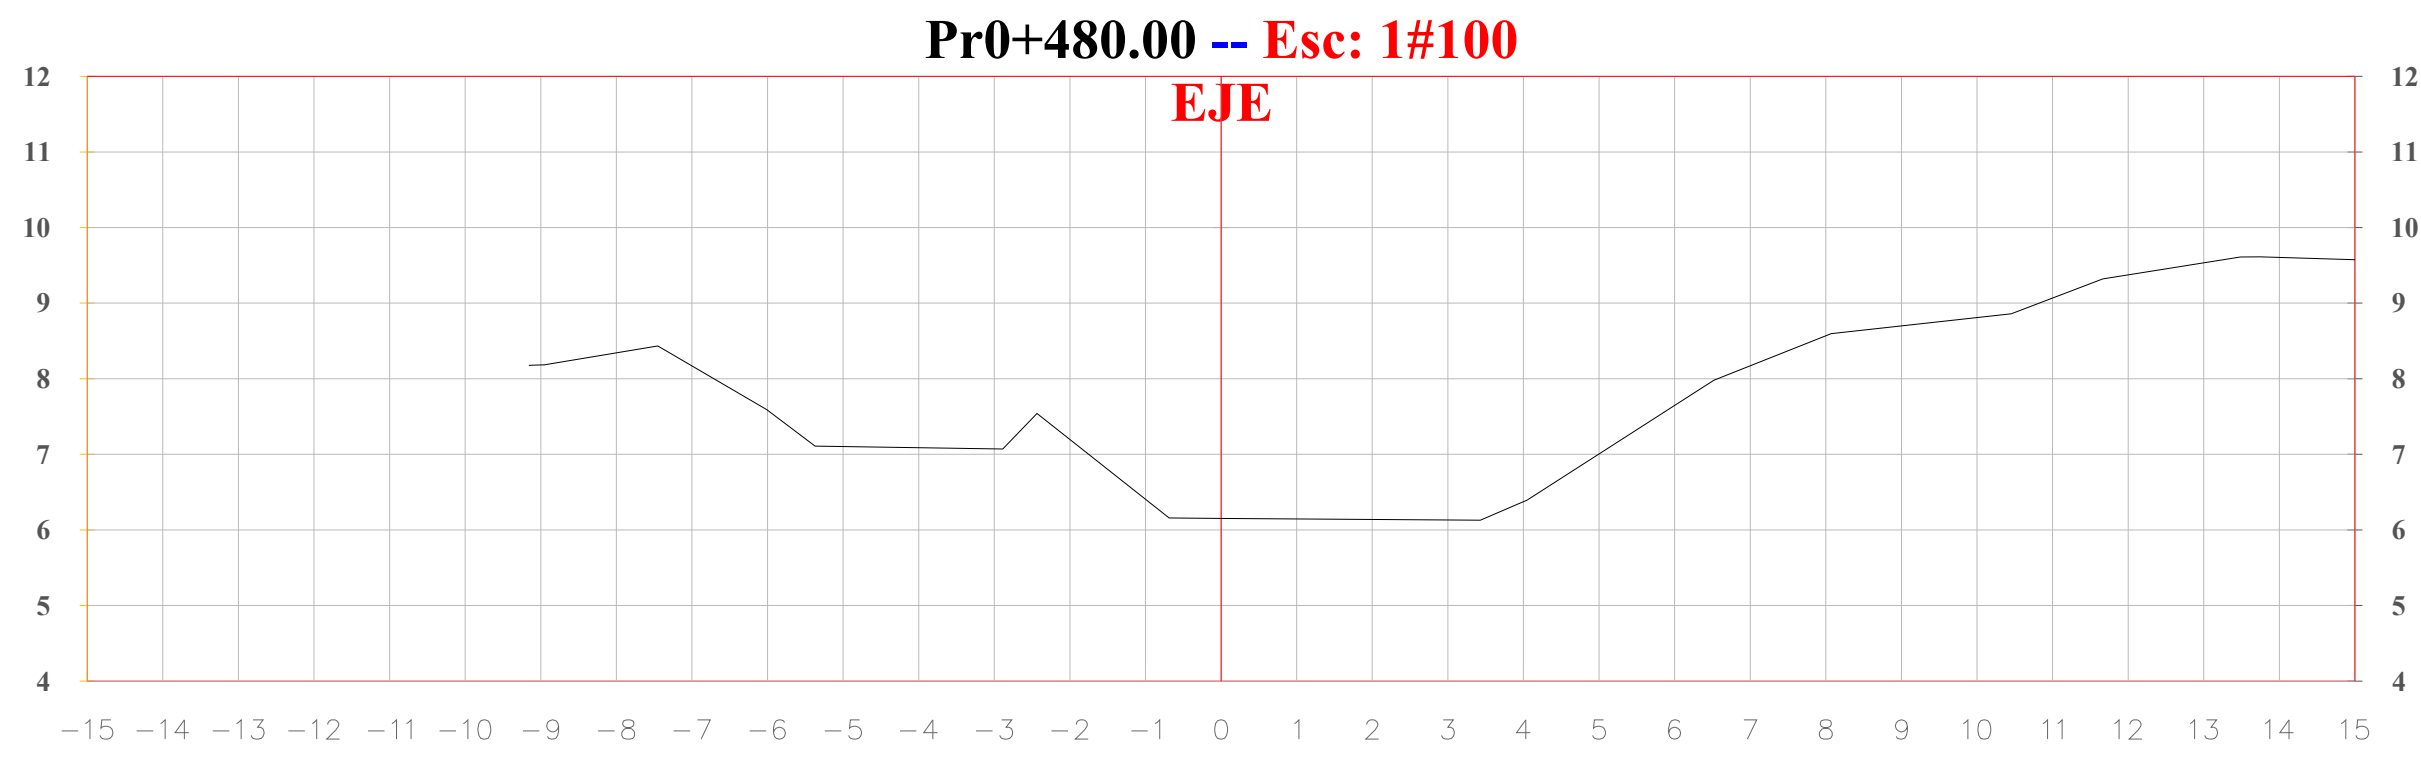


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

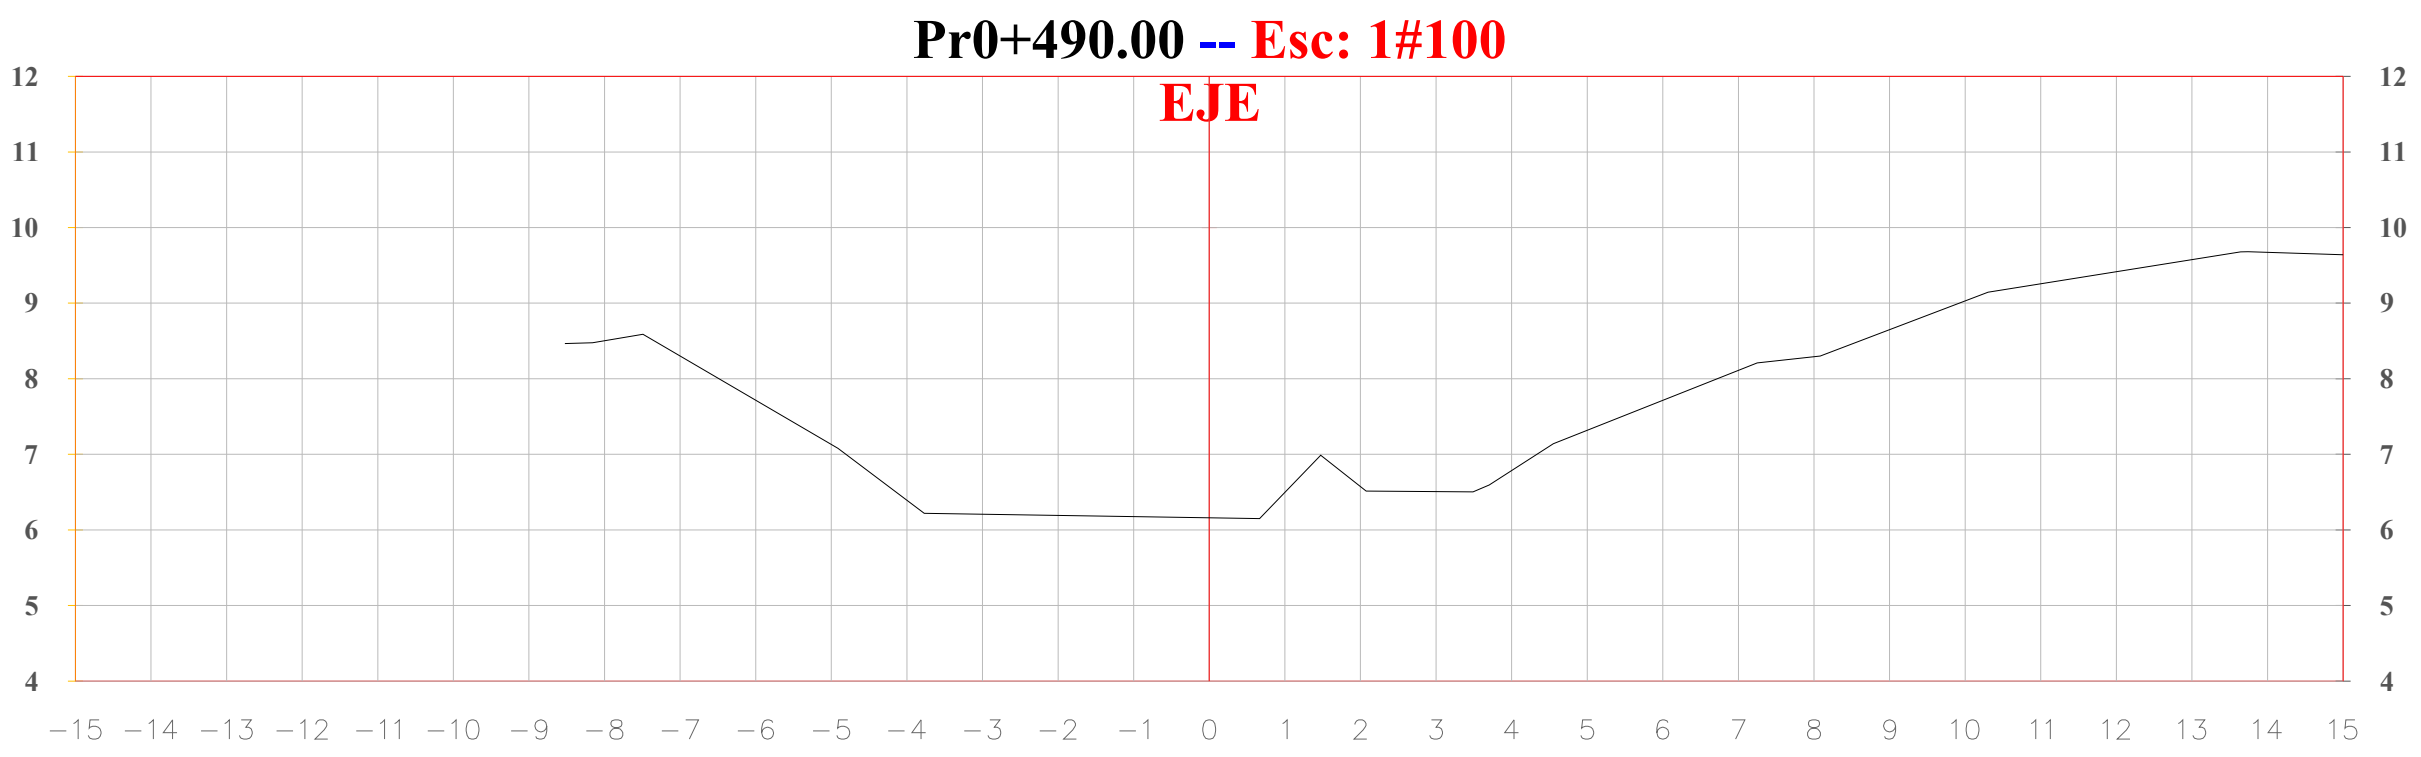


ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

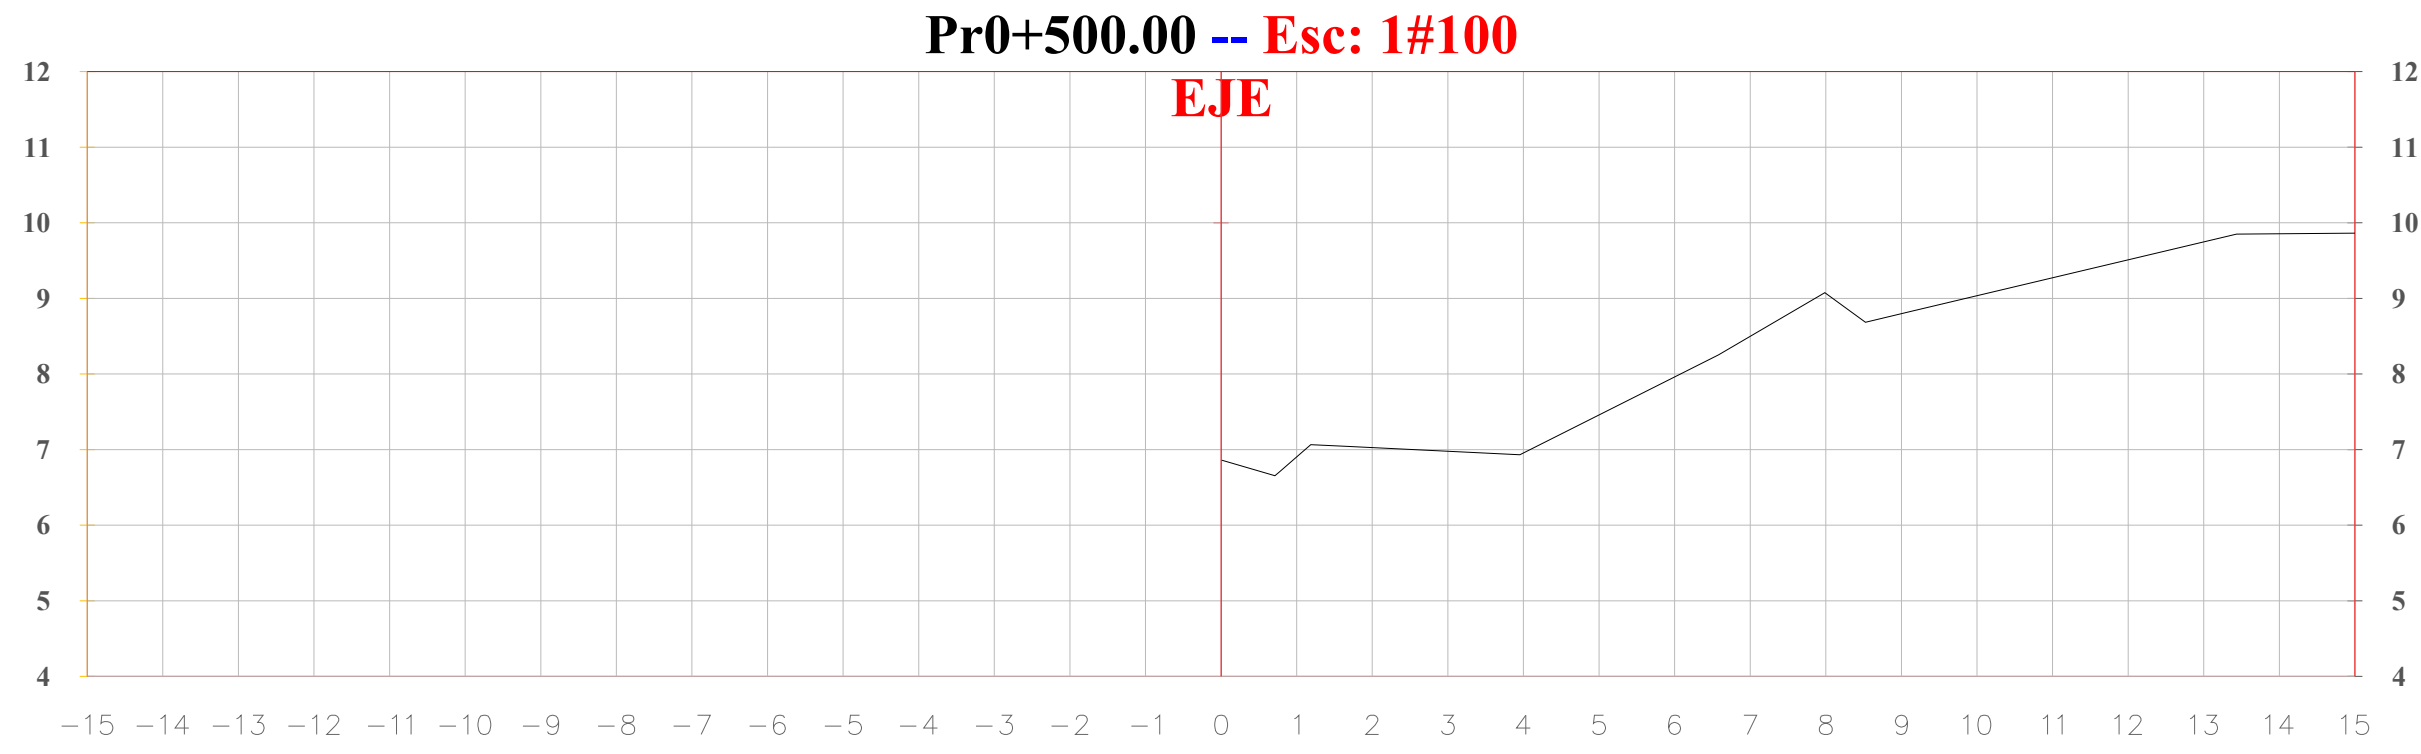

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

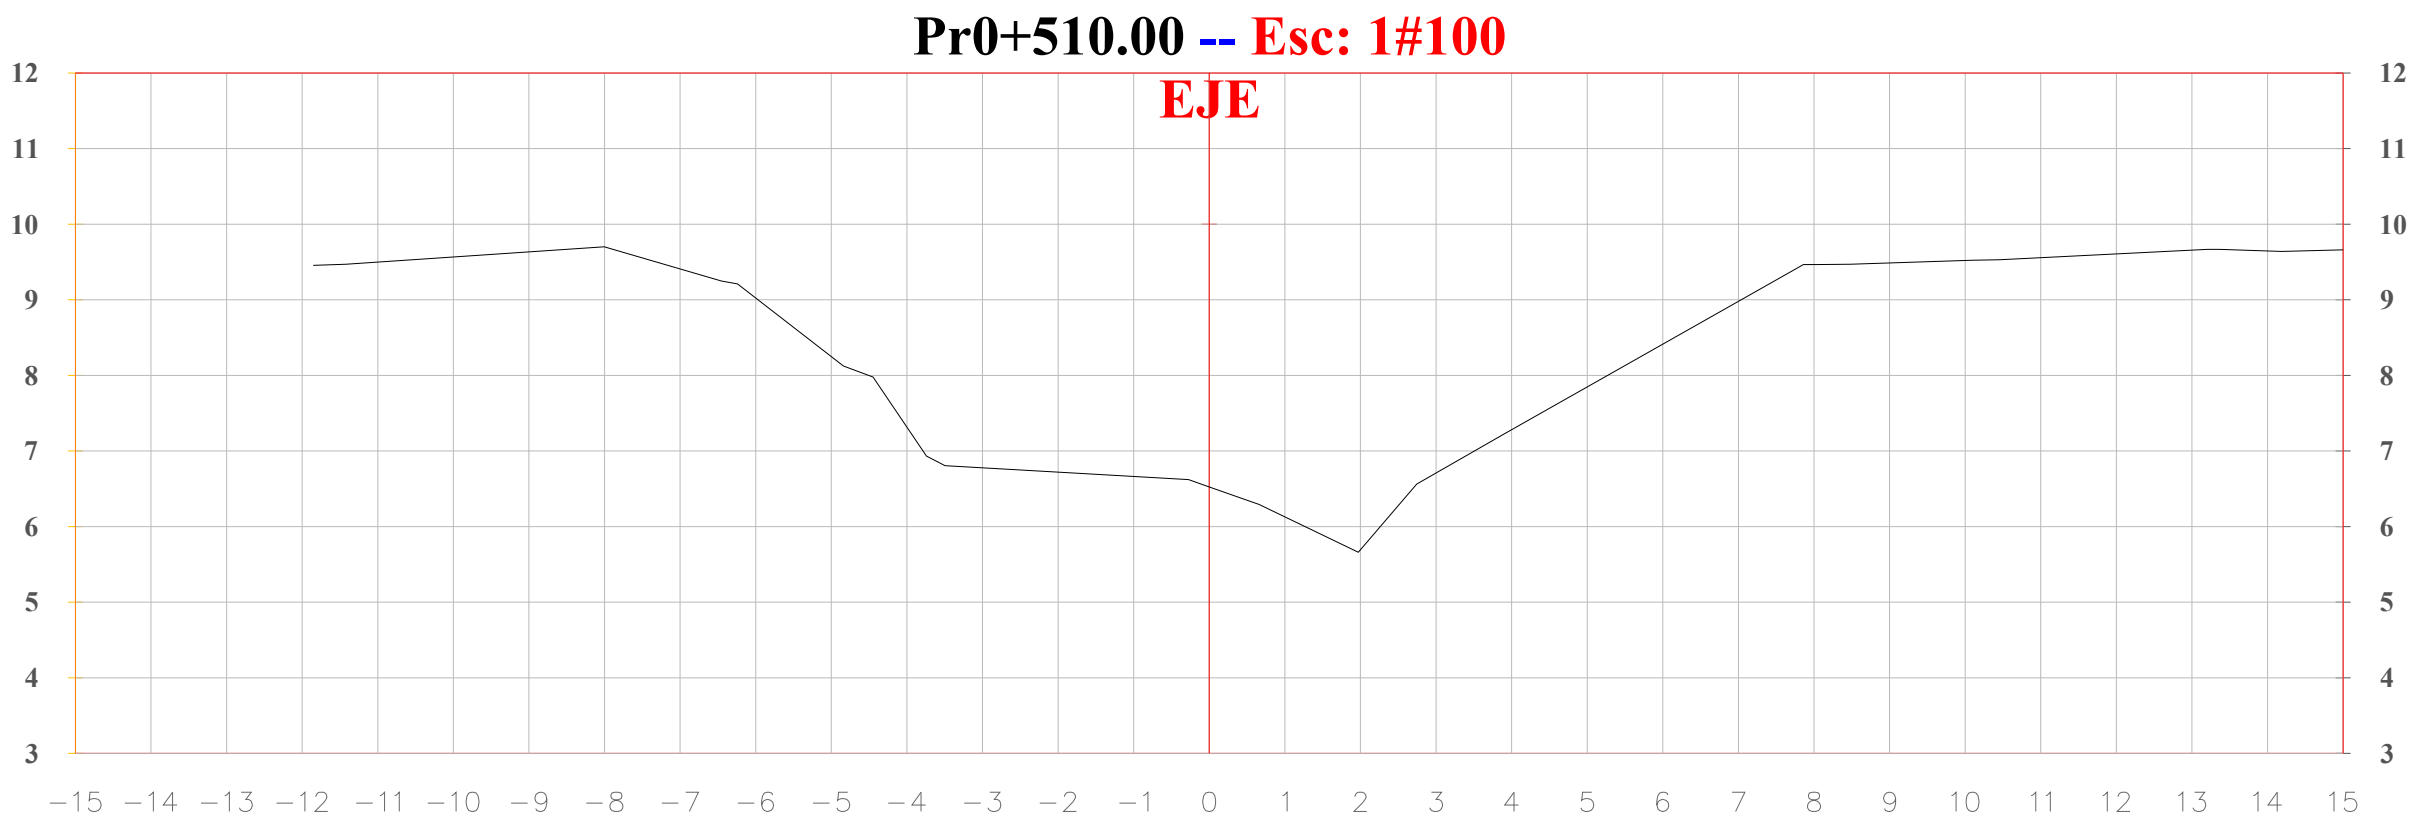

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:

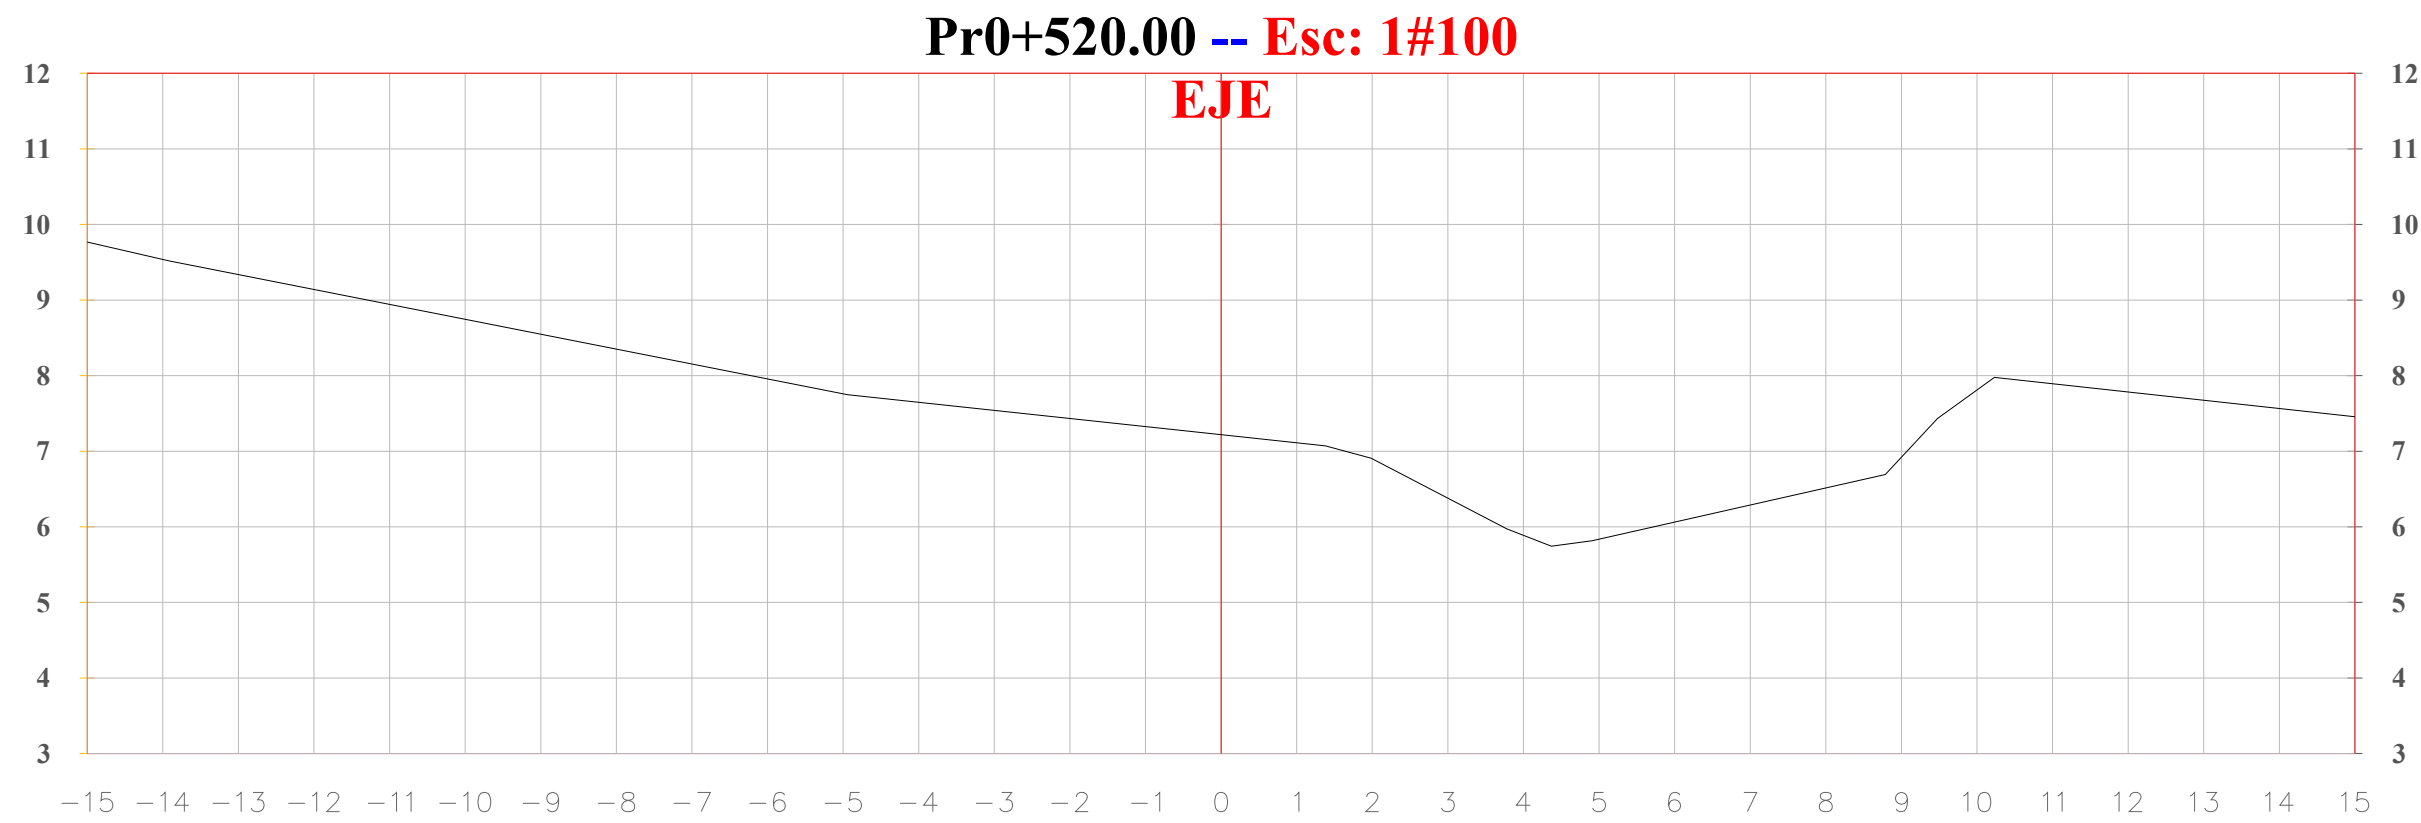

ELEVACION TERRENO NATURAL:
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCA SANCHEZ
Mat. Profesional 82.22794

Director de Obra:
YESSY MARCELO GARCIA ARAN
Mat. Profesional 3302-00189861

Topógrafo Interventor:
Jorge R. RUIZ
Mat. Profesional 8323016475

Director de Interventoría:
MANUEL BERNARDO GOMEZ
Mat. Profesional 33023016475

MODIFICACIONES



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026

ARCHIVO:

Consortio Ambiental del Atlántico	INFORME MENSUAL No. 6	
Versión 1		

Anexo No. 10.9. Planos y carteras topográficas.

10.9.2. Planos de seguimiento arroyo león

INFORME DE TOPOGRAFÍA

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+000.00	10,55	10,55		7,71	7,71	0	36,84	0
Nivel de diseño		10,55	3,21		3,21	7,71			
Diferencia de altura		0	7,34		4,5	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+010.00	8,35	8,35		5,42	5,42	10	26,66	317,46
Nivel de diseño		8,35	3,24		3,24	5,42			
Diferencia de altura		0	5,11		2,18	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+020.00	9,01	9,01		6,02	6,02	10	31,73	286,45
Nivel de diseño		9,01	3,26		3,26	6,02			
Diferencia de altura		0	5,75		2,76	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+030.00	7,75	7,75		6,62	6,62	10	24,77	267,68
Nivel de diseño		7,75	3,29		3,29	6,62			
Diferencia de altura		0	4,46		3,33	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+040.00	9,04	9,04		6,69	6,69	10	55,19	399,81
Nivel de diseño		9,04	3,32		3,32	6,69			
Diferencia de altura		0	5,72		3,37	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+050.00	8,21	8,21		7,44	7,44	10	35,8	454,93
Nivel de diseño		8,21	3,35		3,35	7,44			
Diferencia de altura		0	4,86		4,09	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+060.00	8,48	8,48		7,85	7,85	10	38,53	369,85
Nivel de diseño		8,48	3,38		3,38	7,85			
Diferencia de altura		0	5,1		4,47	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+070.00	9,75	9,75		8,83	8,83	10	41,13	394,36
Nivel de diseño		9,75	3,4		3,4	8,83			
Diferencia de altura		0	6,35		5,43	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+080.00	10,21	10,21		9,27	9,27	10	48,12	446,24
Nivel de diseño		10,21	3,43		3,43	9,27			
Diferencia de altura		0	6,78		5,84	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+090.00	10,36	10,36		9,5	9,5	10	60,61	549,73
Nivel de diseño		10,36	3,46		3,46	9,5			
Diferencia de altura		0	6,9		6,04	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+100.00	10,23	10,23		8,81	8,81	10	57,51	573,55
Nivel de diseño		10,23	3,49		3,49	8,81			
Diferencia de altura		0	6,74		5,32	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+110.00	10,23	10,23		8,79	8,79	10	45,31	514,11
Nivel de diseño		10,23	3,52		3,52	8,79			
Diferencia de altura		0	6,71		5,27	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+120.00	10,14	10,14		9,27	9,27	10	47,49	464
Nivel de diseño		10,14	3,54		3,54	9,27			
Diferencia de altura		0	6,6		5,73	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+130.00	9,46	9,46		9,55	9,55	10	48,63	480,62
Nivel de diseño		9,46	3,57		3,57	9,55			
Diferencia de altura		0	5,89		5,98	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+140.00	10,22	10,22		9,65	9,65	10	44,45	465,42
Nivel de diseño		10,22	3,6		9,65	9,65			
Diferencia de altura		0	6,62		0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+150.00	9,68	9,68		9,69	9,69	10	40,41	426,67
Nivel de diseño		9,68	3,63		3,63	9,69			
Diferencia de altura		0	6,05		6,06	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+160.00	9,14	9,14		9,44	9,44	10	39,29	398,53
Nivel de diseño		9,14	3,66		3,66	9,44			
Diferencia de altura		0	5,48		5,78	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+170.00	8,9	8,9		8,58	8,58	10	37,14	382,18
Nivel de diseño		8,9	3,68		3,68	8,58			
Diferencia de altura		0	5,22		4,9	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+180.00	8,95	8,95		9,2	9,2	10	37,18	371,61
Nivel de diseño		8,95	3,71		3,71	9,2			
Diferencia de altura		0	5,24		5,49	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+190.00	8,81	8,81		8,59	8,59	10	37,58	373,77
Nivel de diseño		8,81	3,74		3,74	8,59			
Diferencia de altura		0	5,07		4,85	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+200.00	9,39	9,39		8,17	8,17	10	30,4	338,8
Nivel de diseño		9,39	3,77		3,77	8,17			
Diferencia de altura		0	5,62		4,4	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+210.00	7,16	7,16	0	0	0	10	38,06	171,16
Nivel de diseño		7,16	3,8	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,36	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+220.00	9,59	9,59	0	0	0	10	30,08	170,355
Nivel de diseño		9,59	3,82	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,77	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+230.00	9,77	9,77	0	0	0	10	34,94	162,56
Nivel de diseño		9,77	3,85	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,92	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+240.00	9,58	9,58	0	0	0	10	37,74	179,57
Nivel de diseño		9,58	3,88	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,7	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+250.00	9,77	9,77	0	0	0	10	42,14	199,69
Nivel de diseño		9,77	3,91	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,86	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+260.00	10,11	10,11	0	0	0	10	38,89	202,57
Nivel de diseño		10,11	3,94	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,17	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+270.00	10,03	10,03	0	0	0	10	39,06	202,995
Nivel de diseño		10,03	3,96	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,07	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+280.00	10,04	10,04	0	0	0	10	35,91	200,265
Nivel de diseño		10,04	3,99	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,05	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+290.00	10,37	10,37	0	0	0	10	27,97	163,155
Nivel de diseño		10,37	4,02	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,35	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+300.00	10,01	10,01	0	0	0	10	35,7	158,925
Nivel de diseño		10,01	4,05	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,96	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+310.00	8,7	8,7	0	0	0	10	35,74	178,6
Nivel de diseño		8,7	4,07	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,63	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+320.00	8,34	8,34	0	0	0	10	33,9	174,185
Nivel de diseño		8,34	4,1	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,24	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+330.00	8,22	8,22	0	0	0	10	34,54	171,095
Nivel de diseño		8,22	4,13	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,09	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+340.00	9,33	9,33	0	0	0	10	37,69	180,6
Nivel de diseño		9,33	4,16	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,17	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+350.00	9,73	9,73	0	0	0	10	36,56	185,63
Nivel de diseño		9,73	4,19	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,54	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+360.00	10,38	10,38	0	0	0	10	28,55	162,78
Nivel de diseño		10,38	4,21	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,17	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+370.00	10,51	10,51	0	0	0	10	32,37	152,295
Nivel de diseño		10,51	4,24	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,27	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+380.00	9,94	9,94	0	0	0	10	30,56	185,63
Nivel de diseño		9,94	4,27	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,67	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+390.00	9,43	9,43	0	0	0	10	28,55	162,78
Nivel de diseño		9,43	4,3	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,13	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+400.00	10,47	10,47	0	0	0	10	32,37	152,295
Nivel de diseño		10,47	4,33	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,14	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+410.00	10,46	10,46	0	0	0	10	30,56	158,375
Nivel de diseño		10,46	4,35	0	0	0			
Diferencia de altura		0	6,11	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+420.00	10,11	10,11	0	0	0	10	33,87	158,81
Nivel de diseño		10,11	4,38	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,73	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+430.00	9,98	9,98	0	0	0	10	33,25	167,795
Nivel de diseño		9,98	4,41	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,57	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+440.00	5,96	5,96	0	0	0	10	26,2	160,045
Nivel de diseño		5,96	4,44	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,52	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+450.00	7,55	7,55	0	0	0	10	28,2	139,985
Nivel de diseño		7,55	4,47	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,08	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+460.00	6,38	6,38	0	0	0	10	31,98	150,45
Nivel de diseño		6,38	4,49	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,89	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+470.00	5,39	5,39	0	0	0	10	51,04	207,54
Nivel de diseño		5,39	4,52	0	0	0			
Diferencia de altura		0	0,87	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+480.00	7,54	7,54	0	0	0	10	44,18	238,05
Nivel de diseño		7,54	4,55	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,99	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+490.00	8,58	8,58	0	0	0	10	13	142,955
Nivel de diseño		8,58	4,58	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+500.00	8,8	8,8	0	0	0	10	8,86	49,885
Nivel de diseño		8,8	4,61	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,19	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+510.00	8,1	8,1	0	0	0	10	11,79	51,605
Nivel de diseño		8,1	4,63	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,47	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+520.00	7,32	7,32	0	0	0	10	5,17	42,56
Nivel de diseño		7,32	4,66	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,66	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+530.00	5,68	5,68	0	0	0	10	8,35	33,785
Nivel de diseño		5,68	4,69	0	0	0			
Diferencia de altura		0	0,99	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+540.00	5,33	5,33	0	0	0	10	10,4	46,84
Nivel de diseño		5,33	4,72	0	0	0			
Diferencia de altura		0	0,61	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+550.00	8,26	8,26	0	0	0	10	10,61	52,535
Nivel de diseño		8,26	4,75	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,51	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+560.00	8,9	8,9	0	0	0	10	6,68	42,355
Nivel de diseño		8,9	4,77	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,13	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+570.00	9,68	9,68	0	0	9,35	10	7,35	36,475
Nivel de diseño		9,68	4,8	0	0	9,35			
Diferencia de altura		0	4,88	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+580.00	9,62	9,62	0	0	0	10	15,43	56,955
Nivel de diseño		9,62	4,83	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,79	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+590.00	7,26	7,26	0	0	0	10	17,48	84,965
Nivel de diseño		7,26	4,86	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,4	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+600.00	7,25	7,25	0	0	0	10	15,73	83,04
Nivel de diseño		7,25	4,88	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,37	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+610.00	8,36	8,36	0	0	0	10	11,5	68,19
Nivel de diseño		8,36	4,91	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,45	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+620.00	8,43	8,43	0	0	0	10	18,78	75,7
Nivel de diseño		8,43	4,94	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,49	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+630.00	9,02	9,02	0	0	0	10	16,49	88,16
Nivel de diseño		9,02	4,97	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,05	0	0	0			



EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+640.00	5,89	5,89	0	0	0	10	16,44	82,515
Nivel de diseño		5,89	5	0	0	0			
Diferencia de altura		0	0,89	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+650.00	5,36	5,36	0	0	0	10	24	111,275
Nivel de diseño		5,36	5,02	0	0	0			
Diferencia de altura		0	0,34	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+660.00	5,96	5,96	0	0	0	10	4,27	70,68
Nivel de diseño		5,96	5,05	0	0	0			
Diferencia de altura		0	0,91	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+670.00	7,98	7,98	0	0	0	10	2,57	17,12
Nivel de diseño		7,98	5,08	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,9	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+680.00	8,32	8,32	0	0	0	10	6,12	21,745
Nivel de diseño		8,32	5,11	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,21	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+690.00	8,44	8,44	0	0	0	10	14,26	52,4
Nivel de diseño		8,44	5,14	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,3	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+700.00	8,77	8,77	0	0	0	10	18,45	81,765
Nivel de diseño		8,77	5,16	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,61	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+710.00	9,08	9,08	0	0	0	10	22,94	103,475
Nivel de diseño		9,08	5,19	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,89	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+720.00	9,23	9,23	0	0	0	10	25,04	119,5
Nivel de diseño		9,23	5,22	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,01	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+730.00	9,38	9,38	0	0	0	10	24,33	123,43
Nivel de diseño		9,38	5,25	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,13	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+740.00	9,48	9,48	0	0	0	10	23,5	120,01
Nivel de diseño		9,48	5,28	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,2	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+750.00	9,27	9,27	0	0	0	10	21,77	113,19
Nivel de diseño		9,27	5,3	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,97	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+760.00	9,08	9,08	0	0	0	10	21,12	107,1
Nivel de diseño		9,08	5,33	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,75	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+770.00	9,7	9,7	0	0	0	10	16,98	95,265
Nivel de diseño		9,7	5,36	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,34	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+780.00	8,24	8,24	0	0	0	10	16,67	83,725
Nivel de diseño		8,24	5,39	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,85	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+790.00	8,22	8,22	0	0	0	10	16,56	83,085
Nivel de diseño		8,22	5,42	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,8	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+800.00	10,64	10,64	0	0	0	10	14,07	76,585
Nivel de diseño		10,64	5,44	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,2	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+810.00	7,4	7,4	0	0	0	10	12,2	65,735
Nivel de diseño		7,4	5,47	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,93	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+820.00	6,89	6,89	0	0	0	10	9,97	55,31
Nivel de diseño		6,89	5,5	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,39	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+830.00	9,2	9,2	0	0	0	10	11,04	52,525
Nivel de diseño		9,2	5,53	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,67	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+840.00	8,4	8,4	0	0	0	10	11,08	55,3
Nivel de diseño		8,4	5,55	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,85	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+850.00	7,89	7,89	0	0	0	10	13,25	60,815
Nivel de diseño		7,89	5,58	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,31	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+860.00	7,44	7,44	0	0	0	10	12,98	65,47
Nivel de diseño		7,44	5,61	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,83	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+870.00	10,83	10,83	0	0	0	10	10,27	58,115
Nivel de diseño		10,83	5,64	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,19	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+880.00	10,95	10,95	0	0	0	10	10,25	51,29
Nivel de diseño		10,95	5,67	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,28	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+890.00	9,14	9,14	0	0	0	10	12,57	57,05
Nivel de diseño		9,14	5,69	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,45	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+900.00	7,51	7,51	0	0	0	10	11,09	59,105
Nivel de diseño		7,51	5,72	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,79	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+910.00	10,84	10,84	0	0	0	10	10,12	53,015
Nivel de diseño		10,84	5,74	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,1	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+920.00	10,59	10,59	0	0	0	10	8,48	46,49
Nivel de diseño		10,59	5,76	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,83	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+930.00	10,52	10,52	0	0	0	10	7,45	40,135
Nivel de diseño		10,52	5,78	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,74	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+940.00	10,22	10,22	0	0	0	10	11,68	47,815
Nivel de diseño		10,22	5,8	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,42	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+950.00	9,49	9,49	0	0	0	10	14,77	66,13
Nivel de diseño		9,49	5,82	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,67	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+960.00	7,42	7,42	0	0	0	10	10,56	63,335
Nivel de diseño		7,42	5,84	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,58	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+970.00	7,96	7,96	0	0	0	10	6,63	42,965
Nivel de diseño		7,96	5,86	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,1	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+980.00	8,32	8,32	0	0	0	10	7,73	35,88
Nivel de diseño		8,32	5,88	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,44	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 0+990.00	8,67	8,67	0	0	0	10	9,77	43,745
Nivel de diseño		8,67	5,9	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,77	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+000.00	8,03	8,03	0	0	0	10	10,86	51,59
Nivel de diseño		8,03	5,92	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,11	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+010.00	7,97	7,97	0	0	0	10	7,52	39,04
Nivel de diseño		7,97	5,94	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,03	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+020.00	9,84	9,84	0	0	0	10	10,8	45,8
Nivel de diseño		9,84	5,96	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,88	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+030.00	10,96	10,96	0	0	0	10	12,89	59,225
Nivel de diseño		10,96	5,98	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,98	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+040.00	11,49	11,49	0	0	0	10	13,93	67,835
Nivel de diseño		11,49	6	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,49	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+050.00	11,77	11,77	0	0	0	10	15,58	74,145
Nivel de diseño		11,77	6,02	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,75	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+060.00	11,66	11,66	0	0	0	10	10	63,935
Nivel de diseño		11,66	6,03	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,63	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+070.00	7,66	7,66	0	0	0	10	10,8	51,595
Nivel de diseño		7,66	6,05	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,61	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+080.00	7,72	7,72	0	0	0	10	9,83	51,575
Nivel de diseño		7,72	6,07	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,65	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+090.00	7,83	7,83	0	0	0	10	9,42	49,08
Nivel de diseño		7,83	6,09	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,74	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+100.00	11,13	11,13	0	0	0	10	8,99	46,05
Nivel de diseño		11,13	6,11	0	0	0			
Diferencia de altura		0	5,02	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+110.00	11,04	11,04	0	0	0	10	8,87	45,1
Nivel de diseño		11,04	6,13	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,91	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+120.00	10,84	10,84	0	0	0	10	5,49	35,905
Nivel de diseño		10,84	6,15	0	0	0			
Diferencia de altura		0	4,69	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+130.00	8,28	8,28	0	0	0	10	5,7	27,965
Nivel de diseño		8,28	6,17	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,11	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+140.00	8,54	8,54	0	0	9,39	10	8,43	35,32
Nivel de diseño		8,54	6,19	0	0	9,39			
Diferencia de altura		0	2,35	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+150.00	8,9	8,9	0	0	0	10	9,32	44,38
Nivel de diseño		8,9	6,21	0	0	0			
Diferencia de altura		0	2,69	0	0	0			

EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+160.00	9,36	9,36	0	0	0	10	1,3	26,57
Nivel de diseño		9,36	6,23	0	0	0			
Diferencia de altura		0	3,13	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+170.00	8,07	8,07	0	0	0	10	1,32	6,56
Nivel de diseño		8,07	6,25	0	0	0			
Diferencia de altura		0	1,82	0	0	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+180.00	6,48	6,48	6,47	6,5	6,5	10	3,65	12,42
Nivel de diseño		6,48	6,27	6,27	6,27	6,5			
Diferencia de altura		0	0,21	0,2	0,23	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+190.00	6,88	6,88	6,79	6,84	6,84	10	9,69	33,705
Nivel de diseño		6,88	6,29	6,29	6,29	6,82			
Diferencia de altura		0	0,59	0,5	0,55	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+200.00	7,39	7,39	7,53	7,73	7,73	10	10,64	51,37
Nivel de diseño		7,39	6,31	6,31	6,31	7,7			
Diferencia de altura		0	1,08	1,22	1,42	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+210.00	7,69	7,69	7,66	7,62	7,62	10	6,6	42,98
Nivel de diseño		7,69	6,33	6,33	6,33	7,62			
Diferencia de altura		0	1,36	1,33	1,29	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+220.00	7,28	7,28	7,25	7,16	7,16	10	2,55	22,87
Nivel de diseño		7,28	6,35	6,35	6,35	7,16			
Diferencia de altura		0	0,93	0,9	0,81	0			
EXCAVACION SECCIÓN DEL ARROYO									
Cotas	Abscisa	Cota izquierda hombro	Cota fondo izquierdo	Cota eje	Cota fondo derecho	Cota derecha hombro	Longitud	Área	Volumen
Nivel de terreno	ABCISA 1+230.00	6,68	6,68	6,75	6,81	6,81	10	1,88	11,075
Nivel de diseño		6,68	6,37	6,37	6,37	6,8			
Diferencia de altura		0	0,31	0,38	0,44	0			



ABSCISADO	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+090	0+100	0+110	0+120	0+130	0+140	0+150	0+160	0+170	0+180	0+190	0+200	0+210	0+220	0+230	0+240	0+250	0+260	0+270	0+280	0+290	0+300	0+310	0+320
ELEVACION RASANTE	3.237	3.265	3.293	3.321	3.349	3.377	3.405	3.433	3.460	3.49	3.516	3.544	3.572	3.600	3.628	3.656	3.684	3.712	3.740	3.77	3.796	3.824	3.851	3.879	3.907	3.935	3.963	3.991	4.019	4.05	4.075	4.103
ELEV. TERRENO NATURAL	5.778	6.053	5.215	7.566	5.476	5.520	5.857	5.471	5.559	6.32	6.370	5.298	5.622	5.807	5.793	5.519	6.017	6.080	6.284	6.37	6.344	6.649	5.681	6.104	6.348	6.503	6.173	6.119	5.662	5.40	5.608	5.800



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo, Controlista:
[Firma]
GRANILDA JARBER ARBENIZO KARGAS
R.C. Profesional 31.2752

Director de Obra:
[Firma]
TESO BANC-AMIGUEL JIMENEZ
R.C. Profesional 122-0000951

Topógrafo, Interventor:
[Firma]
Jorge RIVERA
ARROYO LUIS ALVARO ARROYO
R.C. Profesional 31.2477

Director de Interventoría:
[Firma]
MANUEL RODRIGUEZ LÓPEZ
R.C. Profesional 122-0000951





PROYECTO:
REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:
PLANTA - PERFIL
SEGUIMIENTO CANALIZACIÓN TRAMO PRINCIPAL

ESCALA:
PLANTA 1:500
PERFIL H 1:500
V 1:50

PLANO 1
FECHA: 27 de Enero 2026
ARCHIVO:

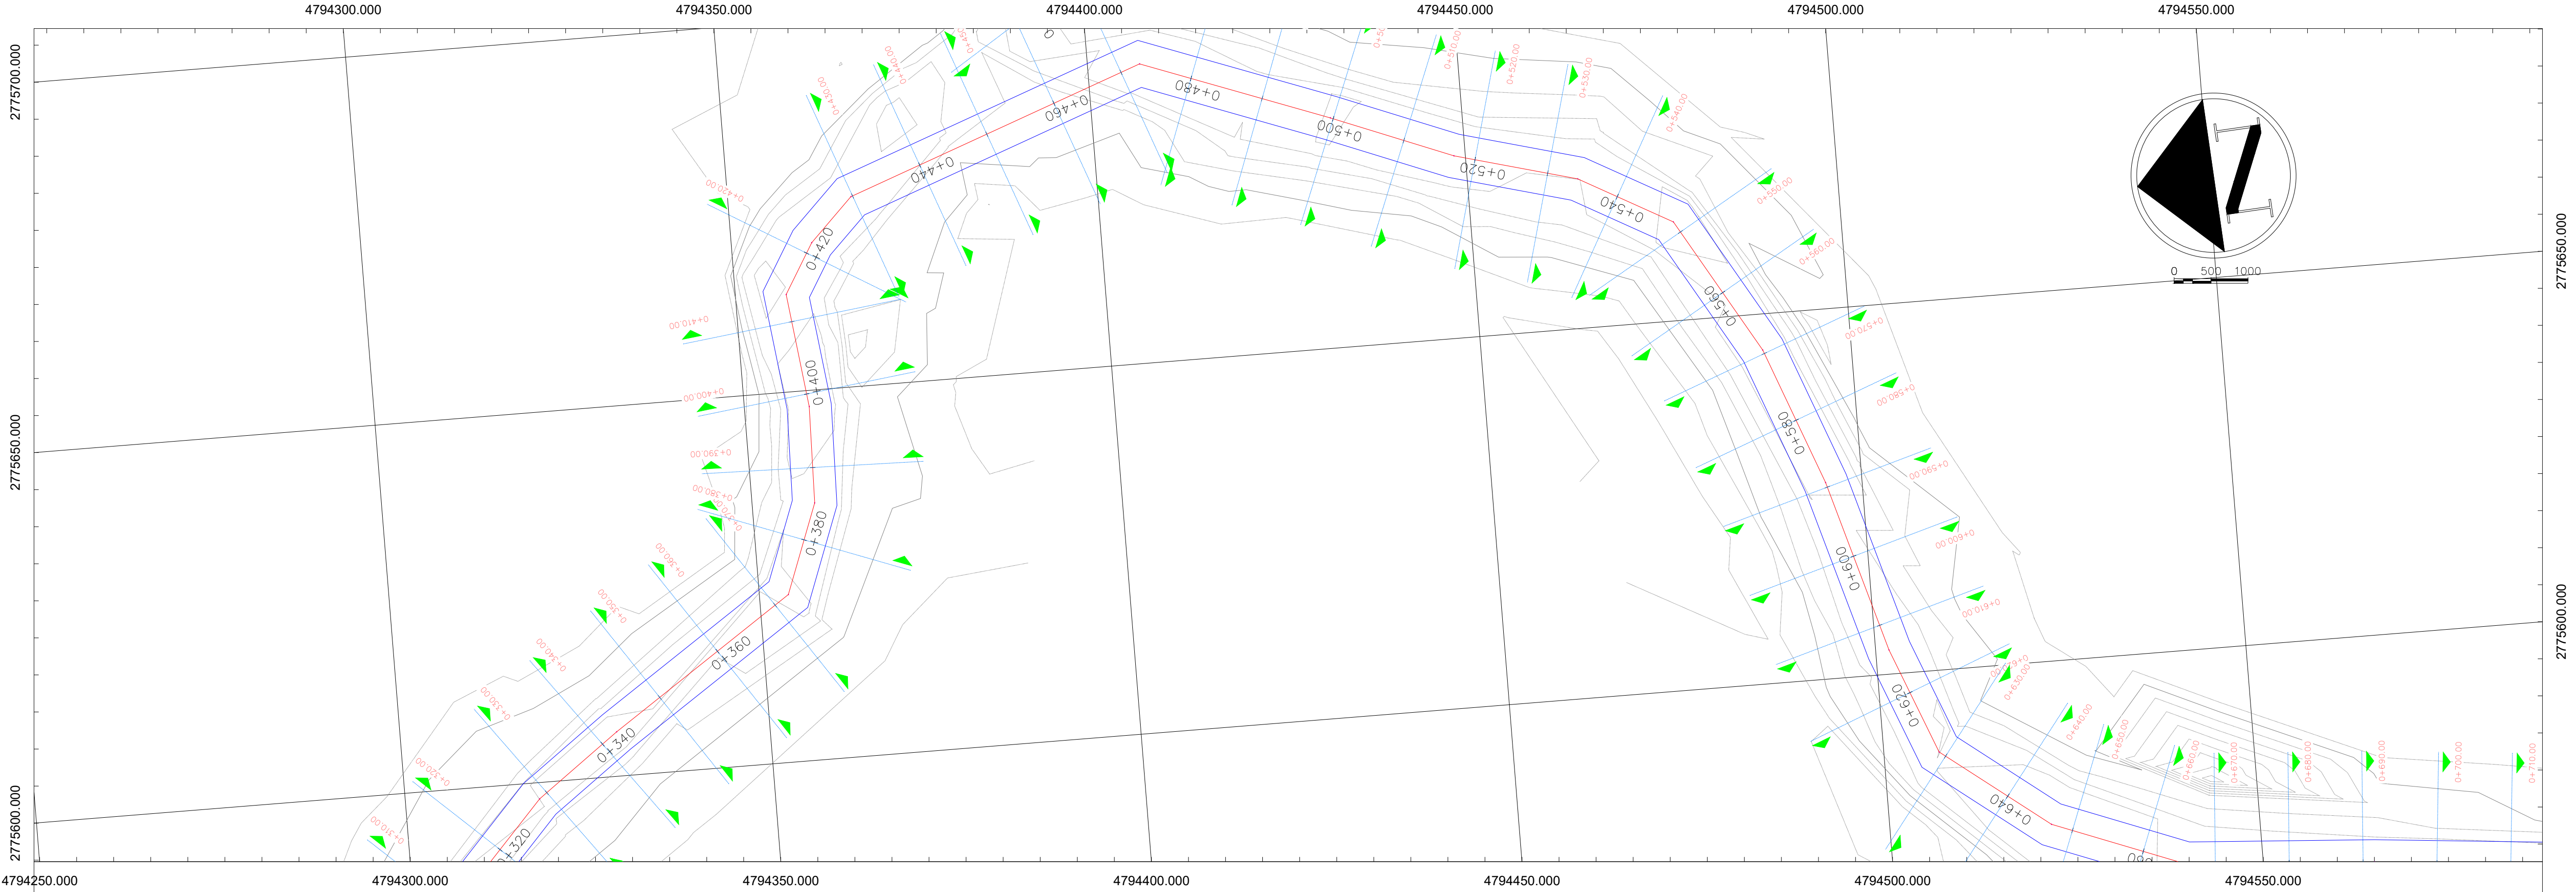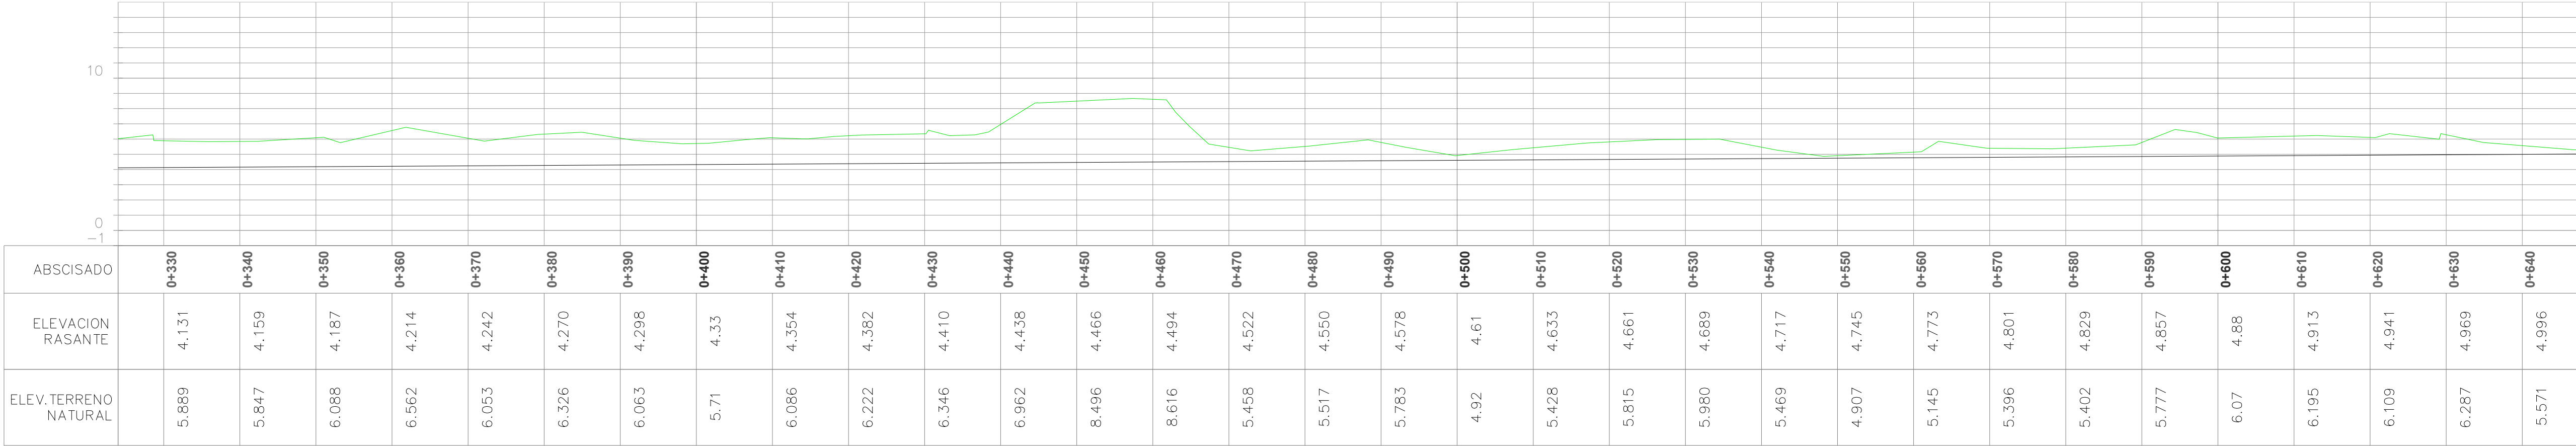

INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo, Controlista:
[Firma]
GRANLAND JARBER ARBENIZO KANGAR
Mat. Profesional: 31.2752

Topógrafo, Interventor:
[Firma]
Jorge RIVERA
ARROYO LUIS ALVARO ARROYO
Mat. Profesional: 31.2479

Director de Obra:
[Firma]
TESO BANC ANTONIO JARBER
Mat. Profesional: 31.2752

Director de Interventoría:
[Firma]
MANUEL RODRIGUEZ ZAMORA
Mat. Profesional: 32.071461

MODIFICACIONES	
I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:
REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:
PLANTA - PERFIL
SEGUIMIENTO CANALIZACIÓN TRAMO PRINCIPAL


ESCALA:
PLANTA 1:500
PERFIL H 1:500
V 1:50

PLANO 2

FECHA: 27 de Enero 2026	ARCHIVO:
----------------------------	----------

4794650.000


2775350.000

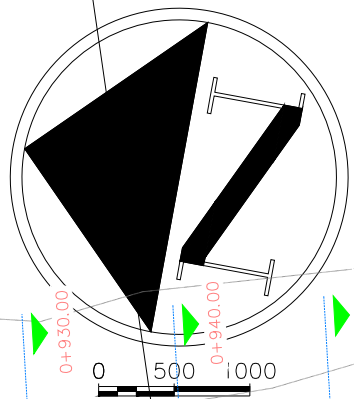


2775700.000

4794550.000







ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.33
ELEVACION RASANTE: 3.21




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.78
ELEVACION RASANTE: 3.24




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.05
ELEVACION RASANTE: 3.26



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.21
ELEVACION RASANTE: 3.29



ELEVACION TERRENO NATURAL: 7.57
ELEVACION RASANTE: 3.32



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.48
ELEVACION RASANTE: 3.35



INTERVENTORIA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
[Firma]
GRANDEZAS LUIS ALBERTO SANCHEZ
Mat. Profesional: 02-11799

Director de Obra:
[Firma]
YESSY MARCELA GONZALEZ GARCIA
Mat. Profesional: 1302-001990001

Topógrafo Interventor:
[Firma]
Jorge R. RUIZ
Mat. Profesional: 02-11799

Director de Interventoría:
[Firma]
MARCELO RODRIGUEZ GONZALEZ
Mat. Profesional: 0303-001990001

MODIFICACIONES

	I	II	III	IV	V



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO


TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN


ESCALA:
PLANTA: 1:100

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:
PLANO
1




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.52
ELEVACION RASANTE: 3.38




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.86
ELEVACION RASANTE: 3.40




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.47
ELEVACION RASANTE: 3.43



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.56
ELEVACION RASANTE: 3.46



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.32
ELEVACION RASANTE: 3.49



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.37
ELEVACION RASANTE: 3.52



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
[Firma]
GRANVILLE LARREA SARMIENTO Y ARCE
Mat. Profesional: 0211799

Director de Obra:
[Firma]
YOSIO ARACI-CHAVEZ-ARACI
Mat. Profesional: 1330290199001

Topógrafo Interventor:
[Firma]
Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional: 01186238870

Director de Interventoría:
[Firma]
MARCELO BERNARDO CORRALES
Mat. Profesional: 03030194075

MODIFICACIONES

I
II
III
IV
V



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN


ESCALA:
PLANTA: 1:100

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:

PLANO


2




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.08
ELEVACION RASANTE: 3.71




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.28
ELEVACION RASANTE: 3.74




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.37
ELEVACION RASANTE: 3.77



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.34
ELEVACION RASANTE: 4.95



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.65
ELEVACION RASANTE: 4.98



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.68
ELEVACION RASANTE: 4.88



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIELA LARREA SARMIENTO Y GARCIA
Mat. Profesional: 02-11794

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCIA GARCIA
Mat. Profesional: 1102-001990001

Topógrafo Interventor:
Jorge A. BARRERA
Mat. Profesional: 02-11794

Director de Interventoría:
MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ
Mat. Profesional: 02-11794



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.10
ELEVACION RASANTE: 4.20




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.35
ELEVACION RASANTE: 3.91




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.50
ELEVACION RASANTE: 3.94



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.17
ELEVACION RASANTE: 3.97



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.12
ELEVACION RASANTE: 3.99



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.66
ELEVACION RASANTE: 4.02



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Mat. Profesional: 8211799

Director de Obra:
YESSY MARCELO GARCIA
Mat. Profesional: 3302-00190801

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RUIZ
Mat. Profesional: 8333016473

Director de Interventoría:
MARCELO RODRIGUEZ CORREA
Mat. Profesional: 8333016473

MODIFICACIONES

I
II
III
IV
V



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.40
ELEVACION RASANTE: 4.05




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.61
ELEVACION RASANTE: 4.07




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.80
ELEVACION RASANTE: 4.10



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.89
ELEVACION RASANTE: 4.13



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.85
ELEVACION RASANTE: 4.15



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.09
ELEVACION RASANTE: 4.18



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Mat. Profesional 02-11794

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCIA
Mat. Profesional 1330-00199001

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RIVERA
Mat. Profesional 02-11794

Director de Interventoría:
MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
Mat. Profesional 0303016475

MODIFICACIONES



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.56
ELEVACION RASANTE: 4.21




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.05
ELEVACION RASANTE: 4.30




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.33
ELEVACION RASANTE: 4.28



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.06
ELEVACION RASANTE: 4.30



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.71
ELEVACION RASANTE: 4.33



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.09
ELEVACION RASANTE: 4.36



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCA SANCHEZ
Mat. Profesional 8211799

Director de Obra:
YESSY MARCELO GARCIA
Mat. Profesional 110209199001

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RUIZ
Mat. Profesional 8211799

Director de Interventoría:
MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
Mat. Profesional 8211799



PROYECTO:
REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:

PLANO


7




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.22
ELEVACION RASANTE: 4.38




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.35
ELEVACION RASANTE: 4.41




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.96
ELEVACION RASANTE: 4.43



ELEVACION TERRENO NATURAL: 8.50
ELEVACION RASANTE: 4.46



ELEVACION TERRENO NATURAL: 8.62
ELEVACION RASANTE: 4.49



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.46
ELEVACION RASANTE: 4.52



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCA SANCHEZ
Mat. Profesional: 8211799

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCIA
Mat. Profesional: 1332091990001

Topógrafo Interventor:
Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional: 8333016475

Director de Interventoría:
MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
Mat. Profesional: 8333016475

MODIFICACIONES

C.R.A.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ATLÁNTICO

PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA
DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA: 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.52
ELEVACION RASANTE: 4.55




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.78
ELEVACION RASANTE: 4.57




ELEVACION TERRENO NATURAL: 4.92
ELEVACION RASANTE: 4.60



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.43
ELEVACION RASANTE: 4.63



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.82
ELEVACION RASANTE: 4.66



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.98
ELEVACION RASANTE: 4.69



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Rat. Profesional 02-11794

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCIA
Rat. Profesional 1102-00190001

Topógrafo Interventor:
JESUS RUIZ
Rat. Profesional 02-11794

Director de Interventoría:
MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
Rat. Profesional 0303-00190001

MODIFICACIONES



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.47
ELEVACION RASANTE: 4.72




ELEVACION TERRENO NATURAL: 4.91
ELEVACION RASANTE: 4.74



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.14
ELEVACION RASANTE: 4.77



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.40
ELEVACION RASANTE: 4.80



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.40
ELEVACION RASANTE: 4.82



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.78
ELEVACION RASANTE: 4.85



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Mat. Profesional: 8212789

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCIA
Mat. Profesional: 3302001900017

Topógrafo Interventor:
Jesús RIVERA
Mat. Profesional: 8333015475

Director de Interventoría:
MARCOS RODRIGUEZ GOMEZ
Mat. Profesional: 8333015475

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:

PLANTA 1:100


FECHA:

27 de Enero 2026


ARCHIVO:

PLANO


10




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.07
ELEVACION RASANTE: 4.87




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.20
ELEVACION RASANTE: 4.90




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.11
ELEVACION RASANTE: 4.93



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.29
ELEVACION RASANTE: 5.03



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.57
ELEVACION RASANTE: 5.05



ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.41
ELEVACION RASANTE: 5.09



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LARREA SARMIENTO FARIAS
Mat. Profesional: 8211799

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCÍA GARCÍA
Mat. Profesional: 11520049900017

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RUIZ
Mat. Profesional: 8333015475

Director de Interventoría:
MARCELO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Mat. Profesional: 8333015475

MODIFICACIONES	
I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.89
ELEVACION RASANTE: 5.12




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.29
ELEVACION RASANTE: 5.15




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.36
ELEVACION RASANTE: 5.17



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.39
ELEVACION RASANTE: 5.18



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.31
ELEVACION RASANTE: 5.21



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.42
ELEVACION RASANTE: 5.19



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRANIZO LARREA SARMIENTO Y ARCE
Mat. Profesional: 02-11794

Director de Obra:
YUSO ARRIAGA-CORREIA-ARABAR
Mat. Profesional: 1102-00190001

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RUIZ
Mat. Profesional: 03-14573

Director de Interventoría:
MARTÍN BERNARDO CORREA
Mat. Profesional: 03-05054075

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO


TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN


ESCALA:
PLANTA 1:100

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:
PLANO 12




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.95
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.89
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 5.46
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.40
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.17
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.28
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:

GRACIELA LARREA SARMIENTO VARGAS
Mat. Profesional: 62.11794

Director de Obra:

YESSICA MARCELO GARCÍA RAMÍREZ
Mat. Profesional: 13302019190017

Topógrafo Interventor:

Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional: 62.11794

Director de Interventoría:

MANUEL RODRÍGUEZ CORTÉS
Mat. Profesional: 62.11794

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:


SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026

ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.56
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.43
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.08
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.06
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.12
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.38
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRANIELA LARREA SARRACENY HARRIS
Mat. Profesional: 82.12794

Director de Obra:
YOSIO MARICANO GARCIA ARAN
Mat. Profesional: 1332-00199861

Topógrafo Interventor:
Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional: 82.12794

Director de Interventoría:
MANUEL BERNARDO GONZALEZ
Mat. Profesional: 82.12794

MODIFICACIONES

I	
II	
III	
IV	
V	



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:

PLANTA 1:100


FECHA:

27 de Enero 2026


ARCHIVO:

PLANO


14



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.62
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.81
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.76
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 7.33
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.14
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.09
ELEVACION RASANTE:




<p>Topógrafo Contratista:</p>  <p>GERARDO ALFONSO DE ALBARRADO Y LARGAS Msc. Profesional 123456789</p>	<p>Director de Obra:</p>  <p>YUSUFI ARACELI GARCIA LAROS Msc. Profesional 123456789</p>	MODIFICACIONES
<p>Topógrafo Interventor:</p>  <p>JESUS ALVARO INGENIERO CIVIL Y AGUERO DE Msc. Profesional 123456789</p>	Director de Interventoría:	I
		II
		III
		IV
		V







ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.73
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.42
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.68
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.73
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.42
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.30
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Rat. Profesional 02-22794

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCIA
Rat. Profesional 2320-00199001

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RUIZ
Rat. Profesional 02-16473

Director de Interventoría:
MANUEL BERNARDO CORREA
Rat. Profesional 0320-00199001

MODIFICACIONES

I

II

III

IV

V



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:

PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:

27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.64
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.63
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.70
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.48
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.57
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.47
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:

GRACIANO LAFRANCA SANCHEZ
Mat. Profesional 8211794

Director de Obra:

YUSID MARCOLO GARCIA
Mat. Profesional 115209199801

Topógrafo Interventor:

Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional 811621880

Director de Interventoría:

MANUEL BERNARDO GOMEZ
Mat. Profesional 8323016475

MODIFICACIONES	
I	
II	
III	
IV	
V	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES CANALIZACIÓN

ESCALA:


PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:

27 de Enero 2026


ARCHIVO:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.32
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.21
ELEVACION RASANTE:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.27
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.26
ELEVACION RASANTE: 6.02



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.54
ELEVACION RASANTE: 6.03



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.58
ELEVACION RASANTE: 6.05



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LARREA SANCHEZ Y MARCELO
Mar. Profesional 82.12794

Director de Obra:
YOSIO MARCELO SANCHEZ Y MARCELO
Mar. Profesional 1332-00199801

Topógrafo Interventor:
Jesús R. RUIZ
Mar. Profesional 82.12794

Director de Interventoría:
MARCELO SANCHEZ Y MARCELO
Mar. Profesional 1332-00199801

MODIFICACIONES



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN


ESCALA:

PLANTA 1:100


PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026


ARCHIVO:




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.81
ELEVACION RASANTE: 6.07




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.75
ELEVACION RASANTE: 6.09




ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.48
ELEVACION RASANTE: 6.11

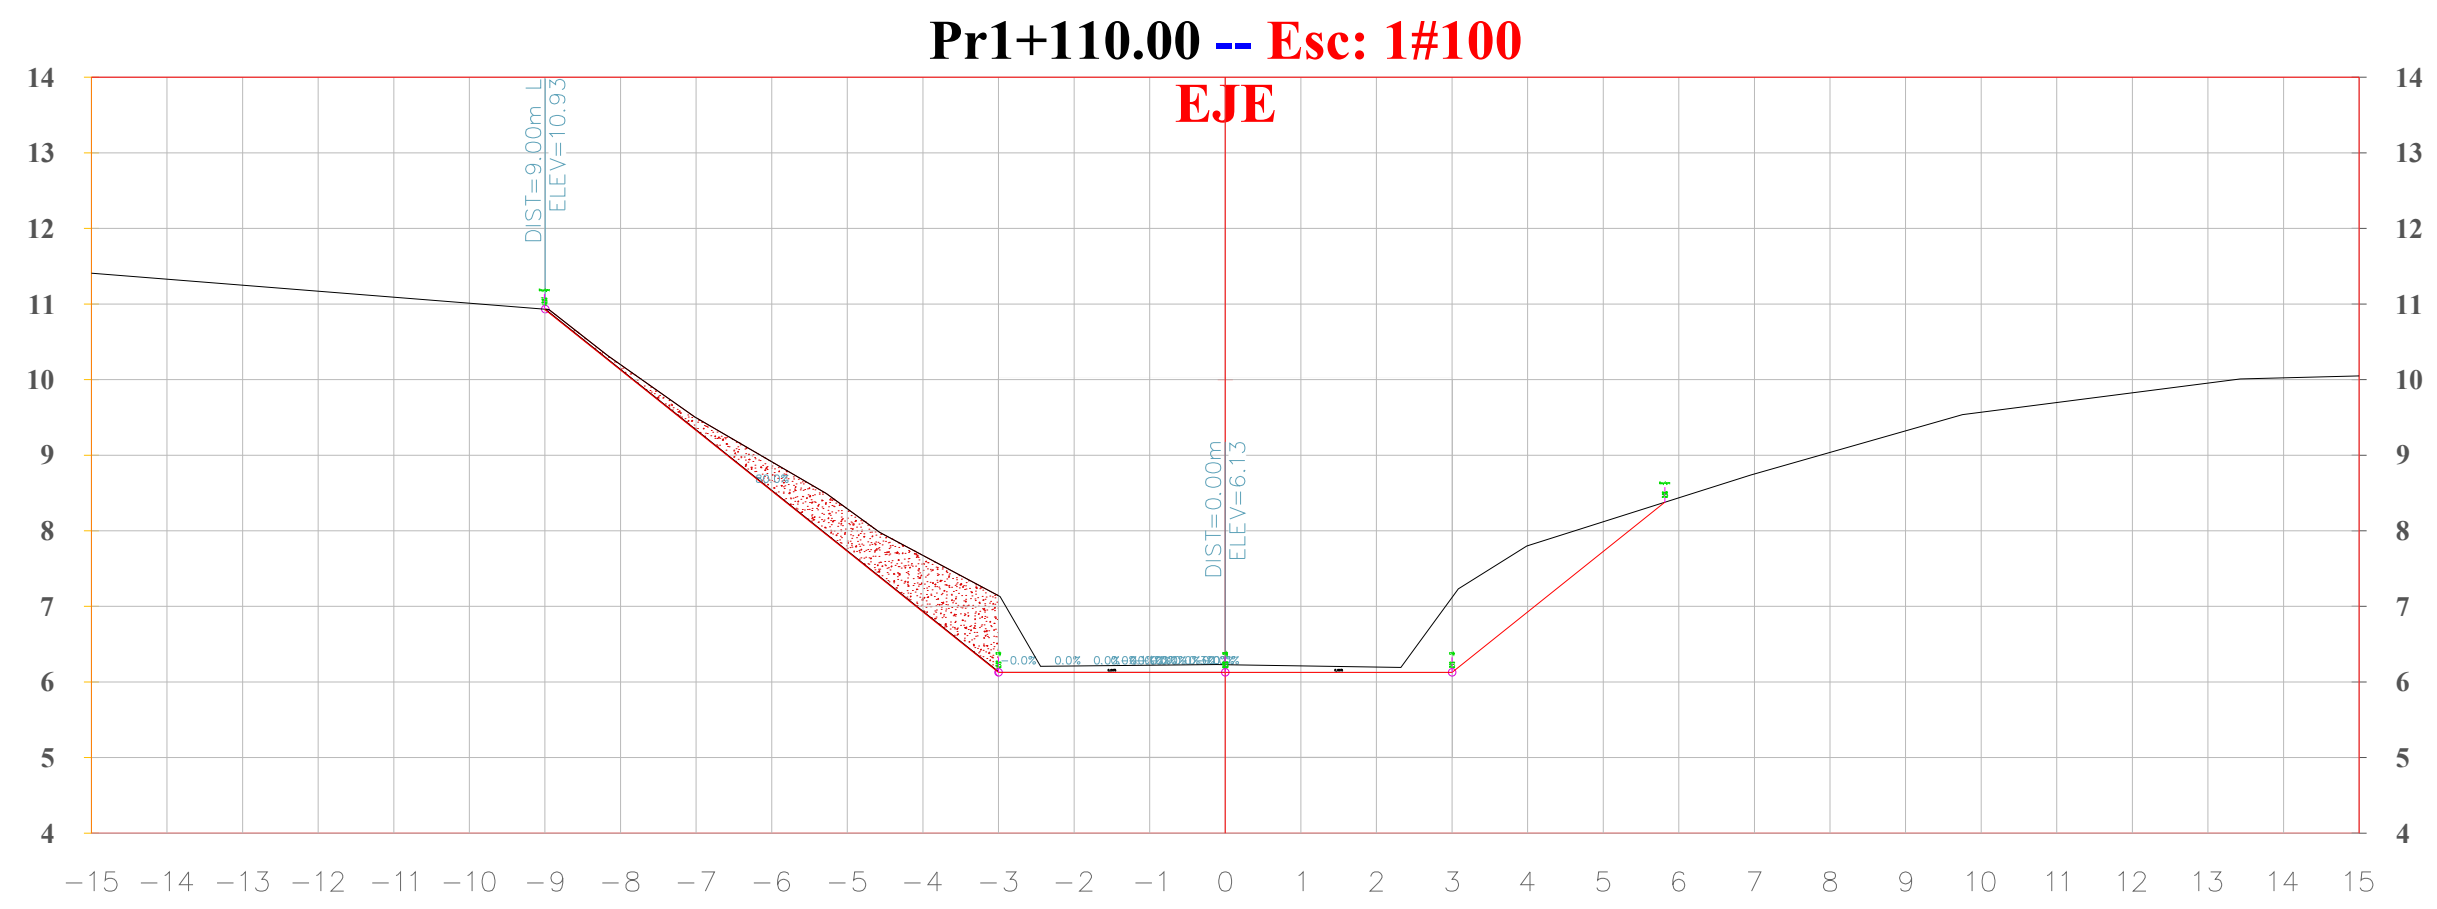

ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.23
ELEVACION RASANTE: 6.13



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.35
ELEVACION RASANTE: 6.15



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.38
ELEVACION RASANTE: 6.15



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LARREA SARMIENTO Y SÁNCHEZ
Mat. Profesional: 02-12799

Director de Obra:
YESSICA MARCELO GARCÍA SÁNCHEZ
Mat. Profesional: 2320-001990001

Topógrafo Interventor:
Jorge Luis BARRERA
Mat. Profesional: 02-16473

Director de Interventoría:
MARCELO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Mat. Profesional: 0320-001990001

MODIFICACIONES
I
II
III
IV
V



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN






ESCALA:
PLANTA 1:100

FECHA:

27 de Enero 2026


ARCHIVO:

PLANO

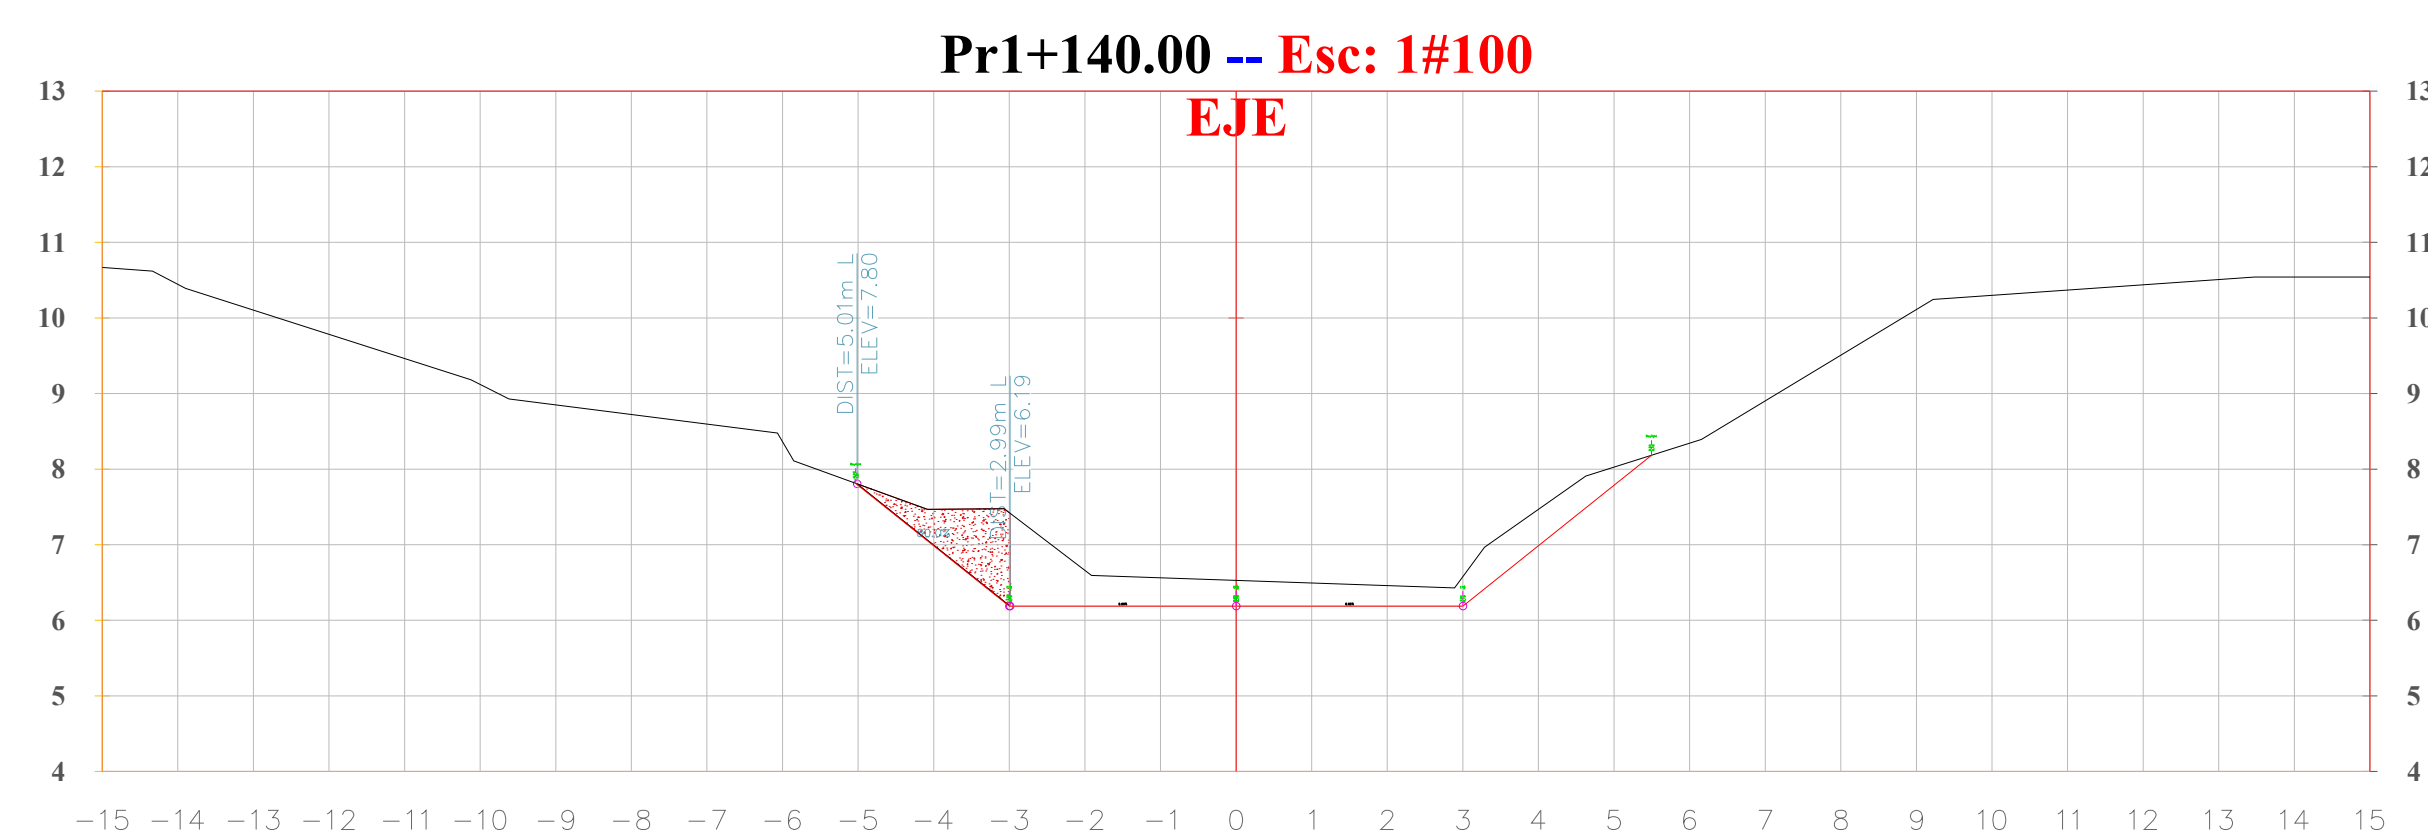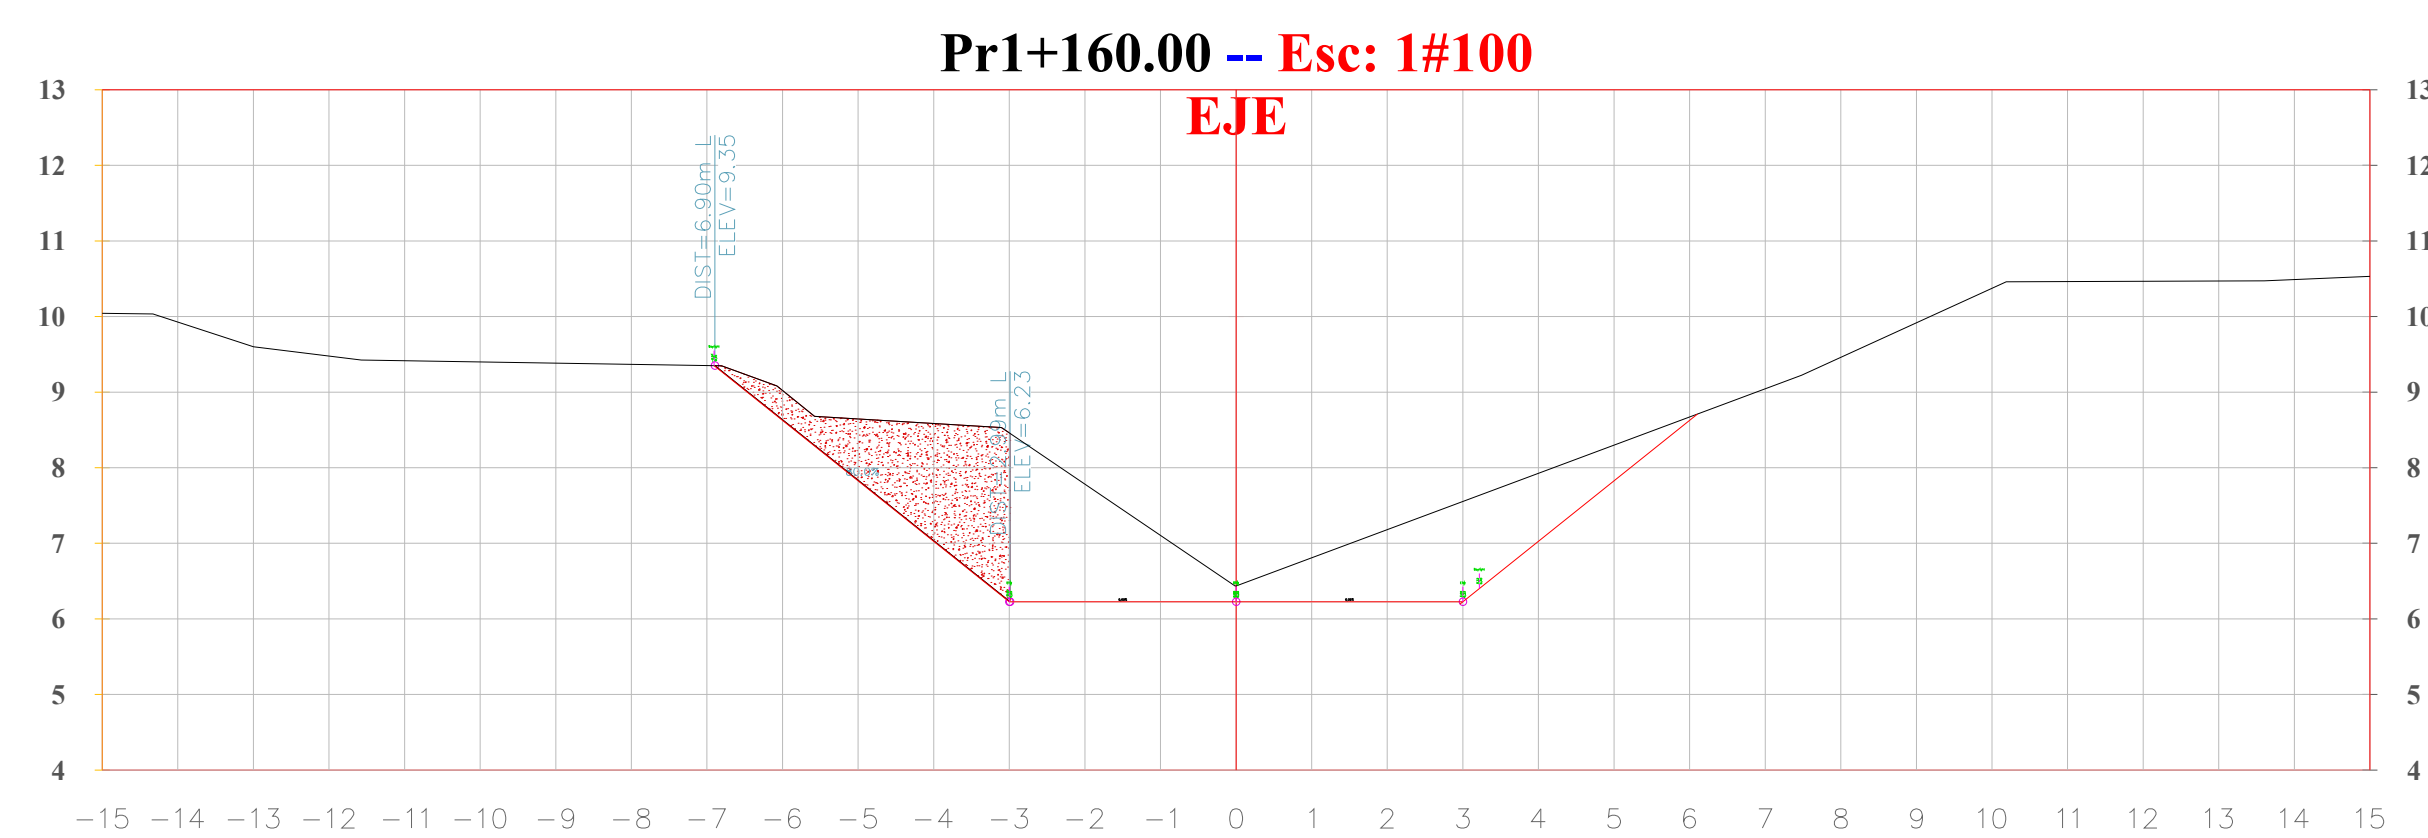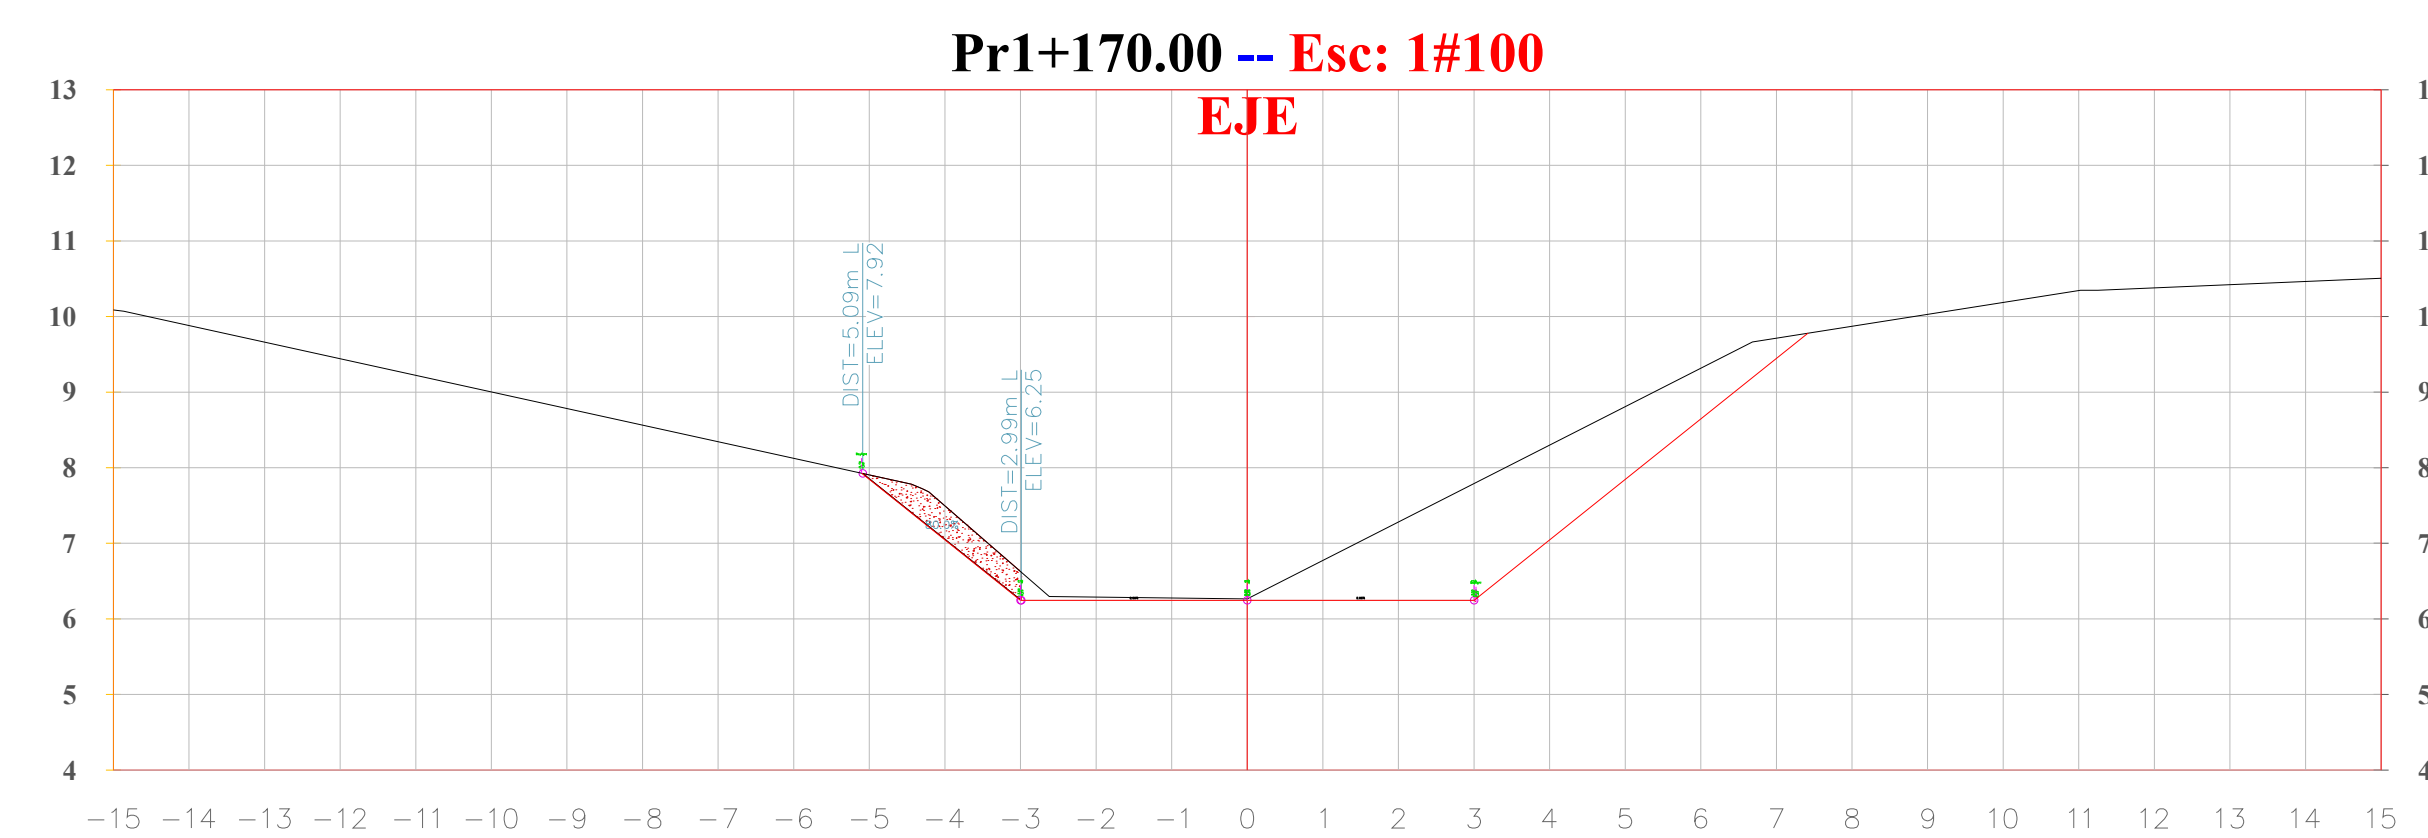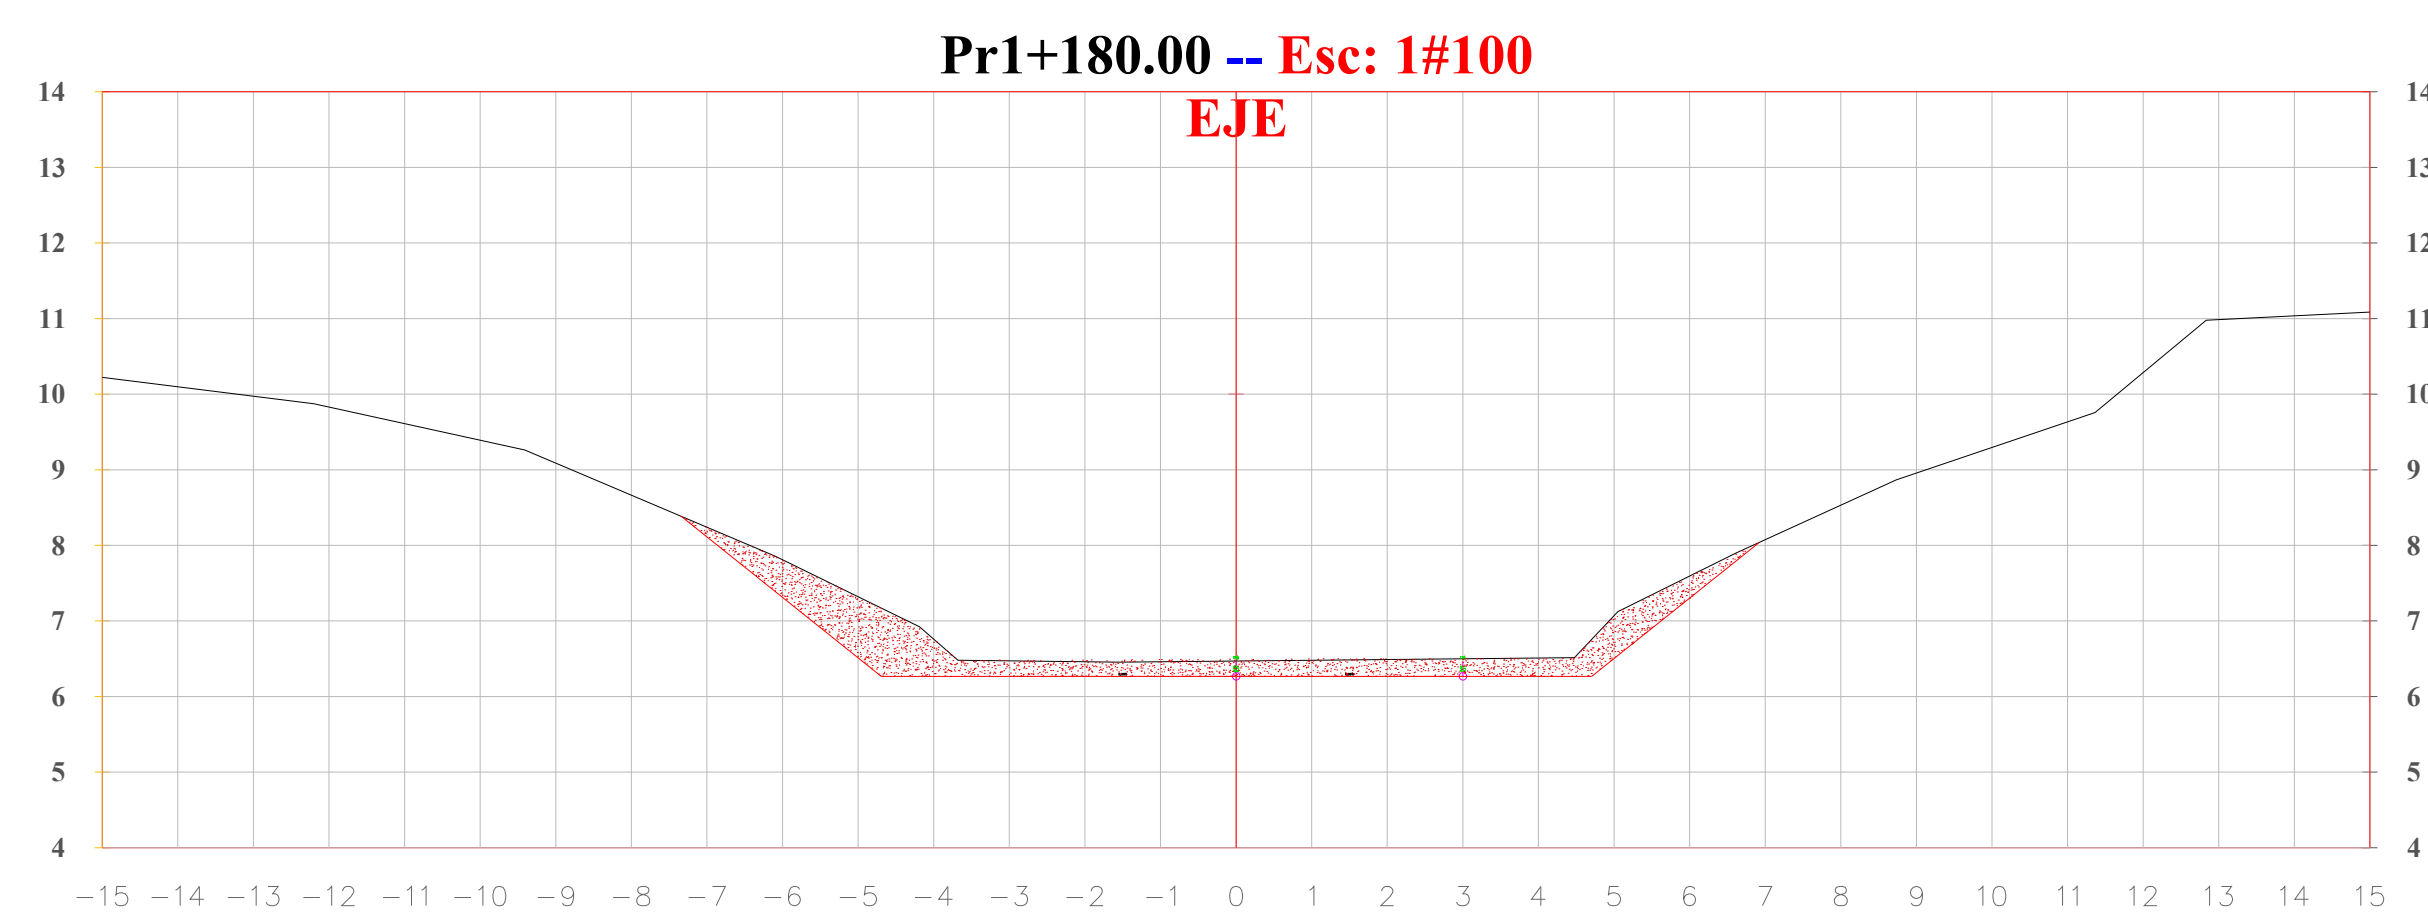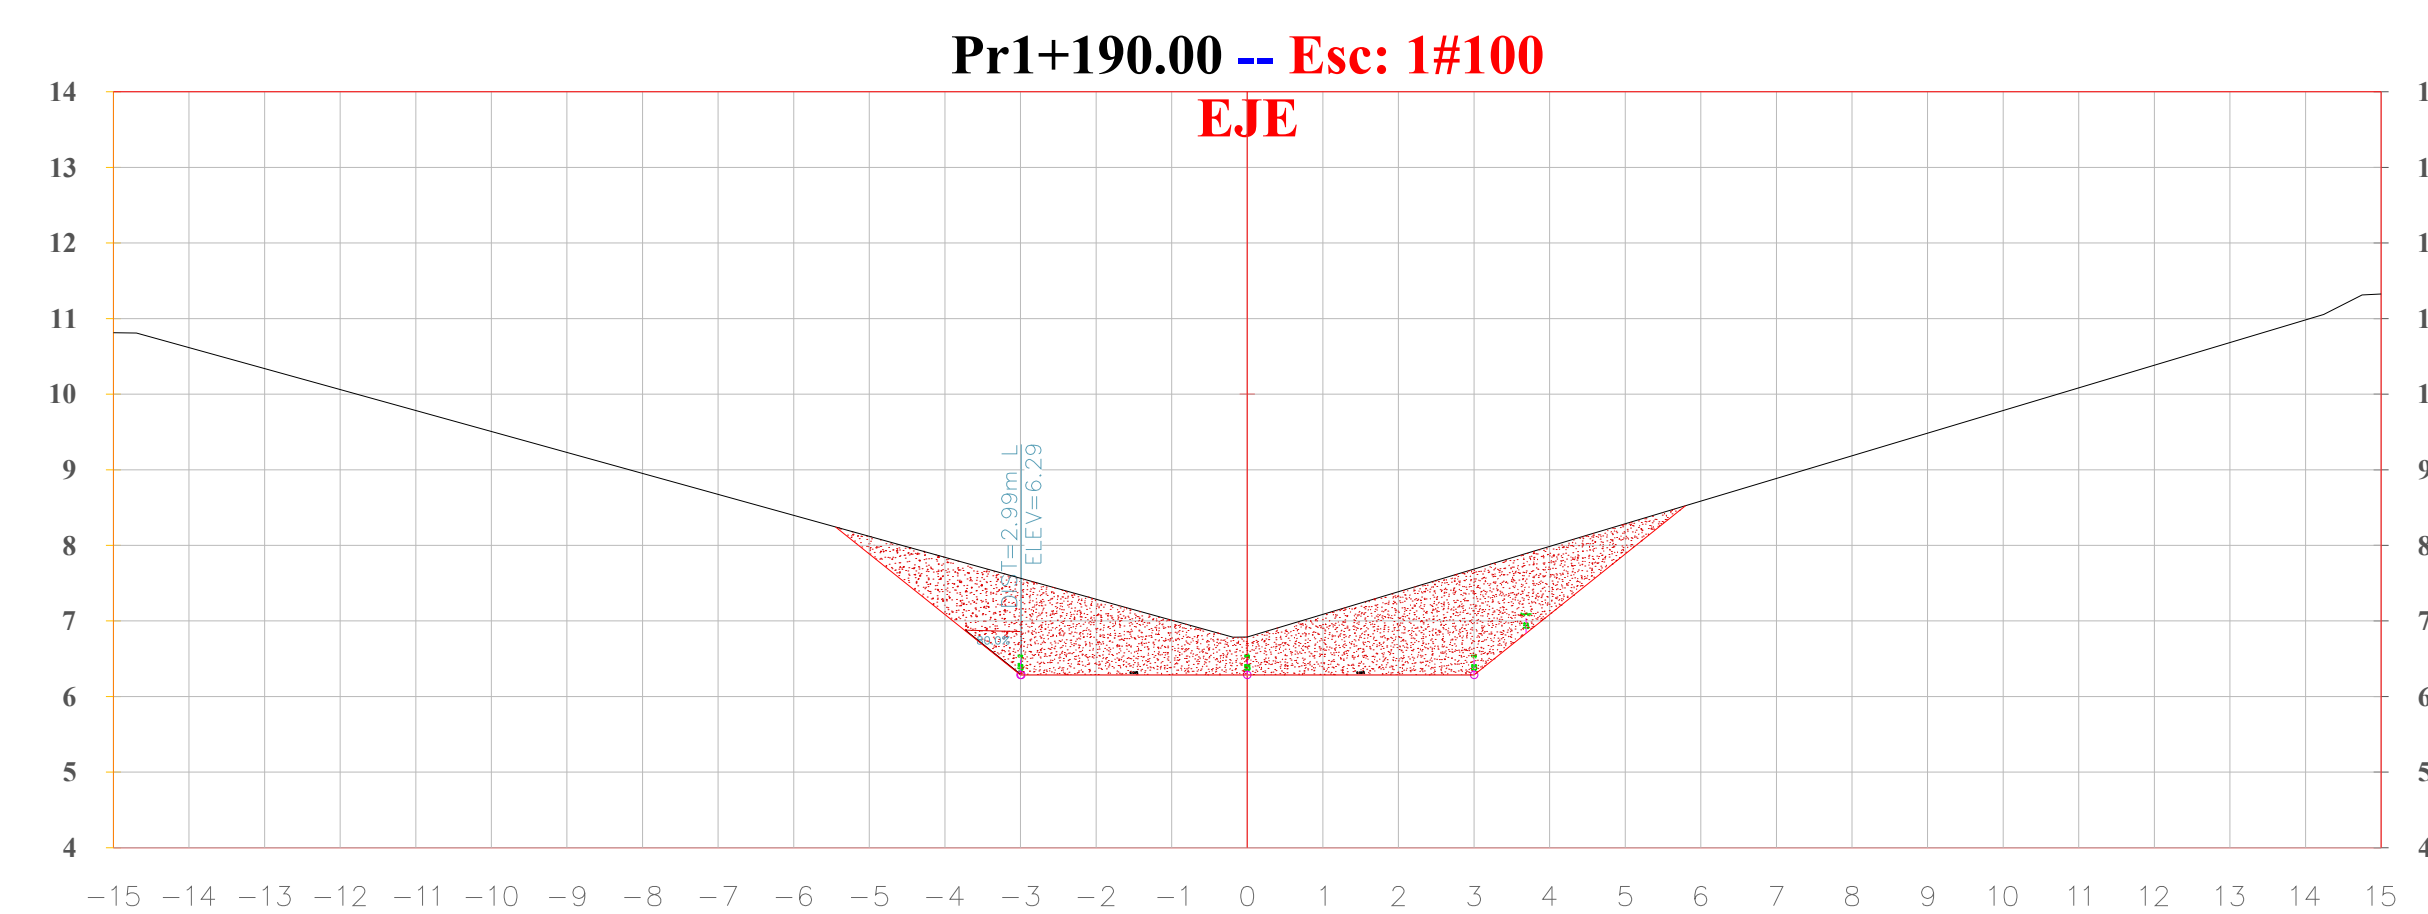


Tapadera Controlista:  GWANELIO JAVIER LARAMENDI LANGAS Msc. Pedagogía / UCIUM	Director de Obra:  YSIDRO ARCANGEL ALMOR Msc. Pedagogía / UCIUM	MODIFICACIONES I II III IV V
Tapadera Interventor/a:  JERSON ROSALES RECTOR DE LA UCIUM	Director de Interventoría:  MANZAN RODRÍGUEZ GÓMEZ Msc. Pedagogía / UCIUM	






ELEVACION TERRENO NATURAL: 7.53
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 7.66
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 7.25
ELEVACION RASANTE:



ELEVACION TERRENO NATURAL: 6.75
ELEVACION RASANTE:



INTERVENTORÍA: CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRÁULICA



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO

Topógrafo Controlista:
GRACIANO LAFRANCO SANCHEZ
Mat. Profesional 8212789

Director de Obra:
YESSY MARCELO GARCIA ARAN
Mat. Profesional 3302091890017

Topógrafo Interventor:
Jesús R. BARRERA
Mat. Profesional 80154753

Director de Interventoría:
MANUEL BERNARDO CORREA
Mat. Profesional 3302091890017

MODIFICACIONES



PROYECTO:

REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

TÍTULO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CANALIZACIÓN

ESCALA:
PLANTA 1:100

PLANO

FECHA:
27 de Enero 2026

ARCHIVO:
