
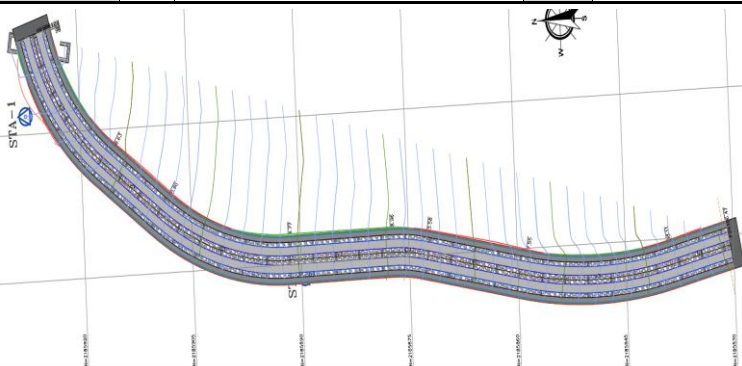

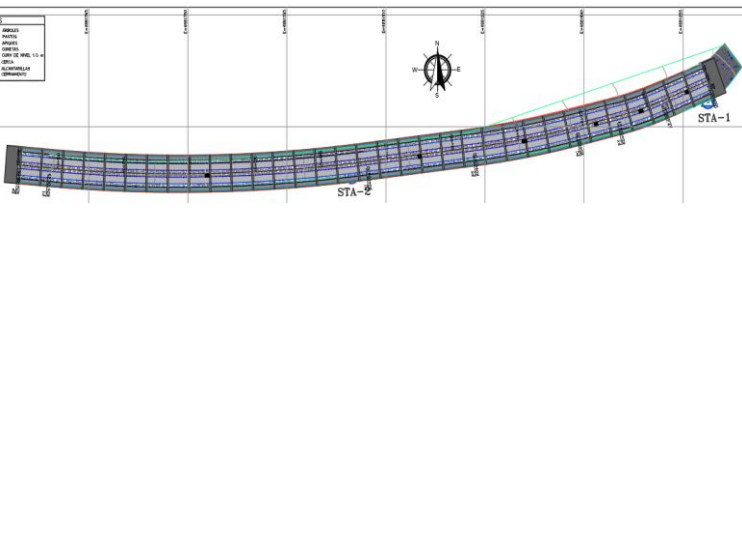



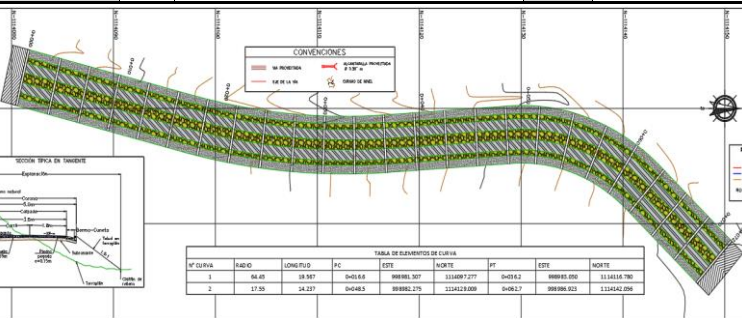


 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2											
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ	ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ					
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR											
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).			UNIDAD:	M3-Km				
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total			
				VOLÚMEN (m³)		F. EXPAN.	D. CANTERA (km)						
				TRAMO TELLEZ (L = 76,00m)									
				Transporte Material de SUBBASE (118,00m³ * 1.3 Factor Compactación * ((41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 8,73Km Distancia al Tramo Veredal) - 5,0km Acarreo Libre = 45,03km))				118.00	1.30	45.03	6 907.60	1.00	6 907.60
OBSERVACIONES:				Subtotal						6 907.60			
				Viene de Hoja No.									
				TOTAL (TRAMO TELLEZ)						6 907.60			
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas									

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR</div>		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2											
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ	ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ					
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR											
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).			UNIDAD:	M3-Km				
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total			
				VOLÚMEN (m³)	F. EXPAN.	D. CANTERA (km)							
				TRAMO PARAMO LAGUNAS (L = 80,00m)									
				Transporte Material de SUBBASE (122,00m³ * 1,3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 13,40Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 49,70km))				122,00	1,30	49,70	7 882,42	1,00	7 882,42
OBSERVACIONES:				Subtotal						7 882,42			
				Viene de Hoja No.									
				TOTAL (TRAMO PARAMO LAGUNAS)						7 882,42			
<div> ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación</div> <div> ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas</div>													



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBÚR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2									
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO						
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ				
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR									
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas				
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).		UNIDAD: M3-Km				
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		Número elementos	Medida Total		
				VOLÚMEN (m³)		F. EXPAN.	D. CANTERA (km)			V. PARCIAL	
				TRAMO SAN MARTÍN - SALIDA A LA PEÑA (L = 250,00m)							
				Transporte Material de SUBBASE (163,00m³ * 1.3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 17,30Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 53,60km))		379.00	1.30	53.60	26 408.72	1.00	26 408.72
OBSERVACIONES:				Subtotal		26 408.72					
				Viene de Hoja No.							
				TOTAL (TRAMO SAN MARTÍN - SALIDA A LA PEÑA)		26 408.72					
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas							


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2											
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ						
						ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ							
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR											
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).		UNIDAD: M3-Km						
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		Número elementos	Medida Total				
						VOLÚMEN (m³)	F. EXPAN.			D. CANTERA (km)	V. PARCIAL		
				TRAMO CHIZO CENTRO - SANTA TERESA (L = 72,00m)									
				Transporte Material de SUBBASE (112,00m³ * 1.3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 8,30Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 44,60km))				112,00	1,30	44,60	6 493,76	1,00	6 493,76
OBSERVACIONES:				Subtotal					6 493,76				
				Viene de Hoja No.									
				TOTAL (TRAMO CHIZO CENTRO - SANTA TERESA)					6 493,76				
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas									







REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2

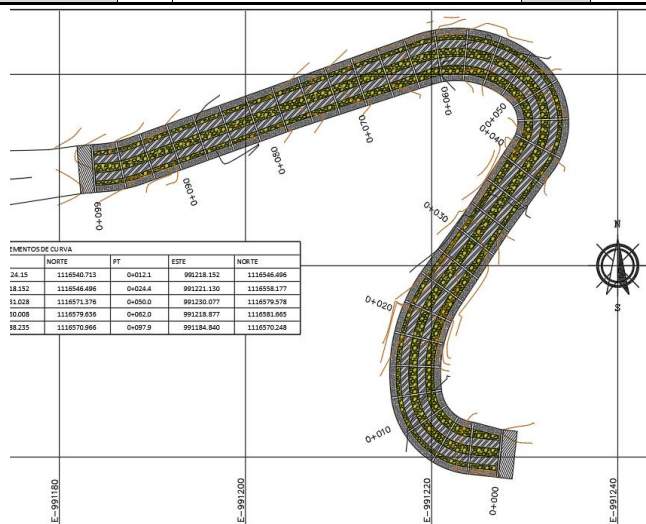

MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)					FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																																												
FECHA		DD	30	MM	1	AA	2025		ELABORÓ		ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ																																										
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED Terciaria del MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR																																																			
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR						SUPERVISOR		ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas																																											
CAPITULO		2		CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA				ITEM		2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).				UNIDAD:		M3-Km																																					
<div><div><div><table data-bbox="192 756 488 852"><tr><th colspan="4">PUNTOS DE CURVA</th></tr><tr><th></th><th>NORTE</th><th>PT</th><th>ESTE</th><th>NORTE</th></tr><tr><td>24.15</td><td>1118540.713</td><td>0+012.1</td><td>991218.152</td><td>1118546.496</td></tr><tr><td>18.152</td><td>1118546.496</td><td>0+024.4</td><td>991221.130</td><td>1118558.177</td></tr><tr><td>11.028</td><td>1118571.378</td><td>0+050.0</td><td>991230.077</td><td>1118579.378</td></tr><tr><td>10.008</td><td>1118579.636</td><td>0+062.0</td><td>991218.877</td><td>1118581.869</td></tr><tr><td>58.235</td><td>1118570.968</td><td>0+097.9</td><td>991184.940</td><td>1118570.248</td></tr></table></div><div><div>OBSERVACIONES:</div><div><div><div>Subtotal</div><div>Viene de Hoja No.</div><div>TOTAL (TRAMO SANTA BARBARA - LA PAZ)</div></div><div><div>12 198.40</div><div></div><div>12 198.40</div></div></div></div><div><div><div>ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación</div></div><div><div><div>ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas</div></div></div></div></div></div>																PUNTOS DE CURVA					NORTE	PT	ESTE	NORTE	24.15	1118540.713	0+012.1	991218.152	1118546.496	18.152	1118546.496	0+024.4	991221.130	1118558.177	11.028	1118571.378	0+050.0	991230.077	1118579.378	10.008	1118579.636	0+062.0	991218.877	1118581.869	58.235	1118570.968	0+097.9	991184.940	1118570.248				
PUNTOS DE CURVA																																																					
	NORTE	PT	ESTE	NORTE																																																	
24.15	1118540.713	0+012.1	991218.152	1118546.496																																																	
18.152	1118546.496	0+024.4	991221.130	1118558.177																																																	
11.028	1118571.378	0+050.0	991230.077	1118579.378																																																	
10.008	1118579.636	0+062.0	991218.877	1118581.869																																																	
58.235	1118570.968	0+097.9	991184.940	1118570.248																																																	

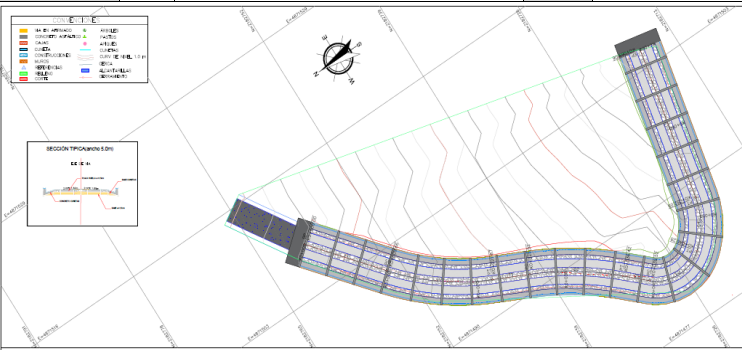 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2											
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ						
						ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ							
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED Terciaria DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR											
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).		UNIDAD: M3-Km						
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total			
				VOLÚMEN (m³)		F. EXPAN.	D. CANTERA (km)						
				TRAMO SANTA BARBARA - SAN JOSÉ (L = 69,00m)									
				Transporte Material de AFIRMADO (129,39m³ * 1.3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 20,22Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 56,52km))				129.39	1.30	56.52	9 507.06	1.00	9 507.06
				Transporte Material de SUBBASE (52,88m³ * 1.3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 20,22Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 56,52km))				52.88	1.30	56.52	3 885.41	1.00	3 885.41
OBSERVACIONES:				Subtotal					13 392.47				
				Viene de Hoja No.									
				TOTAL (TRAMO SANTA BARBARA - SAN JOSÉ)					13 392.47				
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas									

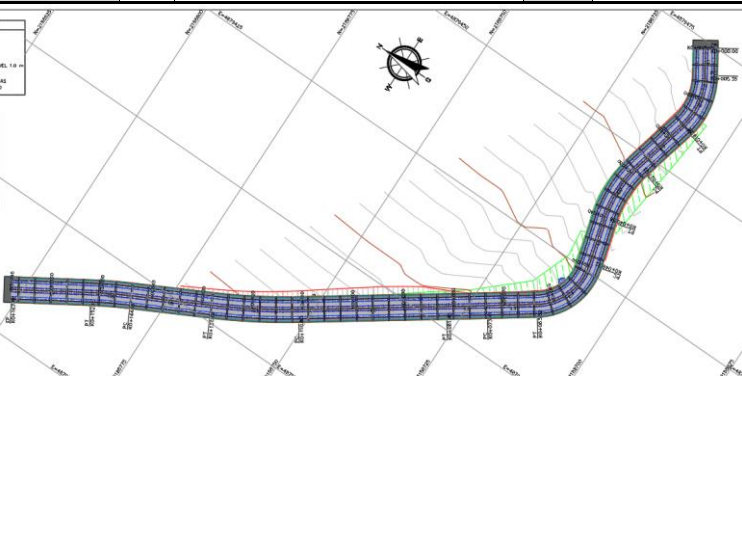 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBÚR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2											
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO								
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR											
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas						
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).		UNIDAD: M3-Km						
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		V. PARCIAL	Número elementos	Medida Total			
				VOLÚMEN (m³)		F. EXPAN.	D. CANTERA (km)						
				TRAMO LLANO GRANDE - MATEGUATILA (L = 100,00m)									
				Transporte Material de AFIRMADO (162,38m³ * 1.3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 27,17Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 63,47km))				162.38	1.30	63.47	13 398.14	1.00	13 398.14
				Transporte Material de SUBBASE (78,00m³ * 1.3 Factor Compactación * (41,3Km Distancia Urbana a la Cantera + 27,17Km Distancia al Tramo Veredal - 5,0km Acarreo Libre = 63,47km))				78.00	1.30	63.47	6 435.86	1.00	6 435.86
OBSERVACIONES:				Subtotal					19 833.99				
				Viene de Hoja No.									
				TOTAL (TRAMO LLANO GRANDE - MATEGUATILA)					19 833.99				
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas									

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2										
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBÚR (BOYACA)		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO							
FECHA	DD	30	MM	1	AA	2025	ELABORÓ					
						ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ						
PROYECTO:		MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR										
ENTIDAD:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas					
CAPITULO	2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA		ITEM	2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (SUELTO).		UNIDAD: M3-Km					
				AREA / LUGAR / ELEMENTO		Dimensiones		Número elementos	Medida Total			
						VOLÚMEN (m³)	F. EXPAN.			D. CANTERA (km)	V. PARCIAL	
				CONSOLIDADO								
				Tramo TELLEZ							6 907.60	
				Tramo PARAMO LAGUNAS							7 882.42	
				Tramo SAN MARTÍN - SALIDA A LA PEÑA							26 408.72	
				Tramo SANTA BÁRBARA - LA PAZ							12 198.40	
				Tramo SANTA BÁRBARA - SAN JOSÉ							13 392.47	
				Tramo CHIZO CENTRO - SANTA TERESA							6 493.76	
				Tramo LLANO GRANDE - MATEGUATILA							19 833.99	
OBSERVACIONES:												
				Subtotal				93 117.37				
				Viene de Hoja No.								
				TOTAL				93 117.37				
 ING. HARVEY CAMILO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Profesional de Apoyo Planeación				 ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas								
