



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENIOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	ITEM	UNID.	m³	UBICACIÓN
CAP I: PRELIMINARES	1,1 Demolición De Estructuras			Vía Chibolo - Apure

HITO 1 - (K0+000 - K2+000)								
Demolición alcantarilla existente 36" - K0+094								
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espeor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)
					DI. interior	DI. exterior		
Alcantarilla - Losa inferior	K0+094	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08
Alcantarilla - Guardarrueda	K0+094	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08
Alcantarilla - Atraque	K0+094	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30
Alcantarilla - Muros aletas	K0+094	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,08
Alcantarilla - Muros tubería	K0+094	1,00	1,00	0,20	1,00	0,90	2,00	0,09
Alcantarilla - Tubería	K0+094	7,20	1,57	0,20	1,00	0,90	1,00	1,07
Demolición alcantarilla existente 24" - K0+189								
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espeor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)
					DI. interior	DI. exterior		
Alcantarilla - Losa inferior	K0+189	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08
Alcantarilla - Guardarrueda	K0+189	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08
Alcantarilla - Atraque	K0+189	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30
Alcantarilla - Muros aletas	K0+189	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,08
Alcantarilla - Muros tubería	K0+189	1,00	1,00	0,20	0,70	0,60	2,00	0,25
Alcantarilla - Tubería	K0+189	7,20	1,57	0,20	0,70	0,60	1,00	0,74
Demolición alcantarilla existente 24" - K0+713								
Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espeor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)
					DI. interior	DI. exterior		
Alcantarilla - Losa inferior	K0+713	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08
Alcantarilla - Guardarrueda	K0+713	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08
Alcantarilla - Atraque	K0+713	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30
Alcantarilla - Muros aletas	K0+713	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,08
Alcantarilla - Muros tubería	K0+713	1,00	1,00	0,20	0,70	0,60	2,00	0,25
Alcantarilla - Tubería	K0+713	7,20	1,57	0,20	0,70	0,60	1,00	0,74





MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA																																																																												
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA																																																																												
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025																																																																												
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.																																																																												
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	801.774.297 - 1																																																																										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	801.846.652																																																																										
		CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023																																																																										
CAPÍTULO	CAP I. PRELIMINARES	ITEM	1.1																																																																										
		Demolición De Estructuras	UNID.																																																																										
		m³	UBICACIÓN																																																																										
		Vía Chibolo - Apure																																																																											
Demolición alcantarilla existente 36" - K1+996																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Descripción</th><th rowspan="2">Localización</th><th rowspan="2">Longitud</th><th rowspan="2">Ancho</th><th rowspan="2">Espesor</th><th colspan="2">Tubería</th><th rowspan="2">Cantidad</th><th rowspan="2">Volumen (m³)</th></tr><tr><th>Di. interior</th><th>Di. exterior</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alcantarilla - Losa inferior</td><td>K1+996</td><td>7,20</td><td>1,00</td><td>0,15</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>1,00</td><td>1,08</td></tr><tr><td>Alcantarilla - Guardarrueda</td><td>K1+996</td><td>1,00</td><td>0,20</td><td>0,20</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>2,00</td><td>0,08</td></tr><tr><td>Alcantarilla - Atraque</td><td>K1+996</td><td>7,20</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>2,00</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Alcantarilla - Muros cletas</td><td>K1+996</td><td>1,20</td><td>1,10</td><td>0,20</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>4,00</td><td>1,06</td></tr><tr><td>Alcantarilla - Muros tubería</td><td>K1+996</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>0,80</td><td>2,00</td><td>0,09</td></tr><tr><td>Alcantarilla - Tubería</td><td>K1+996</td><td>7,20</td><td>1,57</td><td>0,20</td><td>1,00</td><td>0,90</td><td>1,00</td><td>1,07</td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL</td><td>61,39</td></tr></tbody></table>				Descripción	Localización	Longitud	Ancho	Espesor	Tubería		Cantidad	Volumen (m³)	Di. interior	Di. exterior	Alcantarilla - Losa inferior	K1+996	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08	Alcantarilla - Guardarrueda	K1+996	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08	Alcantarilla - Atraque	K1+996	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30	Alcantarilla - Muros cletas	K1+996	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,06	Alcantarilla - Muros tubería	K1+996	1,00	1,00	0,20	1,00	0,80	2,00	0,09	Alcantarilla - Tubería	K1+996	7,20	1,57	0,20	1,00	0,90	1,00	1,07	TOTAL								61,39
Descripción	Localización	Longitud	Ancho						Espesor	Tubería			Cantidad	Volumen (m³)																																																															
				Di. interior	Di. exterior																																																																								
Alcantarilla - Losa inferior	K1+996	7,20	1,00	0,15	N/A	N/A	1,00	1,08																																																																					
Alcantarilla - Guardarrueda	K1+996	1,00	0,20	0,20	N/A	N/A	2,00	0,08																																																																					
Alcantarilla - Atraque	K1+996	7,20	0,30	0,30	N/A	N/A	2,00	1,30																																																																					
Alcantarilla - Muros cletas	K1+996	1,20	1,10	0,20	N/A	N/A	4,00	1,06																																																																					
Alcantarilla - Muros tubería	K1+996	1,00	1,00	0,20	1,00	0,80	2,00	0,09																																																																					
Alcantarilla - Tubería	K1+996	7,20	1,57	0,20	1,00	0,90	1,00	1,07																																																																					
TOTAL								61,39																																																																					
Elaboró: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA																																																																													
Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma Jairo Enrique Ruiz Molina DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																													



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP I: PRELIMINARES	ITEM	1,2	Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas	UNID.	m ²	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
----------	---------------------	------	-----	--	-------	----------------	-----------	---------------------



Descripción	Localización		Longitud	Ancho	Espesor	Cantidad	Area (m ²)
HITO 1 - (K0+000 - K2+000)							
Desmonte y limpieza	K0+000,00	K2+000,00	2.000,00	2,50	N/A	2,00	10.000,00
TOTAL							10.000,00

Elaboró:
CONSORCIO VAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA			ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.852		

CAPÍTULO	CAP I: PRELIMINARES	ITEM	1,3	Remoción De Cercas Alambre	UNID.	m	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
				Descripción	Localización	Longitud	Lado	Cantidad	Metros (m)	
				MITO 1 - (K0+000 - K2+000)						
				Remoción de cerca	K0+000,00	K2+000,00	560,00	Derecho	1,00	560,00
TOTAL								560,00		

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Firma Jairo Enrique Ruiz Molina
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.G. 901.774.297 - 1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.G. 901.848.652
CONTRATO DE OBRA N° 1586 DEL 2023		
CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ITEM 2,1
Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales		
UNID.	m3	UBICACIÓN
Via Chibolo - Apure		
Descripción	Localización	Longitud (m)
Excavación	K0+000,00 K2+000,00	Ver cartera topografica anexa
MTO 1 - (K0+000 - K2+000)		12.606,42
TOTAL		12.606,42

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.G.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.G.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2.2	Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
								
Descripción		Localización		Volumen material (m³)	Expansión	Cantidad	Volumen (m³)	
HITO 1 - (K0+000 - K2+000)								
Transporte material	K0+000,00	K2+000,00	12.008,42	1,30	1,00	16.388,35		



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA					
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652			
CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ÍTEM	2.3	Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 - 22		
		UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure	
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	
		HITO 1 - (K0+000 - K2+000)				
		Mejoramiento	K0+000,00	K2+000,00	Ver cartera topografica anexa	
TOTAL				10.558,01		

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA					
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.					
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N° 1588 DEL 2023		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652			

CAPÍTULO	CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ÍTEM	2.4	Suministro y colocación de Geomalla Biaxial Coextrudal para separación de suelos de subrasante y capas granulares	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure		
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Área (m2)	
				HITO 1 - (K0+000 - K2+000)						
				Geomalla	K0+000,00	K2+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,0



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSÓRCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652
		CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023

CAPÍTULO	CAP II: EXCAVACION Y RELLENOS	ITEM	2.6	Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 13 (incluye colocación, extendido y compactación)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
HITO 1 - (K0+000 - K2+000)								
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
		Subbase granular	K0+000,00 K2+000,00	2.000,00	9,30	0,25	4.650,00	
TOTAL							4.650,00	

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ACUAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO	MAGDALENA		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.846.652		

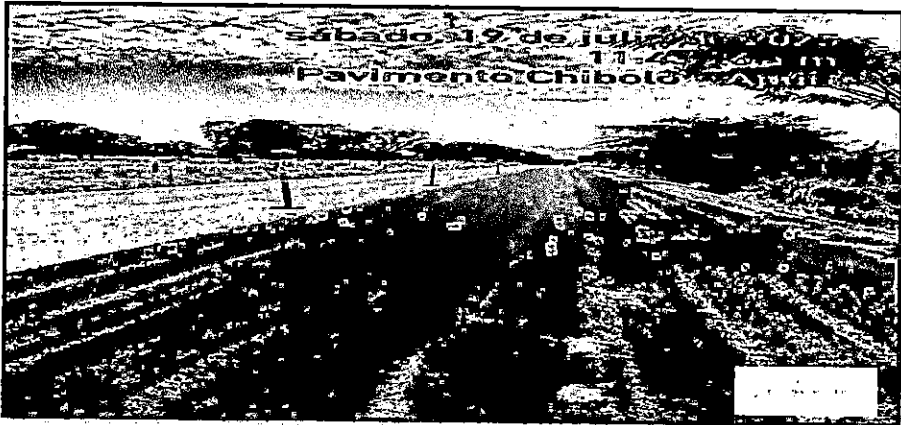
[illegible]

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORO CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP. III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ÍTEM	3,1	Suministro e instalación de emulsión asfáltica (Imprimación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	Via Chibola - Apure
								
Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Propio (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)		
HITO 4 - (K2+000 - K4+000)								
Imprimación	K2+000,00	K4+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,00		
HITO 5 - (K4+000 - K6+000)								
Imprimación	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	9,30	N/A	18.600,00		
TOTAL						37.200,00		

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

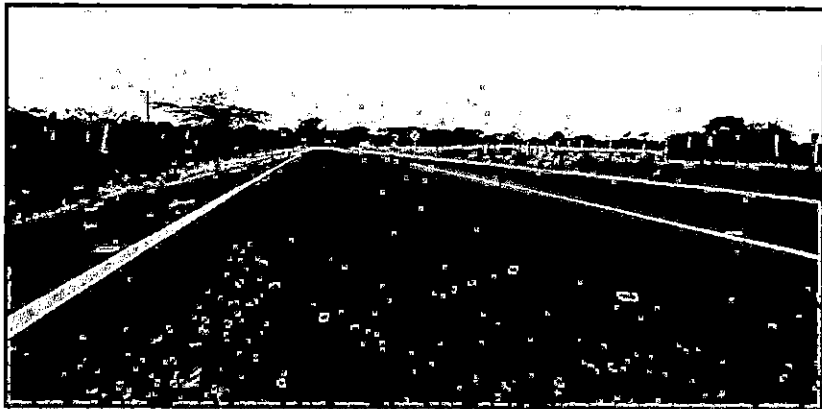

Aprobó:
CONSORCIO INTERMUNE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO		MAGDALENA				
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA		01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.	901.774.297 - 1	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.	901.846.652	
				CONTRATO DE OBRA N°	1688 DEL 2023	
CAPÍTULO	CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	ITEM	3,2	Suministro y colocación de concreto asfáltico MDC -19 para carpeta de rodadura	UNID.	
				m3	UBICACIÓN	
				Vía Chibolo - Apure		
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	
		HITO 4 - (K2+000 - K4+000)				
		MDC-19	K2+000,00	K4+000,00	2.000,00	9,30
		HITO 6 - (K4+000 - K6+000)				
		MDC-19	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	9,30
				TOTAL	2.790,00	
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA		Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUÍZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA				



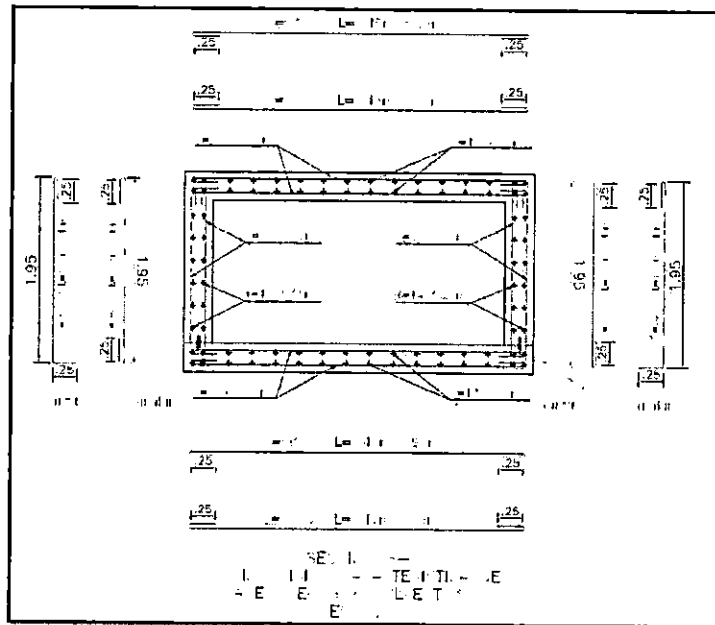
GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	MT O.C.C.	901.774.297 - 1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	MT O.C.C.	901.846.652
		CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4,2	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	UNID.	kg	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
----------	--------------------------	------	-----	---	-------	----	-----------	---------------------



HTO 1 - (K0+000 - K2+000)								
Box Culvert 1.5m x 1.5m - K0+120								
Elemento	Descripción	Acero No	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (Kg)
Muros	Ref Transversal - 1	1/2"	2,00	2,40	70,00	336,00	0,99	333,68
	Ref Transversal - 2	1/2"	2,00	2,35	70,00	329,00	0,99	327,03
	Ref Longitudinal	1/2"	2,00	3,15	16,00	100,80	0,99	100,20
	Ref Longitudinal	1/2"	2,00	12,00	16,00	384,00	0,99	381,70
Losa inferior	Ref Transversal	1/2"	2,00	2,35	70,00	329,00	0,99	327,03
	Ref Longitudinal	1/2"	2,00	3,55	10,00	71,00	0,99	70,57
	Ref Longitudinal	1/2"	2,00	12,00	10,00	240,00	0,99	238,56
Losa superior	Ref Transversal	1/2"	2,00	2,35	70,00	329,00	0,99	327,03
	Ref Longitudinal	1/2"	2,00	3,55	10,00	71,00	0,99	70,57
	Ref Longitudinal	1/2"	2,00	12,00	10,00	240,00	0,99	238,56
Solera	Ver plano estructural	1/2"	2,00	2,00	31,00	124,00	0,99	123,26
	Ver plano estructural	1/2"	2,00	2,00	31,00	124,00	0,99	123,26
	Ver plano estructural	1/2"	2,00	2,00	31,00	124,00	0,99	123,26
	Ver plano estructural	1/2"	4,00	6,00	12,00	288,00	0,99	289,27
	Ver plano estructural	1/2"	4,00	3,00	44,00	528,00	0,99	524,83
	Ver plano estructural	1/2"	4,00	3,00	19,00	228,00	0,99	226,63
Box Culvert 3m x 1.5m - K0+680								
Elemento	Descripción	Acero No	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (Kg)
Acero de refuerzo - 1	Ver plano estructural	5/8"	1,00	3,95	80,00	318,00	1,55	490,43
Acero de refuerzo - 2	Ver plano estructural	5/8"	1,00	3,95	80,00	318,00	1,55	490,43
Acero de refuerzo - 3	Ver plano estructural	1/2"	1,00	9,95	12,00	119,40	0,99	118,68
Acero de refuerzo - 4	Ver plano estructural	1/2"	1,00	2,90	12,00	34,80	0,99	34,59
Acero de refuerzo - 5	Ver plano estructural	1/2"	1,00	9,95	12,00	119,40	0,99	118,68
Acero de refuerzo - 6	Ver plano estructural	1/2"	1,00	2,90	12,00	34,80	0,99	34,59
Acero de refuerzo - 7	Ver plano estructural	5/8"	1,00	3,95	60,00	237,00	1,55	367,82
Acero de refuerzo - 8	Ver plano estructural	5/8"	1,00	3,95	60,00	237,00	1,55	367,82
Acero de refuerzo - 9	Ver plano estructural	1/2"	1,00	9,95	12,00	119,40	0,99	117,49
Acero de refuerzo - 10	Ver plano estructural	1/2"	1,00	2,90	12,00	34,80	0,99	34,59
Acero de refuerzo - 11	Ver plano estructural	1/2"	1,00	9,95	12,00	119,40	0,99	118,68



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.287 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652		

[illegible]



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO MAGDALENA

CONTRATANTE GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

FECHA 01 de Junio del 2025 al 24 de Mayo del 2025

OBJETO DEL CONTRATO MEDICAMENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL MANCIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS UNIVERSALES MAGDALENA

INTERVENIOR CONSORCIO INTER APURÉ

CONTRATO DE OBRA N°

1588 DEL 2023

ELABORÓ CONSORCIO VÍAS UNIVERSALES MAGDALENA

CAPITULO	CAP N: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4.2	Suministro e instalación de acero de refuerzo y=400 kg/cm2 para estructuras, especificadas tipo box culvert
----------	-------------------------	------	-----	---

Elemento		Descripción	Acero (kg)	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (kg)
Guardanueva	Fleje guarda rueda	3/8	2.00	1.30	81.00	210.60	0.56		117.94
	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	11.65	4.00	94.80	1.56		147.89
	Fleje guarda rueda	3/8	2.00	1.20	34.00	81.80	0.56		45.70
Viga solera	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	6.60	6.00	79.20	1.56		123.55
	Refuerzo Transversal #1	3/4	2.00	5.35	60.00	642.00	2.25		1,444.50
	Refuerzo Transversal #2	3/4	2.00	5.35	60.00	642.00	2.25		1,444.50
Muros	Refuerzo longitudinal	1/2	4.00	8.05	16.00	636.60	1.00		638.60
	Refuerzo longitudinal	1/2	4.00	2.90	16.00	165.60	1.00		165.60
	Refuerzo Transversal #3	3/4	2.00	7.35	60.00	682.00	2.25		1,584.50
Piso	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	9.95	28.00	557.20	1.00		557.20
	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	2.90	28.00	162.40	1.00		162.40
	Refuerzo Transversal #3	3/4	2.00	7.35	60.00	682.00	2.25		1,584.50
Tapa box	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	8.95	28.00	557.20	1.00		557.20
	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	2.80	28.00	162.40	1.00		162.40
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.12	2.00	32.88	2.25		74.18
Muros	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.17	2.00	33.36	2.25		75.06
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.22	2.00	33.76	2.25		75.86
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.27	2.00	34.16	2.25		76.86
Tapa box	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.32	2.00	34.56	2.25		77.76
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.37	2.00	34.96	2.25		78.66
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.42	2.00	35.36	2.25		79.56
Muros	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.47	2.00	35.76	2.25		80.46
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.52	2.00	36.16	2.25		81.36
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.57	2.00	36.56	2.25		82.26
Tapa box	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.62	2.00	36.96	2.25		83.16
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.67	2.00	37.36	2.25		84.06
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.72	2.00	37.76	2.25		84.96
Muros	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.77	2.00	38.16	2.25		85.86
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.82	2.00	38.56	2.25		86.76
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.87	2.00	38.96	2.25		87.66
Tapa box	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.92	2.00	39.36	2.25		88.56

REFUERZO BOX CULVERT

4.00 m X 2.00m

4.00

2.00

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

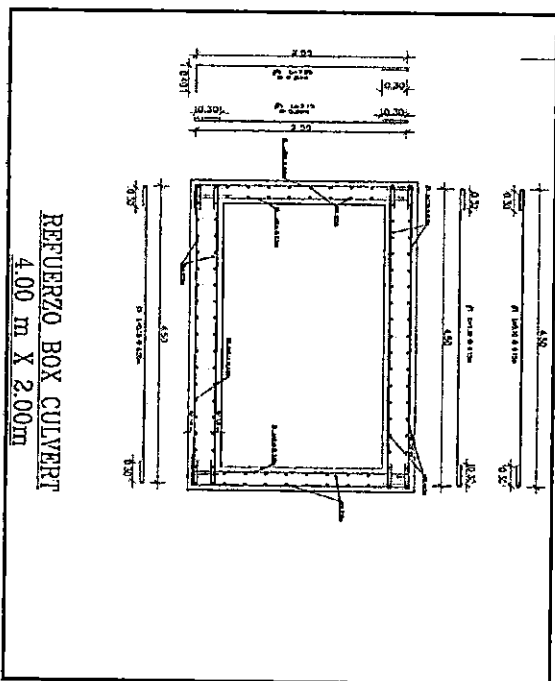
1.80

1.80

1.80

1.80

1.80</





GOVERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO MAGDALENA

CONTRATANTE GOVERNACIÓN DEL MAGDALENA

FECHA 01 de junio del 2023 a 24 de julio del 2023

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONLIGA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 90-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS UNIVERSALES MAGDALENA

INTERVENIOR CONSORCIO INTER APURE

NT O.C.C. 801.774.287 - 1

NT O.C.C. 801.846.652

CONTRATO DE OBRA N°

1588 DEL 2023

ELABORÓ CONSORCIO VÍAS UNIVERSALES MAGDALENA

CAPÍTULO CAP IV: OBRAS DE DRENAJE

ITEM

4.2

Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, de acuerdo a las especificaciones de la obra.

UNID.

kg

UBICACIÓN

Vía Chibolo - Apure

Boleros oleatas

Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.87	2.00	39.76	2.25	89.46
Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.02	2.00	40.16	2.25	90.38
Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.08	2.00	40.64	2.25	91.44
Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.13	2.00	41.04	2.25	92.34
Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.16	2.00	41.44	2.25	93.24
Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.23	2.00	41.84	2.25	94.14
Refuerzo horizontal	1/2	2.00	12.00	32.00	768.00	1.00	768.00
Refuerzo transversal	3/4	2.00	12.80	2.00	48.00	2.25	108.00
Refuerzo transversal	3/4	2.00	1.62	2.00	6.48	2.25	14.58
Refuerzo transversal	3/4	2.00	1.30	2.00	5.20	2.25	11.70
Refuerzo transversal	3/4	2.00	11.82	2.00	47.28	2.25	106.38
Refuerzo transversal	3/4	2.00	11.41	2.00	45.64	2.25	102.69
Refuerzo transversal	3/4	2.00	11.01	2.00	44.04	2.25	98.09
Refuerzo transversal	3/4	2.00	10.80	2.00	42.40	2.25	95.40
Refuerzo transversal	3/4	2.00	10.20	2.00	40.80	2.25	91.80
Refuerzo transversal	3/4	2.00	8.80	2.00	39.20	2.25	88.20
Refuerzo transversal	3/4	2.00	9.39	2.00	37.56	2.25	84.51
Refuerzo transversal	3/4	2.00	8.99	2.00	35.96	2.25	80.91
Refuerzo transversal	3/4	2.00	8.58	2.00	34.32	2.25	77.22
Refuerzo transversal	3/4	2.00	8.18	2.00	32.72	2.25	73.62
Refuerzo transversal	3/4	2.00	7.78	2.00	31.12	2.25	70.02
Refuerzo transversal	3/4	2.00	7.37	2.00	29.48	2.25	66.33
Refuerzo transversal	3/4	2.00	6.97	2.00	27.88	2.25	62.73
Refuerzo transversal	3/4	2.00	6.59	2.00	26.24	2.25	59.04
Refuerzo horizontal	1/2	4.00	12.00	16.00	720.00	1.00	720.00

Bot. Chibolo km 4.400 - 4.414.600

Elemento	Descripción	Acero tipo	Cantidad elemento estructural	Longitud corte (m)	Cantidad	Longitud total (m)	Peso (kg/m)	Peso (kg)
Guardarrueda	Fleje guarda rueda	3/8	2.00	1.30	81.00	210.60	0.56	117.94
	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	11.85	4.00	84.80	1.56	147.89
Viga solera	Fleje guarda rueda	3/8	2.00	1.20	34.00	81.60	0.56	45.70
	Refuerzo longitudinal	5/8	2.00	8.60	6.00	76.20	1.56	123.55



GOVERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO

MAGDALENA

CONTRATANTE

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

FECHA

01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 8042 EN EL CORREIMIENTO DE APURE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA

CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

INTERVENIENTE

CONSORCIO INTER APURE

NT O.C.C.

801.774.287 - 1

NT O.C.C.

801.846.652

CONTRATO DE OBRA N°

1585 DEL 2023

ELABORÓ

CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

CAPÍTULO

CAP IV. OBRAS DE DRENAJE

ITEM

4.2

Suministro e instalación de acero de refuerzo $\varnothing=20$ kg/cm² para curcas, de acuerdo al tipo de obra.

UNID.

kg

UBICACIÓN

Via Chibolo - Apure

Muros	Refuerzo Transversal #1	3/4	2.00	5.35	60.00	642.00	2.25	1,444.50
	Refuerzo Transversal #2	3/4	2.00	5.35	60.00	642.00	2.25	1,444.50
	Refuerzo longitudinal	1/2	4.00	8.05	18.00	636.80	1.00	636.80
	Refuerzo longitudinal	1/2	4.00	2.90	16.00	105.60	1.00	105.60
	Refuerzo Transversal #3	3/4	2.00	7.35	60.00	832.00	2.25	1,864.50
	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	9.95	28.00	557.20	1.00	557.20
	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	2.90	28.00	162.40	1.00	162.40
	Refuerzo Transversal #3	3/4	2.00	7.35	60.00	832.00	2.25	1,864.50
	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	8.95	28.00	557.20	1.00	557.20
	Refuerzo longitudinal	1/2	2.00	2.90	28.00	162.40	1.00	162.40
Piso	Refuerzo Transversal #3	3/4	4.00	4.12	2.00	32.96	2.25	74.16
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.17	2.00	33.36	2.25	75.06
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.22	2.00	33.76	2.25	75.96
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.27	2.00	34.16	2.25	76.86
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.32	2.00	34.56	2.25	77.76
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.37	2.00	34.96	2.25	78.66
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.42	2.00	35.36	2.25	79.56
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.47	2.00	35.76	2.25	80.46
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.52	2.00	36.16	2.25	81.36
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.57	2.00	36.56	2.25	82.26
Tapa box	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.62	2.00	36.96	2.25	83.16
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.67	2.00	37.36	2.25	84.06
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.72	2.00	37.76	2.25	84.96
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.77	2.00	38.16	2.25	85.86
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.82	2.00	38.56	2.25	86.76
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.87	2.00	38.96	2.25	87.66
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.92	2.00	39.36	2.25	88.56
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	4.97	2.00	39.76	2.25	89.46
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.02	2.00	40.16	2.25	90.36
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.06	2.00	40.56	2.25	91.26
Muros Aléas	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.11	2.00	40.96	2.25	92.16
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.16	2.00	41.36	2.25	93.06
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.21	2.00	41.76	2.25	93.96
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.26	2.00	42.16	2.25	94.86
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.31	2.00	42.56	2.25	95.76
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.36	2.00	42.96	2.25	96.66
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.41	2.00	43.36	2.25	97.56
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.46	2.00	43.76	2.25	98.46
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.51	2.00	44.16	2.25	99.36
	Refuerzo vertical	3/4	4.00	5.56	2.00	44.56	2.25	100.26



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.852		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4.2	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para cunetas, alcantarillas tipo box culvert	UNID.	kg	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure			
		Solera aletas		Refuerzo vertical	3/4	4,00	5,23	2,00	41,84	2,25	94,14
				Refuerzo horizontal	1/2	2,00	12,00	32,00	768,00	1,00	768,00
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	12,00	2,00	48,00	2,25	108,00
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	1,62	2,00	6,48	2,25	14,58
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	12,00	2,00	48,00	2,25	108,00
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	1,30	2,00	5,20	2,25	11,70
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	11,62	2,00	47,28	2,25	106,38
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	11,41	2,00	45,64	2,25	102,69
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	11,01	2,00	44,04	2,25	99,09
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	10,60	2,00	42,40	2,25	95,40
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	10,20	2,00	40,80	2,25	91,60
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	9,80	2,00	39,20	2,25	88,20
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	9,39	2,00	37,56	2,25	84,51
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	8,99	2,00	35,96	2,25	80,91
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	8,58	2,00	34,32	2,25	77,22
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	8,18	2,00	32,72	2,25	73,62
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	7,78	2,00	31,12	2,25	70,02
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	7,37	2,00	29,48	2,25	66,33
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	6,97	2,00	27,88	2,25	62,73
				Refuerzo transversal	3/4	2,00	6,56	2,00	26,24	2,25	59,04
				Refuerzo horizontal	1/2	4,00	12,00	15,00	720,00	1,00	720,00
TOTAL										28.753,80	

Elaboró:
CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

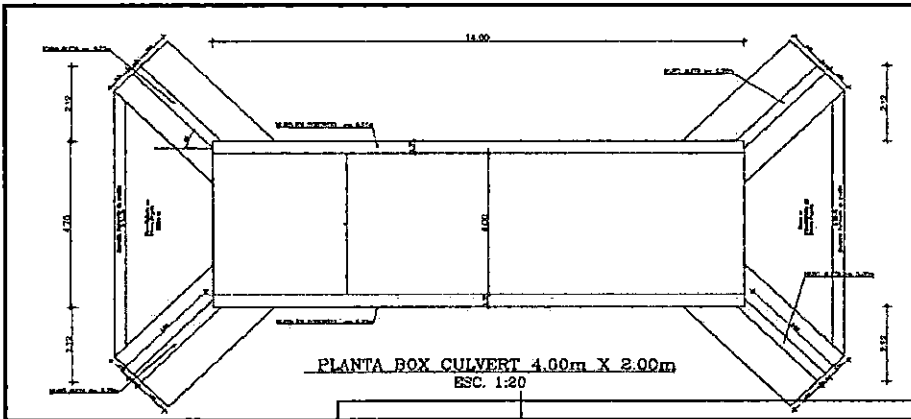


GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.846.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ITEM	4.3	Suministra y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
								
HITO 1 - (K0+000 - K2+000)								
Box Culvert 1.5m x 1.5m - K0+120								
Descripción		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)		
Concreto ciclopeo - Cuerpo box		12,00	2,10	0,30	1,00	7,56		
Concreto ciclopeo - Soleras		1,21	2,80	0,30	2,00	2,03		
Losa inferior		12,00	2,10	0,30	1,00	7,56		
Soleras		1,21	2,80	0,30	2,00	2,03		
Muros		12,00	1,50	0,30	2,00	10,80		
Losa superior		12,00	2,10	0,30	1,00	7,56		
Aletas		1,50	1,35	0,30	4,00	2,43		
Guardarueda		2,10	0,30	0,60	2,00	0,76		
Box Culvert 3m x 1.5m - K0+650								
Descripción		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)		
Concreto ciclopeo - Cuerpo box		12,00	3,60	0,30	1,00	12,96		
Concreto ciclopeo - Soleras		1,41	4,42	0,30	2,00	3,74		
Losa inferior		12,00	3,60	0,30	1,00	12,96		
Soleras		1,41	4,42	0,30	2,00	3,74		
Muros		12,00	1,50	0,30	2,00	10,80		
Losa superior		12,00	3,60	0,30	1,00	12,96		
Aletas		2,00	1,50	0,30	4,00	3,60		
Guardarueda		3,60	0,30	0,60	2,00	1,30		
Box Culvert 3m x 1.5m - K0+850								
Descripción		Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)		
Concreto ciclopeo - Cuerpo box		12,00	3,60	0,30	1,00	12,96		
Concreto ciclopeo - Soleras		1,41	4,42	0,30	2,00	3,74		
Losa inferior		12,00	3,60	0,30	1,00	12,96		
Soleras		1,41	4,42	0,30	2,00	3,74		
Muros		12,00	1,50	0,30	2,00	10,80		

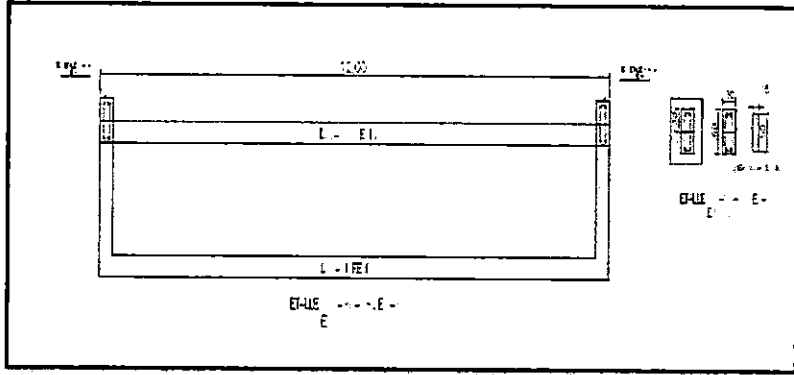



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,3	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert	UNID.	m3	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure			
					Los superior	12,00	3,60	0,30	1,00	12,96	
					Aletas	2,00	1,50	0,30	4,00	3,60	
					Guardarrueda	3,60	0,30	0,60	2,00	1,30	
					Box Culvert 6m x 4m - K1+430						
					Descripción	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)	
					placa de fondo	12,00	6,00	0,45	1,00	37,26	
					Placa Encofe y descofe	3,11	9,65	0,45	2,00	27,01	
					Muro box cuerpo	12,00	0,45	4,00	2,00	43,20	
					Aletas	4,50	0,30	3,88	4,00	20,93	
					Tapa box	12,00	6,00	0,45	1,00	37,26	
					Box Culvert 6m x 4m - K1+680						
					Descripción	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad (m)	Volumen (m³)	
					placa de fondo	12,00	6,00	0,45	1,00	37,26	
					Placa Encofe y descofe	3,11	9,65	0,45	2,00	27,01	
					Muro box cuerpo	12,00	0,45	4,00	2,00	43,20	
					Aletas	4,50	0,30	3,88	4,00	20,93	
					Tapa box	12,00	6,00	0,45	1,00	37,26	
					TOTAL						331,31

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

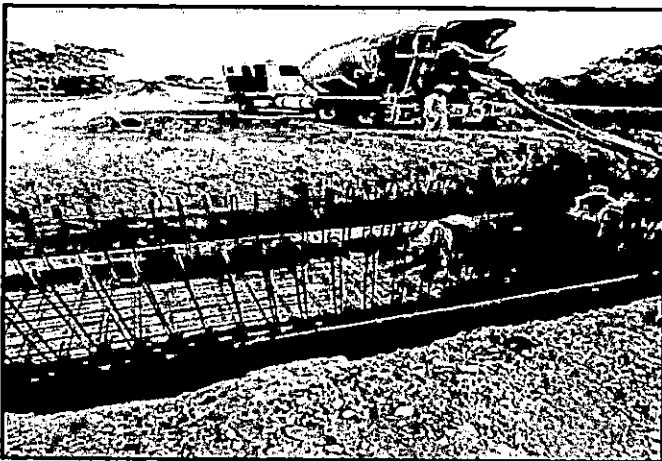


GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
		ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.848.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,4	Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert	UNID.	m	UBICACIÓN	Vía Chiboto - Apure		
				HITO 1 - (K0+000 - K2+000)						
				Box Culvert 6m x 4m - K1+430						
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad	Longitud total (m)
				Cinta PVC	K1+430	21,00	N/A	N/A	2,00	42,00
				Box Culvert 6m x 4m - K1+680						
				Cinta PVC	K1+680	21,00	N/A	N/A	2,00	42,00
				Box Culvert 1.5m x 1.5m - K0+120						
				Cinta PVC	K0+120	15,00	N/A	N/A	2,00	30,00
				Box Culvert 3m x 1.5m - K0+680						
				Cinta PVC	K0+680	16,00	N/A	N/A	2,00	32,00
				Box Culvert 3m x 1.5m - K0+950						
				Cinta PVC	K0+950	16,00	N/A	N/A	2,00	32,00
				TOTAL						

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP IV: OBRAS DE DRENAJE	ÍTEM	4,5	Suministro e instalación de geodren para laterales de box culvert, incluye tubería perforada en PVC D = 8"	UNID.	m	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure			
					HITO 1 - (K0+000 - K2+000)						
					Box Culvert 6m x 4m - K1+430						
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espeor (m)	Cantidad	Longitud total (m)
					Geodren	K1+430	21,00	N/A	N/A	2,00	42,00
					Box Culvert 6m x 4m - K1+680						
					Geodren	K1+680	21,00	N/A	N/A	2,00	42,00
					Box Culvert 1,5m x 1,5m - K0+120						
					Cinta PVC	K0+120	15,00	N/A	N/A	2,00	30,00
					Box Culvert 3m x 1,5m - K0+680						
					Cinta PVC	K0+680	16,00	N/A	N/A	2,00	32,00
					Box Culvert 3m x 1,5m - K0+950						
					Cinta PVC	K0+950	16,00	N/A	N/A	2,00	32,00
					TOTAL:						178,00

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE



Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA	ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	01 de Junio del 2025 al 24 de julio del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652					
CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE	ITEM	6.2	Suministro e instalación de tacha reflectiva	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Cantidad por línea	Cantidad	
		HITO 4 - (K2+000 - K4+000)						
		Tacha reflectiva	K2+000,00 K4+000,00	2.000,00	167,00	3,0	501,00	
		HITO 5 - (K4+000 - K6+000)						
		Tacha reflectiva	K4+000,00 K6+000,00	2.000,00	167,00	3,0	501,00	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
TOTAL						1.002,00		
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA		Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA						



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.287 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.846.652		

[illegible]

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APIURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

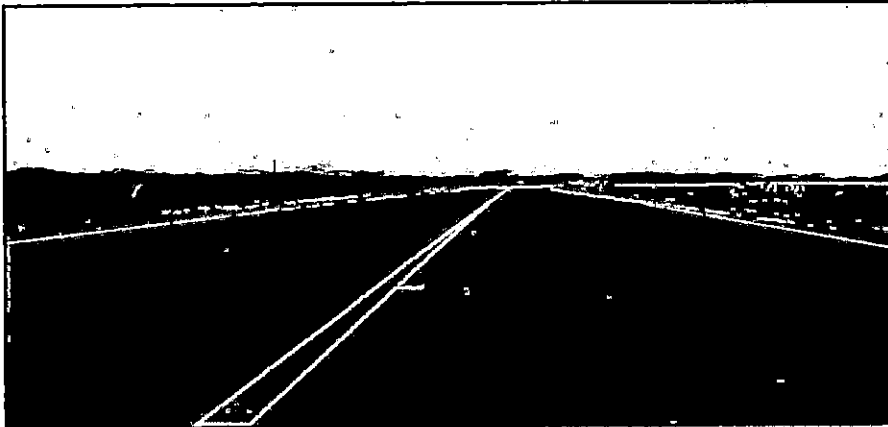
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025

ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA
---------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE	ÍTEM	6,5	Suministro e instalación de poste de kilometraje	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure						
														
									Descripción	Localización		Longitud (m)	Cantidad	Total (Unidad)
									HITO 4 - (K2+000 - K4+000)					
									Poste de kilometraje	K2+000,00	K4+000,00	2.000,00	2,00	2,00
									HITO 6 - (K4+000 - K6+000)					
									Poste de kilometraje	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	2,00	2,00
TOTAL						4,00								

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

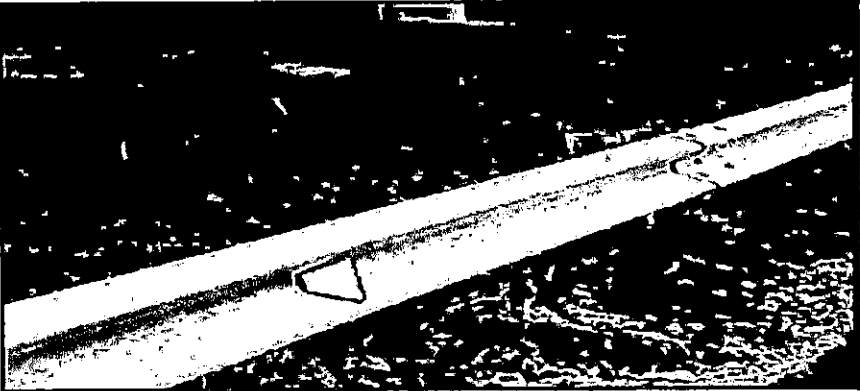

Firma
JAIR ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena


DEPARTAMENTO	MAGDALENA							
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652					
CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE	ÍTEM	8.7	Suministro e instalación de defensa metálica	UNID.	m	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Longitud (m)		
		HITO 4 - (K2+000 - K4+000)						
		Defensa metálica	K2+000,00 K4+000,00	385,00	1,00	385,00		
		HITO 6 - (K4+000 - K8+000)						
		Defensa metálica	K4+000,00 K8+000,00	385,00	1,00	385,00		
TOTAL						770,00		
Elaboró: CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA		Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA						



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA		
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.287 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE	ITEM	8.8	Suministro e instalación de captafaros	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibola - Apure			
				Descripción	Localización		Longitud (m)	Cantidad	Cantidad		
				HITO 4 - (K2+000 - K4+000)							
				Captafaros	K2+000,00	K4+000,00	2.000,00	52,00	52,00		
				HITO 5 - (K4+000 - K6+000)							
				Captafaros	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	52,00	52,00		
TOTAL							104,00				

Elaboró:
CONSORCIO MAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ACVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTERAPURE

JAIR O ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA				
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.848.652		

CAPÍTULO	CAP VI: SEÑALIZACION PERMANENTE	ITEM	8,9	Suministro e instalación de Señal preventiva Delineador de curva SP-75	UNID.	und	UBICACIÓN	Via Chibolo - Apure	
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Cantidad	Longitud (m)
					HITO 4 - (K2+000 - K4+000)				
					SP-75	K2+000,00 K4+000,00	2.000,00	43,00	43,00
					HITO 5 - (K4+000 - K6+000)				
					SP-75	K4+000,00 K6+000,00	2.000,00	43,00	43,00
				TOTAL					86,00

Elaboró:
CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

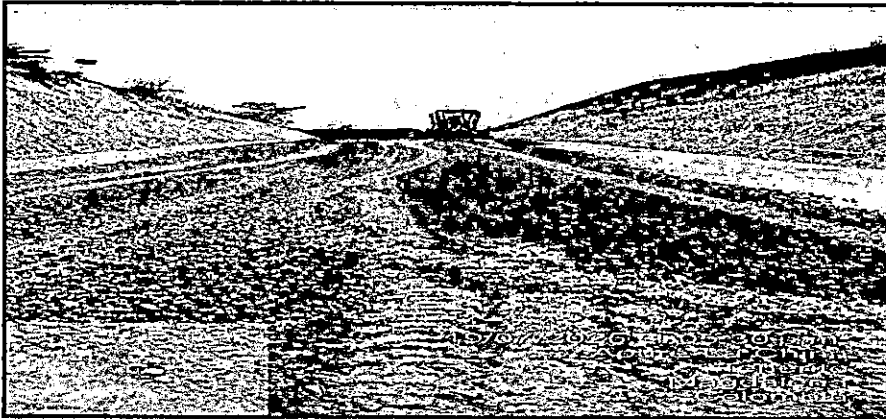

Firma
JAIR O ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
Vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA							
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025							
ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652					
CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ITEM	NP-01	Suministro y colocación de relleno con material seleccionado de acuerdo con norma INVIAS	UNID.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
		HITO 24 - (K0+000 - K2+000)						
		Mejoramiento	K0+000,00 K2+000,00	2.000,00	5,30	0,35	3.661,06	
TOTAL						3.661,06		
<div>Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA  Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA</div> <div>Aprobó: CONSORCIO INTER APURE  Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div>								



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


CONSORCIO
vías universal Magdalena

DEPARTAMENTO	MAGDALENA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025

ELABORÓ: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O.C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1588 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O.C.C.	901.846.652		

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ITEM	NP-02	Suministro y colocación de Geomalla para sobreanchos de vía	UNID.	m2	UBICACIÓN		Vía Chibolo - Apure	
HITO 25 - (K0+000 - K2+000)										
Descripción	Localización		Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)				
Geomalla	K0+000,00	K2+000,00	2.000,00	2,00	N/A	4.000,00				



DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	ELABORÓ CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	801.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	801.846.852		

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ÍTEM	NP-03	Suministro y compactación del material granular requerido para la conformación de los sobreanchos de la vía	UNID.	m3	UBICACIÓN	Vía Chibolo - Apure				
				Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)			
				HITO 26 - (K0+000 - K2+000)								
				Subbase granular	K0+000,00	K2+000,00	2.000,00	1,50	0,25	750,00		
				Base granular	K0+000,00	K2+000,00	2.000,00	0,70	0,15	210,00		
TOTAL						960,00						

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA							
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA							
FECHA	01 de Junio del 2025 al 24 de julio del 2025							
ELABORÓ	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA	NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°	1586 DEL 2023			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE	NIT O C.C.	901.846.652					
CAPITULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ITEM	NP-04	Suministro y colocación de sobrecarpeta Asfáltica (2.5 cm)	UNID.			
				m3	UBICACIÓN			
				Via Chibolo - Apure				
		Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
		HITO 32 - (K2+000 - K4+000)						
		Carpeta asfáltica	K2+000,00	K4+000,00	2.000,00	9,30	0,025	485,00
		HITO 37 - (K4+000 - K6+000)						
		Carpeta asfáltica	K4+000,00	K6+000,00	2.000,00	9,30	0,025	465,00
TOTAL						930,00		
Elaboró: CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA Firma JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA DIRECTOR DE OBRA								
Aprobó: CONSORCIO INTER APURE Firma JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA DIRECTOR DE INTERVENTORIA								



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES



DEPARTAMENTO	MAGDALENA							
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		ELABORÓ		CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA			
FECHA	01 de junio del 2025 al 24 de julio del 2025							
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 60-02 EN EL CORREGIMIENTO DE APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.							
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA		NIT O C.C.	901.774.297 - 1	CONTRATO DE OBRA N°		1588 DEL 2023	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER APURE		NIT O C.C.	901.846.652				

CAPÍTULO	CAP VI: HITOS NO PREVISTOS	ITEM	NP-05	Suministro e instalación de Box culvert prefabricado 1m x 1m	UNID.	und	UBICACIÓN		Via Chibolo - Apure	
					Descripción	Localización	Longitud (m)	Ancho Prom (m)	Espesor (m)	Cantidad
					HITO 48 - (K8+000 - K10+000)					
					Box Culvert	K8+270	N/A	N/A	N/A	1,00
					Box Culvert	K9+500	N/A	N/A	N/A	1,00
					TOTAL					2,00

Firma
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:
CONSORCIO INTER APURE

Firma
JAIRO ENRIQUE RUIZ MOLINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
