Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **18** PERIODO: **26/04/2021** **al** **2/05/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			5,12%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR.2071522		
VALOR INICIAL:	$	41.888.000,00		VALOR INICIAL:	$	818.871.366,16	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**41.888.000,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**818.871.366,16**	
PLAZO INICIAL:	**6 meses**			PLAZO INICIAL:	**6 meses**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**			PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**			FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**			FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**		
VALOR EJECUTADO:	**$**	**16.016.287,57**	**38,24%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**313.103.497,01**	**38,24%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**25.871.712,43**	**61,76%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**505.767.869,15**	**61,76%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

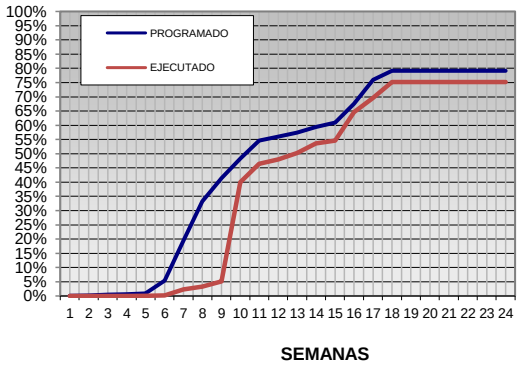
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	76,00%	69,70%	6,30%
Acumulado presente semana	79,16%	75,20%	3,96%
Acumulado Actual	79,16%	75,20%	-3,96%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	122	59,00	-7,17

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Item 1,1 Desmonte de salidas de tomacorrientes existentes, voz y datos.	100%	Desmonte de salidas de tomacorrientes existentes, voz y datos.	80%

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	Consejo Superior de la Judicatura

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **18** PERIODO: **26/04/2021** **al** **2/05/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

Item 2,1 tendido de cable 1/0 x 3 Fases - 1 linea 1/0 Neutro - 1 linea 4 AWG Tierra	100%	tendido de cable 1/0 x 3 Fases - 1 linea 1/0 Neutro - 1 linea 4 AWG Tierra	35%
Item 2,3 canalización subterranea para ductos de 2"	100%	Suministro e instalacion de canalizacion subterranea ducto PVC de 2" incluye excavacion y relleno	100,00%
Item 2,4 Tablero electrico de distribución 24 circuitos	100%	Suministro e instalacion tablero electrico de distribucion de 24 circuitos trifasico, en lamina galvanizada en caliente , con acabado en pintura de polvo, expuesto, con espacio para totalizador, para interruptor enchufable, 5 hilos(1) barraje para tierra 1 para neutro, con puerta y chapa, color gris el tablero debe cumplir RETIE, barraje de 206amp, 208v, incluye todos los elementos y accesorios para su adecuada instalacion y fijacion (pernos expansivo) y marcacion con placa en acrilico.	35,00%
Item 2,8 Tablero general (solo suministro)	100%	Suministro e instalación de sub-tablero eléctrico de baja tensión (tg-bt) tipo intemperie certificado, elaborado en lamina galvanizada. según diagrama unifilar, incluye: celda de baja tensión, con las protecciones y capacidades de interrupción mostrada en planos, barrajes,breakers totalizadores a tableros y todos los demás materiales y elementos que hacen parte de la misma.	40,00%
item 3,1 Instalacion de tuberia PVC de 1/2" SCH40 para luminarias de emergencia	100,00%	Suministro e instalación de salida para iluminación en tubería PVC 1/2" SCH 40 empotrada y conductor n. 12 Awg Libre de halogenos. Incluye accesorios PVC, tomacorriente doble 20A, conectores de resorte	95,00%
Item 3,4 Salida electrica para interruptor sencillo 120v	100%	Salida electrica para interruptor sencillo 120v.uso interior.15a empotrado en tuberia pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opacos 1xn12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tuberia PVC 1/2" SCH40	97,00%
Item 3,5 Salida electrica para interruptor doble 120v	100%	Salida electrica para interruptor doble 120v.uso interior.15a expuesto en tuberia pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opacos 1xn12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tuberia PVC 1/2" SCH40	97,00%
Item 3,6 Salida electrica para interruptor triple 120v	100%	Salida electrica para interruptor triple 120v.uso interior.15a expuesto en tuberia pvc 1/2" SCH40 INCLUYE 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opacos 1xn12awg. Caja pvc 2"x4". Aparato con tapa, conectores tipo resorte y accesorios incluye tuberia PVC 1/2" SCH40	90,00%
Item 3,8 salida electrica para condensadora en tuberia PVC de 3/4"	100%	Salida electrica para condensadora en tuberia PVC de 3/4"	95,00%
Item 3,9 Lamparas led de 60x60 de 45 Vatios	100%	Suministro e Instalacion de Lamparas Tipo Led hermetica de 60x60 de 45w para uso interior, incluye tubos , incluye clavija y cinta de marcacion	100,00%
Item 3,10 Suministro e Instalacion de Lamparas Tipo Led hermetica 2x18w	100%	Suministro e instalacion de lamparas tipo LED hermetica2x18w	100,00%
Item 3,11 Iluminacion de emergencia	100%	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo aplique con 90 minutos de autonomía, incluye clavija y cintas de marcación	95,00%
Item 3,12 Aviso de salida Luminoso	100%	Suministro e instalación de luminaria de avisos luminosos con 90 minutos de autonomía, incluye clavija y cintas de marcación.	95,00%
Item 3,13 Ramales cable calibre 12 AWG	100%	Suministro e instalación de circuito ramal en tubería PVC 3/4" SCH y conductor 3xn. 12 Awg. Libre de Halogenos. incluye accesorios PVC.	11,00%
Item 6,1 generador (planta electrica)	100%	Suministro e instalacion de grupo electrogeno de 400W, incluye silenciador de absorcion directa de 2 pulgada	100,00%
NP-6 alimentación trifasica para tableros regulados 4 lineas nº6 - 1 linea nº8	100%	Alimentador trifásico tablero de baja tensión Rregulados en cable de cobre suave libre de halógenos y baja emisión de humos opacos, calibre 3xn 6 por fase + 1n°6 para neutro y 1n°8awg para la tierra.	35,00%

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	Consejo Superior de la Judicatura

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **18** PERIODO: **26/04/2021** **al** **2/05/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

NP-7(No previsto) Suministro e intalacion de canaleta Metalica 15x15	100%	Suministro e intalacion de canaleta Metalica 15x5 Se Compro el 100% solo compra	76,00%
NP-8(No previsto) Bandeja electrocincada portacables	100%	Suministro e instalacion de Bandeja Electrocincada 30x10CMx1 mt se compro el 100% solo suministro	109% según cantidades
NP-9(No previsto) Suministro e instalación de troquel doble	100%	Suministro e instalacion de troquel metlico doble liso 12cm color blanco	104% llevamos 10 troqueles de mas
NP-11(No previstos) Tomacorrientes GFCI para baños		Salida electrica para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 125v, 20A en caja PVC 2x4, con todos sus accesorios	37,00%
NP-13(No previsto) Corte y Demolicion de Pavimento y retiro de escombro	100%	Corte y Demolicion de Pavimento y retiro de escombro	100,00%
NP-15(No previsto) Registro de baja tensión de 60x60	100%	Registro de baja tensión de 60x60	100% mas 2 cajas adicionales
NP-16(No previsto) Tomacorriente normal en canaleta	100%	Salida electrica para toma corriente doble con polo a tierra color blanco, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2*4, incluye 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tuberia pvc 1/2" SCH40 placa y ac BLANCO	92,00%
NP-17(No previsto) Tomacorrientes regulados en canaleta	100%	Salida electrica para toma regulado doble con polo a tierra color naranja, en canaleta, 125v.20a en caja PVC 2*4, incluye 3m de cable de cobre libre de halogeno y humo opaco 1n 10awg, aparato, conectores tipo resorte en tuberia pvc 1/2" SCH40 placa y ac naranja	98,00%
		Se informa que se lleva un atraso del 3,96%. Este atraso se debe a que hay actividades no previstas que se debe de incluir en la programacion de obra, y asi poder actualizar la programacion a las condiciones actuales.	

DIRECTOR DE INTERVENTORIA Ing. FABIO MEJIA MEDINA



Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	


1. INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No. **18** PERIODO: **26/04/2021** **al** **2/05/2021**


OBJETO


"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".


REGISTRO FOTOGRAFICO





SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRAFICO
