INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Arq. Mauricio Baquero
Apoyo a la Supervisión Contrato Interventoría CO1.PCCNTR.228159
Ciudad.

Ref: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera al contrato de ejecución de las obras para la primera infancia en el colegio san francisco sede a – cpf – 1964, ubicado en la localidad de ciudad bolívar, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la sed.

Cordial saludo:

A continuación se hace entrega del informe No. 5 de obra y de interventoría del contrato para la *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A – CPF – 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.*


Cordialmente,

Arq. EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO
Director Interventoría
INPLAYCO S.A.S.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE "A"
BOGOTÁ D.C.


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A – CPF – 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

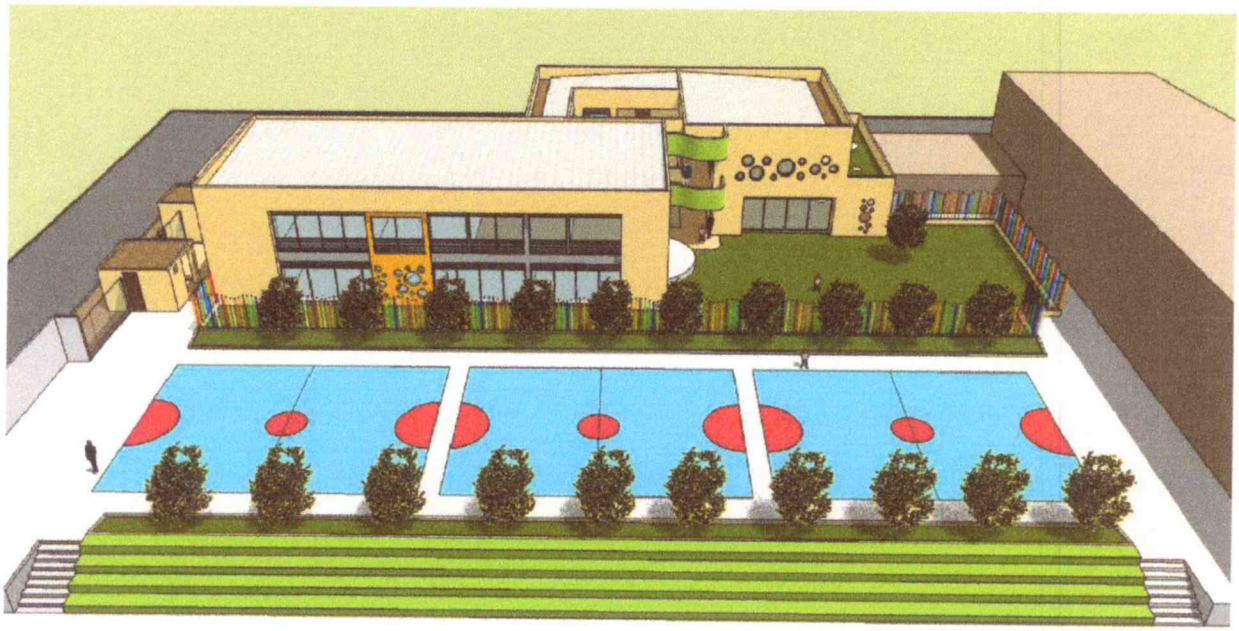

INFORME MENSUAL 005 **ABRIL 2018 / MAYO 2018**

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SITIO

Localización General

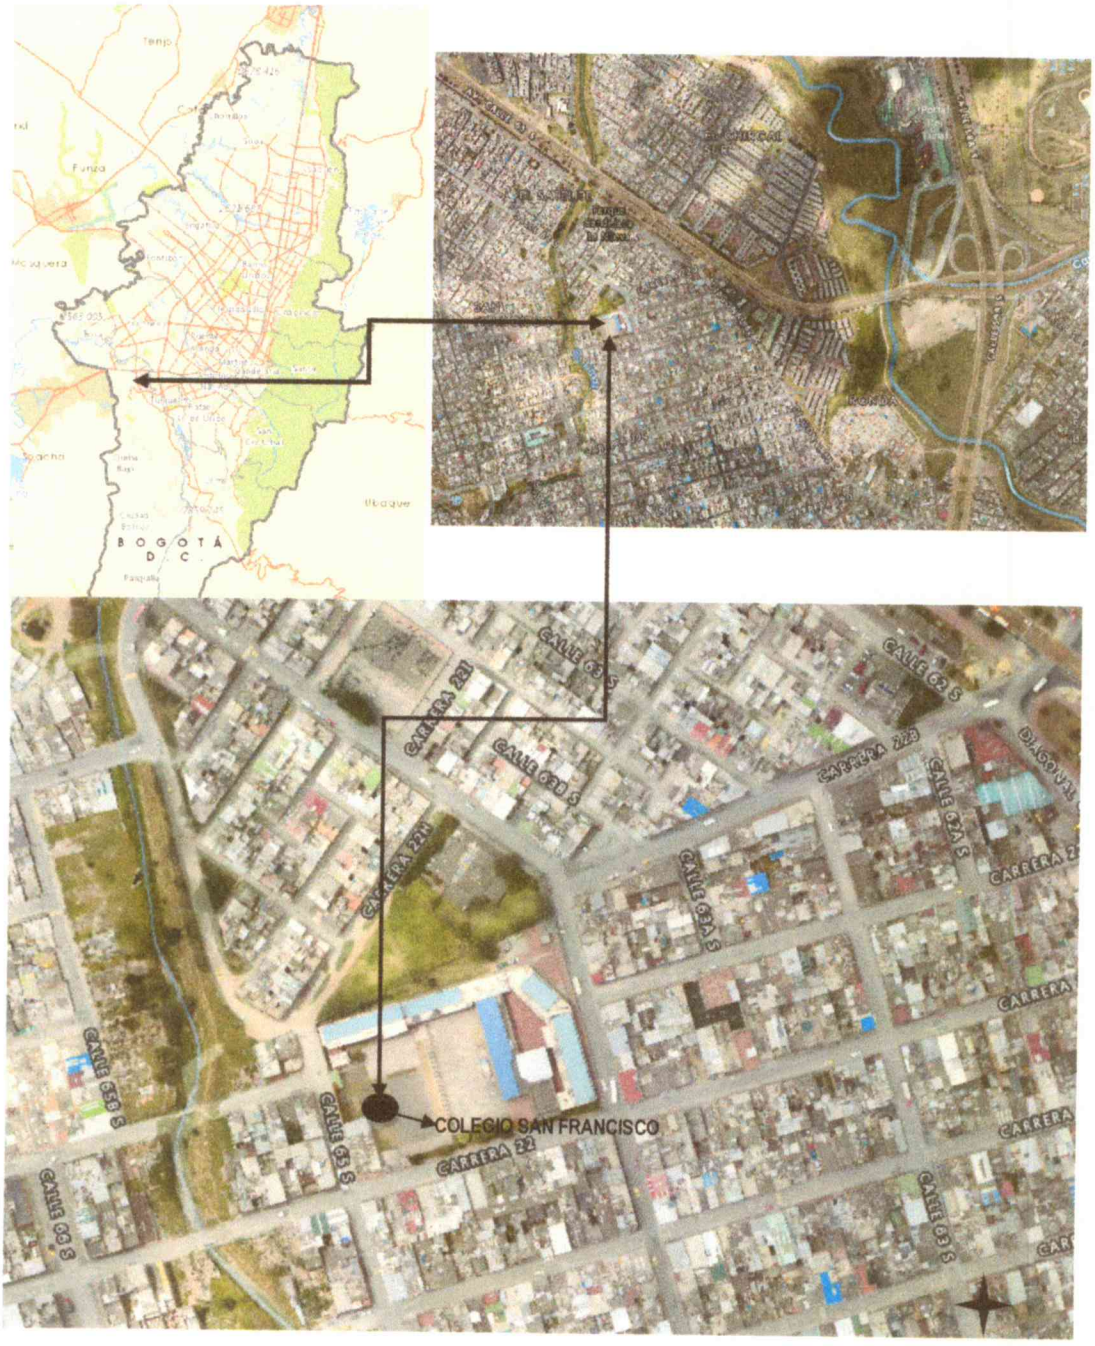

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION	INPLAYCO S.A.S.

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA	CONSORCIO PLT ANGULO
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.226345
PLAZO EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2018
VALOR INCIAL:	$2.899.054.705.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	INPLAYCO S.A.S
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.228159
PLAZO EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2018
VALOR INCIAL:	$287.947.037.00

LINDERACION	
NORTE	PREDIO SDE
SUR	CARRERA 22
ESTE	CALLE 64 S
OESTE	CALLE 65 S

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

TABLA DE CONTENIDO

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SITIO 2
LOCALIZACIÓN GENERAL 2

1 INTRODUCCIÓN 5
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
1.2 ALCANCE DEL CONTRATO 7
1.3 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
1.4 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 7
1.5 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 8

2 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 8

3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
3.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
3.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
3.4 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 13
3.5 RELACIÓN DE EQUIPO 13
3.6 ACTIVIDADES DEL LA INTERVENTORÍA 13
3.7 ACTIVIDADES TÉCNICAS 13
3.8 ACTIVIDADES DE CAMPO 14
3.9 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
3.10 ACTIVIDADES AMBIENTALES 14

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

1 INTRODUCCIÓN

Presentamos a continuación el informe mensual número uno (4) comprendido del 18 de ABRIL de 2018 al 18 de MAYO de 2018, que describe el avance de ejecución de la obra del contrato para la *EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED. Cuyo contratista es el CONSORCIO PLT ANGULO.*

A este proyecto se le realiza la interventoría mediante Contrato de *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A – CPF – 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.* Cuyo contratista es INPLAYCO S.A.S.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Contrato de obra: No. C01.PCCNTR 226345 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Contratista: CONSORCIO PLT ANGULO

Objeto del contrato:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED. Cuyo contratista es el CONSORCIO PLT ANGULO.

Plazo de ejecución: SEIS (6) meses

Fecha de Inicio del contrato: *Dieciocho (18) de diciembre de 2017*

Fecha de Terminación: *Diecisiete (17) de junio de 2017*

Valor del contrato: $ 2.899.054.705.00

Valor del anticipo: $__579.810.941.00

Amparo	Valor	Vigencia	Compañía de seguros
a) CUMPLIMIENTO – BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	579.810.941.00	15-05-2018	ALLIANZ SEGUROS S.A
b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	579.810.941.00	15-11-2018	ALLIANZ SEGUROS S.A
c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	579.810.941.00	15-05-2023	ALLIANZ SEGUROS S.A
d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	289.905.470.50	15-05-2021	ALLIANZ SEGUROS S.A

1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

La consultoría fue elaborada por la firma JARDINES FACOG, entregada a la secretaría de educación Distrital en el año 2015. Se compone de: ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE OBRA Y APU, PRESUPUESTO OFICIAL Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.

El área a intervenir se compone de aulas y servicios para atención a la primera infancia del colegio SAN FRANCISCO SEDE A dentro de la planta física existente del colegio ya consolidada, que alberga nueve aulas de clase, ludoteca, cocina, comedor, administrativos y áreas de recreación[1].

1.3 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Las actas legales suscritas a la fecha son las siguientes:

No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	18-12-2017
2	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LC 15-3-0310 – RESOLUCIÓN PRORROGA 17-3-0965 DEL 28 DE JULIO 2017-	20 JUNIO 2018

1.4 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Las actas financieras suscritas por el contratista son las siguientes:

No. De Acta	Mes	Valor
001	DICIEMBRE 2017 ENERO 2018	$36.089.680.83
002	ENERO 2018 FEBRERO 2018	$234.245.947.31
003	FEBRERO 2018 MARZO 2018	$363.782.225.59
004	MARZO 2018 ABRIL 2018	$705.239.636.30

[1] Pliego de condiciones, licitación pública _No. SED.LP DCCEE-113-201

1.5 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal adscrito al proyecto se encuentra relacionado en los informes semanales presentados por la interventoría.

2 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades teniendo presente que cada una de ellas contempla un porcentaje de avance diferente :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDADES EJECUTADAS	AVANCE DE EJECUCIÓN
2.01.03	Relleno (Base En Recebo Compactado)	M3	93.00	100%
2.01.06	Concreto De 4.000 P.S.I. Para Vigas de cimentacion, Incluye suministro, transporte y vaciado del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección.	M3	1.05	100%
3.00.00	ESTRUCTURA EN CONCRETO			
3.01.13	Escaleras Principal Y De Emergencias En Concreto De 3.000 P.S.I.	M3	1.56	100%
9.01.00	REDES DE DESAGÜES			
9.01.18	Sumidero transversal en concreto (0.4mx0.45m) - Incluye rejilla	ML	47.00	100%
9.01.20	Excavación en tierra entre 0 - 2 metros (incluye retiro)	M3	94.56	100%
9.02.03	RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA			
9.02.03.02	Tubería PVCP 2"	ML	15.00	100%
9.02.03.03	Tubería PVCP 1.1/2"	ML	48.00	100%
9.02.03.05	Tubería PVCP 1"	ML	31.00	100%
9.02.03.06	Tubería PVCP 3/4"	ML	42.00	100%
9.02.03.07	Tubería PVCP 1/2"	ML	91.00	100%
9.02.03.10	Registro de paso directo 1" Tipo Bola	UN	1.00	100%
9.02.03.11	Registro de paso directo 3/4" Tipo Bola	UN	6.00	100%
9.02.03.12	Registro de paso directo 1/2" Tipo Bola	UN	18.00	100%
9.02.03.13	Cajillas plásticas para registros 0.25 x 0.25	UN	25.00	100%
9.02.04	PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA			
9.02.04.01	Punto Hidráulico - Lavamanos	UN	25.00	100%
9.02.04.04	Punto Hidráulico - Sanitario de Push	UN	13.00	100%
9.02.04.05	Punto Hidráulico - Orinal de push	UN	1.00	100%
9.02.04.06	Punto Hidráulico - Ducha	UN	5.00	100%
9.02.04.07	Punto Hidráulico - Llaves para manguera 1/2"	UN	1.00	100%
9.05.00	RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE			
9.05.01	Suministro e Instalación de Tubería CPVC 3/4"	ML	18.00	100%
9.05.02	Suministro e Instalación de Tubería CPVC 1/2"	ML	43.00	100%
9.05.04	Registro de paso directo 1/2" Tipo Bola	UN	6.00	100%
9.05.05	Cajillas plásticas para registros 0.25 x 0.25	UN	6.00	100%
10.01.00	REDES DE TUBERIAS EN ACERO CON COSTURA			
10.01.01	Tubería acero SCH 10 4" (Ranurada)	ML	75.00	100%
10.01.04	Tubería acero SCH 10 2" (Ranurada)	ML	220.00	100%
10.01.05	Tubería acero SCH 40 1.1/2" (Ranurada)	ML	102.00	100%
10.01.06	Tubería acero SCH 40 1" (Roscada)	ML	66.00	100%
10.02.00	ACCESORIOS RANURADOS			
10.02.01	Accesorios ranurados 4"	UN	16.00	100%
10.02.02	Accesorios ranurados 2"	UN	174.00	100%
10.02.03	Accesorios ranurados 1 1/2"	UN	84.00	100%
10.02.04	Accesorios ranurados 1"	UN	46.00	100%
10.09.00	PINTURA REDES SISTEMA CONTRA INCENDIO			
10.09.01	Pintura Incendio	ML	498.00	100%
11.00.00	MAMPOSTERIA Y ENCHAPES			
				100%
11.01.05	Anclaje epoxico con refuerzo en varilla de 1/2" x 1.20 mt	UN	77.00	100%
12.00.00	CUBIERTA			
12.01.03	Estructura metálica para cubierta	KG	1,140.00	100%
13.00.00	PISOS BASES Y ACABADOS			
13.01.01	Afinado Impermeabilizado Para Pisos E = 0.03	M2	56.00	100%
13.01.04	Piso en Baldosa institucional grano marmol P2 fondo blanco 30cms X 30cms incluye destroncado, pulida y brillado	M2	287.00	100%
17.00.00	URBANISMO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES			
17.01.07	PLACA DE CONTRAPISO e=0.1 CONCRETO DE 4000 PSI INCLUYE PENDIENTADO, CORTE Y LLENADO DE JUNTAS DE DILATACION	M2	104.01	100%
AD				
20.5.6	CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e instalación, Incluye 3 cm mortero 1:5)	ML	47.71	100%
AD	Tubería PVCP 3"	ML	46.64	100%
AD	Vigueta Intermedial Muro	ML	100.63	100%
AD	Columnetas	ML	118.80	100%
AD	Cerramiento de tubo agua negra de 2" cal 1,5 mm con tapa superior en lamina, platina inferior de 3*3/16 para alnclaje en viga de concreto, pintura anticorrosivo y esmalte sintetico. Altura variable (1,6-1,8) según diseño y separación de tubos 10cms . Incluye excavación y muro soporte en concreto.	ML	8.70	100%

Fuente_ informe PLT ANGULO

Para este corte se realizaron periódicamente los comités internos de obra los días martes, con la presencia de los representantes del Consorcio, la Interventoría, la Secretaría Distrital de Educación, Asesores por parte del contratista, Asesores por parte de la interventoría en los que se realizaron diferentes observaciones por parte de cada uno de los participantes en el mismo, se analizó el estado actual de la Obra , los retraso que presenta , acciones a seguir para mejorar el rendimiento y avance de Obra, se pactaron compromisos a cumplir por parte de cada uno de los directamente involucrados en el proyecto y se tomaron decisiones importantes. Lo anteriormente indicado quedó consignado en las respectivas actas que se realizaron y en el libro de obra.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de interventoría: C01.PCCNTR.228159 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

Contratista: INPLAYCO S.A.S

Objeto del contrato:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A – CPF – 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses

Fecha de Inicio del contrato: Catorce (14) de diciembre de 2017

Fecha de Terminación: Trece (13) de julio de 2018

Valor del contrato: $ 287.947.037.00

Amparo	Valor	Vigencia	Compañía de seguros
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	57.589.407.40	13-01-2019	SEGUROS DEL ESTADO
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14.397.351.85	14-07-2021	SEGUROS DEL ESTADO
c) CALIDAD DEL SERVICIO	57.589.407.40	14-07-2023	SEGUROS DEL ESTADO

3.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las actas legales suscritas a la fecha son las siguientes:

No.	OBJETO	FECHA
1	Acta de inicio contrato de obra	14-12-2017

3.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las actas financieras suscritas por la interventoría son las siguientes:

No. de Acta	Mes	Valor
001	DICIEMBRE 2017 ENERO 2018	$12.340.587
002	DICIEMBRE 2017 ENERO 2018	$ 2.142.325
003	ENERO 2018 FEBRERO 2018	$12.340.587
004	ENERO 2018 FEBRERO 2018	$13.959.672
005	FEBRERO 2018 MARZO 2018	$12.340.587
006	FEBRERO 2018 MARZO 2018	$21.751.519
007	MARZO 2018 ABRIL 2018	$12.340.587
008	MARZO 2018 ABRIL 2018	$42.034.508

3.4 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO
ARQ. EDGAR ROA	DIRECTOR INTERVENTORÍA
ARQ. MÓNICA PÉREZ- ARQ. JHON SALAS	RESIDENTE INTERVENTORÍA
ING. ALFREDO RODRÍGUEZ	ASESOR ESTRUCTURAL
ING. HERNANDO GÓMEZ	ASESOR GEOTECNIA
ING. CARLOS PERALTA	ASESOR REDES HIDRO-SANITARIAS, GAS Y CONTRA INCENDIO
ING. JUAN CARLOS RIVERA	ASESOR REDES ELÉCTRICAS VOZ Y DATOS
ING. ALEJO QUINTERO RUBIO	ASESOR AMBIENTAL
ING. FELIPE MARÍN	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
ASTRID ALEJANDRA PÁEZ	PROFESIONAL ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
ING. JESSICA CAROLINA ÁLVAREZ	INSPECTOR INTERVENTORÍA
TP. LUIS AUGUSTO SANDOVAL	TOPÓGRAFO
ABG. LENNART MAURICIO CASTRO	ASESOR JURÍDICO

3.5 RELACIÓN DE EQUIPO

Durante el periodo comprendido entre el 18 de ABRIL de 2018 y el 18 de MAYO de 2018 contó con los siguientes equipos:

- Oficina central ubicada en la carrera 16 a 82 13 Of 201
- Oficina satélite ubicada en el campamento de obra del Colegio San Francisco
- Computador y Scanner e impresora en obra y oficina
- Comunicación celular fija y email con la oficina central

3.6 ACTIVIDADES DEL LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido entre el 18 de MARZO de 2018 y el 18 de ABRIL de 2018 se realizó las siguientes actividades.

3.7 ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Redes de desagües, hidráulicas y de incendio
- Puntos sanitarios y cajas

- Redes eléctricas y cableado de acuerdo al RETIE.
- Mampostería y enchapes
- Cubierta
- Acabados generales
- Puesta en marcha equipos
- Obra gris
- Obra blanca

3.8 ACTIVIDADES DE CAMPO

- Se realizan en los comités visitas directa a la obra para verificar su adelanto al igual que aclarar inquietudes.
- Seguimiento del componente social en coordinación con la comunidad y con la institución educativa.
- Se realizan comités con las directivas del colegio para entregar avance del proyecto y solucionar inquietudes.
-

3.9 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• Se realizó reuniones de comité en las instalaciones del Colegio San Francisco como en la Secretaría Distrital de Educación, en estas reuniones se realizaron recorridos, se verifico documentación y se verifico las condiciones actuales de la obra.

Así mismo se estable las acciones a seguir para recuperar tiempos de atraso generados por la ola invernal.

3.10 ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se llevan estrategias ambientales de reciclaje y manejo de residuos al igual que capacitaciones al personal de obra.
- Se contrala y se ajustan las actividades tendientes a minimizar los impactos por elementos particulados en la obra.

Cordialmente:

Arq. EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO
Director Interventoría
INPLAYCO S.A.S.

INFORME TÉCNICO

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION


INFORME MENSUAL 05 DE INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS E	CONTRATO DE OBRA No.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	$ 2.899.054.705,00	C01PCCNTR226345 del 15 de noviembre de 2017
	VALOR DEL CONTRATO (COSTOS DIRECTOS)	
	$ 2.152.230.864,00	
	VALOR CONTRATO MES 05	
	$ 557.359.729,00	

INFOMRE MENSUAL	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
5	18	4	2018	18	5	2018

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE	DÍAS DE RETRASO
DÍAS	181,00	143,00	38,00	24
PORCENTUAL	100%	79,01%	20,99%	13,47%

DINERO INVERTIDO EN OBRA			PORCENTAJE EJECUTADO VS PROGRAMADO			
UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	EJECUTADO
VALOR PARA EL MES COSTO DIRECTOS	$ 557.359.729,00	$ 267.434.047,00	PORCENTAJE SEMANAL	%	25,90%	12,43%
			$ 267.434.047,00			12,43%

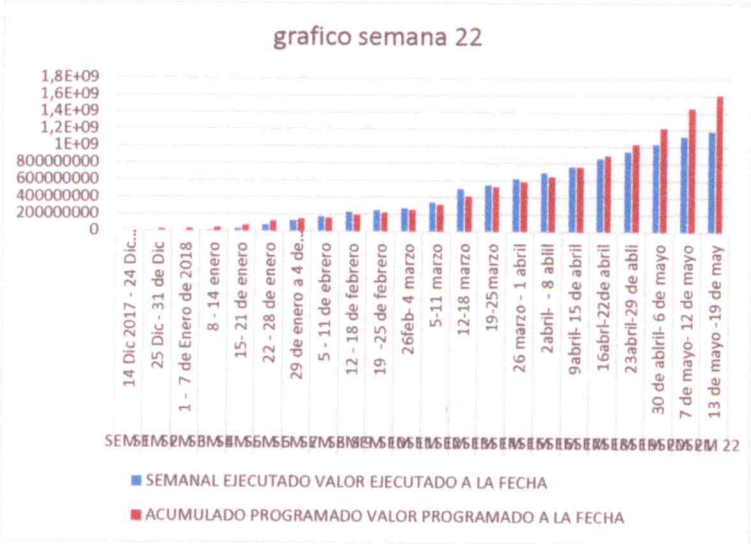



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION INFORME MENSUAL 05 DE INTERVENTORIA	INPLAYCO S.A.

SEMANA 18
MONTAJE TABLETA TEATRO : Piso tablon granito de marmol;se instala la tableta de forma adecuada sobre el alistado de pisos con su respectivo nivel
ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS NIVEL 6.20 FY= 420Mpa - 6000 PSI : Damos continuidad a la ejecución de esta actividad, se amarra hierro para vigas N +6.20 sigiendo especificaciones dadas en planos estructurales se procede al amarre de estos respetando lo especificado en el diseño. En cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias(Vigas aereas bloque 2)
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS y RED CONTRAINSENDIOS: Revisando los planos de instalacion hidrosanitaria y de red contrainsendios, se procede a ubicar y suminitrar la red segun la especificacion tecnica de los planos, la pocision correcta de la tuberia a instalar necesarias para la instalación de tuberías sanitarias y red
MAMPOSTERIA FACHADAS Y MUROS INTERNO: se procede levante de muros No4 Y No.5 cumpliendo la norma tecnica colombiana instalando refuerzo horizontal(grafil-cada 4 hiladas) primer piso bloque A.
PAÑETE: Se da inicio alas actividades de pañete afinado en muros interiores y pañete impermeabilizado - primer piso
INSTALACION ELECTRICA.- Regatas&ductos Y cajas de inspeccion para instalar tuberia y cableado de la red electrica conduit 1/2" respectivamente según planos
CERRAMIENTO E ARMADO SUMIDERO (CARCAMO) : Se procede el replanteo de manera adecuada para instalar cerramiento a la construccion zona colindante a la cancha multiple, con su bases y niveles ; tambien se procede a excavar y armar sumidero al costado del cerramiento se,formalea y funde del carcamo.
SEMANA 19
MONTAJE TABLETA TEATRO : Piso tablon granito de marmol;se instala la tableta de forma adecuada sobre el alistado de pisos con su respectivo nivel
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS y RED CONTRAINSENDIOS: Revisando los planos de instalacion hidrosanitaria y de red contrainsendios, se procede a ubicar y suminitrar la red segun la especificacion tecnica de los planos, la pocision correcta de la tuberia a instalar necesarias para la instalación de tuberías sanitarias y red
MAMPOSTERIA FACHADAS Y MUROS INTERNO: se procede levante de muros No4 Y No.5 cumpliendo la norma tecnica colombiana instalando refuerzo horizontal(grafil-cada 4 hiladas) primer piso bloque A.
PAÑETE: Se da inicio alas actividades de pañete afinado en muros interiores y pañete impermeabilizado - primer piso
INSTALACION ELECTRICA.- Regatas&ductos Y cajas de inspeccion para instalar tuberia y cableado de la red electrica conduit 1/2" respectivamente según planos
CERRAMIENTO E ARMADO SUMIDERO (CARCAMO) : Se procede el replanteo de manera adecuada para instalar cerramiento a la construccion zona colindante a la cancha multiple, con su bases y niveles ; tambien se procede a excavar y armar sumidero al costado del cerramiento se,formalea y funde del carcamo.
SEMANA 20
MONTAJE TABLETA TEATRO : Piso tablon granito de marmol;se instala la tableta de forma adecuada sobre el alistado de pisos con su respectivo nivel
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS y RED CONTRAINSENDIOS: Revisando los planos de instalacion hidrosanitaria y de red contrainsendios, se procede a ubicar y suminitrar la red segun la especificacion tecnica de los planos, la pocision correcta de la tuberia a instalar necesarias para la instalación de tuberías sanitarias y red contrainsendios, se realiza la actividad colocando la tubería en diámetros y longitudes de acuerdo a lo indicado en planos, igualmente respetando las ubicaciones citadas en los diseños. Se prcede a ubicar en terreno las cajas de inspeccion siguiendo especificaciones tecnicas.
MAMPOSTERIA FACHADAS Y MUROS INTERNO: se procede levante de muros No4 Y No.5 cumpliendo la norma tecnica colombiana instalando refuerzo horizontal(grafil-cada 4 hiladas) primer piso bloque A.
PAÑETE: Se da inicio alas actividades de pañete afinado en muros interiores y pañete impermeabilizado - primer piso
INSTALACION ELECTRICA.- Regatas&ductos Y cajas de inspeccion para instalar tuberia y cableado de la red electrica conduit 1/2" respectivamente según planos
PLACA EN CONCRETO EXTERIORES.- Se procede a alistar piso base en recebo compactado b200 y montar malla electrosoldada para refuerzo de placa de refuerzo para esta placa en concreto de 3000 PSI
CERRAMIENTO E ARMADO SUMIDERO (CARCAMO) : Se procede el replanteo de manera adecuada para instalar cerramiento a la construccion zona colindante a la cancha multiple, con su bases y niveles ; tambien se procede a excavar y armar sumidero al costado del cerramiento se,formalea y funde del carcamo.
SEMANA 21
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS y RED CONTRAINSENDIOS: Revisando los planos de instalacion hidrosanitaria y de red contrainsendios, se procede a ubicar y suminitrar la red segun la especificacion tecnica de los planos, la pocision correcta de la tuberia a instalar necesarias para la instalación de tuberías sanitarias y red

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	**ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION** **INFORME MENSUAL 05 DE INTERVENTORIA**	INPLAYCO S.A.

MAMPOSTERIA FACHADAS Y MUROS INTERNO: se procede levante de muros No4 Y No.5 cumpliendo la norma tecnica colombiana instalando refuerzo horizontal(grafil-cada 4 hiladas) primer piso bloque A.

PAÑETE: Se da inicio alas actividades de pañete afinado en muros interiores y pañete impermeabilizado - primer piso

INSTALACION ELECTRICA.- Regatas&ductos Y cajas de inspeccion para instalar tuberia y cableado de la red electrica conduit 1/2" respectivamente según planos

PLACA EN CONCRETO EXTERIORES.- Se procede a alistar piso base en recebo compactado b200 y montar malla electrosoldada para refuerzo de placa de refuerzo para esta placa en concreto de 3000 PSI , CUANDO ESTA LISTA LA SUPERFICIE SE VIERTE CONCRETO 3000 psi.

CERRAMIENTO E ARMADO SUMIDERO (CARCAMO) : Se procede el replanteo de manera adecuada para instalar cerramiento a la construccion zona colindante a la cancha multiple, con su bases y niveles ; tambien se procede a excavar y armar sumidero al costado del cerramiento se,formalea y funde del carcamo.

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL EN OBRA

Durante toda la ejecución se ha contado con los materiales necesarios para la realización de las actividades programadas, en cantidades suficientes y cumpliendo con las especificaciones técnicas de cada actividad. Es de resaltar que el suministro de materiales y equipos ha sido oportuno.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se presenta durante todo el mes lluvias de todo tipo las cuales atrazan actividades en obra. Debido a esto se presentan atrazos en actividades que son antecesoras y necesareas para ejecutar otras.

ARQ. EDGAR ROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATO No.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.	$ 2.899.054.705,00	C01PCCNTR226345 del 15 de noviembre de 2017

SEMANA No.	DEL			AL		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	18	4	2018	13	5	2018

REGISTRO FOTOGRAFICO

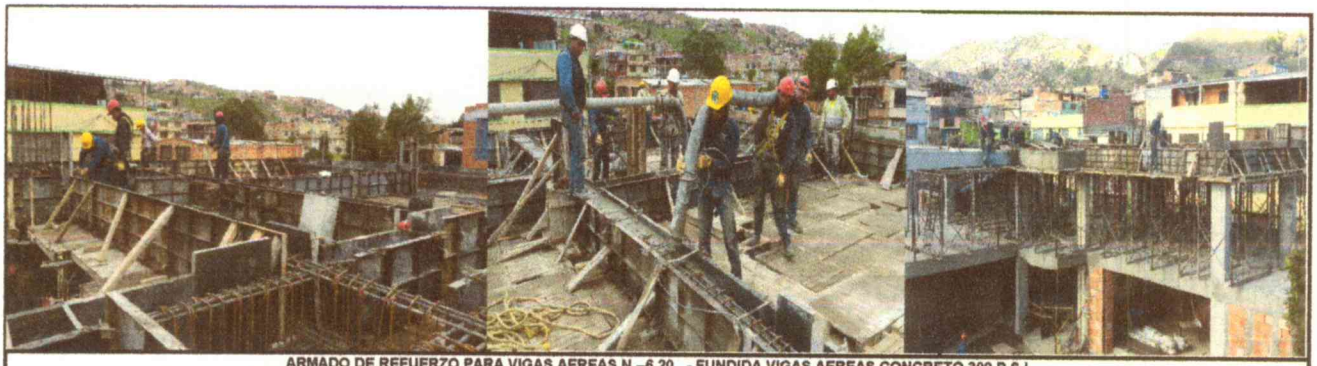

ARMADO DE REFUERZO PARA VIGAS AEREAS N.–6.20 - FUNDIDA VIGAS AEREAS CONCRETO 300 P.S.I



INTALACIONE ELECTRICAS- ARMADO DE CAJAS DE INSPECCION




INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- ARMADO CAJAS DE INSPECCION



SUMIDERO- CARCAMO



CERRAMIENTO Y CAÑUELA PREFABRICADA

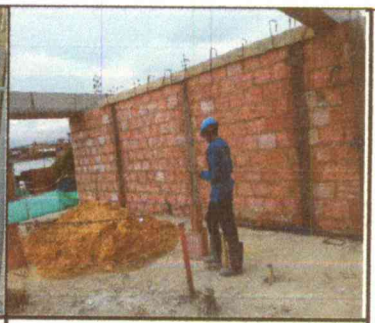

MAMPOSTERIA MUROS INTERNOS




PLACA CONCRETO EXTERIORES



MAMPOSTERIA FACHADAS




RETIRO DE SOBRANTES

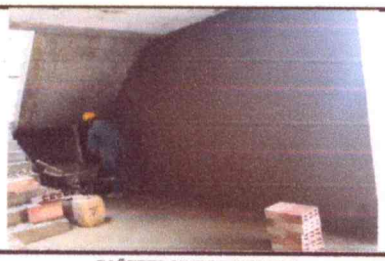

PAÑETES MUROS INTERNO



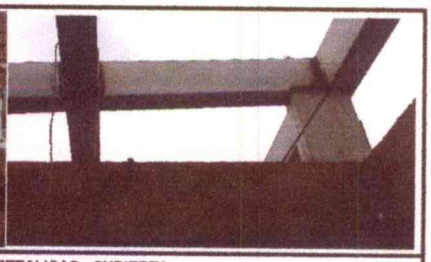


ESTRUCTURAS METALICAS - CUBIERTA





PAÑETE EXTERIOR

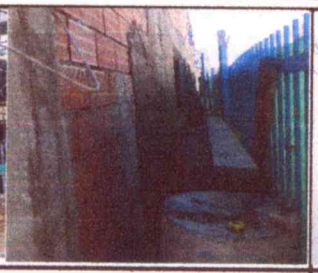



ANCLAJES ASCENSOR

ARQ. EDGAR ROA
DIRECTOR DE INTERVETORIA

ARQ. JOHN SALAS TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INFORME DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	INFORME 5

Informe de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente.

INPLAYCO S.A.S
CONSORCIO PLT ANGULO S.A.S
2018

Informe de gestión 05

Ejecución de las obras para la primera Infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.

Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá D.C.

Periodo: Mayo 2018.

INFORME DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO		INFORME 5

TABLA DE CONTENIDO

1.0 INTRODUCCIÓN 4

2.0 OBJETIVOS 5

2.1 OBJETIVO GENERAL 5

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5

2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 6

3.0 MEDIO AMBIENTE 7

3.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción 7

3.2 Manejo y Disposición Final de Escombros 8

3.3 Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos 11

3.4 Plan de Manejo de Transito, Señalización y Desvíos 12

3.4.1 Señalización de acceso 14

3.4.2 Señales preventivas 14

4.0 Seguimiento a las actividades de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial en el Trabajo y Gestión Ambiental 15

4.1. COPASST 15

4.1.1 Comité de Convivencia 15

4.1.2 Sistema de Seguridad Social 16

4.2 FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 18

4.2.1 Inducciones 18

4.2.2 Capacitaciones 19

4.3 CONTROL OPERACIONAL 20

4.3.1 Medicina Preventiva Del Trabajo 20

4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21

4.4.1 Elementos de Protección Personal 22

4.4,2 Equipos, Máquinas y Herramientas 23

4.4.3 Inspecciones 23

4.4.4 Estándares SISO 24

5.0 Conclusiones 25

1. INTRODUCCIÓN

Desde el momento en que inician las obras de la construcción **Ejecución de las obras para la primera Infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar,** se ha venido haciendo un seguimiento al impacto ambiental que genera esta obra, que consiste en la aplicación de cada uno de los programas ambientales con sus respectivas medidas de manejo e implementación de formatos que aplican para esta obra.

El PMA basado en la legislación ambiental vigente, permite establecer metodologías y estrategias claras que apunten al crecimiento de la empresa en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumplir con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del auto-cuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

Es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro del Plan de Manejo Ambiental. La labor desempeñada por parte del equipo de trabajo Siso – Ambiental realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro y/o en contra del medio ambiente y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generen cambios positivos y finalmente, contribuyan a la conservación de los recursos naturales y así mismo velar por la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evitar, controlar y mitigar la generación de impactos ambientales negativos, que se pueden presentar por la ejecución de las actividades que generan las obras ejecución de las obras para la primera Infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar la oportuna capacitación y entrenamiento dentro de la ejecución de la obra de acuerdo a las necesidades y aplicación que se evidencie dentro de la ejecución de la obra.

- ✓ Realizar seguimiento y control de los puestos de trabajo con el fin de verificar las condiciones de manejo impacto ambiental.

- ✓ Realizar seguimiento al pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la ley.

- ✓ Realizar la ejecución del Plan Específico de Seguridad y Salud en el Trabajo para la reducción de incidencia de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales presentados en la ejecución del proyecto.

- ✓ Proporcionar manejo ambiental a los individuos arbóreos de la zona de influencia del proyecto.

- ✓ Revisar los planes de disposición de desechos y en general, supervisar y hacer cumplir la reglamentación ambiental.

2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Información general del proyecto: El frente de Trabajo que conforma este Proyecto es: Colegio **San Francisco Sede A: Ubicado en Carrera 22 Nº 64 – 29 Sur, Ciudad Bolívar, Bogotá D.C, Colombia, en el cual se realizaron las siguientes actividades durante este periodo:**

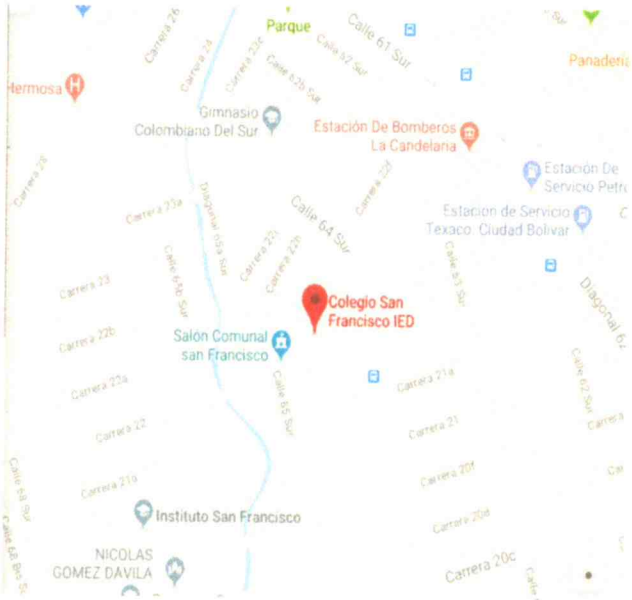


Foto-1.Ubicacion del Colegio San Francisco SEDE A

3. MEDIO AMBIENTE

La gestión ambiental en obra para el presente periodo se fundamentó en el cumplimiento de requerimientos legales con la orientación de la guía de Gestión Ambiental para proyectos en construcción de la Secretaria de Educación Distrital, donde se entiende que la dinámica del medio ambiente es cambiante y es un proceso de ajuste en el tiempo de acuerdo al avance contractual del proyecto "las obras para la primera Infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar". Para esto, Consorcio PLT S.A.S fundamento su gestión en:

3.1Manejo Integral de Materiales de Construcción

El sitio de explotación de materiales es la sociedad identificada con NIT se encuentra ubicada en el municipio de Soacha Cundinamarca (Vereda Panamá) y Contrato de Concesión Minera para mediana minería de materiales de construcción N° DBE-111.

Por medio de la Resolución 1558 de 2003 "Por la cual se establece el Plan de Manejo Ambiental para una Explotación minera y se toman otras disposiciones" expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, se establece que en la zona denominada vereda de panamá municipio de Soacha Cundinamarca, es una zona compatible para la explotación de arcilla y materiales de construcción, con contrato minero vigente y con vigencia de licencia ambiental hasta.

La comercialización y el Transporte del material de cantera al proyecto es realizado por la empresa **Cueva Del Zorro**, con **Nit: 900.037.814-3**, quienes con sus respectivos recibos certifica el ingreso de material requerido para la obra. Para el periodo de informe, se relaciona a continuación la relación de los materiales pétreos llegados a obra con su correspondiente identificación de volqueta.

3.1 Manejo y Disposición Final de Escombros

El Transporte del material a sitio de disposición final del proyecto es realizado por la empresa CB TRANSPORTES S.A.S, identificada con en el NIT 900,907,047-4, quienes con sus respectivos recibos certifican la salida de material de la obra. Para el periodo de informe, se relaciona a continuación la relación escombros con su correspondiente identificación de volqueta.

Inicialmente, para el proyecto 597,87 m2 de área a construir, lo cual corresponde contractualmente a 267 m3 en excavaciones y 724 m3 de escombros.

ARENA DE PEÑA

FECHA	PLACA	CANTIDAD	UNIDAD
17/04/2018	SBF 061	7	MTS3
27/04/2018	ACD 986	7	MTS3
30/04/2018	SBF 061	7	MTS3
03/05/2018	ACD 986	7	MTS3
12/05/2018	ACD 986	7	MTS3
21/05/2018	ACD 986	7	MTS3
22/05/2018	ACD 986	7	MTS3
TOTAL	**49 MTS ARENA DE PEÑA**		

- **ARENA DE RIO**

FECHA	PLACA	CANTIDAD	UNIDAD
17/04/2018	SBF 061	7	MTS3
21/04/2018	SBF 061	7	MTS3
04/05/2018	SBF 061	7	MTS3
12/05/2018	EKF 961	7	MTS3
TOTAL	**28 MTS ARENA DE RIO**		

- **B200**

FECHA	PLACA	CANTIDAD	UNIDAD
21/04/2018	SBF 061	7	MTS3
21/04/2018	ACD 986	7	MTS3
23/04/2018	ACD 986	7	MTS3
24/04/2018	SBF 061	7	MTS3
26/04/2018	ACD 986	7	MTS3
21/05/2018	ACD 986	7	MTS3
21/05/2018	ACD 986	7	MTS3
TOTAL	**49 MT B200**		

- **GRAVILLA**

FECHA	PLACA	CANTIDAD	UNIDAD
19/04/2018	SBF 961	7	MTS3
12/05/2018	SBF 961	7	MTS3
TOTAL	**14 MTS DE GRAVILLA**		

PROYECTO: COLEGIO SAN FRANCISCO					
FECHA	Nº RECIBO	PLACA VOLQUETA	VOLÚMEN TRANSPORTADO (m^3)	LUGAR DE DISPOSICIÓN	TIPO DE MATERIAL
14/04/2018	4587	ACD986	7	CEMEX	ESCOMBRO
14/04/2018	4730	EKF961	7	CEMEX	ESCOMBRO
21/04/2018	4727	SBF061	7	CEMEX	ESCOMBRO
21/04/2018	4588	EKF961	7	CEMEX	ESCOMBRO
05/05/2018	4729	ACD986	7	CEMEX	ESCOMBRO
05/05/2018	4728	ACD986	7	CEMEX	ESCOMBRO

Para el presente periodo, se ha realizado un retiro de escombros de:

MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD
MATERIAL DE ESCOMBROS	42	MTS3

Nombre de la Empresa	Nit	Proceso Constructivo	Cantidad	Sitio Disposición Final
CB TRANSPORTES S.A.S	**900,907,047-4**	Excavación y demoliciones	42 mts 3	CEMEX

Nota: De acuerdo la comunicación por parte de Cemex de no certificar los RCD sin el pin obra. Adjunta correo.

3.2 Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos

Para la obra se contempla la utilización de 5 volquetas inicialmente, las cuales realizaran el suministro de material necesario para la realización de preliminares en obra y de igual forma el transporte y disposición de residuos de excavación y lodos generados por la actividad de pilotaje. De acuerdo a la resolución 1115 de 2013 y sus normas complementarias, dichas volquetas se encuentran inscritas como Transportadores ante la Secretaria Distrital de Ambiente, donde a cada una se le asigna un PIN que a continuación se relaciona con la respectiva placa y nombre de conductor:

PLACA	NOMBRE CONDUCTOR	PIN AMBIENTAL
SBF 061	JIMMY VIVAS	542



Fotografia-2: Cargue de escombros

3.2 Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos

Para la obra se contempla la utilización de 5 volquetas inicialmente, las cuales realizaran el suministro de material necesario para la realización de preliminares en obra y de igual forma el transporte y disposición de residuos de excavación y lodos generados por la actividad de pilotaje. De acuerdo a la resolución 1115 de 2013 y sus normas complementarias, dichas volquetas se encuentran inscritas como Transportadores ante la Secretaria Distrital de Ambiente, donde a cada una se le asigna un PIN .

Utilizando estrategias adecuadas para el almacenamiento y transporte de los materiales es posible optimizar su uso, reducir de manera considerable los efectos negativos al ambiente por cuanto se minimiza el volumen de desperdicios y se puede evitar la emisión de partículas al aire.

En el proyecto se ha contado con la siguiente maquinaria para el desarrollo de actividades de excavación, demolición, cargue y descargue de materiales y conformado y estabilización de bases.

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
Trompo	1
Pluma	1
Rana	1
Equipos Soldadura	3
Herramientas menores	1




Fotografía-3: Minicargador CAT

Se le recomienda al contratista que el transporte de la Minicargador CAT (Fotografía-3), o cualquiera de la maquinaria pesada que ellos estén utilizando en el desarrollo de las obras, debe ser transportado en cama baja. Según lo establecido en la resolución 12335 de 2012 y la normativa Ley 769 de 2002 "Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, construcción y conservación de obras, que por sus características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público".

3.3 Plan de Manejo de Transito, Señalización y Desvíos.

El Plan de Manejo de Trafico, señalización y desvíos – PMT, ha sido desarrollado para mitigar el impacto sobre el tráfico peatonal y vehicular; así como sobre los habitantes del sector, que se generara como consecuencia de las intervenciones proyectadas para la "Ejecución de las obras para la primera Infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.", si bien no se presentara intervención sobre la vía, el presente documento se presente para entrada y salida de volquetas, considerado en la Secretaria de Movilidad un Proyecto de Bajo Impacto.

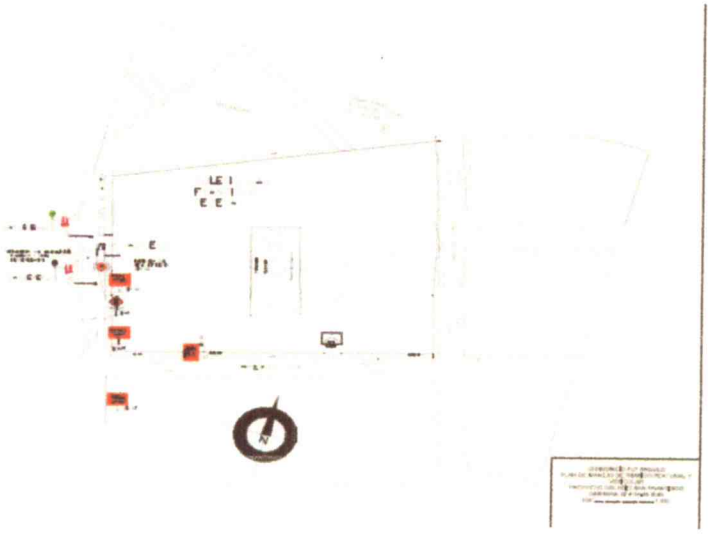

Fotografía-4: Acceso a la obra.

Como se puede observar (Fotografia-4) sobre la Carrera 22 Nº 64 – 29 Sur se encuentra el acceso a la obra el lado sur del colegio, el tráfico vehicular para esta zona en su gran mayoría se encuentra compuesto por vehículos particulares de tipo liviano, públicos livianos (taxis), motocicletas, vehículos escolares y pero no circulas rustas de transporte público colectivo.

Consorcio PLT Angulo destino un auxiliar de Transito (Paletero) quien cumple actividades de prevención y control en la entrada y salida de vehículos y maquinaria a la obra, de igual forma es la persona que se encarga, bajo las instrucciones del residente de obra y residente ambiental, de organizar sobre la carrea Carrera 22 Nº 64 – 29 Sur los vehículos de carga (volquetas) cuando el desarrollo de las actividades lo requieren, garantizando que de esta forma no presenten traumatismos en la movilidad del área de influencia de la obra.

3.4.1 Señalización de acceso


Cuando se ejecutan trabajos de construcción en una determinada vía como es el caso de la construcción **"Ejecución de las obras para la primera Infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar"** se presentan condiciones especiales que afectan la circulación de vehículos y personas.

Para dicha situación se deben implementar medidas técnicas apropiadas, que se incorporan a lo largo de la ejecución del proyecto, esto con el objeto de reducir el riesgo de accidentes del flujo vehicular (conductores), el flujo peatonal (transeúntes) y personal de la obra que intervienen en el mismo.

Los dispositivos para la regulación del tránsito, en cada tramo o tramos de alcantarillado y acueducto a intervenir en las vías nacionales y departamentales deberán ubicarse con anterioridad al inicio de la obra, permanecer durante la ejecución de la misma y serán retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. Como es el caso de la ejecución de los trabajos de alcantarillado y acueducto que se deben acometer por etapas, deberán permanecer en el lugar solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas.

3.4.2 Señales preventivas

Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los peligros potenciales existentes en la zona, cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede presentarse un cierre parcial de la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio de la obra. Las señales preventivas tienen forma de rombo y sus colores serán naranja para el fondo y negro para símbolos, textos, flechas y orla. Se colocarán los lados (derecho y/o izquierdo) de la vía que se afecte por la obra.

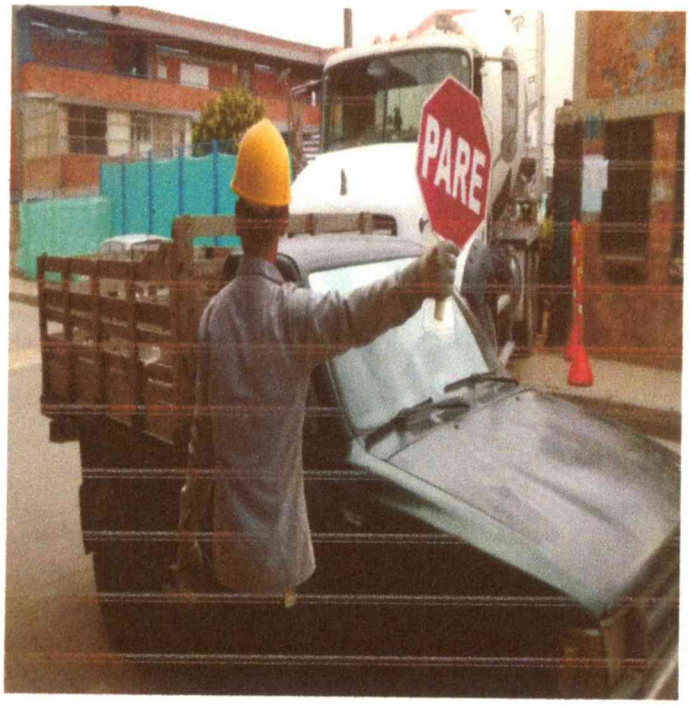

Fotografia-5. Apoyo del auxiliar de tránsito.

3.4.3 Señalización de Frentes de Obra y Sitios Temporales

Durante el desarrollo de las actividades de obra, se ha realizado cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio de obra con cinta de demarcación de mínimo 12 cm de ancho con franjas amarillas y negras y también con malla fina sintética (Poli sombra) que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. Este cerramiento se a apoyado parales de madera de aproximadamente 1.20 metros de alto, espaciados cada 3 a 5 metros.

Se ha garantizado el cerramiento en perfecto estado durante todo el trascurso de la

obra, teniendo en cuenta que al finalizar la jornada se dejan las zonas lo mejor posible en cerramiento, pero muchas veces el estado del tiempo o los soldados de unidades militares adyacentes a la obra, derriban el mismo para ingresar o salir por estas áreas.

4.0 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 COPASST

El comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo es aquel que Previene, protege y promueve la salud y seguridad en el Trabajo en todos los niveles de, enfocado en la búsqueda de acuerdos con las directivas y responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgando y sustentando prácticas saludables y motivar al personal a la adquisición de hábitos seguros.

El COPASST sirve como organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa y aplicación correcta dentro del proyecto **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".**

Se realiza la Segunda reunión, en las instalaciones del Colegio Distrital San Francisco Sede A con los miembros que hacen parte del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo.

4.1.1 COMITÉ DE CONVIVENCIA

De acuerdo a la Resolución 652 de 2012, **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".** cumple a legalidad y satisfacción con la reglamentación dispuesta puesto que se cuenta formado el comité de convivencia dentro de la organización; luego de ser creado se le realizó por parte del equipo profesional ambiental y SG-SST a los integrantes del comité la respectiva capacitación y/o charla teniendo como tema central para desarrollo funciones y responsabilidades del mismo.

Se realiza la primera reunión, en las instalaciones del Colegio Distrital San Francisco Sede A con los miembros que hacen parte del comité de Convivencia.

4.1.2 Sistema de Seguridad Social

La supervisión y seguimiento del contrato verificó la respectiva certificación del pago de la seguridad social, pensión del contratista y riesgos profesionales de las personas que laboran.

Para el periodo Abril se realizó los chequeos de pago de seguridad social, por medio de la planilla de pago. De igual forma se verificó el personal que ingreso nuevo a los distintos frentes que se maneja el proyecto, revisando que estas personas cuenten con la documentación al día y en regla.

El Residente SISOMA de la Interventoría ha velado por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, al contratista se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, es por esto que actualmente envían la documentación requerida y permanece en el archivo.

Esta documentación es revisada por El Residente SISOMA de la Interventoría para garantizar el estricto cumplimiento de este requerimiento contractual.

El Contratista atendiendo los lineamientos establecidos presentó como anexo las planillas de pago de EPS, ARP, Pensiones y Parafiscales, tal como se presenta en el punto a continuación.

Fechas para el pago a la seguridad social.

El Ministerio de Protección Social a través del Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007, ajusta las fechas de pago de la planilla única ampliando las fechas de pago y además otorgando más tiempo para ingresar al sistema a las empresas con menos de 20 empleados, trabajadores independientes y personas naturales.

Empresas con más de 200 empleados:
Se amplía la fecha de pago (8 días hábiles)
Se cambian los días de pago (del 1º al 8º)
Las fechas corresponden a los últimos 2 dígitos del NIT.

Dos últimos dígitos del NIT o CC	Día hábil de vencimiento
00 al 10	1º
11 al 23	2º
24 al 36	3º
37 al 49	4º
50 al 62	5º
63 al 75	6º
76 al 88	7º
89 al 99	8º

Medianas y pequeñas empresas de menos de 200 empleados:
Se amplía la fecha de pago (13 días hábiles).
Se cambian los días de pago (del 1º al 13º).
Las fechas corresponden a los últimos 2 dígitos del NIT.

Dos últimos dígitos del NIT o CC	Día hábil de vencimiento
00 al 08	1º
09 al 16	2º
17 al 24	3º
25 al 32	4º
33 al 40	5º
41 al 48	6º
49 al 56	7º
57 al 64	8º
65 al 72	9º
73 al 79	10º
80 al 86	11º
87 al 93	12º
94 al 99	13º

4.2 FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

4.2.1 INDUCCIONES

La inducción es una herramienta fundamental para incluir al trabajador en la empresa acercándolo a los conocimientos que la componen y explica al trabajador que ingresa detalles de la misma, su funcionamiento, cuáles son sus objetivos, de qué forma tiene que proceder él en relación a su tarea específica y las expectativas en torno a la misma, entre otros aspectos.

Consorcio PLT Angulo S.A.S, explica en sus inducciones todo lo relacionado a la seguridad y la salud en el trabajo, capacitaciones a las personas en materia de prevención, la conducta de los trabajadores mejorará significativamente diversas variables como el ausentismo, la disminución de siniestros y la ausencia de accidentes entre otras. A su vez contribuye a afianzar una imagen de la empresa alineada al cuidado de sus trabajadores.

4.2.2 CAPACITACIONES

Actividades relacionadas con la formación, capacitación, salud ocupacional, seguridad industrial, ambiental adecuación de puestos de trabajo, fortalecimiento de la comunicación interna, y desarrollo de valores, entre otros; han permitido que el clima laboral mejore especialmente en la dimensión laboral, aunque deben emprenderse aún ejercicios innovadores que permitan que este ambiente también mejore en la dimensión de las relaciones frente al otro. Por otra parte, de esta forma se da cumplimiento al artículo 62 del decreto 1295/94, que obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores, a que riesgos pueden estar expuestos durante la ejecución de sus labores que tiene como objetivo proveer formalmente a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con los estándares de Salud Ocupacional, calidad y satisfacción.

En este periodo de Abril se realiza esta actividad una vez por semana para concientizar al personal sobre diferentes temas de Seguridad Industrial y Ambiental.



Fotografía 6. Jornada de Capacitación y Concientización al personal



Fotografía 7. Jornada de Capacitación y Concientización al personal.

4.3 CONTROL OPERACIONAL

4.3.1 Medicina Preventiva y del Trabajo

Dando cumplimiento a la Resolución 6398 / 91: Procedimientos sobre exámenes médicos ocupacionales y Circular 001/03 Obligatoriedad de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales para las empresas; SOLUCIONES INTEGRALES UNION, le realiza a los trabajadores que ingresan a la compañía a desarrollar actividades en la obra **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".** su respectivo examen médico ocupacional de ingreso es realizado en el lugar definido por la organización y están realizados por personal idóneo en salud ocupacional, el objetivo del examen médico de ingreso es valorar el estado de salud actual del aspirante a ingresar a la empresa, buscando establecer un balance de salud que permita valorar la capacidad laboral para el cargo al que se aspira y los riesgos a los que vaya a estar expuesto en el desarrollo de su trabajo.

Consorcio PLT Angulo, cuenta con la cobertura de la totalidad de exámenes médicos de los trabajadores que se encuentran vinculados en obra, teniendo a la fecha doce (10) exámenes médicos ocupacionales (EMO).

4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.4.1 Elementos de protección personal

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial, el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un buen resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

Dentro del proyecto **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".** se desarrollan inspecciones de estado y uso de los elementos de protección personal (EPP) de forma aleatoria al personal que se encuentra realizando labores dentro de la obra con una periocidad de una (1) vez a la semana, teniendo en cuenta dentro de estas inspecciones planes de acción en el momento que se llegase a presentar alguna acción correctiva a tener en cuenta; a la fecha del periodo evaluado no se han presentado acciones correctivas a corregir; en este bimestre estimado se cuenta con 2 (2) inspecciones diligenciadas correspondientes a cinco (5) trabajadores diferentes para cada una de las semanas inspeccionadas.

4.4.2 Equipos, máquinas y herramientas.

En la obra se encuentran operando maquinaria como la siguiente a mencionar:

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
Minicargador	1
Trompo	1
Herramientas menores	1

El equipo de trabajo ambiental - SGSST ha verificado la documentación tanto de la maquinaria como de los operarios. A su vez se tiene en archivo los respectivos certificados de mantenimiento de equipos y/o maquinaria en centros debidamente autorizados, con el fin de llevar a cabo completas condiciones de salud.

4.4.3 Inspecciones

Con el fin de orientar la identificación y manejo de condiciones inseguras o sub-estándar que puedan generar incidentes o cualquier tipo de pérdidas en el proyecto, se realizan inspecciones pre-operacionales a equipos o maquinas críticas o que son utilizados en tareas críticas.

Para el proyecto **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".** Que se está ejecutando se tiene la aplicación de las siguientes inspecciones donde se discrimina la cantidad existente de las mismas dentro del periodo evaluado y frecuencia con la que se efectúan cada una de ellas:

4.4.4 Estándares SISO

Consorcio PLT Angulo, identifica y controla los riesgos asociados con tareas y/o actividades, para generar procedimientos de trabajo más seguros con el fin de determinar los peligros, riesgos y controles que permitan minimizar los incidentes durante la realización del proyecto **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".**

La evaluación y análisis de riesgos de trabajo aplicadas por **Consorcio PLT Angulo S.A.S** está concebida para:

- Analizar los pasos individuales o actividades que conforman un trabajo o la designación de trabajo específico.
- Detectar los peligros potenciales o actuales que se pueden presentar y los que están implícitos para ser identificados previamente a la realización de un trabajo.
- Determinar cómo los peligros potenciales o actuales pueden ser controlados.
- Revelar movimientos, posturas, actividades o prácticas de trabajo peligrosas.
- Instruir como hacer operaciones en la mejor y más segura manera o forma.
- Aumentar el compromiso del empleado en el proceso de seguridad.
- Contribuir a la productividad de un trabajo por la eliminación o reducción de incidentes potenciales o lesiones.

5.0 RECOMENDACIONES

La gestión del área de salud ocupacional pretende alcanzar y demostrar un sólido desempeño de las actividades ejecutadas en el periodo evaluado, lo que ha permitido alcanzar resultados satisfactorios. En aras del mejoramiento continuo del área socio ambiental, la interventoría realizó las siguientes recomendaciones al contratista:

- ✓ Se le recomienda realizar todos los días las charlas de 5 min y capacitaciones al personal.
- ✓ El personal que trabaje en alturas superiores 1.50 mts debe tener los equipos para trabajar en alturas y conectarse una línea de vida.
- ✓ Se deberá separar y clasificar con el fin de utilizar el material que se pueda reciclar, para posteriormente los sobrantes ser trasladados al lugar autorizado.
- ✓ Mantener al día el registro de mantenimiento de equipos, adicional, verificar que el procedimiento sea realizado en centros debidamente autorizados.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN DE AVANCE**	**CONSORCIO PLT ANGULO** INPLAYCO S.A.S.

Código	**N/A**	**Fecha**	25/04/2018	**Inicio**	**12:30pm**		**Lugar**	**Colegio San Francisco Sede A (Rectoria)**
Proyecto	" EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."					**Contrato Nro.**	CO1.PCCNTR.226345	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					**Asistentes Externos**	N/A	
Fecha de Elaboración	25/04/2018	**Elaborado por**	Catalina Serrano				**Próxima Reunión**	

Siendo las 12:30 pm, se reunieron las personas que aparecen en la lista de asistencia adjunta, en el Colegio San Francisco Sede (Biblioteca), ubicado en la Carrera 22 No.64-29 Sur, para tratar el tema relacionado con el avance de la obra para la primera infancia en Colegio San Francisco Sede A.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 25 de abril de 2018, se reunieron los representantes del área Técnica, SST y Social de Contratista e Interventoría, para ejecutar l reunión de avance del proyecto de la referencia, se asiste dese las 12:20 pm y se dio espera hasta la 1:00 pm, pero no asistiero representantes de la comunidad educativa (rector, docentes, estudiantes y/o padres de familia).

El Rector anunció con anticipación que no podía asistir, sin embargo, los docentes estaban notificados de la actividad.

Se deja constancia que el Contratista realizó el respectivo proceso de divulgación entregando comunicado predio a predio, e instaló la invitación en los Puntos Satélites, en las entradas del colegio y en la oficina de Secretaria del Colegio, con el acompañamiento de la Interventoría. Se anexa a la presente la respectiva presentación, registro fotográfico listado de asistencia donde firman los representantes de Contratista e interventoría que hicieron presencia y la bibliotecóloga del Colegio, como testigo que se asistió y se organizó debidamente la actividad, la cual se tenía proyectada en el siguiente orden:

1. Presentación y bienvenida
2. Avances Componente Social
3. Avances Componente SST
4. Avances Componente Técnico
5. Inquietudes de la comunidad

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO PLT ANGULO

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

INPLAYCO


Tema de la Reunión:	PROYECTO "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"				Proceso:	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.226345
Área Responsable:	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Fecha:	25-ABRIL-2018	Lugar:	Colegio San Francisco	
Contratista responsable.	CONSORCIO PLT ANGULO			Hora:	12:30 PM.	


No.	NOMBRE	ROL	INSTITUCION	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jose Solis Torres	Res interventoria	INPLAYCO		Josl3ota	
2	Edgar Yosid Paredes	Res Obra	Consorcio PLT		edgar.y.paredes.g	
3	Felipe Hernando Herrera	Res. Sst Inter.	Inplayco		Interedisse@gmail.com	
4	Norma Guerrero	Res S.S.O.	Consorcio PLT		Inv.admonistrativa@gmail.com	
5	Alejandra Paez C.	Trabajo Social.	Inplayco		interse@gmail.com	Alejandra Paez.
6	Nubia Eugenia Cano	BIBLIOTECARIA	San francisco		nicyam526@yahoo.com	
7	CATALINA SERRANO	RES SOCIAL	PLT.		SocialCARRIS@GTMail.com	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reunión de avance

25 de abril de 2018

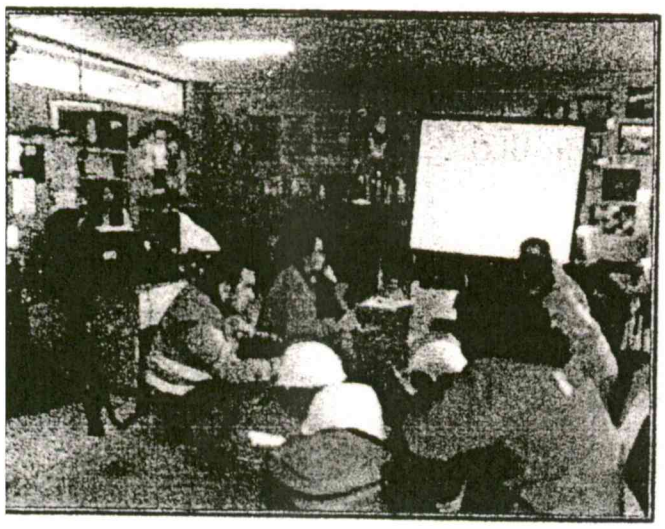

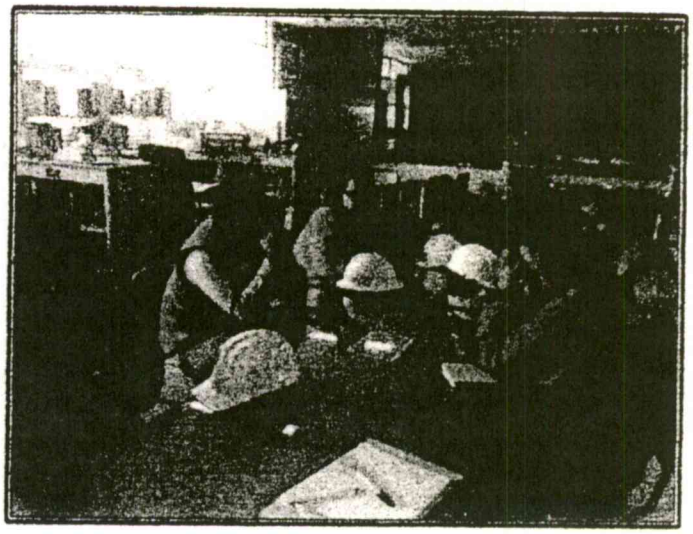

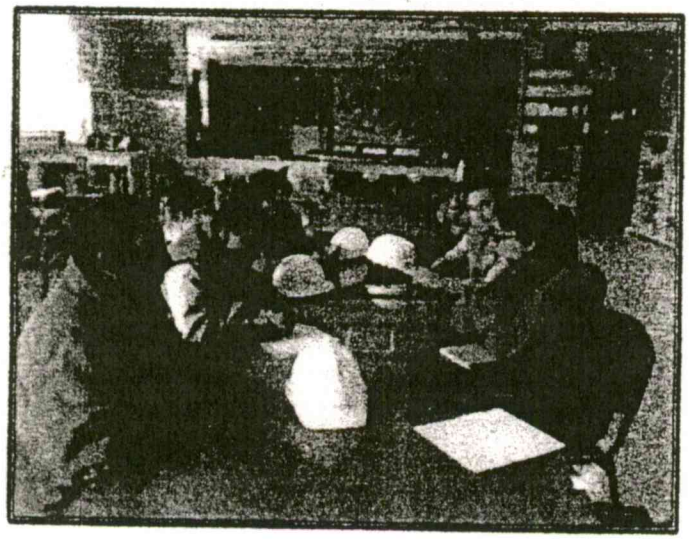

1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

➢ REUNIONES

REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA	25 de abril de 2018
REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA	Se realizará al finalizar el 100% de la obra
REUNIONES EXTRAORDINARIAS	1. Reunión con trabajadores (01/02/2018) 2. Conformación comité de participación (14/02/2018)

1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

➢ ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN


LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD, SOLICITUD MONC,INVITACIÓN REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN, CANALES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, INVITACIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN , INVITACIÓN REUNIÓN DE AVANCE	121

1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN


➢ PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN



COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A (OBRA)



PAPELERIA COSMOCOPIAS




PANADERIA YOBIPAN


2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

➢ COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nº COMITÉ	DESCRIPCIÓN	FECHA	LUGAR	Nº DE PARTICIPES	Nº DE ASISTENTES
1	REUNION COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.01	[illegible]	CARRERA 22 No 64-29 SUR COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A (OBRA)	7	11
2	REUNION COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.02	[illegible]	CARRERA 22 No 64-29 SUR COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A (OBRA)	7	8
TOTAL				14	19

2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA







3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

➢ Ubicación Punto de Atención: Carrera 22 No 64-29 Sur (Acceso por la calle 65 Sur, obra en construcción)

➢ Línea Telefónica, 3102784652

➢ Correo electrónico: socialobraas@gmail.com

➢ Horario de atención: Miércoles de 9:00am a 11:00am

➢ Responsable de la atención: T.S Catalina Serrano. Residente Social

A la fecha no se han recibido PQRS

CONTRATO DE OBRA: No. CO1.PCCNTR.226345

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

CONTRATISTA: CONSORCIO PLT ANGULO

INTERVENTORIA: INPLAYCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AGENDA DEL DÍA

1. Presentación y bienvenida
2. Actividades Componente Social
3. Actividades Componente SST y Ambiental
4. Actividades Componente Técnico
5. Aclaración de inquietudes

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

PRESENTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL Y ACTIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LA OBRA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Generalidades del Proyecto

Proyecto:	Contrato No: CO1.PCCNTR.226345
Objeto del Contrato:	Ejecución de las obras para la primera infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, Ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED.
Localización:	Localidad Ciudad Bolívar. Barrio San Francisco
Contratista:	Consorcio PLT Angulo
Plazo estimado total:	6 meses
Fecha de iniciación Contrato:	18 de diciembre de 2017
Fecha de terminación Contrato:	17 de junio de 2018
Interventoría	INPLAYCO SAS CO1.PCCNTR.226156

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


Este es el Equipo del Contrato

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	INTERVENTORIA INPLAYCO S.A.S	CONTRATISTA CONSORCIO PLT ANGULO
Supervisión Técnica: Arq. Mauricio Baquero.	DIRECTOR INTERVENTORIA Arq. Edgar Reo	DIRECTORA OBRA Arq. Paola Lopez
	RESIDENTE INTERVENTORIA Arq. Jhon Soto	RESIDENTES OBRA Ing. Edgar Paredes
	RESIDENTE SST Ing. Felipe Marin	RESIDENTE SST Ing. Norman Adrian
	RESIDENTE AMBIENTAL Ing. Felipe Marin	RESIDENTE AMBIENTAL Ing.Lorena Zuñiga
	RESIDENTE SOCIAL Alejandra Paez	RESIDENTE SOCIAL T.S. Catalina Serrano

BOGOTÁ

COMPONENTE SOCIAL





4. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO




- Se cuenta con un total de cuarenta y dos (42) personas vinculadas a la obra, de las cuales catorce **(14)** pertenecen a **MONC** (Mano de obra no calificada) y veintisiete **(28)** corresponden a **MOC** (Mano de obra calificada). La mayoría del personal de MONC reside en la Localidad de Ciudad Bolívar y/o pertenecen a los estratos 1 y/o 2; por lo cual se cumple con un total de **43%** de vinculación de mano de obra no calificada perteneciente a la Localidad, superando el porcentaje requerido por la Secretaría de Educación del Distrito, el cual es del **30%.**

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

- ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS



Dentro de esta estrategia de sostenibilidad se enmarcan los talleres de **"uso, mantenimiento y conservación de la planta física"**; en Comité de Participación No.2 se acordó realizarlos a mediados del mes de mayo con grupos focales, previa coordinación del cronograma para esta actividad con el Rector y la Secretaria de Educación del Distrito.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


COMPONENTE SST

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN

La salud y seguridad ocupacional son tomadas como herramientas básicas e indispensables para mejorar las condiciones de trabajo, como la calidad de vida de todos los empleados de una organización.



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEGURIDAD VIAL



SEÑALIZACIÓN




PROTECCIÓN

En las instalaciones, evitando accidentes de todo tipo, logrando una mejor calidad de vida en sus operarios y un mayor cuidado en los alumnos


BOGOTÁ

COMPONENTE TÉCNICO

AVANCE OBRA

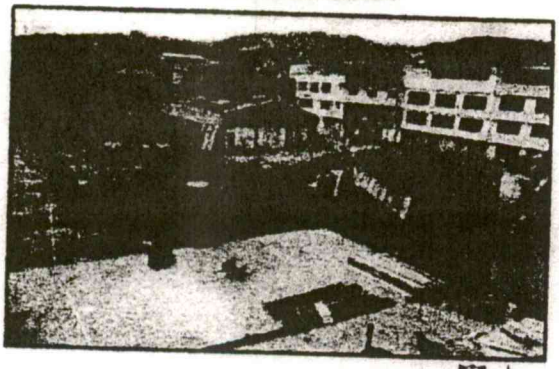

AVANCE OBRA




AVANCE OBRA



AVANCE OBRA



AVANCE OBRA



ACTIVIDADES FALTANTES

- MAMPOSTERIA Y PAÑETES SEGUNDO PISO
- INSTALACIONES SANITARIAS (40%)
- INSTALACIONES ELECTRICAS (40%)
- INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS (EN PRODUCCIÓN)
- ACABADOS


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
Recuerde consignar sus datos en el Registro de Asistencia
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

51

CONSORCIO PLT ANGULO

INPLAYCO S.A.S

Comunicado N°. 10

INVITACION REUNION DE AVANCE

CONTRATO DE OBRA: No. CO1.PCCNTR.226345:
"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

Señores
COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A
La Ciudad

La **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, la firma Contratista **CONSORCIO PLT ANGULO**, y la Interventoría **INPLAYCO S.A.S** le invitan a formar parte de este proyecto y a participar en la reunión de avance.

En la reunión podrán participar todas las personas representantes de la comunidad educativa a quienes se les informará sobre el avance técnico de la obra, avance de cada uno de los programas del Plan de gestión Social y se le aclararan las inquietudes relacionadas con el informe.

Para la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, **CONSORCIO PLT ANGULO** y demás entidades involucradas en el proceso, es de vital importancia su presencia en la reunión, para poder aclarar todas las dudas e inquietudes que surjan producto de la socialización.

LUGAR: COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A. (BIBLIOTECA)
DIRECCION: CARRERA 22 N.64-29 SUR.
FECHA: 25 DE ABRIL DE 2018
HORA: 12:30 PM

T 6PE 27

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Para dudas e inquietudes comuníquese con nosotros
OFICINA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
Residente Social: Catalina Serrano
Dirección: Carrera 22 no.64-29 Sur Colegio San Francisco Sede A (Acceso por la calle 65 Sur, obra en construcción).
Horario: Miercoles de 9:00am a 11:00am.
Teléfono: 3102784652
Correo: socialobrass@gmail.com

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PLT ANGULO

INPLAYCO S.A.S.

Fecha: 09 de Mayo de 2018
Barrio: San Francisco
Contrato: CO1.PCCNTR.226345
Contratista: CONSORCIO PLT ANGULO

Comunicado N° 11

Señor: **Cesar Alberto López**
Rector IED San Francisco

INVITACIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3

Objeto del Contrato: **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"**

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SED), LA FIRMA CONTRATISTA CONSORCIO PLT ANGULO Y LA INTERVENTORÍA INPLAYCO S.A.S, nos permitimos invitarlo al Comité de Participación Ciudadana No.3, espacio en el cual se le informará del avance técnico de la obra, avance de cada uno de los programas del Plan de gestión Social y se le aclararan las inquietudes relacionadas con el informe.

Lugar: Carrera 22 No.64-29 Sur
Colegio San Francisco (Oficina Rectoría)
Fecha: Miércoles 16 de Mayo de 2018
Hora Inicio: 11:30 am
Hora Finalización: 12:00 pm

¡ SU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE !

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Para dudas e inquietudes comuníquese con nosotros
OFICINA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Residente Social Catalina Serrano
Dirección: Carrera 22 no 64-29 Sur Colegio San Francisco Sede A (Acceso por la calle 65 Sur, obra en construcción
Horario: Miércoles de 9:00am a 11:00am
Teléfono: 3102784652
Correo: socialobras@gmail.com

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PLT ANGULO

INPLAYCO S.A.S.

Fecha: 09 de Mayo de 2018
Barrio: San Francisco
Contrato: CO1.PCCNTR.226345
Contratista: CONSORCIO PLT ANGULO

Comunicado N° 12

INVITACIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3
INTEGRANTES COMITÉ

Objeto del Contrato: **"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"**

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SED), LA FIRMA CONTRATISTA CONSORCIO PLT ANGULO Y LA INTERVENTORÍA INPLAYCO S.A.S, nos permitimos invitarlo al Comité de Participación Ciudadana No.3, espacio en el cual se le informará del avance técnico de la obra, avance de cada uno de los programas del Plan de gestión Social y se le aclararan las inquietudes relacionadas con el informe.

Lugar: Carrera 22 No.64-29 Sur
Colegio San Francisco (Oficina Rectoría)
Fecha: Miércoles 16 de Mayo de 2018
Hora Inicio: 11:30 am
Hora Finalización: 12:00 pm

¡ SU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE !


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


Para dudas e inquietudes comuníquese con nosotros
OFICINA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Residente Social: Catalina Serrano
Dirección: Carrera 22 no 64-29 Sur Colegio San Francisco Sede A (Acceso por la calle 65 Sur, obra en construcción).
Horario: Miércoles de 9:00am a 11:00am
Teléfono: 3102784652
Correo: socialcbrass@gmail.com

Scanned with CamScanner

ENVIO INVITACIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN No.3

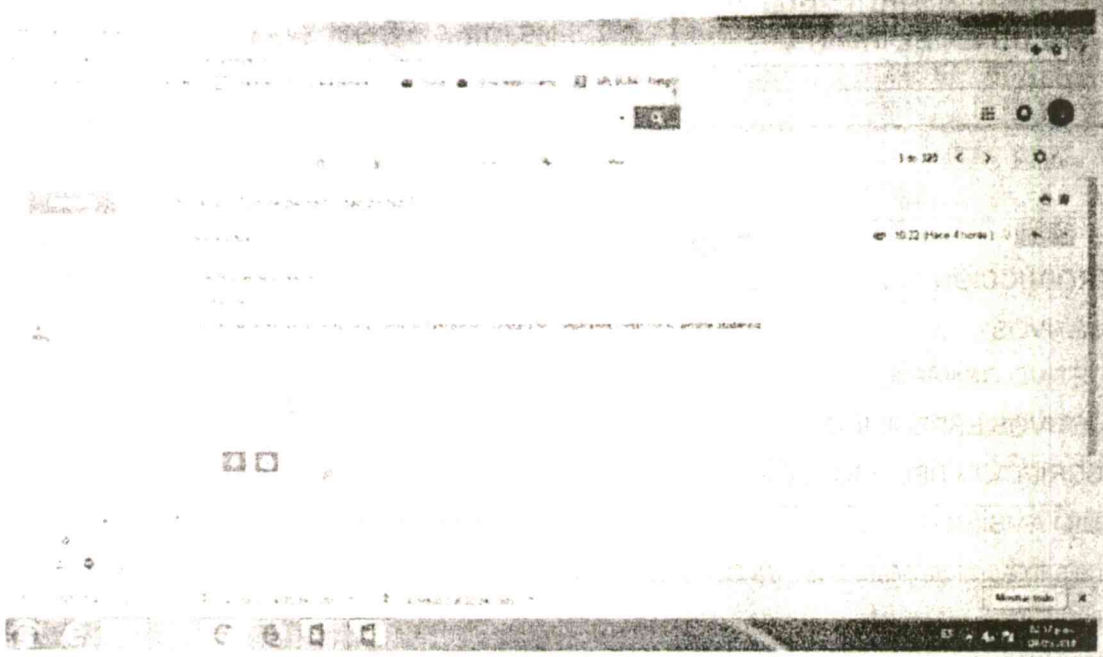

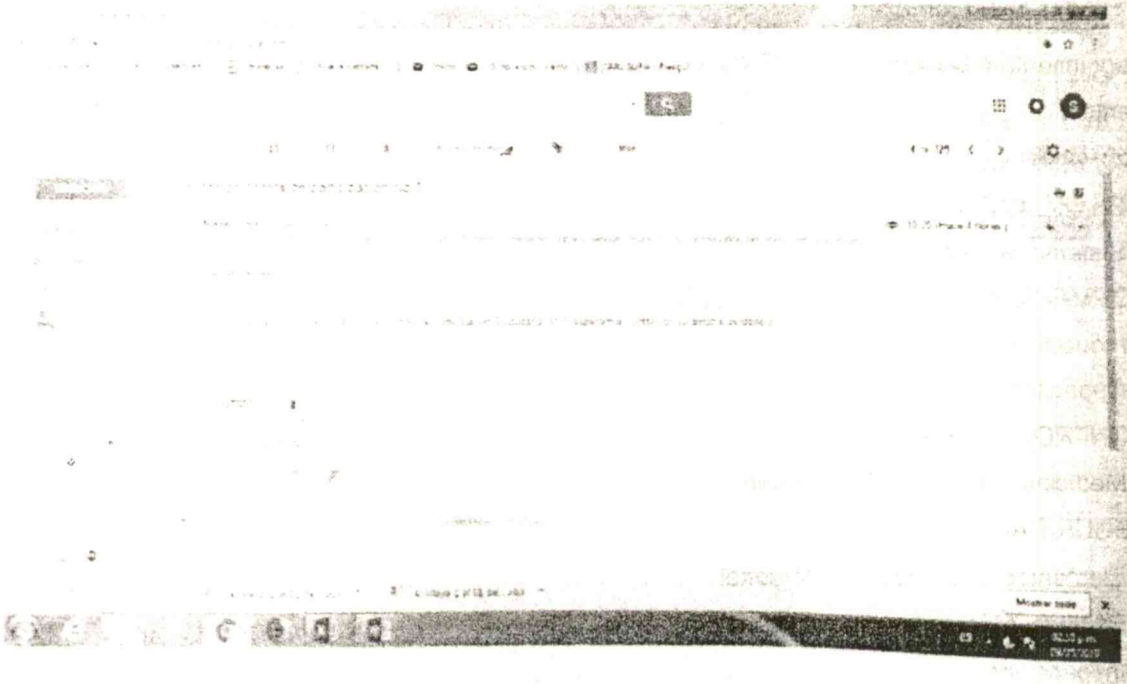

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EL TRIANGULO

COMUNICADO NRO.

INVITACION COMITE PARTICIPACION #3 11 y 12

INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

CONTRATO NRO. CO1.PCONTR.226348

CONSORCIO EL TRIANGULO INFRAESTRUCTURA S.A.S

Fecha: 09- MAYO - 2018

Lugar: SAN FRANCISCO.

Hora: 10:40 AM

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FECHA DE RECIBO	FIRMA
CESAR LOPEZ (RECTOR)	COLSAN FRANCISCO	3105509126	COLSANFRANCISCO592 EPM.NET.CO	09 - MAYO - 2018	ENVIADA VIA CORREO ELECTRONICO
CAMILO ORTIZ	COL SAN FRANCISCO	3102093223	CAMILOFU3@GMAIL.COM		
IVONNE MEDINA	COL SAN FRANCISCO.	3195079946	PROF.IVONNEMEDINA@GMAIL.COM		
CRISTIAN FELIPE OROZCO	COL SAN FRANCISCO.	3173586735	ARISTIANOR3@GMAIL.COM		
EDISSON COTAMO	COL SAN FRANCISCO	3223033873	EDISSON27059@GMAIL.COM		
SERGIO GARCIA	COL SAN FRANCISCO	3107872134	SERGIOMAGARCIA@GMAIL.COM		
JENNY WILCHES	COL SAN FRANCISCO	3197855514	JENNYWILCHES@GMAIL.COM		

SO-F-008 V1

Scanned with CamScanner

55

CONSORCIO PLT ANGULO

COMUNICADO NRO. 10.

INPLAYCO

Tema del Comunicado: INVITACION REUNION DE AVANCE.
PROYECTO "EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.226345

Contratista: CONSORCIO PLT ANGULO — Fecha: 18-ABRIL-2018 — Lugar: SAN FRANCISCO

Interventoria: INPLAYCO S.A.S — Hora: 10:30 AM

No.	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE RECIBO	FIRMA
1	NO ATIENDEN.	KR22A#65-05SUR.	N/A			BAJO PUERTA
2	NO ATIENDEN.	KR22A#65-09SUR.	N/A			BAJO PUERTA
3	SHON CORREA.	KR22A #6522-29 SUR.	3105696998			
4	MARCY SANDRA	CALLE 65S #22-23.	7171497.			
5	MARIA MARTINEZ.	KR22#65-035.	3219049269			
6	JUAN DUARTE.	KR22#64-98S	N/A			
7	ESTEH PARRADO.	KR22#64-90S.	4557443			
8	SEGUNDO CERPA	KR22#64-88S.	5634274			
9	LUIS CASTRO	KR22#64-80S.	N/A			NO FIRMA
10	NO ATIENDEN.	KR22#64-74S.	N/A			BAJO PUERTA.
11	NO ATIENDEN.	KR22#64-62S.	N/A			BAJO PUERTA.
12	NO ATIENDEN	KR22#64-54S.	N/A			BAJO PUERTA.
13	MARIA GOMEZ.	KR22#64-50S.	4554572			
14	LUIS NIÑO	KR22#64-74S.	N/A			
15	MIRIAM ACHIA	KR22#64-36S.	7151993.			
16	NANCY RUTIDO.	KR22#64-28S.	7151553.			-Nancy P.
17	NO ATIENDEN.	KR22#64-22S.	N/A			BAJO PUERTA
18	MARIA REYES.	KR22#64-26S.	N/A			-Mª Fernanda
19	OSCAR RODRIGUEZ.	KR22#64-30S.	3133768251			N/A
20	NO ATIENDEN.	KR22#64-02S.	3133768251			

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
PLT ANGULO

COMUNICADO NRO. 10.

INPLAYCO

INVITACION REUNION DE AVANCE.

PROYECTO: EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.226345

CONSORCIO PLT ANGULO	Fecha: 28-ABRIL-2018	Lugar:	SAN FRANCISCO
INPLAYCO S.A.S.		Hora:	10:30 AM.

NOMBRE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE RECIBO	FIRMA
CLAUDIA RAMOS	KR22#6A-29SUR.				Claudia-CR.

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3**	**CONSORCIO PLT ANGULO** INPLAYCO S.A.S

Código	**N/A**	**Fecha**	16/05/2018	**Inicio**	**11:30am**		**Lugar**	**Colegio San Francisco Sede A (Rectoría)**
Proyecto	" EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."					**Contrato Nro.**	CO1.PCCNTR.226345	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					**Asistentes Externos**	N/A	
Fecha de Elaboración	16/05/2018	**Elaborado por**	Catalina Serrano				**Próxima Reunión**	13/06/2018

Luego el Ing. Edgar Paredes, Residente Técnico del Contratista, informa las actividades adelantadas por el área técnica, entre las que se encuentran: 1. Mampostería y pañetes 2. Urbanismo 3. Cárcamo 4. Cerramientos. Informa que la mampostería del 1er nivel se encuentra al 100% y en el 2do nivel está al 90%. Se encuentra pendiente las fachadas y la cubierta del 2do nivel, debido a que la época de lluvias ha afectado el normal desarrollo del proceso.

Informa también que el día domingo 13 de mayo, estuvo Codensa realizando el arreglo para potenciar la carga eléctrica del jardín.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. El Rector pregunta: **A.** ¿Dónde estará la planta eléctrica? **B.** ¿El suministro eléctrico es para el jardín o para todo el colegio? , **C.** ¿Cómo es el mantenimiento de la planta eléctrica?
RTA: El Arq. Jhon Salas, Residente Técnico de Interventoría informa: **A.** La planta estará ubicada en el área donde estaba acopiado el mobiliario urbano, que ya fue despejada. **B.** Explica que, el suministro será para el colegio y el jardín. **C.** En cuanto al mantenimiento el Ing. Edgar Paredes, explica, que finalizando la obra se entregará los manuales de mantenimiento, en los cuales se especifica el uso y cuidado de la planta eléctrica.
2. El Rector pregunta: **A.** ¿Qué paso con el acceso? **B.** ¿Hay extensión de plazo? , **C.** En el diseño la fachada tenía ventanales redondos ¿Se mantienen?, **D.** ¿Cómo va el avance del teatro?
RTA: El Ing. Edgar Paredes, informa: **A.** Por las lluvias no se ha podido trabajar esta área, debido a que, no se puede rellenar ni compactar. Lo que se hizó fue sacar el agua que se apozo en el sector y por ahora se deja quieto hasta que mejoré el clima, para poder dar continuidad a los trabajos en el acceso. **B.** Se está tramitando una extensión en el plazo, por la afectación que ha representado la temporada de lluvias, la cual no ha permitido avanzar en la cubierta del 2do nivel, y que a su vez retrasa otras actividades dentro del edificio. **C.** Los ventanales se mantiene como están en el diseño, aclara que, el acabado redondo se hace durante el proceso de adecuación e instalación de ventanas. **D.** En cuanto al tema del teatro, explica que, en la parte interna se encuentra en un avance

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3**	**CONSORCIO PLT ANGULO** INPLAYCO SAS

Código	**N/A**	**Fecha**	16/05/2018	**Inicio**	**11:30am**		**Lugar**	**Colegio San Francisco Sede A (Rectoría)**	
Proyecto	" EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."					**Contrato Nro.**	CO1.PCCNTR.226345		
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					**Asistentes Externos**	N/A		
Fecha de Elaboración	16/05/2018	**Elaborado por**	Catalina Serrano				**Próxima Reunión**	13/06/2018	

publicación de la misma en los Puntos satélites y porterías del colegio; explica que, para este período se realizó la entrega de veintiocho (28) comunicados correspondientes a: invitación reunión de avance e invitación a comité de participación No.3, las invitaciones al comité fueron enviadas vía correo electrónico a los integrantes del comité.

2. Programa de Participación Ciudadana: Tiene por objeto realizar el seguimiento mensual del proyecto, a través del comité de Participación Ciudadana. Para tal fin el día 04 de abril de 2018, se realizó el comité de participación ciudadana No.2.

3. Programa de Atención al Ciudadano: Se recordó a los asistentes que durante la ejecución de la obra se brinda atención a la comunidad en el Punto de Atención, al cual pueden acudir ante cualquier duda, inquietud y/o sugerencia; este se encuentra ubicado en la Carrera 22 No.64-29 Sur (Acceso por la calle 65 Sur, obra en construcción), Barrio San Francisco, Correo electrónico: socialobrass@gmail.com, Teléfono: 3102784652. El horario de atención es el día miércoles de 9:00am a 11:00am. Mencionó también que, a la fecha no se han recibido PQRS.

4. Programa de Generación de Empleo: Cuyo objetivo es brindar empleo a personas residentes en la Localidad de Ciudad Bolívar y/o personas de los estratos 1 y 2, para actividades de mano de obra no calificada (MONC).

Explica que a la fecha se cuenta con un total de 42 personas vinculadas a la obra, de las cuales 26 pertenecen a mano de obra calificada y 16 a mano de obra no calificada (el personal de mano de obra no calificada, reside en su mayoría en la Localidad de Ciudad Bolívar y/o pertenecen a los estratos 1 y/o 2), cumpliendo con un total de 38% de vinculación de mano de obra no calificada perteneciente a la Localidad, superando el porcentaje requerido por la Secretaria de Educación del Distrito el cual es del 30%.

5. Programa de Sostenibilidad: Con respecto a las estrategias pedagógicas señala que, dentro de esta estrategia de sostenibilidad se enmarcan los talleres de **"uso, mantenimiento y conservación de la planta física".** El día 02 de mayo se realizó reunión con el Rector, donde se programaron las fechas tentativas para la realización de los talleres, se informa que, estos espacios son responsabilidad directa de la SED; por lo cual se está a la espera de la verificación para la viabilidad de ejecutarlos en las fechas solicitadas.

Posteriormente menciona las actividades adelantadas desde el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, entra las que se encuentran: capacitación al personal de la obra, pausas activas, seguridad vial, señalización y protección. Todas las actividades están encaminadas a lograr un mejor ambiente de trabajo, que repercute en calidad de vida de los trabajadores y un mayor cuidado del bienestar de la comunidad educativa.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3**	**CONSORCIO PLT ANGULO** INPLAYCO S.A.S

Código	**N/A**	**Fecha**	16/05/2018	**Inicio**	**11:30am**		**Lugar**	**Colegio San Francisco Sede A (Rectoría)**
Proyecto	" EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."					**Contrato Nro.**	CO1.PCCNTR.226345	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					**Asistentes Externos**	N/A	
Fecha de Elaboración	16/05/2018	**Elaborado por**	Catalina Serrano				**Próxima Reunión**	13/06/2018

Siendo las 11:30 am, se reunieron las personas que aparecen en la lista de asistencia adjunta, en el Colegio San Francisco Sede A (Rectoría), ubicado en la Carrera 22 No.64-29 Sur, para tratar el tema relacionado con el avance de la obra para la primera infancia en el Colegio San Francisco Sede A.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y bienvenida
2. Avances Componente Técnico
3. Avances Componente Social
4. Inquietudes de la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Residente Social del Contratista Catalina Serrano, da la bienvenida y agradece la asistencia a la reunión No.03 del Comité de Participación Ciudadana. Informa que el objetivo es presentar las actividades y avances del componente social y técnico, durante el período del 04 de abril al 15 de mayo de 2018.

Seguido a esto la Residente Social, explica las actividades adelantadas a través del programa de Gestión Social, el cual tiene como objetivo mitigar el impacto generado por la obra en la comunidad, esta gestión se realiza a través de cinco programas:

1. Programa de Divulgación e Información: El cual busca informar a la comunidad sobre el proyecto y resolver las inquietudes que se tienen del mismo, a través de las reuniones de inicio, avance, finalización de obra, reuniones extraordinarias, entrega de comunicados e instalación de Puntos Satélites de Información.

Dentro de este componente el día 25 de abril de 2018, se realizó la reunión de avance, pero no asistieron representantes de la comunidad educativa (rector, docentes, estudiantes y/o padres de familia). A pesar que se realizó la entrega de la invitación puerta a puerta, y

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3**	**CONSORCIO PLT ANGULO** INPLAYCO S.A.S

Código	**N/A**	**Fecha**	16/05/2018	**Inicio**	**11:30am**		**Lugar**	**Colegio San Francisco Sede A (Rectoría)**
Proyecto	" EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED."					**Contrato Nro.**	CO1.PCCNTR.226345	
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					**Asistentes Externos**	N/A	
Fecha de Elaboración	16/05/2018	**Elaborado por**	Catalina Serrano				**Próxima Reunión**	13/06/2018

aproximado del 80%. Sin embargo, se encuentra pendiente el cambio de las puertas externas, lo que implica un trámite administrativo que está en proceso de aprobación, por ser un ítem que no estaba previsto.

3. El Docente Camilo Ortiz pregunta ¿la cancha se va a dejar así?

RTA: El Ing. Edgar Paredes, explica, que se realizaron los cárcamos, y, explica que las canchas no se encuentran dentro del área de intervención del proyecto, no obstante, el Contratista realiza la entrega de estas en igual o mejores condiciones de las que se encontraban.

4. La docente Ivonne Medina pregunta ¿La cancha se va a entregar en un mes?

RTA: El Ing. Edgar Paredes, informa que, esta área se entrega al finalizar la obra, debido a que el proyecto es un conjunto, el cual se entrega completo y no se hacen entregas parciales.

5. El Rector pregunta ¿Dónde van a llegar las aguas residuales?

RTA: El Ing. Edgar Paredes, explica que las conexiones se harán a las cajas recolectoras que ya se encuentran en el colegio.

6. El Rector solicita que para el próximo comité se realice un recorrido con los integrantes del comité en la obra, se informa que ocho días antes de la fecha del comité se comunicará la viabilidad de la solicitud.

7. Para finalizar se acuerda entre los asistentes realizar la próxima reunión de comité de participación el día 13 de junio de 2018. Debido a que no han asistido los estudiantes, el docente Camilo Ortiz informa, que invitará al personero y al contralor de los estudiantes a participar del próximo comité.

BOGOTÁ

CONSORCIO
PLT ANGULO

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA


INPLAYCO


Tema de la Reunión	COMITE DE PARTICIPACION #3. PROYECTO "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"			Proceso:	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.226345
Area Responsable	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	Fecha:	16-MAYO-2018	Lugar	RECTORIA-COLEGIO SAN FRANCISCO.
Contratista responsable	CONSORCIO PLT ANGULO			Hora:	11:30 AM.


No.	NOMBRE	ROL	INSTITUCION	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Camilo Ortiz	Docente	C. San Francisco	-	camilo7913@hotmail.com	
2	Cesar A. Lopez M.	Rector	San Francisco	7174211	Celopezmalagon	
3	Edgar Yesid Paredes	Ing. Residente	Consorcio PLT Angulo	3103366393	edgar.y.paredes@gmail.com	
4	Ivonne Maritza Medina	Docente	Col. San Francisco	7189313	prof.ivonnemmedina@gmail.com	
5	John Solos Torres	Arq. Interventor.	INPLAYCO	3332619761	johnsolto@gmail.com	
6	CATALINA SERRANO	RES. SOCIAL	PLT ANGULO.	—	SOCIALPLTA@GMAIL.COM	
7	Alejandra Paez Correño	RES. SOCIAL	INPLAYCO	—	inpersocialregistro	Alejandra Paez C.
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No.3
16 de Mayo de 2018

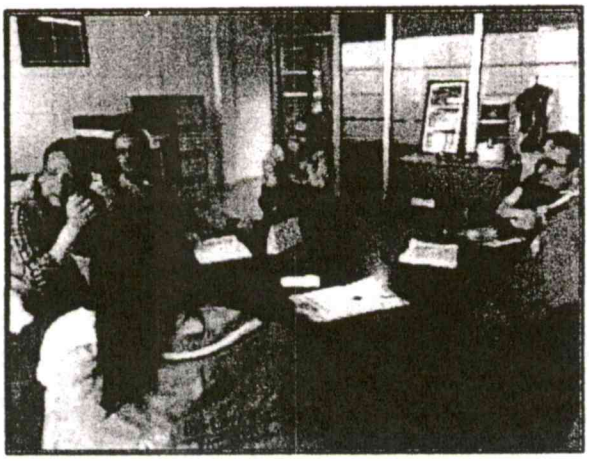

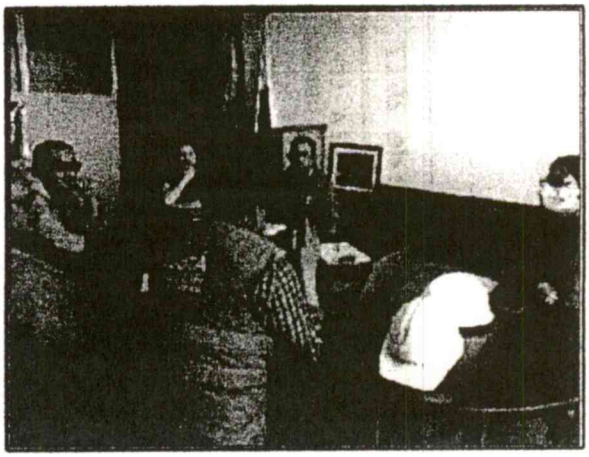

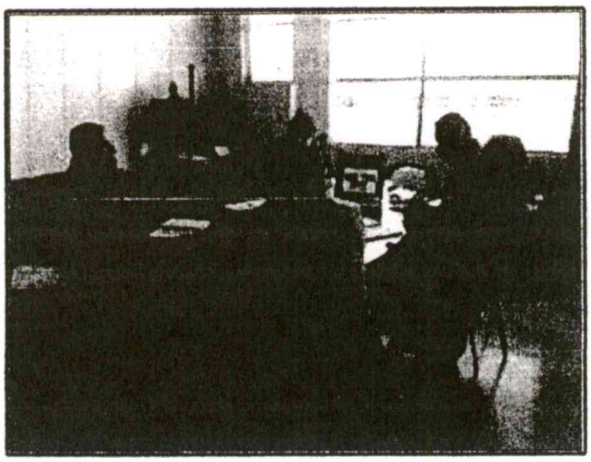

14/05/2018

CONTRATO DE OBRA: No. CO1.PCCNTR.226345

"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

CONTRATISTA: CONSORCIO PLT ANGULO

INTERVENTORIA: INPLAYCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AGENDA DEL DÍA

1. Presentación y bienvenida
2. Actividades Componente Social
3. Avances Componente Técnico
4. Aclaración de Inquietudes

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

PRESENTAR LAS ACTIVIDADES Y AVANCES DEL COMPONENTE SOCIAL Y TÉCNICO, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018, CORRESPONDIENTE A LA OBRA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A


Generalidades del Proyecto

Proyecto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.226345
Objeto del Contrato:	Ejecución de las obras para la primera infancia en el Colegio San Francisco Sede A - CPF 1964, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED
Localización:	Localidad Ciudad Bolívar, Barrio San Francisco
Contratista:	Consorcio PLT Angulo
Plazo ejecución total:	6 meses
Fecha de Iniciación Contrato:	18 de diciembre de 2017
Fecha de terminación Contrato:	17 de junio de 2018
Interventoría:	INPLAYCO SAS CO1.PCCNTR.226198

Este es el Equipo del Contrato

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	INTERVENTORIA INPLAYCO S.A.S	CONTRATISTA CONSORCIO PLT ANGULO
Supervisión Técnica: Arq. Mauricio Sanjuan.	DIRECTOR INTERVENTORIA Arq. Edgar Rios	DIRECTORA OBRA Arq. Paola Lopez
	RESIDENTE INTERVENTORIA Arq. Jhon Soto	RESIDENTE OBRA Ing. Edgar Paredes
	RESIDENTE SST Ing. Felipe Maria	RESIDENTE SST Ing.
	RESIDENTE AMBIENTAL Ing. Felipe Maria	RESIDENTE AMBIENTAL Ing.Lorena Zuñiga
	RESIDENTE SOCIAL T.S. Alejandra Paez	RESIDENTE SOCIAL T.S. Catalina Serrano

COMPONENTE SOCIAL

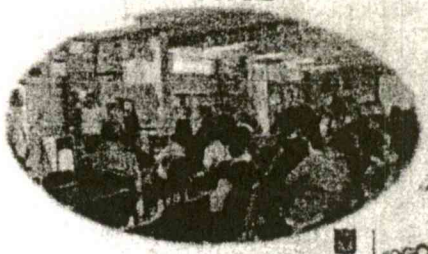

Scanned with CamScanner

1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

- REUNIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA	LUGAR
REUNIÓN DE AVANCE DE OBRA	25/04/2018	CARRERA 22 No 64-29 SUR COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A

1. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

- ENTREGA PIEZAS DE DIVULGACIÓN

2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Ubicación Punto de Atención: Carrera 22 No 64-29 Sur (Acceso por la calle 65 Sur, obra en construcción)
- Línea Telefónica: 3102784652
- Correo electrónico: socialobrass@gmail.com
- Horario de atención: Miércoles de 9:00am a 11:00am
- Responsable de la atención: T.S Catalina Serrano, Residente Social

La Oficina de Atención a la Comunidad permite establecer un canal de comunicación directo con la comunidad.

4. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Se cuenta con un total de cuarenta y dos (42) personas vinculadas a la obra, de las cuales dieciseis (16) pertenecen a MONC (Mano de obra no calificada) y veintiséis (26) corresponden a MOC (Mano de obra calificada). El personal de MONC reside en la Localidad de Ciudad Bolívar y/o pertenecen a los estratos 1 y/o 2, por lo cual se cumple con un total de 38% de vinculación de mano de obra no calificada perteneciente a la Localidad, superando el porcentaje requerido por la Secretaría de Educación del Distrito, el cual es del 30%.


5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

- ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

El día 02 de mayo se realizó reunión con el Hector, donde se programaron las fechas tentativas para la realización de los talleres de sostenibilidad **"uso, mantenimiento y conservación de la planta física"**, estos espacios son responsabilidad directa de la SED; se esta a la espera de la verificación para la viabilidad de ejecutarlos en las fechas solicitadas.

Scanned with CamScanner




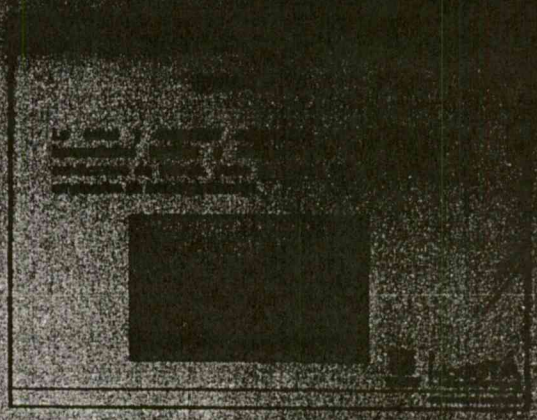








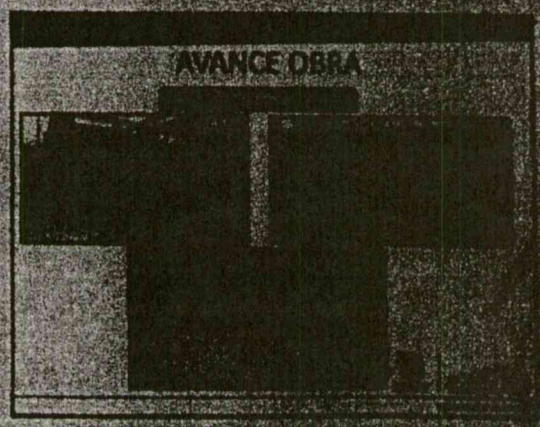

Scanned with CamScanner

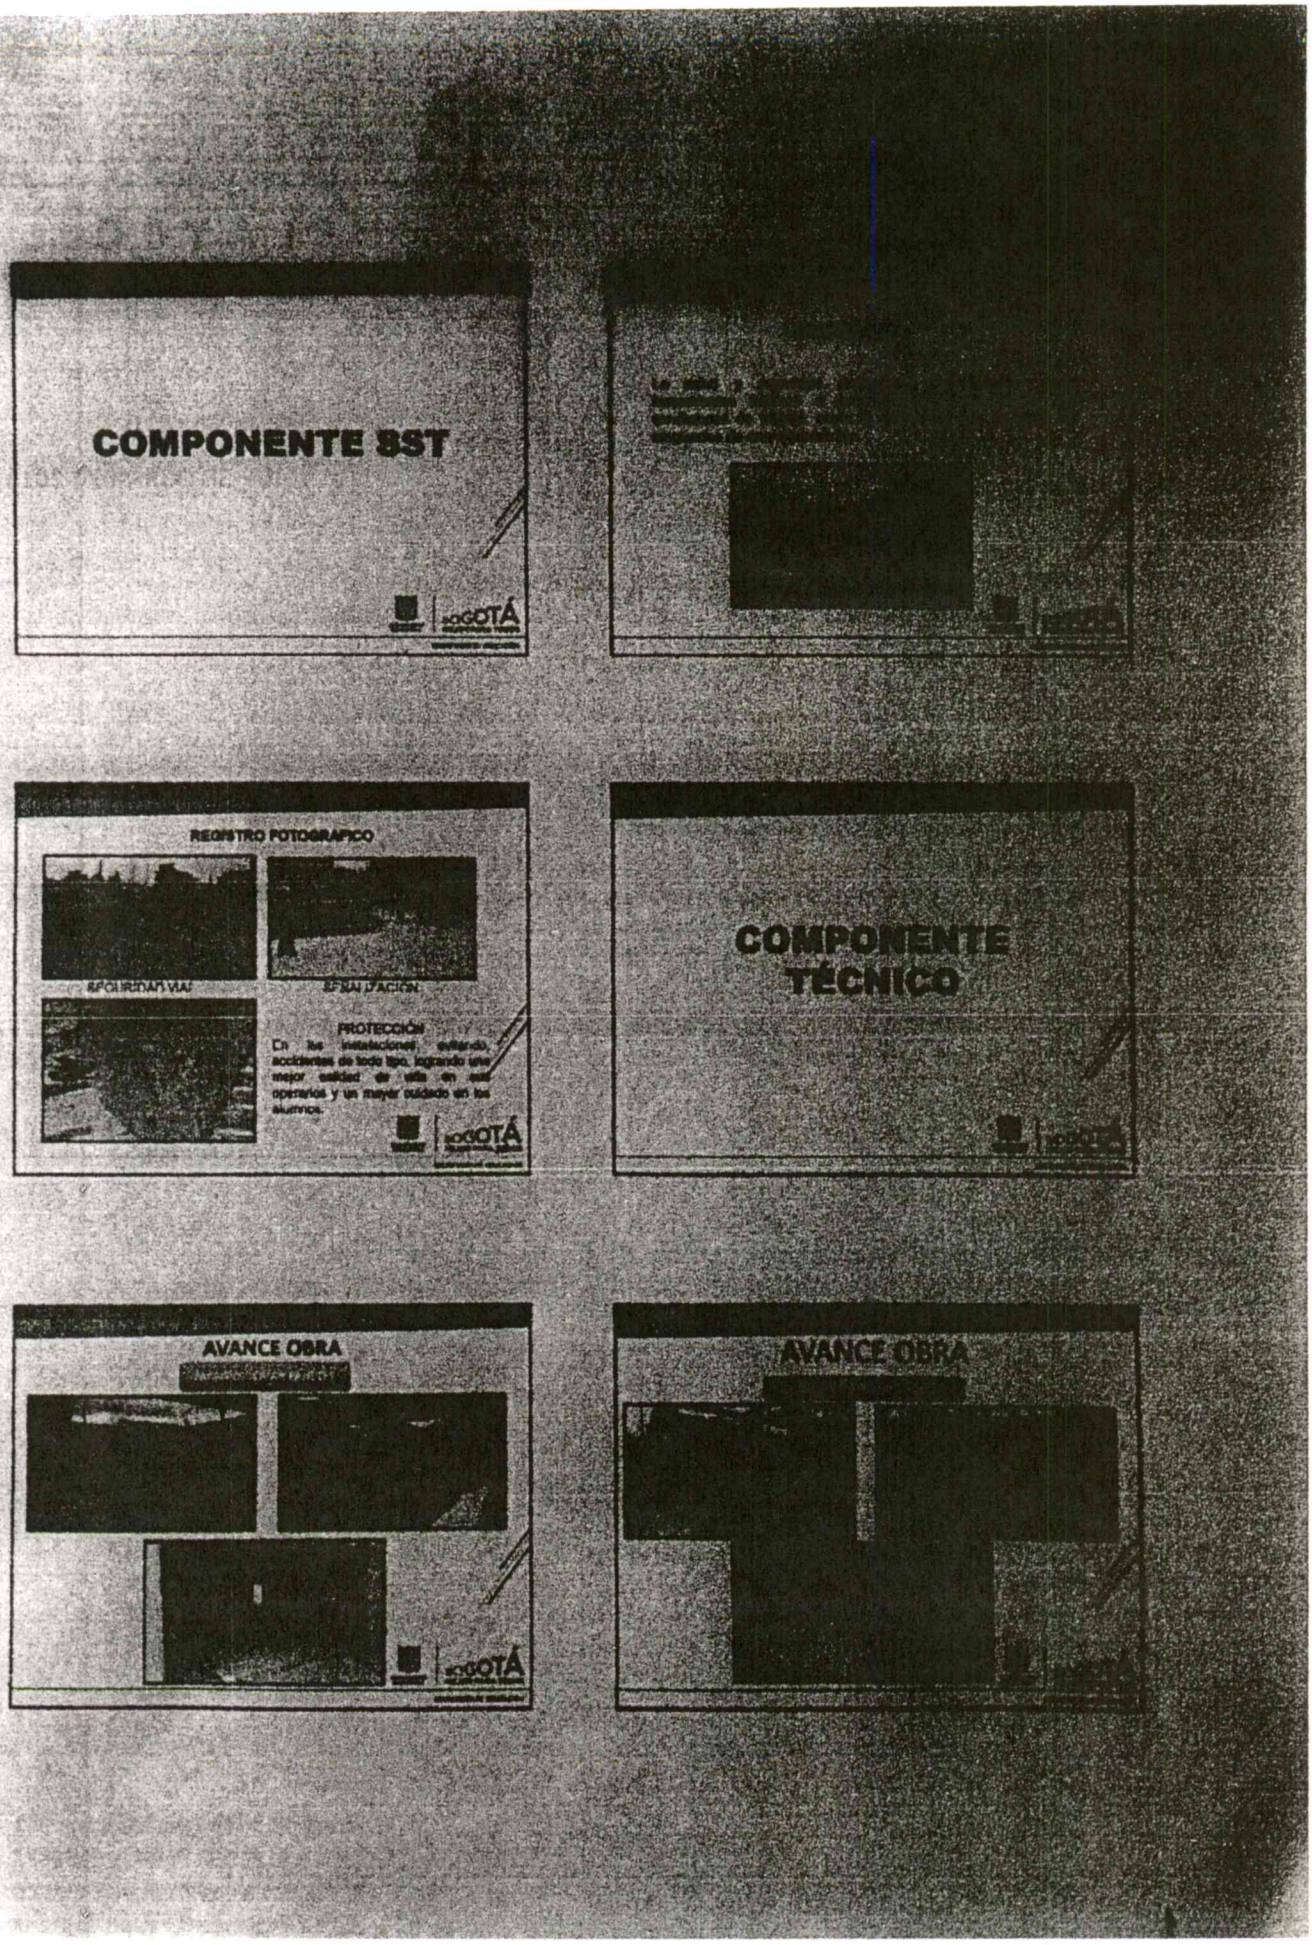

Scanned with CamScanner

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.226345 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

CONSORCIO FLT ANGULO

INPLAYCO

LISTADO PERSONAL DE OBRA
COLEGIO SAN FRANCISCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NO	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA INGRESO	LOCALIDAD	RETIRADO	CERTIFICADO
28	ORLANDO	ALVAREZ	98.138.124	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	03-abr-18	TOCANCIPA		N/A
29	ANTONIO JOSE	MONCADA FANDIÑO	1.232.391.926	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	06-abr-18	CIUDAD BOLIVAR		INF 4
30	JIMMY ALEXANDER	GARCIA CHIRIVI	80.183.251	OFICIAL	HIDROSANITARIO	09-abr-18	SOACHA		N/A
31	JOSE EULISES	ARAGON	93.080.261	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	05-abr-18	SUBA		N/A
32	DAIRON FELIPE	TRILLOS	1,023,973,893	SISO	AG SOLUCIONES	17-abr-18	SAN CRISTOBAL		N/A
33	JORGE YECID	CAMARGO GARAVITO	79,892,512	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	18-abr-18	SAN CRISTOBAL		N/A
34	JOSE OCTAVIO	ESPINOSA RODRIGUEZ	80.366.860	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	18-abr-18	KENNEDY		N/A
35	LUIS ALFONSO	GAVIRIA AGUDELO	1.113.038.047	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	22-mar-18	CAJICA		N/A
36	JULIO CESAR	OROZCO HERNANDEZ	12.632.493	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	26-abr-18	CIUDAD BOLIVAR		INF 5
37	ALIRIO	SUAREZ	7.687.099	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	26-abr-18	BOSA		N/A
38	ISRAEL	SUAREZ HERNANDES	1.073.985.871	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	26-abr-18	CIUDAD BOLIVAR		INF 5
39	ALBEIRO	PINTO	1.045.249.066	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	04-may-18	BOSA		N/A
40	ADOLFO	CASTILLO	19.181.009	SOLDADOR	CONSTRUNCSAN	04-may-18	USME		N/A
41	LUIS FRANCISCO	ROJAS	1.019.028.071	SOLDADOR	CONSTRUNCSAN	04-may-18	SUBA		N/A
42	LUIS GABRIEL	SAMPAYO GOMEZ	1.116.790.090	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	04-may-18	CIUDAD BOLIVAR		INF 5
43	JHON JAIME	SANCHEZ MOLINA	80.749.667	OFICIAL	CONSTRUNCSAN	11-may-18	FONTIBON		N/A
44	RAFAEL	IBAÑEZ VERGARA	19.300.333	OFICIAL	CONSTRUNCSAN	09-may-18	RAFAEL URIBE		N/A
45	JONATHAN	IBAÑEZ MONGUA	1.030.601.775	OFICIAL	CONSTRUNCSAN	10-may-18	SUBA		N/A
46	URIEL	IBAÑEZ VERGARA	79.308.407	OFICIAL	CONSTRUNCSAN	10-may-18	RAFAEL URIBE		N/A
47	WILIAM ANDRES	ALVAREZ DUSSAN	7.729.089	AYUDANTE PINTURA	CYRA	15-may-18	USME		N/A
48	JAIRO HERNANDO	HERNANDEZ CASTAÑEDA	79.118.670	SOLDADOR	CYRA	15-may-18	TUNJUELITO		N/A
49	LUIS ALBERTO	PABUENA ARRIOLLA	1.102.576.450	OFICIAL	CONSTRUNCSAN	16-may-18	USAQUEN		N/A
50	JUAN CARLOS	VELAZQUEZ TORRES	1.020.738.392	OFICIAL	CONSTRUNCSAN	16-may-18	USAQUEN		N/A

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.226345 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

CONSORCIO FLT ANGULO

INPLAYCO

LISTADO PERSONAL DE OBRA
COLEGIO SAN FRANCISCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NO	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	CONTRATISTA	FECHA INGRESO	LOCALIDAD	RETIRADO	CERTIFICADO
1	PAOLA	LOPEZ TRIVIÑO	52.215.791	DIRECTORA DE OBRA	CONSORCIO	18-dic-17	SUBA		N/A
2	EDGAR	PAREDES	79.506.318	RESIDENTE ING	CONSORCIO	18-dic-17	SALITRE		N/A
3	SEBASTIAN	MANRIQUE	1.019.130.587	AUXILIAR ING.	CONSORCIO	16-ene-18	SUBA		N/A
4	MARCO ANTONIO	MORENO	19.228.691	MESTRO	CONSORCIO	09-ene-18	SAN CRISTOBAL		N/A
5	ANDREA CATALINA	SERRANO VARGAS	1.022.925.431	GESTION SOCIAL	CONSORCIO	18-dic-17	KENNEDY		N/A
6	JOAQUIN	UMAÑA	1.232.397.428	AYUDANTE	CONSORCIO	09-ene-18	OLAYA		N/A
7	JESUS DAVID	PEREZ PEDROZO	1.073.710.920	OFICIAL	ESTRUCTURAS	19-dic-18	SOACHA		INF 2
8	FARID LEONARDO	RIVERA QUIROZ	1.193.410.028	AYUDANTE	ESTRUCTURAS	18-dic-18	CIUDAD BOLIVAR		INF 4
9	LUIS CARLOS	PEREZ	1.004.325.082	AYUDANTE	PINILLA	31-ene-18	SAN CRISTOBAL		N/A
10	VITALIANO	RODRIGUEZ	80.360.018	OFICIAL	ESTRUCTURAS	15-feb-18	SOACHA		N/A
11	JOSE DE JESUS	MEDINA CAMPO	80.279.835	OFICIAL	ESTRUCTURAS	20-feb-18	CIUDAD BOLIVAR		N/A
12	JESUS ALIRIO	PEREZ	79.218.750	OFICIAL	ESTRUCTURAS	09-feb-18	BOSA		N/A
13	OSCAR ANDRES	PEREZ	80.144.185	OFICIAL	AG SOLUCIONES	09-feb-18	BOSA		N/A
14	DAMIAN	CASTRO YEPEZ	1.085.180.136	OFICIAL	ESTRUCTURAS	30-ene-18	BOSA		N/A
15	JIMMY ANDRES	VIVAS ROMERO	1.026.252.162	OPERARIO DE MINI CARGADOR	VIVAS EDILBERTO	26-feb-18	KENEDY		N/A
16	JAIR	GOMEZ	1.106.307.699	TECNICO ELECTRICISTA	Ingycons LTDA	05-mar-18	USME		N/A
17	JHON EDISSON	VARELA JIMENEZ	1.073.684.346	SOLDADOR 1A	CONSTRUNCSAN	12-mar-18	SOACHA		N/A
18	JAIBER	SALAS SANCHEZ	80.366.971	ELECTRICO	Ingycons LTDA	14-mar-18	RAFAEL URIBE		N/A
19	LUIS FRANCISCO	SANCHEZ ROJAS	1.019.028.071	SOLDADOR 1A	CONSTRUNCSAN	14-mar-18	SUBA		N/A
20	OSCAR JAVIER	VELAZQUEZ TORRES	1.020.778.265	AYUDANTE PINTURA	CONSTRUNCSAN	14-mar-18	USAQUEN		N/A
21	JUAN DIEGO	PULIDO URIBE	80.744.459	MAESTRO	AG SOLUCIONES	24-mar-18	CAJICA		N/A
22	EBERTO	URBINA TORRES	1.101.451.473	OFICIAL	AG SOLUCIONES	24-mar-18	SUBA		N/A
23	JOSE ELAIME	ITIAM	83.224.453	AYUDANTE	AG SOLUCIONES	02-abr-18	CIUDAD BOLIVAR		INF 4
24	NICOLAS	GARCIA ZULUAGA	79.103.253	AYUDANTE	CONSTRUNCSAN	02-abr-18	SUBA		N/A
25	OSCAR	MANCILLA	13.107.646	OFICIAL	AG SOLUCIONES	02-abr-18	SAN CRISTOBAL		N/A
26	ORLANDY	CHARRY PEREZ	93.421.560	AUXILIAR ELECTRICO	Ingycons LTDA	03-abr-18	ALFONSO LOPEZ		N/A
27	OSCAR JAVIER	GODOY GRANADA	1.071.548.852	OFICIAL	AG SOLUCIONES	03-abr-18	BOSA		N/A

BARRIO JUAN JOSE RONDON SECTOR EL PLAN
LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR
JUNTA DE ACC/ON COMUNAL PERSONERIA
JURIDICA 00856 MARZO 21186 MINGOBIERNO NIT. 800 164.145-5

Hace Constar

Que el Señor ISRAEL SUAREZ HERNANDES identificado con CEDULA DE CUIDADANIA número 1.073.985.871, Reside en la Calle 63 F Sur 18Q-16; Estrato 1 desde hace tres (3) Años.

Durante este tiempo se ha destacado por su alta calidad humana y moral, su responsabilidad y sana convivencia dando cumplimiento de las normas que rigen la calidad de vida de nuestro sector.

La presente se expide en Bogotá D.C. A los 30 días del mes de abril de 2018.

Cordialmente.

Giovanni Baquero Hernández
Presidente JAC
Cel. 3194589696

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

CONSORCIO PLT ANGULO
INPLAYCO S.A.S.

Código	—	Fecha	02-05-2018	Inicio	10:30 AM	Lugar	RECTORIA COLEGIO SAN FRANCISCO.
Proyecto	" EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE A - CPF 1964, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED "					Contrato Nro.	CO1.PCCNTR.226345
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia					Asistentes Externos	N/A.
Fecha de Elaboración	02-04-2018	Elaborado por	CATALINA SERRANO.			Próxima Reunión	—

SE REALIZA REUNIÓN CON EL RECTOR, A FIN DE PROYECTAR EL CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE SOSTENIBILIDAD. EL RECTOR INFORMA QUE ESTA ACTIVIDAD SE ORGANIZA CON LOS COORDINADORES Y REALIZA EL ENLACE PARA LO PERTINENTE.
LA COORDINADORA DE LA JORNADA MAÑANA ZORAY MUÑOZ INFORMA QUE SE REALIZARÍA UN TALLER CON EL GRUPO PRAES (PREVENCIÓN DE RIESGO ESCOLAR Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE), EL GRUPO ESTA CONFORMADO POR UN REPRESENTANTE DE CADA CURSO.
LA FECHA PROPUESTA ES EL LUNES 21 DE MAYO DE 6:30AM A 7:30AM.
PARA LA JORNADA DE LA TARDE EL COORDINADOR FRANCISCO ANGELES INFORMA QUE SERÍA EL 25 DE MAYO DE 2018 DE 4:30PM - 5:30PM CON EL GRUPO PRAES.

SE INFORMA QUE SE PASARÁN LAS FECHAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LA ACTIVIDAD EN LAS FECHAS PLANTEADAS.
PARA FINALIZAR SE ACUERDA CON EL RECTOR REALIZAR EL PRIMER COMITÉ DE PARTICIPACIÓN EL 16 DE MAYO DE 2018; EL RECTOR PREGUNTA PARA CUANDO QUEDA LA ENTREGA DEL TEATRO Y SOLICITA QUE SE DE RESPUESTA A ESTA INQUIETUD EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN.

Scanned with CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA
CONSORCIO PLT ANGULO

CODIGO
VERSION
FECHA

Resolución 1409 de 2012, Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas.

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA

Empresa: AC Soluciones | Area: | Fecha: 15/05/2018

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas SI/NO	Profesión	Verificación de la Seguridad Social
Jesus Elvis Perez			
Oscar Andres Perez			
[illegible]			

Descripción de la tarea a realizar:

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 3 mts. | Hora de Inicio: 8:00 AM | Hora final:

Sistemas de Acceso a Utilizar:	Andamio X	Escalera	Elevador de Personal o Grua con canasta	Simultaneo con otras tareas de alto riesgo:	Espacion Confinados	Trabajo en caliente	Energias Peligrosas

Otros (¿Cuáles?)

Requisitos del trabajador (requerimientos de aptitud)

4°
5°
6°

Descripción del procedimiento para desarrollar la tarea:

Equipos de protección personal, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea

Línea de vida vertical	Si / No	Eslinga de posicionamiento	Si / No	Sistemas de anclaje	Si / No	Arnés de cuerpo entero	Si / No	Guantes	Si / No
Línea de vida horizontal	Si / No	Eslinga	Si / No	Casco con barboquejo	Si / No	Señalización del área	Si / No	Gafas	Si / No

Otros Elementos de Protección personal(¿Cuales?)

Herramentas a utilizar:

LISTA DE CHEQUEO

ITEM	Si	No	N/A
Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar el área.	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para el área.	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal	✓		
Se ha verificado la formación en alturas del personal esté	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente.	✓		
Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona, y no permitir el paso de vehículos o personas.	✓		
Se cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caidas.	✓		
Se cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida.	✓		
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los trabajadores.	✓		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro.	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos.	✓		
Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de prevención establecidas en la evaluación de riesgos.	✓		

ITEM	Si	No	N/A
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.			X
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.	✓		
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.	✓		
Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio	✓		
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.	✓		
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos.	✓		
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	✓		
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas.	✓		

Observaciones:

Nombre y Cedula de los trabajadores autorizados	Firma
Jesus Elvis Perez 79218720	Jesus Elvis Perez
Oscar Andres Perez 80144185	Oscar Andres Perez
[illegible]	[illegible]
Nombre y Cedula de la persona que autoriza	Firma
[illegible]	[illegible] 80866407

Permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA
CONSORCIO PLT ANGULO

CODIGO
VERSION
FECHA

Resolución 1409 de 2012, Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas.

Este permiso debe ser diligenciado por el empleador o contratante antes de iniciar cualquier actividad que involucre trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser implementado por el trabajador independiente o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA

Empresa: PS Soluciones Area: Fachada Eje 2 Fecha: 16/05/2018

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Cumplimiento de certificación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas SI/NO	Profesión	Verificación de la Seguridad Social
1° Alberto Urbina Torres	SI	OF	1101451473
2° Cesar Cador	SI	OR	
3° Rafael Ibañez			
4° Juan Pulido	SI	of.	

Descripción de la tarea a realizar.

Área destinada a la cual se va a desarrollar la actividad _____ mts Hora de Inicio. Hora final

Sistemas de Acceso a Utilizar: Andamio Escalera Elevador de Personal o grua con canasta Simultaneo con otras tareas de alto riesgo Excavacion Confinados Trabajo en caliente Energias Peligrosas

Otros (cuales?)

Otros (cuales?)

Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud)

4°

5°

6°

Descripcion del procedimiento para desarrollar la tarea

Equipos de proteccion personal, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea

Arnes de vida Vertical	SI☐No☐	Eslinga de posicionamiento	SI☐No☐	Sistemas de anclaje	SI☐No☐	Arnés de cuerpo entero	SI☐No☐	Guantes	SI☐No☐
Arnes de vida Horizontal	SI☐No☐	Eslinga	SI☐No☐	Casco con barboquejo	SI☐No☐	Señalización del area	SI☐No☐	Gafas	SI☐No☐

Otros Elementos de Proteccion Personal(cuales?)

Herramientas a utilizar

ITEM	SI	No	N/A
Verificó el diligenciamiento y firma del permiso (Aval)			
El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.			
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea			
El personal cuenta con el equipo definido para acceder			
Verificó que el personal fue inspeccionado			
Verifico que la formación en alturas del personal corresponde al trabajo a realizar.			
El área donde se ejecutara el trabajo esta aislada y señalizada completamente			
Ha instalado mamparos o cinta para aislar y restringir la zona y no permitir el paso de vehículos o personas			
Están con eslinga de seguridad con absorbente de energía			
Están con freno de seguridad, certificado y			
Cuenta con líneas de vida para cada uno de los trabajadores			
Las cuerdas se encuentran libres de nudos			
Los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación			

Observaciones

LISTA DE CHEQUEO ITEM	SI	No	N/A
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos			
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			
Se controlaran los riesgos presentes en el sitio de trabajo			
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario			
Línea de vida o una estructura donde el trabajador			
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate			
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios			
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios			
Los cauces o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm del andamio			
Se ha diligenciado de los elementos necesarios para izar			
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos			
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio con garfio se encuentran en buen			
Las barandas de andamio cumplen con las especificaciones técnicas			

Alberto Urbina 1101451473
Juan Pulido
Rafael Ibañez
Nombre y Cedula de la persona que autoriza
Cesar Cador.

Firma

Trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección personales, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, pértigas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA
CONSORCIO PLT ANGULO

CODIGO
VERSION
FECHA

Resolución 1409 de 2012, Articulo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas.

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Empresa: Construcsan S.A.S. Area: PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA Fecha: 14 de Mayo 2019

	Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas SI/NO	Profesión	Verificación de la Seguridad Social
1°	Omar Mendoza		Soldador	✓
2°	Shon Varela		Soldador	
3°	Wilmer Guerra		Soldador	
4	Oscar Velasquez		Pintor	

Descripción de la tarea a realizar
Instalacion Pintura estructura metalica y aplicacion pintor soldadura para fijar.

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 2,5 mts. Hora de Inicio: 8:00 am Hora final:

Tipos de Acceso a Utilizar: Andamio ✗ Escalera Elevador de Personal o Grua con canasta Simultaneo con otras tareas de alto riesgo: Espacion Confinados Trabajo en caliente Energias Peligrosas

Otros (¿Cuáles?) Otros (¿Cuales?)

Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud,
1° Certificado de alturas vigente 4°
2° examen medico 5°
3° planillas seguridad social. 6°

Descripción del procedimiento para desarrollar la tarea:

Equipos de protección personal, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea.

Linea de vida vertical	Si ✓ No	Eslinga de posicionamiento	Si ✓ No	Sistemas de anclaje	Si ✓ No	Arnés de cuerpo entero	Si ✓ No	Guantes	Si ✓ No
Linea de vida horizontal	Si ✓ No	Eslinga	Si ✓ No	Casco con barboquejo	Si ✓ No	Señalizacion del area	Si ✓ No	Gafas	Si ✓ No

Otros Elementos de Proteccion personal(¿Cuales?)

Herramientas a utilizar: Equipo de soldadura, manila, diferencial

ITEM	Si	No	N/A
...e realizo el análisis de seguridad en el trabajo. (AST)	X		
...l personal cumple con los requisitos de aptitud para ...alizar la tarea	X		
...l personal cuenta con el equipo de protección definido ...ra la tarea.	X		
...l personal cuenta con el equipo definido para acceder al ...tio.	X		
...l equipo para acceder al sitio y el de protección personal ... ...apacionados.	X		
... que la formación en alturas del personal esté ...al trabajo a realizar	X		
...l sitio donde se ejecutara el trabajo esta aislado y ...ñalizado completamente	X		
...e han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la ...ma y no permitir el paso de vehículos o personas.	X		
...ientan con eslinga de seguridad con absorbente de ...idas.	X		
...ientan con frer o de seguridad certificado y apropiado ...ra el tipo de linea de vida	X		
... cuenta con lineas de vida para cada uno de los ...eradores.	X		
...s conectores o mosquetones son de doble seguro.	X		
...s cuerdas se encuentran libres de nudos.	X		
...dos los trabajadores autorizados conocen las medidas de ...cación establecidas en la evalicación de riesgos.	X		

Observaciones:

LISTA DE CHEQUEO ITEM	Si	No	N/A
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación.			X
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	X		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.			X
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la linea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos en sus partes y accesorios.	X		
Estan operando los frenos de las ruedas de los andamios	X		
Los canes o plataformas estan asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio.	X		
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.	X		
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos.	X		
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	X		
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.	X		
Las escaleras cumplen las especificaciones tecnicas	X		

Nombre y Cedula de los trabajadores autorizados

Omar Mendoza
Shon Varela 1073684246
Wilmer Guerra 1012352200

Firma

Nombre y Cedula de la persona que autoriza

Erika Zuñiga 37.292403

Firma

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros)

Oscar Velasquez 1.020778265.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA
CONSORCIO PLT ANGULO

CODIGO
VERSION
FECHA

Resolución 1409 de 2012, Articulo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificacion y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realizacion de trabajos en alturas.

Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolucion y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Empresa: Construcam SAS Area: PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA Fecha: 10/05/2018

	Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas SI/NO	Profesión	Verificación de la Seguridad Social
1°	Omar Enrique Mendoza Peña	✓	Soldador	✓
2°	Andres Castillo	✓	Auxiliar	✓
3°	Jhon Edisson Varela	✓	Soldador	✓
4.	Francisco Sanchez	✓	Soldador	✓

Descripcion de la tarea a realizar:

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 3 mts. Hora de Inicio 7:30 AM Hora final: 5:00 PM

Tipos de Acceso a Utilizar: Andamio Escalera Elevador de Personal o Grua con canasta Simultaneo con otras tareas de alto riesgo: Espacion Confinados Trabajo en caliente Energias Peligrosas

Otros (¿Cuáles?) Otros (¿Cuáles?)

Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud)

1° Examen Empresa Altura
2° Curso Avanzado en Alturas
3°

Descripcion del procedimiento para desarrollar la tarea.

Equipos de protección personal, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea.

Línea de vida vertical	Si ✓ No	Eslinga de posicionamiento	Si ✓ No	Sistemas de anclaje	Si ✓ No	Arnés de cuerpo entero	Si ✓ No	Guantes	Si ✓ No
Línea de vida horizontal	Si ✓ No	Eslinga	Si ✓ No	Casco con barboquejo	Si ✓ No	Señalización del área	Si ✓ No	Gafas	Si ✓ No

Otros Elementos de Proteccion personal(¿Cuales?)

Herramientas a utilizar:

ITEM	Si	No	N/A
Se realizo el analisis de seguridad en el trabajo, (AST)	✓		
l personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea.	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido ara la tarea.	✓		
l personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio.	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal speccionados.	✓		
ó que la formación en alturas del personal esté icoroe al trabajo a realizar.	✓		
l sitio donde se ejecutará el trabajo esta aislado y ñalizado completamente.	✓		
e han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la ona y no permitir el paso de vehiculos o personas.	✓		
uentan con eslinga de seguridad con absorbente de idas	✓		
uentan con freno de seguridad, certificado y apropiado ara el tipo de linea de vida	✓		
a cuenta con lineas de vida para cada uno de los eradores.	✓		
s conectores o mosquetones son de doble seguro.	✓		
cuerdas se encuentran libres de nudos.	✓		
dos los trabajadores autorizados conocen las medidas de ecaución establecidas en la evaluación de riesgos	✓		

LISTA DE CHEQUEO ITEM	Si	No	N/A
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos.	✓		
Si va a utilizar sustancias quimicas, cuenta con los controles para su manipulación.			✓
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo.	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	✓		
El lugar donde realizara la labor tiene instalada la linea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios.	✓		
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios.			✓
Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio	✓		
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta	✓		
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos.	✓		
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y	✓		
Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas.	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		

Nombre y Cedula de los trabajadores autorizados

Omar Enrique Mendoza Peña CC 79652610
Andres Castillo CC 1047715014
Jhon Edisson Varela CC 1073681346
Luis Francisco Sanchez Reyes 1019028071

Firma

Nombre y Cedula de la persona que autoriza

Firma

OK

Permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA
CONSORCIO PLT ANGULO

CODIGO
VERSION
FECHA

Resolución 1409 de 2012. Artículo 17. El permiso de trabajo en alturas es un mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas.

e permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA

presa: Construcción S.A.S Area: Cubierta. Fecha: 04/05/2016

Nombres y Apellidos de los trabajadores autorizados	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas SI/NO	Profesión	Verificación de la Seguridad Social
Jhon Carlos Oscar Javier Velasquez Luis Francisco Sandoval Lopez	✓	Pintor Soldador Pintor Soldador	✓

cripcion de la tarea a realizar:

ra aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 5.30 mts. Hora de Inicio: 9:00 Hora final: 5:30pm

emas de Acceso a Utilizar: Andamio Escalera Elevador de Personal o Silla de canasta Simultaneo con otras tareas de alto riesgo: Trabajo en caliente Energias Peligrosas

os (¿Cuáles?) Otros ¿Cuáles?)

nsitos de trabajador (requerimientos de aptitud)

4°

5°

6°

cripción del procedimiento para desarrollar la tarea:

ipos de protección personal, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea.

a de vida vertical	SI X No	Eslinga de posicionamiento	SI X No	Sistemas de anclaje	SI X No	Arnés de cuerpo entero	SI X No	Guantes	SI X No		
a de vida zontal	SI X No	Eslinga	SI X No	Casco con barboquejo	SI X No	Señalización del área	SI X No	Gafas	SI X No		

s Elementos de Protección personal(¿Cuales?) Arnes y Eslinga, Lineas de Vida, Equipo de Soldadura, Herramientas de Mano

amientas a utilizar:

ITEM	Si	No	N/A
alizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST)	✓		
rsonal cumple con los requisitos de aptitud para realizar rea.	✓		
rsonal cuenta con el equipo de protección definido para rea.	✓		
rsonal cuenta con el equipo definido para acceder al	✓		
uipo para acceder al sitio y el de protección personal n inspeccionados.	✓		
rifico que la formación en alturas del personal esté le al trabajo a realizar.	✓		
se ejecutará el trabajo está aislado y ía mpletamente.	✓		
n instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la y no permitir el paso de vehiculos o personas	✓		
tan con eslinga de seguridad con absorbente de caidas.	✓		
tan con freno de seguridad, certificado y apropiado el tipo de linea de vida.	✓		
enta con lineas de vida para cada uno de los idores.	✓		
nectores o mosquetones son de doble seguro.	✓		
erdas se encuentran libres de nudos.	✓		
los trabajadores autorizados conocen las medidas de ución establecidas en la evaluación de riesgos.	✓		

LISTA DE CHEQUEO ITEM	Si	No	N/A
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos.	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			
Se controlan los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario.	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate.	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios	✓		
Están bloqueados los frenos de las ruedas de los andamios.	✓		
Los cantos de plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm del andamio	✓		
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender el material	✓		
Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos.	✓		
Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio y se encuentran en buen estado y	✓		
Las barandas de andamio cumplen con las especificaciones técnicas	✓		
Las escaleras cumplen con las especificaciones técnicas.	✓		

vaciones :

Nombre y Cedula de los trabajadores autorizados

Jhon Carlos 1.070.971.819.
Oscar Velasquez 1.070.963.436.
Luis Francisco 1.00.778.765

Firma

Nombre y Cedula de la persona que autoriza

Norman Alvarez T. (C.C. 8825991

Firma

niso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajador, líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el e riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INPLAYCO S.A.S.

CONSORCIO FLT ANGULO

INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Localización:	Fachada Interna	**Contratista:**	Ag Soluciones
Inspeccionado por:	Adrian Guevara	**Cargo:**	Sisoma
Reportado a:	Adrian Guevara	**Cargo:**	Sisoma
Fecha:	23 AL 29 Abril		

DIA																				
ASPECTOS GENERALES A EVALUAR GENERALIDADES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ESTA EL ANDAMIO NIVELADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
TABLONES EN USO REVISADOS Y APROBADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
)TABLONES SIN GRIETAS, NUDOS,OTROS DEFECTOS RELEVANTES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
TABLONES SOBRESALIENDO DEL MARCO (>15CM < 30 CM)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAÍDAS		X			X			X			X			X			X			X	
ZAPATA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
SE HA PROVISTO CINTURON DE SEGURIDAD EN ALTURA »1.20 M	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LÍNEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
RODACHINA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
AUTORIZACION YO, COMO SUPERVISOR DEL TRABAJO, HE VERIFICADO LA LISTA ANTERIOR Y CERTIFICO QUE EL ANDAMIO REUNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EXIGIDAS Y POR LO TANTO SE PUEDE TRABAJAR. En constancia firmo:																					

Observaciones

Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:	
Firma:			
Fecha verificación compromisos:			

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PARA PULIDORAS

INPLAYCO S.A.S.

CONSORCIO FLT ANGULO

FECHA: 23/09/2016
PERIODO DEL 23 AL 29 DEL Abril
PULIDORA No #1
MARCA _____

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAP		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador _____

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

OBSERVACIONES:

Ninguna

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PARA PULIDORAS

INPLAYCO

CONSORCIO PLT ANGULO

FECHA: 7/05/2016
PERIODO DEL 7 AL 12 DEL Mayo
PULIDORA No # 2
MARCA _____

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAP		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador _____

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO ~~X~~

OBSERVACIONES:
Ninguna

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONSORCIO PLT ANGULO INPLAYCO	CONSORCIO PLT ANGULO	codigo version fecha pag

INSPECCIÓN LOCATIVA, ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA OBRA

AREA O PUESTO: 2 Piso
LIDER DEL ÁREA: Adria Gomez
AUDITOR: Adria Gomez
FECHA: 28/04/2018
HORA: 01:07 pm
CARGO: Sisoma

ITEM	LOCATIVO, ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	BIEN	MAL	OBSERVACIONES
1	Lugares definidos y demarcados para ubicación de equipos, herramientas y materiales.	✓		
2	Ubicación correcta de materiales equipos y herramientas no utilizadas en el momento	✓		
3	Disposición de basureras suficientes, bien ubicadas y señalizadas	✓		
4	Disposición de depósitos especiales para resíduos industriales	✓		
5	Pasillos despejados, sin presencia de muebles, equipos, cables, etc.	✓		
6	Escaleras adecuadas y en buen estado (antideslizantes)	✓		
7	Pisos sin huecos, secos y sin grasas	✓		
8	Paredes y techos limpios y en buen estado	✓		
9	Alberca y depositos de agua limpios y tapados	✓		
10	Luminarias (bombillos, lamparas) limpios y en buen estado	✓		
11	Puertas señalizadas, despejadas y en buen estado	✓		
12	Puestos de trabajo limpios y ordenados	✓		
13	Barreras perimetrales despejadas y en buen estado	✓		
14	Detectores de humo	N/A		N/A
15	Señalización de emergencia	✓		
16	Limpieza periódica y adecuada de las instalaciones	✓		
17	Estado y ubicación de la camilla	✓		
	BAÑOS	**BIEN**	**MAL**	**OBSERVACIONES**
18	Presencia de extintor	✓		
19	estado del sanitario	✓		
20	Evacuación de residuos en forma adecuada	✓		
21	Papel higienico, jabón, toallas y papeleras	✓		
	ALMACEN Y CAMPAMENTOS	**BIEN**	**MAL**	**OBSERVACIONES**
22	Areas de circulación despejadas y señalizadas	✓		
23	Estantes en buen estado y anclados	✓		
24	Cajas, paquetes debidamente identificados	✓		
25	Ventilación adecuada	✓		
26	Adecuado almacenamiento de sustancias químicas con fichas de seguridad	✓		
27	Presencia de detectores y/o extintores de incendios	✓		
28	Otros			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	**BIEN**	**MAL**	**OBSERVACIONES**
29	Hay suficientes toma corrientes, ubicados convenientemente, en buen estado e identificados según el	✓		
30	Iluminación natural y artificial	✓		
31	Estado de lámparas y luminarias	✓		
32	Empalmes eléctricos defectuosos	✓		
33	Ubicación adecuada de interruptores	✓		
34	Controles eléctricos despejados, señalizados e identificados	✓		
35	Cables entubados, organizados en canaleta y/o amarrados; cajas con tapas	✓		
36	Otros			


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | INPLAYCO S.A.S.

CONSORCIO PLT ANGULO

INSPECCIÓN GENERAL MEZCLADORA

CONSORCIO PLT ANGULO

Localización:	Piso 2
Contratista:	Ay Soluciones
Inspeccionado por/cargo:	Henry O
Reportado a/cargo:	Residente Sitio
Fecha:	05/05/2018



ELEMENTOS DE OPERACIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	
POLEAS	X		
MEDIDOR DE ACEITE	X		
TAPA DE COMBUSTIBLE	X		
BUJIA	X		
TUBO DE ESCAPE	X		
CORREAS	X		
CHOQUE	X		
YOYO	X		
ACELERADOR	X		
VOLANTE DE OPERACIÓN	X		
MOTOR	X		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TORNILLOS EN GENERAL	X		
GUARDA DE LOS PIÑONES	X		
TAPA PROTECTORA MOTOR	X		
TAMBOR	X		
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	X		
LLANTAS	X		
ENGRASE EN GENERAL	X		
BALINERAS	X		
FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X		
PINTURA	X		
ASEO	X		

Observaciones

Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:
Firma:		
Fecha verificación compromisos:		

CONSORCIO PLT ANGULO	CONSORCIO PLT ANGULO	codigo
		version
		fecha
		pag

INSPECCION LOCATIVA, ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA OBRA

AREA O PUESTO: PISO 1 - PISO 2 FECHA: 12/05/2016
LIDER DEL ÁREA: Adrian Guerrero HORA: 4:00 AM
AUDITOR: Adrian Guerrero CARGO: SISOMA

ITEM	LOCATIVO, ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA	BIEN	MAL	OBSERVACIONES
1	Lugares definidos y demarcados para ubicación de equipos, herramientas y materiales.	X		
2	Ubicación correcta de materiales equipos y herramientas no utilizadas en el momento	X		
3	Disposición de basureras suficientes, bien ubicadas y señalizadas	X		
4	Disposición de depósitos especiales para resíduos industriales	X		
5	Pasillos despejados, sin presencia de muebles, equipos, cables, etc.	X		
6	Escaleras adecuadas y en buen estado (antideslizantes)			
7	Pisos sin huecos, secos y sin grasas	X		
8	Paredes y techos limpios y en buen estado	X		
9	Alberca y depositos de agua limpios y tapados	X		
10	Luminarias (bombillos, lamparas) limpios y en buen estado	X		
11	Puertas señalizadas, despejadas y en buen estado	X		
12	Puestos de trabajo limpios y ordenados	X		
13	Barreras perimetrales despejadas y en buen estado	X		
14	Detectores de humo			
15	Señalización de emergencia			N/A
16	Limpieza periódica y adecuada de las instalaciones	X		
17	Estado y ubicación de la camilla	X		
	BAÑOS	**BIEN**	**MAL**	**OBSERVACIONES**
18	Presencia de extintor	X		
19	estado del sanitario	X		
20	Evacuación de residuos en forma adecuada	X		
21	Papel higienico, jabón, toallas y papeleras	X		
	ALMACEN Y CAMPAMENTOS	**BIEN**	**MAL**	**OBSERVACIONES**
22	Areas de circulación despejadas y señalizadas	X		
23	Estantes en buen estado y anclados	X		
24	Cajas, paquetes debidamente identificados	X		
25	Ventilación adecuada	X		
26	Adecuado almacenamiento de sustancias químicas con fichas de seguridad	X		
27	Presencia de detectores y/o extintores de incendios	X		
28	Otros			
	INSTALACIONES ELECTRICAS	**BIEN**	**MAL**	**OBSERVACIONES**
29	Hay suficientes toma corrientes, ubicados convenientemente, en buen estado e identificados según el	X		
30	Iluminación natural y artificial	X		
31	Estado de lámparas y luminarias	X		
32	Empalmes eléctricos defectuosos	X		
33	Ubicación adecuada de interruptores	X		
34	Controles eléctricos despejados, señalizados e identificados	X		
35	Cables entubados, organizados en canaleta y/o amarrados; cajas con tapas	X		
36	Otros			

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INPLAYCO S.A.S.

CONSORCIO FLT ÁNGULO

INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Localización:	Torre de Externo	**Contratista:**	Hy Soluciones
Inspeccionado por:	Adriana Guerrero	**Cargo:**	SISOMA
Reportado a:	Adriana Guerrero	**Cargo:**	SISOMA
Fecha:	20 al 05		

DIA																							
ASPECTOS GENERALES A EVALUAR GENERALIDADES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ESTA EL ANDAMIO NIVELADO	X			X			X			X			X			X			X		
ESTA ENSAMBLADO SOBRE SUPERFICIE ADECUADA ESTABLE	X			X			X			X			X			X			X		
ANDAMIO DE DOS O MÁS SECCIONES ASEGURADAS ENTRE SI ESTABLE	X			X			X			X			X			X			X		
FIRMEMENTE ASEGURADO A ESTRUCTURA FIJA CONTRA MOVIMIENTOS	X			X			X			X			X			X			X		
DIAGONALES O CRUCETAS COMPLETAS EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X			X		
DIAGONALES O CRUCETAS BIEN ASEGURADAS (PIN/PASADOR/GRAPAS)	X			X			X			X			X			X			X		
PINES /PASADORES SIN PUNTAS OP FILOS SOBRESALIENDO PELIGROSAMENTE	X			X			X			X			X			X			X		
ESCALERA DE ACCESO A SUPERFICIE DE TRABAJO ADECUADA	X			X			X			X			X			X			X		
LA DISTANCIA ENTRE ESCALONES ES NENOR DE 40 CM	X			X			X			X			X			X			X		
ANCHO DE PLATAFORMA DE TRABAJO MINIMO 40 CM	X			X			X			X			X			X			X		
TABLONES EN USO REVISADOS Y APROBADOS	X			X			X			X			X			X			X		
)TABLONES SIN GRIETAS, NUDOS,OTROS DEFECTOS RELEVANTES	X			X			X			X			X			X			X		
TABLONES SOBRESALIENDO DEL MARCO (»15CM « 30 CM)	X			X			X			X			X			X			X		
BARANDAS EN PLATAFORMA DE TRABAJO	X			X			X			X			X			X			X		
GUARDAPIES EN PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PREVENIR CAÍDAS			X	X		X	/		X			X			X			X			X
ZAPATA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	X			X			X			X			X			X			X		
SE HA PROVISTO CINTURON DE SEGURIDAD EN ALTURA »1.20 M	X			X			X			X			X			X			X		
LÍNEA DE VIDA DEBIDAMENTE ASEGURADA POR ENCIMA DE LA CINTURA	X			X			X			X			X			X			X		
LOS USUARIOS DEL ANDAMIO UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS E.P.P.	X			X			X			X			X			X			X		
RODACHINA EN LA BASE DE LOS ANDAMIOS	X			X			X			X			X			X			X		
AUTORIZACIÓN YO, COMO SUPERVISOR DEL TRABAJO, HE VERIFICADO LA LISTA ANTERIOR Y CERTIFICO QUE EL ANDAMIO REUNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EXIGIDAS Y POR LO TANTO SE PUEDE TRABAJAR. En constancia firmo:																						

Observaciones

Responsable de corregir la condición por parte del contratista:		Para la fecha:
Firma:		
Fecha verificación compromisos:		

FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD DE LA OBRA

Versión: 0.0

Página 1 de 1

Descripción del material			Observaciones	1 Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m3) (4)	2 Cantidades proyectada de RCD a generar en obra (m3)	3 Aprovechamiento o tratamiento (1)				4 Lugar de disposición final (2)	5 Acumulado			6 Mes de reporte			7 Certificados de disposición final	
Etapa	Tipología del residuo	Componente				Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros		Volumen total de materiales usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación	Volumen total de materiales usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Justificación (3)	No. anexo	Descripción del certificado
Demolición	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Tipo de obra a demoler:															
			Edificio															
			Exterior Edificios															
			Dotacional															
			Vías															
			Canaletas															
			Puentes															
			Otros _X_ Cual?															
			Area de la construcción a demoler															
			Altura o espesor (según corresponda) de la demolición 0,05 m															
			Empresa que realiza la demolición															
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC																
		Metales																
		Maderas																
		Cartón, papel																
		Vidrios																
		Otros																
Excavación y Cimentación	Residuos de cespedón	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal SI X NO															
			Dimensiones de material retirado															
			Largo 40,4 metros															
			Ancho 52,4 metros															
			Alto 0,10 metros															
	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometría		*Arena de Peña: 7M3 *Arena de Rio 7M3 *Gravilla 21M3 *B200 133M3	20						*Arena de Peña: 14M3 *Arena de Rio 14M3 *Gravilla 14M3 *Ñato 7M3 *Piedra 742M3							
Construcción	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Tipo de obra a demoler:															
			Edificio	2100														
			Exterior Edificios															
			Dotacional															
			Vías															
			Canaletas															
			Puentes															
			Otros _X_ Cual? COLEGIO		1362	1376				*MAQUINAS AMARILLAS *CEMEX	154	1376		70	14		ANEXO 5 VALES DEL PROVEEDOR	CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL DE CEMEX Y MAQUINAS AMARILLAS
			Area de la construcción a demoler															
			Altura o espesor (según corresponda) de la demolición															
			Empresa que realiza la demolición															
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC																
		Maderas		130	40													
		Cartón, papel																
		Vidrios																
		Cables de energía																
		Cableado de voz y datos																
		Otros																
	Residuos de carácter metálico	Chatarra																
		Cobre																
		Aluminio																
		Otros																
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón - yeso (drywall), fluxtas usadas																
	Residuos posconsumo	Luminarias convencionales y fluorescentes																
		Residuos eléctricos y electrónicos como lámparas, balastros, circuitos, entre otros.																
	Residuos peligrosos	Desechos y envases de productos químicos, emulsiones, alquitran, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes,tintas, beturres, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, y desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del decreto 4741 de 2005		350	10													
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores																

(1) Tratamiento: Marque con una "X" al que corresponda (2) Lugar de disposición: sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente y/o zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en la obra (3) Justificación: breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales. (4) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Artículo 4 de la Resolución 01115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar para con este dato calcular la cantidad de RCD's que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en el que se desarrolle.
