ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	**ACTA DE PAGO**

ACTA N°4 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2020

PAGO No. 2 de No._____

CONTRATO N°: 346 **DE:** 3 DE MARZO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de las obras públicas asociadas al mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial, así como la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas, del mismo modo, la atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas de producción, de conformidad con su objeto misional que deba ejecutar la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, y/o establecidas en los convenios o contratos interadministrativos que celebre, y, las derivadas de la regulación normativa expedida dentro del marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID-19; bajo las instrucciones señaladas expresamente a SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C., por la Entidad, Sindicato que atenderá el desarrollo de este objeto con sus afiliados partícipes, de conformidad al anexo técnico que hace parte integral del contrato, de acuerdo con las necesidades, directrices técnicas y lineamientos técnicos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

TIPO DE CONTRATACION:	CONTRATO SINDICAL
PLAZO DE EJECUCION:	VEINTITRES (23) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de febrero de 2023
VALOR CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (48.991.511.438).
CDP N°: 405	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°. 406	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°1. Vigencias futuras 2022.	**DE**: 1 de enero de 2022.
CDP N°2. Vigencias futuras 2023.	**DE**: 1 de enero de 2023.
CRP N°: 401	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°: 402	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°: 1 de vigencia futura.	**DE**: 1 de enero de 2022.
CRP N°: 1 de vigencia futura.	**DE**: 1 de enero de 2023.
CONTRATISTA:	SINTRAUNIOBRAS
NIT:	860.025.353-3.
SUPERVISOR:	Luis Fernando Ramos Parra.
C.C.:	79.846.969 de Bogotá

En la ciudad de Bogotá D.C., a los mayo (21) días del mes de mayo de 2021, se reunieron: por parte del Sindicato Contratista, el señor JOSE ANGEL PEÑA NIVIA, por parte de la UAERMV el ingeniero GIACOMO MARCENARO JIMENEZ, Subdirección Técnica de Producción e Intervención, en su calidad de Ordenador del Gasto **delegado mediante la Resolución N°331 de 2016** y supervisor del contrato LUIS FERNANDO RAMOS PARRA para dejar constancia por medio de la presente acta de pago mensual por la ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación, atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas, ejecutadas por el Sindicato a través de órdenes de obra, materializadas mediante las unidades ejecutoras, durante el periodo 8 de marzo al 30 de marzo de 2021.

RELACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS:

La Supervisión verifica que el objeto se ha cumplido de acuerdo con lo establecido en el contrato tal y como reportan la STPI (laboratorio), las Gerencias de Intervención, Producción, Gasa para el periodo de marzo y se resume en la siguiente tabla N°1:

Tabla N°2. RESUMEN DE UNIDADES PERIODO DE 8 AL 30 DE MARZO DE 2021.

ITEM	DETALLE	VR. UNIDAD/MES	CANT. UNIDADES / MES	DIAS PROPORCIONALES	VALOR PARCIAL MES	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN							
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	$ 27.106.609,77	9	23	$ 243.959.487,94	$ 187.035.607,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	2	$ 27.106.609,77	1	21	$ 27.106.609,77	$ 18.974.627,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	1, 2	$ 27.106.609,77	2	23	$ 54.213.219,54	$ 41.563.468,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$ 33.886.640,89	9	23	$ 304.979.768,03	$ 233.817.822,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	2	$ 33.886.640,89	1	2	$ 33.886.640,89	$ 2.259.109,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	10	$ 33.886.640,89	1	15	$ 33.886.640,89	$ 16.943.320,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	1, 2, 3, 4, 5, 6	$ 10.278.082,80	6	23	$ 61.668.496,80	$ 47.279.181,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	8	$ 10.278.082,80	1	15	$ 10.278.082,80	$ 5.139.041,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	1, 2, 3, 4	$ 32.622.319,61	4	23	$ 130.489.278,43	$ 100.041.780,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES ADICIONAL		$ 11.440.556,40			$ 0,00	$ 0,00	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	7	$ 13.380.842,14	1	23	$ 13.380.842,14	$ 10.258.646,00	$ 663.312.601,00
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA							
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001		$ 7.289.567,10	2	23	$ 14.579.134,20	$ 11.177.336,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003		$ 4.416.101,40	2	23	$ 8.832.202,80	$ 6.771.355,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003		$ 4.416.101,40	1	15	$ 4.416.101,40	$ 2.208.051,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004		$ 6.870.828,90	2	23	$ 13.741.657,80	$ 10.535.271,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005		$ 7.569.276,00	1	23	$ 7.569.276,00	$ 5.803.112,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008		$ 4.228.195,20	2	23	$ 8.456.390,40	$ 6.483.233,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006		$ 6.746.571,60	2	23	$ 13.493.143,20	$ 10.344.743,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007		$ 10.066.111,20	1	23	$ 10.066.111,20	$ 7.717.352,00	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002		$ 4.782.789,30	1	15	$ 4.782.789,30	$ 2.391.395,00	
UNIDAD DE RELEVO		$ 13.919.908,80			$ 0,00	$ 0,00	$ 63.431.848,00
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							

ITEM	DETALLE	VR. UNIDAD/MES	CANT. UNIDADES / MES	DIAS PROPORCIONALES	VALOR PARCIAL MES	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1		$ 13.130.523,90	1	23	$ 13.130.523,90	$ 10.066.735,00	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2		$ 8.753.682,60	1	23	$ 8.753.682,60	$ 6.711.157,00	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 3		$ 17.378.586,35			$ 0,00	$ 0,00	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4		$ 11.585.724,23	1	23	$ 11.585.724,23	$ 8.882.389,00	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SEDES		$ 10.169.703,42			$ 0,00	$ 0,00	$ 25.660.281,00
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA							
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	1, 2, 3, 4	$ 9.329.473,20	4	23	$ 37.317.892,80	$ 28.610.384,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	1	$ 4.664.736,60	1	23	$ 4.664.736,60	$ 3.576.298,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	1, 2, 3, 4, 5, 6	$ 6.198.643,20	6	23	$ 37.191.859,20	$ 28.513.759,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	3, 4	$ 6.226.645,20	2	23	$ 12.453.290,40	$ 9.547.523,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	1	$ 7.092.825,60	1	15	$ 7.092.825,60	$ 3.546.413,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	2	$ 7.092.825,60	1	20	$ 7.092.825,60	$ 4.728.550,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	1, 2	$ 8.746.190,70	2	23	$ 17.492.381,40	$ 13.410.826,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	4	$ 8.746.190,70	1	7	$ 8.746.190,70	$ 2.040.778,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	1, 2	$ 6.226.645,20	2	23	$ 12.453.290,40	$ 9.547.523,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	2	$ 6.154.263,60	1	23	$ 6.154.263,60	$ 4.718.269,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 7	1	$ 6.274.477,20	1	23	$ 6.274.477,20	$ 4.810.433,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	1	$ 12.202.818,00	1	23	$ 12.202.818,00	$ 9.355.494,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	1	$ 6.101.409,00	1	23	$ 6.101.409,00	$ 4.677.747,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	1, 2	$ 5.703.756,30	2	23	$ 11.407.512,60	$ 8.745.760,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	1, 2, 3	$ 13.080.236,40	3	23	$ 39.240.709,20	$ 30.084.544,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	1	$ 6.540.118,20	1	23	$ 6.540.118,20	$ 5.014.091,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	1	$ 12.293.974,80	1	23	$ 12.293.974,80	$ 9.425.381,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	1	$ 6.146.987,40	1	23	$ 6.146.987,40	$ 4.712.690,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	1	$ 7.872.564,30	1	23	$ 7.872.564,30	$ 6.035.633,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	1	$ 12.701.265,60	1	23	$ 12.701.265,60	$ 9.737.637,00	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	1	$ 4.312.710,60	1	23	$ 4.312.710,60	$ 3.306.411,00	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	1	$ 5.983.686,00	1	23	$ 5.983.686,00	$ 4.587.493,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	1	$ 6.310.743,00	1	23	$ 6.310.743,00	$ 4.838.236,00	
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	1	$ 5.278.749,00	1	6	$ 5.278.749,00	$ 1.055.750,00	
UNIDAD DE RELEVO	1	$ 13.919.908,80	1	7	$ 13.919.908,80	$ 3.247.979,00	$ 217.875.602,00
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA							
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	5, 5, 7	$ 12.143.871,54	3	23	$ 36.431.614,62	$ 27.930.905,00	
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	7	$ 8.087.398,39	1	23	$ 8.087.398,39	$ 6.200.339,00	

ACTA DE PAGO

ITEM	DETALLE	VR. UNIDAD/MES	CANT. UNIDADES / MES	DIAS PROPORCIONALES	VALOR PARCIAL MES	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	1, 2, 5	$ 8.115.400,39	3	23	$ 24.346.201,16	$ 18.665.421,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	1	$ 9.272.462,53	1	8	$ 9.272.462,53	$ 2.472.657,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	3	$ 11.236.595,26	1	23	$ 11.236.595,26	$ 8.614.723,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	1	$ 8.043.018,79	1	23	$ 8.043.018,79	$ 6.166.314,00	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6A	1	$ 9.964.659,80	1	23	$ 9.964.659,80	$ 7.639.573,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	2	$ 8.114.497,95	1	23	$ 8.114.497,95	$ 6.221.115,00	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	1	$ 7.248.631,82	1	23	$ 7.248.631,82	$ 5.557.284,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	4, 5	$ 17.035.506,11	2	23	$ 34.071.012,22	$ 26.121.109,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	2	$ 8.517.753,05	1	23	$ 8.517.753,05	$ 6.530.277,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12		$ 10.268.580,90	1	23	$ 10.268.580,90	$ 7.872.579,00	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	1	$ 8.328.267,65	1	23	$ 8.328.267,65	$ 6.385.005,00	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	1	$ 5.464.194,00	1	23	$ 5.464.194,00	$ 4.189.215,00	
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18		$ 6.779.184,68			$ 0,00	$ 0,00	$ 140.566.516,00

UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO

UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$ 5.387.998,20	7	23	$ 37.715.987,40	$ 28.915.590,00	
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1 - NOCTURNA	8	$ 6.951.545,92	1	23	$ 6.951.545,92	$ 5.329.519,00	$ 34.245.109,00

TOTAL COSTOS DIRECTO:	$ 1.145.091.957,00
COSTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONTRATO:	$ 202.048.434,00
SUBTOTAL COSTOS MANO DE OBRA MÁS COSTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DEL CTO:	$ 1.347.140.391,00
TIEMPO SUPLEMENTARIO PERIODO: MARZO 8 A MARZO 24 DE 2021	$ 46.814.325,00
TOTAL A PAGAR PERIODO DE MARZO (COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, TIEMPO SUPLEMENTARIO)	$ 1.393.954.716,00

Fuente: **Correo electrónico abril 15 de 2021, informe de laboratorio.**
Correo electrónico abril 8 de 2021, informe de la gerencia de Intervención.
Correo electrónico abril 16 de 2021, informe de la gerencia de Producción.
Correo electrónico abril 13 de 2021, informe de GASA.

Teniendo en cuenta que el costo directo para el contrato 346 de 2021 es de $263.451.435, para el periodo de marzo se registra el valor proporcinal a los días ejecutados desde el 8 al 30 de marzo, que corresponde a un total de 23 dias, razón por la cual el valor reconocido en la presente acta es de: $202.018.434.

DETALLE FACTURACIÓN MARZO 2021

De los informes de los usuarios del contrato sindical (Correo electrónico de la Gerencia de Producción abril 15 de 2021, Intervención de abril 8 de 2021, GASA abril 13 de 2021), se cuantifica la información correspondiente a los costos directos, además del tiempo suplementario el cual es validado por las partes.

El resultado se consolida en la tabla N°2:

TABLA N° 2 DISCRIMINACIÓN DE FACTURACIÓN

CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
VALOR COSTO DIRECTO	$ 1,145,091,957,00
TIEMPO SUPLEMENTARIO PERIODO DE MARZO	$ 46,814,325,00
ADMON TOTAL CON IVA	$ 202,048,434,00
ADMINISTRACION GRAVABLE	$ 169,788,600,00
IVA ADMON	$ 32,259,834,00
TOTAL	**$ 1,393,954,716,00**

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 48,991,511,438,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 48,991,511,438,00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS PESOS M/CTE	$ 3,475,458,422,00
VALOR POR FACTURAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE	$ 45,516,052,016,00
VALOR PRESENTE ACTA	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE	$ 1,393,954,716,00
SALDO CONTRATO PAGANDO PRESENTE ACTA	CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	$ 44,122,097,300,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintiun (21) dias del mes de mayo de 2021.

(Firma)

JOSE ÁNGEL PEÑA NIVIA
Representante Legal

(Firma)

LUIS FERNANDO RAMOS PARRA
Supervisor UAERMV

(Firma)

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Gerente del proyecto de inversión

(Firma)

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Ordenador del Gasto

Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisora del contrato
Copia N°2: Contratista
Elaboró: Mercedes Sánchez Lemus. Ingeniero de Apoyo STPL
Revisó: Tomas Sanchez Gomez. Profesional de Apoio STPL

CONTRATO 346 DE 2021 – INFORME DE SUPERVISIÓN

INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad describir el avance y estado del Contrato Sindical Nº 346 de 2021, para el periodo del 8 al 30 de marzo de 2021 incluyendo los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos de la ejecución.

1. GENERALIDADES

DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO: Contrato Colectivo - Laboral suscrito bajo el Nº 346 de 2021, del 3 de marzo de 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de las obras públicas asociadas al mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial, así como la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas, del mismo modo, la atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas de producción, de conformidad con su objeto misional que deba ejecutar la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, y/o establecidas en los convenios o contratos interadministrativos que celebre, y, las derivadas de la regulación normativa expedida dentro del marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID-19; bajo las instrucciones señaladas expresamente a SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C., por la Entidad, Sindicato que atenderá el desarrollo de este objeto con sus afiliados partícipes, de conformidad al anexo técnico que hace parte integral del contrato, de acuerdo con las necesidades, directrices técnicas y lineamientos técnicos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

TIPO DE CONTRATACION:	CONTRATO SINDICAL
PLAZO DE EJECUCION:	VEINTITRES (23) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de febrero de 2023
VALOR CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (48.991.511.438).
CDP N°: 405	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°. 406	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°1. Vigencias futuras 2022.	**DE**: 1 de enero 2022.
CDP N°2. Vigencias futuras 2023.	**DE**: 1 de enero 2023.
CRP N°: 401	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°: 402	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°:1 de vigencia futura.	**DE**: 1 de enero de 2022.
CRP N°: 2 de vigencia futura.	**DE**: 1 de enero de 2023.
CONTRATISTA:	SINTRAUNIOBRAS
NIT:	860.025.353-3.

SUPERVISOR: Luis Fernando Ramos Parra.
C.C.: 79.846.969 de Bogotá

2. SUPERVISORES DE APOYO

Según asignación Rad. 20211300052863 del 19 04 2021, la Supervisión cuenta con Profesionales de Apoyo con áreas de responsabilidad distribuídas así:

Mercedes Sanchez Lemus -STPI : Administrativa
Tomas Sanchez Gomez -STPI : Contable / Financiera
Natalia Ahumada Daza -STPI : Costos y Presupuesto
Alexandra Gonzalez Alfonso -STPI : SST

3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

3.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS:

En las siguientes tablas se presenta la información de cauciones y vigencias

Tabla N°1. GARANTIAS VIGENTES

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	33-44-101210278	$ 4.899.151.143,8	08 03 2021	08 08 2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A
SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMN.	33-44-101210278	$ 4.899.151.143,8	08 03 2021	08 02 2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DEVOLUCION DE PAGOS ANTICIPADOS	33-44-101210278	$ 3.475.459.422	08 03 2021	08 02 2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	33-40-101062499	$ 2.449.575.571,9	08 03 2021	08 02 2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A

3.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

En tabla N°2 se presenta el control legal, donde se relacionan los actos administrativos realizados durante la ejecución del contrato.

Tabla N°2. CONTROL LEGAL

ACTA N°	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Acta de inicio del Contrato Sindical	8 de marzo de 2021
2	Acta aclaratoria de inicio	25 de marzo de 2021
3	Primer pago	5 de abril de 2021
4	Acta parcial de pago periodo 8 al 30 de marzo de 2021 (de pago N°2)	21 de mayo de 2021

3.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN

En la tabla N°3 se presentan las fuentes del contrato y los saldos de cada una de ellas.

Tabla N°3: RELACION DE FUENTES DE FINANCIACION Y SALDOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
NOMBRE DE LA FUENTE	**VALOR REGISTRO PRESUPEUSTAL**	**PAGOS**	**SALDOS**
1-100-I072 VA- RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CDP: 405)	$ 1.241.998.705	$ 124.199.871,00	$ 1.117.798.834,00
1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CDP: 406)	$ 745.138.000	$ 745.138.000,00	$ 0,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CDP 406)	$ 5.539.457.000	$ 4.000.076.267,00	$ 1.539.380.733,00
1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CDP 406)	$ 11.059.752.000	$ 0,00	$ 11.059.752.000,00
1-100-I072 VA RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CDP 406)	$ 2.655.653.000	$ 0,00	$ 2.655.653.000,00
1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CDP N°1 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 893.203.884	$ 0,00	$ 893.203.884,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CDP N°1 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 6.252.427.184	$ 0,00	$ 6.252.427.184,00
1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CDP N°1 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 12.281.553.398	$ 0,00	$ 12.281.553.398,00
1-100-I072 VA RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CDP N°1 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 2.902.912.621	$ 0,00	$ 2.902.912.621,00
1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CDP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 216.776.626	$ 0,00	$ 216.776.626,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CDP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 1.517.436.381	$ 0,00	$ 1.517.436.381,00
1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CDP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 2.980.678.605	$ 0,00	$ 2.980.678.605,00
1-100-I072 VA RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CDP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 704.524.034	$ 0,00	$ 704.524.034,00
TOTAL	**$ 48.991.511.438**	**$ 4.869.414.138,00**	**$ 44.122.097.300,00**

Tabla No.4: AFECTACION A FUENTES Y RELACION DE PAGOS

RESUMEN DE PAGOS		**DETALLE DE LA FUENTE CDP N° 405 / CRP N°401**	**DETALLE DE LA FUENTE CDP N° 406 / CRP N°402 VIGENCIA 2021**			
DESCRIPCION	**VALOR ACTA**	1-100-I072 VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CDP: 405)	1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CDP: 406)	1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CDP 406)	1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CDP 406)	1-100-I072 VA RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CDP 406)
VALOR DE CRP		$ 1.241.998.705	$ 745.138.000	$ 5.539.457.000	$ 11.059.752.000	$ 2.655.653.000
ACTA N° 3 PRIMER PAGO	$ 3.475.459.422		$ 745.138.000	$ 2.730.321.422		
ACTA Nº 4. PERIODO DE 8 DE MARZO A 30 DE MARZO	$ 1.393.954.716	$ 124.199.871		$ 1.269.754.845		
VALOR PAGADO	**$ 4.869.414.138**	**$ 124.199.871**	**$ 745.138.000**	**$ 4.000.076.267**	**$ 0**	**$ 0**

Una vez causado el período de marzo, el saldo del contrato es de: $44.122.097.300,oo

Tabla No.5: RESUMEN FINANCIERO 30 DE MARZO DE 2021

INICIO DEL CONTRATO	8 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	7 DE FEBRERO DE 2023
VALOR CONTRATO	$ 48.991.511.438,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 48.991.511.438,00
VALOR FACTURADO AL ACTA N°3	$ 3.475.459.422
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.393.954.716
PENDIENTE POR FACTURAR	$ 44.122.097.300

3.4 DESARROLLO DEL CONTRATO

En la siguiente tabla, se presenta el comportamiento de pagos, el pago realizado por la organización, por el concepto de: Primer Pago y las diferentes adiciones realizadas; del ejercicio se concluye que el saldo del contrato es de: $44.122.097.300.oo

DESCRIPCION	PRIMER PAGO	MARZO 2021 (PRESENTE ACTA)	TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS:	$ 3.475.459.422,00	$ 1.145.091.957,00	$ 4.620.551.379,00
ADMINISTRACIÓN:		$ 202.048.434,00	$ 202.048.434,00
TIEMPO SUPLEMENTARIO		$ 46.814.325,00	$ 46.814.325,00
SUBTOTAL: COSTOS DIRECTOS MÁS ADMINISTRACIÓN MAS TIEMPO SUPLEMENTARIO:	$ 3.475.459.422,00	$ 1.393.954.716,00	$ 4.869.414.138,00
TOTAL (SUMA HORIZONTAL)	$ 3.475.459.422,00	$ 1.393.954.716,00	$ 4.869.414.138,00
TOTAL (SUMA VERTICAL)			$ 4.869.414.138,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 48.991.511.438,00
SALDO CONTRATO			$ 44.122.097.300,00

4. INFORME TÉCNICO

4.1 GERENCIA DE INTERVENCION:

Durante el periodo marzo estuvieron en la gerencia de intervención un total de 34 unidades, las cuales se presenta a continuación:

ITEM	DETALLE	CANT. UNIDADES / MES
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN		
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	9
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	2	1
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	1, 2	2
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	9
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	10	1
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	8	1
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	1, 2, 3, 4	4
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	7	1

En la siguiente tabla N°6, se presentan los frentes que realizaron actividades en obra, durante el periodo de marzo de 2021.

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD
8008838	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 69	KR 69BIS	Parcheo/sello Fisuras
8007389	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 35 A S	CL 35 B S	Parcheo/Sello Fisuras
4000576	Infraestructura y Gestión de Tránsito	4	KR 4	KR 5	sello fisuras
8014482	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 42 G S	CL 42 H S	Parcheo/Sello Fisuras
3000509	Infraestructura y Gestión de Tránsito	3	KR 13A	KR 14	sello fisuras
15001373	Infraestructura y Gestión de Tránsito	15	CL 18 S	CL 19 S	sello fisuras
9002913	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 25D	CL 25F	sello fisuras
9003001	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 25B	CL 25C	sello fisuras
9003194	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 23A	CL 23B	sello fisuras
9003195	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	KR 82	KR 83	sello fisuras
3000652	Infraestructura y Gestión de Tránsito	3	CL 14	CL 15	sello fisuras
3000593	Infraestructura y Gestión de Tránsito	3	CL 16	CL 16A	sello fisuras
12002035	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	KR 57	KR 57A	sello fisuras
12000863	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	CL 79	DG 79ABIS	sello fisuras
12003340	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	KR 57A	KR 57C	sello fisuras
12003341	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	CL 64A	CL 65	sello fisuras
12003167	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	AC 64	CL 64A	sello fisuras
12002869	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	CL 73	TV 56A	sello fisuras
12002028	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	KR 25	KR 26	sello fisuras
12001812	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	KR 22	KR 23	sello fisuras
12000864	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	KR 55BIS	KR 55A	sello fisuras
9001608	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 23G	CL 23H	sello fisuras
9001764	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 23	CL 23D	sello fisuras
12003246	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	DG 74BIS	CL 74A	sello fisuras
8008668	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 69BIS	KR 69BISA	Parcheo
8008080	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72MBIS	KR 72N	Parcheo
13001972	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	KR 20	KR 21	sello fisuras
13001967	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	KR 21	AK 24	sello fisuras
13001586	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	KR 25	TV 26B	sello fisuras
13001582	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	TV 26B	KR 27	sello fisuras
1008086	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 127BIS	CL 127A	Parcheo
1008085	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 127A	CL 127B	Parcheo
8013437	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 69BISA	KR 69A	Parcheo
13002431	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	CL 36	DG 36 BIS	sello fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD
13001830	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	CL 40	CL 41	sello fisuras
13000836	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	TV 24	TV 25	sello fisuras
13000553	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	CL 57	CL 57A	sello fisuras
13001690	Infraestructura y Gestión de Tránsito	13	CL 22A	CL 22ABIS	sello fisuras
10008154	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 70A	KR 70G	sello fisuras
10007329	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 69R	KR 69T	sello fisuras
10007669	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 80	KR 80A	sello fisuras
10007619	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 80A	KR 81A	sello fisuras
10007568	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 81A	KR 81B	sello fisuras
10007446	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 74A	KR 75	sello fisuras
10006426	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 74BIS	CL 74A	sello fisuras
10007424	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 72A	KR 73A	sello fisuras
10005538	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	DG 81F	DG 81I	sello fisuras
8007727	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72N	KR 72P	Parcheo/Sello Fisuras
8008356	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73A	KR 74	Parcheo/Sello Fisuras
8008226	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 74	KR 74A	sello fisuras
8008202	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 41BISA S	CL 41A S	sello fisuras
8008219	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 41A S	KR 78	sello fisuras
8008393	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 41F S	CL 41G S	sello fisuras
8008418	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 75ABIS	KR 78	sello fisuras
8008726	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 42ABIS S	CL 42B S	Parcheo
8002575	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72B	KR 72C	Parcheo/Bacheo
11004003	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	11	CL 139	CL 140	Rehabilitación Rígido
16000216	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	CL 9A	CL 10	Cambio de Carpeta
19011354	Infraestructura y Gestión de Tránsito	19	CL 77A S	CL 78 S	Parcheo/sello Fisuras
8007640	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72P	KR 72Q	Parcheo/Sello Fisuras
8007522	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	DG 37 S	CL 37D S	sello fisuras
8008065	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 38D S	CL 39 S	sello fisuras
8008542	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73	KR 73A	Parcheo/Sello Fisuras
10000372	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 80A	CL 81	Parcheo/Sello Fisuras
10000371	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 111C	KR 112BIS	Parcheo/Sello Fisuras
11011211	Infraestructura y Gestión de Tránsito	11	AK 45	KR 45A	Parcheo/Sello Fisuras
11008221	Infraestructura y Gestión de Tránsito	11	CL 137A	AC 138	Parcheo
9000462	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	KR 122	KR 127	Parcheo
2001490	Infraestructura y Gestión de Tránsito	2	CL 61		Cambio de Carpeta

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD
8002497	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72C	KR 73	Parcheo
1006195	Infraestructura y Gestión de Tránsito	1	CL 160	AC 161	Cambio de carpeta/Bacheo
8007163	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 34 S	CL 35 S	Parcheo/Sello Fisuras
8008130	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72N	KR 72NBIS	Parcheo/Sello Fisuras
8007687	infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 36 S	CL 36A S	Parcheo
8007319	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 35A S	CL 35B S	sello fisuras
8007726	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 36 S	CL 37 S	sello fisuras
8007550	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 36A S	CL 37 S	sello fisuras
14001584	infraestructura y Gestión de Tránsito	14	KR 19	KR 19BIS	Parcheo
14001556	Infraestructura y Gestión de Tránsito	14	KR 19BBIS	TV 19B	Parcheo
16000169	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	CL 10	CL 10A	Cambio de carpeta/Bacheo
4000645	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	4	CL 23 S	CL 24 S	Rehabilitación Flexible
19001927	Infraestructura y Gestión de Tránsito	19	TV 69	TV 69C	sello fisuras
14001837	Infraestructura y Gestión de Tránsito	14	CL 1F	CL 1FBIS	Parcheo
9000462	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	KR 122	KR 127	Parcheo
7006512	Infraestructura y Gestión de Tránsito	7	KR 78C	TV 78D	sello fisuras
8007443	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 35B S	CL 36 S	Parcheo
8007989	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72P	KR 72Q	Parcheo/Sello Fisuras
8011855	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72NBIS	KR 72P	Parcheo/Sello Fisuras
8007738	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 38A S	CL 38B S	Parcheo
8008654	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73	CL 40C S	Parcheo
8008542	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73	KR 73A	Parcheo/Sello Fisuras
14001551	Infraestructura y Gestión de Tránsito	14	CL 1FBIS	CL 1G	Parcheo
14001580	Infraestructura y Gestión de Tránsito	14	KR 19BIS	KR 19A	Parcheo
14001552	Infraestructura y Gestión de Tránsito	14	KR 19A	TV 19B	Parcheo
5005042	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	5	CL 91B S	CL 92 S	Rehabilitación Flexible
2002022	Infraestructura y Gestión de Tránsito	2	CL 42A	CL 43	Parcheo/Sello Fisuras
2002016	infraestructura y Gestión de Tránsito	2	KR 8	KR 9	Parcheo/Sello Fisuras
8006463	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73	KR 73ABIS	Parcheo/Sello Fisuras
8007203	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 35 S	CL 35A S	Parcheo/Sello Fisuras
8003520	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	TV 78C	KR 78B	Parcheo/Sello Fisuras
14001838	infraestructura y Gestión de Tránsito	14	KR 19BIS	KR 19A	Parcheo
8013561	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72C	KR 72CBIS	Parcheo/Sello Fisuras
1005695	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 102	CL 103	Parcheo
8009222	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 31 S	CL 31BIS S	Parcheo/Sello Fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD
8008076	infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 70B	KR 71	Parcheo
8007660	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 38 S	CL 38A S	Parcheo/Sello Fisuras
8007660	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 38 S	CL 38A S	Parcheo/Sello Fisuras
8008335	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 39 S	CL 40 S	Parcheo/Sello Fisuras
8013515	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 8BBIS	CL 9	Parcheo
14001653	infraestructura y Gestión de Tránsito	14	CL 1C	CL 1D	Parcheo/Sello Fisuras
9000261	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	9	CL 17	KR 134	Parcheo
8012430	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 40 S	KR 72R	Parcheo/Sello Fisuras
1006369	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 104A	CL 104	Parcheo
8008311	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 69B	KR 69C	Parcheo
8008142	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 69CBIS	KR 70B	Parcheo
8007849	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 70B	KR 71D	Parcheo
10010259	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 68BBIS	KR 69	Parcheo/Sello Fisuras
8013439	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 69BISA	KR 69A	Parcheo
1006476	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	AC 100	CL 102	Parcheo
7004711	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	7	KR 81I	KR 82	Rehabilitación Rígido
10008110	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 69A	CL 69B	Cambio de carpeta/Bacheo
10000360	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 81	CL 81A	Parcheo
10000265	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 81A	CL 82	Parcheo
5005082	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	5	CL 92 S	CL 92B S	Rehabilitación Flexible
9000462	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	KR 120	KR 127	Parcheo/Sello Fisuras
10008212	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	10	CL 66A	CL 68B	Parcheo
1008003	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 127B	CL 127BBIS	Parcheo
1008002	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 127BBIS	CL 127D	Parcheo
8013575	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	TV 78HBISA	TV 78HBISA	Parcheo
1007152	Infraestructura y Gestión de Tránsito	1	KR 12	KR 13 A	Cambio de carpeta/Bacheo
1000450	Infraestructura y Gestión de Tránsito	1	CL 187	CL 188	Cambio de Losas parcial/Sello de Grietas
8007822	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72Q	KR 72QBIS	Parcheo/Sello Fisuras
8007650	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 72R	KR 73	Parcheo/Sello Fisuras
14001653	infraestructura y Gestión de Tránsito	14	CL 1C	CL 1D	Parcheo/Sello Fisuras
16003246	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	KR 53	KR 54	Parcheo/Sello Fisuras
16003204	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	KR 54	AK 68	Parcheo/Sello Fisuras
4001513	Infraestructura y Gestión de Tránsito	4	CL 33 S	CL 34 S	Parcheo
4001602	Infraestructura y Gestión de Tránsito	4	CL 34 S	CL 35 S	Parcheo
8014356	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 69BISA	KR 69B	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD
8013946	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	AC 43 S	CL 43A S	Parcheo
10010844	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 83	CL 83BIS	Parcheo
10007954	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 71	CL 71BIS	Parcheo
10008402	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 71A	AC 72	Parcheo/Bacheo
10000171	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 112F	KR 113	Parcheo/Sello Fisuras
10000171	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 112F	KR 113	Parcheo/Sello Fisuras
10000278	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 80A	CL 81	Parcheo/Sello Fisuras
10000150	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	KR 111C	KR 112F	Parcheo/Sello Fisuras
10010048	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	DG 89A	DG 89B	Parcheo/Sello Fisuras
10010274	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	TV 68A	KR 68BBIS	Parcheo/Sello Fisuras
8014355	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 69	KR 69BISA	Parcheo
8007987	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	TV 78H	TV 78HBISA	Parcheo
10000225	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 83BIS	CL 83A	Parcheo/Sello Fisuras
8008673	Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	8	KR 76	CL 42ABIS S	Rehabilitación Flexible
8007310	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73ABIS	TV 73ABISA	Parcheo/Sello Fisuras
8007544	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	CL 37D S	CL 38 S	Parcheo/Sello Fisuras
8008356	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	KR 73A	KR 74	Parcheo/Sello Fisuras
10008068	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 69B	CL 69C	Cambio de Carpeta
10000242	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 81	CL 82	Parcheo/Bacheo
4006414	Infraestructura y Gestión de Tránsito	4	KR 15C E	KR 16 E	Parcheo
19007333	Infraestructura y Gestión de Tránsito	19	KR 18MBIS	KR 18N	Fresado Estabilizado
8008966	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 68I	KR 69	Parcheo
8009033	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	8	KR 68HBIS	KR 68I	Parcheo
10007222	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	AC 72	CL 72A	Parcheo/Sello Fisuras
9002681	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	KR 96C	KR 96G	Lechada Asfáltica con Mezcla Bituminosa Reciclada
10008008	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 69C	CL 71	Cambio de Carpeta
19015715	Infraestructura y Gestión de Tránsito	19	KR 18N	KR 18NBISA	Fresado Estabilizado
10000246	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 83	CL 83BIS	Parcheo/Sello Fisuras
10000156	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 86A	CL 86ABIS	Parcheo/Sello Fisuras
12001624	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	CL 76	CL 77	Parcheo
9002680	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 20A	CL 20C	Lechada Asfáltica con Mezcla Bituminosa Reciclada
9002997	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 18	CL 19	Lechada Asfáltica con Mezcla Bituminosa Reciclada
10007101	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 72B	CL 73	Parcheo/Sello Fisuras
1006421	situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 234	CL 237A	Parcheo
10007006	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 73A	CL 74	Parcheo/Sello Fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	DESDE	HASTA	ACTIVIDAD
10007150	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 72A	CL 72B	Parcheo/Sello Fisuras
10010447	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 72B	CL 73	Parcheo/Sello Fisuras
8014362	Infraestructura y Gestión de Tránsito	8	TV 74C	KR 78BIS	Parcheo/Sello Fisuras
16004247	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	CL 43 S	CL 44 S	Parcheo/Sello Fisuras
16000235	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	CL 14	CL 15	Parcheo
4001338	Infraestructura y Gestión de Tránsito	4	CL 32 S	CL 33 S	Parcheo/Sello Fisuras
4001398	Infraestructura y Gestión de Tránsito	4	CL 33 S	CL 34 S	Parcheo/Sello Fisuras
1006271	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 201	CL 209	Parcheo
9004831	Infraestructura y Gestión de Tránsito	9	CL 14C	CL 15	Lechada Asfáltica con Mezcla Bituminosa Reciclada
12001684	Infraestructura y Gestión de Tránsito	12	CL 75A	CL 76	Parcheo
11012142	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	1	CL 209	CL 215	Parcheo
10006955	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 74	CL 74A	Parcheo/Sello Fisuras
10007062	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 73BIS	CL 73A	Parcheo/Sello Fisuras
1000921	Infraestructura y Gestión de Tránsito	1	AC 183	CL 184	Parcheo/Sello Fisuras
1000853	Infraestructura y Gestión de Tránsito	1	CL 184	CL 184A	Parcheo/Sello Fisuras
1000917	Infraestructura y Gestión de Tránsito	1	AC 183	CL 184	Parcheo/Sello Fisuras
16000347	Infraestructura y Gestión de Tránsito	16	CL 5C	AC 9	Parcheo/Sello Fisuras
19002968	Infraestructura y Gestión de Tránsito	19	KR 47	KR 48A	Cambio de Carpeta
10006817	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 75	CL 75A	Parcheo/Sello Fisuras
10006896	Infraestructura y Gestión de Tránsito	10	CL 74A	CL 75	Parcheo/Sello Fisuras
1007152	Espacio Publico	1	KR 12	KR 13A	Cambio de Losas parcial/Sello de Grietas

4.2 GERENCIA DE PRODUCCIÓN

4.2.1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE EQUIPOS

Con los equipos de la entidad el grupo de operación, apoya las actividades realizadas por la gerencia de intervención, lo cual corresponde a un total de 68 unidades operativas:

UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA

UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	1, 2, 3, 4	4
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	1	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	3, 4	2
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	1	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	2	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	1, 2	2
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	4	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	1, 2	2
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	2	1
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 7	1	1

UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	1	1
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	1	1
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	1, 2	2
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	1, 2, 3	3
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	1	1
UNIDAD DE RELEVO	1	1

UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA

UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	5, 5, 7	3
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	7	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	1, 2, 5	3
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	1	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	3	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	1	1
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6A	1	1
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	2	1
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	4, 5	2
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	2	1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12		1
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	1	1
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	1	1

Estas unidades aporyan la operación de los siguientes equipos:

CAMION SEMIPESADO	6
CONDUCTOR DE BUS	2
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO	34
CONDUCTOR VH PESADO	2
CONDUCTOR VH PESADO CAMABAJA	2
CONDUCTOR VH PESADO CARRO IRRIGADOR EMULSION	3
CONDUCTOR VH PESADO GRUA PLANCHON	8
CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	26
CONDUCTOR VH SEMI PESADO CARRO TANQUE DE AGUA	4
CONDUCTOR VH SEMI PESADO VOLQUETA SENCILLA	6
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	2
OPERADOR RETROCARGADOR	4
OPERADOR SELLADORA	1
OPERADOR FINISHER	4
OPERADOR FRESADORA	2
OPERADOR MINICARGADOR CON MARTILLO	14
OPERADOR MOTONIVELADORA	2
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO O D.R	10
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO	2
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR O DOBLE RODILLO 8T	2
TOTAL	**136**

4.2.2 PRODUCCIÓN DE MEZCLAS

Las unidades que estuvieron presentes en el periodo de marzo, para las operación de equipos en producción son:

UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001	2
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	2
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	1
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004	2
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005	1
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	2
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	2
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007	1
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	1

El grupo de producción, apoyo las diferentes actividades de intervención con un total de 14 unidades de producción, con las cuales se atienden:

Dos plantas de asfalto en caliente.
Una planta de asfalto en frio.
Una planta dosificadora de concreto.
Una planta de trituración.

La gerencia de Produccion informa que en este periodo se produjo los siguientes tipos de mezcla y sus cantidades, las cuales son la materia prima para las intervenciones viales.

Tabla No. 7. Producción de Mezclas

	MEZCLA ASFALTICA (m^3)			MATERIAL DE FRESADO (m^3)	
	MD10	MD12	MGCR TIPO I	FRESADO	MBR
CANTIDAD	92,44	2576,46	603,04	2596,99	304,35
Totales	*3271,94*			*2901,34*	

	CONCRETO (m^3)			
	3500 psi	3000 psi	2500 psi	MR 43
CANTIDAD		8,00		100,30
Totales	*108,3*			

Informe Gerencia de Producción correo electrónico de 13 de abril de 2021.

4.3 GERENCIA GASA.

La gerencia de GASA con las tres unidades básicas para el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, realiza actividades como: revisar las condiciones de trabajo y el uso de los elementos de protección personal.


UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1	1
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2	1
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4	1

Adicionalmente, realiza seguimiento a:

- Al protocolo de bioseguridad para la prevención de Covid-19, identificando en obra condiciones como: estado de salud de las personas y su entorno familiar, inspección de orden y aseo en el frente de obra y baterías sanitarias, se veirifica el sumistro insumos como jabón y alcohol para la prevención de covid-19, cumplimiento del distanciamiento social en horas de almuerzo y pausas activas.
- En el mes de marzo se aislaron un total de 8 afiliados participes, por sospecha de contagio por covid-19, solo se presento un caso con prueba positiva.
- Se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente por COVID-19 y las directrices dadas por los entes correspondientes
- A las personas que realizan sus desplazamientos en difentes modos de transporte, de acuerdo con la infromacion procesada por la gerencia se oberva que las mayoría de desplazamientos se realizan en bicicleta, evitando de esta forma la propagación de contagio por COVID-19.

Movilidad Segura

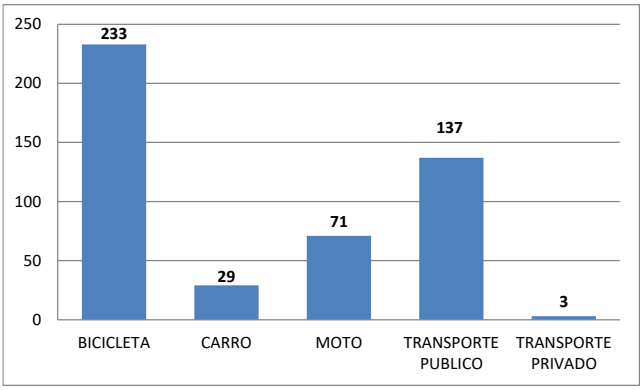

Dentro de las obligaciones de la organización sindical, se encuentra realizar capacitaciones durante la ejecución del contrato, la gerencia de GASA, realiza el seguimiento a esta obligación presentando el siguiente consolidado:

Tabla N°8 Seguimiento de cursos

PROGRAMA DE CAPACITACIONES CONTRATO COLECTIVO LABORAL 346/2021 UMV- SINTRAUNIOBRAS BOGOTA.	
SEGURIDAD	**# DE ASISTENTES**
1.Socialización y entrega del manual del manual de perfiles de cargo operativo	491 Afiliados participes
2. Socialización de consentimiento informado para la aplicación de la prueba de alcoholemia en frente de obra y sedes.	456 Afiliados participes

3.Inducción en SST y evaluación	456 Afiliados participes
4. Inducción PESV y evaluación	456 Afiliados participes
5. Sensibilización uso adecuado de los elementos de protección personal en ejecución de actividades.	456 Afiliados participes

4.4 SUBDIRECCION TÉCNICA DE PRODUCCION E INTERVENCION – LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS:

A continuación se relacionan las unidades que apoyaron las actividades de laboratorio en el mes de marzo:

UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO

UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1 - NOCTURNA	8	1

En tabla N° 9, se discriminan las actividades realizadas por las unidades de laboratorio: el total de unidades trabajando es de ocho unidades.

Tabla N°9

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL EN EL PERIODO 08 AL 24 DE MARZO DE 2021		
ACTIVIDAD DESARROLLADA	**MUESTRAS TOMADAS**	**JORNADA**
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 001		
* Apoyo en la toma de densidades de campo día	14	Diurna
* Toma de muestras de materiales granulares	8	Diurna
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	87	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 002		
* Toma de muestras de los materiales pétreos (gravas y arenas), recibidos en la sede de producción.	215	Diurna
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	87	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 03		
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	87	Diurna
* Apoyo de ensayos para materiales petreos	215	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 004		
* Apoyo de ensayos para materiales granulares.	8	Diurna
* Toma de muestras de mezcla densa en caliente (turno nocturno).	63	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 005		
*Toma de asentamiento, elaboración y fallo de vigas	23	Diurna
* Toma de muestras de mezcla densa en caliente (turno nocturno).	63	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 006		
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	87	Diurna
* Apoyo de ensayos mezcla asfáltica en laboratorio.	63	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 007		
* Apoyo de ensayos para materiales petreos	215	Diurna
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	87	Diurna
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB GP 007 - 008		
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	87	Diurna
Apoyo en planta de mezcla asfáltica en caliente	63	Diurna

4.5 RESUMEN EJECUCIÓN

TABLA No 11: DISCRIMINACIÓN DE UNIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PERIODO DE MARZO


GERENCIA	CANTIDAD DE UNIDADES POR GERENCIA	VALOR
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN	34,00	$ 663.312.601,00
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA	13,00	$ 63.431.848,00
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3,00	$ 25.660.281,00
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA	37,00	$ 217.875.602,00
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA	19,00	$ 140.566.516,00
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO	8,00	$ 34.245.109,00
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.145.091.957,00


TABLA No 12. CONSOLIDADO DE TIEMPO SUPLEMENTARIO AVALADO POR LAS GERENCIAS

GERENCIA	TIEMPO SUPLEMENTARIO (EN HORAS) 8 DE MARZO A 24 DE MARZO DE 2021	FECHA
LABORATORIO	57,00	15 DE ABRIL DE 2021
PRODUCCION	574,00	13 DE ABRIL DE 2021
INTERVENCION	1.025,00	8 DE ABRIL DE 2021
OPERACIÓN	1.678,00	16 DE ABRIL DE 2021
GASA	-	13 DE ABRIL DE 2021
TOTALES	3.334	13 DE ABRIL DE 2021

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDAD: CAMBIO DE CARPETA
DIRECCIÓN: KR 12 CON CL 160 Y AC 161
BARRIO: LA LIBERIA
LOCALIDAD: USAQUEN

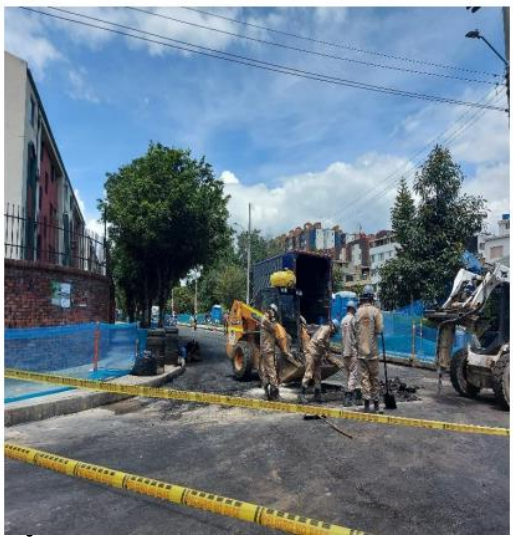

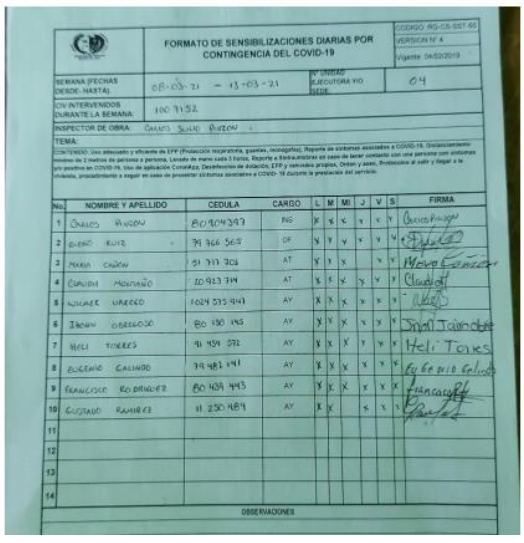

FORMATO DE SENSIBILIZACIONES DIARIAS POR CONTINGENCIA DEL COVID-19

Entrega de carnet, en el inicio del contrato 346 de 2021



CIV: 2001678
ACTIVIDAD: CAMBIO DE CARPETA
DIRECCIÓN: CL 55 CON KR 5 KR 6
BARRIO: BOSQUE CALDERON
LOCALIDAD: CHAPINERO





CIV: 13000460
ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN: TV 21 BIS CL 59 DG 60 Y TV 22 BIS
BARRIO: SAN LUIS
LOCALIDAD: TEUSAQUILLO









CIV: 16000169
ACTIVIDAD: CAMBIO DE CARPETA
DIRECCIÓN: KR 67 CON CL 10 Y CL 10 A
BARRIO: SALAZAR GOMEZ
LOCALIDAD: PUENTE ARANDA





CIV: 1000437
ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN: KR 17 CON CL 187 Y CL 189
BARRIO: EL VERVENAL
LOCALIDAD: USAQUEN






CIV: 7004711
ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN: CL 70 A S CON KR 81 I Y KR 82
BARRIO: PASO ANCHO
LOCALIDAD: BOSA





CIV: 19015715-19007333
ACTIVIDAD: FRESADO ESTABILIZADO
DIRECCIÓN: DG 61 A S CON KR 18 N Y KR 18 N BIS A
BARRIO: LUCERO ALTO
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR



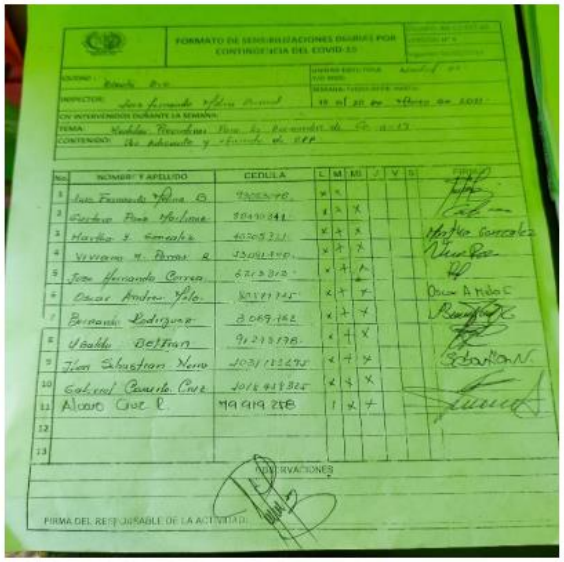

CIV: 13000460
ACTIVIDAD: REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN: TV 21 BIS CL 59 DG 60 Y TV 22 BIS
BARRIO: SAN LUIS
LOCALIDAD: TEUSAQUILLO





LUIS FERNANDO RAMOS PARRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO N°346 DE 2021

Fecha de elaboración de informe: 23.04.2021

Revisó: Tomas Sánchez. Profesional de apoyo STPI
Elaboró: Mercedes Sánchez Lemus. Contratista STPI

Correos electrónicos:
informe de laboratorio: Correo del 15.04.2021.
informe de Producción: correo de 13.04.2021.
informe de Operación: correo de 16.04.2021.
informe de Intervención: correo 8.04.2021.
informe de Gasa: correo 13.4.2021.
informe STPI -SST: 14.04.2021.
