INFORME 4 DE SUPERVISION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0520 de 10 DICIEMBRE DE 2020

PERIODO:

18 DE MARZO DE 2021 AL 17 DE ABRIL DE 2021

OBJETO:
"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA CONTRATAR EL "MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BÁSICO DEL RIO OPIA CON LA REPOSICIÓN DEL EMISARIO FINAL DE LA PTAR CHICALA DEL MUNICIPIO PIEDRAS"

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

CONTRATANTE	
ENTIDAD	CORPORACION AUTONMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
NIT	890.704.536-7
MUNICIPIO	
NOMBRE	MUNICIPIO DE PIEDRAS
NIT.	800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ
C.C.	79.882.952
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($1.012.000.000,oo)
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	APORTE DE CORTOLIMA: $ 1.000.000.000
	APORTE DEL MUNICIPIO: $ 12.000.000
PLAZO	5 MESES
SUPERVISOR DEL CONVENIO	OSCAR FERNANDO CARDOZO OSUNA
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA FINAL DEL CONVENIO	17 DE MAYO DE 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. DESEMBOLSO PRIMER 30%**	NO APLICA	25- MARZO-2021	$300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO		NO APLICA		
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$300.000.000
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. GESTION DE PAGOS

	1	2	3	4
INFORMES DE SUPERVISION	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	ACTA PARCIAL No 3	ACTA FINAL
	Fecha de presentación	**Fecha de presentación**	**Fecha de presentación**	**Fecha de presentación**
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Fecha de Pago	**Fecha de Pago**	**Fecha de Pago**	**Fecha de Pago**

4. INFORMACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DE 2021 AL 17 DE ABRIL DE 2021.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**25,00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**30.0%**

% AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
	30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: avance de obra #1
AVANCE: 30,00%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
RECURSOS GIRADOS: a la fecha del presente informe no se ha realizado pagos parciales al contratista de interventoría, tampoco al contratista de obra.

INFORME DE ACTIVIDADES

En el periodo del presente informe mensual se desarrollan las actividades correspondientes:

Firma del acta de Inicio del contrato de obra PLP 001 DE 2020 del 5 de febrero de 2021 con fecha del 18 de marzo de 2021.

Firma del acta de Inicio del contrato de Interventoría No. CMA 001 de 25 de febrero de 2021, con fecha del 18 de maro de 2021.

Inicio de actividades de obra

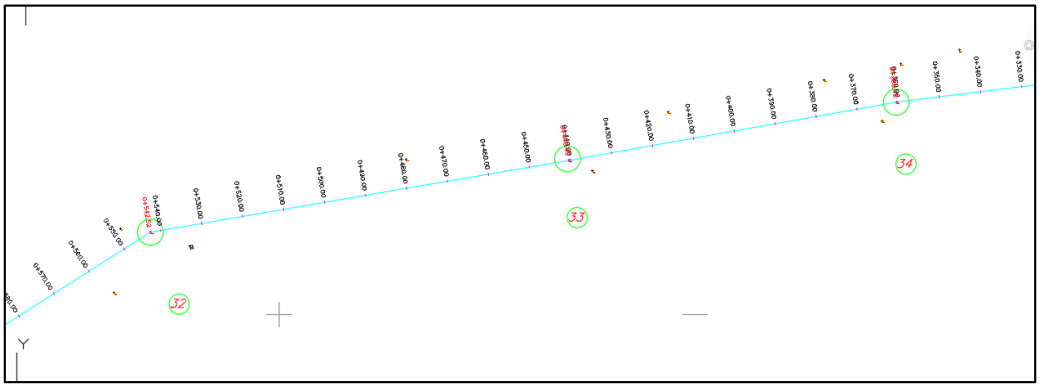
Las actividades de avance de obra realizaos es la localización y replanteo de las obras con equipo de topografía, una vez terminada esta actividad se procedió a iniciar la actividad de cerramiento y las excavaciones mecánicas desde el pozo # 36 hacia el pozo # 35.

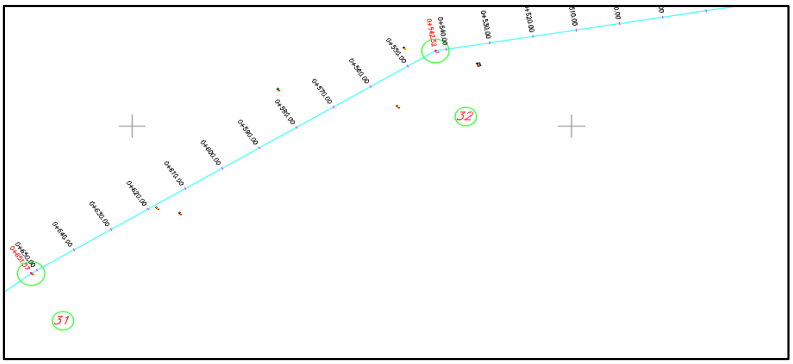
Sucesivamente desde el:
pozo #34 hasta el pozo # 33
pozo #33 hasta el pozo # 32
pozo #32 hasta el pozo # 31

Las actividades desarrolladas constan de corte de pavimento en los tramos donde hay material asfaltico, rotura de carpeta asfáltica, excavaciones en roca y conglomerado, suministro e instalación de cama en arena, suministro e instalación de tubería de 12” PVC según especificación del contrato, suministro e instalación de atraque en material de triturado y lleno con material seleccionado y capa de 25 cm de recebo para nivelación de vía.

Para el cierre del presente informe se resalta que el avance del contratista es mayor al 30% en ejecución de actividades de obra.


34
35
36


32
33
34


31
32



Se deja en este avance para la proyección del acta parcial de obra la cual no debe superar el 30%.

El presente informe se firma en el Municipio de Piedras Tolima a los diecisiete (17) días del Mes de abril de 2021.

ING. KELLY VIVIANA ORDOÑEZ CRUZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL INFORME 4



SEÑALIZACION DE OBRA



CORTE DE PAVIMENTO



REPLANTEO TOPOGRAFICO CON NIVEL DE PRESICIÓN



VISITA DE FUNCIONARIOS DE CORTOLIMA – LOCALIZACION DE POZOS

DIRECCIÓN:
Carrera 2 calle 4 Esquina - Palacio Municipal Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co
CÓDIGO POSTAL: 730501





CORTE DE PAVIMENTO CON MAQUINA

DIRECCIÓN:
Carrera 2 calle 4 Esquina - Palacio Municipal Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co
CÓDIGO POSTAL: 730501



EXCAVACION MECANICA



CERRAMIENTO DE OBRA CON POLISOMBRA – ENTIBADO

DIRECCIÓN:
Carrera 2 calle 4 Esquina - Palacio Municipal Parque Principal

CORREO:
alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB:
www.piedras-tolima.gov.co
CÓDIGO POSTAL: 730501



INSTALACION DE TUBERIA DE 12" PVC Y ATRAQUE EN TRITURADO



INSTALACION DE CAMA EN ARENA DE 10 CM



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECHO EN TRITURADO PARA ATRAQUE DE TUBERÍA D=1/2 A3/4"





COMPACTACIO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION



COMACTACION DE 25 CM DE MATERIAL TIPO RECEBO PARA NIVELAR
