
GRG INGENIERIA SAS

INFORME DE INTERVENTORIA No 1

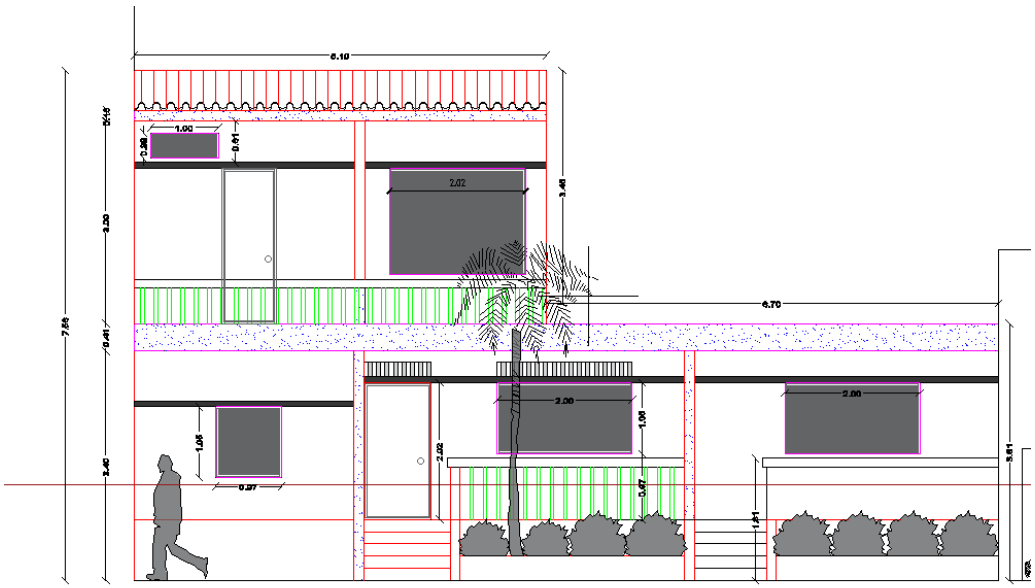

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Fecha: 13 de julio a 31 de julio de 2020

GRG INGENIERIA SAS

ÍNDICE DE CONTENIDO.

1. Acta de Inventario Instalaciones
2. Bitácora de obra.
3. Control financiero mensual de obra (obra a ejecutarse, mayores, menores y obras adicionales
4. Actas de recibo parcial y liquidación de obra* (las que se hayan realizado en el mes).
5. Resultados ensayos de laboratorio realizados en el mes - localización planos
6. Reseña fotográfica digital
7. Informe ambiental, de seguridad social e industrial y de cumplimiento al sistema de aseguramiento de la calidad
8. Formato control mensual de personal que labora en obra.
9. Informe de Trazabilidad del material y calidad
10. Informe de Cumplimiento especificaciones técnicas.
11. Programa y avance de obra - análisis ruta crítica
12. Flujograma de inversión.
13. Reporte inversión del anticipo. Los soportes deben reposar en el archivo de la interventoría y cualquier requerimiento debe ser atendido de manera inmediata y debe coincidir con los formatos entregados en los informes. En este reporte se debe anexar el arqueo de almacén en obra.
14. Acta de liquidación de servicios públicos.
15. Relación de paz y salvos de proveedores, subcontratistas para liquidación de la obra.
16. Planos récord a la fecha de presentación del informe (INFORME FINAL).
17. Memorias de medición de obra soporte de las actas de recibo de obra

GRG INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. SAB-MC-5-2020

ECOHABITAT S.A.S

Objeto de Contrato: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valor del Contrato: $ 461.183. 037.oo

Duración: 90 Días

Fecha de Inicio: 13 de Julio de 2019

Fecha de Terminación: 13 de octubre de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 18 DE 2020

GRG INGENIERIA S.A.S

Objeto de Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Valor del Contrato: $ 33.000. 000.oo

Duración: 90 Días

Fecha de Inicio: 13 de Julio de 2019

Fecha de Terminación: 13 de octubre de 2019

GRG INGENIERIA SAS

LOCALIZACIÓNDE LA OBRA




El sitio de ejecución del contrato será en el predio ubicado en la dirección: carrera 19 # 28ª – 67 en el barrio Ciudad Jardín

INVENTARIO DE LAS INSTALACIONES O INMUEBLE

- Marcos y puerta en madera: 9 und
- Marcos en madera: 13 und
- Closets en Madera: 5m2
- Cielo Raso en Madera y Tríplex: 50.2m2
- Ventanas en Madera: 9und
- Ventana Metálica incluye vidrio y reja en hierra: 3und
- Cubierta en teja de asbestos cemento: 253.95
- Mampostería en bloque de arena cemento
- Mampostería en bloque de arcilla
- Pisos de cemento tipo mosaico
- Pasamanos de escalera en tubo galvanizado redondo
- Árbol de mano de gran tamaño ubicado en el patio posterior: 1un
- Tanque subterráneo para almacenar agua potable: 1und

GRG INGENIERIA SAS

BITÁCORA DE OBRA.

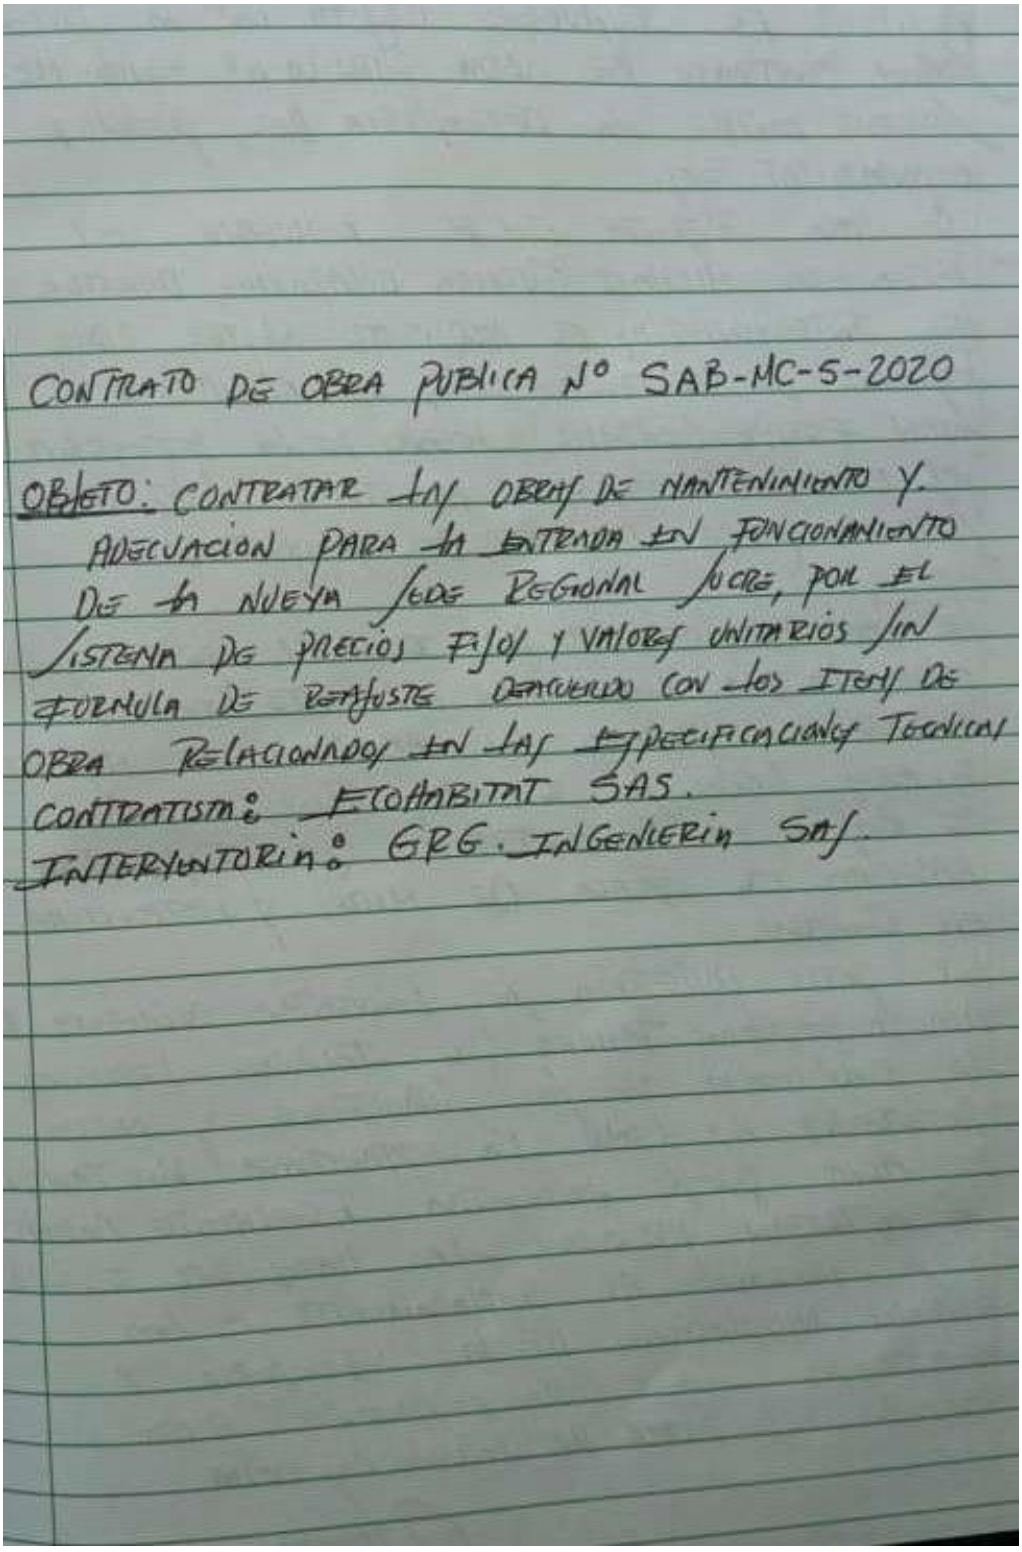


CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SAB-MC-5-2020

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CONTENIDOS CON LOS ITEMS DE OBRA RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATISTA: ECOHABITAT SAS.

INTERVENTORIA: GRG. INGENIERIA SAS.

GRG INGENIERIA SAS

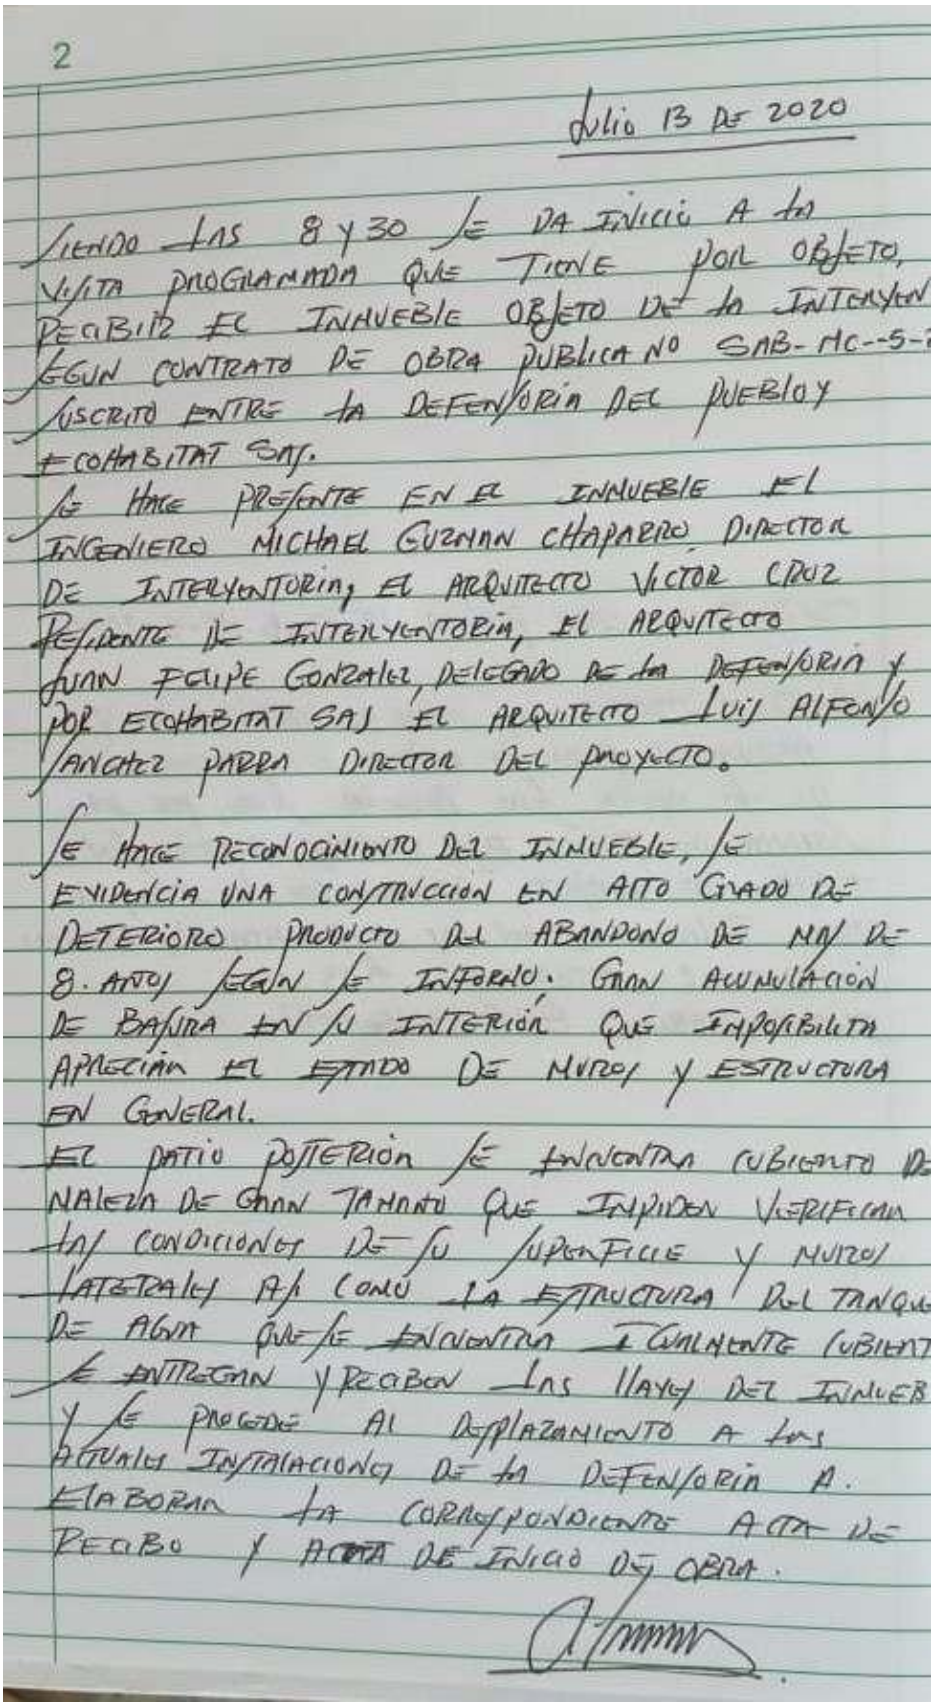

2

Julio 13 DE 2020

Siendo las 8 y 30 se da inicio a la visita programada que tiene por objeto, recibir el inmueble objeto de la intervención según contrato de obra publica No SAB-MC--5-
suscrito entre la Defensoría del pueblo y ecohabitat SAS.
Se hace presente en el inmueble el ingeniero Michael Guzman Chaparro Director de interventoria, el arquitecto Victor Cruz Residente de interventoria, el arquitecto Juan Felipe Gonzalez, delegado de la Defensoría y por ecohabitat SAS el arquitecto Luis Alfonso Sanchez parra Director del proyecto.

Se hace reconocimiento del inmueble, se evidencia una construccion en alto grado de deterioro producto del abandono de mas de 8. Años segun se informo. Gran acumulación de basura en su interior que imposibilita apreciar el estado de muros y estructura en General.
El patio posterior se encuentra cubierto de maleza de gran tamaño que impiden verificar las condiciones de su superficie y muros laterales asi como la estructura del tanque de agua que se encuentra totalmente cubierto
se entregan y reciben las llaves del inmueb
y se procede al desplazamiento a las actuales instalaciones de la Defensoría a.
Elaborar la correspondiente Acta de recibo y Acta de inicio de obra.

GRG INGENIERIA SAS

Julio 14 de 2020

Se da inicio a las actividades con la verificacion de protocolos de bioseguridad del personal procedente de Bogota, procediendo con el desmonte y poceria de la maleza del patio posterior se adelanta la contratacion de personal en sitio cuyos documentos son enviados a Bogota para la revision y aprobaciones de los mismos.
siendo las 5pm de la tarde se cierra la jornada sin novedad.


Julio 15 de 2020

Se inician las actividades recibiendo el personal contratado, se practica reunion sobre la descripcion del proyecto, medidas de seguridad en el trabajo, protocolos de bioseguridad y actividades a desarrollar.
Se procede a tomar los protocolos de bioseguridad.
Se hace entrega de la dotacion y se da inicio a la actividad de limpieza del inmueble.
A las 5pm. se terminan actividades sin novedad.

Julio 16 de 2020

Se da inicio a las actividades con la toma de parametros de los protocolos de bioseguridad, no se presentan novedades sobre este particular.
Se continua con las actividades de limpieza del inmueble y retiro de la maleza del patio posterior.
Se realiza la reconexion del servicio de agua por parte de la empresa Veolia.
A las 5pm. se cierran actividades sin novedad.

GRG INGENIERIA SAS

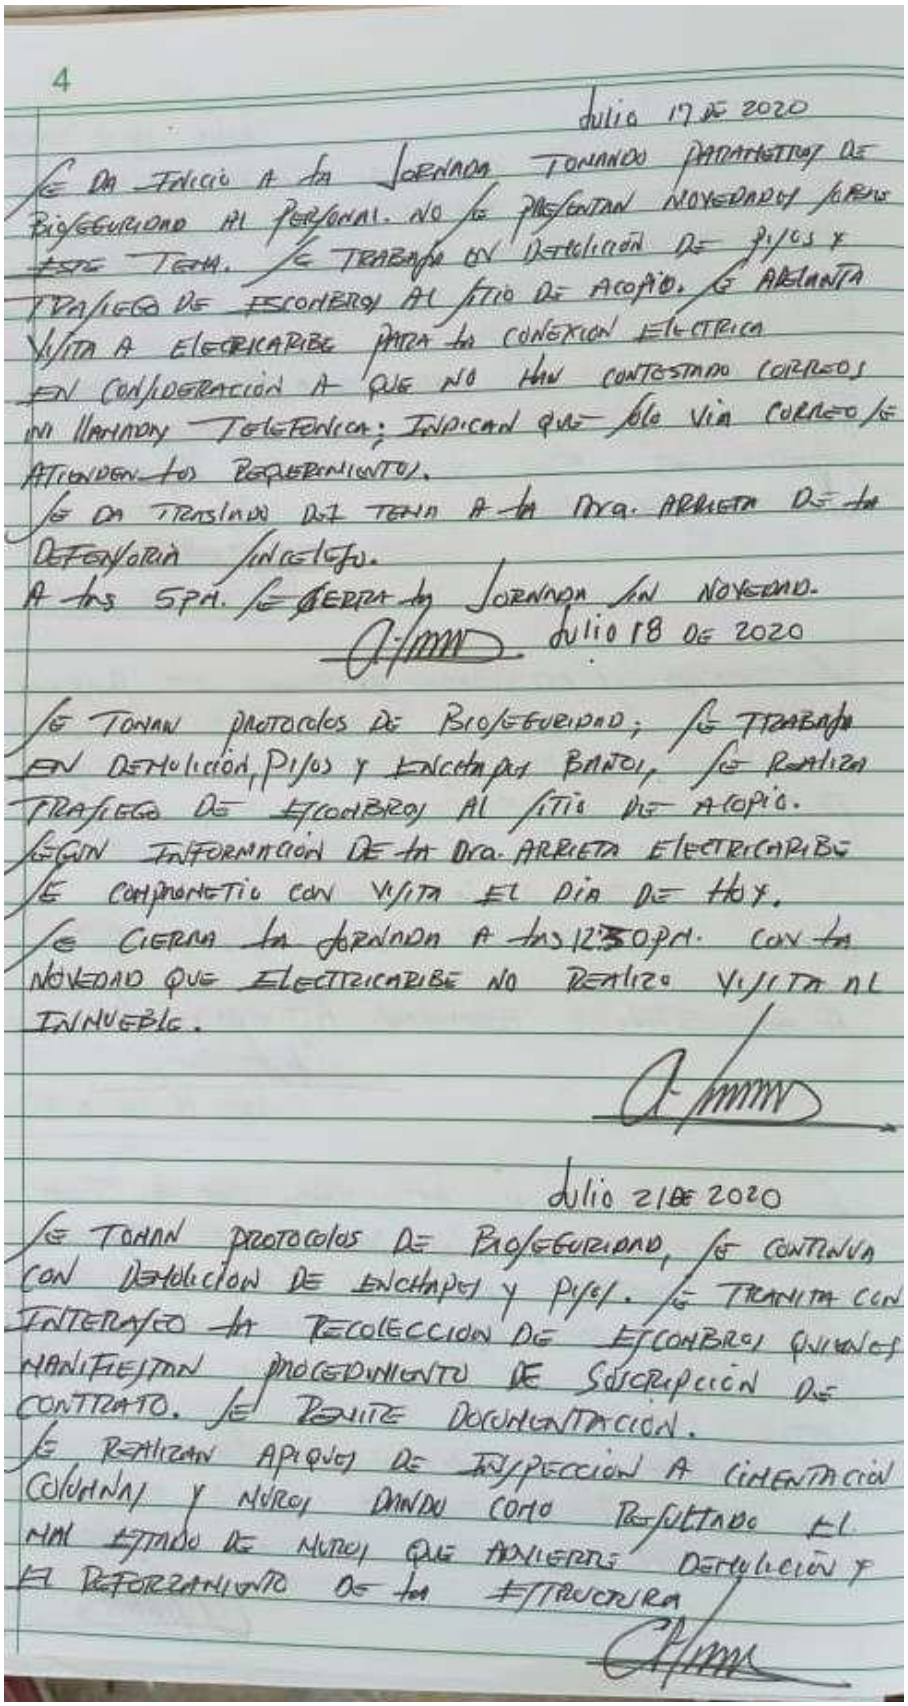

4

Julio 17 DE 2020

SE DA INICIO A LA JORNADA TOMANDO PARAMETROS DE BIOSEGURIDAD AL PERSONAL. NO SE PRESENTAN NOVEDADES SOBRE ESTE TEMA. SE TRABAJA EN DEMOLICION DE PISOS Y TRASLEGO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO. SE ADELANTA VISITA A ELECTRICARIBE PARA LA CONEXION ELECTRICA EN CONSIDERACION A QUE NO HAN CONTESTADO CORREOS NI LLAMADAS TELEFONICAS; INDICAN QUE SOLO VIA CORREO SE ATIENDEN LOS REQUERIMIENTOS.
SE DA TRASLADO DEL TEMA A LA Dra. ARRIETA DE LA DEFENSORIA JURIDICO.
A LAS 5PM. SE CIERRA LA JORNADA SIN NOVEDAD.

Julio 18 DE 2020

SE TOMAN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD; SE TRABAJA EN DEMOLICION PISOS Y ENCHAPES BANOS, SE REALIZA TRASLEGO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO.
SEGUN INFORMACION DE LA Dra. ARRIETA ELECTRICARIBE SE COMPROMETIO CON VISITA EL DIA DE HOY.
SE CIERRA LA JORNADA A LAS 12:30 P.M. CON LA NOVEDAD QUE ELECTRICARIBE NO REALIZO VISITA AL INMUEBLE.

Julio 21 DE 2020

SE TOMAN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, SE CONTINUA CON DEMOLICION DE ENCHAPES Y PISOS. SE TRAMITA CON INTERASEO LA RECOLECCION DE ESCOMBROS QUIENES MANIFIESTAN PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCION DE CONTRATO. SE REQUITE DOCUMENTACION.
SE REALIZAN APIQUES DE INSPECCION A CIMENTACION COLUMNAS Y MUROS DANDO COMO RESULTADO EL MAL ESTADO DE MUROS QUE REQUIEREN DEMOLICION Y EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA

GRG INGENIERIA SAS

JULIO 22 DE 2020.

SE INICIAN ACTIVIDADES CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, SE TRABAJA EN DEMOLICIONES DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL, EVACUACION DE ESCOMBROS, DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PARED. A LAS 3 PM. SE ATIENDE REUNIÓN VIRTUAL CON INGENIERA MANUELA, DR. JUAN MANUEL QUIÑONEZ, ARQ. JUAN FELIPE DE LA DEFENSORIA, EL INGENIERO MICHAEL EDUARDO GUZMAN, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, ARQ. HELDER BENITEZ. RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y EL ARQ. LUIS ALFONSO SANCHEZ. DIRECTOR DE OBRA DE LA FIRMA CONSTRUCTORA. SE CONCLUYE LO SIGUIENTE.

ADELANTAR DEMOLICION DE MUROS COLINDANTES EN EL PATIO POSTERIOR

CONSTRUIR SISTEMA DE CIMENTACION DE CICLOPEO CORRIDO, VIGA DE AMARRE, COLUMNAS Y VIGA DE CONFINAMIENTO, LA MAMPOSTERIA SE REALIZARA EN BLOQUE DE CEMENTO ABUFANDADO ESTRUCTURAL CON DOVELAS — REALIZAR DISEÑO.

REALIZAR DEMOLICION DE PLACA DE PISO PATIO

REALIZAR DEMOLICION DE TANQUE DE AGUA

REALIZAR DEMOLICION ESCALERAS DE ACCESO A PATIO Y DE ACCESO DE PATIO A SEGUNDO PISO.

SOBRE LA EDIFICACION DE PRIMER Y SEGUNDO PISO SE DEFINE DEMOLER MUROS DIVISORIOS VERIFICAR HUMEDAD Y NIVEL FREATICO PARA CON ELLO PROPONER FILTROS PERIMETRALES TIPO FRANCES Y CONDUCIRLOS A CAJAS DE INSPECCION VERIFICAR SISTEMA ESTRUCTURAL DEL COMPONENTE DE 1 PISO Y PROPONER EL MISMO POSIBILITANDO EL TRABAJO DE PLANTA LIBRE.

SE AUTORIZA DEMOLICION DE VIGA CANAL EN CONCRETO Y REEMPLAZARLA

SE DEFINE ADELANTAR REUNIONES PARA UN BALANCE REAL DEL CONTRATO (NO SE

GRG INGENIERIA SAS

6

DEFINE QUIEN LO REALIZARA.
- SE REDEFINIRA UN NUEVO COMITE VIRTUAL UNA VEZ LA CONSTRUCCION ESTE LIBRE DE TAREAS DE DEMOLICION Y EVACUACION DE ESCOMBROS.
SE CIERRAN ACTIVIDADES DEJANDO PENDIENTE CONSULTA SOBRE EJECUCION DE PLANOS, PRESUPUESTOS Y DISEÑOS TECNICOS. A LA INTERVENTORIA Y POR SU CONDUCTO A LA ENTIDAD.

HECTOR BENITEZ O. LUIS ALFONSO SANCHEZ P.

JULIO 23 DE 2020

SE INICIAN ACTIVIDADES 7AM. CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE TODO EL PERSONAL, SE ADELANTAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS DEFECTUOSAS DEL SECTOR DE COCINA Y ESPACIO PARA EL RACK. UBICADOS EN EL PATIO POSTERIOR, SE ADELANTA LA DEMOLICION DEL TANQUE DE AGUA EXISTENTE Y MUROS ADYACENTES, SE ADELANTA DEMOLICION DE PISOS Y ENCHAPES EN EL PRIMER PISO DE LA EDIFICACION.
SE REALIZA ACOPIO DE ESCOMBRO A LA ESPERA QUE LA EMPRESA INTERASEO REALICE LA RECOLECCION QUE SEGUN INFORMARON INICIARAN EL DIA 24 DE LOS CORRIENTES LA RECOLECCION.
SIENDO LAS 5 PM. SE TERMINA LA JORNADA SIN NOVEDADES.

HECTOR BENITEZ O.

GRG INGENIERIA SAS

Julio 24 DE 2020

SE TRABAJA INICIANDO JORNADA EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. NO SE PRESENTAN ALERTAS, NI NOVEDADES SOBRE ESTE ASPECTO. DEL PERSONAL SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PISOS EN EL PRIMER PISO, ACOPIO DE ESCOMBROS, TERMINACION DE DEMOLICIÓN DE TANQUE DE AGUA, MUROS ADYACENTES, VIGAS, COLUMNAS Y MUROS DE LA COCINA Y CUARTO DE RACK DEL PATIO POSTERIOR. LA EMPRESA INTERASEO NO HA REALIZADO LA RECOLECCION DE ESCOMBROS, SE ESTA TRAMITANDO CONTRATO CON EL AREA JURIDICA DE LA EMPRESA ELECTRICARIBE NO HA REALIZADO LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO A PESAR QUE COMPLETAMOS 2 SEMANAS DE TRAMITE.
A LAS 5PM. SE CIERRA LA JORNADA SIN NOVEDAD.

ELOER BENITEZ O.

Julio 25 DE 2020

SE DA INICIO A LA JORNADA CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD NO SE PRESENTAN NOVEDADES EN ESTE ASPECTO. SE TRABAJA EN DEMOLICION DE MUROS, DEMOLICION DE PISOS Y TRASIEGO DE ESCOMBROS DEL INTERIOR AL SITIO DE ACOPIO ESTABLECIDO EN LA ENTRADA DEL PROYECTO.
SE REALIZAN 2 VIAJES DE 14M³ DE ESCOMBROS POR PARTE DE LA EMPRESA INTERASEO S.A E.S.P.
SE LABORA EN OBRA CON 4 AYUDANTES, 2 OFICIALES, DIRECTOR DE OBRA.
A LAS 12.30 PM DEL DIA SE TERMINA LA JORNADA SIN NOVEDADES.

ELOER BENITEZ O.

GRG INGENIERIA SAS

8

JULIO 27 DE 2020

SE DA INICIO CON LA TOMA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD NO SE PRESENTAN NOVEDADES. SE TRABAJA EN EL TRASLEGO DE ESCOMBROS, SE ESPERA AUTORIZACION DE DEMOLICION MURO SE VERIFICA EL ESTADO DE LOS MUROS INTERNOS DEL SEGUNDO PISO, PRESENTANDO GRIETAS QUE COMPROMETEN LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, VIGAS ARRIETADAS DESCANSANDO DIRECTAMENTE SOBRE MUROS.
SE AUTORIZA DEMOLICION DE MUROS INTERNOS ACORDE CON LO DEFINIDO EN EL COMITE VIRTUAL DEL 22 DE JULIO DE 2020.

Heiber Benitez C.

Julio 28 de 2020.

SE INICIA LA JORNADA TOMANDO REGISTROS DE PARAMETROS DE BIOSEGURIDAD; NO SE PRESENTAN NOVEDADES SOBRE ESTE PARTICULAR.
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y TRASLEGO DE ESCOMBROS AL SITIO DE ACOPIO EXTERNO EN ESPERA DE LA RECOLECCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA INTERASEO.
SE REALIZA LLAMADA A LA INGENIERA NANUEIA DE LA DEFENSORIA SOBRE EL AVANCE DE LOS REQUERIMIENTOS, MANIFIESTA QUE ENVIARA LA PROPUESTA QUE TENIAN INICIALMENTE PARA EL INMUEBLE Y CONVOCA REUNION VIRTUAL PARA LAS 3PM DE HOY.
SE RECIBE VISITA DE ELECTRICARIBE Y PROCEDEN A EJECUTAR TRABAJO DE ACOMETIDA ELECTRICA, CONEXIÓN TRANSFORMADOR Y CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTADOR- SE SUSCRIBEN ACTAS.
SE DESARROLLA A LAS 3PM REUNIÓN VIRTUAL CON LA INGENIERA NANUEIA Y SE DESARROLLAN LOS SIGUIENTES TEMAS.

- SE DISCUTE EL DISEÑO INICIALMENTE PROPUESTO POR LA DEFENSORIA ENVIADO POR LA INGENIERA

GRG INGENIERIA SAS

MANUELA, SOBRE EL CUAL SE OBSERVA QUE SE DEFINE UNA AMPLIACION CONSIDERABLE SOBRE EL PATIO POSTERIOR.

- EL ARQUITECTO SANCHEZ SOLICITA DEFINIR EL ALCANCE Y NIVEL DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO PARA PODER REALIZAR UN BALANCE CIERTO AL PRESUPUESTO. SOLICITA CELERIDAD A LOS DISEÑOS YA QUE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR CONCLUIRAN EN TRES SEMANAS. PROPONE PARA DARLE CELERIDAD AL PROYECTO QUE SE AMPLIE EL ALCANCE DEL CONTRATO PARA PODER REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS JUNTO CON EL NUEVO PRESUPUESTO. LA INGENIERA MANUELA REALIZARA CONSULTA.
- EL ARQUITECTO SANCHEZ ENVIARA A LA ENTIDAD UN ESQUEMA ARQUITECTONICO DE OCUPACIÓN CON UN PRIMER BALANCE DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DEFINIDAS.


INSISTE COMO DELEGADO DEL CONTRATISTA QUE ES FUNDAMENTAL TOMAR DECISIONES RAPIDAS Y ASERTIVAS PARA NO INCURRIR EN SOBRECOSTOS DE PERSONAL Y RETRASO DE OBRA.

- SE CONCLUYE EN QUE LA INGENIERA MANUELA REALIZARA LAS CONSULTAS RESPECTIVAS SOBRE LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE DISEÑOS TECNICOS LOS CUALES REQUIEREN DE MEMORIAS Y CARTA DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS EJECUTE.

A LAS 5PM SE CIERRAN LAS ACTIVIDADES CON LA NOVEDAD DE NO RETIRO DE ESCOMBROS POR LA EMPRESA INTEGRASEO.

HECTOR MARTINEZ O.

GRG INGENIERIA SAS

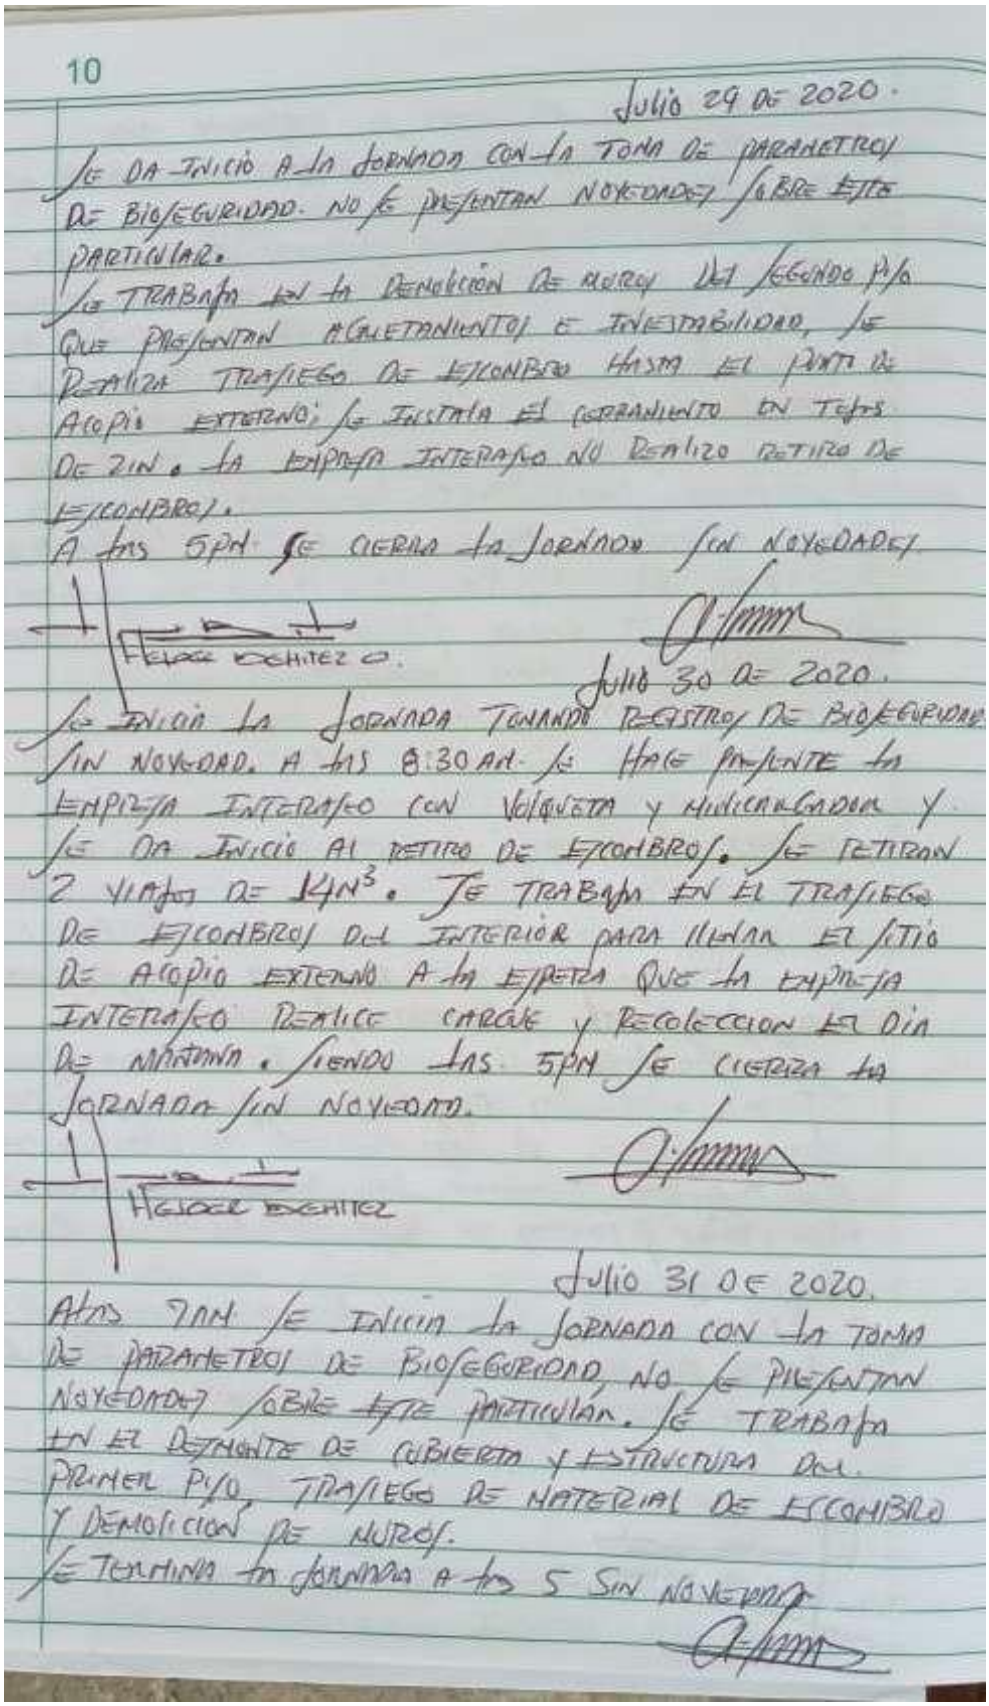

10

Julio 29 de 2020.

Se da inicio a la jornada con la toma de parametros de bioseguridad. No se presentan novedades sobre este particular.

Se trabaja en la demolición de muros del segundo p/o que presentan asentamientos e inestabilidad, se realiza traslado de escombros hasta el punto de acopio externo; se instala el cerramiento en tejas de zinc. La empresa integrasa no realizo retiro de escombros.

A las 5pm se cierra la jornada sin novedades.

Felipe Benitez C.

Julio 30 de 2020.

Se inicia la jornada tomando registros de bioseguridad sin novedad. A las 8:30 am se hace presente la empresa integrasa con volqueta y minicargador y se da inicio al retiro de escombros. Se retiran 2 viajes de 14m³. Se trabaja en el traslado de escombros del interior para llevar el sitio de acopio externo a la espera que la empresa integrasa realice cargue y recolección el dia de mañana. Siendo las 5pm se cierra la jornada sin novedad.

Hector Benitez


Julio 31 de 2020.

A las 7am se inicia la jornada con la toma de parametros de bioseguridad, no se presentan novedades sobre este particular. Se trabaja en el desmonte de cubierta y estructura del primer piso, traslado de material de escombro y demolición de muros.

Se termina la jornada a las 5 sin novedad.

GRG INGENIERIA SAS

CONTROL FINANCIERO MENSUAL DE OBRA

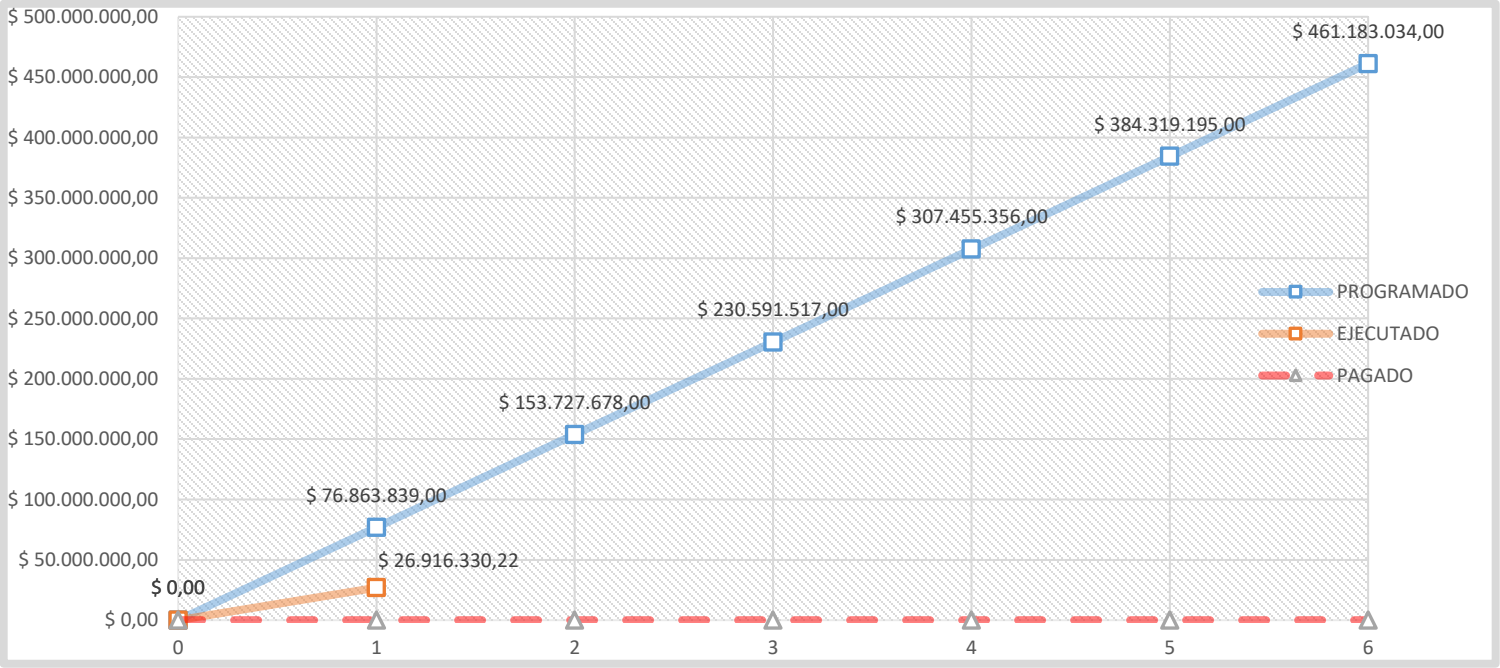

La obra presenta un avance del 5.84% con respecto al valor de la obra, debido a que las actividades ejecutadas hasta la fecha son actividades no previstas

al iniciar la obra se realizó un diagnóstico del estado actual del inmueble en el cual concluimos que la edificación se encontraba en mal estado de conservación.

Diagnostico:

Estructura: Construida con una cimentación en vigas de concreto de reforzado, y sobre cimiento el ladrillo en algunas áreas, columnas en concreto reforzado con Varilla Lisa, Losa de Entrepiso aligerada con bloques de cemento, dintel en concreto en algunos vanos de puertas y ventanas.

No presenta vigas de confinamiento superior en el segundo piso, las columnas no presentan continuidad en el segundo piso para trasmitir las cargas de cubierta hacia la cimentación.

Mampostería:

Los muros perimetrales de la edificación se encuentran construidos en bloque de arcilla presentando humedad y abundante presencia de comején con nidos dentro de estos bloques.

Los muros interiores algunos se construyeron en bloque de arcilla y otros en bloque de arena cemento a mano (sin vibrar), los cuales también presentan comején.

Cubierta: el inmueble presenta una cubierta en láminas de asbesto cemento con estructura en madera, con bastante presencia de comején

Cielo Raso: cielo raso en madera prensada y estructura en madera

GRG INGENIERIA SAS

Pisos: el inmueble presenta pisos en baldosa de cemento tipo mosaico instalados directamente sobre el terreno (la edificación lo presenta plantilla en concreto en la mayoría de sus áreas.
Presenta humedad en la parte posterior izquierda, se presume que puede ser alguna tubería colapsada o filtración de algún tanque subterránea de los vecinos.
El patio presenta mucha maleza, la cual requieres ser desmontada.
Instalaciones Hidrosanitarias: se asumen en tubería de pvc en regular estado de conservación
Carpintería de Madera: el inmueble presenta todos los marcos y puertas y ventanas en madera en mal estado de conservación con presencia de comején.
Enchapes: los baños y cocina presentan enchapes de regular calidad en mal estado de conservación

A raíz de estos hallazgos Se determino la necesidad de demoler todos los muros del primer y segundo piso, el tanque de almacenamiento de agua y otros componentes

ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y LIQUIDACIÓN DE OBRA * (LAS QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL MES).

Hasta la fecha no se ha realizado acta parcial y liquidación de obra


RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS EN EL MES

Hasta la fecho se están ejecutando actividades de demolición

GRG INGENIERIA SAS

RESEÑA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	14 DE JULIO DE 2020

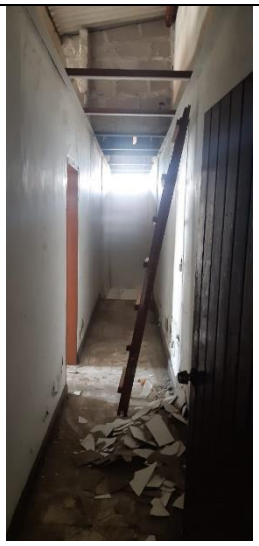

- Desmonte de Maleza en Patio Posterior
- Demolición de Piso en Baldosa y Plantilla de Concreto
- Desmonte de Closet y Poyos en Concreto
- Desmonte de Cielo Falso

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	15 DE JULIO DE 2020



- Limpieza de Desmonte de Maleza en el Patio

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	16 DE JULIO DE 2020






- Pañetes Agrietados

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	17 DE JULIO DE 2020



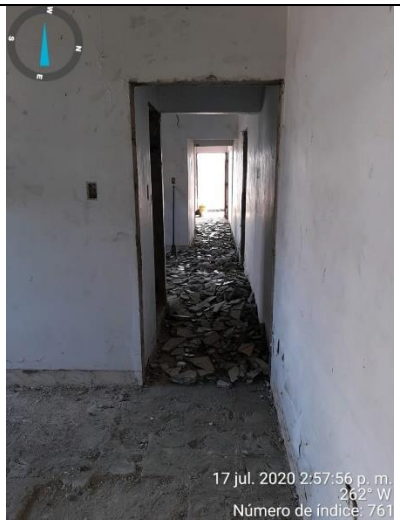



- Desmonte de Puertas y Marcos en Madera
- Desmonte de Ventanas
- Demolición de Piso en Baldosa de Cemento
- Demolición de Plantilla en Concreto

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	18 DE JULIO DE 2020





- Excavación para Viga Cimiento de muro en el lindero del patio

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	21 DE JULIO DE 2020



- Pañetes en Mal Estado,
- Presencia de Humedad en Muros internos y Externos,
- Pisos existentes no tienen plantilla (la baldosa fue instalada directamente sobre el terreno
- Presencia de Comején o Termitas en todos los muros internos del inmueble



- Presencia de Comején o Termitas en la estructura de cubierta

GRG INGENIERIA SAS



- Presencia de Comején o Termitas en todos los muros internos del inmueble



- Pisos existentes no tienen plantilla (la baldosa fue instalada directamente sobre el terreno

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	22 DE JULIO DE 2020





- Demolición de Tanque de almacenamiento de Agua Potable
- Limpieza de Patio

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	23 DE JULIO DE 2020





- Demoliciones en el Patio





- Demoliciones en el Patio

GRG INGENIERIA SAS







- Demoliciones de Enchape
- Demoliciones de Piso

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	24 DE JULIO DE 2020




- Demoliciones en el Patio






- Demoliciones de muros internos
- Demoliciones de Piso
- Acarreo de Escombros apunto de acopio

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	25 DE JULIO DE 2020



- Demoliciones en de Muros internos en Primer y segundo piso
- Acarreo o trasiego de material proveniente de las demoliciones al punto de Acopio



GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	27 DE JULIO DE 2020



- Limpieza de Escombros



- Demolición y Limpieza de Escombros

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	29 DE JULIO DE 2020











- Construcción de cerramiento provisional
- Demolición de Plantilla contra piso en Patio Posterior

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	28 DE JULIO DE 2020





- Construcción de cerramiento provisional







- Aseo y Limpieza de la Obra

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	30 DE JULIO DE 2020










- Desmonte de Cubierta y Retiro de Escombros

GRG INGENIERIA SAS

Nombre del proyecto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Localización del proyecto:	SINCELEJO, SUCRE
Nombre del contratista que ejecuta la Obra:	ECOHABITAT S.A.S.
Nombre del contratista que ejecuta la Interventoría:	GRG S.A.S
Número del contrato:	SAB-MC-5-2020
Fecha del registro fotográfico:	31 DE JULIO DE 2020



- Desmonte de Cubierta y Retiro de Escombros

GRG INGENIERIA SAS

INFORME CONTROL AMBIENTAL, DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL Y DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PERIODO:	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JULIO Y EL 30 DE JULIO DE 2020**
CONTRATISTA:	ECOHABITAT S.A.S
INTERVENTOR:	GRG INGENIERIA S.A.S

DESCRIPCIÓN	**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
	Si/Bueno	**No/Deficiente**	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		
- Regularidad del mantenimiento	X		
- Vibraciones /Ruidos		X	
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa		X	
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa		X	
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente		X	
- Uso según zona de trabajo		X	
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		
- Diurna		X	
- Nocturna	N.A		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		N.A	
- Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad S.	X		

GRG INGENIERIA SAS

FORMATO CONTROL MENSUAL DE PERSONAL QUE LABORA EN OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE JULIO **Y EL** 30 DE JULIO **PLAZO:** 3 MESES

CONTRATISTA: ECOHABITAT S.A.S

INTERVENTOR: GRG INGENIERIA S.A.S

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA		JULIO																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CARGO		Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4								
DIRECTOR DE INTERVENTORI	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESIDENTE DE OBRA	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIRECTOR DE INTERVENTORI	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESIDENTE DE INTERVENTOR	1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALMACENISTA	1																														
OFICIAL	2														2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AYUDANTE	6														6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
PERSONAL CONTRATISTA	#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ROCEDENCIA / CONDICIÓ		MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																													
MADRE CABEZA FAMILIA	0																														
DESPLAZADO	0																														
REINSERTADO	0																														
MANO OBRA LOCAL	0														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

COMENTARIOS

INFORME DE TRAZABILIDAD DEL MATERIAL Y CALIDAD EN LA OBRA

Actividades realizadas por la interventoría para el control de calidad en los materiales:

- Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes y necesarios, en acuerdo con la gerencia del proyecto.
- Acompañamiento permanente en la obra para dar las mejores soluciones.
- El control de calidad se ha llevado solicitando la toma de los ensayos y pruebas de laboratorio necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones y calidad de la obra.
- Aprobar o rechazar los materiales y sus procesos de elaboración, mediante ensayos de laboratorios a que dé lugar.
- Chequeo del refuerzo de las zapatas y columnas y su respectiva localización.

GRG INGENIERIA SAS

CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMENTO Y ADECUACION PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DEACUERDO CON LOS ITEM DE OBRAS RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
NUMERO DE CONTRATO:	SAB-MC-5-2020
CONTRATISTA:	ECOHABITAT S.A.S
INTERVENTOR:	GRG S.A.S

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
1	14/07/2020	10	0		NO	
2	15/07/2020	10	0		NO	
3	16/07/2020	10	0		NO	
4	17/07/2020	10	0		NO	
5	18/07/2020	10	0		NO	
6	21/07/2020	4	0		NO	Nublado Toda la Tarde despus de 12:00PM
7	22/07/2020	10	0		NO	
8	23/07/2020	10	0		NO	
9	24/07/2020	8	0		NO	Nublado despues de 4:30pm
10	25/07/2020	6	0		NO	LLovisna en Horas de la Manana
11	27/07/2020	4	0		NO	Fuertes Lluvias toda la tarde
12	28/07/2020	10	0		NO	
13	29/07/2020	10	0		NO	
14	30/07/2020	6	0		NO	Nublado despues de 2:00PM
15	31/07/2020	10	0		NO	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La interventoría ha verificado el cumplimiento de las especificaciones y calidad de la obra.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
RELACIÓN DE PAZ Y SALVOS DE PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS PARA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La Obra se encuentra iniciando, hasta la fecha no existe paz y salvo de proveedores

PLANOS RÉCORD

Se solicito rediseño de planos arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios y estructurales

GRG INGENIERIA SAS

	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	codigo:	IT-PIA-FR-003
		fecha:	19/06/2020
		version:	1

N° CONTRATO — OBRA PUBLICA N° SAB-MC-5-2020

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL SUCRE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONTRATISTA	ECOHABITAT SAS	
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON	
NIT	830.091.013-6	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	461.183.037
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$	230.591.518,50
VALOR CONSIGNADO	$	230.591.518,50
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	3 MESES	
INTERVENTOR	GRG INGENIERIA S.A.S.	
SUPERVISOR	ING. MANUELA GARCIA	

ITEM	DESCRIPCION	VALOR ITEM	VALOR TOTAL ITEM	%
1	**MANO DE OBRA**			
1,1	*Pago de subcontratos, orden prestacion de servicios y mano de obra de nomina incluido Parafiscales.*			
	Total gastos mano de obra	**$ 86.557.218,00**	**$ 86.557.218,00**	**37,537%**
2	**MATERIALES**			
2.1	*Materiales para concretos y morteros*			
2.2	*Acero de refuerzo para concretos*			
2.3	*Materiales para pisos enchapes.*			
2.4	*Materiales Tejas para cubierta*			
2.5	*Materiales para cielos rasos*			
2.6	*Materiales para obra electrica*			
2.7	*Materiales obra Voz y Datos*			
2.8	*Materiales Aparatos Sanitarios y Griferia*			
2.9	*Materiales acabados muros, (estucos, vinilos)*			
2.10	*Equipos hidroneumaticos, sistema bombeo*			
2.11	*Equipos Aires Acondicionados*			
	Total compra de materiales	$ 119.984.300,50	**$ 119.984.300,50**	**52,03%**
3	**TRANSPORTE**			
3.1	*Cargue, retiro y disposicion final de escombros*	$ 11.550.000,00		
3.2	*Transporte de materiales*	$ 7.500.000,00		
3.3	*Alquiler de equipos*	$ 5.000.000,00		
	Total gastos transporte	$ 24.050.000,00	**$ 24.050.000,00**	**10,43%**
	TOTAL		**$ 230.591.518,50**	**100,00%**

GRG INGENIERIA SAS

*) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista, incluye impuestos.	
Elaboró **ZANDR Repres** **ECOHABITAT SAS** Firma y posfirma	Aprobó **MICHAEL GUZMAN CHAPARRO** **Representante legal interventoría** **GRG INGENIERA SAS** Firma y posfirma

MEMORIAS DE MEDICIÓN DE OBRA SOPORTE DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

No aplica para este periodo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922890	1	GRG INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMON	Av Jimenez No 5-16 of 1103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2608709	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	717661738	9409128038	E	2020/08/25	2020/08/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1024509789	GUZMAN MICHAEL																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1013622129	RUIZ KIMBERLY																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(2)**																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0		$619,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900922890	1	GRG INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMON	Av Jimenez No 5-16 of 1103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2608709	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	717661738	9409128038	E	2020/08/25	2020/08/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$619,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$139,200	$0	$0	$139,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$139,200	$0	$0	$139,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$619,200	$0	$0	$619,200
