REPÚBLICA DE COLOMBIA

LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO No. 0164 de 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COPEBA S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02

Mejoramiento de vía terciaria Mediante placa huella corregimiento de Aquitania Municipio de San Francisco, Antioquia

PERÍODO: 1 AL 24 DE MARZO DE 2020
Versión 0

Carrera 21 No. 100 – 20, Oficina 602 - Telefax: 2183292 - 2564013 – 2581094

BOGOTÁ D.C

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. _____**2**_____ **MES O PERIODO:** mar-20

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				8
2.1	Localización				8
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				9
2.3	Características técnicas del proyecto				10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				14
3.1	Información general del contrato				14
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			26
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			28
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			30
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			32
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			34
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			37
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			38
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			40
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			43
4.10	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1			46
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2			48
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1			50
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2			52
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			54
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			N.A.
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			87
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				19
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			65
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			68
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			70
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			72
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			74
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1			77
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2			79
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				81
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				83
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización
2.2 Inventario y estado inicial de la vía
2.3 Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3 Seguimiento ítems no previsto
3.4 Estado de Avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto
4.2 Maquinaria y equipo del contrato de obra
4.3 Personal del contrato de obra
4.4 Informe financiera del contrato de obra
4.5 Estado general del tiempo
4.6 Información relacionada con el resultado de los ensayos de laboratorio
4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
4.8 Informe avance Físico-Financiero
4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
4.10 Seguimiento a la inversión del anticipo
4.11 Seguimiento programa de inversiones
4.12 Actas de comité de obra
4.13 Informe semanal

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del contrato
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo contrato de interventoría
6.2 Personal contrato de interventoría
6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.
6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de interventoría
6.6 Seguimiento a la inversión del anticipo
6.7 Relación de la correspondencia generada entre contratista e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.
6.8 Registro fotográfico del avance de las obras

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

ANEXO 1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3.

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4.

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11.

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - MINFRA-MN-IN-15-FR-14

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

ANEXO 10. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

ANEXO 11. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO OBRA - MINFRA-MN-IN-2-FR-2

ANEXO 12. PROGRAMA INVERSIÓN O REPROGRAMACIÓN INVERSIÓN - MINFRA-MN-IN-6-FR-1.

ANEXO 13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES -MINFRA-MN-IN-6-FR-2

ANEXO 14. ACTA DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1.

ANEXO 15. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

ANEXO 16. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

ANEXO 17. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA-MINFRA-MN-IN-15-FR-7.

ANEXO 18. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-15-FR-9.

ANEXO 19. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA - MINFRA-MN-IN-15-FR-13.

ANEXO 20 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-15-FR-16.

ANEXO 21. PLAN DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-3-FR-1.

ANEXO 22. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - MINFRA-MN-IN-3-FR-2

ANEXO 23. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

ANEXO 24. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de San Francisco adjudicó bajo la modalidad de licitación pública (proceso número LP-003-2019) el Contrato de obra No. 163-2019 para el "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA" al CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP. Las obras están financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 14 del 6 de junio de 2019 del ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD-PAZ DEL SGR. Como antecedente se señala que mediante oficio de 27 de junio de 2019, la administración municipal comunicó a la Secretaría Técnica de la OCAD PAZ la designación como entidad pública ejecutora del proyecto, cuyo BPIN corresponde al 2018130101074.

Mediante comunicado DG 27867 de 9 de julio de 2019 el INVIAS acepta la designación de instancia para la contratación de la interventoría, en virtud de lo cual convoca el concurso de méritos CMA-DO-SRT-118-2019 el cual genera el contrato de interventoría 0164 de 2020 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

El proyecto está enmarcado de la siguiente manera en las políticas públicas nacional y regional:

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo: Plan "Todos por un nuevo país", Estrategia Regional "Competitividad e Infraestructuras Estratégicas", Programa "Infraestructura Red Vial Regional".

Plan de Desarrollo Departamental: "Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande"; Línea Estratégica: "La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo"; Programa del Plan de Desarrollo Departamental: "Infraestructura de vías terciarias como apoyo a la comercialización de productos agropecuarios, pesqueros y forestales".

Plan de Desarrollo Municipal: "Unidos por el cambio de San Francisco"; Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: "Competitividad e Infraestructura sostenible para

el desarrollo local en el marco del pos conflicto para alcanzar la paz"; Plan de Desarrollo Municipal: "Programa del sector transporte – infraestructura vial en el marco del pos conflicto para alcanzar la paz".

El pliego de condiciones del concurso de méritos CMA-DO-SRT-118-2019 establece que "En concordancia con lo establecido en la Ley, el Interventor ejerce una función pública en virtud del contrato de Interventoría, es el representante del INSTITUTO en la obra, y como tal todas sus actuaciones deben estar enmarcadas con el sentido de pertenencia a la Entidad, de manera que se constituya en un miembro más de la familia Institucional, asumiendo como propio el logro de los objetivos del (los) proyecto (s) objeto de la Interventoría".

El Contrato de obra No. 163-2019 tiene orden de inicio el 9 de marzo de 2020, y su plazo de ejecución es de siete (7) meses.

Mediante la ejecución del proyecto objeto de Interventoría se busca dar cumplimiento a las siguientes metas:

- Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de la carretera, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.

- Disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.

- Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

Se mejorará la vía terciaria que comunica hacia el casco urbano del corregimiento de Aquitania a través de la construcción de 3,5 Km de placa huella y se hará caracterización vial a una longitud de 12,0 Km. Así mismo, se deben adelantar las obras preliminares, obras de drenaje, implementar el plan de manejo ambiental y el plan de manejo de tránsito.

En el presente Informe Mensual de Interventoría se reportan las actividades más importantes que se han ejecutado en el período correspondiente al informe. Se incluye la descripción del proceso de ajuste a los diseños del proyecto por parte del Contratista, como también el seguimiento a los aspectos relacionados con el control técnico, administrativo, financiero, medio ambiente, gestión social, y

especificaciones técnicas del contrato de obra. Al final del Informe se incluye algunos comentarios, conclusiones y observaciones de los aspectos más relevantes del desarrollo y ejecución general del Proyecto.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El tramo a intervenir inicia a aproximadamente 1,5 Km de la cabecera municipal de San Francisco sobre la carretera que de este municipio conduce a Sonsón (Antioquia) y finaliza en la vereda el Zancudo, con una longitud total de 4,0 Km, dentro de los cuales se tiene previsto intervenir 3,0 Km distribuidos en cinco (5) tramos. La orientación global de la vía es esencialmente norte – sur. Se trata de un terreno montañoso.

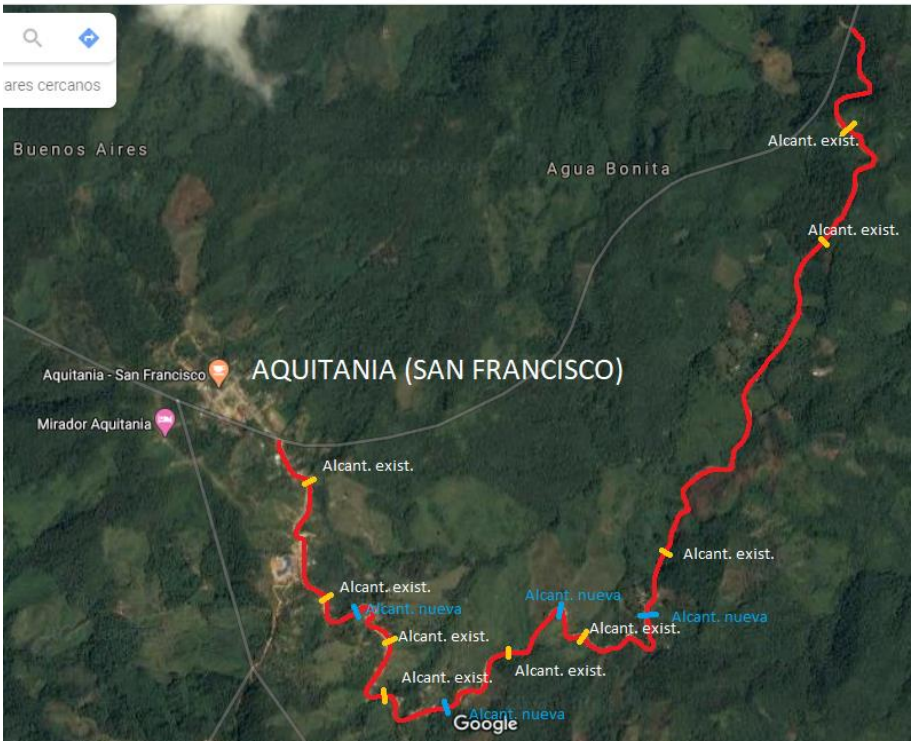


Figura 1 - Localización general del Proyecto.

La vía inicia en el K1+359 y finaliza en el K4+889.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (KM)
K1+359	K1+889	3,5

2.2 Inventario y estado inicial de la vía

La vía inicial se encuentra conformada con afirmado. El ancho de la calzada tiene un ancho promedio de 6,0 m. y cuenta con nueve (9) alcantarillas existentes con tubería de 36” de diámetro, a las que les falta mantenimiento, por lo que presentan taponamientos parciales y algunas veces, totales. El estado general de la superficie de rodadura y transitabilidad de la vía es calificado de regular. No se cuenta con cunetas.

Actualmente se identifican afectaciones principalmente en la funcionalidad de la vía, lo cual se han incrementado notablemente los tiempos de recorrido, el deterioro del parque automotor y consecuentemente el costo de mantenimiento de los vehículos que circulan por la vía. El manejo de las aguas dentro del carreteable es regular, por lo que se han formado surcos de manera natural evidenciándose algunos puntos críticos.

Todo lo anterior ha afectado directamente la economía de la región por el mayor costo de las tarifas de transporte de personas y productos, no sólo del corregimiento o el área de intervención del proyecto, sino también de los centros de distribución y venta de la producción agrícola de la vereda. El área de interés del proyecto es de 4,6 km de vías en mal estado y sin caracterización vial, sobre la cual se realizará una construcción de 3,0 km de placa huella. Actualmente hay 2.300 campesinos que se encuentran con dificultades para la transitabilidad y el acceso a servicios que se ofrecen en la zona urbana, tales como los de salud, educación, participación ciudadana y comercio.

.



Foto No. 1 – Estado de la vía



Foto No. 2 – Estado de la vía



Foto No. 3 – Estado de las alcantarillas

2.3 Características técnicas del Proyecto.

El Municipio de San Francisco aportó diseños iniciales basados en la Guía de Diseño de placa huellas del INVIAS. El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones al día siendo los camperos los vehículos más frecuentes. Los principales atributos de éste tipo de pavimento son:

- Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio período de servicio.

- No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales.

- Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos costos de un pavimento convencional.

- Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales.

El criterio adoptado es el de placas huellas de quince centímetros (0,15 m) de espesor en concreto reforzado totalmente apoyadas sobre la sub base (0,15 m), complementadas con vigas transversales (riostras), también reforzadas, uniformemente espaciadas y totalmente apoyadas que aportan confinamiento a todos los elementos de la sección transversal. El acero de refuerzo de placa huellas y riostras se entrecruza para hacer que el conjunto trabaje monolíticamente. El espesor de placa huella de 0,15 m se definió porque es el mínimo espesor que permite cumplir con el recubrimiento mínimo del acero en losas que están en contacto con el suelo.

Las placas-huella y riostras están diseñadas con capacidad estructural suficiente para que el paso de un camión C-3 con veintidós (22) toneladas en su eje tándem no genere esfuerzos superiores a los esfuerzos admisibles de la placa-huella reforzada. Lo anterior implica que si un camión C-3 no produce falla tampoco lo harían vehículos de menor peso que el del C-3.

La resistencia de los materiales estipulada es de concreto de 210 Kgf/cm2 y acero de refuerzo de 4.200 Kgf/cm2.

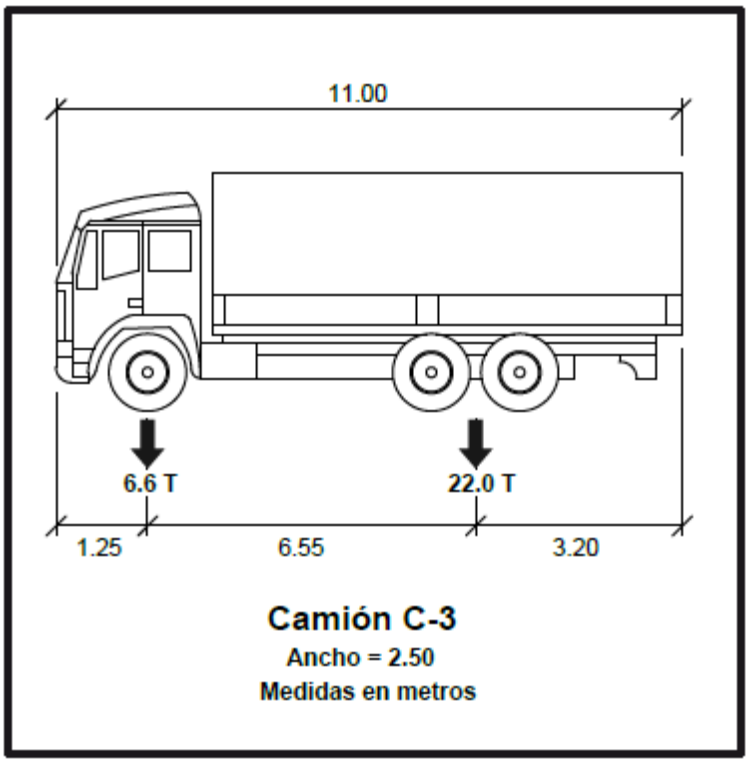


Figura No. 2 – Vehículo de diseño de placa huella

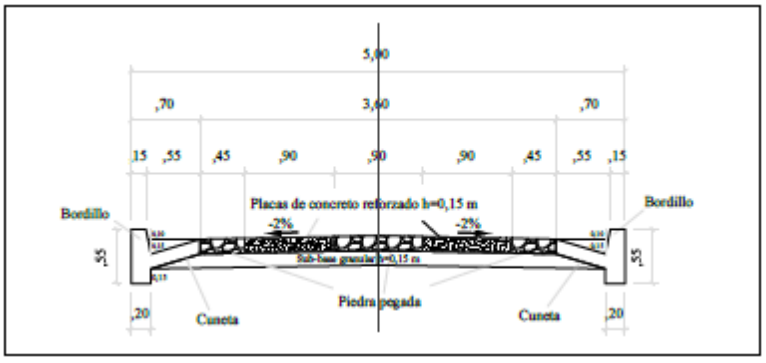


Figura No. 2 – Sección típica placa huella

Las principales actividades programadas para el contrato de obra son las siguientes:

- Excavación manual en material común para nivelar la sub rasante
- Conformación de la sub rasante con equipos

- Suministro, transporte, colocación de sub base granular
- Placa huella, incluyendo cunetas, en concreto reforzado de 210 Kgf/cm2 en un espesor de 0,15 m
- Piedra pegada en proporción de 60% concreto de 210 Kgf/cm2 y 40% piedra para placa huella
- Construcción de obras de drenaje consistentes en alcantarillas en tubería de 36” de diámetro en concreto reforzado.
- Figuración y colocación de acero de refuerzo para placa huellas y alcantarillas.
- Actualización de estudios y diseños
- Ejecución de plan de manejo ambiental
- Manejo de tránsito
- Caracterización vial

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

Licitación Pública	LP-003-2019
Contrato No.	163-2019
Nit Municipio de San Francisco	800.022.791-4
Contratista	Consorcio Vial San Francisco – Top
Nit Contratista	901.348.842-8
Integrante consorcio 1	Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S. - Nit 900.355.893-9 - 95%
Integrante consorcio 2	José Joaquín Posada Loreña - Nit 17.528.507-1 - 5%
Objeto	Mejoramiento de vía terciaria Mediante placa huella corregimiento de Aquitania Municipio de San Francisco, Antioquia
Valor	4.787.062.126
Fecha acta de inicio	9 de marzo de 2020
Plazo	Siete (7) meses
Fecha de terminación inicial	8 de octubre de 2020
Acta de suspensión No. 1	25 de marzo de 2020
Fecha de reanudación	Suspensión indefinida
Representante Legal Contratista	William Jaramillo Hernández
C.C. Representante Legal Contratista	No. 15.441.658,00

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el período

- En el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
- Firma del acta de inicio
- Recorrido inicial a la obra el día 18 de febrero de 2020
- Trabajos de levantamiento topográfico inicial

3.3 Seguimiento a ítems no previstos

No se han generado ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

El 9 de marzo de 2020 se firmó acta de inicio. El día de 18 de febrero se efectuó un recorrido en la obra con participación de funcionarios de Invias DT Antioquia, Municipio de San Francisco, interventoría y contratista.

El contrato No. 163-2019 se encuentra en etapa de ajuste de estudios y diseños, y en general, en etapa de pre construcción.

Desde la fecha de inicio hasta la del fin del periodo del presente informe se han celebrado las siguientes reuniones y comités:

- Trabajos de levantamiento topográfico inicial

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen mensual estado general del proyecto

El *ANEXO 1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO-MINFRA-MN-IN-15-FR-3,* presenta el estado del proyecto.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

El *ANEXO 2. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA -MINFRA-MN-IN-15-FR-4,* presenta el seguimiento diario al equipo dispuesto por el Contratista de obra en el período en cuestión, cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos de equipo requerido contractualmente.

4.3 Personal contrato de obra

En el *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA-MINFRA-MN-IN-15-FR-6,* se presenta el seguimiento diario al personal dispuesto por el Contratista de obra en el período en cuestión. El contrato se encuentra en etapa de ajustes a estudios y diseños, por lo que las únicas actividad de campo realizada tiene que ver con levantamiento topográfico. La restante actividad está relacionada con gestión de documentación, y el personal ocupado por el contratista tiene que ver con esta situación.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

En el *ANEXO 4. INFORMACIÓN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8,* se muestra el seguimiento financiero del Contratista de

4.5 Estado general del tiempo

El *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10,* registra el estado del tiempo en el sitio de ejecución de los trabajos para el período en cuestión.

4.6 Información relacionada con el resultado de los ensayos de laboratorio

En el *ANEXO 6. ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11* se indica que se encuentran en proceso la ejecución de los ensayos a las muestras de la sub rasante y las fuentes de materiales, de manera que aun no hay reporte de resultados.

4.7 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12,* se presenta el seguimiento de la Interventoría del cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social.

4.8 Informe avance físico-financiero

El *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MINFRA-MN-IN-15-FR-14,* se presenta el formato de seguimiento físico – financiero del Contrato de obra.

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

El *ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA MINFRA-MN-IN-15-FR-15,* se presenta información relacionada con las pólizas de contrato de obra.

4.10 Seguimiento a la inversión del anticipo

El *ANEXO 11. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2*. El presente contrato no contempla anticipo dentro de su forma de pago.

4.11 Seguimiento programa de inversiones

Los *ANEXOS 12 Y 13. PROGRAMA INVERSIÓN O REPROGRAMACIÓN INVERSIÓN – MINFRA-MN-IN-6-FR-1 Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN - MINFRA-MN-IN-6-FR-2* se refieren al programa de inversiones y seguimiento a las reprogramaciones, las cuales, en el presente contrato, no se han dado.

4.12 Actas de comité de obra

En el presente periodo se realizó una (1) reunión de obra, de la cual se levantó acta; en dicha reunión participaron representantes del Consorcio Víal San Francisco – Top, Municipio de San Francisco, INVIAS y COPEBA S.A.S, con el fin de discutir temas pertenecientes al desarrollo del proyecto.

En el ANEXO 14. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO – MINFRA-MN-IN-14-FR-1, se incluye copia del Acta de técnico y acta de compromiso, realizadas en el período en cuestión.

4.13 Informes semanales

En el *ANEXO 15. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-2* se incluye copia de los informes semanales de Interventoría No. 1 y 2 del período en cuestión.

5.0 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN:	CMA-DO-SRT-118-2019
CONTRATO :	No. 0164 DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE ENERO DE 2020
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
CONTRATISTA:	COPEBA S.A.S.
NIT:	830.011.122-9
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE FINALIZACION:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO	13 DE ABRIL DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO:	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL:	$ 718.510.249
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ING. HUGO NIEVES DE LA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. JESÚS ALONSO MEJÍA
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO:	ING. WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ
CONTACTO:	Ing. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ Carrera 21 No. 100 – 20 Of. 602 Tel. 2564013 2183292 – Bogotá D.C. - E-mail: consorcioici@gmail.com

5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes

5.2.1 Reuniones de Coordinación

Se realizaron reuniones y comités técnicos los días 31 de enero y 9 de marzo de 2020, donde se trataron temas relacionados al proyecto, se efectuó recorrido de obras y acompañamiento al Contratista en su labor de diagnóstico de la vía.

5.2.2 Seguimiento a ajuste a estudios y diseños

El día 24 de marzo de 2020 el Contratista presentó documentación relacionadas con hojas de vida del personal, análisis de precios unitarios, diseño de pavimento, estudio de tránsito, plan de calidad, programa de generación de empleo, programa de reincorporación, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito, documentos legales y ambientales de fuentes de materiales y ensayos de materiales de fuentes de materiales. Se está a la espera del reinicio de los contratos de obra e interventoría para distribuir a los especialistas de interventoría para los conceptos respectivos.

5.2.3 Documentos de la etapa pre construcción

Se solicitó al Consorcio Víal San Francisco – Top la presentación de los documentos de la etapa de preconstrucción, esto es:

- Hojas de vida del personal
- Relación de equipo mínimo requerido
- Análisis de precios unitarios
- Programa de obra
- Plan de manejo de tráfico
- Plan de manejo ambiental

La documentación fue objeto de observaciones y solicitud de ajustes por parte de interventoría para posibilitar su aprobación. Se está a la espera del reinicio de los contratos de obra e interventoría para distribuir a los especialistas de interventoría para los conceptos respectivos.

5.2.4 Informes semanales.

Se efectuaron los informes semanales Nos. 1, 2 y 3 correspondientes a las semanas comprendidas entre el 9 y 12, y 13 y 19, 20 y 24 de marzo de 2020, respectivamente. Del mismo modo se subió la información correspondiente a la plataforma Cifra de los mismos períodos semanales.

5.2.5 Bitácora de obra.

Se abrirá el libro de obra respectivo en el momento de inicio de obras en campo; hasta tanto, los registros de las actividades desarrolladas será la que se genere a través de los distintos documentos.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría.

En el *ANEXO 16. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5,* relaciona la utilización diaria del equipo del Interventor.

6.2 Personal contrato de Interventoría.

En el presente período la interventoría se ajustó a lo establecido en el contrato y a las necesidades del proyecto en cuanto a la utilización de personal.

En el *ANEXO 17. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7,* relaciona el personal dispuesto en obra y oficina por el Interventor para el seguimiento del contrato de obra durante el período en cuestión, que cumple con los requisitos aprobados.

6.3 Información financiero y presupuestal contrato de Interventoría.

A la fecha COPEBA S.A.S. no ha facturado aun, tal como se indica en el *ANEXO 18. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9*.

6.4 Control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría

En el *ANEXO 19. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES INTERVENTORÍA– MINFRA-MN-IN-15-FR-13,* se relaciona los pagos de aporte de seguridad social del personal de Interventoría que labora para el proyecto durante el período en cuestión.

6.5 Seguimiento garantías contrato de interventoría

El contrato No. 0164 de 2020 se ampara con las pólizas tomadas a la firma Segurexpo de Colombia S.A., cuyas condiciones se reflejan en el *ANEXO 20*, *MINFRA-MN-IN-15-FR-16*, en la cual se indica igualmente el número y fecha del acta de aprobación de garantías por parte de la entidad contratante.

6.6 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato No. 0164 de 2020 no tiene contemplado anticipo en su forma de pago.

6.7 Relación de la correspondencia generada entre contratista e Interventor incluyendo asunto, fecha de emisión.

El *ANEXO 23. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA* muestra el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento de la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el período en cuestión.

6.8 Registro fotográfico del avance de las obras

El *ANEXO 24. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS* se presenta el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento fotográfico de los procesos constructivos y de las obras ejecutadas, durante el desarrollo del Contrato para el período en cuestión.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- El contrato de obra No. 163 de 2019 fue suspendido por tiempo indefinido, estando en etapa de pre construcción; se está a la espera de las decisiones del Gobierno Nacional respecto a la cuarentena por la contingencia del Coronavirus para darle reinicio.

- Dentro de este periodo se tiene previsto que el Consorcio Vial San Francisco – Top aporte a satisfacción la documentación de control de ejecución del contrato, la documentación técnica y legal para aprobación de fuentes de materiales, el plan de manejo ambiental, el plan de manejo de tráfico y complete los ajustes a los estudios y diseños.

- Se ha avanzado en el levantamiento topográfico de la vía y en la práctica de los apiques para efectos de estudio de suelos de la sub rasante; con la información recopilada en campo el Contratista remitió documentos preliminares; tan pronto como se dé reinicio a los contratos, estos documentos serán remitidos a los especialistas de Interventoría para sus observaciones.

- El Contratista y la Interventoría realizaron recorrido el 18 de febrero de 2020 para determinar los puntos críticos que requieren intervención a través de la construcción de placa huella. Se corroboró que el tramo propuesto es el que requiere intervención.

- Por encontrarse en etapa de pre construcción, aun no se refleja avance físico en el contrato.

- Las gestiones por parte de los distintos entes involucrados en el proyecto han avanzado lo suficiente como para prever que se podrá iniciar la etapa constructiva en la fecha que se determine a partir de la suspensión y reinicio del contrato de obra, para lo cual se tiene previsto un mes neto a partir de la fecha del acta de inicio.

ANEXOS

ANEXO 1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PERIODO MES:** mar-20

CONTRATO DE OBRA No.: 163-2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO TOP

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACION: 9/03/2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.787.062.126,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.787.062.126,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: 25-mar-20
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0164-2020 INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	KM	3,5
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Alcantarillas	UN	5

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

EL CONTRAT SE ENCUENTRA EN ETAPA DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-	-	-	-	N.A.	0,00		
Acumulado:	-	-	-	-	N.A.	0,00		

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2019	$738.542.103
Total	**$738.542.103**

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,43	0,061	6,57	4.701.007.012	0	4.701.007.012	4.701.007.012
Interventor:	0,00	0,43	0,061	6,57	738.510.249	0	738.510.249	738.510.249

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	17-feb-20	18-ene-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17-feb-20	17-sep-23
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.
Estabilidad y Calidad de Obra	17-feb-20	"5 AÑOS"

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17-feb-20	17-sep-20
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

NO SE HAN INICIADO PROCESOS SANCIONATORIOS

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EN EL MOMENTO DE SUSPENDERSE EL CONTRATO EL CONTRATISTA NO HABÍA HECHO ENTREGA DE LAS VERSIONES INICIALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

LAS ACTIVIDADES DE AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS PROSEGUIRÁN EN EL MOMENTO DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO.

Firma

Nombre JO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: mar-20 **CONTRATO No.** 163-2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP **SECTOR:** K1+358 A K1+858
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Equipo de topografía									A	A	A	A	A	A																	
Equipo de cómputo									A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE TIENE UNA DURACIÓN CONTRACTUAL DE UN (1) MES
SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 25 DE MARZO DE 2020 DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR PANDEMIA DE CORONAVIRUS

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202 - 2096604 CND

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ARGELIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: mar-20 **CONTRATO DE OBRA No.** 163-2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP **SECTOR:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0164-2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE OBRA									A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A							

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Director de obra
Matricula No.: 25202 - 2096604

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No: 163-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP

MES INFORME MENSUAL: mar-20 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	719 30/10/2019	Mejoramiento de vía terciaria mediante		SGR	163-2019	$4.795.701.056
		placa huella corregimiento de Aquitania				
		Municipio de San Francisco Antioquia				
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $4.787.062.126

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
AUN NO SE HAN TRAMITADO ACTAS, DADO QUE LA FECHA DE CORTE DEL CONTRATO DE OBRA ES EL 17 DE MARZO DE 2020														
TOTALES														


Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	AUN NO SE HAN TRAMITADO ACTAS; LA FECHA DE CORTE DEL CONTRATO DE OBRA ES EL 17 DE MARZO DE 2020		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-2096694 CND



Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No: 163-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS TERCIARIAS ANT

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-20 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco									24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24								192
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-2096604 CND

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6. ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
	VERSIÓN	1		
	PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 163-2020

CONTRATISTA: CIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEB-2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	06-mar-20	Compactación en laboratorio	E-142	Geminco S.A.S.	3	N.A.	2334	N.A.	Sub base granular
2	06-mar-20	Equivalente de arena	E-133	Geminco S.A.S.	3	Mìn 25	37,7	SI	Sub base granular
3	06-mar-20	Granulometrìa	E-123	Geminco S.A.S.	1	Curva	En la franja	SI	Sub base granular
4	06-mar-20	Lìmite lìquido	E-125	Geminco S.A.S.	3	Máx 25	15	SI	Sub base granular
5	06-mar-20	Ìndice de plasticidad	E-125	Geminco S.A.S.	3	Máx 6	2	SI	Sub base granular
6	06-mar-20	Desgaste a la abrasión	E-218	Geminco S.A.S.	1	Máx 50	27,4	SI	Sub base granular
7	06-mar-20	Solidez en sulfato de sodio	E-220	Geminco S.A.S.	1	Máx 12	2,9	SI	Sub base granular
8	06-mar-20	Terrones de arcilla	E-211	Geminco S.A.S.	1	Máx 25	1,4	SI	Sub base granular

OBSERVACIONES: SE HAN TOMADO MUESTRAS DE LA SUB RASANTE Y DE FUENTES DE MATERIALES, PERO AUN NO SE TIENEN REPORTES

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

Director de Obra

Matrícula No.: 25202-2096604 CND

Firma

Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No: 163-2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO TOP

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-20 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
José Rodríguez	Dir. Obra	1-24 mar 2020	30	79.560.053	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Rafael de los Ríos	Ing. Residente	1-24 mar 2020	30	1.022.124.760	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Francelly Velásquez	Prof. Socioambiental	1-24 mar 2020	28	1.037.630.168	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre : HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Obra
Matricula No.: 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - MINFRA-MN-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA No:** N.A. **PERIODO MES:** mar-20 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : 163-2019
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS
SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA
RUTA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA
TRAMO: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 9/03/2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.787.062.126,00
VALOR ACUMULADO: $ 4.787.062.126,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: 25-mar-20
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: INDEFINIDA
VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0164-2020 INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
163-2020	7 MESES	INDEFINIDA	4.787.062.126,00	4.787.062.126,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2019	4.701.007.012
Total	4.701.007.012

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0164-2020	7 MESES	16/09/2020	738.510.249	738.510.249,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	41.446.240	-	-	-		3981664,00	N.A.	N.A.
Acumulado:	41.446.240	-	-	-		3981664,00	N.A.	N.A.

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:		0,53	0,076190476	6,47	4.701.007.012	0	4.787.062.126	4.787.062.126
Interventor:		0,53	0,076190476	6,47	738.510.249	0	738.510.249	738.510.249

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	5,0
Calzada:	5,0
Cunetas	0,7
Sub base:	0,15
Base:	0,00
Placa huella	0,15

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	0,00
CARACTERIZACIÓN VIAL	0,00
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)		Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
OBRAS DE ARTE		0	0	0	0		0	0	0	0
EXPLANACIONES (Localización, conformación)		0	0	0	0		0	0	0	0
SUB BASE		0	0	0	0		0	0	0	0
PLACA HUELLAS		0	0	0	0		0	0	0	0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre
Director de Obra JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Matrícula No. 25202-2096694 CND

Firma
Nombre HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No. 163-2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO -TOP

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

FECHA DE INICIO: 9/03/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: INDEFINIDA (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.787.062.126,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.787.062.126,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 41.937.446,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 41.937.446,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. '0164-2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 478.706.212,60	17	12	2019	17	12	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10	$ 478.706.212,60	17	12	2019	17	8	2023
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10	$ 478.706.212,60	17	8	2020	17	8	2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100108734

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMLV	$ 165.623.200,00	17	12	2019	17	8	2020
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE M-100108197 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	3	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 478.706.212,60	17	12	2019	17	12	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10	$ 478.706.212,60	17	12	2019	17	8	2023
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10	$ 478.706.212,60	17	8	2020	17	8	2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100108734

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 438.901.500,00	17	2	2020	17	9	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE M-100108197 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 13202-15939 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA MINFRA-MN-IN-2-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	3	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 14 **DE** 2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0164 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. EL CONTRATO NO TIENE ANTICIPO
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EL CONTRATO NO TIENE ANTICIPO						%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre) JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Director de Obra
Contratista
Matricula No.: 25202-2096604 CND

(Firma)
(Nombre) HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Interventor
Matricula No.:13202-15939 BLV

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO OBRA - MINFRA-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	3	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** mar-20 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐
(Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 163 **DE** 2019

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0164 **DE** 2020

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
EL CONTRATO NO CONTEMPLA PAGO DE ANTICIPO						

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: EL CONTRATO NO CONTEMPLA PAGO DE ANTICIPO

Firma
Nombre : JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula No. : 25202-2096604 CND

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 13202-15939 BLV

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 12. PROGRAMA INVERSIÓN O REPROGRAMACIÓN INVERSIÓN - MINFRA-MN-IN-6-FR-1.

FECHA: 31 (Día) / 3 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL: N.A.**

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. N.A. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 163-2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CORREGIMIENTO DE AQUITANIA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0164-2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9/03/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25-mar-20 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.787.062.126,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.787.062.126,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: INDEFINIDA (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 / mar-20	2 / abr-20	3 / may-20	4 / jun-20	5 / jul-20	6 / ago-20	7 / sep-20	8 / oct-20			
OBRAS DE ARTE	$143.851.247	3,07%	0,00%	% P0											100%
	$143.851.247	3,07%	$0	$ P0	$0	$29.099.781	$114.751.467	$0	$0	$0	$0	$0			
				$ P1	$0	$29.099.781	$114.751.467	$0	$0	$0	$0	$0			
				% P1											
EXPLANACIONES	$154.482.040	3,29%	0,00%	% P0											
	$154.482.040	3,29%	$0	$ P0	$0	$16.828.393	$33.656.786	$33.656.786	$33.656.786	$30.962.939	$5.720.349	$0			
				$ P1	$0	$16.828.393	$33.656.786	$33.656.786	$33.656.786	$30.962.939	$5.720.349	$0			
				% P1											
SUBBASE	$897.435.000	19,14%	0,00%	% P0				-							
	$897.435.000	19,14%	$0	$ P0	$0	$0	$56.089.688	$224.358.750	$224.358.750	$224.358.750	$168.269.063	$0			
				$ P1	$0	$0	$56.089.688	$224.358.750	$224.358.750	$224.358.750	$168.269.063	$0			
				% P1											
PLACA HUELLAS	$3.492.992.570	74,50%	0,00%	% P0											
	$3.492.992.570	74,50%	$0	$ P0	$0	$0	$18.628.235	$1.095.317.084	$1.412.192.957	$437.992.235	$424.021.059	$104.841.000			
				$ P1	$0	$0	$18.628.235	$1.095.317.084	$1.412.192.957	$437.992.235	$424.021.059	$104.841.000			
				% P1											
				% P0											
				$ P0											
				$ P1											
				% P1											50%
				% P0											
				$ P0											
				$ P1											
				% P1											
				% P0											
				$ P0											
				$ P1											
				% P1											
				% P0											
				$ P0											
				$ P1											
				% P1											
TOTAL OTROS ITEMS				% P0											
				$ P0											
				$ P1											
				% P1											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 4.688.760.857,48														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 4.688.760.857,48														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,98%	4,76%	28,86%	35,62%	14,79%	12,75%	2,24%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$45.928.174	$223.126.176	$1.353.332.620	$1.670.208.493	$693.313.924	$598.010.471	$104.841.000		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,98%	5,74%	34,60%	70,22%	85,01%	97,76%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$45.928.174	$269.054.349	$1.622.386.969	$3.292.595.462	$3.985.909.387	$4.583.919.857	$4.688.760.857		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.937.446
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	$17.600.157
CARACTERIZACIÓN VIAL	$10.065.173
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$28.698.493
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$98.301.269
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$4.787.062.126**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. NO SE HA EJECUTADO OBRA FÍSICA

Firma:
Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-2096604 CND

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES -MINFRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ARGELIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. N.A. **DE** N.A. (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. N.A. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

CONTRATO No: 14-2019
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CORREGIMIENTO DE AQUITANIA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9/03/200 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: INDEFINIDA (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 25-mar-20 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.787.062.126,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.787.062.126,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20			
OBRAS DE ARTE	$143.851.247	3,07%	0,00%	% P											100%
	$143.851.247	3,07%	$0	$ P	$0	$29.099.781	$114.751.467	$0	$0	$0	$0	$0			
				$ E	$0										
				% E											
EXPLANACIONES	$154.482.040	3,29%	0,00%	% P											
				$ P	$0	$16.828.393	$33.656.786	$33.656.786	$33.656.786	$30.962.939	$5.720.349	$0			
	$154.482.040	3,29%	$0	$ E	$0										
				% E											
SUBBASE	$897.435.000	19,14%	0,00%	% P											
				$ P	$0	$0	$56.089.688	$224.358.750	$224.358.750	$224.358.750	$168.269.063	$0			
	$897.435.000	19,14%	$0	$ E	$0										
				% E											
PLACA HUELLAS	$3.492.992.570	74,50%	0,00%	% P											
				$ P	$0	$0	$18.628.235	$1.095.317.084	$1.412.192.957	$437.992.235	$424.021.059	$104.841.000			
	$3.492.992.570	74,50%	$0	$ E	$0										
				% E											
				% P											50%
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.688.760.857,48**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.688.760.857,48**														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,98%	4,76%	28,86%	35,62%	14,79%	12,75%	2,24%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$45.928.174	$223.126.176	$1.353.332.820	$1.670.208.493	$693.313.924	$598.010.471	$104.841.000		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,98%	5,74%	34,60%	70,23%	85,01%	97,76%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$45.928.174	$269.054.349	$1.622.386.969	$3.292.595.462	$3.985.909.387	$4.583.919.857	$4.688.760.857		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$67.482.425	$ -
	$67.482.425	$ -
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	$25.498.607	$ -
	$25.498.607	$ -
CARACTERIZACIÓN VIAL	$2.761.810	$ -
	$2.761.810	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$50.254.931	$ -
	$50.254.931	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$145.997.773	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$145.997.773	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$4.701.007.012**	**$ -**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$4.701.007.012**	**$ -**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 POR LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Firma:
Nombre: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-2096 CND

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 14. ACTA DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE
		FECHA	(Dia) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

CONTRATO DE OBRA No. _____ DE _____

CONTRATISTA: _____

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0164 DE 2020

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Antonio Rodriguez C.	Director Obra	Consorcio Vias Terciarias
William Jaramillo M.	Coordinador	Consorcio Vias Terciarias
CARLOS H. HORTUA	Ingeniero.	CONSORCIO VIAS.
Leidy Marcela Valencia	Sec. Planeación	Alcaldia Argelia.
Alejandro Ortiz londoño	Sec. Planeación	Alcaldia Valdivia
Leidy Paula Quintero Cardenas	Coordinador Sanfran	Alcaldia San Francisco.
ANDRES M. NESTRERO MORA	REP. LEGAL.	CONSORCIO VIAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Estados de los contratos y seguimiento.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Contrato de Argelia
Contrato de San Francisco
Contrato de Valdivia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

* Contrato de Argelia: Interventoría informa que se han realizado reuniones los días 21, 26 y 3 de marzo de 2020 para analizar los documentos de control de ejecución del contrato. El contratista informa que el día de mañana 3 de marzo hará entrega de los documentos finales ajustados.
El Invias acota que se debe proveerse seguridad vial, teniendo en cuenta que hay cabezotes de alcantarilla que constituyen obstáculos. Considerar, si es necesario, demoler y/o señalizar. La Alcaldía de Argelia manifiesta que estrangular la vía sería preferible si con ello se alcanta una mayor longitud.

* Contrato de San Francisco: La interventoría manifiesta que ha emitido tres oficios solicitando información sobre el acta de inicio. El Municipio de Sn. Francisco informa que hoy se ha firmado el acta de inicio. El contratista de San Francisco manifiesta que ya ha recibido el acta de inicio para revisión y firma. El acta de inicio tiene fecha del día de hoy 9 de marzo de 2020. El Municipio informa que la vía es departamental. El Invias indica que corresponde a la gobernación emitir resolución de cierre. El Municipio manifiesta que hará la gestión correspondiente. Se fijan como fecha de visita el 16 de abril para Argelia y 17 de abril para San Francisco.

* Contrato de Valdivia: Interventoría solicita información sobre la firma del contrato y acta de inicio. El Municipio manifiesta que se está a la espera de resolver un asunto del Nit del contratista, ya que son consorcio. El Invias manifiesta que el convenio fue hecho por el Municipio con un plazo de tres meses y que se hace necesario que el contrato se ajuste a este plazo. El contratista manifiesta que no encuentra inconveniente en ello. Se acuerda que se hará visita de inicio el 19 de marzo 2020.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Visita a Argelia	16 marzo 2020	
Visita a Sn. Francisco	17 marzo 2020	
Visita a Valdivia	19 marzo 2020	

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Se aclara que la visita à Argelia es el 16 de abril de 2020 y San Francisco es el 17 de abril de 2020.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA

Original Informe mensual de Interventoría.
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

ANEXO 15. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 12 (Día) / 3 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA — TRAMO Y/O SECTOR(S): N.A.

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 1 del 9/03/2020 al 12/03/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA Z. — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de vía terciaria Mediante placa huella corregimiento de Aquitania Municipio de San Francisco, Antioquia — FECHA DE INICIO: 9-mar-20

KM A MEJORAR: 3,5 — KM A REHABILITAR: 0 — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: ALCANTARILLAS A CONSTRUIR: 5

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP			INTERVENTOR:	COPEBA S.A.S.		
INTEGRANTES:	Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S. - 95%; José Joaquín Posada Loreña - 5%			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	163-2019	VALOR INICIAL:	$ 4.787.062.126,00	CONTRATO No.	164	VALOR INICIAL:	$ 738.510.249,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 4.787.062.126,00	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 738.510.249,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.795.701.056	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.688.760.857,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

Nota: el contrato se encuentra en fase de ajustes a estudios y diseños

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

NO SE HA FACTURADO AÚN
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		


MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

NO SE HA FACTURADO AUN. ACTA DE COSTOS RADICADA
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1					TOT
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	3					3
OBRAS DE ARTE (Un):						0
KM EXPLANACIONES						0
KM SUBBASE						0
KM PLACA HUELLAS						0
						0
						0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: K0+000 - K1+040

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1					TOTAL
Cargador de llantas						0
Planta de trituración:						0
Motoniveladoras:						0
Retrocargadores:						0
Vibrocompactadores:						0
Volquetas:						0
Otros:						0

Nota: en la semana se realizaron labores de ajuste a estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SER PRESENTADA A INTERVENTORÍA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A		
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X	

OBSERVACIONES: LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEPENDEN DEL PMA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VER OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES: LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEPENDEN DEL PMA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE GESTIÓN PREDIAL.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: EL NÚMERO DE EMPLEOS INCLUYE EL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
APIQUES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corregimiento de Aquitana - Recorrido inicial



Corregimiento de Aquitana - Recorrido inicial



Corregimiento de Aquitana - Recorrido inicial

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA; PRONUNCIARSE SEGUN LO PERTINENTE CUANDO SE REQUIERA	FIRMA NOMBRE: HUGO NIEVES DE LA CRUZ No. MAT: 13202-15939 BLV

Invías - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA	19 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA — TRAMO Y/O SECTOR(S): N.A.

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 2 del 13/03/2020 al 19/03/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA Z. — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de vía terciaria Mediante placa huella corregimiento de Aquitania Municipio de San Francisco, Antioquia — FECHA DE INICIO: 9-mar-20

KM A MEJORAR: 3,5 — KM A REHABILITAR: 0 — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: ALCANTARILLAS A CONSTRUIR: 5

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP			INTERVENTOR:	COPEBA S.A.S.		
INTEGRANTES:	Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S. - 95%; José Joaquín Posada Loreña - 5%			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	163-2019	VALOR INICIAL:	$ 4.787.062.126,00	CONTRATO No.	164	VALOR INICIAL:	$ 738.510.249,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 4.787.062.126,00	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 738.510.249,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2019	2020	2021	2022
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.795.701.056	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4.688.760.857,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

Nota: el contrato se encuentra en fase de ajustes a estudios y diseños

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

NO SE HA FACTURADO AÚN

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

NO SE HA FACTURADO AUN. ACTA DE COSTOS RADICADA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO					
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1					TOT
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	6					6
OBRAS DE ARTE (Un):						0
KM EXPLANACIONES						0
KM SUBBASE						0
KM PLACA HUELLAS						0
						0
						0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: K0+000 - K1+040

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1					TOTAL
Cargador de llantas						0
Planta de trituración:						0
Motoniveladoras:						0
Retrocargadores:						0
Vibrocompactadores:						0
Volquetas:						0
Otros:						0

Nota: en la semana se realizaron labores de ajuste a estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SER PRESENTADA A INTERVENTORÍA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEPENDEN DEL PMA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VER OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES: LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEPENDEN DEL PMA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE GESTIÓN PREDIAL.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: EL NÚMERO DE EMPLEOS INCLUYE EL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
APIQUES EN LA SUB RASANTE

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
APIQUES EN LA SUB RASANTE

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corregimiento de Aquitana - Levantamiento topográfico



Corregimiento de Aquitana - Levantamiento topográfico



Corregimiento de Aquitana
Levantamiento topográfico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA; PRONUNCIARSE SEGUN LO PERTINENTE CUANDO SE REQUIERA	FIRMA NOMBRE: HUGO NIEVES DE LA CRUZ No. MAT: 13202-15939 BLV

Invías - Gestión Pública con Calidad

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA — TRAMO Y/O SECTOR(S): N.A.

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 3 del 20/03/2020 al 24/03/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA Z. — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. WILLIAM FELIPE GUTIÉRREZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento de vía terciaria Mediante placa huella corregimiento de Aquitania Municipio de San Francisco, Antioquia — FECHA DE INICIO: 9-mar-20

KM A MEJORAR: 3,5 — KM A REHABILITAR: 0 — KM A CONSTRUIR: — No. PUENTES: — OTROS: ALCANTARILLAS A CONSTRUIR: 5

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO - TOP			INTERVENTOR:	COPEBA S.A.S.		
INTEGRANTES:	Ingeniería y Construcciones WJ S.A.S. - 95%; José Joaquín Posada Loreña - 5%			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	163-2019	VALOR INICIAL:	$ 4.787.062.126,00	CONTRATO No.	164	VALOR INICIAL:	$ 738.510.249,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	7 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	7 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 4.787.062.126,00	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 738.510.249,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2019	2020	2021	2022
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.795.701.056	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 4.688.760.857,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
Nota: el contrato se encuentra en fase de ajustes a estudios y diseños

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

NO SE HA FACTURADO AÚN
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		


MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

NO SE HA FACTURADO AUN. ACTA DE COSTOS RADICADA
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO						
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1						TOT
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	9						9
OBRAS DE ARTE (Un):							0
KM EXPLANACIONES							0
KM SUBBASE							0
KM PLACA HUELLAS							0
							0
							0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: K0+000 - K1+040

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1					TOTAL
Cargador de llantas						0
Planta de trituración:						0
Motoniveladoras:						0
Retrocargadores:						0
Vibrocompactadores:						0
Volquetas:						0
Otros: Equipos de topografía	1					1

Nota: en la semana se realizaron labores de ajuste a estudios y diseños

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SER PRESENTADA A INTERVENTORÍA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEPENDEN DEL PMA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: VER OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES: LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEPENDEN DEL PMA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE REQUIERE GESTIÓN PREDIAL.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: EL NÚMERO DE EMPLEOS INCLUYE EL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
APIQUES EN LA SUB RASANTE

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
APIQUES EN LA SUB RASANTE. EL CONTRATO FUE SUSPENDIDO EL 25 DE MARZO DE 2020 MOTIVADA POR LA CUARENTENA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corregimiento de Aquitana - Apiques en la sub rasante



Corregimiento de Aquitana - Apiques en la sub rasante



Corregimiento de Aquitana
Apiques en la sub rasante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA; PRONUNCIARSE SEGUN LO PERTINENTE CUANDO SE REQUIERA	FIRMA NOMBRE: HUGO NIEVES DE LA CRUZ No. MAT: 13202-15939 BLV

Invías - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 16. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: 2 **CONTRATO No.** 163-2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S. **SECTOR:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A						
CAMIONETA	DIMAX		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A						
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A						
EQUIPO DE CÓMPUTO	ACER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A						

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA CUAL CONTRACTUALMENTE ES DE UN MES

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ

Firma
Nombre: JESÚS ALONSO MEJÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	3	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

Director de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 25202-43646 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 17. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA-MINFRA-MN-IN-15-FR-7.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: mar-20 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 0164-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

INTERVENTOR: **SECTOR:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HUGO NIEVES DE LA CRUZ	DIR. DE INTERVENTORÍA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A										
DUSTIN GUTIÉRREZ DE LA ROSA	TOPÓGRAFO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A										
DANIEL GIRALDO VALENCIA	CADENERO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 13202-15939 BLV

Firma
Nombre: JESÚS ALONSO MEJÍA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-43646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-15-FR-9.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0164-2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: mar-20 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
	11519			SGR	No. 0164 DE 2020	$ 738.510.249
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 738.510.249

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 11519 De 12/09/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	NO SE HAN TRAMITADO ACTAS DE COSTOS						$ 738.510.249		$ 738.510.249		
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Firma
Nombre: JESÚS ALONSO MEJÍA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-43646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA - MINFRA-MN-IN-15-FR-13.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 0164-2020

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAR 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

SECTOR: CORREGIMIENTO DE AQUITANIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	HUGO NIEVES DE LA CRUZ	73.097.208	Director Interventoría	5.234.000	5.234.000	303.600	174.500	890.100	174.500		
2	DUSTIN GUTIÉRREZ DE LA ROSA	1.045.680.139	Topógrafo inspector	2.000.000	2.000.000	116.100	66.700	320.100	66.700		
3	DANIEL GIRALDO	1022123814	Cadenero	1.006.000	1.006.000	58.400	33.600	161.100	33.600		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				8.240.000							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 13202-15939 BLV

Firma

Nombre: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-43646 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 20 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA - MINFRA-MN-IN-15-FR-16.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ARGELIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0164-2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

FECHA DE INICIO: 17/02/2020

PLAZO INICIAL: SIETE MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/09/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 738.510.249,00

VALOR ACUMULADO: $ 738.510.249,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	73.851.024,90	13	1	2020	Nota de vigencia: hasta liquidación		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	147.702.049,80	13	1	2020	13	8	2020
Calidad del servicio	30	221.553.075,70	13	1	2020	Igual al plazo estabilidad contrato		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 117975

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Segurexpo de Colombia S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	73.851.024,90	13	1	2020	Nota de vigencia: hasta liquidación		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	147.702.049,80	13	1	2020	13	8	2020
Calidad del servicio	30	221.553.075,70	13	1	2020	Igual al plazo estabilidad contrato		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 117975

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Segurexpo de Colombia S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:
Acta de aprobación de pólizas de 24 de enero de 2020

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 13202-15939 BLV

Firma
Nombre: JESÚS ALONSO MEJÍA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-43646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 21. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-3-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	3	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0168 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ING. JESÚS ALONSO MEJÍA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. N.A.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: EL CONTRATO NO CONTEMPLA ANTICIPO EN LA FORMA DE PAGO
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre) ING. HUGO NIEVES DE LA CRUZ
Director de Interventoría
Interventor
Matricula No.: 13202-15939 BLV

(Firma)
(Nombre) ING. JESÚS ALONSO MEJÍA
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.: 25202-43646 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 22. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - MINFRA-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA **DIRECCION TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0164 **DE** 2020

CUENTA BANCARIA No.: _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JESÚS ALONSO MEJÍA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	EL CONTRATO NO TIENE PREVISTO ANTICIPO EN SU FORMA DE PAGO					

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma
Nombre :
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No. :

Firma
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 23. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CONTRATO NO. 163-2019
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO TOP
OBJETO MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

FECHA	CONSECUTIVO	EMISOR	DESTINATARIO	ASUNTO
2-mar-20	ADM-INV-0164-2020-007	Copeba S.A.S.	Instituto Nacional de Vias	Radicación hoja de vida profesional social y ambiental
5-mar-20	SRT 9505	INVIAS	Copeba S.A.S.	Aprobación hoja de vida personal
6-mar-20	OBR-CONTR-0164-2020-005	Copeba S.A.S.	Municipio de S. Francisco	Información sobre acta de inicio
7-mar-20	RAD 140-10.01292020	Mun. S. Francisco	Copeba S.A.S.	Información sobre acta de inicio
16-mar-20	ADM-INV-0164-2020-008	Copeba S.A.S.	Instituto Nacional de Vias	Radicación hoja de vida ingeniero residente
24-mar-20	OBR-CONTR-0164-2020-010	Copeba S.A.S.	Municipio de S. Francisco	Solicitud de suspensión contrato de obra No. 163-2019
27-mar-20	S/N	Consorcio Vial San Francisco	Copeba S.A.S.	Solicitud de suspensión contrato de obra No. 163-2019

ANEXO 24. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO No. 163 DE 2019
MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PLACA HUELLA CORREGIMIENTO DE AQUITANIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA



Foto No. 1 - Recorrido inicial en obra



Foto No. 2 - Recorrido inicial en obra



Foto No. 3 - Recorrido inicial de la obra



Foto No. 4 - Trabajos de topografía



Foto No. 5 - Trabajos de levantamiento topográfico



Foto No. 6 - Rocería para levantamiento topográfico



Fotoo No. 7 - Apiques para estudio de suelos



Foto No. 8 - Muestra para estudio de suelos
