CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL No. 2

MAYO 05 DE 2020 – MAYO 31 DE 2020 BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA FECHA 06 -04-2020	ING. MELISA JANEZ GÓMEZ PALACIOS FECHA: 06-04-2020	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO FECHA: 06-04-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

001

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1 ANTECEDENTES 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 6
4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 7
4.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 10
5. ASPECTO JURÍDICO 12
6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 14
6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 15
7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
7.1. INTRODUCCIÓN 15
7.2 OBJETIVOS 15
7.2.1. OBJETIVO GENERAL 15
7.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 16
7.3.1. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO 16
7.3. ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16
7.4.1. REGISTRO DE PERSONAL VINCULADO 16
7.4.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO 16
7.4.3. CONTRATISTA GYG 17
7.4.4. CONTRATISTA PH 17
7.4. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS 17
7.5. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 17
7.6. CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL 18
7.7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 19
7.7.1. INDUCCIÓN A TRABAJADORES NUEVOS 19

002

7.7.2. CAPACITACIONES REALIZADAS 19
7.8. ACTIVIDADES –PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 19
7.9. PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 22
7.10. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 22
7.11. EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 22
7.12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23
7.12.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 23
7.12.2. VEHÍCULOS 23
7.12.3. IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT'S 23
7.13. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 23
7.14. ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL 24
7.14.1. UNIDADES SANITARIAS 24
7.14.2. LAVAMANOS 24
7.15. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL 24
7.15.1. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO ANTE LA SDA 24
7.15.2. DISPOSICIÓN FINAL DE RCD 24
7.16. REGISTRO FOTOGRÁFICO 24
8. INFORME DE OBRA 24
8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 24
9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 24
9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 24
9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 26
9.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 26
10. INFORME DE DISEÑO 26
11. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 26

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Realizar el diseño de intersecciones de acuerdo a las priorizaciones establecidas en la Entidad e indicadas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas".
- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Atender las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo de la red semafórica existente.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" - Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

Con el objeto de contratar el diseño y construcción, de las obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento el sistema de semaforización de Bogotá D.C., incluyendo diseño semafórico de intersecciones para la implementación de nuevos controles semaforizados. Le adjudico a la empresa **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S** el contrato mediante la **Resolución N° 259 del 26 de DICIEMBRE de 2019**, cuyo objeto es: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."**

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de la red semafórica existente y donde se requiera nueva semaforización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal de la ciudad.

003

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	08 de junio de 2020	PERIODO No.	08	DEL	01/06/2020	HASTA	07/06/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	53 días	EQUIVALE AL	28.8% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	53
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	35
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	19%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	01/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	OFICIO	ASUNTO	DESTINATARIO
04/02/2020	AC2R-SEM-01-2020	Presentación de APU y remisión de la Licencia de excavación N° 024 de 2020	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
04/02/2020	AC2R-SEM-02-2020	Presentación de bodegas	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
06/02/2020	AC2R-SEM-03-2020	Presentación de profesionales	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
05/02/2020	AC2R-SEM-04-2020	Presentación licencia de Software Ofimático	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
05/02/2020	AC2R-SEM-05-2020	Presentación de oficina	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
06/02/2020	AC2R-SEM-06-2020	Presentación del programa de trabajo	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
21/02/2020	AC2R-SEM-07-2020	Remisión de licencias solicitadas mediante el oficio PIV-IMS-2019-063	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
21/02/2020	AC2R-SEM-08-2020	Atención de observaciones del personal mínimo requerido	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
25/02/2020	AC2R-SEM-09-2020	Remisión de contratos de arrendamiento Bodegas 1 y 2	CIRO JIMENEZ - ANDRES BARBOSA PEREZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
02/03/2020	AC2R-SEM-10-2020	Atención de observaciones oficio PIV-IMS-20191810-074	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
04/03/2020	AC2R-SEM-11-2020	Atención de observaciones según reunión realizada el 03 de marzo de 2020 en SDM	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
09/03/2020	AC2R-SEM-12-2020	Remisión pólizas acta de inicio	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
09/03/2020	AC2R-SEM-13-2020	Solicitud de imagen corporativa	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
09/03/2020	AC2R-SEM-14-2020	Solicitud de fichas técnicas y esquemas eléctricos faltantes	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
12/03/2020	AC2R-SEM--15-2020	Atención al correo electrónico recibido 11 de marzo	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
16/03/2020	AC2R-SEM--16-2020	Presentación informe semanal N°1	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
24/03/2020	AC2R-SEM--17-2020	Solicitud de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR - **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

001

13/04/2020	AC2R-SEM-18-2020	Solicitud de prórroga de suspensión del contrato de obra N°2019-1874	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR- **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD** CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
12-05-2020	AC2R-SEM-19-2020	Solicitud de tiempos de respuesta oportunos en PMT típicos y específicos, y trazabilidad de envió de información	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES – LUZ DARY VASQUEZ **PIV INGENIERIA S.A.S**
22/04/2019	AC2R-SEM-20-2020	Solicitud motivada por pandemia COVID -19	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
13/05/2020	AC2R-SEM-20-2020	Solicitud de comité de especialistas en transito	LEYDY TATIANA BORDA **SECRETARIA DE MOVILIDAD** IVAN GARCIA DE ANGULO
14/05/2020	AC2R-SEM-21-2020	Presentación de los vehículos	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
14/05/2020	AC2R-SEM-22-2020	Presentación de personal operativo	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
14/05/2020	AC2R-SEM-23-2020	Remisión de pólizas	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
20/05/2020	AC2R-SEM-24-2020	Respuesta a los oficios N° PIV-IMS-2019-1810-0143 y N° PIV -IMS-1810-0140 y presentación de NP-01, NP-02, NP-03,NP-05,NP-06,NP-07,NP-8, NP-09.	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
20/05/2020	AC2R-SEM-25-2020	Atención de observaciones presentación de personal operativo	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
20/05/2020	AC2R-SEM-26-2020	Solicitud de estado de aprobación Protocolo de Bioseguridad	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
21/05/2020	AC2R-SEM-27-2020	Presentación de profesionales	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
22/05/2020	AC2R-SEM-28-2020	Presentación de vehículos	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
26/05/2020	AC2R-SEM-29-2020	Solicitud de reconocimiento	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
	AC2R-SEM-30-2020	Oficio anulado	
29/05/2020	AC2R-SEM-31-2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra N° 2019-1874 y solicitud de comité técnico	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR – SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO - LADY TATIANA BORDA - **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
03/02/2020	PIV-IMS-20191810-042	Requisitos para legalización acta de inicio contrato N°2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
18/02/2020	PIV-IMS-20191810-062	Comunicación AC2R- SEM -02-2020. Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
18/02/2020	PIV-IMS-20191810-063	Comunicación AC2R-SEM-04-2020. Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
18/02/2020	PIV-IMS-20191810-064	Comunicación AC2R-SEM-03-2020. Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
26/02/2020	PIV-IMS-20191810-074	Respuesta oficios AC2R-SEM-08Y 09-2020. Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.**
6/03/2020	PIV-IMS-20191810-087	Solicitud actualización de las garantías del contrato de obra N°2019-1874, suscrito entre la secretaria distrital de movilidad y AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/04/2020	PIV-IMS-20191810-0116	Protocolo de bioseguridad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
7/05/2020	PIV-IMS-20191810-0139	Solicitud de cronograma de obra	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
7/05/2020	PIV-IMS-20191810-0140	Su comunicación AC2R-SEM-20-2020 del 22 de abril, recibida por correo electrónico el 27 de abril de 2020, solicitud de aprobación de precios no previstos, motivada por pandemia COVID-19	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/05/2020	PIV-IMS-20191810-0456	Presentación vehículos con comunicación AC2R-SEM-21-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
11-05-2020	PIV-IMS-20191810-0143	Alcance comunicado PIV-IMS-20191810-0143	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
13/05/2020	PIV-IMS-20191810-0144	Oficio AC2R-SEM-19-2020. Solicitud de tiempos de respuesta oportunos en PMT típicos y específicos, y trazabilidad de envío de información. Recibido el 12 de mayo a las 16:14 horas.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/05/2020	PIV-IMS-20191810-0156	Presentación vehículos con comunicación AC2R-SEM-21-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/05/2020	PIV-IMS-20191810-0157	Presentación personal operativo adicional al establecido en el numeral 5.1 con comunicación AC2R-SEM-22-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19-05-2020	PIV-IMS-20191810-0158	Alcance a la comunicación PIV-IMS-20191810-0157	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
28/05/2020	PIV-IMS-2019-1810-0165	Respuesta a la comunicación AC2R-SEM-24-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
29/05/2020	PIV-IMS-2019-1810-0167	Incumplimiento entrega plan de calidad -Contrato N°2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

4.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
16/03/2020	Solicitud entrega de PMT	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/03/2020	Replanteo orden de trabajo N°1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/03/2020	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN AC2R-SEM-14-2020 DEL 9 DE MARZO DE 2020. FICHAS TÉCNICAS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS FALTANTES	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
18/03/2020	Programación del PAC	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
18/03/2020	Solicitud entrega PMT	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
27/03/2020	Re: Remisión del oficio AC2R-SEM-17-2020- solicitud de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S SECRETARÍA DE MOVILIDAD
30/03/2020	Acta de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874 versión 30 marzo	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
07/04/2020	ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 2019 1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
07/04/2020	INFORME MENSUAL DE MARZO DE 2020. CTO. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/04/2020	Cronograma de obra. Orden de trabajo No.1. Contrato 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
13/04/2020	REINICIO CONTRATO N. 2019 1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/04/2020	Acta de Suspensión no. 2 Contrato 2019-1874 para firma	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/04/2020	Solicitud Protocolo de Bioseguridad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
27/04/2020	Acta prórroga no. 2 suspensión Cto 2019-1874 para actualización pólizas	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
27/04/2020	Fwd: Cronograma de obra. Orden de trabajo No.1. Contrato 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
30/04/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0120 - Solicitud aclaración técnica del diseño de bases para postes	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
04/05/2020	Manual de Marca Alcaldía	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
04/05/2020	FICHA COMPLEMENTOS Y TECNICA EXTERNO 3503	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
04/05/2020	Acta de reinicio no. 2 Contrato 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/05/2020	PMT.zip	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/05/2020	PMT no accesible	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
06/05/2020	Acta de reinicio No.1 firmada por las partes Cto. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
07/05/2020	CRONOGRAMA DE OBRA CTO. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/05/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-0140 Precios Unitarios no previstos	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/05/2020	Observaciones PMT típicos	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/05/2020	Solicitud de estado de aprobación de PMT general	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
13/05/2020	PLAN DE CALIDAD CONTRATO 20199-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

13/05/2020	Respuesta a comunicado AC2R-SEM-19-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
14/05/2020	Su comunicado AC2R-SEM-20-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
14/05/2020	Presentación de vehiculos	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/05/2020	Respuesta presentacion del personal operativo	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
28/05/2020	Respuesta a la comunicación AC2R-SEM-24-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
28/05/2020	Invitation: Contrato de Obra 2019-1874 @ Mon Jun 1, 2020 3:15pm - 3:55pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
28/05/2020	Re: Nueva hora propuesta: Contrato de Obra 2019-1874 lun 1 de jun de 2020 3:15pm - 3:55pm (COT) (Sandra Patricia Giraldo Clavijo)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
29/05/2020	Invitación: Comité de Obra mar 2 de jun de 2020 8am - 9am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
30/05/2020	Incumplimiento entrega Plan de Calidad – Contrato N. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS

FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
10/02/2020	Fwd: LISTADO OBRAS CIVILES CONTRATO 2019-1874	PIV INGENIERIA
19/02/2020	Citación para visita de aprobación de Bodegas	PIV INGENIERIA
20/02/2020	CITACIÓN DE VERIFICACIÓN DE BODEGAS	PIV INGENIERIA
24/02/2020	Remisión de apu editables	PIV INGENIERIA
24/02/2020	Confirmación Reunión del día 25 de febrero de 2020	PIV INGENIERIA
04/03/2020	Atencion oficio presentacion del personal	PIV INGENIERIA
14/03/2020	SOLICITUD FECHAS PARA INICIAR CON REPLANTEO	PIV INGENIERIA
16/03/2020	SOLICITUD ENTREGA DE PMT	PIV INGENIERIA
24/03/2020	Remision del informe semanal N°2	PIV INGENIERIA
24/03/2020	Remisión del oficio AC2R-SEM-17-2020- solicitud de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874	PIV INGENIERIA
30/03/2020	Acta de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874 versión 30 marzo	PIV INGENIERIA
01/04/2020	ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 2017-1858	PIV INGENIERIA
08/04/2020	Informe mensual N°1	PIV INGENIERIA
13/04/2020	solicitud de prórroga de la suspensión del contrato de obra 2019- 1874	PIV INGENIERIA
15/04/2020	Solicitud de Pólizas de Garantía Cto 2017-1858	PIV INGENIERIA
24/04/2020	Acta de Suspensión no. 2 Contrato 2019-1874 para firma	PIV INGENIERIA
29/04/2020	Planes de manejo de transito específicos	PIV INGENIERIA
05/05/2020	Re: PMT.zip	PIV INGENIERIA

07/05/2020	CRONOGRAMA DE OBRA CTO. 2019-1874	PIV INGENIERIA
08/05/2020	PMT TIPICOS	PIV INGENIERIA
08/05/2020	Cronograma de obra	PIV INGENIERIA
11/05/2020	Solicitud de estado de aprobacion de PMT general	PIV INGENIERIA
12/05/2020	Remisión oficio AC2R-SEM-19-2020	PIV INGENIERIA
13/05/2020	Respuesta a oficio PIV-IMS-20191810-0147	PIV INGENIERIA
14/05/2020	Presentación de vehiculos	PIV INGENIERIA
14/05/2020	presentacion del personal operativo	PIV INGENIERIA
14/05/2020	adjunto carta de respuesta	PIV INGENIERIA
14/05/2020	Polizas actualizadas	PIV INGENIERIA
15/05/2020	SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE REPLANTEO	PIV INGENIERIA
18/05/2020	parafiscales	PIV INGENIERIA
20/05/2020	Oficio, N° AC2R-SEM-25-2020	PIV INGENIERIA
20/05/2020	respuesta RESPUESTA A LOS OFICIOS N°PIV-IMS-2019-1810-0143 Y N°PIV-IMS- 1810-0140, Y PRESENTACION DE NP-01,NP-02,NP-03,NP-04,NP-05,NP-06,NP07,NP08,NP09.	PIV INGENIERIA
20/05/2020	Oficio N° AC2R-SEM-26-2020	PIV INGENIERIA
21/05/2020	presentacion de profesionales	PIV INGENIERIA
22/05/2020	Respuesta oficio PIV-IMS-20191810-0156	PIV INGENIERIA
26/05/2020	remision oficio AC2R-SEM-029-2020	PIV INGENIERIA
29/05/2020	REMISIÓN DEL OFICIO 31 TRAZABILIDAD DE HECHOS QUE HAN GENERADO LA DILATACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°2019- 1874 Y SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO

	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO


SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

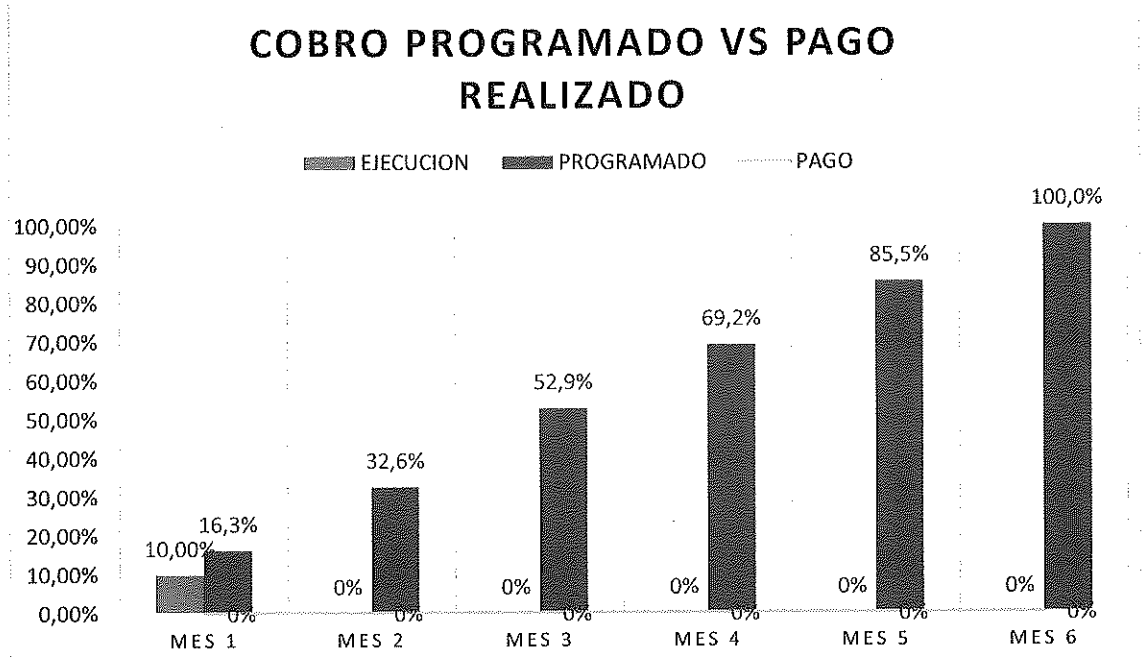

En el mes 2, el avance programado es de un 25.5% vs un avance ejecutado real del 10%.

6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	25.5%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 807.291.410
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describen las actividades referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra N° 2019-1874 cuyo objeto es el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C

Este informe comprende las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 05 de mayo y el 31 de mayo de 2020.

7.2 OBJETIVOS

7.2.1. OBJETIVO GENERAL

008

Describir las actividades implementadas en los frentes de obra para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, las medias de manejo ambiental y PG – RCD acorde con los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio Ambiente en el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra pública 2019-1974.

7.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Velar por el cumplimiento el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo durante los trabajos ejecutados.

Implementar planes de mejora con el fin de identificar y mitigar los riesgos presentes en la ejecución del proyecto.

Describir las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los compromisos contractuales y la normatividad ambiental aplicable.

Verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato de obra 2019-1874.

7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseño y construcción de obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento de las obras civiles para el sistema de semaforización de Bogotá DC y contiene de manera general para su ejecución la Formulación y tramites de planes de manejo de tráfico, Localización, verificación y replanteo, Estudio y trazado de redes existentes, Implementación planes de manejo de tráfico, Demoliciones, Excavaciones, Perforaciones y Construcción.

7.3.1. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se ejecutaron actividades constructivas o de mantenimiento.

7.3. ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST trazado para el contrato de Obra No. 2019-1874 AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S llevo a cabo las siguientes actividades:

7.4.1. REGISTRO DE PERSONAL VINCULADO

El Personal vinculado en el área administrativa y operativa para la ejecución del contrato se relaciona a continuación:

7.4.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO

N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Edwin García	Director de Obra			Positiva
2	Meliza Janes	Residente de Obra			Bolívar
3	Camila Gamba	Aux. de Ingeniería			Bolívar

4	Stella Pineda	Tec. Ing. SISO			Bolívar

7.4.3. CONTRATISTA GYG

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no hubo ingreso de personal operativo del Contratista GYG Asociados SAS, debido a que no se han iniciado las actividades constructivas o de mantenimiento

7.4.4. CONTRATISTA PH

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no hubo ingreso de personal operativo de PH Ingeniería De Perforaciones Horizontales S.A.S, debido a que no se han iniciado las actividades constructivas o de mantenimiento.

7.4. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

Todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todos los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, que implica la afiliación y pago de cotizaciones mensuales.

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020, se vigiló y aseguró que el personal activo del presente contrato cuenta con las afiliaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social – SGSS.

El personal activo durante este periodo se relaciona el en el ***numeral 5***. *Registro de personal vinculado*, del presente informe. Las afiliaciones, pagos de seguridad social y certificado de pago de parafiscales y seguridad social se evidencian en el ***Anexo 1. Planilla Seguridad Social.***

7.5. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

Los exámenes de ingreso, son aquellos que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se realizaron exámenes médicos de ingreso.

009

7.6. CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL

Según lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 3701 Guía para la Clasificación, Registro Y Estadística De Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales , se toma una constante de 200000 horas hombre de exposición (100 trabajadores X 8horas diarias X 5 días de la semana x 50 semanas).
N° AT : Número de días de incapacidad por AT
HHT : Horas hombre trabajadas en el periodo
K: Constante según VTC 3701 = 200000
IF: Índice de frecuencia de accidentalidad
IS: Índice de severidad de accidentalidad.
ILI: Índice de lesiones incapacitantes

a. IF: Índice de frecuencia

Evalúa y presenta los resultados de la frecuencia de los eventos, se puede hacer frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades de origen común, etc.
Relaciona el número total de eventos por ejemplo con tiempo perdido con respecto al total de horas-hombre-trabajadas durante el período y se expresa en cantidad de accidentes en una constante definida como K.
I.F = (Número de lesiones incapacitantes / Horas-Hombre- trabajadas en el período) * K

b. I.S: Índice de severidad

La gravedad o severidad de los eventos se mide mediante los días perdidos que a su vez se compone de dos factores: los días de incapacidad y los días cargados.

.G: (Número de días perdidos / Horas-hombre-trabajadas en el período) * K

AC2R Ingeniería & Proyectos	INDICADORES DE AUSENTISMO	Fo SG-SST 28 V02
		Fecha creación: 05 - 05 - 2017
		Fecha actualización: 27 - 04 - 2019

EMPRESA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
PROYECTO	CTO OBRA - N° 2019-1874 - SEMAFORIZACIÓN
PERIODO REPORTADO	MAYO DE 2019
RESPONSABLE	STELLA PINEDA

		RESUMEN		OBSERVACIONES
NUMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	6			
NUMERO DE EMPLEADOS OPERATIVOS	0	TOTAL	6	
DIAS TRABAJADOS ADMINISTRATIVOS	23	HHT	1104	

DIAS TRABAJADOS OPERATIVOS	0	HHT	0	
TOTAL HORAS - HOMBRE - TRABAJADAS	1104	ACUMULADO	7976	
CASOS DE ENFERMEDAD COMUN	0	ACUMULADO	0	
DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	0	ACUMULADO	10	
CASOS MATERNIDAD	0	ACUMULADO	0	
DIAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0	ACUMULADO	0	
DIAS PERDIDOS (Revisar tablas, anexo 1 y 2)	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE ENFERMEDADES LABORALES	0	ACUMULADO	0	
DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL	0	ACUMULADO	0	
NUMERO DE FATALIDADES	0	ACUMULADO	0	
INDICES	**ENFERMEDAD COMUN**	**ACCIDENTE DE TRABAJO**	**ENFERMEDAD LABORAL**	**OBSERVACIONES**
INDICE DE FRECUENCIA	0	0	0	
INDICE DE SEVERIDAD	0	0	0	
INDICE LESIONES INCAPACITANTES	0	0	0	
TASA DE INCIDENCIA (eventos nuevos)	0	0	0	
TASA DE PREVALENCIA (eventos nuevos y antiguos)	0	0	0	

7.7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

7.7.1. INDUCCIÓN A TRABAJADORES NUEVOS

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se realizaron capacitaciones de inducción ya que no hubo ingreso de personal nuevo al equipo de trabajo.

7.7.2. CAPACITACIONES REALIZADAS

- Diario- Charlas de bioseguridad
- 08 de mayo - Divulgación de protocolos de bioseguridad personal oficina
- 08 de mayo – Divulgación y publicación de protocolo de lavado de manos
- 08 de mayo - Divulgación y publicación medidas de prevención COVID-19
- Publicación y divulgación Circular interna 001 de 30 de abril de 2020 – COMUNICADO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19

Los soportes de las capacitaciones citadas en el presente numeral se evidencian en el ***anexo 2. Capacitaciones***

7.8. ACTIVIDADES –PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 se realizó la compra de implementos de aseo y otros EPI para dotar al personal y dar cumplimiento al **Plan De Aplicación Del Protocolo Sanitario Para La Obra (PAPSO)** se realizó compra de insumos de aseo y otro elementos de bioseguridad para implementación de Protocolos de Bioseguridad

- Gel antibacterial OVI
- Jabón antibacterial OVI
- Hipoclorito de sodio al 5.25 %
- Alcohol al 70%
- Detergente
- Toallas de único uso
- Tapaboca industrial
- Polainas
- Careta de protección facial
- Termómetro infrarrojo

ACTIVIDADES- PROTOCOLO

- 09 de mayo- Publicación de protocolos de bioseguridad
- Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes. ***Anexo 4. Registro de temperatura corporal***
- Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
- Publicación y divulgación Circular interna 001 de 30 de abril de 2020 – COMUNICADO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19
- Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

CIRCULAR INTERNA 001

PARA: PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES, PERSONAL OPERATIVO, CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
DE: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
ASUNTO: COMUNICADO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19
FECHA: 30 ABRIL 2020

Cordial saludo,

En cumplimento a la circular 003 del 08 de abril de 2020 emitida en conjunto por El Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Transporte y el Ministerio del Trabajo en la cual se establecen las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19 en todo el sector de

infraestructura, la empresa AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, se permite comunicar las medidas de carácter preventivo frente al coronavirus las cuales serán de obligatorio cumplimientos por parte de todo el personal al cual se dirige la presente circular.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. **INTERACCION SOCIAL:** Evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones de personas que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y contagiosas.
2. **HIDRATACIÓN**: Consumir agua frecuentemente.
3. **INFORMARSE**: Orientar a los trabajadores que se informen acerca de la prevención únicamente de fuentes oficiales y evitar la divulgación de información que proyecte miedo o pánico generalizado.
4. **HIGIENE PERSONAL**: lavado de manos mínimo cada 03 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo o cada _ labor. Secado con toallas de un solo uso (personal de cada trabajador), evitar tocarse la cara o la nariz.
   El lavado de manos debe durar de 20 a 30 segundos. Si no cuenta con un sitio para hacer el lavado de manos cuente con un kit que contenga alcohol glicerinado o toallas desinfectantes
5. **PREVENCION**: Si hay personal con resfriado, tos, gripa o presenta síntomas como fiebre o dificultad para respirar no deben presentarse al trabajo, reportar al jefe inmediato su condición y reintegrarse a la labor una vez este recuperado presentado los registros médicos correspondientes.
6. **SALUDO**: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos ni abrazos.
7. **PUESTOS DE TRABAJO LIMPIOS**: Organizar documentos, archivar, mantener el escritorio libre y despejado para facilitar las labores de limpieza.
8. **VEHÍCULOS**: limpiar con desinfectantes o alcohol al 70% las partes de contacto común, sillas, volante, controles, mandos, operar con vidrios cerrados
9. **OFICINAS VENTILADAS**: Ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos, no usar aire acondicionado.
10. **DISTANCIA**: Procurar conservar distancia aproximada de 1.5 m con los demás compañeros y colaboradores
11. **RECURSOS**: Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo dispuestos en el centro de trabajo, gel, alcohol, papel, toallas, etc. Y evitar el desperdicio del agua (uso eficiente).
12. **REUNIONES**: Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario convocar máximo a 15 personas, dejar una illa intermedia, mantener distancia mínima de 1,5 m entre personas, mantener las salas abiertas y ventiladas.
13. **CAPACITACIONES**: Desarrollar sesiones escalonadas con número de personas acorde al lugar, evitar aglomeraciones, mantener distancia mínima de 1,5 m entre personas, usar espacios abiertos o ventilados.

SE PROHIBE EL INGRESO DE PERSONAL AJENO A LA OBRA

Agradecemos su atención y esperamos que con la colaboración de todos, podamos contribuir al correcto manejo de esta situación de salud pública.

ING.CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.

El registro fotográfico de todas las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se evidencian en el ***anexo 3. Registro Fotográfico.***

7.9. PLAN DE MOVILIDAD SEGURA

Dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal que se traslada al a oficina usa transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

7.10. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP):

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

7.11. EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 se realizó entrega de elementos de bioseguridad al personal que está desarrollando actividades de la oficina.

Nombre	Cargo	EPI	Fecha
Camilo Rosario	Rep. Legal	-Careta de protección facial	07 Mayo

		-Tapabocas -Polainas	
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	-Careta de protección facial -Tapabocas -Polainas	07 Mayo
Felipe López	Aux. Administrativo	-Careta de protección facial -Tapabocas -Polainas	07 Mayo
Elizabeth Pineda	Aux. SST	-Careta de protección facial -Tapabocas -Polainas	07 Mayo

7.12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Inspección de seguridad es una técnica básica para la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es identificar las posibles deficiencias y controlar las medidas preventivas existentes, durante la ejecución de los trabajos. Las inspecciones proyectadas durante la ejecución del contrato en mención se relacionan en los siguientes numerales.

7.12.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran inspección de herramientas y equipos.

7.12.2. VEHÍCULOS

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran inspección de vehículos.

7.12.3. IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT'S

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran implementación de PMT'S

7.13. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 se realizó la compra de insumos necesarios para la correcta implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo se verifica diariamente su disponibilidad en cada área.

- Gel antibacterial OVI
- Jabón antibacterial OVI
- Hipoclorito de sodio al 5.25 %
- Alcohol al 70%
- Detergente
- Toallas de único uso

- Tapaboca industrial
- Polainas
- Careta de protección facial
- Termómetro infrarrojo

7.14. ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL

7.14.1. UNIDADES SANITARIAS

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran el uso de unidades sanitarias en obra.

7.14.2. LAVAMANOS

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran el uso de lavamanos en obra.

7.15. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL

7.15.1. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO ANTE LA SDA

El trámite de registro de la obra con el referente PIGA de la Secretaría de Movilidad se encuentra en proceso.

7.15.2. DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020, no se han desarrollado actividades constructivas o de mantenimiento que puedan generar residuos de construcción y demolición.

7.16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de todas las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se evidencian en el ***anexo 2. Registro Fotográfico.***

8. INFORME DE OBRA

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de tránsito para iniciar la ejecución de la obra.

9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

9.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°4 (DEL 5 AL 10 DE MAYO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 4 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020

4.	Cl 53 x KR 24	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020

9.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°5 (DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria

9.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°6 (DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se entregan las observaciones atendidas el día 21 de mayo de 2020

9.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°7 (DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Se espera aprobación de la interventoría para radicación ante Secretaria Distrital de Movilidad.

9.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM'S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	En tramite
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite

10. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

11. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- El acta de inicio del contrato de obra 2019-1874 fue suscrita el 6 de marzo de 2020, a causa de la pandemia causada por el virus COVID-19 al contrato se le realizo la suspensión N°1 el dia 30 de marzo de 2020 hasta el

dia 12 de abril de 2020, por motivo de continuación del estado de emergencia se genera la suspensión N°2 del 13 de abril de 2020 hasta el día 5 de mayo de 2020, desde el día 5 de mayo hasta el día de hoy el contrato lleva de ejecución 53 dias.

- A la fecha el contrato tiene un porcentaje de ejecución programado del 25.5%, versus el porcentaje ejecutado real es del 10%, presentando a la fecha un atraso del 15.5% de la ejecución del contrato, esto debido a las razones expuestas en los diferentes comunicados entre la interventoría y el contratista en donde se refleja que al día de hoy no se ha iniciado la ejecución de actividades de obra.

ANEXO 1. PLANILLAS DEL PERSONAL

compensar | miplanilla.com

PLANIL . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E	11/05/2020	42539064	$593.600	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en Exterior	Suscriptor	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1014240634	SANCHEZ RUIZ DAVID RICARDO	1	0			S																	25-14	877.803	26.400	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	26.400	0	0	0	0	0
CC	1016021481	SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0
CC	1129577194	ESCOBAR CASTILLO KATHERINE	1	0			S																	230301	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0
CC	80739892	GARCIA ANGULO EDWIN GONZALO	1	0			S																	230301	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C -- MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E	11/05/2020	42539064	$593.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	90.000	0	0	0	0	0	0		90.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	26.400	0	0	0	0	0	0		26.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	205.600				205.600	0	0	205.600			2.056	205.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	116.400	0	0	116.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	155.200	155.200
Pensión	2	116.400	116.400
Riesgos Laborales	1	205.600	205.600
CCF	1	116.400	116.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	593.600	593.600

Este documento está clasificad omo PRIVADO por parte de Compensar Operad de Información

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-06-05, 09:04:03 a. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 1030007641

Periodo Cotización: 202004 **Periodo Servicio:** 202004

PAGADA 2020-05-21 21:42:13.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 21/05/2020, la empresa LUZ STELLA PINEDA BUSTOS, con documento de identificación CC1026260474, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINEDA BUSTOS LUZ STELLA, con CC 1026260474, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION (ING + PROTECCION)
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificada con **CC** número **1019079604**, aportó por el empleado **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado(a) con **CC** número **1019079604** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **42038805** para el periodo de salud **2020-04** y pensiones **2020-04** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	APORTANTE	SUCURSAL	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	VIP	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE DE RIESGO	INDICA TARIFA PENSION	COTIZACION VOLUNTARIA	FSP CONTABILIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA PAGO	APORTE MORA
Cajas	CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	3	0														0		30	$877.803	0,02000			$17.600	$0	$0	Abril - 2020	42038805	18/05/2020	N
Salud	EPS008	Compensar EPS	860066942	3	0														0		30	$877.803	0,12500			$109.800	$0	$0	Abril - 2020	42038805	18/05/2020	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	3	0														0		30	$877.803	0,16000			$140.500	$0	$0	Abril - 2020	42038805	18/0_	N

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Junio de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001 icontec

Certificado Nº SI 005-1

Identificación	1077425387	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3116397504
Razón Social	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS	Dirección	TRANSVERSAL 113F #64B-18	Fecha Pago	21/05/2020
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Abril-20
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	42814196	Periodo Pensión	Abril-20
Total a Pagar	$250,300	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	1	$877,803	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0		$140,500
Totales				$877,803	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0		$140,500

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$877,803	$109,800	$0	$0		$0		$0		109800	$109,800
Totales				$877,803	$109,800	$0	$0		$0		$0		$109,800	$109,800

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

ANEXO 2. CAPACITACIONES

AC2R Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act 04 - 04 - 2019

FECHA:	8/05/2020	**LUGAR:**	Oficina AC2R
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Elizabeth Pineda Bustos	**DOCUMENTO ID**	1.032.450.451

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación		Divulgación de protocolos de bioseguridad personal oficina
Capacitación		Divulgación y publicación de protocolo de lavado de manos
Capacitación		Divulgación y publicación medidas de prevención COVID-19
Capacitación		Publicación y divulgación Circular interna 001 de 30 de abril de 2020 – COMUNICADO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19
Otra		

OBJETIVO:	Dar a conocer las medidas de prevención del contagio de covid 19 propuestas por AC2R Ingeniería y Proyectos SAS


N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Maria Camila Cambo	1019079604	Aux Ingeniero		
2	Felipe Lopez	1073510410	Aux Adm.		
3	Camila Rosario	80228570	Rep Legal		
4	Elizabeth Pineda	1032450457	Aux SST		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

020


ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTOGRAFÍA No.	1
FECHA	7/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN	
Suministro de polainas	




FOTOGRAFÍA No.	2
FECHA	7/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN	
Suministro de Careta de protección facial	




FOTOGRAFÍA No.	3
FECHA	8/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN	
Publicación medidas de prevención COVID-19	




FOTOGRAFÍA No.	4
FECHA	8/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN	
Publicación protocolo lavado de manos	





FOTOGRAFÍA No.	5
FECHA	8/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN	
Publicación protocolos de bioseguridad	



FOTOGRAFÍA No.	6
FECHA	8/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN	
Publicación circular interna 001	





			
FOTOGRAFÍA No.	7	FOTOGRAFÍA No.	8
FECHA	8/05/2020	FECHA	8/05/2020
LUGAR	Oficina AC2R	LUGAR	Oficina AC2R
DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN	
Registro diario de temperatura		Area de cuidado en salud	

ANEXO 4. REGISTRO DE TEMPERATURA CORPORAL

ACSR Ingeniería & Proyectos S.A.S.	**ENCUESTA PREOPERACIONAL DE SALUD POSTERIOR A CONTINGENCIA NACIONAL POR COVID 19**	VERSION 1 2020-05-27

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
01 Jun.	11:57	Omar lopez	—	36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
		German Perez		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	No	SI	/	
		Sandra Perez		36.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	/	
		Carlos Gomez.		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
		liliana Sanchez		36.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
	1:20	Melissa Janez.		36.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	/	
		Gustavo		36.9													
1 Jun	2:55	Gonzalo		36.6													

ACSR Ingeniería & Proyectos S.A.S.	**ENCUESTA PREOPERACIONAL DE SALUD POSTERIOR A CONTINGENCIA NACIONAL POR COVID 19**	VERSION 1 2020-05-27

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
26 May	10:00	Fabian Chacon	1126123618	36.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
26 May	10:33	Meliza Jones	-	36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
26 May	11:58	Oscar Godoy		36.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
27 May	8:15	Maria Camila		35.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
27 May	8:20	Felipe Lopez		36.2	N	N	N	N	N	N	N	S	N	NO	SI	✓	
27 May	8:25	Catalina Cagli		36.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
27 May	8:40	Elizabeth Prada		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
27 May	8:50	Mayerly Herrera		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
28 May	9:30	Camila Herrera		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
28 May	11:40am	Johan Mojos		36.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
28 May	1:30	Meliza Jones		35.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	

Ingeniería & Proyectos S.A.S.	ENCUESTA PREOPERACIONAL DE SALUD POSTERIOR A CONTINGENCIA NACIONAL POR COVID 19	VERSION 1
		2020-05-27

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
21-05-20	10:57	Maria Camba Gamba	1019079604	36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI		
21-05-20	10:58	Mayerly Moreno	1019090314	36.5	N	N	S	N	N	N	N	N	N	NO	SI		
21-05-20	11:00	Catalina Ordoñez	1014259721	36.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI		
21-05-20	11:02	Felipe Lopez	1073510410	36.8	N	N	N	N	N	N	N	S	N	SI	SI		
21-05-20	11:05	Elizabeth Pineda	1032450485	36.2	N	N	S	N	N	N	N	N	N	SI	SI		
21-05-20		Camilo Rosario	80228570	36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
21-05-20		Gicmar Perez	19439755	35.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI		
26 Mayo	9:15	Camilo Rosario		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	

025

ACSR Ingeniería & Proyectos S.A.S.	**ENCUESTA PREOPERACIONAL DE SALUD POSTERIOR A CONTINGENCIA NACIONAL POR COVID 19**	VERSION 1 2020-05-27

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
22-05-20	9:39	Maria Camila Gamba		35.7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	✓	
22-05-20	9:42	Felipe lopez		36.7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	✓	
22-05-20	9:45	Hayerly Marero		36.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	✓	
22-05-20	9:48	Catalina Ordoñez		35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	✓	
22-05-20	10:5	Elizabeth Pineda		36.7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	✓	
22-05-20	10:15	Camilo Rocha		37.0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	✓	
22-05-20	10:19	Meliza Nanes		36.6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	✓	
26-May	9:00	Camila Gamba		36.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
26 May	9:02	Felipe lopez		36.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
26 May	9:10	Catalina Ordoñez		36.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	
26 May	9:15	Hayerly Marero		36.4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NO	SI	✓	

ANEXO 5. INFORMES SEMANALES

026

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 3

MARZO 21 DE 2020 – MARZO 30 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA FECHA:30 -03-2020	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA:30 -03-2020	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO FECHA: 30 -03-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

027

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 4
2.2 CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 5
4. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 6
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 6
5. ASPECTO AMBIENTAL 7
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 7
6. INFORME DE OBRA 7
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 7
7. INFORME DE CONSULTORÍA PMT 7
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 7
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 7
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 7
8. INFORME DE DISEÑO 7

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	30 de marzo de 2020	PERIODO No.	03	DEL	21/03/2020	HASTA	30/03/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	05 de septiembre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	24 días	EQUIVALE AL	10% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICIÓN(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DÍAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DÍAS TRANSCURRIDOS:	24
% DE EJECUCIÓN	7.59%
DÍAS DE RETRASO:	0
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%
DÍAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
No se emitieron oficios durante esta semana			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
No se recibieron oficios durante esta semana			

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
27/03/2020	Re: Remisión del oficio AC2R-SEM-17-2020- solicitud de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S SECRETARÍA DE MOVILIDAD
30/03/2020	Acta de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874 versión 30 marzo	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
24/03/2020	Remision del informe semanal N°2	PIV INGENIERIA
24/03/2020	Remisión del oficio AC2R-SEM-17-2020- solicitud de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874	PIV INGENIERIA
30/03/2020	Acta de suspensión del contrato de obra N° 2019-1874 versión 30 marzo	PIV INGENIERIA

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

029


	INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020

4. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

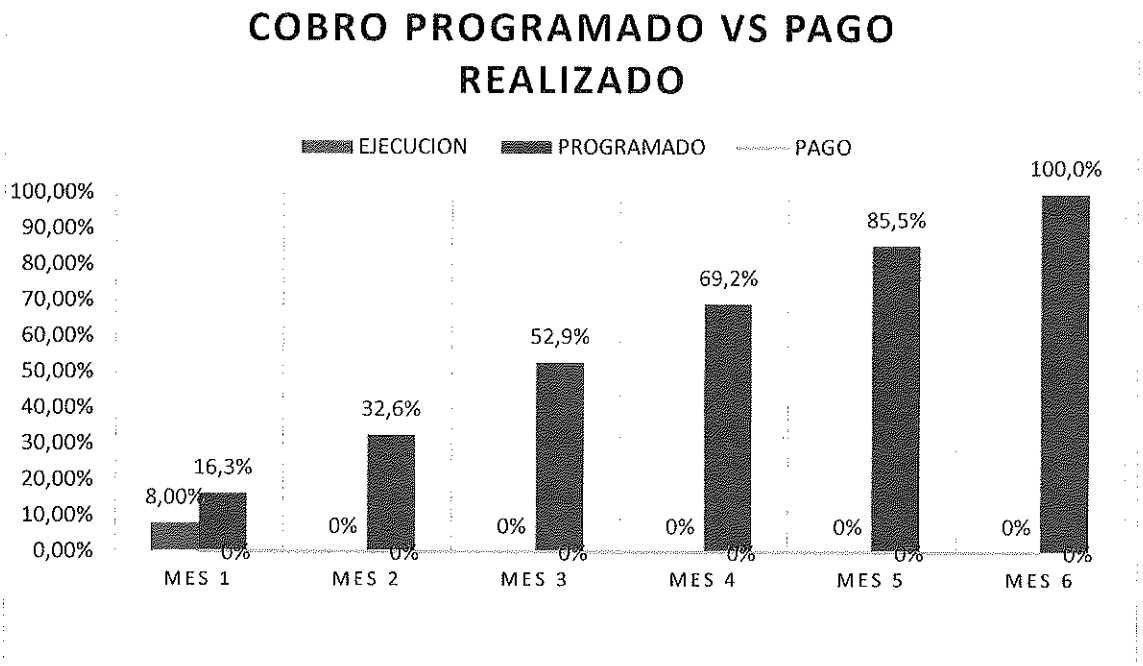

En la Semana 3, el avance programado es de un 13.5% vs un avance ejecutado real del 7.59%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	100%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	7.59%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 239.878.911

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

A la fecha no se han iniciado actividades de obra.

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de tránsito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME DE CONSULTORÍA PMT

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	PMT'S TIPICOS	1.	El 19 de marzo se realiza la radicación física de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventora

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Se realizara la radicación de 10 PMT de la orden de trabajo N° 1

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación pon la interventoría	19/03/2020	En tramite

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 4

MAYO 05 DE 2020 – MAYO 10 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
FECHA: 11 -05-2020	FECHA: 11 -05-2020	FECHA: 11 -05-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO:	CARGO:	CARGO:

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 5
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 7
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 7
5. ASPECTO AMBIENTAL 8
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 8
6. INFORME DE OBRA 9
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 9
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 9
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 9
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 10
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 10
8. INFORME DE DISEÑO 10

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	11 de mayo de 2020	PERIODO No.	04	DEL	05/05/2020	HASTA	10/05/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	29 días	EQUIVALE AL	15.7% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	29
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	11
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	6%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
No se enviaron oficios durante esta semana			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
7/05/2020	PIV-IMS-20191810-0139	Solicitud de cronograma de obra	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
7/05/2020	PIV-IMS-20191810-0140	Su comunicación AC2R-SEM-20-2020 del 22 de abril, recibida por correo electrónico el 27 de abril de 2020, solicitud de aprobación de precios no previstos, motivada por pandemia COVID-19	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
05/05/2020	PMT.zip	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/05/2020	PMT no accesible	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
06/05/2020	Acta de reinicio No.1 firmada por las partes Cto. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
07/05/2020	CRONOGRAMA DE OBRA CTO. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/05/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-0140 Precios Unitarios no previstos	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
05/05/2020	Re: PMT.zip	PIV INGENIERIA
07/05/2020	CRONOGRAMA DE OBRA CTO. 2019-1874	PIV INGENIERIA
08/05/2020	PMT TIPICOS	PIV INGENIERIA
08/05/2020	Cronograma de obra	PIV INGENIERIA

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO

	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO


	INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

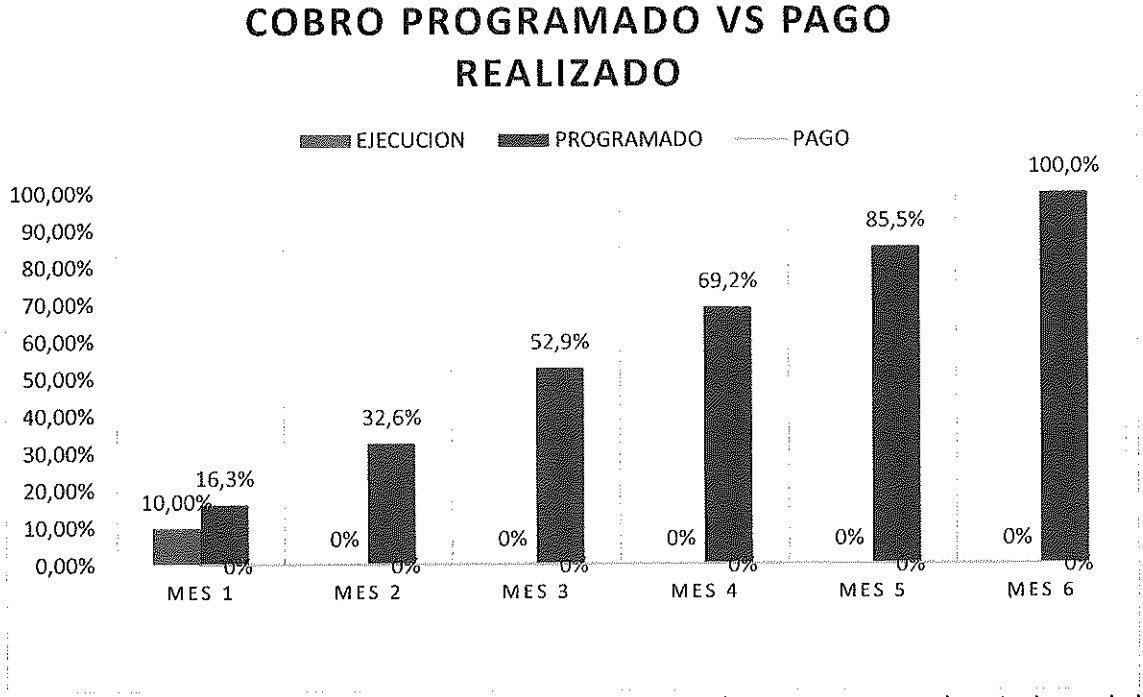

En la Semana 4, el avance programado es de un 15.7% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	15.7%

VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 498.115.976
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

Insumos Plan De Aplicación Del Protocolo Sanitario Para La Obra (PAPSO)

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 se realizó la compra de implementos de aseo y otros EPI para dotar al personal y dar cumplimiento al **Plan De Aplicación Del Protocolo Sanitario Para La Obra (PAPSO)**

Compra de insumos de aseo y otro elemento de bioseguridad para implementación de Protocolos de Bioseguridad

- Gel antibacterial OVI
- Jabón antibacterial OVI
- Hipoclorito de sodio al 5.25 %
- Alcohol al 70%
- Detergente
- Toallas de único uso
- Tapaboca industrial
- Polainas
- Careta de protección facial
- Termómetro infrarrojo

Suministro de elementos de bioseguridad personal de oficina


Se realizó entrega de los elementos de protección al personal de oficina relacionado a continuación:

Nombre	Cargo	EPI	Fecha
Camilo Rosario	Rep. Legal	-Careta de protección facial -Tapabocas -Polainas	07 Mayo
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	-Careta de protección facial -Tapabocas -Polainas	07 Mayo
Felipe López	Aux. Administrativo	-Careta de protección facial -Tapabocas -Polainas	07 Mayo
Elizabeth Pineda	Aux. SST	-Careta de protección facial	07 Mayo

		-Tapabocas -Polainas	



Suministro de polainas

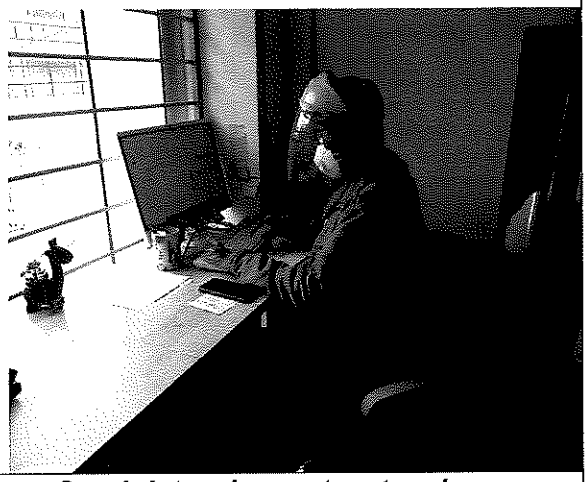

Suministro de careta y tapabocas

Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 – V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19

Diario- Charlas de bioseguridad
08 de mayo - Divulgación de protocolos de bioseguridad personal oficina
08 de mayo – Divulgación y publicación de protocolo de lavado de manos
08 de mayo - Divulgación y publicación medidas de prevención COVID-19

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de transito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 4 de Mayo de 2020

2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		El 23 de abril se realiza la radicación virtual de los PMT´S típicos, para aprobación de la interventoría, se reciben observaciones el 8 de Mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Atender observaciones generadas por la interventoría y radicar ante SDM.

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	En tramite
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME SEMANAL No. 5

MAYO 11 DE 2020 – MAYO 17 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GÓMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
FECHA: 18 -05-2020	FECHA: 18 -05-2020	FECHA: 18 -05-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

036

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 6
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 7
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 8
5. ASPECTO AMBIENTAL 8
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 8
6. INFORME DE OBRA 12
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 12
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 12
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 12
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 12
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 12
8. INFORME DE DISEÑO 13

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	18 de mayo de 2020	PERIODO No.	05	DEL	11/05/2020	HASTA	17/05/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRÉS ROSÁRIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTÁ CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	35 días	EQUIVALE AL	19% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICIÓN(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DÍAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DÍAS TRANSCURRIDOS:	35
% DE EJECUCIÓN	10%
DÍAS DE RETRASO:	17
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	9%
DÍAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
12-05-2020	AC2R-SEM-19-2020	Solicitud de tiempos de respuesta oportunos en PMT típicos y específicos, y trazabilidad de envió de información	IVÁN GARCÍA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES – LUZ DARY VÁSQUEZ **PIV INGENIERÍA S.A.S**
22/04/2019	AC2R-SEM-20-2020	Solicitud motivada por pandemia COVID -19	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERÍA S.A.S**
13/05/2020	AC2R-SEM-20-2020	Solicitud de comité de especialistas en transito	LEYDY TATIANA BORDA **SECRETARIA DE MOVILIDAD** IVÁN GARCÍA DE ANGULO
14/05/2020	AC2R-SEM-21-2020	Presentación de los vehículos	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERÍA S.A.S**
14/05/2020	AC2R-SEM-22-2020	Presentación de personal operativo	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERÍA S.A.S**
14/05/2020	AC2R-SEM-23-2020	Remisión de pólizas	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERÍA S.A.S**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
19/05/2020	PIV-IMS-20191810-0456	Presentación vehículos con comunicación AC2R-SEM-21-2020	CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**
11-05-2020	PIV-IMS-20191810-0143	Alcance comunicado PIV-IMS-20191810-0143	CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**
13/05/2020	PIV-IMS-20191810-0144	Oficio AC2R-SEM-19-2020. Solicitud de tiempos de respuesta oportunos en PMT típicos y específicos, y trazabilidad de envío de información. Recibido el 12 de mayo a las 16:14 horas.	CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
11/05/2020	Observaciones PMT típicos	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
11/05/2020	Solicitud de estado de aprobación de PMT general	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
13/05/2020	PLAN DE CALIDAD CONTRATO 20199-1874	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
13/05/2020	Respuesta a comunicado AC2R-SEM-19-2020	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
14/05/2020	Su comunicado AC2R-SEM-20-2020	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
14/05/2020	Presentación de vehículos	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
11/05/2020	Solicitud de estado de aprobación de PMT general	PIV INGENIERÍA
12/05/2020	Remisión oficio AC2R-SEM-19-2020	PIV INGENIERÍA

038

13/05/2020	Respuesta a oficio PIV-IMS-20191810-0147	PIV INGENIERÍA
14/05/2020	Presentación de vehículos	PIV INGENIERÍA
14/05/2020	presentación del personal operativo	PIV INGENIERÍA
14/05/2020	adjunto carta de respuesta	PIV INGENIERÍA
14/05/2020	Pólizas actualizadas	PIV INGENIERÍA
15/05/2020	SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE REPLANTEO	PIV INGENIERÍA

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

PÓLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO


PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

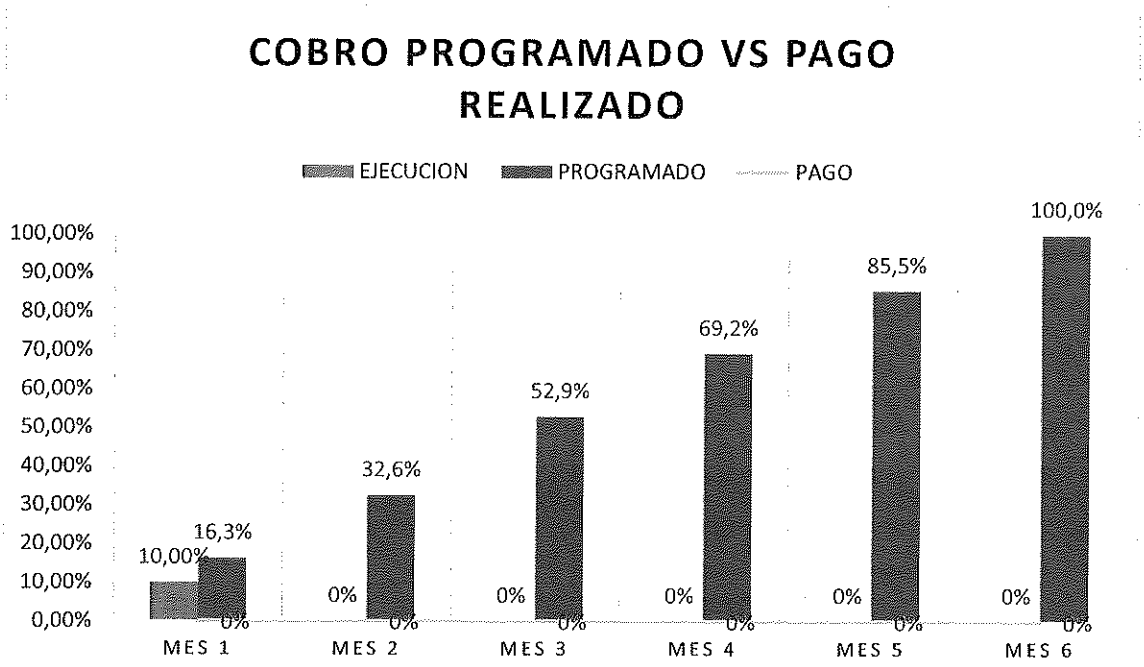

En la Semana 5, el avance programado es de un 19% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	19%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 601.174.454
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina usará transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular

María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19

11 al 17 de mayo - Diario- Charlas de bioseguridad
18 de mayo - Publicación y divulgación Circular interna 001 de 30 de abril de 2020 – COMUNICADO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19

CIRCULAR INTERNA 001

PARA: PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES, PERSONAL OPERATIVO, CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
DE: AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS
ASUNTO: COMUNICADO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19
FECHA: 30 ABRIL 2020

Cordial saludo,

En cumplimento a la circular 003 del 08 de abril de 2020 emitida en conjunto por El Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Transporte y el Ministerio del Trabajo en la cual se establecen las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19 en todo el sector de infraestructura, la empresa AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, se permite comunicar las medidas de carácter preventivo frente al coronavirus las cuales serán de obligatorio cumplimientos por parte de todo el personal al cual se dirige la presente circular.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. **INTERACCION SOCIAL:** Evitar la asistencia e interacción en lugares con aglomeraciones de personas que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas y contagiosas.
2. **HIDRATACIÓN**: Consumir agua frecuentemente.


040

3. **INFORMARSE**: Orientar a los trabajadores que se informen acerca de la prevención únicamente de fuentes oficiales y evitar la divulgación de información que proyecte miedo o pánico generalizado.
4. **HIGIENE PERSONAL**: lavado de manos mínimo cada 03 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo o cada _ labor. Secado con toallas de un solo uso (personal de cada trabajador), evitar tocarse la cara o la nariz.
   El lavado de manos debe durar de 20 a 30 segundos. Si no cuenta con un sitio para hacer el lavado de manos cuente con un kit que contenga alcohol glicerinado o toallas desinfectantes
5. **PREVENCION**: Si hay personal con resfriado, tos, gripa o presenta síntomas como fiebre o dificultad para respirar no deben presentarse al trabajo, reportar al jefe inmediato su condición y reintegrarse a la labor una vez este recuperado presentado los registros médicos correspondientes.
6. **SALUDO**: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos ni abrazos.
7. **PUESTOS DE TRABAJO LIMPIOS**: Organizar documentos, archivar, mantener el escritorio libre y despejado para facilitar las labores de limpieza.
8. **VEHÍCULOS**: limpiar con desinfectantes o alcohol al 70% las partes de contacto común, sillas, volante, controles, mandos, operar con vidrios cerrados
9. **OFICINAS VENTILADAS**: Ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos, no usar aire acondicionado.
10. **DISTANCIA**: Procurar conservar distancia aproximada de 1.5 m con los demás compañeros y colaboradores
11. **RECURSOS**: Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo dispuestos en el centro de trabajo, gel, alcohol, papel, toallas, etc. Y evitar el desperdicio del agua (uso eficiente).
12. **REUNIONES**: Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente necesario convocar máximo a 15 personas, dejar una illa intermedia, mantener distancia mínima de 1,5 m entre personas, mantener las salas abiertas y ventiladas.
13. **CAPACITACIONES**: Desarrollar sesiones escalonadas con número de personas acorde al lugar, evitar aglomeraciones, mantener distancia mínima de 1,5 m entre personas, usar espacios abiertos o ventilados.

SE PROHÍBE EL INGRESO DE PERSONAL AJENO A LA OBRA

Agradecemos su atención y esperamos que con la colaboración de todos, podamos contribuir al correcto manejo de esta situación de salud pública.


ING.CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.



Circular interna 001

Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

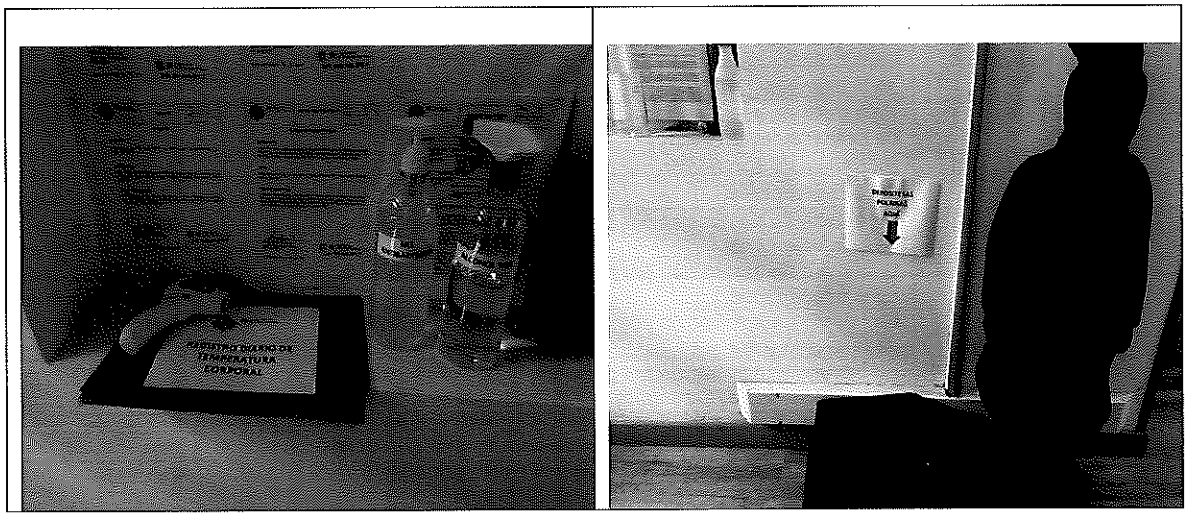

Registro diario de temperatura corporal	***Disposición de polainas***

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de tránsito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se encuentran en trámite la atención de las observaciones generadas por la interventoria

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Atender observaciones generadas por la interventoria y radicar ante SDM.

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM'S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	En tramite
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite

11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME SEMANAL No. 6

MAYO 18 DE 2020 – MAYO 24 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA FECHA: 25 -05-2020	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 25 -05-2020	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO FECHA: 25 -05-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 5
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 7
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 8
5. ASPECTO AMBIENTAL 8
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 8
6. INFORME DE OBRA 10
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 10
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 10
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 10
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 11
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 11
8. INFORME DE DISEÑO 11

044

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	25 de mayo de 2020	PERIODO No.	06	DEL	18/05/2020	HASTA	24/05/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	41 días	EQUIVALE AL	22.2% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	41
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	23
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	12%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
20/05/2020	AC2R-SEM-24-2020	Respuesta a los oficios N° PIV-IMS-2019-1810-0143 y N° PIV -IMS-1810-0140 y presentación de NP-01, NP-02, NP-03,NP-05,NP-06,NP-07,NP-8, NP-09.	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
20/05/2020	AC2R-SEM-25-2020	Atención de observaciones presentación de personal operativo	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
20/05/2020	AC2R-SEM-26-2020	Solicitud de estado de aprobación Protocolo de Bioseguridad	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
21/05/2020	AC2R-SEM-27-2020	Presentación de profesionales	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
22/05/2020	AC2R-SEM-28-2020	Presentación de vehículos	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
19/05/2020	PIV-IMS-20191810-0156	Presentación vehículos con comunicación AC2R-SEM-21-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/05/2020	PIV-IMS-20191810-0157	Presentación personal operativo adicional al establecido en el numeral 5.1 con comunicación AC2R-SEM-22-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19-05-2020	PIV-IMS-20191810-0158	Alcance a la comunicación PIV-IMS-20191810-0157	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
19/05/2020	Respuesta presentación del personal operativo	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
18/05/2020	parafiscales	PIV INGENIERIA
20/05/2020	Oficio, N° AC2R-SEM-25-2020	PIV INGENIERIA
20/05/2020	respuesta RESPUESTA A LOS OFICIOS N°PIV-IMS-2019-1810-0143 Y N°PIV-IMS- 1810-0140, Y PRESENTACIÓN DE NP-01,NP-02,NP-03,NP-04,NP-05,NP-06,NP07,NP08,NP09.	PIV INGENIERIA
20/05/2020	Oficio N° AC2R-SEM-26-2020	PIV INGENIERIA
21/05/2020	presentacion de profesionales	PIV INGENIERIA
22/05/2020	Respuesta oficio PIV-IMS-20191810-0156	PIV INGENIERIA

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020

ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

PÓLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020


4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

046

COBRO PROGRAMADO VS PAGO REALIZADO

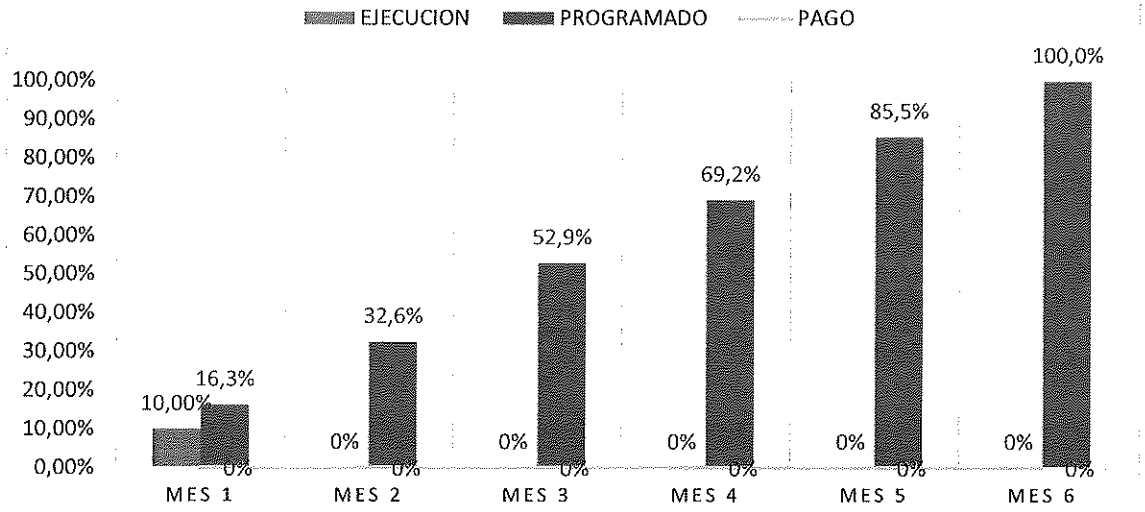

En la Semana 6, el avance programado es de un 22.2% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	22.2%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 704.232.932
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular


María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19

Diario- Charlas de bioseguridad
Socialización de área de cuidado en salud

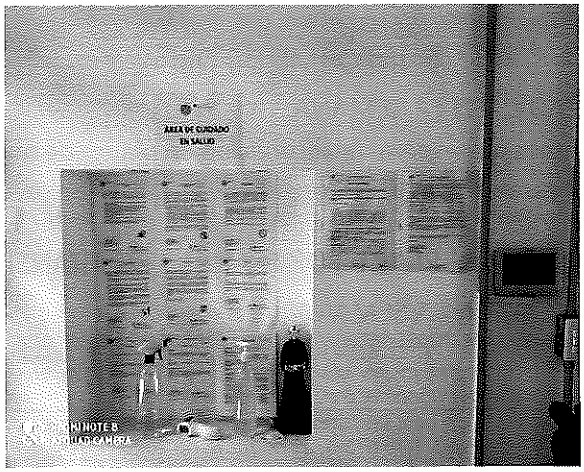

Área de cuidado en salud

Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

047



Registro diario de temperatura corporal



Disposición de polainas

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de transito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se entregan las observaciones N°2 atendidas el día 18 de mayo de 2020 y las observaciones N°3 el 22 de mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se entregan las observaciones atendidas el día 21 de mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	En tramite
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.




CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 7

MAYO 25 DE 2020 – MAYO 31 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA FECHA: 01 -06-2020	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 01 -06-2020	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO FECHA: 01 -06-2020
 FIRMA:	 FIRMA:	 FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 6
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 7
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 8
5. ASPECTO AMBIENTAL 8
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 8
6. INFORME DE OBRA 10
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 10
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 10
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 10
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 10
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 10
8. INFORME DE DISEÑO 11

050

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	01 de junio de 2020	PERIODO No.	07	DEL	25/05/2020	HASTA	31/05/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	47 días	EQUIVALE AL	25.5% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	47
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	29
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	16%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
26/05/2020	AC2R-SEM-29-2020	Solicitud de reconocimiento	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S**
	AC2R-SEM-30-2020	Oficio anulado	
29/05/2020	AC2R-SEM-31-2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra N° 2019-1874 y solicitud de comité técnico	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR – SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO - LADY TATIANA BORDA - **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
28/05/2020	PIV-IMS-2019-1810-0165	Respuesta a la comunicación AC2R-SEM-24-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
29/05/2020	PIV-IMS-2019-1810-0167	Incumplimiento entrega plan de calidad -Contrato N°2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
28/05/2020	Respuesta a la comunicación AC2R-SEM-24-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
28/05/2020	Invitation: Contrato de Obra 2019-1874 @ Mon Jun 1, 2020 3:15pm - 3:55pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
28/05/2020	Re: Nueva hora propuesta: Contrato de Obra 2019-1874 lun 1 de jun de 2020 3:15pm - 3:55pm (COT) (Sandra Patricia Giraldo Clavijo)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
29/05/2020	Invitación: Comité de Obra mar 2 de jun de 2020 8am - 9am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
30/05/2020	Incumplimiento entrega Plan de Calidad – Contrato N. 2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
26/05/2020	remision oficio AC2R-SEM-029-2020	PIV INGENIERIA
29/05/2020	REMISIÓN DEL OFICIO 31 TRAZABILIDAD DE HECHOS QUE HAN GENERADO LA DILATACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N°2019- 1874 Y SOLICITUD DE COMITÉ TECNICO	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO

3. ASPECTO JURÍDICO

4. LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

	SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO


EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

COBRO PROGRAMADO VS PAGO REALIZADO

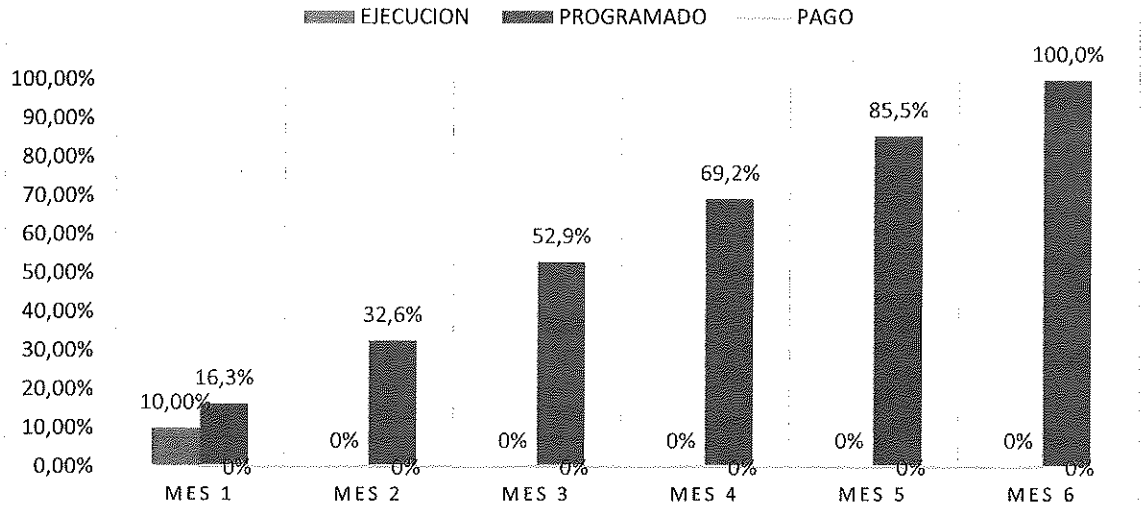

En la Semana 7, el avance programado es de un 25.5% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	25.5%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 807.291.410
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte


Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19


Diario- Charlas de bioseguridad
– Socialización de área de cuidado en salud

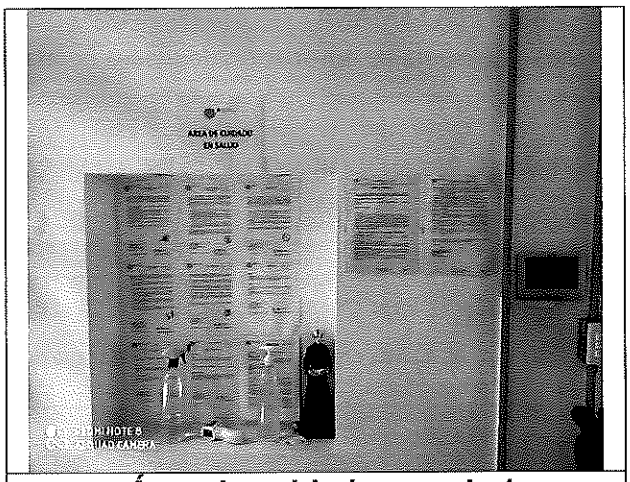

Área de cuidado en salud

Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

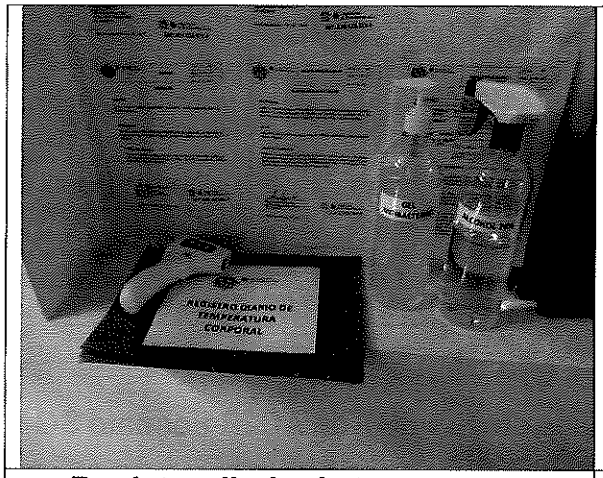

Registro diario de temperatura corporal



Disposición de polainas

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de tránsito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN	SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN

1.	PTM'S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

05
