CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL No. 3

JUNIO 01 DE 2020 – JULIO 05 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GÓMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
FECHA 06 -07-2020	FECHA: 06-07-2020	FECHA: 06-07-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

001

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MOVILIDAD

Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.

2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1 ANTECEDENTES 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 6
4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 7
4.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 10
5. ASPECTO JURÍDICO 16
6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 17
6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 18
7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18
7.1 INTRODUCCIÓN 18
7.2 OBJETIVOS 19
7.2.1 OBJETIVO GENERAL 19
7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 19
7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 19
7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO 19
7.4. ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20
7.4.1 REGISTRO DE PERSONAL VINCULADO 20
7.4.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 20
7.4.3 CONTRATISTA GYG 20
7.4.4 CONTRATISTA PH 20
7.5 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS 20
7.6 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 21
7.7. CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL 21
7.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 22
7.8.1 INDUCCIÓN A TRABAJADORES NUEVOS 22

002

7.8.2 CAPACITACIONES REALIZADAS 22
7.9. ACTIVIDADES –PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 22
7.10. PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 23
7.11 SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 23
7.12 EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 24
7.13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 24
7.13.1 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 24
7.13.2 VEHICULOS 24
7.13.3 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT'S 24
7.14. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 24
7.15. ACTIVIDADES DE HIGIENE INSDUTRIAL 25
7.15.1. UNIDADES SANITARIAS 25
7.15.2. LAVAMANOS 25
7.16. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL 25
7.16.1. INSCRIPCION DEL PROYECTO ANTE LA SDA 25
7.16.2. DISPOSICION FINAL DE RCD 25
7.17. REGISTRO FOTOGRÁFICO 25
8. INFORME DE OBRA 25
8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 25
9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 25
9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 25
9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 27
9.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 27
10. INFORME DE DISEÑO 27
11. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 27

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Realizar el diseño de intersecciones de acuerdo a las priorizaciones establecidas en la Entidad e indicadas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas".
- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Atender las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo de la red semafórica existente.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" - Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

Con el objeto de contratar el diseño y construcción, de las obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento el sistema de semaforización de Bogotá D.C., incluyendo diseño semafórico de intersecciones para la implementación de nuevos controles semaforizados. Le adjudico a la empresa **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S** el contrato mediante la **Resolución N° 259 del 26 de DICIEMBRE de 2019**, cuyo objeto es: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."**

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de la red semafórica existente y donde se requiera nueva semaforización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal de la ciudad.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	06 de julio de 2020	PERIODO No.	03	DEL	01/06/2020	HASTA	06/07/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	79 días	EQUIVALE AL	52.9% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	79
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	64
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	42.9%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	01/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

4.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1/06/2020	AC2R-SEM-32-2020	Presentación de calidad	CIRO JIMENEZ - JORGE A. WILCHES S. **PIV INGENIERIA S.A.S.**
3/06/2020	AC2R-SEM-33-2020	Conciliación ejecución contrato de obra N° 2019-1874	ALVARO JOSE GIRALDO CADAVID **PERSONERO DELEGADO MOVILIDAD**
09/06/2020	AC2R-SEM-34-2020	Respuesta al oficio PIV-IMS-20191810-0165	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
11/06/2020	AC2R-SEM-35-2020	Comentarios técnicos oficio PIV-IMS-0185-2020	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
11/06/2020	AC2R-SEM-36-2020	Remisión de documentos- seguridad industrial-medio ambiente	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
11/06/2020	AC2R-SEM-37-2020	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. 2019-1874	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
16/06/2020	AC2R-SEM-38-2020	Presentación de vehículo para traslado de personal administrativo	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
16/06/2020	AC2R-SEM-39-2020	Solicitud de aprobación de no previstos y aprobación del protocolo de bioseguridad	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
18/06/2020	AC2R-SEM-40-2020	Presentación plan de manejo ambiental – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
17/06/2020	AC2R-SEM-41-2020	Presentación plan de SST – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
18/06/2020	AC2R-SEM-42-2020	Atención de observaciones realizadas al plan de calidad mediante el oficio PIV-IMS-20191810-0197 y piv-ims-20191810-0176	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
19/06/2020	AC2R-SEM-43-2020	Presentación plan de RCD - PIN	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
24/06/2020	AC2R-SEM-44-2020	Presentación de informes semanales y mensuales	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
30/06/2020	AC2R-SEM-45-2020	Presentación plan de SST – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA S.A.S**
26/06/2020	AC2R-SEM-46-2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra N°2019-1874.	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR – SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO - LADY TATIANA BORDA - **SECRETARIA**

			DISTRITAL DE MOVILIDAD
30/06/2020	AC2R-SEM-47-2020	Presentación plan RCD – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA S.A.S**
30/06/2020	AC2R-SEM-48-2020	Presentación de los informes semana 8,9,10	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
30/06/2020	AC2R-SEM-48-2020	Presentación plan de manejo ambiental – atención de observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA S.A.S**
01/07/2020	AC2R-SEM-49-2020	Respuesta oficio PIV-IMS-20191810-0207 y SDM - SEMA-95473-2020	
01/07/2020	AC2R-SEM-50-2020	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN DE CALIDAD MEDIANTE EL OFICIO	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
03/07/2020	AC2R-SEM-51-2020	PRESENTACION PLAN DE RCD – PIN	IVAN GARCIA DE ANGULO PIV INGENIERIA S.A.S
03/07/2020	AC2R-SEM-52-2020	PRESENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – ATENCION OBSERVACIONES	IVAN GARCIA DE ANGULO PIV INGENIERIA S.A.S
04/07/2020	AC2R-SEM-54-2020	CAMBIO DE BODEGA	IVAN GARCIA DE ANGULO, JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
04/07/2020	AC2R-SEM-55-2020	PRESENTACION DE LOS INFORMES SEMANA 11	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
04/07/2020	AC2R-SEM-56-2020	RESPUESTA PROGRAMACION	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1/06/2020	PIV-IMS-2019-1810-0168	Remisión orden de trabajo N°2	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
4/06/2020	PIV-IMS-20191810-0176	Revisión plan de calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0180	Solicitud del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST) y plan de gestión ambiental (PGA)	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
8/06/2020	PIV-IMS-20191810-0186	Su comunicación AC2R-SEM-029-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0178	Eliminación de la intersección Auto sur con carrera 67 con numero externo 3810 la orden de trabajo N°1	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0179	Numeral 6.2 del anexo técnico. Vehículo para el traslado de personal administrativo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
7/06/2020	PIV-IMS-0185-2020	Comunicado AC2R-SEM-31-2020 de 29 de mayo de 2020	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO

			SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
10/06/2020	PIV-IMS-20191810-190	Su comunicación AC2R-SEM-034-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-193	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – Plan SST	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-194	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – PG-RCD	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-195	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – PMA	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-196	Comunicación AC2R-SEM-34-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
17/06/2020	PIV-IMS-20191810-197	Cumplir con la presentación del Plan de calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
13/06/2020	PIV-IMS-20191810-198	Obtención del PIN que autoriza la disposición de escombros en Bogotá D.C.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-199	Numeral 6.2.1 del anexo técnico. Vehículos para el traslado de personal administrativo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/06/2020	PIV-IMS-20191810-0207	Comunicación AC2R-SEM-39-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
22/06/2020	PIV-IMS-20191810-0208	Apremio plan SST- enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020 a las 16:33	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
23/06/2020	PIV-IMS-20191810-0215	Apremio cumplimiento Plan de Calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
24/06/2020	PIV-IMS-20191810-0218	Retiro de intersección de la primera orden de trabajo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
25/06/2020	PIV-IMS-20191810-0210	Comunicado AC2R-SEM-43-2020 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PG RCD) RCD - PIN - correo electrónico del 19 de junio de 2020.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
25/06/2020	PIV-IMS-20191810-0211	Comunicado AC2R-SEM-40-2020, recibido el día 18 de junio de 2020 a las 16:31.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
02/07/2020	PIV-IMS-20191810-0234	Comunicado AC2R-SEM-47-2020 Presentación plan RCD – Atención observaciones correo electrónico del 30 de junio de 2020 a las 2:55.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
02/07/2020	PIV-IMS-20191810-0235	Comunicado AC2R-SEM-48-2020, recibido el día 30 de junio de 2020 a las 3:02.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

			AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	PIV-IMS-20191810-0239	Solicitud de actualización del cronograma de obra y presupuesto	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
10/06/2020	PIV-IMS-20191810-190	Su comunicación AC2R-SEM-034-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-193	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – Plan SST	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-194	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – PG-RCD	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-195	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – PMA	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-196	Comunicación AC2R-SEM-34-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
17/06/2020	PIV-IMS-20191810-197	Cumplir con la presentación del Plan de calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
13/06/2020	PIV-IMS-20191810-198	Obtención del PIN que autoriza la disposición de escombros en Bogotá D.C.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-199	Numeral 6.2.1 del anexo técnico. Vehículos para el traslado de personal administrativo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/06/2020	PIV-IMS-20191810-0207	Comunicación AC2R-SEM-39-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
22/06/2020	PIV-IMS-20191810-0208	Apremio plan SST- enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020 a las 16:33	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
23/06/2020	PIV-IMS-20191810-0215	Apremio cumplimiento Plan de Calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

4.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
01/06/2020	Invitación actualizada con una nota: Comité de Obra mar 2 de jun de 2020 11am - 12pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
01/06/2020	PIV-IMS-20191810-0168 ORDEN DE TRABAJO N. 2 Cto2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

03/06/2020	INSCRIPCION BOGOTA CUIDADORA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
03/06/2020	PMT KENNEDY Y BOSA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
04/06/2020	Su comunicado AC2R-SEM-32-20	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	NO EJECUTAR LA AUTOSUR CON CARRERA 67	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	Observaciones presentación vehículos	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	Solicitud Sistema de Gestión SG SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	SU COMUNICACIÓN AC2R.-SEM-027-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	Respuesta comunicación AC2R-SEM-029-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	Fwd: Respuesta a comunicación AC2R-SEM-31-2020 de 29 de mayo de 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	respuesta AC2R-SEM-031-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
09/06/2020	PIV 185 - Respuesta a AC2R-SEM-31-2020 - 200607.docx	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Respuesta OFICIO AC2R-SEM-34-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Invitación: Temas de Bioseguridad jue 11 de jun de 2020 2:30pm - 2:55pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Invitación: Temas de PMTS jue 11 de jun de 2020 3pm - 3:50pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/06/2020	Invitación: PMTS Cl 53 Contrato 2019-1874 mar 16 de jun de 2020 9am - 9:50am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/06/2020	Invitación actualizada: PMTS Contrato 2019-1874 jue 11 de jun de 2020 3:30pm - 4:20pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
12/06/2020	Invitación: Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 sáb 13 de jun de 2020 10am - 11am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
12/06/2020	Invitación actualizada: Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 sáb 13 de jun de 2020 9am - 9:40am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-193	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicado PIV-IMS-201910-194	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-195	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

16/06/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-0198	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Invitación: SOLICITUD DE COORDINACIÓN POR RESERVA DE INTERVENCIÓN mié 17 de jun de 2020 9am - 10am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Invitación actualizada: SOLICITUD DE COORDINACIÓN POR RESERVA DE INTERVENCIÓN jue 18 de jun de 2020 10am - 11am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Oficio AC2R-SEM-38-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0196	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Solicitud Plan de Calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/06/2020	Comunicado PIV-ISM-20191810-0207	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
23/06/2020	Apremio plan SST – enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	EXCLUSION INTERSECCIONES ORDEN DE TRABAJO N. 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-02015- Plan de calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
25/06/2020	Fwd: FABRICACION DE TAPAS CAJAS DE PASO	PIV INGENIERIA
19/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
30/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra No. 2019-1874- SDM-SEMA-95473-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud capacitación RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud apertura de PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0234	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0235	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Solicitud programa obra e inversión	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
03/07/2020	Fwd: Construcción de vados en intersecciones Radicado SDM-92407-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	Respuesta comunicación AC2R-SEM-029-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	Fwd: Respuesta a comunicación AC2R-SEM-31-2020 de 29 de mayo de 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	respuesta AC2R-SEM-031-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
09/06/2020	PIV 185 - Respuesta a AC2R-SEM-31-2020 - 200607.docx	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

10/06/2020	Respuesta OFICIO AC2R-SEM-34-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Invitación: Temas de Bioseguridad jue 11 de jun de 2020 2:30pm - 2:55pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Invitación: Temas de PMTS jue 11 de jun de 2020 3pm - 3:50pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/06/2020	Invitación: PMTS Cl 53 Contrato 2019-1874 mar 16 de jun de 2020 9am - 9:50am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/06/2020	Invitación actualizada: PMTS Contrato 2019-1874 jue 11 de jun de 2020 3:30pm - 4:20pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
12/06/2020	Invitación: Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 sáb 13 de jun de 2020 10am - 11am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
12/06/2020	Invitación actualizada: Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 sáb 13 de jun de 2020 9am - 9:40am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-193	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicado PIV-IMS-201910-194	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-195	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-0198	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Invitación: SOLICITUD DE COORDINACIÓN POR RESERVA DE INTERVENCIÓN mié 17 de jun de 2020 9am - 10am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Invitación actualizada: SOLICITUD DE COORDINACIÓN POR RESERVA DE INTERVENCIÓN jue 18 de jun de 2020 10am - 11am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Oficio AC2R-SEM-38-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0196	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Solicitud Plan de Calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/06/2020	Comunicado PIV-ISM-20191810-0207	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
23/06/2020	Apremio plan SST – enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	EXCLUSION INTERSECCIONES ORDEN DE TRABAJO N. 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-02015- Plan de calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

25/06/2020	Fwd: FABRICACION DE TAPAS CAJAS DE PASO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
30/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra No. 2019-1874- SDM-SEMA-95473-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud capacitación RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud apertura de PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0234	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0235	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Solicitud programa obra e inversión	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
03/07/2020	Fwd: Construcción de vados en intersecciones Radicado SDM-92407-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0196	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Solicitud Plan de Calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/06/2020	Comunicado PIV-ISM-20191810-0207	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
23/06/2020	Apremio plan SST -- enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	EXCLUSION INTERSECCIONES ORDEN DE TRABAJO N. 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-02015- Plan de calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
25/06/2020	Fwd: FABRICACION DE TAPAS CAJAS DE PASO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
24/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
30/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra No. 2019-1874- SDM-SEMA-95473-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud capacitación RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud apertura de PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0234	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0235	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Solicitud programa obra e inversión	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

03/07/2020	Fwd: Construcción de vados en intersecciones Radicado SDM-92407-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
01/06/2020	Presentación de Plan de Calidad	PIV INGENIERIA
02/06/2020	Acuso no recibido observaciones o visto bueno por parte de interventoria a PMT´S especificos	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO PIV INGENIERIA
08/06/2020	PIV-IMS-20191810-0168 ORDEN DE TRABAJO N. 2 Cto2019-1874	PIV INGENIERIA
09/06/2020	INSCRIPCION BOGOTA CUIDADORA	PIV INGENIERIA
09/06/2020	OFICIO AC2R-SEM-34-2020	PIV INGENIERIA
10/06/2020	Oficio de aprobación al plan de movilidad segura	PIV INGENIERIA
11/06/2020	Oficio AC2R-SEM-35-2020	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO PIV INGENIERIA
11/06/2020	Presentación de documentos requeridos SST-MA	PIV INGENIERIA
11/06/2020	Información Referente PIGA- Secretaría de Movilidad	LEIDY TATIANA – SECRETARIA DE MOVILIDAD
16/06/2020	Oficio AC2R-SEM-38-2020	PIV INGENIERIA
16/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-39-2020	PIV INGENIERIA
17/06/2020	Contrato de obra 2019--1874 SDM - Semaforización	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS
17/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-41-2020	PIV INGENIERIA
18/06/2020	Programacion	JHON JAIRO BONILLA ALVAREZ
18/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-40-2020	PIV INGENIERIA
19/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-43-2020	PIV INGENIERIA
19/06/2020	Solicitud de replanteo KR 7 x AC 53	PIV INGENIERIA
19/06/2020	Acta de coordinación de obras de mantenimiento Calle 53	JHON JAIRO BONILLA ALVAREZ
23/06/2020	PIN contrato 2019-1874	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS
24/06/2020	Informes semanales y mensuales	PIV INGENIERIA
25/06/2020	Solicitud de comunicación telefónica	PIV INGENIERIA
26/06/2020	TRAZABILIDAD DE HECHOS QUE HAN GENERADO LA DILATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 2019-1874.	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO LEYDY TATIANA BORDA JONNY LEONARDO VASQUEZ

27/06/2020	Solicitud apertura de PIN	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS
02/07/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	PIV INGENIERIA

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO


PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

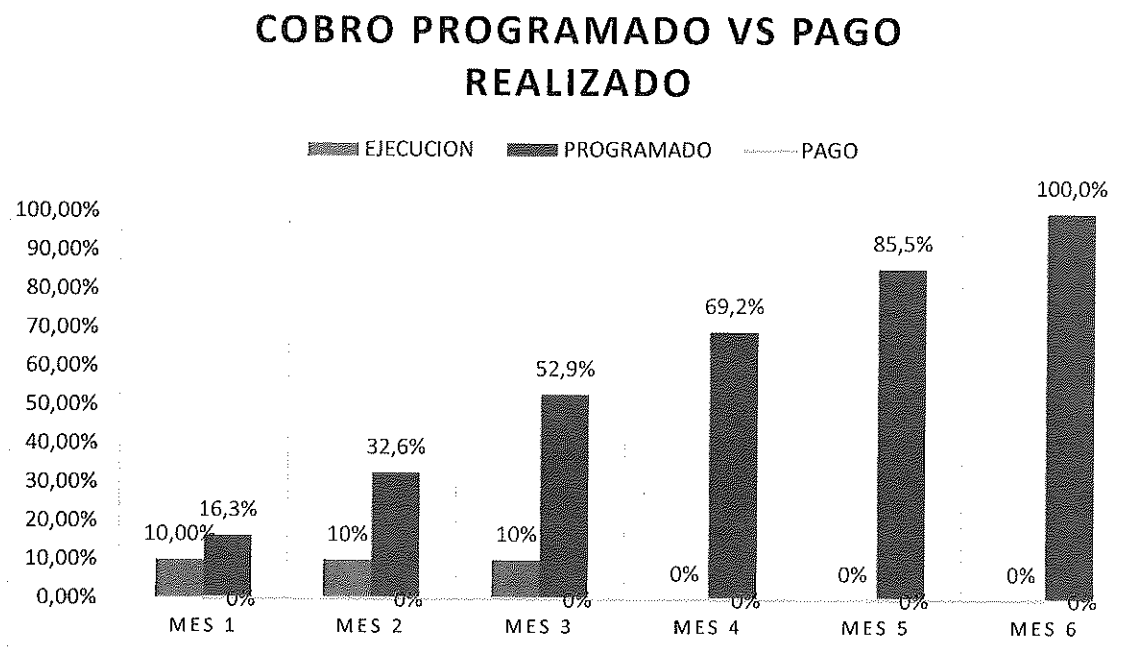

En el mes 3, el avance programado es de un 52,9% vs un avance ejecutado real del 10%.

6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	52,9%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 1.671.883.334
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describen las actividades referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra N° 2019-1874 cuyo objeto es el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C

Este informe comprende las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 05 de julio de 2020.

7.2 OBJETIVOS

7.2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades implementadas en los frentes de obra para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, las medias de manejo ambiental y PG – RCD acorde con los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio Ambiente en el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra pública 2019-1974.

7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Velar por el cumplimiento el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo durante los trabajos ejecutados.

Implementar planes de mejora con el fin de identificar y mitigar los riesgos presentes en la ejecución del proyecto.

Describir las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los compromisos contractuales y la normatividad ambiental aplicable.

Verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato de obra 2019-1874.

7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseño y construcción de obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento de las obras civiles para el sistema de semaforización de Bogotá DC y contiene de manera general para su ejecución la Formulación y tramites de planes de manejo de tráfico, Localización, verificación y replanteo, Estudio y trazado de redes existentes, Implementación planes de manejo de tráfico, Demoliciones, Excavaciones, Perforaciones y Construcción.

7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 no se ejecutaron actividades constructivas o de mantenimiento.

7.4. ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST trazado para el contrato de Obra No. 2019-1874 AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S llevo a cabo las siguientes actividades:

7.4.1 REGISTRO DE PERSONAL VINCULADO

El Personal vinculado en el área administrativa y operativa para la ejecución del contrato se relaciona a continuación:

7.4.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO

N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Edwin García	Director de Obra	Compensar	Porvenir	Positiva
2	Meliza Janes	Residente de Obra	Compensar	Colpensiones	Bolívar
3	Camila Gamba	Aux. de Ingeniería	Compensar		Bolívar
4	Stella Pineda	Tec. Ing. SISO	Sanitas	Protección	Bolívar

7.4.3 CONTRATISTA GYG

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 no hubo ingreso de personal operativo del Contratista GYG Asociados SAS, debido a que no se han iniciado las actividades constructivas o de mantenimiento

7.4.4 CONTRATISTA PH

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio no hubo ingreso de personal operativo de *PH* Ingeniería De Perforaciones Horizontales S.A.S, debido a que no se han iniciado las actividades constructivas o de mantenimiento.

7.5 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

Todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todos los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, que implica la afiliación y pago de cotizaciones mensuales.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio, se vigiló y aseguró que el personal activo del presente contrato cuenta con las afiliaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social – SGSS.

El personal activo durante este periodo se relaciona el en el ***numeral 5***. *Registro de personal vinculado*, del presente informe. Las afiliaciones, pagos de seguridad social y certificado de pago de parafiscales y seguridad social se evidencian en el ***Anexo 1. Planilla Seguridad Social.***

7.6 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

Los exámenes de ingreso, son aquellos que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio no se realizaron exámenes médicos de ingreso.

7.7. CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL

Según lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 3701 Guía para la Clasificación, Registro Y Estadística De Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales , se toma una constante de 200000 horas hombre de exposición (100 trabajadores X 8horas diarias X 5 días de la semana x 50 semanas).

N° AT : Número de días de incapacidad por AT

HHT : Horas hombre trabajadas en el periodo

K: Constante según VTC 3701 = 200000

IF: Índice de frecuencia de accidentalidad

IS: Índice de severidad de accidentalidad.

ILI: Índice de lesiones incapacitantes

a. IF: Índice de frecuencia

Evalúa y presenta los resultados de la frecuencia de los eventos, se puede hacer frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades de origen común, etc.

Relaciona el número total de eventos por ejemplo con tiempo perdido con respecto al total de horas-hombre-trabajadas durante el período y se expresa en cantidad de accidentes en una constante definida como K.

I.F = (Número de lesiones incapacitantes / Horas-Hombre- trabajadas en el período) * K

b. I.S: Índice de severidad

La gravedad o severidad de los eventos se mide mediante los días perdidos que a su vez se compone de dos factores: los días de incapacidad y los días cargados.

.G: (Número de días perdidos / Horas-hombre-trabajadas en el período) * K

INDICES	ENFERMEDAD COMUN	ACCIDENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD LABORAL	OBSERVACIONES
INDICE DE FRECUENCIA	0	0	0	
INDICE DE SEVERIDAD	0	0	0	
INDICE LESIONES INCAPACITANTES	0	0	0	
TASA DE INCIDENCIA (eventos nuevos)	0	0	0	
TASA DE PREVALENCIA (eventos nuevos y antiguos)	0	0	0	

7.8. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

7.8.1 INDUCCIÓN A TRABAJADORES NUEVOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio no se realizaron capacitaciones de inducción ya que no hubo ingreso de personal nuevo al equipo de trabajo.

7.8.2 CAPACITACIONES REALIZADAS

- Diario- Charlas de bioseguridad

7.9. ACTIVIDADES –PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 se realizó la compra de implementos de aseo y otros EPI para dotar al personal y dar cumplimiento al **Plan De Aplicación Del Protocolo Sanitario Para La Obra (PAPSO)** se realizó compra de insumos de aseo y otro elementos de bioseguridad para implementación de Protocolos de Bioseguridad

- Gel antibacterial OVI
- Jabón antibacterial OVI
- Hipoclorito de sodio al 5.25 %
- Alcohol al 70%

- Detergente
- Toallas de único uso
- Tapaboca industrial
- Polainas
- Careta de protección facial
- Termómetro infrarrojo

ACTIVIDADES- PROTOCOLO

- Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
- Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
- Publicación y divulgación Circular interna 001 de 30 de abril de 2020
- Limpieza y desinfección de instalaciones

El registro fotográfico de todas las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se evidencian en el ***anexo 3. Registro Fotográfico.***

7.10. PLAN DE MOVILIDAD SEGURA

Dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal que se traslada al a oficina usa transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Luz Stella Pineda	Profesional SST	Teletrabajo
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

7.11 SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.

Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP):

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,.
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

7.12 EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2020 se realizó entrega de elementos de bioseguridad al personal que está desarrollando actividades de la oficina.

Nombre	Cargo	EPI	Fecha
Camilo Rosario	Rep. Legal	-Tapabocas	3, 10, 17 y 24 de Junio
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	-Tapabocas	3, 10, 17 y 24 de Junio
Felipe López	Aux. Administrativo	-Tapabocas	3, 10, 17 y 24 de Junio
Elizabeth Pineda	Aux. SST	-Tapabocas	

7.13. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Inspección de seguridad es una técnica básica para la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es identificar las posibles deficiencias y controlar las medidas preventivas existentes, durante la ejecución de los trabajos. Las inspecciones proyectadas durante la ejecución del contrato en mención se relacionan en los siguientes numerales.

7.13.1 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran inspección de herramientas y equipos.

7.13.2 VEHICULOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran inspección de vehículos.

7.13.3 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT'S

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran implementación de PMT'S

7.14. SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 se surtió la oficina de los insumos necesarios.

7.15. ACTIVIDADES DE HIGIENE INSDUTRIAL

7.15.1. UNIDADES SANITARIAS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran el uso de unidades sanitarias en obra

7.15.2. LAVAMANOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020 no se han desarrollado actividades que requieran el uso de lavamanos en obra

7.16. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL

7.16.1. INSCRIPCION DEL PROYECTO ANTE LA SDA

El proyecto está registrado bajo el número de PIN 18616

7.16.2. DISPOSICION FINAL DE RCD

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 05 de julio de 2020, no se han desarrollado actividades constructivas o de mantenimiento que puedan generar residuos de construcción y demolición.

7.17. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de todas las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se evidencian en el ***anexo 3. Registro Fotográfico.***

8. INFORME DE OBRA

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de los planes de manejo de transito por parte de la interventoría para radicación ante SDM, y la aprobación de los no previstos presentados en ocasión de la pandemia, para iniciar con todos los elementos de protección personal para mitigar el contagio del virus COVID-19 entre nuestro personal en obra.

9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

9.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°8 (DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020

10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

9.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°9 (DEL 8 AL 15 DE JUNIO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

9.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°10 (DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

9.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°11 (DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se solicita no ejecutar esta obra
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020

3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se atienden las observaciones el día 5 de junio de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

9.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°12 (DEL 30 AL 5 DE JULIO DE 2020)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	KR 92 X CL 157C Y 158	1.	Se radica ante interventoria

9.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM
2.	ORDEN DE TRABAJO 2	1.	Radicar PMT´S ante interventoría

9.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN COOS
1.	PTM'S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	SE SOLICITO NO EJECUTAR ESTA INTERSECCION		
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020

10. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

11. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

1. El acta de inicio del contrato de obra 2019-1874 fue suscrita el 6 de marzo de 2020, a causa de la pandemia causada por el virus COVID-19 al contrato se le realizo la suspensión N°1 el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 12 de abril de 2020, por motivo de continuación del estado de emergencia se genera la suspensión

N°2 del 13 de abril de 2020 hasta el día 5 de mayo de 2020, desde el día 5 de mayo hasta el día de hoy el contrato lleva de ejecución 79 días.

2. A la fecha el contrato tiene un porcentaje de ejecución programado del 52.9%, versus el porcentaje ejecutado real es del 10%, presentando a la fecha un atraso del 42.9% de la ejecución del contrato, esto debido a las razones expuestas en los diferentes comunicados entre la interventoría y el contratista en donde se refleja que hoy no se ha iniciado la ejecución de actividades de obra.

ANEXO 1. PLANILLAS DEL PERSONAL

015

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E	16/07/2020	43853207	$1.097.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	205.600				205.600	0	0	205.600			2.056	205.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	116.400	0	0	116.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	155.200	155.200
Pensión	2	620.500	620.500
Riesgos Laborales	1	205.600	205.600
CCF	1	116.400	116.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.097.700	1.097.700

PAGADA
853

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-07	2020-06	E	16/07/2020	43853207	$1.097.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colcena	Rol/tipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014240634	SANCHEZ RUIZ DAVID RICARDO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-11	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	26.400	0	0	0	0	0
2	CC	1016021461	SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0
3	CC	1129577194	ESCOBAR CASTILLO KATHERINE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS009	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0
4	CC	80739692	GARCIA ANGULO EDWIN GONZALO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

017

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado con **CC** número **1019079604**, aportó en nombre de **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado(a) con **CC** número **1019079604** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-05** y salud **2020-05** de la siguiente manera:

Código	Nombre de Administradora																								
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiiar																0		30	$877.803	$17.600	$0	$0	Mayo - 2020	43191623	05/06/2020	N
EPS008	Compensar EPS																0		30	$877.803	$109.800	$0	$0	Mayo - 2020	43191623	05/06/2020	N
230301	Porvenir																0		30	$877.803	$26.400	$0	$0	Mayo - 2020	43191623	05/06/2020	N

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Junio de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 005-1

018

Identificación	1077425387	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3116397504
Razón Social	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS	Dirección	TRANSVERSAL 113F #64B-18	Fecha Pago	30/06/2020
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Junio-20
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	43681053	Periodo Pensión	Junio-20
Total a Pagar	$250,300	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	1	$877,803	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0		$140,500
Totales				$877,803	$140,500	$0	$0	$0	$0	$0		$140,500

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$877,803	$109,800	$0	$0		$0		$0		109800	$109,800
Totales				$877,803	$109,800	$0	$0		$0		$0		$109,800	$109,800

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDU

Fecha creación: 2020-08-18, 03:50:58 p. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 1030007641

Periodo Cotización: 202004 **Periodo Servicio:** 202004

PAGADA 2020-05-21 21:42:13.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 21/05/2020, la empresa LUZ STELLA PINEDA BUSTOS, con documento de identificación CC1026260474, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINEDA BUSTOS LUZ STELLA, con CC 1026260474, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION (ING + PROTECCION)
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!




¡El Poder de lo SIMPLE!


Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

020

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Inscripción PMS	*Inscripción PMS*
	
Area de reciclaje	*Area de reciclaje*
	
Toma diaria de temperatura	*Insumos y EPP- Bioseguridad*

	
Insumos para desinfección	*Insumos para desinfección*

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME SEMANAL No. 8

JUNIO 01 DE 2020 – JUNIO 07 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
FECHA: 8 -06-2020	FECHA: 08 -06-2020	FECHA: 08 -06-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

025

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 6
3. ASPECTO JURÍDICO 6
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 8
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 9
5. ASPECTO AMBIENTAL 9
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 9
6. INFORME DE OBRA 13
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 13
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 13
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 13
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 13
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 13
8. INFORME DE DISEÑO 14

026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	08 de junio de 2020	PERIODO No.	08	DEL	01/06/2020	HASTA	07/06/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	53 días	EQUIVALE AL	28.8% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	53
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	35
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	19%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1/06/2020	PIV-IMS-2019-1810-0168	Remisión orden de trabajo N°2	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
4/06/2020	PIV-IMS-20191810-0176	Revisión plan de calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0180	Solicitud del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST) y plan de gestión ambiental (PGA)	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
8/06/2020	PIV-IMS-20191810-0186	Su comunicación AC2R-SEM-029-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0178	Eliminación de la intersección Auto sur con carrera 67 con numero externo 3810 la orden de trabajo N°1	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0179	Numeral 6.2 del anexo técnico. Vehículo para el traslado de personal administrativo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
7/06/2020	PIV-IMS-0185-2020	Comunicado AC2R-SEM-31-2020 de 29 de mayo de 2020	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1/06/2020	PIV-IMS-2019-1810-0168	Remisión orden de trabajo N°2	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
4/06/2020	PIV-IMS-20191810-0176	Revisión plan de calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0180	Solicitud del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST) y plan de gestión ambiental (PGA)	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
8/06/2020	PIV-IMS-20191810-0186	Su comunicación AC2R-SEM-029-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0178	Eliminación de la intersección Auto sur con carrera 67 con numero externo 3810 la orden de trabajo N°1	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
5/06/2020	PIV-IMS-20191810-0179	Numeral 6.2 del anexo técnico. Vehículo para el traslado de personal administrativo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
7/06/2020	PIV-IMS-0185-2020	Comunicado AC2R-SEM-31-2020 de 29 de mayo de 2020	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
01/06/2020	Invitación actualizada con una nota: Comité de Obra mar 2 de jun de 2020 11am - 12pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S PIV INGENIERIA SECRETARIA DE MOVILIDAD
01/06/2020	PIV-IMS-20191810-0168 ORDEN DE TRABAJO N. 2 Cto2019-1874	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
03/06/2020	INSCRIPCION BOGOTA CUIDADORA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
03/06/2020	PMT KENNEDY Y BOSA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
04/06/2020	Su comunicado AC2R-SEM-32-20	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	NO EJECUTAR LA AUTOSUR CON CARRERA 67	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	Observaciones presentación vehículos	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	Solicitud Sistema de Gestión SG SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
05/06/2020	SU COMUNICACIÓN AC2R.-SEM-027-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
01/06/2020	Presentación de Plan de Calidad	PIV INGENIERIA
02/06/2020	Acuso no recibido observaciones o visto bueno por parte de interventoria a PMT´S especificos	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO PIV INGENIERIA

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO

	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

028


	INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

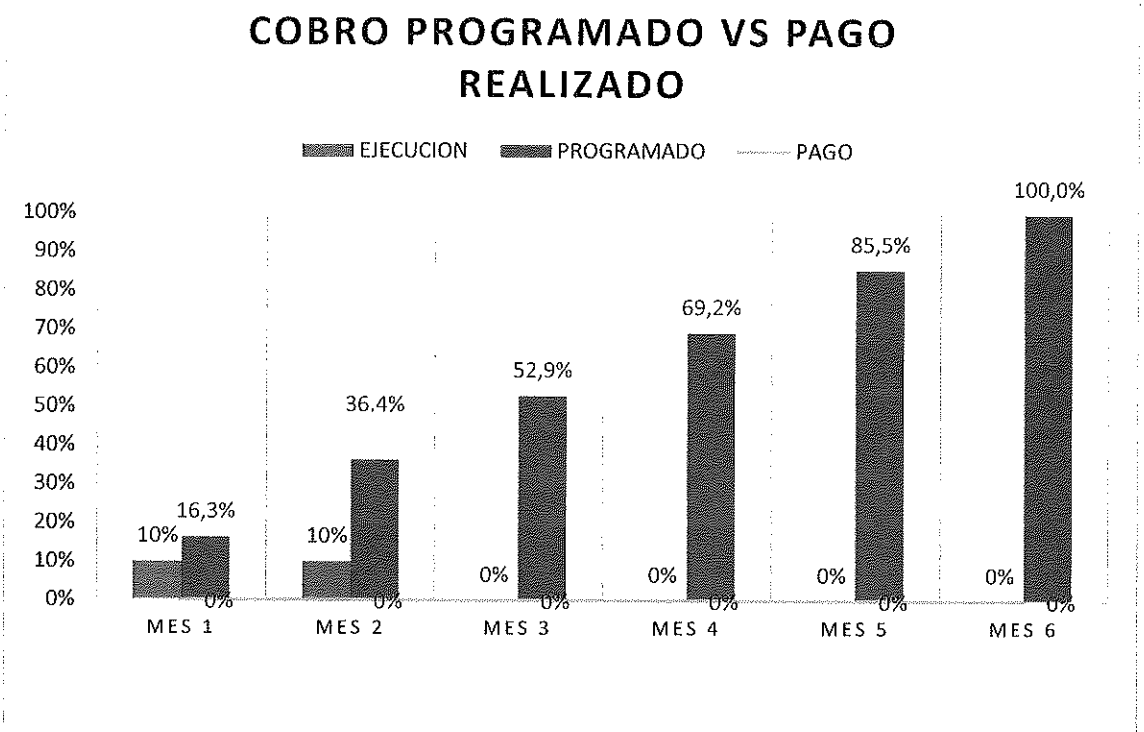

En la Semana 8, el avance programado es de un 28.8% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	28.8%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 910.349.888
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

Durante esta semana llega un correo electrónico por parte de la Alcaldia Mayor de Bogota especificando que ha sido exitoso la revisión de los documentos presentados para el plan de movilidad segura. Como se muestra acontinuacion:

Estimado(a):

MELIZA JANEZ GOMEZ

ac2r ingenieria y proyectos sas

El registro de la información de la obra pública contratada por SDM asociada al contrato 2019-1874, relacionada en el formulario Obra Pública, ha sido exitoso. Recuerde que los protocolos cargados podrán ser verificados por la administración distrital en cualquier momento, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto Distrital 126 del 10 de mayo de 2020. No olvide que debe presentar ante la Secretaría Distrital de Movilidad el Plan de

029


Movilidad Segura, a través del link https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.


Por favor póngase en contacto con el supervisor de su contrato en la Entidad Pública contratante para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 0666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y del Plan de Movilidad Segura (PMS) establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Cordialmente

Alcaldía Mayor de Bogotá

Adicionalmente el dia 3 de Junio de 2020 se realiza el registro solicitado por secretaria de movilidad y la interventoría en la página Bogotá cuidadora como se muestra en los pantallazos a continuación:

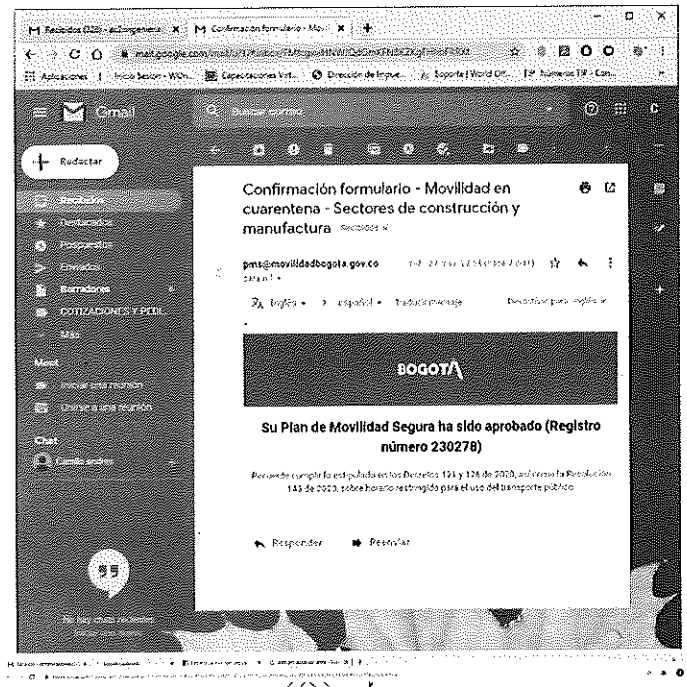



Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19

Diario- Charlas de bioseguridad
Disposición de residuos de riesgo biológico generados de implementación de protocolo

030



Area de reciclaje



Area de reciclaje

Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.



Registro diario de temperatura corporal

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de transito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 9

JUNIO 08 DE 2020 – JUNIO 15 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
FECHA: 16 -06-2020	FECHA: 16 -06-2020	FECHA: 16 -06-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

032

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 7
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 8
5. ASPECTO AMBIENTAL 8
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 8
6. INFORME DE OBRA 12
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 12
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 12
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 12
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 13
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 13
8. INFORME DE DISEÑO 13

037

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	16 de junio de 2020	PERIODO No.	09	DEL	08/06/2020	HASTA	15/06/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	60 días	EQUIVALE AL	32.6% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	60
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	42
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	23%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
09/06/2020	AC2R-SEM-34-2020	Respuesta al oficio PIV-IMS-20191810-0165	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
11/06/2020	AC2R-SEM-35-2020	Comentarios técnicos oficio PIV-IMS-0185-2020	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
11/06/2020	AC2R-SEM-36-2020	Remisión de documentos- seguridad industrial-medio ambiente	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
11/06/2020	AC2R-SEM-37-2020	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. 2019-1874	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
8/06/2020	PIV-IMS-20191810-0186	Su comunicación AC2R-SEM-029-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
10/06/2020	PIV-IMS-20191810-190	Su comunicación AC2R-SEM-034-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
13/06/2020	PIV-IMS-20191810-198	Obtención del PIN que autoriza la disposición de escombros en Bogotá D.C.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
08/06/2020	Respuesta comunicación AC2R-SEM-029-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	Fwd: Respuesta a comunicación AC2R-SEM-31-2020 de 29 de mayo de 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
08/06/2020	respuesta AC2R-SEM-031-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
09/06/2020	PIV 185 - Respuesta a AC2R-SEM-31-2020 - 200607.docx	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Respuesta OFICIO AC2R-SEM-34-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Invitación: Temas de Bioseguridad jue 11 de jun de 2020 2:30pm - 2:55pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
10/06/2020	Invitación: Temas de PMTS jue 11 de jun de 2020 3pm - 3:50pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

034

11/06/2020	Invitación: PMTS Cl 53 Contrato 2019-1874 mar 16 de jun de 2020 9am - 9:50am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
11/06/2020	Invitación actualizada: PMTS Contrato 2019-1874 jue 11 de jun de 2020 3:30pm - 4:20pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
12/06/2020	Invitación: Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 sáb 13 de jun de 2020 10am - 11am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
12/06/2020	Invitación actualizada: Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 sáb 13 de jun de 2020 9am - 9:40am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
08/06/2020	PIV-IMS-20191810-0168 ORDEN DE TRABAJO N. 2 Cto2019-1874	PIV INGENIERIA
09/06/2020	INSCRIPCION BOGOTA CUIDADORA	PIV INGENIERIA
09/06/2020	OFICIO AC2R-SEM-34-2020	PIV INGENIERIA
10/06/2020	Oficio de aprobación al plan de movilidad segura	PIV INGENIERIA
11/06/2020	Oficio AC2R-SEM-35-2020	SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO PIV INGENIERIA
11/06/2020	Presentación de documentos requeridos SST-MA	PIV INGENIERIA
11/06/2020	Información Referente PIGA- Secretaría de Movilidad	LEIDY TATIANA – SECRETARIA DE MOVILIDAD

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO


EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

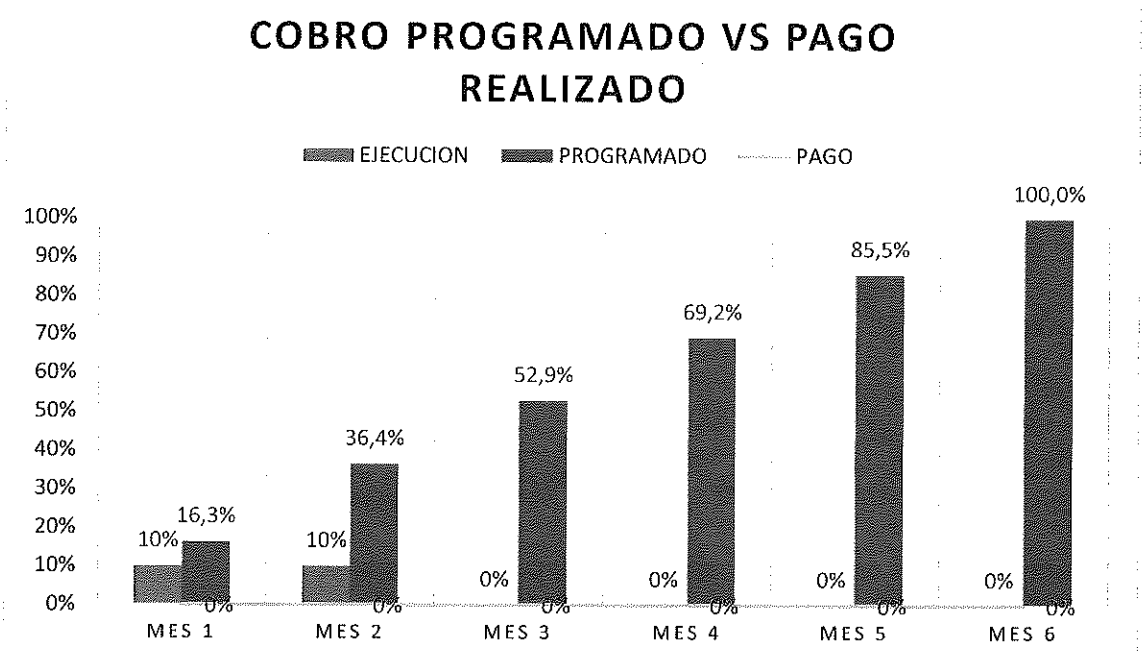

En la Semana 9, el avance programado es de un 32,6% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	32,6%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 1.030.584.779
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

Durante esta semana fue remitido a la interventoría el oficio en donde se aprueba el plan de movilidad segura por parte de la alcaldía mayor de Bogotá, el oficio se muestra a continuación

036

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SDM-DPM- 85184-2020

(Al contestar cite este número)

Bogotá D.C., 08 de junio de 2020

Señor
CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
CARRERA 71 A 52 A 17
Tel. 3113531384
Correo electrónico. semaforizacionac2r@gmail.com
Ciudad

Asunto: Aprobación plan de movilidad segura
Ref: SDM-75950-2020

Estimado señor Rosario,

Teniendo en cuenta el oficio del asunto, en el cual se requiere respuesta sobre la aprobación del Plan de Movilidad Segura, esta Secretaría le informa al respecto:

La aprobación del Plan de Movilidad Segura de la empresa AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, con NIT 830123577, que está ejecutando la obra pública bajo el contrato 20191874, fue aprobado y notificado vía correo electrónico a la dirección: semaforizacionac2r@gmail.com el día viernes, 8 de mayo de 2020, 02:23 p. m., como consta en los registros de la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad.

En caso de no haber recibido la notificación, la presente respuesta hace las veces de la misma, por lo cual se reitera la aprobación de su PMS.

Cordialmente,

SEBASTIAN VELÁSQUEZ GALLÓN
Director de Planeación de la Movilidad

Proyectó: Sonia Gaona Uscátegui - Profesional especializado SDM

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19



Diario- Charlas de bioseguridad
Uso de EPP y kits de bioseguridad



Area de desinfección

Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

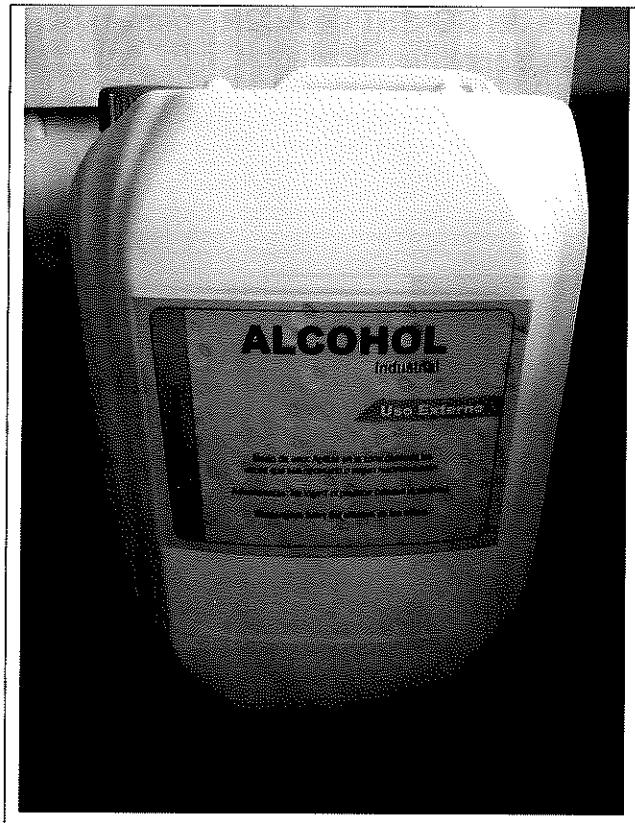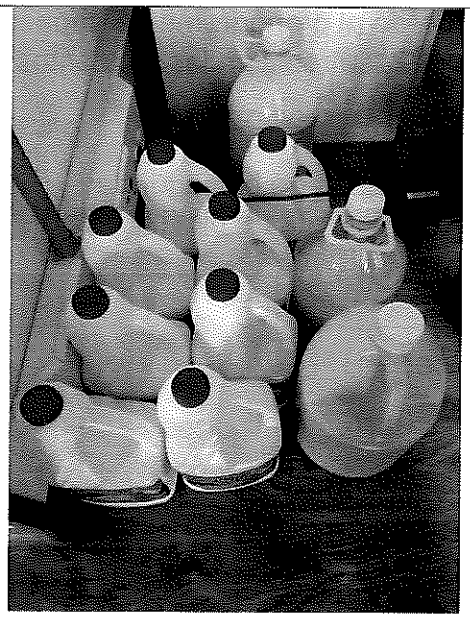	
Implementos de desinfeccion	***Implementos de desinfeccion***

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de transito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020

9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 10

JUNIO 16 DE 2020 – JUNIO 21 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
FECHA: 22-06-2020	FECHA: 22-06-2020	FECHA: 22-06-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 6
3. ASPECTO JURÍDICO 6
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 8
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 9
5. ASPECTO AMBIENTAL 9
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 9
6. INFORME DE OBRA 11
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 11
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 11
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 11
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 12
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 12
8. INFORME DE DISEÑO 12

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	22 de junio de 2020	PERIODO No.	10	DEL	16/06/2020	HASTA	21/06/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	67 días	EQUIVALE AL	36.4% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	67
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	49
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	26%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
16/06/2020	AC2R-SEM-38-2020	Presentación de vehículo para traslado de personal administrativo	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
16/06/2020	AC2R-SEM-39-2020	Solicitud de aprobación de no previstos y aprobación del protocolo de bioseguridad	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
18/06/2020	AC2R-SEM-40-2020	Presentación plan de manejo ambiental – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
17/06/2020	AC2R-SEM-41-2020	Presentación plan de SST – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
18/06/2020	AC2R-SEM-42-2020	Atención de observaciones realizadas al plan de calidad mediante el oficio PIV-IMS-20191810-0197 y piv-ims-20191810-0176	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
19/06/2020	AC2R-SEM-43-2020	Presentación plan de RCD - PIN	IVAN GARCIA DE ANGULO – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-193	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – Plan SST	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-194	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – PG-RCD	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-195	Comunicado AC2R-SEM-36-2020 del día 11 de junio de 2020 – PMA	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-196	Comunicación AC2R-SEM-34-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
17/06/2020	PIV-IMS-20191810-197	Cumplir con la presentación del Plan de calidad – Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
13/06/2020	PIV-IMS-20191810-198	Obtención del PIN que autoriza la disposición de escombros en Bogotá D.C.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
16/06/2020	PIV-IMS-20191810-199	Numeral 6.2.1 del anexo técnico. Vehículos para el traslado de personal administrativo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
19/06/2020	PIV-IMS-20191810-0207	Comunicación AC2R-SEM-39-2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
16/06/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-193	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicado PIV-IMS-201910-194	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-195	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Comunicación PIV-IMS-20191810-0198	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Invitación: SOLICITUD DE COORDINACIÓN POR RESERVA DE INTERVENCIÓN mié 17 de jun de 2020 9am - 10am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Invitación actualizada: SOLICITUD DE COORDINACIÓN POR RESERVA DE INTERVENCIÓN jue 18 de jun de 2020 10am - 11am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
16/06/2020	Oficio AC2R-SEM-38-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0196	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
17/06/2020	Solicitud Plan de Calidad	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
19/06/2020	Comunicado PIV-ISM-20191810-0207	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
16/06/2020	Oficio AC2R-SEM-38-2020	PIV INGENIERIA
16/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-39-2020	PIV INGENIERIA
17/06/2020	Contrato de obra 2019--1874 SDM - Semaforización	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS
17/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-41-2020	PIV INGENIERIA
18/06/2020	Programacion	JHON JAIRO BONILLA ALVAREZ
18/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-40-2020	PIV INGENIERIA
19/06/2020	OFICIO N° AC2R-SEM-43-2020	PIV INGENIERIA
19/06/2020	Solicitud de replanteo KR 7 x AC 53	PIV INGENIERIA
19/06/2020	Acta de coordinación de obras de mantenimiento Calle 53	JHON JAIRO BONILLA ALVAREZ

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2


ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

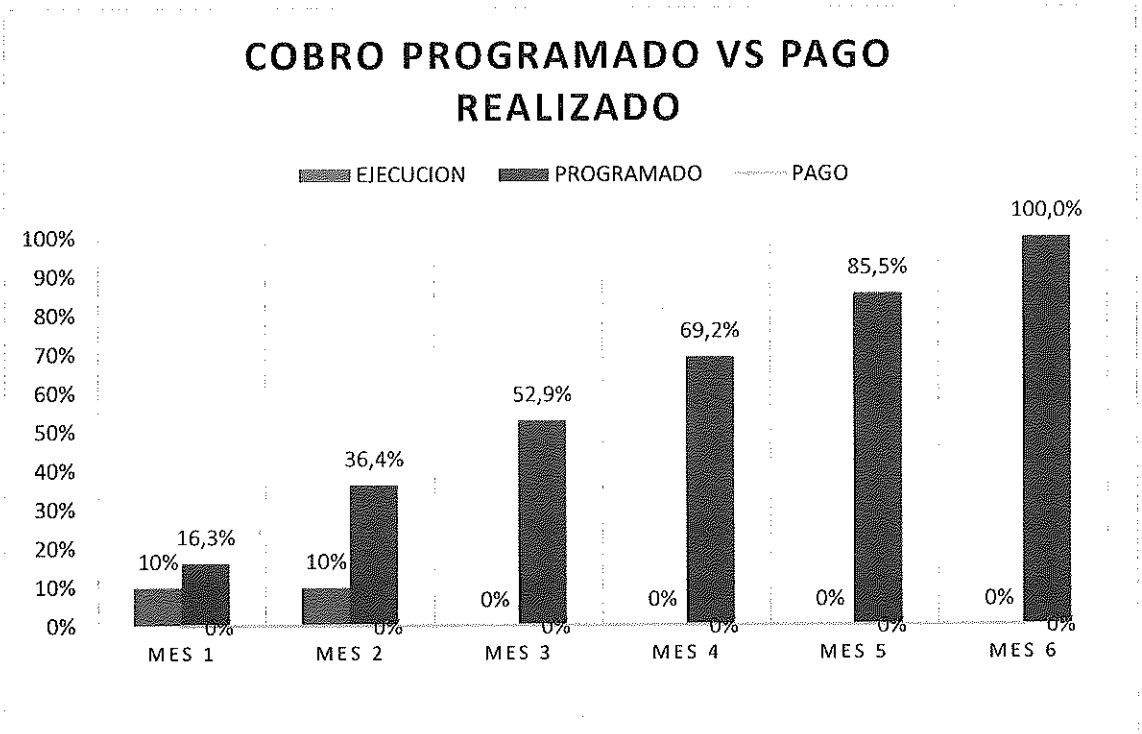

En la Semana 10, el avance programado es de un 36,4% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	36,4%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 1.150.819.670
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

1- Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular


María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

2- Capacitaciones

De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19


Diario- Charlas de bioseguridad
Identificar que es el Coronavirus, mecanismos de propagación, sintomatología, riesgos de contagio y medidas de protección.

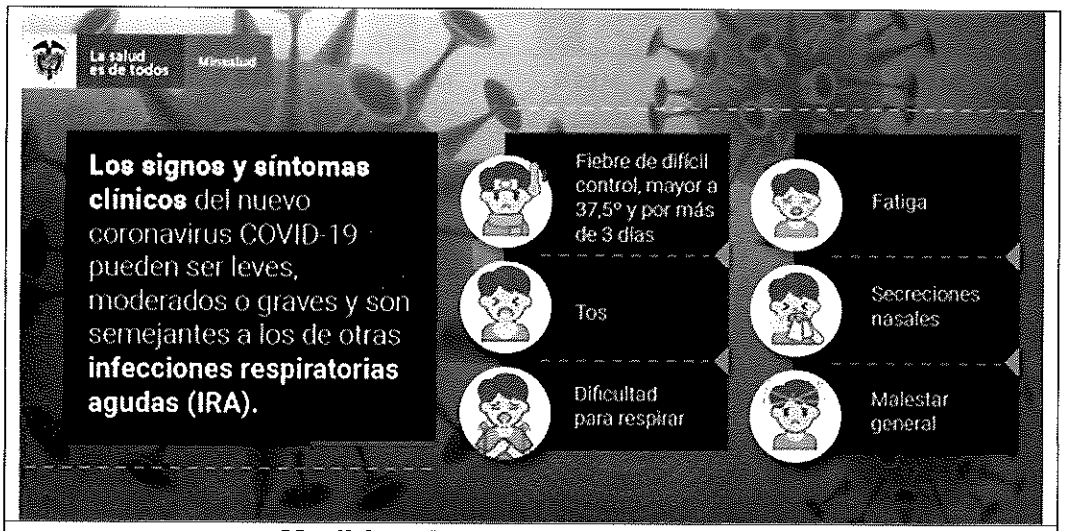

Medidas de prevención COVID-19

3- Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Desinfección al ingreso y salida de las instalaciones
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

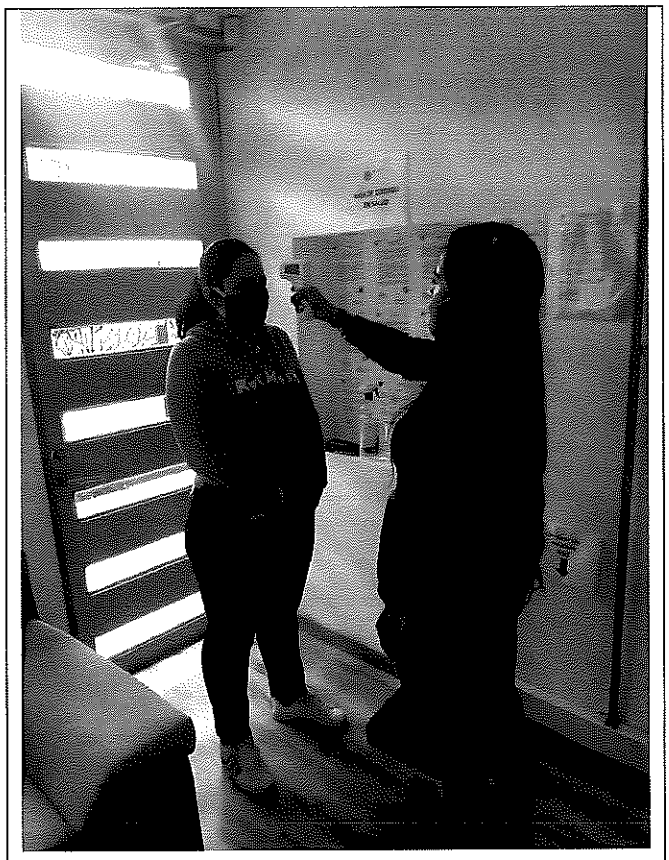

Registro diario de temperatura corporal

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de transito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020

011

6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 11

JUNIO 22 DE 2020 – JUNIO 29 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA FECHA: 30-06-2020	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 30-06-2020	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO FECHA: 30-06-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

045

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 6
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 8
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 9
5. ASPECTO AMBIENTAL 9
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 9
6. INFORME DE OBRA 11
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 11
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 11
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 11
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 11
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 11
8. INFORME DE DISEÑO 12

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	30 de junio de 2020	PERIODO No.	11	DEL	22/06/2020	HASTA	29/06/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	74 días	EQUIVALE AL	40.2% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	74
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	56
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	30%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
24/06/2020	AC2R-SEM-44-2020	Presentación de informes semanales y mensuales	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA – JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
26/06/2020	AC2R-SEM-46-2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra N° 2019-1874	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR - SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO - LADY TATIANA BORDA - **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
22/06/2020	PIV-IMS-20191810-0208	Apremio plan SST – enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020 a las 16:33	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
23/06/2020	PIV-IMS-20191810-0215	Apremio cumplimiento plan de calidad -Contrato 2019-1874	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
24-06-2020	PIV-IMS-20191810-0218	Retiro de intersecciones de la primera orden de trabajo	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
25-06-2020	PIV-IMS-20191810-0210	Comunicado AC2R-SEM-43-2020 *plan de gestión de residuos de construcción y demolición* (PG-RCD) RCD-PIN-correo electrónico del 19 de junio de 2020	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
25-06-2020	PIV-IMS-20191810-0211	Comunicado AC2R-SEM-40-2020, recibido el día 18 de junio de 2020 a las 16:31.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
25-06-2020	PIV-IMS-20191810-0208	Apremio plan SST – enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020 a las 16:33	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**REMITENTE**
23-06-2020	Apremio plan SST – enviado por correo electrónico del 17 de junio de 2020	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA**
24-06-2020	EXCLUSION INTERSECCIONES ORDEN DE TRABAJO N. 1	JORGE A. WILCHES S. **PIV. INGENIERIA**
24/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-02015- Plan de calidad	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA **PIV INGENIERIA S.A.S.**
24/06/2020	Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 (2020-06-13 at 07:34 GMT-7)	LADY TATIANA BORDA ROJAS **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
24/06/2020	Protocolo de Bioseguridad Contrato 2019-1874 (2020-06-13 at 07:34 GMT-7)	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR - **SECRETARIA**

		DISTRITAL DE MOVILIDAD
25/06/2020	Aceptación de comunicación telefónico	CLAUDIA TREJOS PIV INGENIERIA S.A.S.
26/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0210	IVAN GARCIA DE ANGULO PIV INGENIERIA S.A.S.
26/06/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0211	IVAN GARCIA DE ANGULO PIV INGENIERIA S.A.S.
26/06/2020	FABRICACION DE TAPAS CAJAS DE PASO	LADY TATIANA BORDA ROJAS SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD JORGE A. WILCHES S. PIV. INGENIERIA
27/06/2020	Solicitud Asesoría reporte RCD	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
23-06-2020	PIN contrato 2019-1874	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
24/06/2020	Informes semanales y mensuales	JORGE A. WILCHES S. PIV. INGENIERIA
25/036/2020	Solicitud de comunicación telefónica	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
25/036/2020	Entrega de tapas orden de trabajo N°1	JORGE A. WILCHES S. PIV. INGENIERIA
27/06/2020	Solicitud apertura de PIN	ADRIANA MILENA GUEVARA VARGAS SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
26/06/2020	TRAZABILIDAD DE HECHOS QUE HAN GENERADO LA DILATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 2019-1874.	JHONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR - SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO - LADY TATIANA BORDA - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO


	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

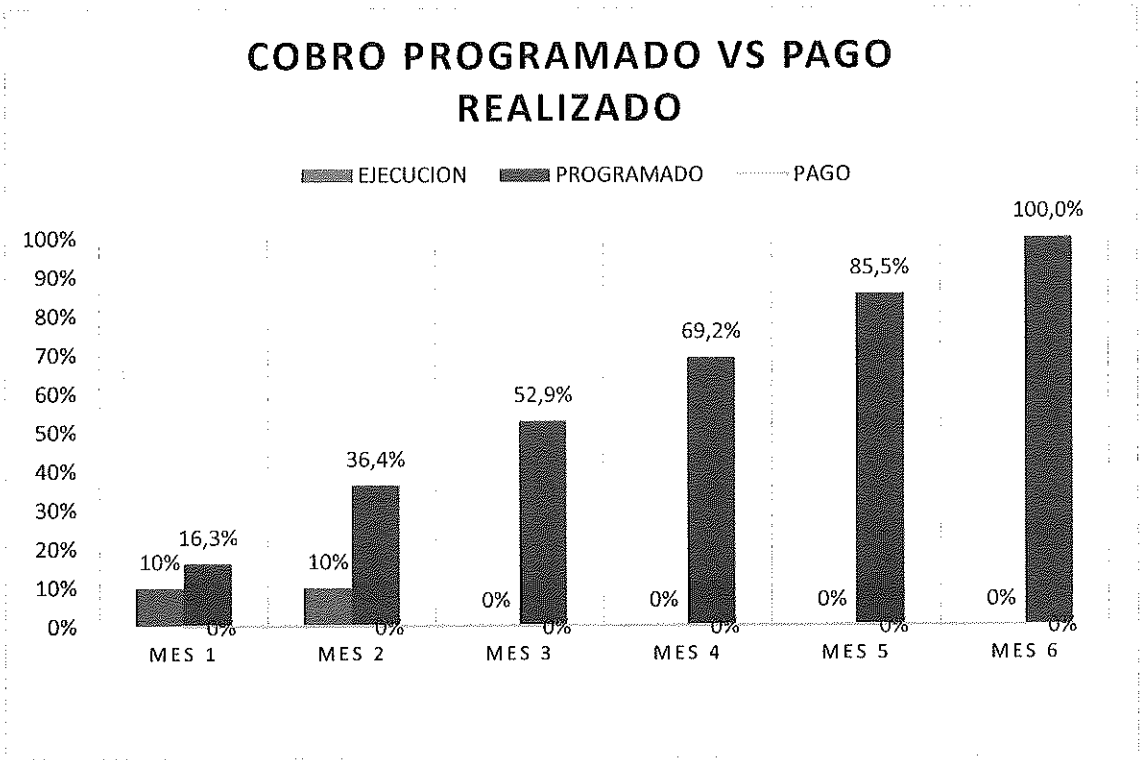

En la Semana 11, el avance programado es de un 40,2% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	40.2%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 1.271.054.560
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

1- Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta

Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta
Daney Parra C	Conductor	Vehículo particular


2- Capacitaciones


De acuerdo al cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

Diario- Charlas de bioseguridad

3- Protocolos de bioseguridad

Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

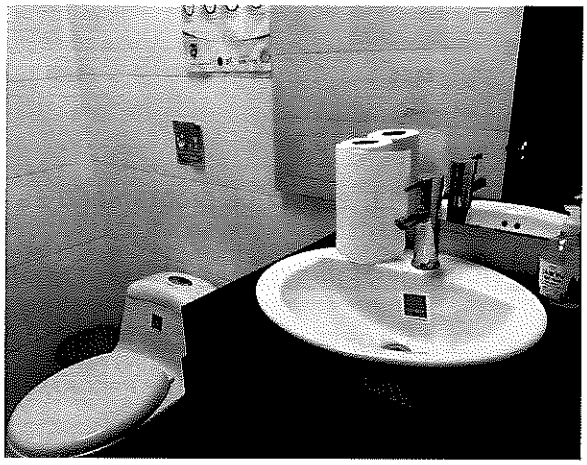	
Limpieza y desinfección de todas las áreas de la oficina	**Suministro de jabón líquido para manos y toallas de único uso**

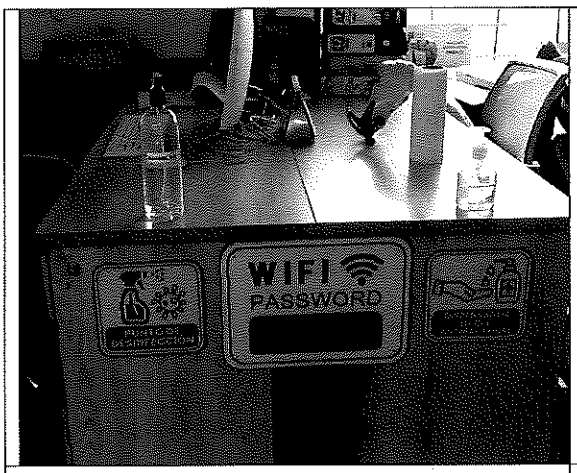

Identificación de puntos de desinfección



Limpieza y desinfecc0n de punto ecológico

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de transito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	AUTO SUR X KR 67	1.	Se solicita no ejecutar esta obra
2.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
3.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
4.	Cl 53 x KR 24	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
5.	Cl 53 x KR 21	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
6.	Cl 53 x KR 20	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
7.	Cl 53 x KR 18	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
8.	Cl 53 x KR 17	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
9.	Cl 53 x KR 16	1.	Se atienden las observaciones el día 30 de junio de 2020
10.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	Se reciben nuevas observaciones el dia 28 de mayo de 2020 y 29 de Mayo de 2020
11.	KR 73 x CL 26 SUR		Se atienden las observaciones el día 5 de junio de 2020
12.	GENERALES TÍPICOS	1.	Se recibe el visto bueno por parte de la interventoría el día 22 de Mayo de 2020

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020

2.	AUTO SUR X KR 67	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	En tramite
11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.

CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

INFORME SEMANAL No. 12

JUNIO 30 DE 2020 – JULIO 5 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARIA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GOMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
FECHA: 06-07-2020	FECHA: 06-07-2020	FECHA: 06-07-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

BOGOTÁ D.C.
2020

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5
2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 5
3. ASPECTO JURÍDICO 6
4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 7
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 8
5. ASPECTO AMBIENTAL 8
5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD 8
6. INFORME DE OBRA 10
6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 10
7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 10
7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 10
7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA 10
7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES 10
8. INFORME DE DISEÑO 11

052

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	6 de julio de 2020	PERIODO No.	12	DEL	30/06/2020	HASTA	05/07/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71A # 52A -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	11 de octubre de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	79 días	EQUIVALE AL	52.9% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	184
DIAS TRANSCURRIDOS:	79
% DE EJECUCION	10%
DIAS DE RETRASO:	64
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	42.9%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
30/06/2020	AC2R-SEM-47-2020	Presentación plan RCD – atención observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA S.A.S**
30/06/2020	AC2R-SEM-48-2020	Presentación de los informes semana 8,9,10	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES **PIV INGENIERIA S.A.S.**
30/06/2020	AC2R-SEM-48-2020	Presentación plan de manejo ambiental – atención de observaciones	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA S.A.S**
01/07/2020	AC2R-SEM-49-2020	Respuesta oficio PIV-IMS-20191810-0207 y SDM -SEMA-95473-2020	IVAN GARCIA DE ANGULO **PIV INGENIERIA S.A.S** LEYDY TATIANA BORDA **SECRETARIA DE MOVILIDAD**
01/07/2020	AC2R-SEM-50-2020	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN DE CALIDAD MEDIANTE EL OFICIO	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
03/07/2020	AC2R-SEM-51-2020	PRESENTACION PLAN DE RCD – PIN	IVAN GARCIA DE ANGULO PIV INGENIERIA S.A.S
03/07/2020	AC2R-SEM-52-2020	PRESENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – ATENCION OBSERVACIONES	IVAN GARCIA DE ANGULO PIV INGENIERIA S.A.S
04/07/2020	AC2R-SEM-54-2020	CAMBIO DE BODEGA	IVAN GARCIA DE ANGULO, JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
04/07/2020	AC2R-SEM-55-2020	PRESENTACION DE LOS INFORMES SEMANA 11	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
04/07/2020	AC2R-SEM-56-2020	RESPUESTA PROGRAMACION	CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA– JORGE A. WILCHES PIV INGENIERIA S.A.S
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
02/07/2020	PIV-IMS-20191810-0234	Comunicado AC2R-SEM-47-2020 Presentación plan RCD – Atención observaciones correo electrónico del 30 de junio de 2020 a las 2:55.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
02/07/2020	PIV-IMS-20191810-0235	Comunicado AC2R-SEM-48-2020, recibido el día 30 de junio de 2020 a las 3:02.	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
02/07/2020	PIV-IMS-20191810-0239	Solicitud de actualización del cronograma de obra y presupuesto	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

2.2 CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS		
FECHA	**ASUNTO**	**REMITENTE**
30/06/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Trazabilidad de hechos que han generado la dilatación de la ejecución del contrato de obra No. 2019-1874- SDM-SEMA-95473-2020	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S

01/07/2020	Solicitud capacitación RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
01/07/2020	Solicitud apertura de PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0234	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Comunicado PIV-IMS-20191810-0235	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
02/07/2020	Solicitud programa obra e inversión	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
03/07/2020	Fwd: Construcción de vados en intersecciones Radicado SDM-92407-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS		
FECHA	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
02/07/2020	ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL - 2 DE JUNIO DE 2020	PIV INGENIERIA

3. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	1/04/2020
ACTA DE REINICIO N°1	5/05/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	27/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

	SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO


EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020

4 ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR POR EJECUTAR		$3160.459.988	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$3160.459.988
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3160.459.988

05

A la fecha no se ha realizado ningún pago y está pendiente de pago un 100%.

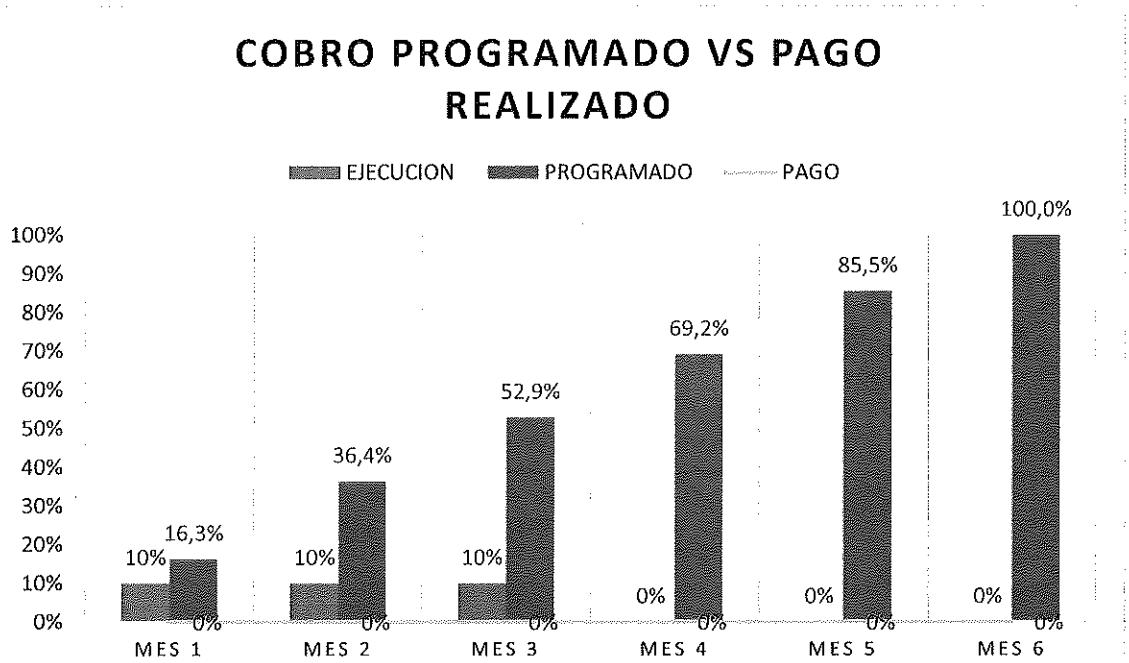

En la Semana 12, el avance programado es de un 52,9% vs un avance ejecutado real del 10%.

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	52.9%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 1.671.883.334
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	10%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 316.045.999

5. ASPECTO AMBIENTAL

5.1. CONCEPTO SEGURIDAD Y SALUD

1- Plan de Movilidad Segura

Con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 dentro de las operaciones y actividades desarrolladas en el contrato de obra No. 2019-1874 y dando cumplimiento al Plan de Movilidad Segura, todo el personal de oficina está usando transporte alternativo.

Nombre	Cargo	Medio de Transporte
Camilo Rosario	Rep. Legal	Vehículo particular
María Camila Gamba	Aux. Ingeniería	Bicicleta
Felipe López	Aux. Administrativo	Bicicleta
Elizabeth Pineda	Aux. SST	Bicicleta

2- Capacitaciones

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones del SG-SST de AC2R Formato SG-SST6 –V2, se realizan las siguientes capacitaciones.

CRONOGRAMA COVID-19


Diario- Charlas de bioseguridad
– Uso de EPP




Limpieza y desinfección oficina

3- Protocolos de bioseguridad

Diario- Registro de temperatura y condiciones de salud del personal de oficina y visitantes.
Diario- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y a la disponibilidad de insumos para su aplicación.

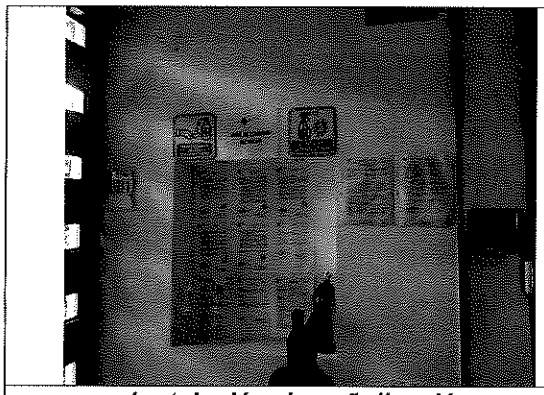

Instalación de señalización



Limpieza y desinfección zonas comunes

6. INFORME DE OBRA

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actualmente nos encontramos a la espera de aprobación de planes de manejo de tránsito para iniciar la ejecución de la obra.

7. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	KR 92 X CL 157C Y 158	1.	Se radica ante interventoria

7.2 ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD	
1.	ORDEN DE TRABAJO 1	1.	Radicar PMT´S ante la SDM
2.	ORDEN DE TRABAJO 2	1.	Radicar PMT´S ante interventoría

7.3 ESTADO ACTUAL DE LAS INTERSECCIONES

INTERSECCIÓN		SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DEL PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN COOS
1.	PTM´S. TÍPICOS	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	19/03/2020	22/05/2020
2.	AUTO SUR X KR 67	1.	SE SOLICITO NO EJECUTAR ESTA INTERSECCION		
3.	Carrera 81 por calle 68a Sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
4.	Carrera 73 por calle 26 sur	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020
5.	Cl 53 x KR 24	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
6.	Cl 53 x KR 21	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
7.	Cl 53 x KR 20	1,	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
8.	Cl 53 x KR 18	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
9.	Cl 53 x KR 17	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020
10.	Cl 53 x KR 16	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	9/07/2020

11.	Carreras 7 y 9 x Calle 53	1.	En trámite de aprobación por parte de la interventoría.	23/04/2020	03/06/2020

8. INFORME DE DISEÑO

A la fecha no se han recibido solicitud de diseño de intersecciones.
