CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL No. 8

NOVIEMBRE 01 DE 2020 – NOVIEMBRE 30 DE 2020

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GÓMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
FECHA 01 -12 -2020	FECHA: 01-12-2020	FECHA: 01-12-2020
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

001

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1 ANTECEDENTES 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 6
5. ASPECTO JURÍDICO 7
6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 9
6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 10
7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
7.1. INTRODUCCIÓN 10
7.2 OBJETIVOS 11
7.2.1 OBJETIVO GENERAL 11
7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 11
7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11
7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO 11
7.4 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS 11
7.5 VIGIA SST 13
7.6 CAPACITACION 13
7.7 DESCRIPCION SOCIEDEMOGRAFICA 14
7.8 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 22
7.9 AGUA POTABLE Y RESIDUOS 22
7.10 CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL 23
7.11 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 23
7.12 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 23
7.13 PROGRAMA DE MANTENIENTO 23
7.14 ENTREGA DE EPP 23
7.15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 24
7.16 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 24

002

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Realizar el diseño de intersecciones de acuerdo con las priorizaciones establecidas en la Entidad e indicadas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas".
- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Atender las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo de la red semafórica existente.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" - Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

Con el objeto de contratar el diseño y construcción, de las obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento el sistema de semaforización de Bogotá D.C., incluyendo diseño semafórico de intersecciones para la implementación de nuevos controles semaforizados. Le adjudico a la empresa **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S** el contrato mediante la **Resolución N° 259 del 26 de DICIEMBRE de 2019**, cuyo objeto es: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."**

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de la red semafórica existente y donde se requiera nueva semaforización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal de la ciudad.

003

PRORROGA N°1	7/10/2020
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	30/03//2020
ACTA DE REINICIO N°1	13/04/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	13/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
PRORROGA N°1	7/10/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020
Se suscribe el acta de inicio de obras	08/09/2020

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		$ 139.207.349	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 1		$ 2.424.504	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1 OBRA Y CONSULTORIA			$ 141.631.853
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		$ 394.281.898	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 2		$ 3.037.011	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2 OBRA Y CONSULTORIA			EN TRAMITE
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$2.621.509.226
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3.160.459.988

A la fecha se ha realizado un pago de $ 141.631.853 correspondiente al acta parcial N°1, actualmente se encuentra pendiente un pago de $ 397.318.909 correspondiente al acta parcial N°2.

005

7.2 OBJETIVOS

7.2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades implementadas en los frentes de obra para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, las medias de manejo ambiental y PG – RCD acorde con los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio Ambiente en el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra pública 2019-1974.

7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Velar por el cumplimiento el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo durante los trabajos ejecutados.

Implementar planes de mejora con el fin de identificar y mitigar los riesgos presentes en la ejecución del proyecto.

Describir las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los compromisos contractuales y la normatividad ambiental aplicable.

Verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato de obra 2019-1874.

7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseño y construcción de obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento de las obras civiles para el sistema de semaforización de Bogotá DC y contiene de manera general para su ejecución la Formulación y tramites de planes de manejo de tráfico, Localización, verificación y replanteo, Estudio y trazado de redes existentes, Implementación planes de manejo de tráfico, Demoliciones, Excavaciones, Perforaciones y Construcción.

7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2020 se ejecutaron actividades constructivas o de mantenimiento en las siguientes intersecciones:

- AV. Boyacá X CL 60CS
- KR 73 X CL 26S
- KR 116 X DG 16
- KR 17 X CL 71BIS SUR
- KR 69B x AC 26 S

7.4 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

Todo el personal vinculado al contrato de obra 2019-1874 se encuentra afiliado al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS. **ANEXO 7** APORTES **AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

006

28	Nelson Suarez Rodríguez	Oficial de obra	Compensar	Colpensiones	Seguros Bolívar
29	Rafael Antonio Suarez Romero	Operario	Salud Total	Porvenir	Seguros Bolívar
30	Miguel Ángel Cubillos	Operario	Salud Total	Porvenir	Seguros Bolívar
31	Damaso Castaño Hernández	Operario	Sura	Protección	Seguros Bolívar
32	Hernando Ruiz Casas	Operario	Sanitas	Colpensiones	Seguros Bolívar
33	Jhon Sebastián Castaño	Operario	Sura	Protección	Seguros Bolívar
34	William Salamanca	Operario	Sura	Porvenir	Seguros Bolívar
35	José Dimas Diaz	Conductor	Compensar	--	Seguros Bolívar
36	Euclides Rivera	Operario	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Bolívar
37	JUSTO PASTOR MONTAÑA	Operario	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Bolívar

RETIROS DE PERSONAL GYG

N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
	Robert Quiroz	Ayudante	Famisanar	Protección	Sura
	Hugo Oviedo	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Sura
	Keiner Capataz	Ayudante	Medimas	Colpensiones	Sura
	Robert Quiroz	Ayudante	Medimas	Colpensiones	Sura
	Jaider Pérez	Ayudante	Nueva Eps	Protección	Sura
	Luis Alfredo Hoyos	Ayudante	Nueva Eps	Protección	Sura
	Jose Luis Hoyos	Ayudante	Nueva Eps	Protección	Sura
	Fredys Rodríguez	Ayudante	Salud Total	Colpensiones	Sura

7.5 VIGIA SST

Se adjunta acta vigía - noviembre de 2020 **ANEXO 8. VIGIA SST**


7.6 CAPACITACION

De acuerdo con el cronograma de capacitación se realizaron las siguientes actividades de capacitación en obra, con las cuales se da cumplimiento del 100% a las actividades programadas.

007


1. EDAD

29 respuestas




2. ESTADO CIVIL

29 respuestas



3. DATOS DE RESIDENCIA, DIRECCIÓN BARRIO Y LOCALIDAD


29 respuestas



008


7. GENERO

29 respuestas




8. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

29 respuestas




9. NIVEL DE ESCOLARIDAD

29 respuestas




13. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA

29 respuestas




14. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL

29 respuestas



15. TIPO DE CONTRATACIÓN


29 respuestas



010


19. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

29 respuestas




CON QUE FRECUENCIA CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

29 respuestas



20.PRACTICA ALGÚN DEPORTE

29 respuestas



011

7.10 CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo.

Accidentalidad- **Anexo 10 INDICADORES**

HHT:

EMPRESA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			
PERIODO REPORTADO	NOVIEMBRE DE 2020			
RESPONSABLE	STELLA PINEDA			
NUMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	5	RESUMEN		OBSERVACIONES
NUMERO DE EMPLEADOS OPERATIVOS	32	TOTAL	37	
DIAS TRABAJADOS ADMINISTRATIVOS	25	HHT	1000	
DIAS TRABAJADOS OPERATIVOS	25	HHT	6400	
TOTAL HORAS - HOMBRE - TRABAJADAS	7400	ACUMULADO	25360	

7.11 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No se han identificado peligros adicionales a los valorados inicialmente, por lo tanto, la matriz de peligros y valoración de riesgos no ha tenido actualizaciones. **ANEXO 13. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**

7.12 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2020 se implementaron las siguientes inspecciones como medidas de prevención y control

- Inspección de compresor – 17/11/2020
- Inspección planta eléctrica - 12/11/2020
- Inspección orden y aseo – 12/11/2020
- Inspección herramienta menor - 24/11/2020

ANEXO 14. INSPECCIONES

7.13 PROGRAMA DE MANTENIENTO

Se adjuntan los documentos de los vehículos que ingresaron a operación en el mes de septiembre como seguimiento al programa de mantenimiento de vehículos. **ANEXO 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO**

7.14 ENTREGA DE EPP

Se realiza entrega de EPP a todo el personal

ANEXO 16. ENTREGA DE EPP

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

012

INTERSECCION		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCION
1.	TV 21 X DG 45D	1.	Se realiza replanteo de obra.	4%
2.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo de obra.	4%
3.	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	1.	Se realiza fundición de anden en concreto en separador occidental	85%
		2.	Se realiza instalación de ducteria de 3".	
		3.	Se realiza construcción de caja doble y sencilla en separador sur.	
		4.	Se realiza construcción de base en separador occidental.	
		5.	Se realiza la instalación de bolardos.	
		6.	Se realiza la perforación horizontal	
		7.	Se realiza demolición de asfalto en el costado oriental	
		8.	Se realiza instalación de sardinel costado oriental	
		9.	Se realiza construcción de caja doble en el separador oriental	
		10.	Se realiza la conformación del separador oriental	
		11.	Se realiza toma de densidades con cono y arena	
4.	KR 69B x AC 26 S	1.	Se realiza replanteo de obra.	4%
5.	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	1.	Se realiza las excavaciones manuales e instalación de ducteria de 3" y perforaciones horizontales	50%
6.	AK 15 X CL 77	1.	Se realiza replanteo de obra.	4%
7.	TV 24 X CL 53B	1.	Se realiza replanteo de obra.	4%

8.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°33 (DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020)

INTERSECCION		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCION
1.	TV 21 X DG 45D	1.	Se realiza la demolición de andenes.	15%
		2.	Se realiza perforación neumática	
		3.	Se realiza instalación de ducteria de 3".	
		4.	Se realiza la instalación de Subbase	
2.	KR 16 X AC 32	1.	Se realiza replanteo de obra	10%
		2.	Se realiza inspección de redes	
3.	KR 17 X AC 32	1.	Se realiza replanteo de obra	10%
		2.	Se realiza inspección de redes	
4.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo de obra	5%
5.	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	1.	Se realiza la demolición de sardinel e instalación costado sur oriental	90%
		2.	Se realiza ensayos de densidades y construcción de anden en concreto encostado nor oriental y sur oriental	
		3.	Se realiza instalación de tubería de 3" en el separador norte	
6.	KR 69B x AC 26 S	1.	Se realiza demolición de anden en concreto se realiza conformación de la subbase granular e instalación de sardinel	70%
		2.	Se realiza la construcción de anden en concreto y base para poste	
7.	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	1.	Se realiza instalación de tubería de 3" y construcción de cajas de paso sencillas	95%
		2.	Se realiza la construcción de anden del costado oriental y occidental	
		3.	Se realiza la perforación horizontal del ingreso de la bomba de gasolina	



Fotografía N° 5




Fotografía N° 6



Fotografía N° 7



Fotografía N° 8

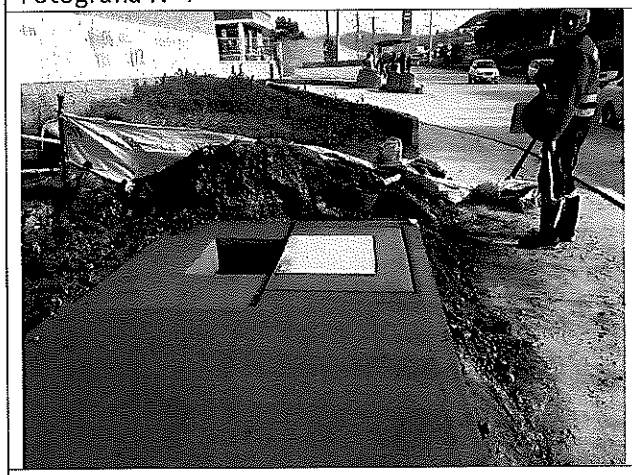

Fotografía N° 9



Fotografía N° 10



Fotografía N° 17



Fotografía N° 18

KRA 116 X DG 16



Fotografía N° 19



Fotografía N° 20

015



Fotografía N° 27



Fotografía N° 28



Fotografía N° 29



Fotografía N° 30




Fotografía N° 31



Fotografía N° 32

016

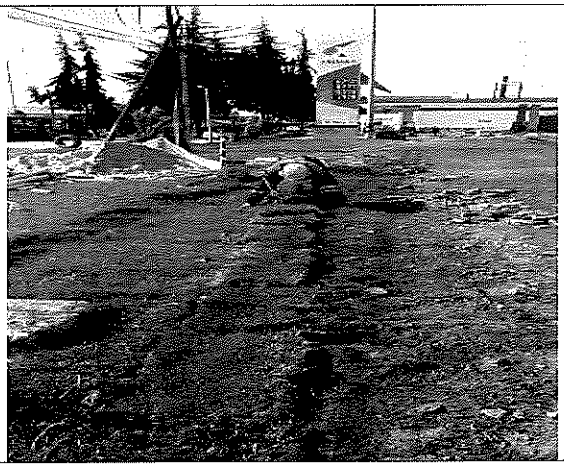	
Fotografía N° 39	Fotografía N° 40
	
Fotografía N° 41	Fotografía N° 42
	
Fotografía N° 43	Fotografía N° 44



Fotografía N° 51



Fotografía N° 52



Fotografía N° 53



Fotografía N° 54



Fotografía N° 55



Fotografía N° 56




Fotografía N° 62




Fotografía N° 63



Fotografía N° 64

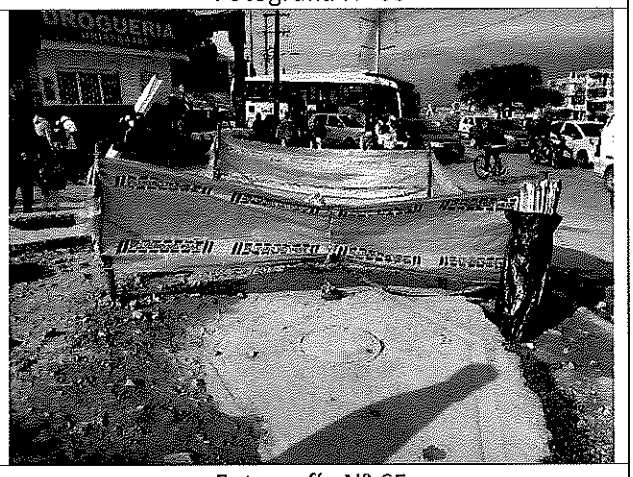

Fotografía N° 65

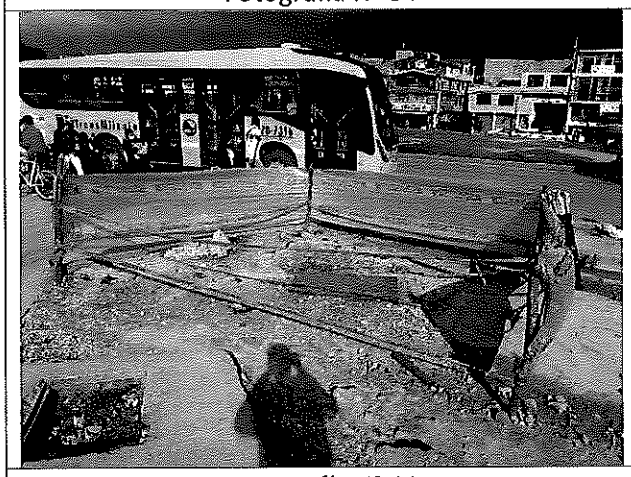

Fotografía N° 66



Fotografía N° 67



Fotografía N° 74



Fotografía N° 75



Fotografía N° 76



Fotografía N° 77



Fotografía N° 78



Fotografía N° 79



Fotografía N° 86



Fotografía N° 87



Fotografía N° 88



Fotografía N° 89



Fotografía N° 90



Fotografía N° 91

021




Fotografía N° 98



Fotografía N° 99



Fotografía N° 100

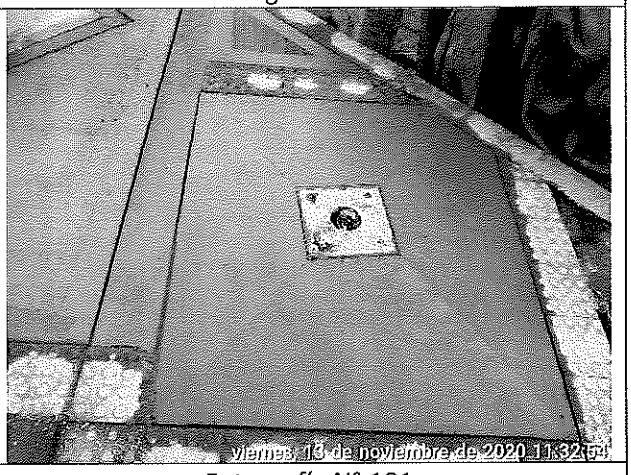

Fotografía N° 101



Fotografía N° 101




Fotografía N° 102



Fotografía N° 109



Fotografía N° 110

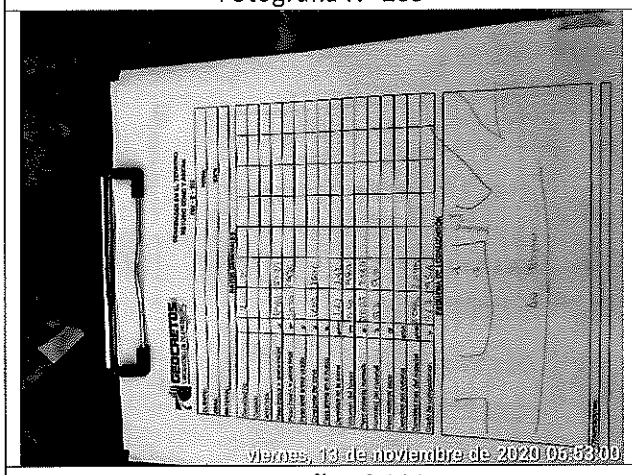

Fotografía N° 111



Fotografía N° 112




Fotografía N° 113



Fotografía N° 114



Fotografía N° 120

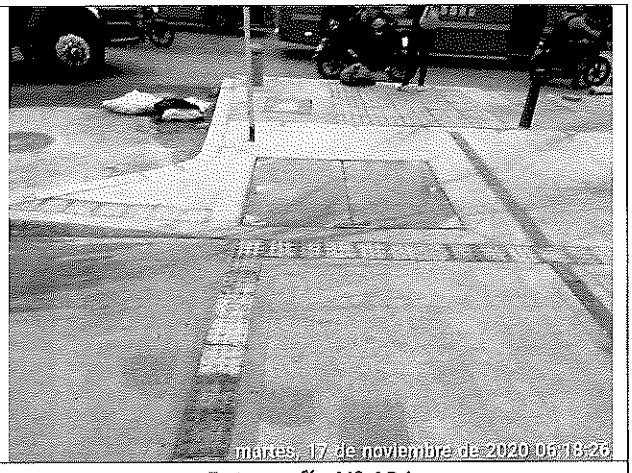

Fotografía N° 121



Fotografía N° 122



Fotografía N° 123



Fotografía N° 124



Fotografía N° 125

024



Fotografía N° 132



Fotografía N° 133



Fotografía N° 134



Fotografía N° 135



Fotografía N° 136



Fotografía N° 137



Fotografía N° 144



Fotografía N° 145



Fotografía N° 146



Fotografía N° 147



Fotografía N° 148



Fotografía N° 149



Fotografía N° 156




Fotografía N° 157



Fotografía N° 158



Fotografía N° 159

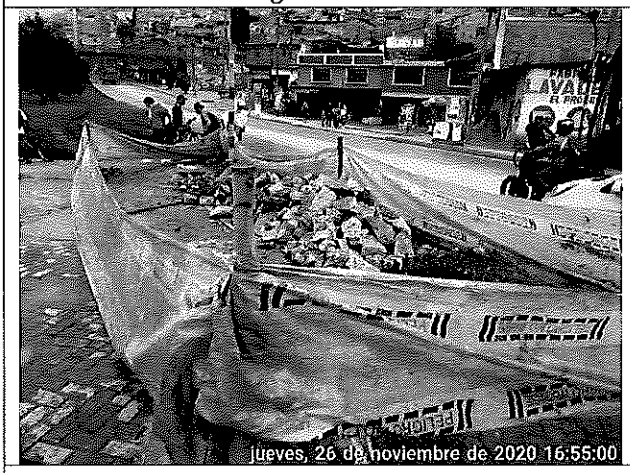

Fotografía N° 160



Fotografía N° 161

027



Fotografía N° 168



Fotografía N° 169



Fotografía N° 170



Fotografía N° 171



Fotografía N° 172



Fotografía N° 173


028



Fotografía N° 180



Fotografía N° 181

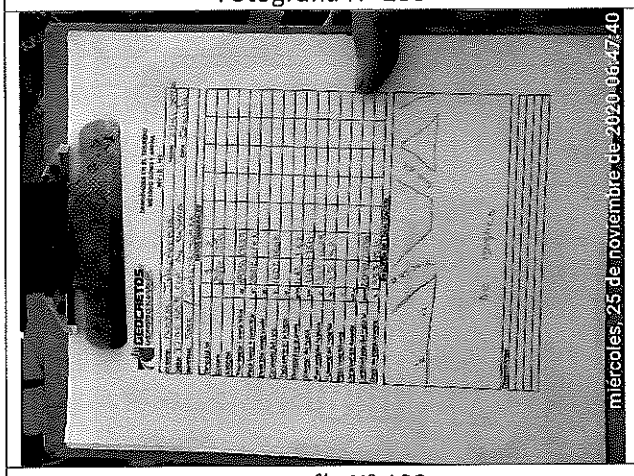

Fotografía N° 182



Fotografía N° 183



Fotografía N° 184



Fotografía N° 185



Fotografía N° 192

KR 15 X CL 77



Fotografía N° 193



Fotografía N° 194


030




Fotografía N° 199



Fotografía N° 200

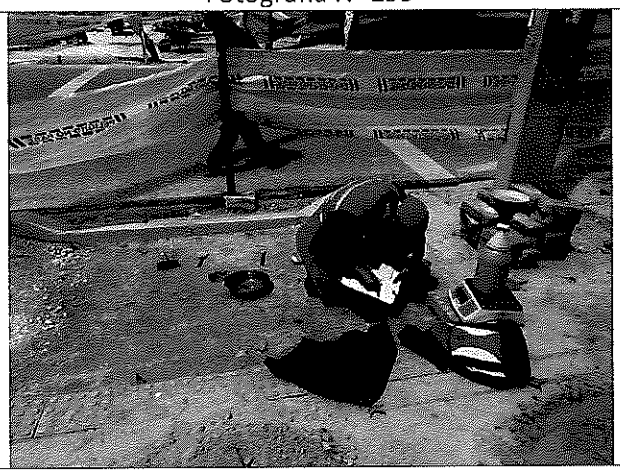

Fotografía N° 201

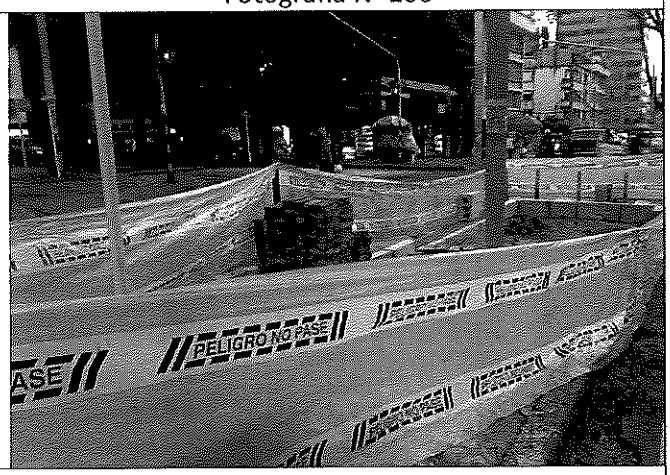

Fotografía N° 202

031



Fotografía N° 206



Fotografía N° 207



Fotografía N° 208



Fotografía N° 209

30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO	
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO	
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO	

9.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°32 (DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM	
				Fecha	Radicado
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46
9	390	2005	KR 5 X CL 17	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46
21	650	2688	KR 50 x CL 24	NEGADA POR IDU POR OBRAS PARALELAS	
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre
24	643	1876	AK 104 x AC 145	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	13/11/2020	COOS 46
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	13/11/2020	COOS 46
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	13/11/2020	COOS 46
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	7/11/2020	COOS EMERGENCIA
30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46
31			KR 17 X CL 71B BIS SUR	28/10/2020	COOS EMERGENCIA
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO	
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO	
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO	

9.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°33 (DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM	
				Fecha	Radicado
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46
9	390	2005	KR 5 X CL 17	24/11/2020	Radicado interventoria
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46

11. INFORME DE CALIDAD

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTION OBJETIVOS DE CALIDAD			
FECHA	30/11/2020	INFORME MENSUAL N°	8
OBJETIVO N°1	Cumplir con los plazos estipulados	META	DIAS DE RETRASO
		2 días	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON RETRASO			
OBJETIVO N°2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		2 quejas	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			
OBJETIVO N°3	Cumplir con especificaciones técnicas y manuales de diseño del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		cumplir con especificaciones técnicas, manuales de diseño y normas del contrato	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			

11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
N/A	13/11/2020	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	LAURA LILIANA JUNCA	Ing. Camilo Rosario	X		LAURA LILIANA JUNCA	13/11/2020	retroalimentación de la base de datos	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	19/11/2020	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	LAURA LILIANA JUNCA	Ing. Camilo Rosario	X		LAURA LILIANA JUNCA	19/11/2020	proceso de selección del personal	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	13/11/2020	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	ANGELA MARÍA CAICEDO CASTILLO	Ing. Camilo Rosario	X		ANGELA MARÍA CAICEDO CASTILLO	19/11/2020	últimas directrices de la Secretaría Distrital de Movilidad en	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS

N/A	19/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/11/2020	DEFINICIONES SOTAVENTO: Vie, 13 de nov de 2020 a las 11:00am – 12:00pm	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	17/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	17/11/2020	CORTE DE OBRA OCTUBRE	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	117/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	17/11/2020	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mié 18 de nov de 2020 8am - 9:30am	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORRE'
N/A	18/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	18/11/2020	informe semanal	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	19/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/11/2020	Corte de obra 2	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	23/11/2020	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	LAURA LILIANA JUNCA	Ing. Camilo Rosario	X		LAURA LILIANA JUNCA	23/11/2020	Solicitamos amablemente si nos pueden facilitar una base de datos más reciente d	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	24/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	24/11/2020	Informe mensual N°7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	24/11/2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD - PIV INGENERIA	Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	24/11/2020	Resolucion N° 530 del 6 de Noviembre de 2020	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	24/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	24/11/2020	Programación de actividades KR 17 X CL 71 BIS SUR	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	24/11/2020	Secretaría Distrital de Movilidad	Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	24/11/2020	INTERSECCION AV CALLE 63 x CARRERA 50	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	25/11/2020	Secretaría Distrital de Movilidad	Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	25/11/2020	Facturas corte 2 contrato 2019-1874	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	26/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	26/11/2020	Programaciones	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
N/A	26/11/2020	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	26/11/2020	Actas de comité de obra 11, 18 Y 24 nov	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS

11/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Acta de comité 11 de noviembre de 2020		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS - LEGALES
11/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Acta de comité 11 de noviembre de 2020		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS - LEGALES
11/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Puntos en vía a construir P736 - TV 42 X CL 12 y P352 - TV 53 x CL 2	X		11/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
10/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación de PAC bimensual	X		11/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	resultado de los indicadores de gestión del mes de octubre de 2020	X		12/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: OBRAS SEMAFORIZACION - PREDIO CEMEX	X		13/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	OBRAS COMPLEMENTARIAS SEMAFORIZACION KR 116 X DG 16		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	SOLICITUD - IMPLEMENTACION TAPA DE CAJA DE PASO	X		13/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/11/2020	PIV-IMS-20191810-0359	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud registros plan de calidad		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS CORRESPONDENCIA II
13/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	PMT EMERGENCIA - CONTRATO SEMAFORIZACION 2019 1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Perforación Av Boyacá		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Ensayos de laboratorio		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	informe semanal	X		15/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	CORTE DE OBRA OCTUBRE	X		15/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
15/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Cuenta de consultoría 2		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 17 de nov de 2020 9:30am - 10:30am		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

21/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Radicado cuentas de corte 2		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Alcance PMT 260-2054-KR 13 X CL 57	X		21/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Alcance PMT 453-2217-TV 24 X CL 53B		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Replanteo 404-2762-KR 16 X AC 32 y 432-2762-KR 17 X AC 32		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	LUZ DARY VASQUEZ	Ing. Camilo Rosario	Observaciones diseño cra 50B x calle 182	X		24/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Visita de acompañamiento 45 2217 TV 24 X CL 53B		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	PMT EMERGENCIA - Carrera 17 x Calle 71 Bis Sur		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
24/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	las actas realizadas para el comité se seguimiento de obra		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
24/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	adjunto el acta correspondiente al 11 de nov para su revisión y firma.		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
24/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Actas de comité de obra 11 y 18 de noc		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS-LEGALES
24/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	INTERSECCION AV CALLE 63 x CARRERA 50	X		25/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
24/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación de actividades KR 17 X CL 71 BIS SUR	X		24/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
24/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Resolucion N° 530 del 6 de Noviembre de 2020		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
25/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	CRISTIAN CAMILO BELLO MONTOYA	Facturas corte 2 contrato 2019-1874		X	28/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Visita intersección P352-TV 53 x CL 2 lun 30 de nov de 2020 9am - 10:30am		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/11/2020	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programaciones	X		26/11/2020		CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

037

debido a las razones expuestas en los diferentes comunicados entre la interventoría y el contratista en donde se refleja que hoy no se ha iniciado la ejecución de actividades de obra.

3. Actualmente nos encontramos a la espera de la orden de trabajo N°3.

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES DE OBRA

039

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°30 - CONTRATO 2019-1874

DEL 2 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2020

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
19	1102	3669	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	Complemento peatonal Serequiereesquemaderedoseléctricasparaconocerpuntos de conexión de la nueva infraestructura	2	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		45%	$ 173.537.457
28			KR 17 X CL 71B BIS SUR	EMERGENCIA	3	28/01/2020	28/01/2022	28/10/2020	7/11/2020	3/11/2020	7/11/2020	3/11/2020		100%	$ 4.117.274

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°31 - CONTRATO 2019-1874

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
19	1102	3669	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	Complemento peatonal Serequiereesquemaderedeseléctricasparaconocerpuntos de conexión de la nueva infraestructura	2	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		55%	$ 173.537.457
28			KR 17 X CL 71B BIS SUR	EMERGENCIA	3	28/01/2020	28/01/2022	28/10/2020	7/11/2020	3/11/2020	7/11/2020	3/11/2020	7/11/2020	100%	$ 4.117.274

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

150

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°32 - CONTRATO 2019-1874

DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
1	447	2735	TV 21 X DG 45D	Solución de obstrucciones e instalación de bajante	1	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	12/01/2021	21/11/2020	5/12/2020			4%	$ 5.748.704
15	260	2054	KR 13 X CL 57	EN EL PLANO ELECTRICO SE NOESTA LA RECUPERACION DE REDES DE SEMAFORIZACION Y CAJAS DE PASO	1	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	12/12/2020	21/11/2020	5/12/2020			4%	$ 4.635.632
19	1102	3669	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	Complemento peatonal Serequiereesquemaderedeseléctricasparaconocerpuntos de conexión de la nueva infraestructura	2	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		85%	$ 173.537.457
22	818	3464	KR 69B x AC 26 S	Correctivo Construcción de base para poste	2	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		4%	$ 744.640
26	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	Setienefactibilidaddecodensa,eltramiteloculminala SDM Alta prioridad	3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	26/11/2020	20/11//2020	26/11/2020	20/11//2020		50%	$ 56.517.864
29	177	1194	AK 15 X CL 77		3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	14/01/2020	21/11/2020	7/12/2020			4%	$ 24.960.732
30	453	2217	TV 24 X CL 53B		3	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021					4%	$ 48.465.055

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

042

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°33 - CONTRATO 2019-1874

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
1	447	2735	TV 21 X DG 45D	Solución de obstrucciones e instalación de bajante	1	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	12/01/2021	21/11/2020	5/12/2020	30/11/2020		15%	$ 5.748.704
13	404	2762	KR 16 X AC 32	CON PLANO INTERSECCIÓN DOBLE:kr16ykr17 EL BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEA DOS A AL COSTADO SUR DEL SEPARADOR AC32. EN KR16 EL BICICARRIL SEA DOS A ALANDÉN COSTADO ORIENTAL. CONSTRUIR cinco(5)BASES ALARGAR EL SEPARADOR ORIENTAL RECORTAR SEPARADOR OCCIDENTAL. CONSTRIUR OCHO (8) RAMPAS.	1	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020		10%	$ 16.647.674
14	432	2762	KR 17 X AC 32	CON PLANO.	1	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020		10%	$ 15.290.365
15	260	2054	KR 13 X CL 57	EN EL PLANO ELECTRICO SE NUESTRA LA RECUPERACION DE REDES DE SEMAFORIZACION Y CAJAS DE PASO	1	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	12/12/2020	30/11/2020	5/12/2020	30/11/2020		5%	$ 4.635.632
19	1102	3669	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	Complemento peatonal Serequiereesquemaderedeseléctricasparaconocerpuntos de conexión de la nueva infraestructura	2	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		90%	$ 173.537.457
22	818	3464	KR 69B x AC 26 S	Correctivo Construcción de base para poste	2	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	13/11/2020	7/01/2021	20/11/2020		70%	$ 744.640
26	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	Setienefactibilidaddecodensa,eltramiteloculminala SDM Alta prioridad	3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	26/11/2020	20/11//2020	26/11/2020	20/11//2020	26/11/2020	95%	$ 56.517.864
29	177	1194	AK 15 X CL 77		3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	14/01/2020	21/11/2020	7/12/2020	21/11/2020		15%	$ 24.960.732
30	450 / 453	2217	TV 24 X CL 53B Y C		3	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	21/11/2020	23/12/2020	21/11/2020		10%	$ 48.465.055

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES DE PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

044

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 30 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 31 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
6	1109	3665	AV.BOYACA X KR 33	15/09/2020	141574			
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	EN TRAMITE	27/10/2020	Radicado en interventoria		
9	390	2005	KR 5 X CL 17	EN TRAMITE	27/10/2020	Requiere modelo		
18	260	2054	KR 13 X CL 57	EN TRAMITE	27/10/2020	Radicado en interventoria		
21	650	2688	KR 50 x CL 24	EN TRAMITE		Requiere modelo		
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	EN TRAMITE	27/10/2020	Radicado en interventoria		
24	643	1876	AK 104 x AC 145	EN TRAMITE	27/10/2020	Requiere modelo		
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	EN TRAMITE	27/10/2020	Radicado en interventoria		
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	EN TRAMITE	27/10/2020			
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	EN TRAMITE	27/10/2020			
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	EN TRAMITE	27/10/2020	Radicado en interventoria		
30	177	1194	AK 15 X CL 77	EN TRAMITE	27/10/2020			

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 31 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 9 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46			
9	390	2005	KR 5 X CL 17	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre			
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46			
21	650	2688	KR 50 x CL 24	NEGADA POR IDU POR OBRAS PARALELAS				
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre			
24	643	1876	AK 104 x AC 145	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre			
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	13/11/2020	COOS 46			
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	13/11/2020	COOS 46			
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	13/11/2020	COOS 46			
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	7/11/2020	COOS EMERGENCIA			
30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46			
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO				

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 32 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 17 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46			
9	390	2005	KR 5 X CL 17	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre			
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46			
21	650	2688	KR 50 x CL 24	NEGADA POR IDU POR OBRAS PARALELAS				
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre			
24	643	1876	AK 104 x AC 145	EN TRAMITE	a radicar 24 de noviembre			
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	13/11/2020	COOS 46			
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	13/11/2020	COOS 46			
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	13/11/2020	COOS 46			
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	7/11/2020	COOS EMERGENCIA			
30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46			
31			KR 17 X CL 71B BIS SUR	28/10/2020	COOS EMERGENCIA			
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO				

250

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 33 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 24 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46			
9	390	2005	KR 5 X CL 17	24/11/2020	Radicado interventoria			
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46			
21	650	2688	KR 50 x CL 24	NEGADA POR IDU POR OBRAS PARALELAS				
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	24/11/2020	Radicado interventoria			
24	643	1876	AK 104 x AC 145	24/11/2020	Radicado interventoria			
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	13/11/2020	COOS 46			
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	13/11/2020	COOS 46			
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	13/11/2020	COOS 46			
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	7/11/2020	COOS EMERGENCIA			
30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46			
31			KR 17 X CL 71B BIS SUR	28/10/2020	COOS EMERGENCIA			
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	24/11/2020	COOS EMERGENCIA			
36		-	KR 116A X DG 16	24/11/2020	COOS EMERGENCIA			

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES DE DISEÑO

049

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 30 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 31 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	SI	NO						
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	SI	NO						
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	NO	NO						
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	NO	NO						
			KR 50X CL 63	SI	SI	SI	NO	NO						

050

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 31 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	NO						
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	NO						
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	NO	NO						
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	NO	NO						
			AK 50 X AC 63	SI	SI	SI	NO	NO						

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 32 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020			23/11/2020			100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	NO						100%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	NO	NO						98%

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 33 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 508 X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	24/11/2020			23/11/2020			100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	NO						100%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	NO						100%

ANEXO 4. RESULTADOS ENSAYOS DE

054

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

Bogota DC Noviembre 30 de 2020

Señores
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
PROYECTO SEMAFORIZACION
Ciudad

Respetados Señores

Hacemos entrega de los ensayos realizados a las muestras tomadas para el contrato en referencia tal como se especifican a continuación

FECHA	MUESTRA	LOCALIZACION	ENSAYOS REALIZADOS
VARIOS	SUB-BASE	USME	DENSIDADES EN EL TERRENO

Sin otro particular nos suscribimos, deseando éxitos en sus labores diarias.

Cordialmente

GEOCRETOS INGENIERIA S.A.S.
NIT.: 900.802.749 - 4

RICARDO LARROTA MANRIQUE
Gerente
GEOCRETOS
Laboratorio de Ingenieria Civil

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. GDEN-120201-154-11

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Nov 23 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION USME	**FECHA DE INFORME**	Nov 30 de 2020
LOCALIZACION	AV BOYACA CON DG 62 SUR		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2	3	4		
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA		
Abscisa (aproximada por lab)		S-W	CENTRO	CENTRO	S-E		
Peso frasco + arena inicial	gr	5818	5727	5675	5598		
Peso frasco + arena final	gr	2716	2847	2901	2917		
Peso total arena usada	gr	3102	2880	2774	2681		
Constante del cono	gr	1602	1602	1602	1602		
Peso arena en el hueco	gr	1500	1278	1172	1079		
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42	1,42		
Volumen del hueco	cm	1056	900	825	760		
Peso material humedo	gr	2282	1973	1807	1673		
Humedad del material	%	7,8	8,2	7,8	8		
Peso material seco	gr	2117	1823	1676	1549		
Densidad del material	gr/cm	2,004	2,026	2,031	2,039		
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098	2,098		
Grado de compactacion	%	**95,5**	**96,6**	**96,8**	**97,2**		

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

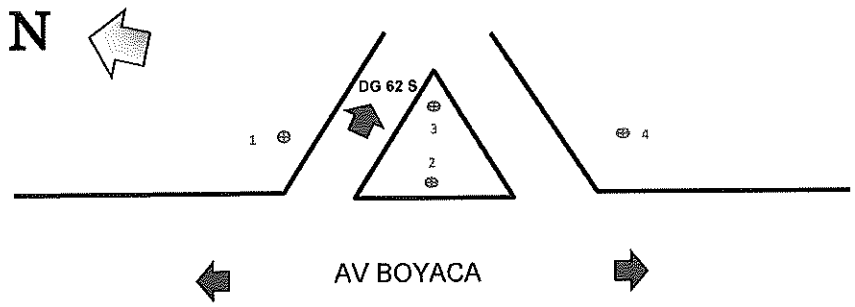

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	GEOCRETOS
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. **GDEN-120201-154-9**

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Nov 5 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION USME	**FECHA DE INFORME**	Nov 30 de 2020
LOCALIZACION	AV BOYACA CON CL 60C SUR		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)							
Peso frasco + arena inicial	gr	6084	6052	6031			
Peso frasco + arena final	gr	2991	3104	2742			
Peso total arena usada	gr	3093	2948	3289			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1491	1346	1687			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1050	948	1188			
Peso material humedo	gr	2292	2154	2576			
Humedad del material	%	8,5	8,2	8,6			
Peso material seco	gr	2112	1991	2372			
Densidad del material	gr/cm	2,012	2,100	1,997			
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098			
Grado de compactacion	%	**95,9**	**100,1**	**95,2**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

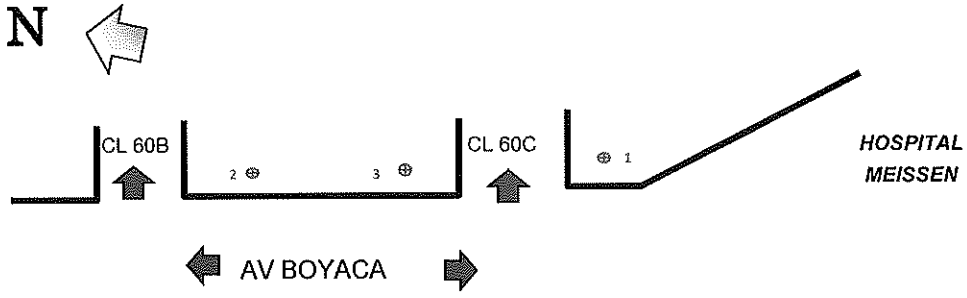

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	GEOCRETOS
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL
geocretoslaboratorio@gmail.com pagina web www.geocretos.com.co

ANEXO 5. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PROVEEDORES Y CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL LABORATORIO

058

HORMIGON ANDINO S.A.

RESULTADO DE PRUEBAS A LA COMPRESION DE PLANTA

CLIENTE AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

FECHA DE CORTE OCTUBRE 29 DE 2020

OBRA SEMAFORIZACION CL 53 CR 24 GALERIAS

# MUESTRA	FECHA	DISEÑO	REMISION	MIXER	7 DIAS				14 DIAS				28 DIAS			
					f'c 1	f'c 2	f'c PROM	% DES.	f'c 1	f'c 2	f'c PROM	% DES.	f'c 1	f'c 2	f'c PROM	% DES.
5619	18-sep-20	3000 GFINA FRAGUADO NORMAL	60083169	527	193	174	183	✓87%	210	238	224	✓107%	231	255	243	✓116%
5621	25-sep-20	3000 GFINA FRAGUADO NORMAL	60083184	527	166	156	161	✓77%	188	183	186	✓88%	219	228	223	✓106%
5629	1-oct-20	3000 GFINA FRAGUADO NORMAL	60083199	206	159	159	159	✓76%	172	191	182	✓86%	238	242	240	✓114%

APROBO

ING. DIEGO RAUL CASAS VERA
DIRECTOR CONTROL DE CALIDAD

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

Bogota DC Noviembre 30 de 2020

Señores
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
PROYECTO SEMAFORIZACION
Ciudad

Respetados Señores

Hacemos entrega de los ensayos realizados a las muestras tomadas para el contrato en referencia tal como se especifican a continuación

FECHA	MUESTRA	LOCALIZACION	ENSAYOS REALIZADOS
VARIOS	SUB-BASE	USME	DENSIDADES EN EL TERRENO

Sin otro particular nos suscribimos, deseando éxitos en sus labores diarias.

Cordialmente

GEOCRETOS INGENIERIA S.A.S.
NIT.: 900.802.749 - 4

RICARDO LARROTA MANRIQUE
Gerente
GEOCRETOS
Laboratorio de Ingenieria Civil

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. **GDEN-120201-154-11**

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Nov 23 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION USME	**FECHA DE INFORME**	Nov 30 de 2020
LOCALIZACION	AV BOYACA CON DG 62 SUR		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2	3	4		
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA		
Abscisa (aproximada por lab)		S-W	CENTRO	CENTRO	S-E		
Peso frasco + arena inicial	gr	5818	5727	5675	5598		
Peso frasco + arena final	gr	2716	2847	2901	2917		
Peso total arena usada	gr	3102	2880	2774	2681		
Constante del cono	gr	1602	1602	1602	1602		
Peso arena en el hueco	gr	1500	1278	1172	1079		
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42	1,42		
Volumen del hueco	cm	1056	900	825	760		
Peso material humedo	gr	2282	1973	1807	1673		
Humedad del material	%	7,8	8,2	7,8	8		
Peso material seco	gr	2117	1823	1676	1549		
Densidad del material	gr/cm	2,004	2,026	2,031	2,039		
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098	2,098		
Grado de compactacion	%	**95,5**	**96,6**	**96,8**	**97,2**		

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

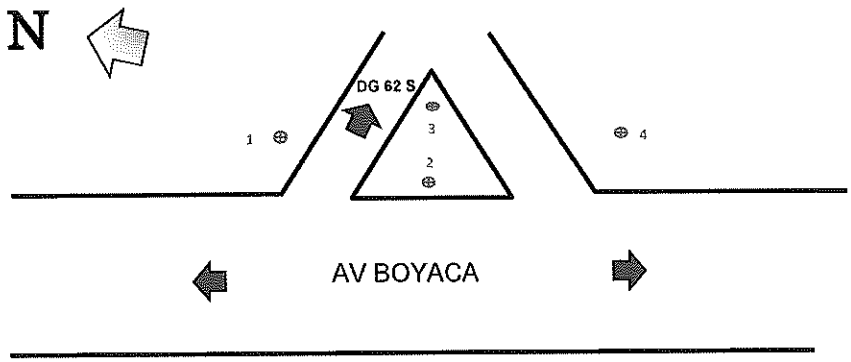

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL
geocretoslaboratorio@gmail.com pagina web www.geocretos.com.co

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. **GDEN-120201-154-9**

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Nov 5 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION USME	**FECHA DE INFORME**	Nov 30 de 2020
LOCALIZACION	AV BOYACA CON CL 60C SUR		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)							
Peso frasco + arena inicial	gr	6084	6052	6031			
Peso frasco + arena final	gr	2991	3104	2742			
Peso total arena usada	gr	3093	2948	3289			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1491	1346	1687			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1050	948	1188			
Peso material humedo	gr	2292	2154	2576			
Humedad del material	%	8,5	8,2	8,6			
Peso material seco	gr	2112	1991	2372			
Densidad del material	gr/cm	2,012	2,100	1,997			
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098			
Grado de compactacion	%	**95,9**	**100,1**	**95,2**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

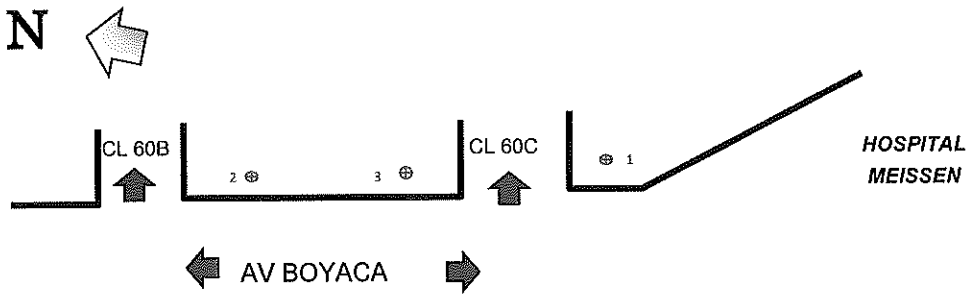

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	GEOCRETOS
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL
geocretoslaboratorio@gmail.com pagina web www.geocretos.com.co

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. GDEN-120201-154-7

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Oct 15 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION CALLE 183	**FECHA DE INFORME**	Nov 4 de 2020
LOCALIZACION	CALLE 183 CON KR 54D		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)		CALZADA SUR	CALZADA NORTE	SEPARADOR			
Peso frasco + arena inicial	gr	6588	6538	6492			
Peso frasco + arena final	gr	3258	3149	3305			
Peso total arena usada	gr	3330	3389	3187			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1728	1787	1585			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1217	1258	1116			
Peso material humedo	gr	2646	2714	2404			
Humedad del material	%	7,7	7,9	7,2			
Peso material seco	gr	2457	2515	2243			
Densidad del material	gr/cm	2,019	1,999	2,009			
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098			
Grado de compactacion	%	**96,2**	**95,3**	**95,8**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

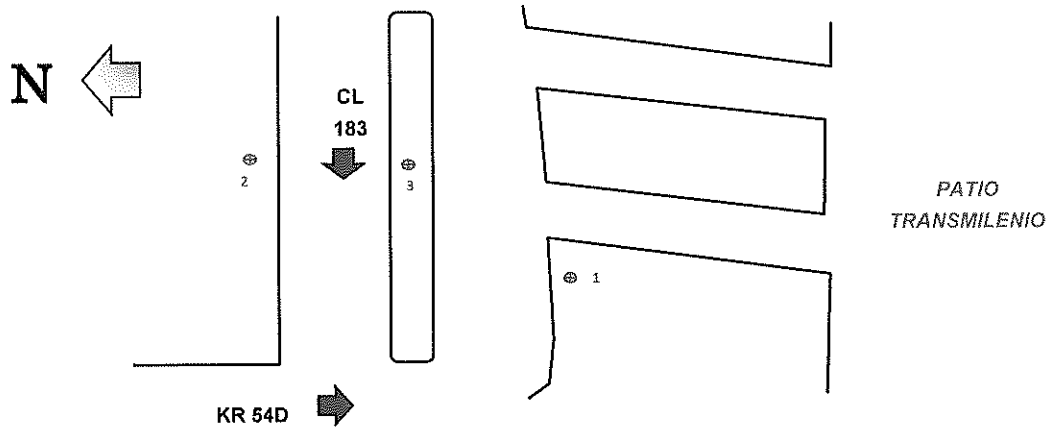

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL
geocretoslaboratorio@gmail.com pagina web www.geocretos.com.co

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. GDEN-120201-154-4B

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Sep 28 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION CALLE 53	**FECHA DE INFORME**	Oct 5 de 2020
LOCALIZACION	CALLE 53 CON KR 20		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1					
Capa		ULTIMA					
Abscisa (aproximada por lab)		S-E					
Peso frasco + arena inicial	gr	6425					
Peso frasco + arena final	gr	3371					
Peso total arena usada	gr	3054					
Constante del cono	gr	1602					
Peso arena en el hueco	gr	1452					
Densidad de la arena	gr/cm	1,42					
Volumen del hueco	cm	1023					
Peso material humedo	gr	2246					
Humedad del material	%	9,1					
Peso material seco	gr	2059					
Densidad del material	gr/cm	2,013					
Densidad max del material	gr/cm	2,098					
Grado de compactacion	%	**96,0**					

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

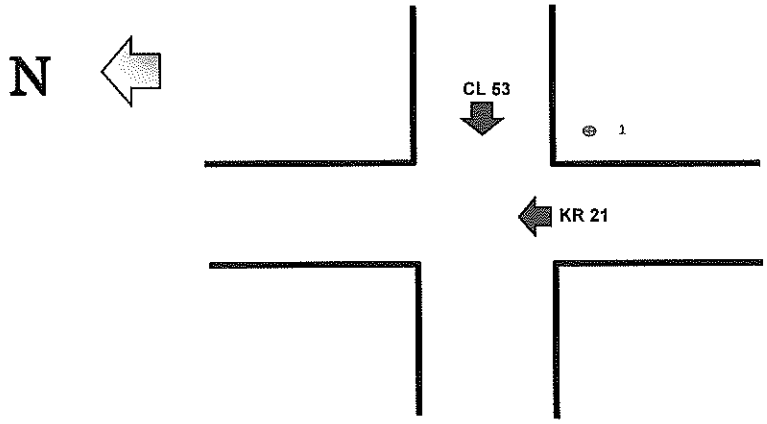

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL
geocretoslaboratorio@gmail.com pagina web www.geocretos.com.co

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

INV - E - 162


REF. **GDEN-120201-154-3**

CLIENTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	**FECHA DE TOMA**	Sep 24 de 2020
OBRA	SEMAFORIZACION CALLE 53	**FECHA DE INFORME**	Sep 28 de 2020
LOCALIZACION	CALLE 53 CON KR 21		
MATERIAL	SUB-BASE	**MUNICIPIO**	BOGOTA DC

DENSIDADES EN EL TERRENO
METODO CONO Y ARENA

Densidad No		1	2				
Capa		ULTIMA	ULTIMA				
Abscisa (aproximada por lab)		N-E	S-E				
Peso frasco + arena inicial	gr	6580	6537				
Peso frasco + arena final	gr	3174	3417				
Peso total arena usada	gr	3406	3120				
Constante del cono	gr	1602	1602				
Peso arena en el hueco	gr	1804	1518				
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42				
Volumen del hueco	cm	1270	1069				
Peso material humedo	gr	2813	2380				
Humedad del material	%	9,1	8,3				
Peso material seco	gr	2578	2198				
Densidad del material	gr/cm	2,030	2,056				
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098				
Grado de compactacion	%	**96,7**	**98,0**				

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

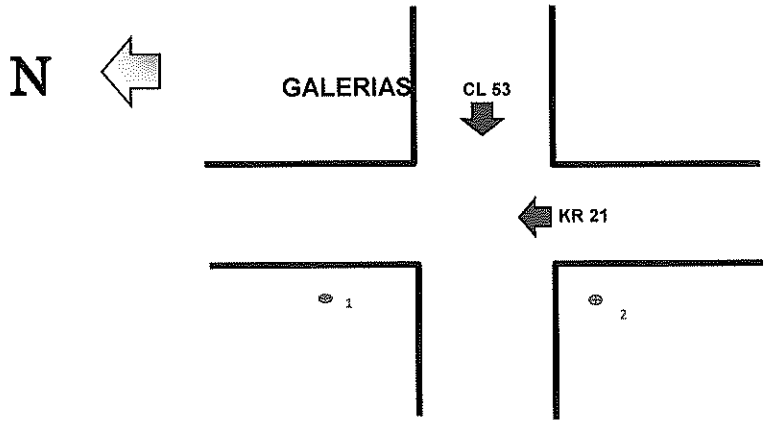

NOTA

PEDRO ESTEPA	ING RICARDO LARROTA	GEOCRETOS
LABORATORISTA	REVISO	APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL
geocretoslaboratorio@gmail.com pagina web www.geocretos.com.co

TERRATEST SAS

ACREDITADO ONAC

Fecha: 2019-10-03

Versión N°.: 14

FT - 131A

INFORME DE CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

Orden de ensayo No.: 241-20

Procedimiento de Ensayo

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINO

CLIENTE:	CONSTRITURAR S A S				
PROYECTO:	977 PLANTA CONSTRITURAR				
DIRECCIÓN:	CALLE 72 No. 10-76				
LOCALIZACIÓN:	NA				
APIQUE:	NA	BARRENO:	NA	PERFORACIÓN:	NA
DESCRIPCIÓN VISUAL:	GRAVA ARENOSA HABANA			TIPO DE MATERIAL:	B 600
FECHA DE RECEPCIÓN:	2020-05-19			PROCEDENCIA:	PLANTA CONSTRITURAR
FECHA INICIO ENSAYO:	2020-06-26	FECHA INICIO ENSAYO:	2020-06-26	PROFUNDIDAD(m):	NA

MUESTRA N°: 3


ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRIA POR TAMIZADO			
NTC-77:2018	-	Ms. (g)	13614,6
INV E-213-13	X	Mb. (g)	13468,0
MATERIAL DESCARTADO		Mc. (g)	11958,0
Tamaño máximo (mm)		Mc. M1 Pasa el No. 4 (g)	4395,0
Cantidad (g)	-	Mc. M1 Pasa el No. 4 Retenida (g)	516,4
T °C	116		

CONVENCIONES	
Ms. g =	Masa Tamizada
Mb. g =	Masa Seca Inicial
Mc. g =	Masa Seca Lavada
Md. g =	Masa Recipiente
T. °C =	Temperatura de secado

Tamiz		Masa Retenida (g)	Masa Real Retenida (g)	% Retenido	% Retenido Unificado	% Pasa Unificado	Especificación (%)	
in / No.	mm							
3"	75,00	-	0,0	0,0	0,0	100	-	-
2 1/2"	63,00		0,0	0,0	0,0	100	-	-
2"	50,00		0,0	0,0	0,0	100	-	-
1 1/2"	37,50		0,0	0,0	0,0	100	-	-
1"	25,00	844,00	844,0	6,3	6,3	94	-	-
3/4"	19,00	1592,00	1592,0	11,8	18,1	82	-	-
1/2"	12,50	2016,00	2015,0	15,0	33,1	67	-	-
3/8"	9,50	1192,00	1192,0	8,9	42,0	58	-	-
Nº.4	4,75	1914,00	1914,0	14,2	56,2	44	-	-
Nº.10	2,00	223,11	1210,0	9,0	65,2	35	-	-
Nº.40	0,425	137,13	743,7	5,5	70,7	29	-	-
Nº.100	0,150	336,79	1794,0	13,3	84,0	16	-	-
Nº 200	0,075	119,33	647,2	4,8	88,8	11,0	-	-
FONDO		0,80	4,3					
FONDO TOTAL		1513,10	1513,1					

Tamaño Máximo (mm)	37,50	
GRAVA		
3" - Nº4 (%)	56,2	
Gruesa (%)	3" - 3/4"	18,1
Fina (%)	3/4" - No. 4	38,1
ARENA		
No.4 - 200 (%)	32,6	
Gruesa(%)	No.4 - No.10	9,0
Media (%)	No.10 - No.40	5,5
Fina (%)	No.40 - No.200	18,1
FINOS		
<0,075 mm (%)	11,0	
D_{60}	10,097 mm	60 %
D_{30}	0,656 mm	30 %
D_{10}	NO APLICA	10 %
C_u	NO APLICA	
C_c	NO APLICA	

GRANULOMETRÍA

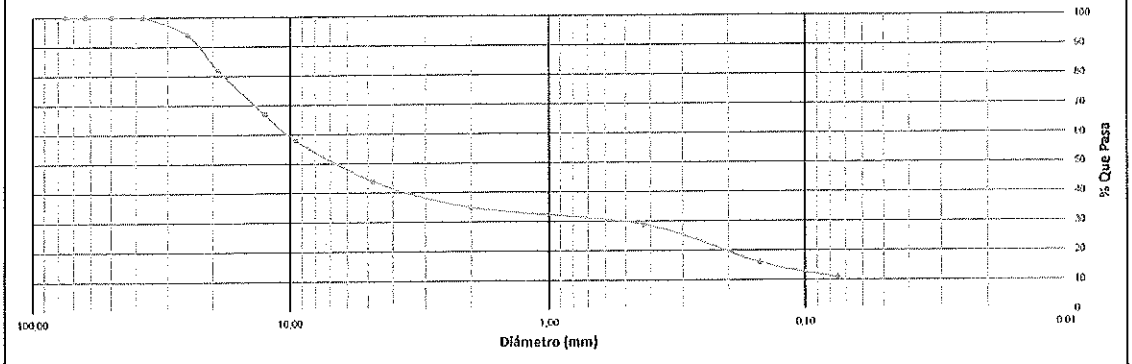

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%	
*INCERTIDUMBRE DE ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO GRAVAS ± %	4,1
*INCERTIDUMBRE DE ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ARENAS ± %	2,0
*INCERTIDUMBRE DE ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO FINOS ± %	2,9
*INCERTIDUMBRE DE ENSAYO PASA TAMIZ N° 200 ± %	2,9

OBSERVACIONES: MUESTRA

REVISÓ: JEFE DE LABORATORIO: ING. PABLO ANDRES GORONEL VIVAS

ESTE ENSAYO NO ESTÁ AMPARADO POR EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN DE TERRATEST S.A.S
LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SÓLO SE REFIEREN A LAS MUESTRAS RECIBIDAS

TERRATEST SAS

ONAC

Fecha:	2017-09-13
Versión Nº.:	11
	FT - 03B

INFORME DE RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS GRUESOS POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1½") Y MAYORES DE 19 mm (¾")

Orden de ensayo No.: 241.20

Norma(s) Técnica(s) de Referencia Aplicada(s) — Procedimiento: PT - 04

INV E - 218-13	x	INV E - 219-13	-	NTC- 98:2012	-	NTC - 93:2013	-

CLIENTE: CONSTRITURAR S A S

PROYECTO: 977 PLANTA CONSTRITURAR

DIRECCIÓN: CALLE 72 No 10-70

LOCALIZACIÓN: NA

APIQUE: NA **BARRENO:** NA **PERFORACIÓN:** NA **MUESTRA Nº:** 3

DESCRIPCIÓN VISUAL: GRAVA ARENOSA HABANA **TIPO DE MATERIAL:** B-600

FECHA DE RECEPCIÓN: 2020-06-10 **PROCEDENCIA:** PLANTA CONSTRITURAR

FECHA INICIO ENSAYO: 2020-06-23 **FECHA FIN DE ENSAYO:** 2020-06-23 **PROFUNDIDAD(m):** NA NA

CONDICION DEL ENSAYO (SECO O HUMEDO)	SECO	SECO	HUMEDO
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	25 mm	25 mm	-
GRADACIÓN USADA	A	A	-
Nº ESFERAS	12	12	-
Nº REVOLUCIONES	100	500	-
P1= MASA DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO (g)	5007	5007	-
P2= MASA DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE ENSAYO (g)	4505	2828	-
P1-P2 = PÉRDIDA POR ABRASION E IMPACTO (g)	502	2179	-
DESGASTE = (P1-P2)/P1 * 100 (%)	10,0	43,6	-
RELACIÓN DE UNIFORMIDAD:	0,2		
RELACIÓN HÚMEDO/SECO:			

DATOS SOBRE LA GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

TAMAÑOS		MASA DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, (g)						
		GRANULOMETRIA						
		INVE 218-13 Y NTC 98-12				INVE 219-13 Y NTC 93-13		
PASA	RETIENE	A	B	C	D	1	2	3
3"	2 1/2"					2500±50		
2 1/2"	2"					2500±50		
2"	1 1/2"					5000±50	5000±50	
1 1/2"	1"	1250±25					5000±25	5000±25
1"	3/4 "	1250±25						5000±25
3/4"	1/2"	1250±10	2500±10					
1/2"	3/8"	1250±10	2500±10					
3/8"	1/4"			2500±10				
1/4"	No 4			2500±10				
No 4	No 8				5000±10			
TOTAL MUESTRA		**5000±10**	**5000±10**	**5000±10**	**5000±10**	**10000±100**	**10000±75**	**10000±50**
Nº ESFERAS		12	11	8	6	12	12	12
CARGA ABRASIVA (g.)		5000±25	4584±25	3330±20	2500±15	5000±25	5000±25	5000±25
Nº REVOLUCIONES		500	500	500	500	1000	1000	1000

OBSERVACIONES: NINGUNO

INCERTIDUMBRE TOMANDO UN K2 Y UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95%: 2,5	INV E 219-13 (%) NTC-93 2013 (%)	+/- 0,28
	INV E 218-13 (%) NTC-98 2012 (%)	+/- 0,1

REVISÓ: JEFE DE LABORATORIO: ING. PABLO ANDRES CORONEL VIVAS

ESTE ENSAYO NO PODRÁ REPRODUCIRSE SIN LA APROBACIÓN ESCRITA DE TERRATEST S.A.S

LOS RESULTADOS DE ESTE ENSAYO SOLO SON APLICABLES A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: [X] Proceso [ ] Producto [ ] Suministro [ ] Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 30 de noviembre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Caracteristicas del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Durante el periodo entre el 16 al 30 de noviembre no se presentaron observaciones en la obra

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	[ ] Aceptado	[ ] Rechazado	[ ] Reprocesado	[ ] Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Prado	NOMBRE: Mariana Gamba	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 03 Noviembre 2020

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		
Apariencia		X		
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se descarga en el acopio un viaje de 7m3 de grava el cual se observa que su textura y granulometria no cumple con los condiciones de calidad para la obra.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se procedera a devolver el material y reemplazar por uno de buena calidad.

Fecha Programada: 03 Noviembre. Responsable: Yelma Jones

Verificación de acción tomada:

Se verifica el nuevo material el cual si cumple con las caracteristicas de calidad solicitado

Fecha toma de acción: 04 Noviembre

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Lider calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Ma. Camila Gamb	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 19 Octubre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		Acabado de tapas deteriorados
Apariencia		X		
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza visita de inspeccion a la bodega de materiales para verificar las tapas para cajas de pozo

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se ordena la demolicion de 20 tapas que no cumplen con las caracteristicas de calidad

Fecha Programada: 19-Octubre 2020 Responsable: Melina Jaraz

Verificación de acción tomada:

En la misma fecha de la inspeccion se realiza la demolicion de las tapas que no cumplen.

Fecha toma de acción: 19-Octubre 2020

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Magamila Gamba	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Lider de calidad	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: Señalización — Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: — Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: — Fecha: 13-10-2020

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Caracteristicas del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		los acabados de algunos tapas estaban deteriorados por
Apariencia		X		
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza inspección en intersección calle 53 x carrera 24 18-17 y 20 en la cual se observó que algunos tapas de los que se instalaron tenían nuevos tenían acabados en deterioro

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se decide reemplazar los tapas existentes por otros tapas nuevos que estuvieran exactamente en buen estado y se procede a demoler 6 (seis) tapas retiradas

Fecha Programada: 13-10-2020 — Responsable: Melisa Jaimes

Verificación de acción tomada:

Se realiza inspección el 16 de Octubre para asegurar que se haya hecho el cambio de todos los tapas observados

Fecha toma de acción: 16-10-2020

Observaciones:

Se solicita revisión de los tapas disponibles en el almacén para identificar otros productos no conformes.

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pineda	NOMBRE: Maria Camila Gamba	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro	
Descripción:	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 05 octubre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros	X			
Apariencia		X		se Adelon nuevo en mal estado
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza verificación de orden fundido en la calle 53 x cra 24 el día 05 de octubre, en el cual se observa que por las lluvias en la tarde del 05 de octubre y por acción de la escorrentía en concreto se lavó y dañó el acabado

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se ordena demolen la esquina noroccidental de la intersección calle 53 x cra 24

Fecha Programada: 09 Octubre 2020 Responsable: Melina Jenez

Verificación de acción tomada:

Se realiza visita de seguimiento el 13 de octubre para verificar la fundida de la esquina

Fecha toma de acción: 09 Octubre de 2020

Observaciones:

Se solicita cubrir el concreto para con plastico para evitar su deterioro ante posibles lluvias

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Elizabeth Pineda	CARGO: Liderdo calidad	CARGO:
NOMBRE: Analista calidad	NOMBRE: Ma.camila Gamb	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

ANEXO 6. BITACORA DE OBRA

073

3-11-20 Km 19 X calle 60 c Sur

Costado occidental, se realiza una visita tecnica de alcantarillado con la ingeniera Angelica Maria Cuicedo de la central SDM, se ubicar la base para poste de los hilos 91 y 291 hacia el costado occidental dado la existencia de un sumidero de 3,40 m, la base se ubicara una vez finalice el Sumidero y a continuacion via la nave, su ubicacion sera hacia la isleta Proyectada en la ficha, Para el grupo 3, se solicita dejar dos carriles de despgo, En cuanto a la proyeccion de geotecnia para la KR 18T se define por parte de la SDM no realiza ninguna intervencion se realiza la instalacion de sardinel en el costado oriental en conformacion de material de SBG

4-11-20 Km 19 X calle 60 c Sur

Se realiza la instalacion de sardinel en el costado oriental y conformacion de material de SBG, esquina costado oriental instalacion de sardinel y excavacion manual en la isla del costado oriental.

observacion:

Se reporta daño a la red de gas natural en el costado oriental de "ruptura de un tubo de 1/2""

074

Escaneado con CamScanner

10-11-20 Kr 19 X calle 60 c Sur

Se realiza extendido de concreto hecho en obra e instalacion de bolardo MG3 en el costado oriental.

Kr 17 X 71 B Bis Sur

Se realiza la construccion de la caja de AUCE costado Sur, se realiza la instalacion de los postes separadores, se realiza la fundicion de los placas del separador y costados Sur y Norte. Se da por terminada la obra.

Javier Montes.
Interv. PIU.

9-11-20 9- Kr 19 X calle 60 c Sur

Se realiza instalacion de bordillo (bolardo) y extendido de concreto hecho en sitio en costado oriental.

10-11-09 Kr 19 X calle 60 c Sur

Se realiza instalacion de tuberia Ø 3 para Conexion de cajas, se realiza construccion de Caja sencilla costado nor occidental, Se realiza Perforacion horizontal costado sur occidental y Separador Sur, se realiza la conformacion del Separador occidental, se realiza la instalacion de bordillo en el Separador occidental

Escaneado con CamScanner

Se realiza la construcción de base para cortar
Se realizan instalación de tapón en el
costado sur occidental y lleno de concreto
3000 psi, se instalan bolardos de concreto
en el costado nor occidental y bolardos
metálicos en el costado sur occidental

17-11-20 Kr 19 x Calle 60 Csur

Se realiza la llenado de concreto 3000 psi
separador occidental, se realiza la instalación
de "tapón" tubería en separador occidental
Se realiza instalación de tubería de Φ3
en el separador sur se realiza construcción
de caja doble separador sur, se realiza
Construcción de base separador occidental
Se realiza instalación de bolardos separador
occidental, se realiza el llenado de concreto
en el separador sur,

Observación
PH ingeniería realiza el lanze para la
perforación horizontal pero no se
obtuvo éxito, debido a que se llego a una
Profundidad la cual no era la correcta.

18-11-20 Kr 19 x Calle 60 C sur

Se realiza la instalación de tubos 3" Φ
Se realiza la construcción de caja sencilla
en el separador sur, se realiza demolición
de Asfalto en el costado occidental

Escaneado con CamScanner

23-11-20 Kr 19 x Calle 60 csur

Se realiza instalacion de bolardos costados sur oriental, nor oriental y separador oriental
Se realiza cruce de diagonales arrojando los siguientes porcentajes de 93,4%, 96.5%, 96.8%, 97,2%. Se realiza el llenado de concreto 3000 psi en los costados sur oriental y separador oriental Se realiza la construccion de 2 bancas separado oriental y 1 sobre costado sur oriental

"Fontibon"

Se realize instalacion de tuberia de 3" ø y construccion de cajas sencillas

24-11-20 "Corex II"

Se realiza excavacion para instalacion de bases para poste

Kr 19 x Calle 60 csur

Se realiza demolicion de sardinel e instalacion costado sur oriental

Escaneado con CamScanner

44

29-11-20 En la [illegible] se realiza [illegible] horizontal [illegible] Sur oriental y Septentrional, se realiza división de [illegible]

Anexo

"Anexo"

Se realiza Perforación horizontal [illegible] de geotécnia

28-11-20 "Canex"

Se realiza instalación de boxes para [illegible] Septentrional Sur oriental, occidental, Septentrional Se dan por terminadas las actividades en este frente de obra

1 de mayo

Se realiza división de cada concreto, Se realiza conformación de terreno en base granular, y se instala Sardinel

078

Escaneado con CamScanner

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Diciembre 07 de 2020
Referencia : TUBO DUCTO CORR ELECT Y TEL 3"
Norma : NTC 3363
Lote: 10091.201112.3

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR	NTC 3358	mm	88,62 - 89.18	89.08
OVALAMIENTO MÁXIMO	NTC 3358	mm	1.60	0,34
DIÁMETRO INTERIOR	NTC 3358	mm	76.00	78.36
ESPESOR VALLE	NTC 3358	mm	0.60	1,13
ESPESOR INTERNO	NTC 3358	mm	0.40	1,15
ESPESOR EXTERNO	NTC 3358	mm	0.40	0,60
LONGITUD DEL TUBO	NTC 3358	mm	6000 - 6012	6010
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	89,72 - 90.28	89.73
OVALAMIENTO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	1.52	1,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	78,00 - 79.00	78.58
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	81.00	CUMPLE
APLASTAMIENTO	NTC 3254	%	60 % de Diámetro Externo	CUMPLE
CALIDAD EXTRUSIÓN, Apariencia	NTC 2983	Minutos	30 Minutos	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 3363	Visual	No desprendimiento de la pared	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO	NTC 3254	KN/m/m	414.00	1075.33
IMPERMEABILIDAD DE LAS UNIONES	NTC 3363	Psi	25 sin presentar fugas	CUMPLE
INFLAMABILIDAD	NTC 979	Visual	Autoextinguible	CUMPLE
ROTULADO	NTC 979	N/A	PVC GERFOR NO. COL. PVC DUCTO TELEFONICO Y ELECTRICO CORRUGADO D.E. 3" - 88 mm PS 414 KN/m/m (60 psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3363 - RETIE Res. 90708 LOTE ...	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra enviada.

Realizó:

Mónica Martínez

Mónica Martínez
Inspector de Conformidad.

Revisó y Aprobó:

Julian Burgos
Líder de conformidad.

ANEXO 7. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado con **CC** número **1019079604**, aportó en nombre de **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado(a) con **CC** número **1019079604** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2020-10** y salud **2020-10** de la siguiente manera:

Modalidad	Nombre de Administradora	Sal. Int.	Ing.	Ret.	T.D.	T.A.	S.L.N.	I.G.E.	L.M.	V.S.P.	V.T.	Inc.	Lic.	AFC	VCT	Días	IBC	Cotización	Tarifa Aplicada	Saldo Pendiente	Periodo	Número de Planilla	Fecha de Pago	Planilla Asistida
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar														0		30	$1.000.000	$20.000	$0	$0	Octubre - 2020	46212759	06/11/2020	N
EPS008	Compensar EPS														0		30	$1.000.000	$125.000	$0	$0	Octubre - 2020	46212759	06/11/2020	N
230301	Porvenir														0		30	$1.000.000	$160.000	$0	$0	Octubre - 2020	46212759	06/11/2020	N

El presente certificado se expide a los 6 días del mes Noviembre de 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

031

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-01, 01:39:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1033080742

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8819753110

PAGADO 01/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN ARTURO CHACIN QUINTERO		
Documento	CC1126123418	**Dirección**	CRA 95 75B-33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	1
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F.P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1126123418	FABIAN ARTURO CHACIN QUINTERO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 877.803	$ 109.800	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 877.803	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.300	$ 0	$ 250.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025050	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA D. C.	BOGOTA. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2020-11	2020-10	E	30/11/2020	46792030	TOTAL A PAGAR	
					3826.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES																			PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Inicio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	Fin	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Centro Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1014240034	SANCHEZ RUIC DAVID RICARDO	1	0			C																		25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-11	877.803	1	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
CC	1127977194	ESCOBAR CASTILLO KATHERINE	1	0			C																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	6.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	80730692	GARCIA ANGULO EDWIN GONZALO	1	0			C																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

Identificación		Sucursal		Teléfono	
Razón Social		Dirección		Fecha Pago	
Clase de Aportante		Ciudad		Periodo Salud	
Banco		No. Planilla		Periodo Pensión	
Total a Pagar		Total Intereses Mora		Estado	
Número Días en Mora					

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar

Totales

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
			1		$150.0								000	$150.0

Totales

PAGADO

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar

ISO / IEC 27001

Certificado Nº SI 306-1

084

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVID' L

Fecha creación: 2020-12-02, 08:26:00 a. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 1033899494

Periodo Cotización: 202010 **Periodo Servicio:** 202010

PAGADA 2020-11-19 20:48:15.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 19/11/2020, la empresa LUZ STELLA PINEDA BUSTOS, con documento de identificación CC1026260474, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINEDA BUSTOS LUZ STELLA, con CC 1026260474, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION (ING + PROTECCION)
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-30. 04:22:57 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1033612636

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020

PAGADO 23/11/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR EDUARDO VALLES MAYORGA		
Documento	CC79220093	**Dirección**	CR 8A #22 - 38 BARRIO LA CAÑADA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8211961
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79220093	OSCAR EDUARDO VALLES MAYORGA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.200.000	$ 150.000	0.522	$ 1.200.000	$ 6.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 192.000	$ 150.000	$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300	$ 0	$ 348.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.191.693
CASTRO CHAVARRO

APELLIDOS

MIXTER ALFONSO

NOMBRES

FIRMA

ESTATURA 1.70 G.S. RH O+ SEXO M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 03 MAR 1989
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

14-JUN-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/11/2020, el empleador GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS identificado con NIT número 901136388 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
2907687	02/11/2020	Reingresos

DETALLE

TIPO IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1024491993	MIXTER ALFONSO CASTRO CHAVARRO	877802	AYUDANTE DE OBRA	2020-11-03

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Noviembre del año 2020.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

088

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	Obra1	003	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 23 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-11	2020-10	E	30/11/2020	46793389	$5.174.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Activo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRL	CORRECCIÓN	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002316047	CAPATAZ PAYARES KOINER	1	0			S	X															23-14	56,521	0,400	0	0	0	0	EPS002	56,521	2,400	14-11	56,521	5	4,100	CCF24	56,521	2,400	0	0	0	0	0
CC	1002444461	HOYOS URIELES JOSE LUIS	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS037	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1002444463	HOYOS URIELES LUIS ALFREDO	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS005	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1002777836	PUMEJ KAYO JAIDER KARITH	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS034	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1007045677	OUIROZ ROBERT ANTONIO	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS017	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1014279562	RADILLO FLOREZ ROMAN JAVIER	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS005	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	80272010	MARTINEZ ARRIETA JHON JADER	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS002	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	91536053	OLIVEROS PEREZ ESTEVENSON	1	0			S																231001	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS017	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	56553653	OVIEDO CORDERO HUGO ALBERTO	1	0			S	X															230201	351,122	56,200	0	0	0	0	EPS037	351,122	14,100	14-11	351,122	5	24,500	CCF24	351,122	14,100	0	0	0	0	0
PE	9[illegible]986	LEON CARDONA DOUGLAS EDUARDO	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS037	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1049956531	NAVARRO [illegible]	1	0			S																231001	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS005	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	11365360	MORA MARTIN MARCO AURELIO	1	0			S																230201	409,642	65,600	0	0	0	0	EPS017	409,642	16,400	14-11	409,642	5	28,000	CCF24	409,642	16,400	0	0	0	0	0
CC	11365360	MORA MARTIN MARCO AURELIO	1	0			S										X						230201	146,301	23,500	0	0	0	0	EPS017	146,301	5,900	14-11	146,301	5	0	CCF24	146,301	5,900	0	0	0	0	0
CC	11365360	MORA MARTIN MARCO AURELIO	1	0			S										X						230201	56,521	0,400	0	0	0	0	EPS017	56,521	2,400	14-11	56,521	5	0	CCF24	56,521	2,400	0	0	0	0	0
CC	11365360	MORA MARTIN MARCO AURELIO	1	0			S										X						230201	263,341	42,200	0	0	0	0	EPS017	263,341	10,400	14-11	263,341	5	0	CCF24	263,341	10,400	0	0	0	0	0
CC	73015114	RODRIGUEZ CONCO FREDYS ENRIQUE	1	0			S	X															23-14	56,521	0,400	0	0	0	0	EPS002	56,521	2,400	14-11	56,521	5	4,100	CCF24	56,521	2,400	0	0	0	0	0
CC	80002500	[illegible] ADRIAN	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS044	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	83103176	CHAVEZ POLANIA JOSE ANTONIO	1	0			S	X															230201	56,521	0,400	0	0	0	0	EPS005	56,521	2,400	14-11	56,521	5	4,100	CCF24	56,521	2,400	0	0	0	0	0
CC	1018021461	SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ANDRES	1	0			S																230201	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,000	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	85271049	CHAVES CAÑA JOSE ANGEL	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS017	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1024509396	DIAZ MERCADO JUAN RAFAEL	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS017	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1020660462	CAMBA SANCHEZ VICTOR ALFONSO	1	0			S	X															230201	351,122	56,200	0	0	0	0	EPS017	351,122	14,100	14-11	351,122	5	24,500	CCF24	351,122	14,100	0	0	0	0	0
CC	1042457042	ALVAREZ ZAMBRANO EDGAON GABRIEL	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS037	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1043042504	VALENCIA ORTEGA YHON GEIDIS	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS017	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1043649111	MARTINEZ VILLA RICHAR DEAN	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS002	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1049244058	URANGO JIMENEZ JESUS ALBERTO	1	0			S																230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS037	877,803	35,200	14-11	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Obra1	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	30/11/2020	46793389	$5,174,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	75.200	0		0		0	0	0	0	75.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	225.400	0		0		0	0	0	0	225.400	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	119.700	0		0		0	0	0	0	119.700	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.124.000	0	0	0	0	0	0		1.124.000	8
230301	Porvenir	800224808-8	1.265.500	0	0	0	0	0	0		1.265.500	11
231001	Colfondos	800227940-6	281.000	0	0	0	0	0	0		281.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	18.800	0	0	0	0	0	0		18.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.137.100				1.137.100	0	0	1.137.100			11.371	1.137.100	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	673.900	0	0	673.900	23

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

090

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO
NI	900260713-6	INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES SAS		CARRERA 69B No 21 - 60 SUR	2601182	ph.ingenierialtda@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS PH	23	BOGOTA D. C.	BOGOTA, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				24	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E		46440542	$9.620.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ocupación	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	VTL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1012304132	ROMERO SUAREZ OSCAR EDUARDO	1	0			X																	230301	2,173,913	347,900	0	0	0	0	EPS017	2,173,913	87,000	14-7	2,173,913	5	164,400	CCF24	2,173,913	87,000	0	0	0	0	0
CC	1012438742	ARCVALO MORANTES YENNY MILENA	1	0			X																	230301	1,090,163	174,500	0	0	0	0	EPS002	1,090,163	43,700	14-7	1,090,163	5	75,900	CCF24	1,090,163	43,700	0	0	0	0	0
CC	1014222877	SALAMANCA STA WILLIAM GUILLERMO	1	0			X																	230301	1,674,000	267,900	0	0	0	0	EPS010	1,674,000	67,000	14-7	1,674,000	5	116,600	CCF24	1,674,000	67,000	0	0	0	0	0
CC	1018478445	ALVARADO CUELLAR WENDY DAYANNA	1	0			X																	230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS002	2,000,000	80,000	14-7	2,000,000	5	139,200	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
CC	1020662499	CASTAÑO HERNANDEZ JHON SEBASTIAN	1	0			X																	230301	1,060,854	170,500	0	0	0	0	EPS017	1,060,854	42,400	14-7	1,060,854	5	73,500	CCF24	1,060,854	42,400	0	0	0	0	0
CC	1031172331	CASAS ORJUELA LILIBETH SAMARA	1	0			X																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS010	1,300,000	52,000	14-7	1,300,000	5	90,500	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
CC	79104200	MONTAÑA CONTRERAS JUSTO PASTOR	1	0			X																	25-14	1,733,000	277,300	0	0	0	0	EPS037	1,733,000	69,400	14-7	1,733,000	5	120,700	CCF24	1,733,000	69,400	0	0	0	0	0
CC	79639332	CUBILLOS CASALLAS MIGUEL ANGEL	1	0			X																	230301	1,374,000	219,900	0	0	0	0	EPS002	1,374,000	55,000	14-7	1,374,000	5	95,700	CCF24	1,374,000	55,000	0	0	0	0	0
CC	80247845	CASTILLO RODRIGUEZ ROGER STEVE	1	0			X																	230301	1,674,000	267,900	0	0	0	0	EPS017	1,674,000	67,000	14-7	1,674,000	5	116,600	CCF24	1,674,000	67,000	0	0	0	0	0
CC	80371216	RUIZ CASAS HERNANDO	1	0			X																	25-14	1,192,550	190,900	0	0	0	0	EPS005	1,192,550	47,800	14-7	1,192,550	5	83,100	CCF24	1,192,550	47,800	0	0	0	0	0
CC	80525841	SUAREZ TERREROS LUIS ALBEIRO	1	0			X																	25-14	1,273,000	203,700	0	0	0	0	EPS037	1,273,000	51,000	14-7	1,273,000	5	88,700	CCF24	1,273,000	51,000	0	0	0	0	0
CC	93011180	RIVERA RODRIGUEZ EUCLIDES	1	0			X																	230301	1,060,854	170,500	0	0	0	0	EPS037	1,060,854	42,400	14-7	1,060,854	5	73,500	CCF24	1,060,854	42,400	0	0	0	0	0
CC	3017702	ROMERO BARBOSA JOSE MIGUEL	1	0			X																	230301	2,173,913	347,900	0	0	0	0	EPS005	2,173,913	87,000	14-7	2,173,913	5	164,400	CCF24	2,173,913	87,000	0	0	0	0	0
CC	3051929	VARGAS CANO PEDRO PABLO	1	0			X																	25-14	1,060,854	170,500	0	0	0	0	EPS002	1,060,854	42,400	14-7	1,060,854	5	73,500	CCF24	1,060,854	42,400	0	0	0	0	0
CC	3080034	ZARATE LEON JOSE RODOLFO	1	0			X																	230301	1,060,854	170,500	0	0	0	0	EPS017	1,060,854	42,400	14-7	1,060,854	5	73,500	CCF24	1,060,854	42,400	0	0	0	0	0
CC	4243270	LAGOS MONSALVE JOSE SATURNINO	1	0			X																	230301	1,060,854	170,500	0	0	0	0	EPS017	1,060,854	42,400	14-7	1,060,854	5	73,500	CCF24	1,060,854	42,400	0	0	0	0	0
CC	72073917	SARMIENTO AGAMEZ ROGER EDUARDO	1	0			X																	230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS002	877,803	35,200	14-7	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	7542960	SUAREZ RODRIGUEZ NELSON	1	0			X																	25-14	1,192,550	190,900	0	0	0	0	EPS005	1,192,550	47,800	14-7	1,192,550	5	83,100	CCF24	1,192,550	47,800	0	0	0	0	0
CC	1003756714	CASTAÑO HERNANDEZ DAMASO	1	0			X																	230201	877,803	140,500	0	0	0	0	EPS010	877,803	35,200	14-7	877,803	5	61,100	CCF24	877,803	35,200	0	0	0	0	0
CC	1006673430	CHIMBI YENNY PAOLA	1	0			X	X																251001	294,447	47,200	0	0	0	0	EPS002	294,447	11,800	14-7	294,447	5	20,500	CCF24	294,447	11,800	0	0	0	0	0
CC	1006673030	TRIANA CHIMBI YCELON	1	0			X																	230301	1,192,550	190,900	0	0	0	0	EPS002	1,192,550	47,800	14-7	1,192,550	5	83,100	CCF24	1,192,550	47,800	0	0	0	0	0
CC	1255027	CAMACHO MENDEZ JAVIER	1	0			X																	230301	1,736,025	277,100	0	0	0	0	EPS002	1,736,025	69,500	14-7	1,736,025	5	120,900	CCF24	1,736,025	69,500	0	0	0	0	0
CC	19027300	DIAZ VALBUENA JOSE DIMAS	1	1			X																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,508,000	60,400	14-7	1,508,000	5	105,000	CCF24	1,508,000	60,400	0	0	0	0	0
CC	3017671	SUAREZ ROMERO RAFAEL ANTONIO	1	0			X																	230301	1,730,000	277,000	0	0	0	0	EPS002	1,730,000	69,400	14-7	1,730,000	5	120,700	CCF24	1,730,000	69,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900280713-8	INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES SAS	CARRERA 69B No 21 - 60 SUR	2601182	ph.ingenierialtda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS PH	23	BOGOTA. D. C.	BOGOTA. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				24	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E		40440542	$9.823.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.301.000	1.301.000
Pension	4	4.958.500	4.958.500
Riesgos Laborales	1	2.262.800	2.262.800
CCF	1	1.301.000	1.301.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.823.300	9.823.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.070.820.760
MADARIAGA DIAZ

APELLIDOS
LUIS ALFONSO

NOMBRES

FIRMA



Porbenir
Nueva EPS
301 203 9442.
Correo: 160 #132A-24



FECHA DE NACIMIENTO 31-MAR-1994
SAN BERNARDO DEL VIENTO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-ABR-2012 SAN BERNARDO DEL VIENTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO


QUIRÓN UNIDAD MEDICA

CERTIFICADO MEDICO LABORAL

VER 003
FEBRERO
2018

ELABORADO POR: ALEXANDER GOMEZ
REVISADO POR: SANDRA MALAGON
APROBADO POR: JULIANA PINEDA

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015 DIRECCION CRA 49B 93 - 35 TEL 6940333



FECHA	2020-11-13	CIUDAD	BOGOTÁ	H DE LLEGADA	7:44 AM	H DE SALIDA	8:14 AM
NOMBRE	**LUIS ALFONSO MADARIAGA DIAZ**					Hemoclasificación: **O +**	
C.C No	**1070820760**		EDAD	**26 años**	IMC.	**65kg * 170cm: 22.5**	
EMPRESA	**G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS**						
CARGO	**AYUDANTE**						
EXAMEN REALIZADO							
INGRESO							

PRUEBAS DE APOYO DIAGNÓSTICO

1. Énfasis Osteomuscular

2. Agudeza Visual

RECOMENDACIONES	OPTOMETRIA	FONOAUDIOLOGIA
HIGIENE POSTURAL PAUSAS ACTIVAS PERMANENTES USO ADECUADO DE E.P.P A LABOR HABITOS DE VIDA SALUDABLE	CONTROL ANUAL	

PROG. VIG. EPIDEMILÓGICO	

CONCEPTO MEDICO

CONCEPTO MEDICO	**SIN RESTRICCION PARA EL CARGO**
OBSERVACIONES	SE REALIZA EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL /SE RECOMIENDA HIGIENE POSTURAL / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO / MANEJO ADECUADO DE CARGAS / REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL / CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL OFICIO A REALIZAR / ÉNFASIS EN EL TRABAJO SEGURO/ PROTECCIÓN SOLAR ADECUADA / PAUSAS ACTIVAS/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROFESIOGRAMA / El TRABAJADOR NO PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID- 19, TAMPOCO HA VIAJADO NI TIENE CONTACTO CON ALGÚN NEXO EPIDEMIOLÓGICO, POR LO QUE NO ES CONSIDERADO UNA FUENTE DE PELIGRO DE CONTAGIO, NO PRESENTA COMORBILIDADES QUE SE ASOCIAN A COMPLICACIONES DE COVID- 19

TRABAJO EN ALTURAS		**MANIPULACION DE ALIMENTOS**		**LEVANTAR CARGAS**	

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO PUEDE SER CONFIRMADO Y ACEPTO LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE

Dra. Silena Cotes Arias
Médica
Esp en seguridad y salud en el trabajo
C C 49 771 764
Licencia 6065 de 18/2020

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA Y C.C DEL TRABAJADOR

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 17/11/2020, el empleador GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS identificado con NIT número 901136388 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.


NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
2941787	17/11/2020	Reingresos

DETALLE

TIPO IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1070820760	LUIS ALFONSO MADARIAGA DIAZ	877802	AYUDANTE DE OBRA	2020-11-18

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Noviembre del año 2020.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS

095

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.124.518.773

NIVAR GARCIA

APELLIDOS


ALBERTO JESUS

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1965

URIBIA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.88
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

25-ENE-2014 URIBIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-4801000-00117991-M-1124518773-20091023 0072174 2 0213121618

Eps: Sanitas
Pensión: Porvenir
Peso: 61.60 Est: 1.75
Cel: 3042001127

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **NIVAR GARCIA ALBERTO JESUS** identificado(a) con **CC** número **1.124.518.773** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 03 de agosto de 2019 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 24 de noviembre de 2020.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2020112409264

097

QUIRÓN UNIDAD MÉDICA	QUIRÓN UNIDAD MEDICA	VER 003 FEBRERO 2018
	CERTIFICADO MEDICO LABORAL	ELABORADO POR: ALEXANDER GOMEZ REVISADO POR: SANDRA MALAGON APROBADO POR: JULIANA PINEDA

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015 DIRECCION CRA 49B 93 - 35 TEL 6940333



FECHA	2020-11-21	CIUDAD	BOGOTÁ	H DE LLEGADA	10:23 AM	H DE SALIDA	11:57 AM
NOMBRE	**ALBERTO JESUS NIVAR GARCIA**					Hemoclasificación: **O +**	
C.C No	**1124518773**		EDAD	**55 años**	IMC.	**80kg * 180cm: 24.7**	
EMPRESA	**G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS**						
CARGO	**OFICIAL**						
EXAMEN REALIZADO							
INGRESO							

PRUEBAS DE APOYO DIAGNÓSTICO

1. Énfasis Osteomuscular

2. Agudeza Visual

RECOMENDACIONES	OPTOMETRIA	FONOAUDIOLOGIA
HABITOS DE VIDA SALUDABLE	USO DE LENTES PERMANENTES USO DE LUBRICANTES OCULARES VALORACION OPTOMETRIA EPS	

PROG. VIG. EPIDEMILÓGICO	

CONCEPTO MEDICO

CONCEPTO MEDICO	SIN RESTRICCION PARA EL CARGO
OBSERVACIONES	SE REALIZA EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL /VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA DE EPS PARA CORRECCIÓN VISUAL / HIGIENE POSTURAL / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO / MANEJO ADECUADO DE CARGAS / REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL / CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL OFICIO A REALIZAR / ÉNFASIS EN EL TRABAJO SEGURO/ PROTECCIÓN SOLAR ADECUADA / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROFESIOGRAMA / El TRABAJADOR NO PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID- 19, TAMPOCO HA VIAJADO NI TIENE CONTACTO CON ALGÚN NEXO EPIDEMIOLÓGICO, POR LO QUE NO ES CONSIDERADO UNA FUENTE DE PELIGRO DE CONTAGIO, NO PRESENTA COMORBILIDADES QUE SE ASOCIAN A COMPLICACIONES DE COVID- 19

TRABAJO EN ALTURAS		MANIPULACION DE ALIMENTOS		LEVANTAR CARGAS	SIN RESTRICCIÓN

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO PUEDE SER CONFIRMADO Y ACEPTO LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE

Dra. Silena Cotes Arias
Médica
Esp en seguridad y salud en el trabajo
C C 49 771 764
Licencia 8085 de 16/2/2019

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA Y C.C DEL TRABAJADOR

098




Exp: Con Guajira

Persona:

Dirección: Cl 60 c sur 92-41

Cel. 304 250 1171

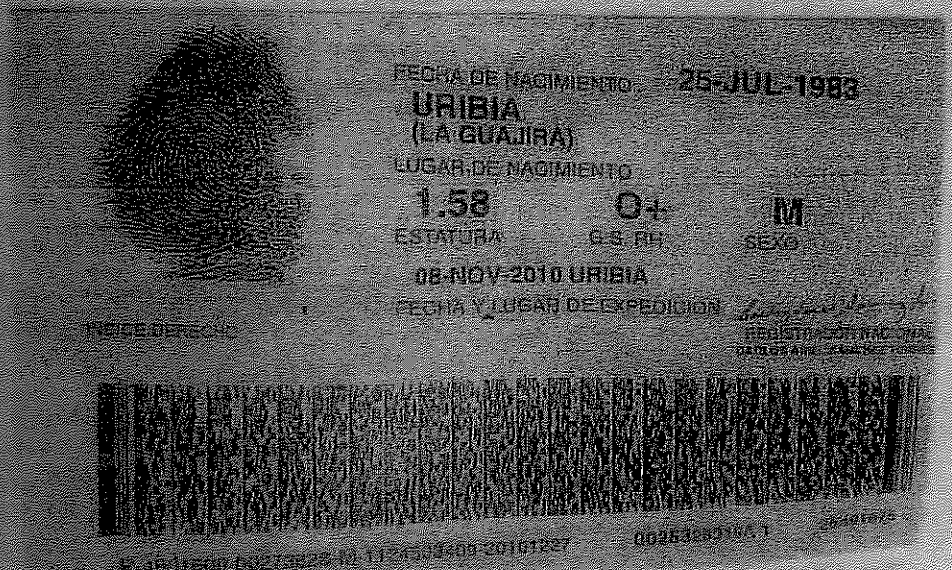

ARL | sura

Medellín, 24 de noviembre de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de G&G INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C112450340 9	GUTIERREZ IPUANA MOISES RAFAEL	25/11/2020		21724921	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2020 09:14:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.102.89.105, 198.143.41.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


QUIRÓN UNIDAD MEDICA

CERTIFICADO MEDICO LABORAL

VER 003
FEBRERO
2018

ELABORADO POR: ALEXANDER GOMEZ
REVISADO POR: SANDRA MALAGON
APROBADO POR: JULIANA PINEDA

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015 DIRECCION CRA 49B 93 - 35 TEL 6940333



FECHA	2020-11-23	CIUDAD	BOGOTÁ	H DE LLEGADA	10:16 AM	H DE SALIDA	10:37 AM
NOMBRE	**MOISES RAFAEL GUTIERREZ IPUANA**					Hemoclasificación:	**O +**
C.C No	**1124503409**	EDAD	**37 años**	IMC.	**62kg * 175cm: 20.2**		
EMPRESA	**G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS**						
CARGO	**AYUDANTE**						

EXAMEN REALIZADO

INGRESO

PRUEBAS DE APOYO DIAGNÓSTICO

1. Énfasis Osteomuscular

2. Agudeza Visual

RECOMENDACIONES	OPTOMETRIA	FONOAUDIOLOGIA
HIGIENE POSTURAL REALIZAR 30 MINUTOS DIARIOS DE EJERCICIO HABITOS DE VIDA SALUDABLE	CONTROL ANUAL	

PROG. VIG. EPIDEMILÓGICO	

CONCEPTO MEDICO

NCEPTO MEDICO	SIN RESTRICCION PARA EL CARGO

OBSERVACIONES

SE REALIZA EXAMEN MEDICO LABORAL CON ESTRICTAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y GUARDANDO DISTANCIAMIENTO SOCIAL/HIGIENE POSTURAL / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS Y PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO / MANEJO ADECUADO DE CARGAS / CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL OFICIO A REALIZAR / ÉNFASIS EN EL TRABAJO SEGURO/ PROTECCIÓN SOLAR ADECUADA, REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL Y USO DE EPP SEGÚN DESPLAZAMIENTO Y ACTIVIDADES DE CAMPO/ El TRABAJADOR NO PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID- 19, TAMPOCO HA VIAJADO NI TIENE CONTACTO CON ALGÚN NEXO EPIDEMIOLÓGICO, POR LO QUE NO ES CONSIDERADO UNA FUENTE DE PELIGRO DE CONTAGIO, NO PRESENTA COMORBILIDADES QUE SE ASOCIAN A COMPLICACIONES DE COVID- 19 .

TRABAJO EN ALTURAS		MANIPULACION DE ALIMENTOS		LEVANTAR CARGAS	SIN RESTRICCIÓN

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO PUEDE SER CONFIRMADO Y ACEPTO LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE

Dr. OSCAR JAIR OSPINA ORTIZ
Médico Especialista SST
Lic. 11200 SDS. RM 011825 M.S.V

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA Y C.C DEL TRABAJADOR

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

NIT 800.130.907-4

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

CONSECUTIVO No.

RADICADO

No. de Radicación: 414948081

Fecha de Radicación: 24 11 20 20

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia [ ] -Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
GUTIERREZ (Primer apellido)	IPUANA (Segundo apellido)	MOISES (Primer nombre)	RAFAEL (Segundo nombre)

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
[ ]	1124503409	Femenino [ ] Masculino [X]	25 07 1983

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
SURA	PROTECCION	877803

18. Residencia			
CALLE 60C SUR 75-45 (Dirección)	(Teléfono Fijo)	3042501577 (Teléfono Celular)	(Correo electrónico)
BOGOTA (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	(Localidad/Comuna)	BOGOTA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
(Primer apellido)	(Segundo apellido)	(Primer nombre)	(Segundo nombre)

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
G&G Ingenieros Asociados S.A.S	[ ]	901.136.388	

39. Ubicación				
Calle 53 # 85 i - 93 (Dirección)	7025650 (Teléfono)	(Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio/Distrito)	C/MARCA (Departamento)

F385-RVA V.1.0-2016

vigilado Supersalud

IMPRESO POR COMPUTER GRAPHICS LTDA. NIT 860.115.475-5 TEL. 482 2113

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MOISES RAFAEL GUTIERREZ IPUANA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.124.503.409**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Noviembre del 2020.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

101

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.124.504.370
GUTIERREZ ATENCIO


APELLIDOS
FRANKLIN JAVIER

NOMBRES

FRANKLIN GUTIERREZ

FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1988
URIBIA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-DIC-2010 URIBIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



Eps: Nueva EPS

Pension:

Direccion: cl 60 4w # 14-50

Cel: 3124476617

ARL | sura

Medellín, 24 de noviembre de 2020

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de G&G INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 OBRA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C112450437 0	GUTIERREZ ATENCIO FRANKLIN JAVIER	25/11/2020		20223715	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/11/2020 09:19:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.102.89.105, 198.143.41.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 24/11/2020, el empleador GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS identificado con NIT número 901136388 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
2956847	24/11/2020	Reingresos

DETALLE

TIPO IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1124504370	FRANKLIN JAVIER GUTIERREZ ATENCIO	877802	AYUDANTE DE OBRA	2020-11-25

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de Noviembre del año 2020.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva EPS


QUIRÓN UNIDAD MEDICA

CERTIFICADO MEDICO LABORAL

VER 003
FEBRERO
2018

ELABORADO POR: ALEXANDER GOMEZ
REVISADO POR: SANDRA MALAGON
APROBADO POR: JULIANA PINEDA

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015 DIRECCION CRA 49B 93 - 35 TEL 6940333



FECHA	2020-11-20	CIUDAD	BOGOTÁ	H DE LLEGADA	9:39 AM	H DE SALIDA	10:35 AM
NOMBRE	**FRANKLIN JAVIER GUTIERREZ ATENCIO**					Hemoclasificación: **A +**	
C.C No	**1124504370**		EDAD	**32 años**	IMC.	**77kg * 168cm: 27.3**	
EMPRESA	**G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS**						
CARGO	**AYUDANTE**						
EXAMEN REALIZADO							
INGRESO							

PRUEBAS DE APOYO DIAGNÓSTICO

1. Énfasis Osteomuscular

2. Agudeza Visual

RECOMENDACIONES	OPTOMETRIA	FONOAUDIOLOGIA
REALIZAR 30 MINUTOS DIARIOS DE EJERCICIO HABITOS DE VIDA SALUDABLE	CONTROL ANUAL	

PROG. VIG. EPIDEMILÓGICO	

CONCEPTO MEDICO

NCEPTO MEDICO	**SIN RESTRICCION PARA EL CARGO**
OBSERVACIONES	SE REALIZA EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL /SE RECOMIENDA HIGIENE POSTURAL / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO / MANEJO ADECUADO DE CARGAS / REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL / CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL OFICIO A REALIZAR / ÉNFASIS EN EL TRABAJO SEGURO/ PROTECCIÓN SOLAR ADECUADA / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROFESIOGRAMA / El TRABAJADOR NO PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID- 19, TAMPOCO HA VIAJADO NI TIENE CONTACTO CON ALGÚN NEXO EPIDEMIOLÓGICO, POR LO QUE NO ES CONSIDERADO UNA FUENTE DE PELIGRO DE CONTAGIO, NO PRESENTA COMORBILIDADES QUE SE ASOCIAN A COMPLICACIONES DE COVID- 19

TRABAJO EN ALTURAS		**MANIPULACION DE ALIMENTOS**		**LEVANTAR CARGAS**	SIN RESTRICCIÓN

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO PUEDE SER CONFIRMADO Y ACEPTO LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE

Dra. Silena Cotes Arias
Médica
Esp en seguridad y salud en el trabajo
C C 49 771 764
Licencia 8065 de 18/enero/2019

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA Y C.C DEL TRABAJADOR

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FRANKLIN JAVIER GUTIERREZ ATENCIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.124.504.370**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Noviembre del 2020.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01 Creado: 18 – 03 – 2019 Act: :

Bogotá 16 de noviembre de 2020

Señor:
LUIS ALFONSO MADARIAGA DIAZ
Cargo: AYUDANTE

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 13– 11 – 2020.

HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
PERMANENTES USO ADECUADO DE E.P.P A LABOR
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Muchas gracias por su atención.

Firma Trabajador
Cc: 1010820760

Firma responsable de SG-SST
Cc. 1012420228

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01
		Creado: 18 – 03 – 2019
		Act: :

Bogotá 23 de noviembre de 2020

Señor:
ALBERTO JESUS NIVAR GARCIA
Cargo: OFICIAL

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 21– 11 – 2020.

HABITOS DE VIDA SALUDABLE
USO DE LENTES PERMANENTES
USO DE LUBRICANTES OCULARES
VALORACION OPTOMETRIA EPS

Muchas gracias por su atención.

Firma Trabajador
Cc: 1124578773

Firma responsable de SG-SST
Cc.

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01
		Creado: 18 – 03 – 2019
		Act: :

Bogotá 25 de noviembre de 2020

Señor:
MOISES RAFAEL GUTIERREZ IPUANA
Cargo: AYUDANTE

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 23– 11 – 2020.

HIGIENE POSTURAL
REALIZAR 30 MINUTOS DIARIOS DE EJERCICIO
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Muchas gracias por su atención.

Firma Trabajador
Cc: 1.124.503.409

Firma responsable de SG-SST
Cc. 1012420258

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01 Creado: 18 – 03 – 2019 Act: :

Bogotá 23 de noviembre de 2020

Señor:
FRANKLIN JAVIER GUTIERREZ ATENCIO
Cargo: AYUDANTE

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 23– 11 – 2020.

REALIZAR 30 MINUTOS DIARIOS DE EJERCICIO
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Muchas gracias por su atención.

FRANKLIN GUTIERREZ

Firma Trabajador
Cc: 1174504370

Firma responsable de SG-SST
Cc. 1012420288

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01 Creado: 18 – 03 – 2019 Act: :

Bogotá 16 de noviembre de 2020

Señor:
LUIS ALFONSO MADARIAGA DIAZ
Cargo: AYUDANTE

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 13– 11 – 2020.

HIGIENE POSTURAL
PAUSAS ACTIVAS
PERMANENTES USO ADECUADO DE E.P.P A LABOR
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Muchas gracias por su atención.

Firma Trabajador
Cc: 1010820760

Firma responsable de SG-SST
Cc. 1012420278

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01
		Creado: 18 – 03 – 2019
		Act: :

Bogotá 23 de noviembre de 2020

Señor:
ALBERTO JESUS NIVAR GARCIA
Cargo: OFICIAL

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el dia 21– 11 – 2020.

HABITOS DE VIDA SALUDABLE
USO DE LENTES PERMANENTES
USO DE LUBRICANTES OCULARES
VALORACION OPTOMETRIA EPS

Muchas gracias por su atención.

Firma Trabajador
Cc: 1124578773

Firma responsable de SG-SST
Cc.

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01
		Creado: 18 – 03 – 2019
		Act: :

Bogotá 25 de noviembre de 2020

Señor:
MOISES RAFAEL GUTIERREZ IPUANA
Cargo: AYUDANTE

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 23– 11 – 2020.

HIGIENE POSTURAL
REALIZAR 30 MINUTOS DIARIOS DE EJERCICIO
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Muchas gracias por su atención.

Firma Trabajador
Cc: 1.124.503.409

Firma responsable de SG-SST
Cc. 1012420258

Ingeniería & Proyectos	NOTIFICACIÓN RECOMENDACIONES MÉDICAS	SG-SST 026 – 1 V01
		Creado: 18 – 03 – 2019
		Act: :

Bogotá 23 de noviembre de 2020

Señor:
FRANKLIN JAVIER GUTIERREZ ATENCIO
Cargo: AYUDANTE

Referencia: **Notificación recomendaciones exámenes médicos ocupacionales**

Mediante el presente, se notifica las recomendaciones médicas realizadas por el médico ocupacional del examen llevado a cabo el día 23– 11 – 2020.

REALIZAR 30 MINUTOS DIARIOS DE EJERCICIO
HABITOS DE VIDA SALUDABLE

Muchas gracias por su atención.

FRANKLIN GUTIERREZ

Firma Trabajador
Cc: 1174504370

Firma responsable de SG-SST
Cc. 1012420288

ANEXO 8. VIGIA SST

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

Fecha	28 – 11 – 2020	
Numero de acta	07	
Hora de inicio	3: 00 pm	
Hora finalización	05: 00 pm	
ORDEN DE LA REUNIÓN		
Verificación del quórum. (Se debe realizar la reunión entre el vigía de SST, el líder del SG-SST y el representante legal de la empresa)	**Cumple** ___X___	**No cumple** _____
Lectura del acta anterior (Se deben revisar los temas planteados en el acta anterior con el fin de realizar seguimiento).	**Cumple** ___X____	**No cumple** _____
DESARROLLO DE TEMAS DEL SG-SST		
Accidentalidad: Durante lo corrido del mes de Noviembre no se presentó ningún tipo de evento de origen laboral, que haya sido reportado a la ARL, las curvas de tendencia de la accidentalidad se mantienen en 0%		
• Para lo corrido del mes de noviembre se inicia el frente de obra de AV. Boyacá X CL 60CS, KR 73 X CL 26S, KR 116 X DG 16 , KR 17 X CL 71BIS SUR, KR 69B x AC 26 S., se continua con la implementación de los protocolos de bioseguridad, garantizando asl los insumos necesarios y minimizar el riesgo de contagio de Covid-19 en los frentes de obra. En la oficina se continua con la implementación del protocolo a cabalidad. Por parte de la gestión del vigía se realiza seguimiento a las inspecciones realizadas en obra sin ninguna novedad.		

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	TEMA PROPUESTO

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar seguimiento de implementación de protocolos de bioseguridad en los frentes de obra y la oficina	Profesional SST	30/12/2020
Realizar seguimiento de inspecciones	Vigía SST Y profesional SST	30/12/2020

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO FELIPE LOPEZ	VIGÍA SST	Felipe Lopez
CAMILO ROSARIO	REPRESENTANTE LEGAL	

ANEXO 9. CAPACITACIONES

Ingeniería & Proyectos S.A.S	CRONOGRAMA CHARLAS EN OBRA	SG-SST 09 - 1 V 02
		Creado: 16 - 06 - 2020

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

| TEMA | RESPONSABLE | DOCUMENTO A VERIFICAR | RECURSOS | | | SEMANAL | | |

Ingeniería & Proyectos	REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	13/NOV/2020	LUGAR:	Av Bayara # 11 Sur.
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Carolina Serna	DOCUMENTO ID	1012420278

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Capacitación		Ruido y Vibraciones
Capacitación		
Capacitación		
Capacitación		
Otra		

OBJETIVO:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Cesar Valencia				
2	Ricardo Martinez	1043849111		Ricardo	
3	Alexander Martinez	85172516	oficial		
4	Oscar Ramirez	7477328			
5	Edinson Olivero	91536053	of		
6	Edison Alvarez	1.041.467682	Ayudante		
7	Douglas Leon	21307138	Ayudante	Douglas	
8	Victor Gamboa	1076790	C Facial		
9	Hugo Oviedo	9°C6J3583	ayudante	Hugo Oviedo	
10	Jesus Ortega	1096244CB	ayudante	Jesus O.	

Ingeniería & Proyectos	REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES	SG-SST – 11 V02
		Creado: 28 - 04 - 2017
		Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	06/NOV/2020	LUGAR:	Av Bosca c11 60c Sur
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Carolina Serna	DOCUMENTO ID	1012420278

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Capacitación		cambio climático
Capacitación		
Capacitación		
Capacitación		
Otra		

OBJETIVO:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Yeison Valencia				
2	Richar Martinez	1043849111		Richar dean	
3	Yhonnader Martinez	85222645	oficial		
4	Jhon Jairo Ospina	79798859	oficial		
5	Estevan olivos	91536053	of		
6	Edison Alvarez	1.042.467682	Ayudante		
7	Douglas Jhon	2136758	ayudante	Douglas	
8	Victor Garcia	1026440962	oficial		
9	Hugo Oviedo	9065383	ayudante	Hugo Oviedo	
10	Jesus Urango	10962498	ayudante	Jesus U.	

2 de 4

ACOR Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	27/NOV/2020	**LUGAR:**	AV Boyaca cll 6cc Sur
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Carolina Serna	**DOCUMENTO ID**	1012420278

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación		Reglamento de higiene y seguridad industrial
Capacitación		
Capacitación		
Capacitación		
Otra		

OBJETIVO:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Gilson Valencia	1043842534			
2	Richar martinez	1043849141		Richar	
3	Leonardo martinez	65222	OFICIAL		
4	Jhon Navarro	1047887537	Oficial		
5	Estiwson oliveros	91556053	OF		
6	Alberto Nuñez	1127518477	A-11		
7	Edison Alvarez	1.042.467.682	Ayudante		
8	Maldad	1124503409	ayudante		
9	Douglas Leon	21307158	ayudante.	Douglas	
10	Victor Cantillo	1022220962	ayudante	Victor	

Ingeniería & Proyectos	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN DEL SG-SST	SG-SST – 12 - 1 V02 2/05/2017

Nombre y apellido del colaborador:	Moises Gutierrez	Fecha	
Cargo que desempeña	ayudante	Documento ID	1124503469
Proyecto o área de trabajo	Señalización	Empresa contratista	Gue
ARL: Sura	EPS: Salud total	Fondo de pensiones	Porvenir

De acuerdo a la inducción realizada por su empresa, marque la respuesta correcta:

1. Que significan las siglas SG-SST

a) Sistemas de gestión de soporte social y de trabajo

b) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

c) Ninguna de las anteriores

2. Mencione cúal es la actividad economica de la empresa

a) Presta servicios de mensajeria a nivel nacional e internacional

b) Contrucción de edificaciones, adecuaciones, mantenimiento de obras, servicios de ingeniería

c) Venta y comercialización de articulos al por mayor y al detal

3. Qué es accidente de trabajo

a) Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que desencadene en el trabajador una lesión o muerte

b) Toda lesión que me ocurra fuera de las instalaciones del trabajo o empresa

c) Toda enfermedad que me suceda como consecuencia del trabajo

4. De acuerdo a su experiencia, escriba al menos tres accidentes de trabajo le pueden ocurrir en este proyecto

Heridas

5. Que es enfermedad laboral

a) Cualquier virus que se encuentre en el ambiente de trabajo

b) Es una patologia contraida como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

c) Cuando me encuentro laborando y siento dolor de cabeza

6. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es un ACTO INSEGURO

a) No usar los EPP que la empresa me suministra

b) Manipular herramienta en mal estado

c) Trabajar en alturas sin la adecuada protección contra caidas

d) Manipular circuitos energizados sin la respectiva protección personal

7. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es una CONDICIÓN INSEGURA


a) Andamio en mal estado, sin los soportes ni escaleras de acceso

b) Día soleado o día lluvioso

c) Equipo o herramienta sin guarda de seguridad

d) Zonas de tolerancia con potencial de robos, atracos, secuestro

8. De acuerdo al gráfico, mencione en qué consiste la politica de AC2R INGENIRÍA Y PROYECTOS S.A.S



EPP



No fumar




no drogas

9. De acuerdo a la imagen, mencione el peligro al cúal se encuentra expuesto en su sitio de trabajo.



ruido



quimico



rio Mecanico



alturas



electrico.



naturales

10. Cuando me suceda un accidente de trabajo, debo hacer:

a) Aviso inmediatamente a mi jefe inmediato sobre lo que me sucedió

b) Me quedo callado, no informo nada y me aguanto el dolor

c) Me voy a la EPS para que el médico me examine

11. Si veo que un compañero está realizando un acto inseguro, que hago:

a) No le digo nada, pues no es mi problema

b) Le digo a mi jefe inmediato o ingeniero de obra

c) Le digo a mi compañero de una forma respetuosa, la forma segura de realizar la actividad.

12. Mis responsabilidades como colaborador frente a la seguridad y salud en el trabajo son:

a) Suministrar información clara sobre mi estado de salud

b) Cumplir las políticas de la empresa

c) Participar en actividades de capacitación

d) Cuidar mi seguridad y mi salud.

13. Las responsabilidades de mi empleador son:

a) Asignar recursos para la seguridad y salud en el trabajo

b) Cumplir los requisitos normativos en materia de SST

c) Asignar y documentar las responsabilidades frente al SG-SST

14. Mencione al menos 5 herramientas que utilice en el trabajo

pala
cuchara

15. De acuerdo a la imagen, escriba para que le sirve cada EPP.


cabeza


ojos


orejas


boca


manos


pies


arnes

Calificación:	Si el Colaborador tiene 6 respuestas incorrectas, deberá repetir la evaluación, pero si el colaborador tiene menos de 5 respuestas incorrectas, se realizará una retroalimentación verbal.	
Respuestas correctas.	15	Retroalimentación sobre:
Respuestas incorrectas.	0	

Firma del colaborador MARES

Nombre del capacitador

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN DEL SG-SST	SG-SST – 12 - 1 V02
		2/05/2017

Nombre y apellido del colaborador:	Alberto Muar	Fecha	23/11/2020
Cargo que desempeña	ayudante	Documento ID	1124 518773
Proyecto o área de trabajo	Fabricación	Empresa contratista	C&G
ARL Sura	EPS Sanitas	Fondo de pensiones	Protección

De acuerdo a la inducción realizada por su empresa, marque la respuesta correcta:

1. Que significan las siglas SG-SST

a) Sistemas de gestión de soporte social y de trabajo

b) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

c) Ninguna de las anteriores

2. Mencione cúal es la actividad economica de la empresa

a) Presta servicios de mensajeria a nivel nacional e internacional

b) Contrucción de edificaciones, adecuaciones, mantenimiento de obras, servicios de ingenieria

c) Venta y comercialización de articulos al por mayor y al detal

3. Qué es accidente de trabajo

a) Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que desencadene en el trabajador una lesión o muerte

b) Toda lesión que me ocurra fuera de las instalaciones del trabajo o empresa

c) Toda enfermedad que me suceda como consecuencia del trabajo

4. De acuerdo a su experiencia, escriba al menos tres accidentes de trabajo le pueden ocurrir en este proyecto

caidas

electricas

5. Que es enfermedad laboral

a) Cualquier virus que se encuentre en el ambiente de trabajo

b) Es una patologia contraida como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

c) Cuando me encuentro laborando y siento dolor de cabeza

6. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es un ACTO INSEGURO

a) No usar los EPP que la empresa me suministra

b) Manipular herramienta en mal estado

c) Trabajar en alturas sin la adecuada protección contra caidas

d) Manipular circuitos energizados sin la respectiva protección personal

7. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es una CONDICIÓN INSEGURA

a) Andamio en mal estado, sin los soportes ni escaleras de acceso

b) Dia soleado o dia lluvioso

c) Equipo o herramienta sin guarda de seguridad

d) Zonas de tolerancia con potencial de robos, atracos, secuestro

8. De acuerdo al gráfico, mencione en qué consiste la politica de AC2R INGENIRÍA Y PROYECTOS S.A.S



SST



no fumar



no drogas

9. De acuerdo a la imagen, mencione el peligro al cúal se encuentra expuesto en su sitio de trabajo.



ruido



quimica



caida



altura



electrica



incendio

10. Cuando me suceda un accidente de trabajo, debo hacer:

a) Aviso inmediatamente a mi jefe inmediato sobre lo que me sucedió

b) Me quedo callado, no informo nada y me aguanto el dolor

c) Me voy a la EPS para que el médico me examine

11. Si veo que un compañero está realizando un acto inseguro, que hago:

a) No le digo nada, pues no es mi problema

b) Le digo a mi jefe inmediato o ingeniero de obra

c) Le digo a mi compañero de una forma respetuosa, la forma segura de realizar la actividad.

12. Mis responsabilidades como colaborador frente a la seguridad y salud en el trabajo son:

a) Suministrar información clara sobre mi estado de salud

b) Cumplir las políticas de la empresa

c) Participar en actividades de capacitación

d) Cuidar mi seguridad y mi salud.

13. Las responsabilidades de mi empleador son:

a) Asignar recursos para la seguridad y salud en el trabajo

b) Cumplir los requisitos normativos en materia de SST

c) Asignar y documentar las responsabilidades frente al SG-SST

14. Mencione al menos 5 herramientas que utilice en el trabajo

Cuchara

15. De acuerdo a la imagen, escriba para que le sirve cada EPP.



Cabeza



Ojos



Oidos



respirar



guantes manos



Pies



Altura

Calificación:	Si el Colaborador tiene 6 respuestas incorrectas, deberá repetir la evaluación, pero si el colaborador tiene menos de 5 respuestas incorrectas, se realizará una retroalimentación verbal.	
Respuestas correctas.	14	Retroalimentación sobre:
Respuestas incorrectas.	1	

Firma del colaborador

Nombre del capacitador

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN DEL SG-SST	SG-SST – 12 - 1 V02
Ingeniería & Proyectos		2/05/2017

Nombre y apellido del colaborador:	Luis Madariaga			Fecha	17 III 120
Cargo que desempeña	ayudante.			Documento ID	1070820760.
Proyecto o área de trabajo	Demarcación			Empresa contratista	646
ARL	Sura	EPS	Nueva EPS	Fondo de pensiones	

De acuerdo a la inducción realizada por su empresa, marque la respuesta correcta:

1. Que significan las siglas SG-SST

a) Sistemas de gestión de soporte social y de trabajo
b) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
c) Ninguna de las anteriores

2. Mencione cúal es la actividad economica de la empresa

a) Presta servicios de mensajería a nivel nacional e internacional
b) Contrucción de edificaciones, adecuaciones, mantenimiento de obras, servicios de ingeniería
c) Venta y comercialización de artículos al por mayor y al detal

3. Qué es accidente de trabajo

a) Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que desencadene en el trabajador una lesión o muerte
b) Toda lesión que me ocurra fuera de las instalaciones del trabajo o empresa
c) Toda enfermedad que me suceda como consecuencia del trabajo

4. De acuerdo a su experiencia, escriba al menos tres accidentes de trabajo le pueden ocurrir en este proyecto

Caidas
Cortadas

5. Que es enfermedad laboral

a) Cualquier virus que se encuentre en el ambiente de trabajo
b) Es una patologia contraida como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
c) Cuando me encuentro laborando y siento dolor de cabeza

6. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es un ACTO INSEGURO

a) No usar los EPP que la empresa me suministra
b) Manipular herramienta en mal estado
c) Trabajar en alturas sin la adecuada protección contra caidas
d) Manipular circuitos energizados sin la respectiva protección personal

7. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es una CONDICIÓN INSEGURA

a) Andamio en mal estado, sin los soportes ni escaleras de acceso
b) Dia soleado o dia lluvioso
c) Equipo o herramienta sin guarda de seguridad
d) Zonas de tolerancia con potencial de robos, atracos, secuestro

8. De acuerdo al gráfico, mencione en qué consiste la política de AC2R INGENIRÍA Y PROYECTOS S.A.S



SST



no Fumar.




no drogas.

9. De acuerdo a la imagen, mencione el peligro al cúal se encuentra expuesto en su sitio de trabajo.



ruido.



germen.



Cargas.



alturas.



electrico.



herramientas.

115

10. Cuando me suceda un accidente de trabajo, debo hacer:

a) Aviso inmediatamente a mi jefe inmediato sobre lo que me sucedió

b) Me quedo callado, no informo nada y me aguanto el dolor

c) Me voy a la EPS para que el médico me examine

11. Si veo que un compañero está realizando un acto inseguro, que hago:

a) No le digo nada, pues no es mi problema

b) Le digo a mi jefe inmediato o ingeniero de obra

c) Le digo a mi compañero de una forma respetuosa, la forma segura de realizar la actividad.

12. Mis responsabilidades como colaborador frente a la seguridad y salud en el trabajo son:

a) Suministrar información clara sobre mi estado de salud

b) Cumplir las políticas de la empresa

c) Participar en actividades de capacitación

d) Cuidar mi seguridad y mi salud.

13. Las responsabilidades de mi empleador son:

a) Asignar recursos para la seguridad y salud en el trabajo

b) Cumplir los requisitos normativos en materia de SST

c) Asignar y documentar las responsabilidades frente al SG-SST


14. Mencione al menos 5 herramientas que utilice en el trabajo

Pala
Pica
Machete

15. De acuerdo a la imagen, escriba para que le sirve cada EPP.


cabeza


ojos


oidos


boca


manos


pies.


alturas.

Calificación:	Si el Colaborador tiene 6 respuestas incorrectas, deberá repetir la evaluación, pero si el colaborador tiene menos de 5 respuestas incorrectas, se realizará una retroalimentación verbal.	
Respuestas correctas.	15	Retroalimentación sobre:
Respuestas incorrectas.	0	

Firma del colaborador

Nombre del capacitador

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN DEL SG-SST	SG-SST – 12 - 1 V02
Ingeniería & Proyectos		2/05/2017

Nombre y apellido del colaborador:	Franklin Gutierrez			Fecha	1124,504,376
Cargo que desempeña	ayudante			Documento ID	23/11/20
Proyecto o área de trabajo	Señalización			Empresa contratista	AC2R
ARL	Sura	EPS	Nueva EPS	Fondo de pensiones	Porvenir

De acuerdo a la inducción realizada por su empresa, marque la respuesta correcta:

1. Que significan las siglas SG-SST

a) Sistemas de gestión de soporte social y de trabajo
b) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ✓
c) Ninguna de las anteriores

2. Mencione cúal es la actividad economica de la empresa

a) Presta servicios de mensajeria a nivel nacional e internacional
b) Contrucción de edificaciones, adecuaciones, mantenimiento de obras, servicios de ingeniería ✓
c) Venta y comercialización de articulos al por mayor y al detal

3. Qué es accidente de trabajo

a) Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que desencadene en el trabajador una lesión o muerte ✓
b) Toda lesión que me ocurra fuera de las instalaciones del trabajo o empresa
c) Toda enfermedad que me suceda como consecuencia del trabajo

4. De acuerdo a su experiencia, escriba al menos tres accidentes de trabajo le pueden ocurrir en este proyecto

eridas ✓
caidas

5. Que es enfermedad laboral

a) Cualquier virus que se encuentre en el ambiente de trabajo
b) Es una patologia contraida como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ✓
c) Cuando me encuentro laborando y siento dolor de cabeza

6. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es un ACTO INSEGURO

a) No usar los EPP que la empresa me suministra ✓
b) Manipular herramienta en mal estado
c) Trabajar en alturas sin la adecuada protección contra caidas
d) Manipular circuitos energizados sin la respectiva protección personal

7. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es una CONDICIÓN INSEGURA

a) Andamio en mal estado, sin los soportes ni escaleras de acceso ✓
b) Dia soleado o dia lluvioso
c) Equipo o herramienta sin guarda de seguridad
d) Zonas de tolerancia con potencial de robos, atracos, secuestro

8. De acuerdo al gráfico, mencione en qué consiste la politica de AC2R INGENIRÍA Y PROYECTOS S.A.S



SST



No Fumar ✓




no drogas

9. De acuerdo a la imagen, mencione el peligro al cúal se encuentra expuesto en su sitio de trabajo.



cuido



señalo



todo seguridad



alturas



electrico.



gases

10. Cuando me suceda un accidente de trabajo, debo hacer:

a) Aviso inmediatamente a mi jefe inmediato sobre lo que me sucedió

b) Me quedo callado, no informo nada y me aguanto el dolor

c) Me voy a la EPS para que el médico me examine

11. Si veo que un compañero está realizando un acto inseguro, que hago:

a) No le digo nada, pues no es mi problema

b) Le digo a mi jefe inmediato o ingeniero de obra

c) Le digo a mi compañero de una forma respetuosa, la forma segura de realizar la actividad.

12. Mis responsabilidades como colaborador frente a la seguridad y salud en el trabajo son:

a) Suministrar información clara sobre mi estado de salud

b) Cumplir las políticas de la empresa

c) Participar en actividades de capacitación

d) Cuidar mi seguridad y mi salud.

13. Las responsabilidades de mi empleador son:

a) Asignar recursos para la seguridad y salud en el trabajo

b) Cumplir los requisitos normativos en materia de SST

c) Asignar y documentar las responsabilidades frente al SG-SST

14. Mencione al menos 5 herramientas que utilice en el trabajo

gafas
tapabocas.

15. De acuerdo a la imagen, escriba para que le sirve cada EPP.


casco


gafas


tapabocas.


boca.


guantes manga.


Pies


arnes

Calificación:	Si el Colaborador tiene 6 respuestas incorrectas, deberá repetir la evaluación, pero si el colaborador tiene menos de 5 respuestas incorrectas, se realizará una retroalimentación verbal.	
Respuestas correctas.	15	Retroalimentación sobre:
Respuestas incorrectas.	0	

Firma del colaborador Franklin

Nombre del capacitador

ANEXO 10. INDICADORES

NOMBRE DE INDICADOR	Indicador de Proceso -.Plan de Capacitación
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evalua el Proceso del SG SST en cuanto al Cumplimiento del Plan de Capacitación
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☑ RESULTADO ☐
A QUIENES LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	LA META DEL INDICADOR	PERIODO DEL REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Cronograma de capacitación	(Numero de Capacitaciones Ejecutadas / Numero de Capacitaciones Programadas)*100	90%	Mensual	Representante del SGSST


MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANÁLISIS 2020

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ANALISIS DE DATOS
Numero de Capacitaciones Ejecutadas									3	3	3		
Numero de Capacitaciones Programadas									30	3	3		

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	100%	100%	0%
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

GRAFICA



CARGOS QUE DEBEN CONOCER LOS RESULTADOS : ALTA DIRECCIÓN : Gerencia General y COPASST

PLANES DE ACCION INMEDIATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evaluan el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto a la frecuencia de ocurrencia de accidentes de trabajo
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	El indicador así calculado se interpreta como el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA [ ] PROCESO [X] RESULTADO [X]
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO NUMERICO

FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL	METODO DE CALCULO	META DEL INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	RESPONSABLE DEL INDICADOR
Base de datos de accidentalidad	(Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes /numero de trabajadores en el mes)*100	0.05	Mensual	Representante del SGSST


MEDICION DE INDICADOR

AÑO DE ANALISIS 2020

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ANALISIS DE DATOS
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES	0	0	0	0	0	0	0	0	17	22	37		

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
META	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evaluan el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto a la severidad de los accidentes de trabajo ocurridos
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	El Indicador así calculado se interpreta como el número de días perdidos o cargados por accidentes de trabajo en el mes
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☒
RESPONSABLE DEL INDICADOR	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
PERIODICIDAD DEL INDICADOR	Este Indicador se medira anualmente


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN				
FUENTE DE DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Base de datos de accidentalidad	(Numero de dias de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de dias cargados en el mes / numero de trabajadores en el mes) *100	0,05	Mensual	Representante del SGSST

INDICADOR SEMESTRAL
PERIODO DE ANALISIS: 2021

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
numero de trabajadores en el mes	6	5	5	5	5	5	5	5	17	22	37	
Número de dias perdidos de incapacidad por accidente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
META	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Mortalidad de Accidentes de Trabajo
DEFINICION DEL INDICADOR	Indicador que evaluan el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto al Número de accidentes mortales ocurridos en el año
INTERPRETACION DEL INDICADOR	El indicador así calculado se interpreta como el número de AT mortales en el año
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☑ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DIRIGE EL INDICADOR	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL CALCULO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	META DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE LA META	RESPONSABLE DE LA MEDICION Y ANALISIS DE RESULTADOS
Base de datos de accidentalidad	(Numero de accidentes mortales que se presentaron en el año / total de accidentes presentados en el año) * 100	0,00	Anual	Representante del SGSST


DESCRIPCION INDICADOR

METODO DE EVALUACION Y CALCULO

VARIABLES	ENE - DIC
total de accidentes presentados en el año	0
Numero de accidentes mortales que se presentaron en el año	0

VARIABLES	ENE - DIC
VALOR REAL	0,0
META	0,00

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE


SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Prevalencia de la enfermedad laboral					
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Numero de casos de enfermedad laboral presentes en una poblacion en un periodo de tiempo					
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA	☐	PROCESO	☐	RESULTADO	☑
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.					
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Este indicador se medira anualmente					

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	PERIODO DE ANALISIS	VALOR META INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0%	Semestral	Representante del SGSST

ANALISIS DEL INDICADOR	
PERIODO DE ANALISIS 2020	
VARIABLES	FIN - SR
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0
VALOR FINAL	0%
META	0%

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Incidencia de enfermedad laboral
DEFINICION DEL INDICADOR	Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en una poblacion determinada en un periodo de tiempo
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	LIMITE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0%	ANUAL	Representante del SGSST

MEDICION DEL INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS: 2020

VARIABLES	RESULTADO
(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0
VALOR REAL	0%
META	0%

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Ausentismo por causa medica
DEFINICION DEL INDICADOR	Ausentismo es la no asistencia al trabajo por incapacidad medica
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
AQUIEN SE DIRIGE LA MEDICION	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadoras.
PERIODICIDAD DE MEDICION	Este Indicador se medira Mensual


SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
VARIABLES INVOLUCRADAS	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programdos en el mes) * 100	0%	MENSUAL	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS 2018

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
(Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programdos en el mes) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									28	29	37	
VALOR REAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
META	80%											

GRAFICA




ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE


ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

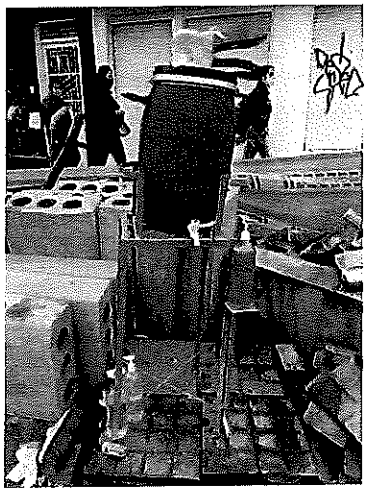


FOTOGRAFÍA No.	01
FECHA	03/11/2020
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	




FOTOGRAFÍA No.	02
FECHA	13/11/2020
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	

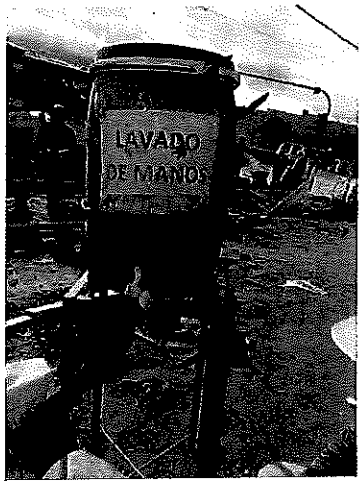


FOTOGRAFÍA No.	03
FECHA	16/11/2020
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	

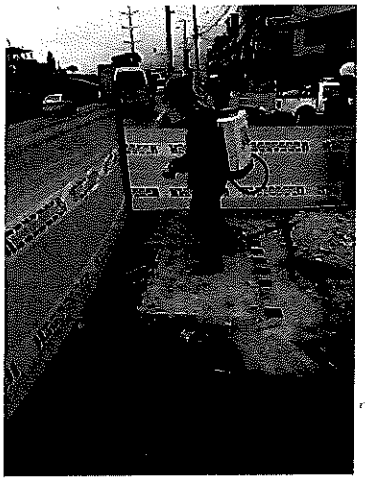


FOTOGRAFÍA No.	04
FECHA	03/11/2020
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN	

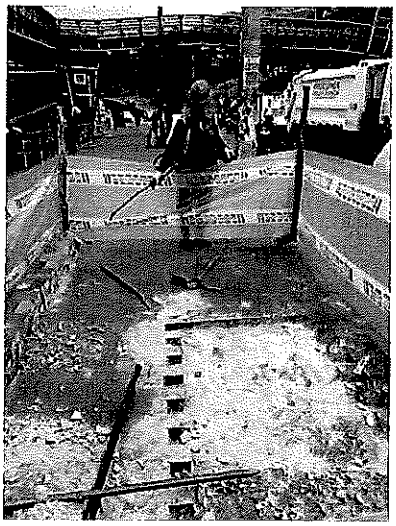


FOTOGRAFÍA No.	05
FECHA	03/11/2020
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN	

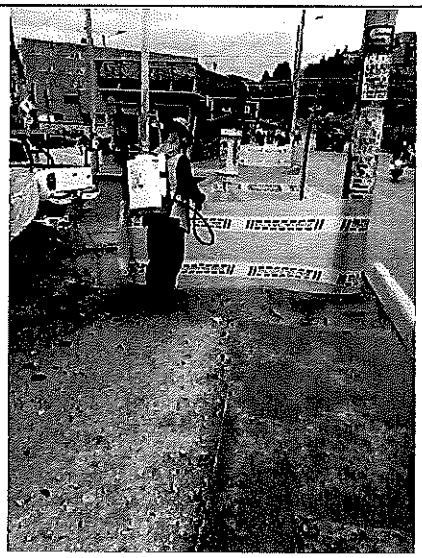

FOTOGRAFÍA No.	06
FECHA	03/11/2020
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN	

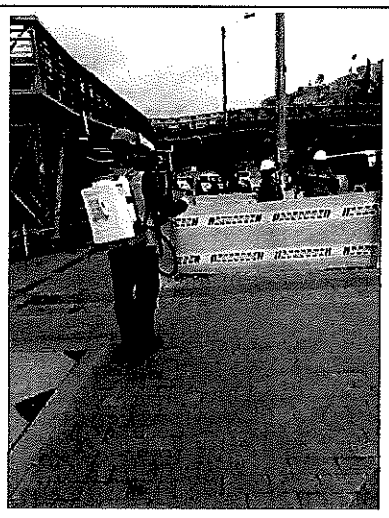


FOTOGRAFÍA No.	07
FECHA	
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	

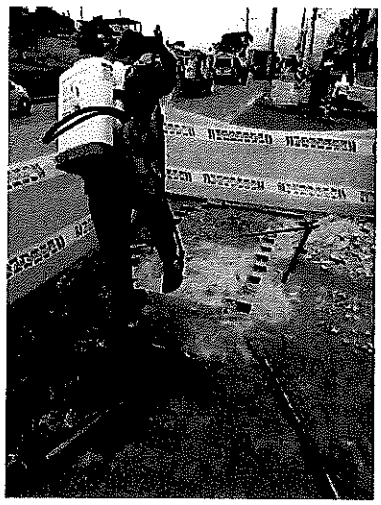

FOTOGRAFÍA No.	08
FECHA	
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES	





FOTOGRAFÍA No.	09	**FOTOGRAFÍA No.**	10
FECHA		**FECHA**	
LUGAR	KRA 116 X DG 16	**LUGAR**	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN		**DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN**	

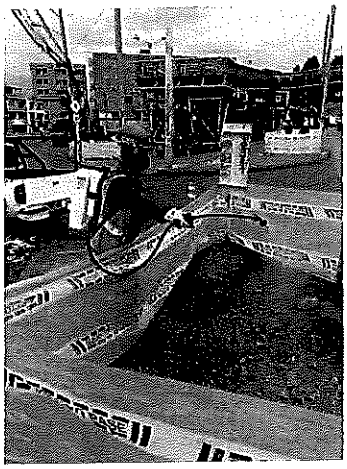



FOTOGRAFÍA No.	09	**FOTOGRAFÍA No.**	10
FECHA		**FECHA**	
LUGAR	AV BOYACA X CLL 60 SUR	**LUGAR**	AV BOYACA X CLL 60 SUR
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN		**DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN**	

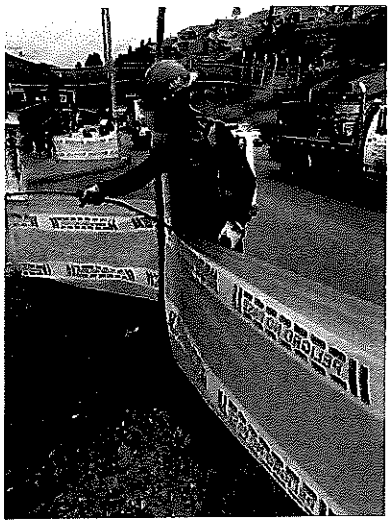

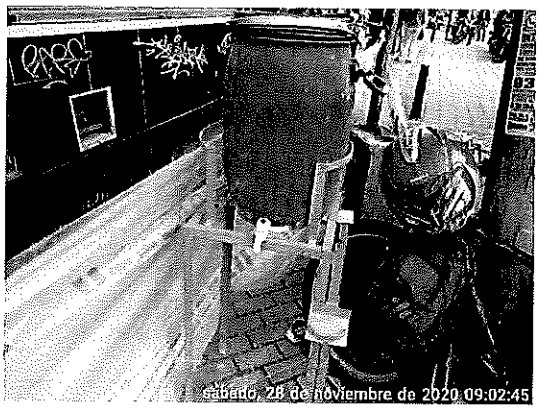

FOTOGRAFÍA No.	11
FECHA	
LUGAR	KRA 69X AC 26 SUR
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	



FOTOGRAFÍA No.	12
FECHA	
LUGAR	KRA 69X AC 26 SUR
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	




FOTOGRAFÍA No.	13
FECHA	
LUGAR	KRA 69X AC 26 SUR
OBSERVACIONES	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN	



FOTOGRAFÍA No.	14
FECHA	
LUGAR	KRA 116 X CALLE 71 BIS SUR
OBSERVACIONES	
DESINFECCIÓN DE INTERSECCIÓN	



FOTOGRAFÍA No.	15
FECHA	26/11/2020
LUGAR	KRA 116 X CALLE 71 BIS SUR
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	

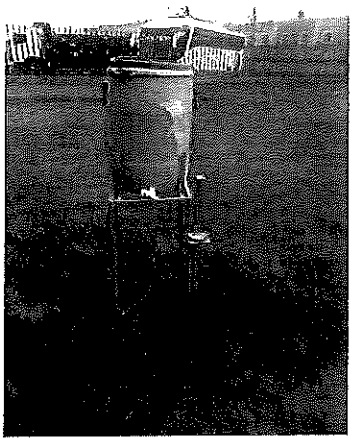

FOTOGRAFÍA No.	16
FECHA	20/11/2020
LUGAR	KRA 116 X DG 16
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	



FOTOGRAFÍA No.	15
FECHA	04/11/2020
LUGAR	KRA 73 X CLL 26 SUR
OBSERVACIONES	

FOTOGRAFÍA No.	
FECHA	
LUGAR	
OBSERVACIONES	


ANEXO 12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1. GESTIÓN DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO .




FECHA	24/11/2020
LUGAR	KR 17 X CL 71BIS SUR

Implementación PMT

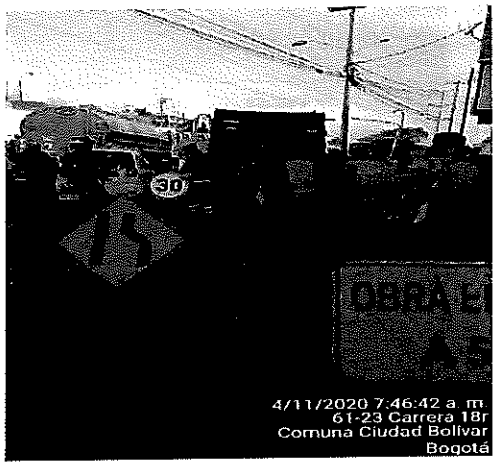

FECHA	13/10/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS

Implementación PMT

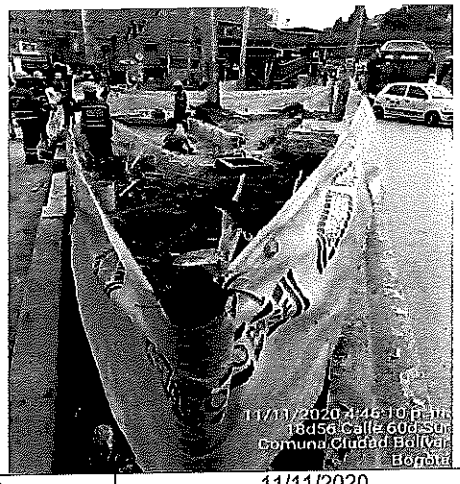

FECHA	11/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS



Implementación PMT





FECHA	11/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS

Implementación PMT

2. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

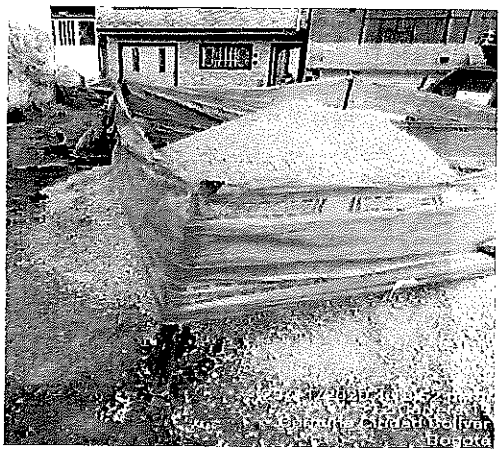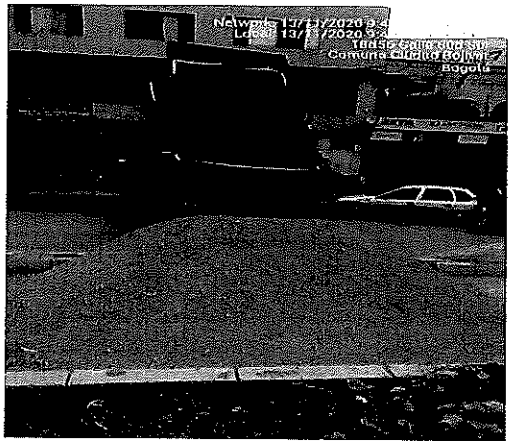			
FECHA	23/11/2020	**FECHA**	13/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS	**LUGAR**	KR 17 X CL 71BIS SUR
Barrera de contención para el material		Material directo al área de uso para	

3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

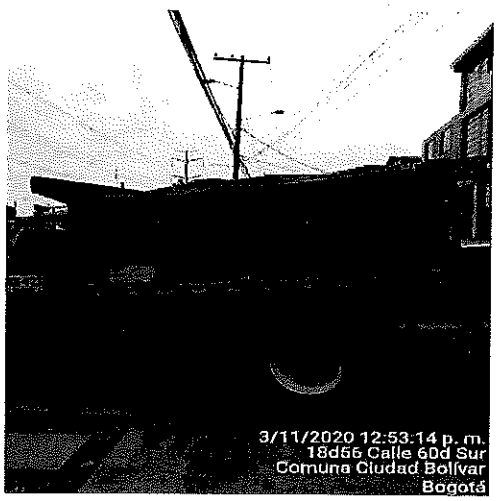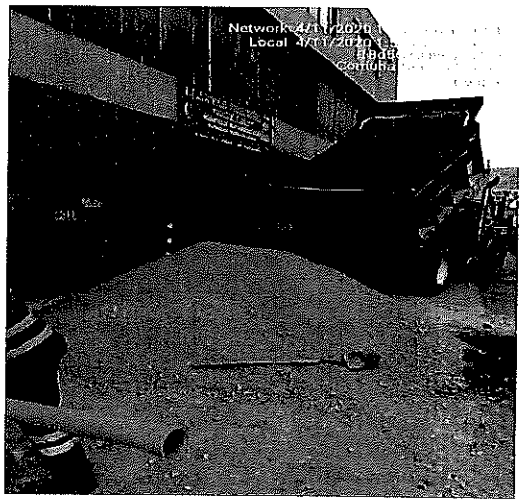			
FECHA	03/11/2020	**FECHA**	04/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS	**LUGAR**	KR 17 X CL 71BIS SUR
Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados		Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados	

4. USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA



FECHA	26/11/2020
LUGAR	KR 116 X DG 16

Suministro de agua. Al finalizar la oras se traslada el tanque con su contenido a una nueva obra



FECHA	03/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS

Suministro de agua. Al finalizar la oras se traslada el tanque con su contenido a una nueva obra


5. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIÓN

RCD APROVECHABLES - I - Residuos mezclados: 1.Residuos pétreos



FECHA	19/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS


Se realiza disposición en escombrera autorizada

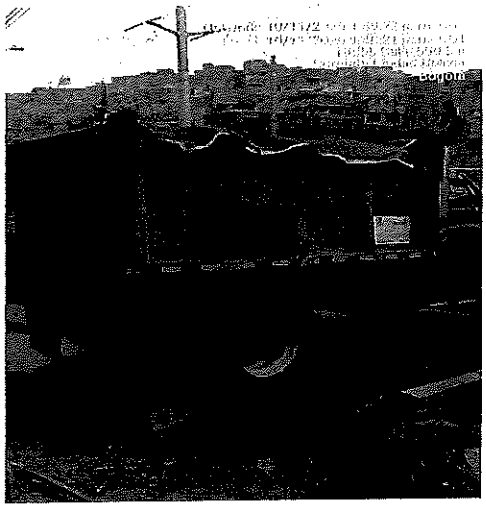

FECHA	10/11/2020
LUGAR	AV. Boyacá X CL 60CS

Se realiza disposición en escombrera autorizada


RCD APROVECHABLES - III- Otros Residuos 2. Residuos de carácter Metálico Acero, hierro, cobre, aluminio, Estaño y zinc.

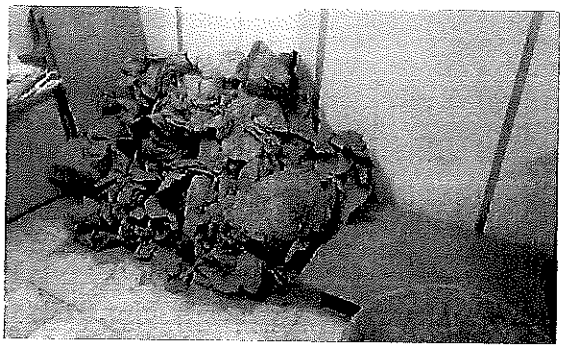

FECHA	19/11/2020
LUGAR	Calle 99#61-49

Se realiza almacenamiento temporal en bodega hasta completar mínimo 20 kg

RCD NO APROVECHABLES- VI- Residuos contaminados con otros residuos Bolsas de cemento, recipientes de pintura y solventes.

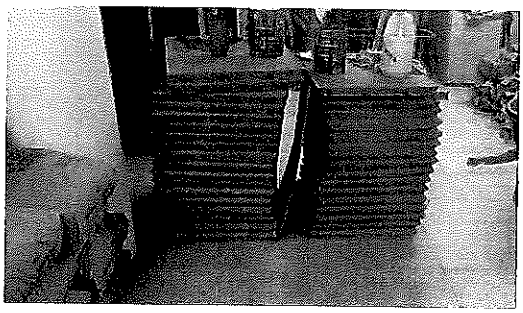



FECHA	19/11/2020
LUGAR	Calle 99#61-49


Se realiza almacenamiento temporal en bodega de tapas por demoler, posteriormente se hará disposición del material de hierro y acero

OTROS RESIDUOS - Se realiza disposición en las canecas dispuestas por la alcaldía de Bogotá para recolección de residuos.

6. REPPORTE DE RCD – APLICATIVO WEB SDA

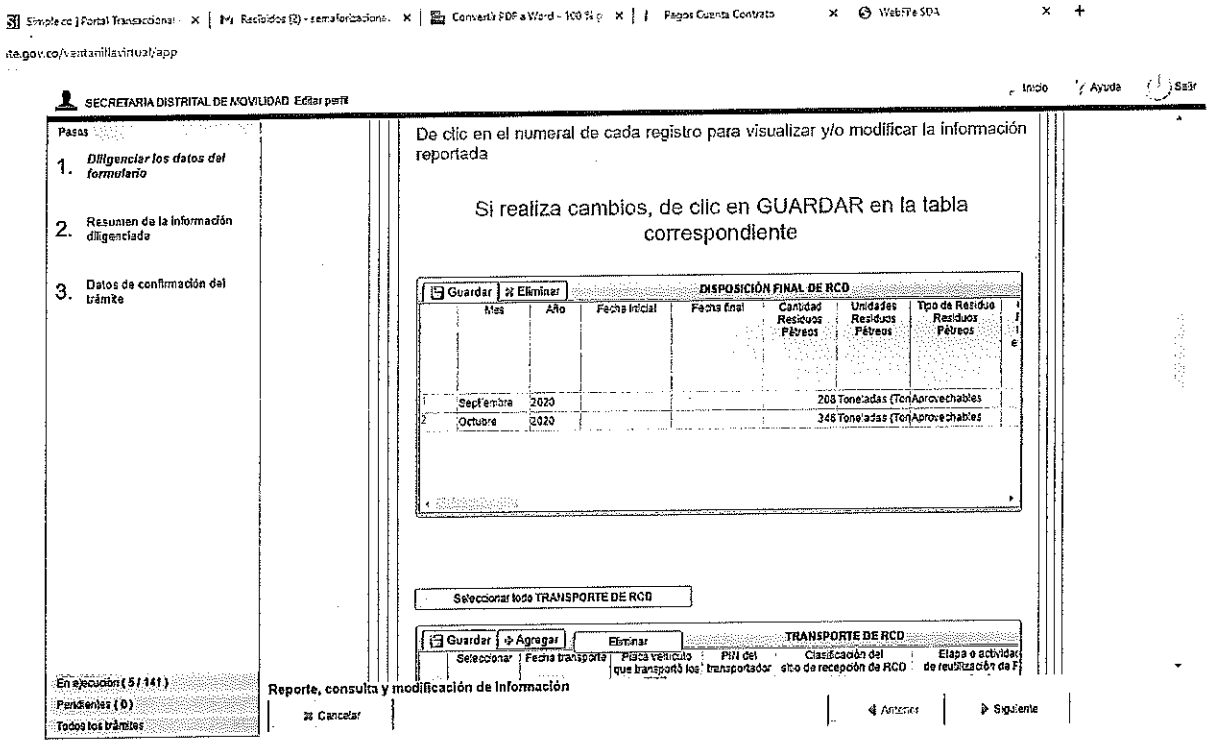

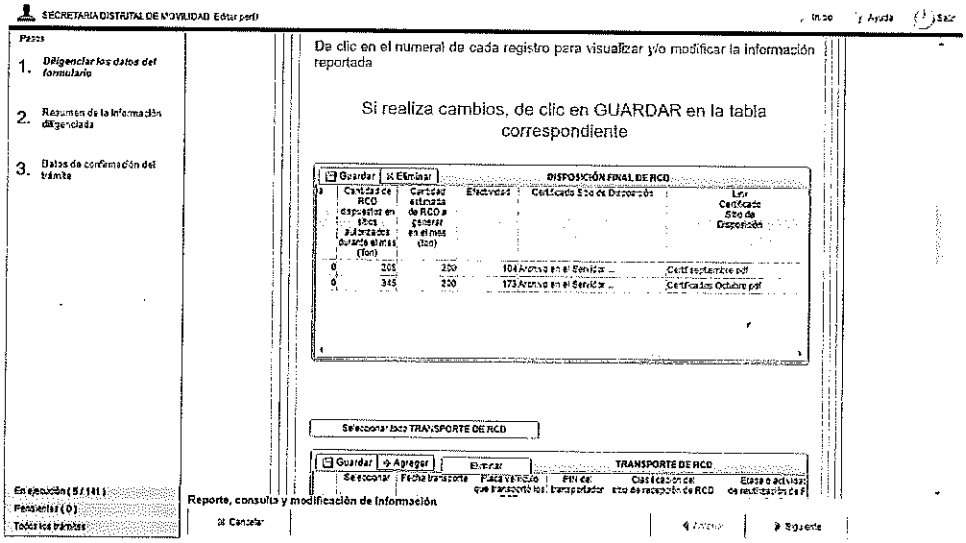
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Editar perfil
Inicio
Ayuda
Salir
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
De clic en el numeral de cada registro para visualizar y/o modificar la información reportada
Si realiza cambios, de clic en GUARDAR en la tabla correspondiente
Guardar
Eliminar
DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (Ton)
Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (Ton)
Efectividad
Certificado Sitio de Disposición
Ver Certificado Sitio de Disposición
0 205 220 104 Archivos en el Servidor... Certificados Septiembre.pdf
0 345 220 173 Archivos en el Servidor... Certificados Octubre.pdf
Seleccionar todo TRANSPORTE DE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
Nit del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa a activar de realización de la F en la obra
En ejecución (5 / 141)
Pendientes (0)
Todos los trámites
Reporte, consulta y modificación de información
Cancelar
Anterior
Siguiente

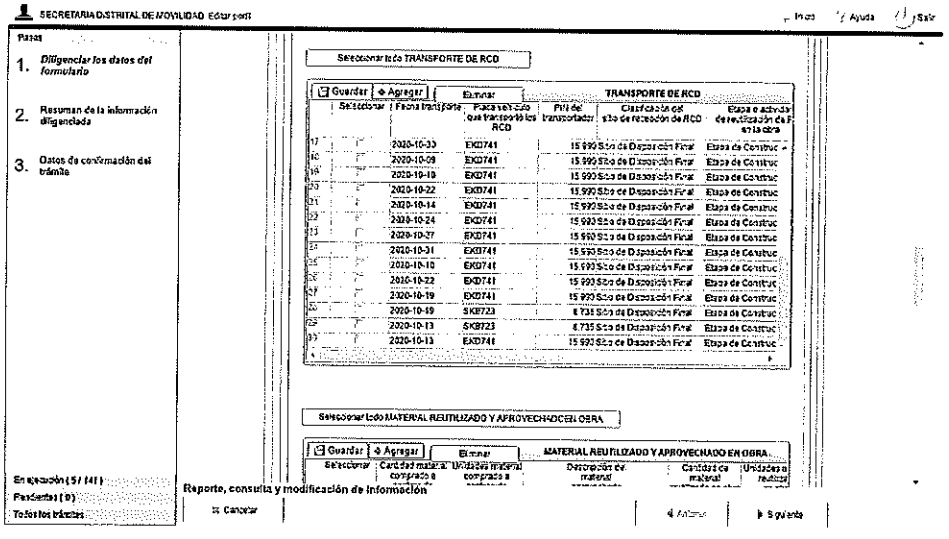
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Editar perfil
Inicio
Ayuda
Salir
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
Seleccionar todo TRANSPORTE DE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
Nit del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa a activar de realización de la F en la obra
2020-10-30 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-09 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-19 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-22 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-14 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-24 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-27 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-31 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-10 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-22 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-19 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-19 SKB723 6 735 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-13 SKB723 6 735 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
2020-10-13 EXD741 15 990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
Seleccionar todo MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA
Guardar
Agregar
Eliminar
MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA
Seleccionar
Cantidad material comprado
Unidades material comprado
Descripción de material
Cantidad de material
Unidades a reutiliz
En ejecución (5 / 141)
Pendientes (0)
Todos los trámites
Reporte, consulta y modificación de información
Cancelar
Anterior
Siguiente

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2020ER212211
Fecha inicio	2020-11-25 16:31:09
Fecha fin	2020-11-27 14:41:34
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

CEMEX
Construyendo un mejor futuro

CEMEX COLOMBIA S.A - NIT: 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 - 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 – 2006 / 1112 - 2012

CERTIFICA QUE:

La firma AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS con identificación 830123577 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 10 del año 2020, un total de 25 viajes expresados en: 175 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes 11 del año 2020, para presentar a la obra CTO DE OBRA 2019-1874 con PIN: 18616.
En constancia se firma:

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: PCvhwSLy-21167, generado en: 2020-11-26
La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.

Link de verificación

Certificación No.: CERT-2721-2020

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Identificada con NIT. 830123577-7, ingreso al sitio de reconformación morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 13 de octubre de 2020 hasta el día 22 de octubre de 2020, Ingresando un total de (5) Viajes, para un volúmen de TREINTA Y CINCO M3. (35 M3) sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra CTO-2019-1874, PIN OBRA: 18616.

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
2	Sencillo- Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos	28,0	4,0
5	Sencillo- Demolición, Concreto, Mampostería	7,0	1,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 13 de noviembre de 2020.

NICOLE STHEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

ACSR Ingeniería & Proyectos	REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	24/NOV/2020	LUGAR:	AV Boyaca c/l 60c Sur.
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Elizabeth Pineda	DOCUMENTO ID	1032450451

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Capacitación		Gestión de ocupación del espacio Público
Capacitación		Manejo de Materiales de construcción
Capacitación		
Capacitación		
Otra		

OBJETIVO:


Nº	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	[illegible]				
2	Richar Martinez	1043849111		R. Martinez	
3	Yhonnabel Martinez	85072815	OFICIAL		
4	Jhon Norberto Gon	9049896531	Ayuda		
5	Estiverson Olivos	91536053	of		
6	Alberto Nivia	1124618773	Of		
7	Edison Alvarez	1.042.467.682	Ayudante		
8	Maldad	1124502409	ayudante.		
9	Douglas Lean	21307158	ayudante	Douglas	
10	Victor Gamba	1026560962	Oficial		

ANEXO 13. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	SG-SST – 10 V 02
		F 17/06/2020

LUZ STELLA PARRA RUEDA — **CTO PARA 2016-1174 – ESTANDARIZACIÓN**

PROCESO	ACTIVIDAD RUTINARIA	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: PELIGRO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES: FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	EVALUACIÓN DEL RIESGO: ND	NE	NP	NC	NR	I	VALORACIÓN DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	INTERVENCIÓN (ELIMINACIÓN, SUSTITUCIÓN, CONTROLES DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVOS, EPP)	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: REALIZACIÓN, ALCANCE/CIERRE, CONTROLES ADMIN	RESPONSABLE Y FECHA
			Mal estado vías	Mecánico	Trabajo en Campo		Ninguno	Ninguno		2	3	6	25	150	II	MEJORABLE	4		M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Desniveles	Mecánico	Caídas		Ninguno	Ninguno		2	3	6	25	150	II	MEJORABLE	4		M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Herramientas	Mecánico	Proyección de partículas		Ninguno	Ninguno		2	3	6	25	150	II	MEJORABLE	4		M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Condiciones_de_Seguridad	Mecánico	Caída de objetos		Ninguno	Ninguno		4	3	12	25	300	III	MEJORAR	4		M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Mal aseo	Biológico	Enfermedades infecciosas	Enfermedad Gastrointestinal	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fenomenos_Naturales	Locativo	Sismos		Ninguno	Ninguno		6	1	6	25	150	II	MEJORABLE	4	Perdidas materiales, humanas, enfermedades.	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Desmayos	Fisiologico	Trastornos Metabolicos		Ninguno	Ninguno		2	3	6	10	60	II	MEJORABLE	2	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Alimentacion	Quimico	Toxicos		Ninguno	Ninguno		2	3	6	10	60	II	MEJORABLE	2	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Agresiones	Fisiologico	Trastornos Metabolicos		Ninguno	Ninguno		2	3	6	10	60	II	MEJORABLE	2	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Condiciones_de_Seguridad	Locativo	Caída de objetos		Ninguno	Ninguno		3	1	3	10	30	II	MEJORABLE	1	Trabajos verticales	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Mal aseo	Biológico	Enfermedades infecciosas	Enfermedad Gastrointestinal	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fenomenos_Naturales	Locativo	Sismos		Ninguno	Ninguno		6	1	6	25	150	II	MEJORABLE	4	Perdidas materiales, humanas, enfermedades.	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Mal aseo	Biológico	Enfermedades infecciosas	Enfermedad Gastrointestinal	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fatiga	Fisiologico	Sobrecarga Laboral	Dermatitis, deshidratación.	Ninguno	Ninguno		2	1	2	10	20	II	MEJORABLE	1	Dermatitis por contacto	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de Sistema de Gestión Ambiental		
			Visión	Visual	Iluminación	Fatiga visual, dolor de cabeza				6	1	6	10	60	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Físicos	Mecánico	Sustancias		Ninguno	Ninguno		3	1	3	10	30	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Psicosocial	Psicosocial	Gestión de la Organización					6	3	18	10	180	III	MEJORAR	3	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Biológico	Biológico	Animales	Enfermedad Leptospirosis	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fenomenos_Naturales	Locativo	Sismos		Ninguno	Ninguno		6	1	6	25	150	II	MEJORABLE	4	Perdidas materiales, humanas, enfermedades.	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Mal aseo	Biológico	Enfermedades infecciosas	Enfermedad Gastrointestinal	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fatiga	Fisiologico	Sobrecarga Laboral	Dermatitis, deshidratación.	Ninguno	Ninguno		2	1	2	10	20	II	MEJORABLE	1	Dermatitis por contacto	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de Sistema de Gestión Ambiental		
			Visión	Visual	Iluminación	Fatiga visual, dolor de cabeza				6	1	6	10	60	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Físicos	Mecánico	Sustancias		Ninguno	Ninguno		3	1	3	10	30	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Psicosocial	Psicosocial	Gestión de la Organización					6	3	18	10	180	III	MEJORAR	3	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Biológico	Biológico	Animales	Enfermedad Leptospirosis	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fenomenos_Naturales	Locativo	Sismos		Ninguno	Ninguno		6	1	6	25	150	II	MEJORABLE	4	Perdidas materiales, humanas, enfermedades.	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Mal aseo	Biológico	Enfermedades infecciosas	Enfermedad Gastrointestinal	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fatiga	Fisiologico	Sobrecarga Laboral	Dermatitis, deshidratación.	Ninguno	Ninguno		2	1	2	10	20	II	MEJORABLE	1	Dermatitis por contacto	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de Sistema de Gestión Ambiental		
			Visión	Visual	Iluminación	Fatiga visual, dolor de cabeza				6	1	6	10	60	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Físicos	Mecánico	Sustancias		Ninguno	Ninguno		3	1	3	10	30	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Psicosocial	Psicosocial	Gestión de la Organización					6	3	18	10	180	III	MEJORAR	3	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Biológico	Biológico	Animales	Enfermedad Leptospirosis	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fenomenos_Naturales	Locativo	Sismos		Ninguno	Ninguno		6	1	6	25	150	II	MEJORABLE	4	Perdidas materiales, humanas, enfermedades.	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Mal aseo	Biológico	Enfermedades infecciosas	Enfermedad Gastrointestinal	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fatiga	Fisiologico	Sobrecarga Laboral	Dermatitis, deshidratación.	Ninguno	Ninguno		2	1	2	10	20	II	MEJORABLE	1	Dermatitis por contacto	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de Sistema de Gestión Ambiental		
			Visión	Visual	Iluminación	Fatiga visual, dolor de cabeza				6	1	6	10	60	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Físicos	Mecánico	Sustancias		Ninguno	Ninguno		3	1	3	10	30	II	MEJORABLE	1	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Psicosocial	Psicosocial	Gestión de la Organización					6	3	18	10	180	III	MEJORAR	3	Lesiones por sistema musculoesqueletico	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Biológico	Biológico	Animales	Enfermedad Leptospirosis	Ninguno	Ninguno		10	3	30	25	750	IV	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL	4	Muerte por septicemia	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			
			Fenomenos_Naturales	Locativo	Sismos		Ninguno	Ninguno		6	1	6	25	150	II	MEJORABLE	4	Perdidas materiales, humanas, enfermedades.	M	Ninguno	Ninguno	Ninguno			

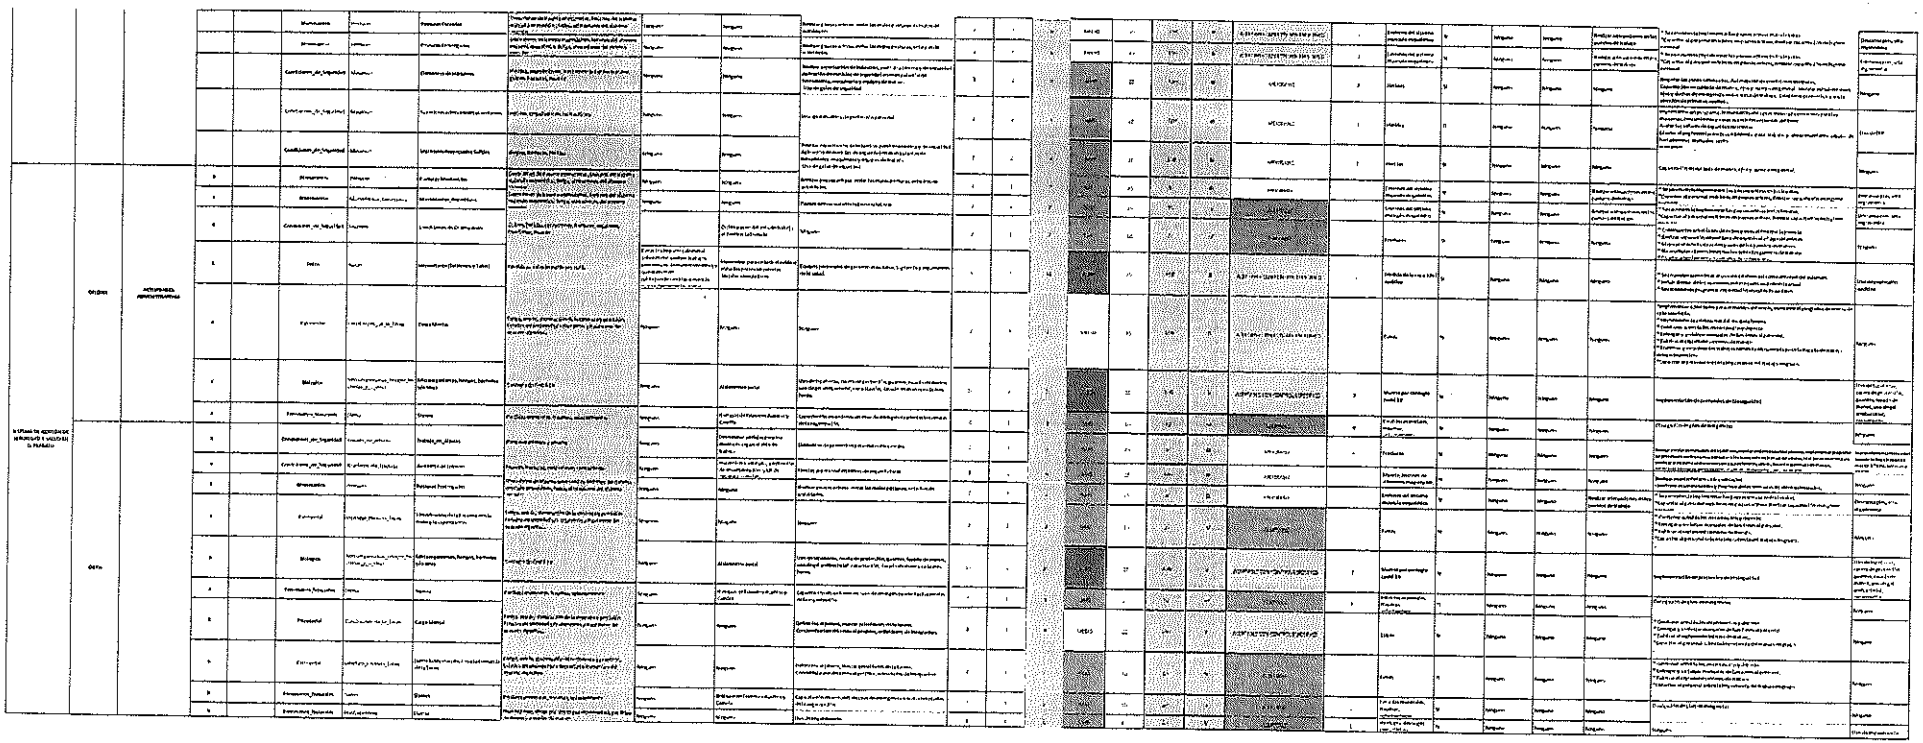

ANEXO 14. INSPECCIONES

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN COMPRERSOR	Código: IN 15-1
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AV Ingeniero Jorge Tadeo Lozano	Operador	Adrian Ubeine
Marca:		Ayudante:	Edwar Leon
Identificación:	N/A Serie 185	Fecha:	12/11/2020
Inspector:	Carolina Jaraq		

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Puerta de acceso del panel de instrumentos	✓			
2	Elemento del separador y punto de llenado	✓			
3	Punto de llenado de aceite del motor	✓			
4	Punto de llenado de la botella de refrigerante	✓			
5	Punto de llenado de combustible	✓			
6	Filtro de aceite del motor	✓			
7	Salida de aire del paquete	✓			
8	Barra de tiro	✓			
9	Indicadores de aceite de motor refrigerante	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ NO

Responsable inspección

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-3
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AV Bosque x Cl 60 C Sur	Operador	Jhon Valencia
Marca:	Porter Cabiel	Ayudante:	Richard Martinez
Modelo:	PPG 2000 - 83	Fecha:	12/11/2020
Serial:		Inspector:	Carolina Jaraq

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Tanque de combustible	✓			
2	Silenciador de escape	✓			
3	Conexión a tierra	✓			
4	Enchufe/conexión AC	✓			
5	Filtro de aire	✓			
6	Manija de arranque	✓			
7	Llave de combustible	✓			
8	Ahogador	✓			
9	Estructura de soporte	✓			
10	Bujía	✓			
11	Tapa del combustible	✓			
12	Interruptor automático de protección AC	✓			
13	Contenedor de aceite	✓			
14	Interruptor de encendido	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la planta

☑ SI No ☐

Responsable inspección

Richard

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	DOCUMENTO:	CODIGO:
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	HS-IN-05
		VERSIÓN: 1

RESPONSABLE : Carolina Serna FECHA: 12/NOV/2020 AREA: Metsen

PROYECTO Señalización

CONDICIONES LOCATIVAS					OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO	NA	SC		NC	
Espacios organizados y libres de obstáculos		✓			
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		✓			
Intersección libre de escombros		✓			
Herramientas almacenadas correctamente		✓			
Limpia y en Buen Estado Locativo		✓			
Material bien apilado o almacenado		✓			
Residuos correctamente separados y zona identificada		✓			
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓			
Paredes limpias	✓				
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓				
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓				
Agua potable		✓			
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		✓			
Sanitarios limpios		✓			
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		✓			
Otros					

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

Firma Responsable	Firma Director de Obra

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Mesitas	Operador	Docente Eca Jesus Urango Carolina Serna H
Marca:	NA	Ayudante:	
Modelo:	NA	Fecha:	
Serial:	NA	Inspector:	

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
1	Martillo -maceta				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
3	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	Cincel				
	Punta libre de reabadas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	Otros				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspección

Responsable uso

ANEXO 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

137

Ingeniería & Proyectos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS

PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DEL MOTOR	KILOMETRAJE	FECHA	MARCA	CLASE DE VEHICULO	LINEA	CILINDRAJE	MODELO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO	DATOS DEL PROPIETARIO	TIENE SOAT	FECHA DE VIGENCIA	TIENE REVISION TECNICO-MECANICA	FECHA DE VIGENCIA	TIENE COMPARENDOS	REPORTE DE INCIDENTES	FECHA	LUGAR	AREA	FECHA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	HALLAZGOS	FECHA DE CIERRE
SXB723	08G0100824			DODGE	VOLQUETA	D 600 157	6194	1980		RAFAEL ANTONIO TAPIERO	SI	6/09/2021	SI	7/09/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				
EDK741	93722195			CHEVROLET	VOLQUETA	SIN LINEA	5000	1954		BELTRAN TAPIERO LUZ STELLA	SI	11/11/2020	SI	16/11/2020	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				
SZQ318	490OZL 0045165X			JBC	CAMIONETA	JBC 1030	2672	2012		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	SI	29/04/2021	SI	11/07/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020209921

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKB723	DODGE	D 600 157	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
08G0100824	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT000119	N	DT000119	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TAPIERO RAFAEL ANTONIO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 80372291

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 83085

I/E: I

FECHA IMPORT.: 14/12/1979

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
14/08/1980	05/02/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA

LT07000152635

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2019-04-25	2019-04-30	2020-04-29

No. DE PÓLIZA	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO DEL VEHÍCULO	TIPO DE VEHÍCULO	CILINDRAJE (CC)	MODELO
4130/0300011120	BKB723	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6194	1980

MARCA	LÍNEA	CLASIFICACIÓN
DODGE	PLATON	

No. MOTOR	No. CHASIS Y No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
D8GD100024	DT0001119		7.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD DE EXPEDICIÓN TOMADOR
TAPIERO RAFAEL ANTONIO	3144443881	CC	80372281	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE LA SUCURSAL	CÓDIGO ACTIVIDAD ESPECIFICA	CLAVE EXPEDICIÓN	EN PROVISIONAL	CIUDAD DE CIRCULACIÓN
AT1329	10	1640005054	0	BOGOTA D.C

PRIMA	PRIMA AUS	DERECHOS DE EMISIÓN	TASA RUNT
$ 520	$ 607700	$ 303950	$ 1900

VALOR TOTAL
$ 911650

AMPARO POR VÍCTIMA	CANTIDAD	
A GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. INCAPACIDAD TEMPORAL Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

No. DE CONTROL 41881017

PLACA	MARCA	LÍNEA
SKB721	DODGE	D 600 157

COLOR	MODELO
AZUL	1980

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE
5191	DIESEL

SERVICIO	CARROCERÍA
VOLQUETA	DDGD100B2A

No. CONSECUTIVO RUNT	No. MOTOR
00372291	

PROPIETARIO	No. IDENTIFICACIÓN
RAFAEL A. TAPIERO Y OTROS	141308352

No. DE CONTROL 41881017

PLACA	CLASE DE VEHÍCULO
SKB721	DT000119

CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	No.
CENTRO NACIONAL DE REVISION	000081626

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2019 05 02	2020 05 01

No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	No. CONSECUTIVO RUNT
09-CIN-026-003	141308352

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017911254

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EKD741	CHEVROLET	SIN LINEA	1954

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5,000	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
937 22195	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
X	N	X	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

~~BELTRAN FAPIERO LUZ ESTELLA~~ — ~~C.C. 41760813~~

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
5058	I	26/09/1966	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/11/1967	01/03/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO GUNDICAJICA





LT07000019483

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2019	11	11	2019	11	12	2020	11	11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
23597924	EKD741	VOLQUETA	PARTICULAR	5000	1954

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	
LÍNEA VEHÍCULO	SINLINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
93722195	X	NO APLICA	4.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	No. DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RAFAEL ANTONIO TAPIERO		CEDULA	80372291	


CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	3553	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 419,800	$ 209,900	$ 1,700

TOTAL A PAGAR $ 631,400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:


- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorito a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores; intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000518888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

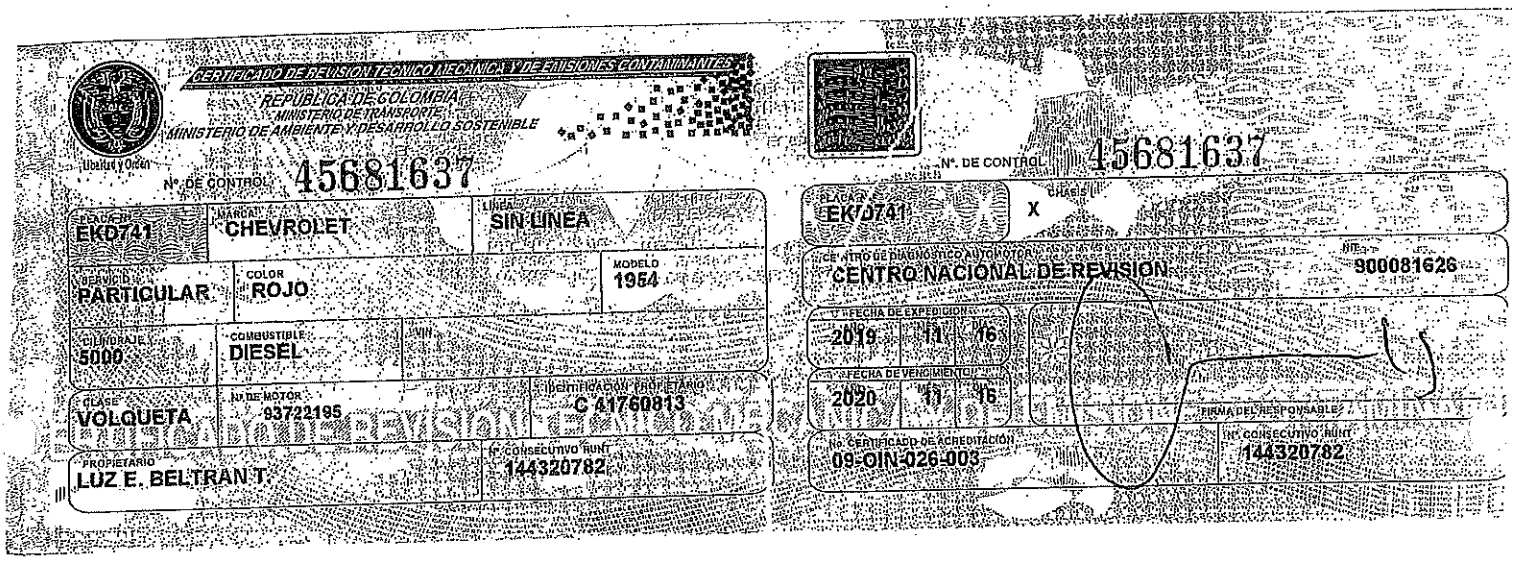

CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 45681637

PLACA Nº EKD741 | MARCA CHEVROLET | LINEA SIN LINEA

SERVICIO PARTICULAR | COLOR ROJO | MODELO 1964

CILINDRAJE 5000 | COMBUSTIBLE DIESEL | VIN

CLASE VOLQUETA | Nº DE MOTOR 93722195 | IDENTIFICACION PROPIETARIO C 41760813

PROPIETARIO LUZ E. BELTRAN T. | Nº CONSECUTIVO RUNT 144320782

Nº. DE CONTROL 45681637

PLACA Nº EKD741 | CHASIS X

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CENTRO NACIONAL DE REVISION | NIT 900081626

FECHA DE EXPEDICION 2019 11 16

FECHA DE VENCIMIENTO 2020 11 16

No. CERTIFICADO DE ACREDITACION 09-OIN-026-003

FIRMA DEL RESPONSABLE

Nº. CONSECUTIVO RUNT 144320782

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016284783

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SZQ318	JBC	JBC 1030	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.672	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAS
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	1300

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
490QZL 0045165X	N	LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LSYCJD3R6CH000070	N	LSYCJD3R6CH000070	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT 8301[illegible]7

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
88201100010846 4

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/12/2011

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******


FECHA MATRÍCULA
17/01/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
20/06/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

SDM BOGOTA D.C.



LT06001413442

142

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

FECHA DE EXPEDICION	DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2020-04-29	2020-04-30	2021-04-29

	PLACA No	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/ATTS	MODELO
300049800	SZQ318	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2672	2012

MARCA	CARROCERIA
JBC	
LINEA VEHICULO: JBC 1030	ESTACAS

No CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
L0045165X	LSYCJD3R6CH000070	LSYCJD3R6CH000070 : 1.30

NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NGENIERIA Y PROYECTOS SAS	3113531384	NIT	8301235777	BOGOTA D.C

ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
	10	1540D5084	0	BOGOTA D.C

PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN/PUESTOS	TASA RUNT
$ 423300	$ 211650	$ 1700

AMPARO POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

UR

50

ADA

cación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos is en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de gunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la que ya se encuentra registrada en el RUNT.

ene tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

r portar siempre su SOAT las autoridades de tránsito le lo pueden solicitar en momento

rificar que su póliza esta registrada en el RUNT

rso al momento en que dicha expire su póliza. No tener SOAT vigente acarrea económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por costos de la atención de las víctimas del accidente

su SOAT en lugares autorizados

accidente de tránsito

n resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más al lugar del accidente. Informe que tenga la capacidad para brindar la atención por las víctimas

prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de s de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie peratividad Nacional de Salud

gastos médicos, el cobro lo hace la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la prestadora de servicios de salud

tender la reclamación ante la compañía aseguradora no se niegue acuda a

Protección de datos personales

Con la respectiva conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en protección de datos personales manifiesta que ha suministrado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que sus datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos así como a conocer actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com



CERTIFICADO DE EMISIONES MECÁNICA Y ELEMENTOS CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

No. DE CERTIFICADO 42369249

SZD018	JBC	JBC 1030
PUBLICO	BLANCO	2012
2572	DIESEL	L3YCJD3R9CH000070
CAMIONETA	490QZL 0946190X	N 830123577
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		1408088918

CAR - PITS S.A.

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

NIT. 900.081.091-1

CARRERA 4A No. 18-08 ENTRADA 4 CAZUCA SOACHA

TEL. 7016

4236924

SZO318

LSYCJD3R6CH000070

CDA CAR PITS SA

2019 03 24

2020 03 27

09-CIN-049-001

1408099143

ANEXO 16. ENTREGA DE EPP

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Estiven Jon Olveros	CEDULA No.	91536053
FECHA:	03/NOV/2020	CARGO	Grlagl-encargado
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			04/11/20	Pantalon Tradicional	4	
2					09/11/20	Guantes	1	
3					30/11/20	Gafas	1	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 91536053

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Adrian Ospina	CEDULA No.	8[illegible]32500
FECHA:	03/11/2020	CARGO	maestro
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (ROPA DE TRABAJO)

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		V			03/11/20	[illegible]	1	X
2			V		18/11/20	[illegible]	1 par	X
3					18/11/20	[illegible]	3	X
4					30/11/20	[illegible]	1	X
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: [illegible]

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jhon Valencia	CEDULA No.	1043842534
FECHA:	3/11/2020	CARGO	Ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			6/11/20	Gafas	1	
2					9/11/20	Chaleco	1	
3					9/11/20	Guantes	3	
4					13/11/20	Botas	1	
5					30/11/20	Gafas	1	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7· LEY 9 DE 1979, Art. 88. DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dolacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1043842534

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Edixon Alvarez			CEDULA No.	1042467682
FECHA:	03 NOV 2020	CARGO	ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Tapabocas	1 X	Edixon
2					09/11/20	Guantes	1 par	Edixon
3					09/11/20	Tapabocas	3 X	Edixon
4					18/11/20	Mascarilla	1	Edixon
5						Tapabocas		Edixon
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art 56 y Art 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88, DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Edixon

CEDULA No: 1042467682

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Douglas Leon			CEDULA No.	1130715858
FECHA:	03/11/20	CARGO	Ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Tapabocas	1	X
2					09/11/20	Guantes	1par	X
3					09/11/20	Tapabocas	3	X Douglas
4					18/11/20	Monogafas	1	X Douglas
5					30/11/20	Tapabocas	1	Douglas Leon
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88. DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	X Douglas
CEDULA No:	1130715858

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jhon Martinez	CEDULA No.	85272819
FECHA:	03 noviembre/20	CARGO	ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Camisas	1	
2					09/11/20	Guantes	1	
3					09/11/20	Gafas	3	
4					30/11/20	Tapabocas	1	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 85272819

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Juan David
FECHA: 05/NOV/2020
CARGO: oficial
CEDULA No: 1020509315
FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1								
2		X			06/11/20	Jardinera	1	X
3					09/11/20	(botas)	1	X
4					09/11/20	Pantalon	3	X
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

De usar los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador de Grag, con la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 84, DECRETO 1295 DE 1994 Art 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en sanciones disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y cumplimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

Firmo este compromiso para Dotación y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA No: 1020509315

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Victor Gamba	CEDULA No.	1026550962
FECHA:	04/11/2020	CARGO Oficial	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Pantalon	4	Victor Gamba
2					09/11/20	Camiseta	1	Victor Gamba
3					30/11/20	Pantalon	1	Victor Gamba
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 86 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Victor Gamba

CEDULA No. 1026550962

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Hugo Ovied	CEDULA No.	9865683
FECHA:	03 nov 2020	CARGO	ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Tapabocas	1	x Hugo Ovied
2					09/11/20	Guantes	1	x Hugo Ovied
3					18/11/20	Guantes	1	x Hugo Ovied
4					18/11/20	Tapabocas	3	x Hugo Ovied
5					18/11/20	Monogafas	1	x Hugo Ovied
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: x Hugo Ovied

CEDULA No: 9865683

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Fabs Uiano	CEDULA No.	1096244058
FECHA:	03/11/2020	CARGO	Ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Overoles	1	
2					09/11/20	Botas	1	
3					09/11/20	Guantes	3	
4					18/11/20	Mascarilla	1	
5					30/11/20	Gafas	1	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 82 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1096244058

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Heiner Navarro — CEDULA No.: 1049298534

FECHA: 03/MN/2020 — CARGO: Ayudante — FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Camisas	1	x Heiner Navarro
2					09/11/20	Guantes	1	x Heiner Navarro
3					09/11/20	Camisas	3	x Heiner Navarro
4					16/11/20	Guantes	1	x Heiner Navarro
5					30/11/20	Camisas	1	Heiner Navarro Rios
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Heiner Navarro

CEDULA No: 1049298534 — CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE HE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	José Angel Chaves			CEDULA No.	85241049
FECHA:	02/11/2020	CARGO	Oficial	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADO

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			06/11/20	Jaqueta	1	X José Angel
2					09/11/20	guantes	1	X José Angel
3					09/11/20	Jaqueta	3	X José Angel
4					18/11/20	Pantalon	1	X José Angel
5					30/11/20	Pantalon		José Angel
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88. DECRETO 1295 DE 1994. Art 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: X José Angel

CEDULA No: 85 241 049

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Luis Madariaga			CEDULA No.	1070820760
FECHA:	5/11/20	CARGO	ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (ERP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1	X				5/11/20	overol	2	
2						casco	1	
3						guantes	1par	
4						gafas	4	
5						tapabocas	1	
6						termometro	1	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1070820760

CEDULA No

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Alberto Nivia			CEDULA No.	1124518993
FECHA:	23/11/20	CARGO	ayudante	FECHA INGRESO:	23/11/20

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1					23/11/20	Botas dieléctricas	4	X
2						Guantes	1par	X
3						overol	2	X
4						Mascarilla	1	X
5						Permanente	1	X
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: X

CEDULA No: 1124518993

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Franklin Gutierrez			CEDULA No.	1124504376
FECHA:	23/11/20	CARGO	ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1					23/11/20	guantes	4	Franklin Gutierrez
2						gafas	1par	Franklin Gutierrez
3						overol	2	Franklin Gutierrez
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Franklin Gutierrez

CEDULA No: 1124504390 CEDULA No:

152

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Alfonso Castro	CEDULA No.	1024491993
FECHA:	03/11/2020	CARGO	Ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1					03/11/20	Guantes	2	ALFONSO CASTRO
2						Overol	1	ALFONSO CASTRO
3						Botas	1	ALFONSO CASTRO
4						Mascarilla	1	ALFONSO CASTRO
5						Casco	1	ALFONSO CASTRO
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88, DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: ALFONSO CASTRO

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Mayes Tarifero			CEDULA No.	1124583409
FECHA:	24/11/20	CARGO	ayudante.	FECHA INGRESO:	24/11/20

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (RAP / DOTACION)

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1					24/11/20	Overol	2	x Mayes
2						Tapabocas	4	x Mayes
3						Guante	1	x Mayes
4						Monogafa	1	x Mayes
5						Termometro	1	x Mayes
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizer adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	x Mayes
CEDULA No:	

153

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ricardo Hurtado			CEDULA No.	1054681093
FECHA:	03 Nov 2022	CARGO	conductor	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2						guantes	1	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 88, DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1054681093

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Fabian Chacon — CEDULA No. 1126123418

FECHA: 03/NOV/2026 — CARGO: Almacenista — FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y VESTUARIO

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Casco	1	Fabian Chacon
2						Tapabocas	4	Fabian Chacon
3						guantes	1	Fabian Chacon
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979. Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1126123418.

154

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Richard Martinez — CEDULA No. 1043849111

FECHA: 03/11/2020 — CARGO: Ayudante — FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADO

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			03/11/20	Japonesa	1	Richard dean
2					07/11/20	Botas	1	Richard dean
3					18/11/20	Camisa (2)	3	Richard dean
4					18/11/20	Botas	1	Richard dean
5					27/11/20	(1KN)	1	Richard dean
6					03/11/20	Japonesa	1	Richard dean
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979. Art 88; DECRETO 1295 DE 1994. Art 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Richard dean

CEDULA No: 1043849111

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO:

NOMBRE	[illegible]		CEDULA No.	1011279583	
FECHA	03/11/2023	CARGO	[illegible]	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X			03/11/23	Camisetas	1	[illegible]
2					03/11/23	Jeans	1	[illegible]
3						Tapabocas	3	[illegible]
4						Gorras	1	[illegible]
5						Manga/brazo	1	[illegible]
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979. Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: [illegible]

CEDULA No: 1011279583

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Carolina Farfa
FECHA: 03/NOV/2020
CARGO: Profesional SST
CEDULA No.: 1012420278
FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1								
2						Tapabocas	4	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
27								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en [illegible] dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro [illegible] de capacitación sobre el uso adecuado de los mismos

[illegible] los EPP y elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador [illegible] de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art 56 y Art 58 numeral 7; LEY 9 DE [illegible] RESOLUCION 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en [illegible] El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y [illegible] de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

[illegible] Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

Intensidad & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Stella Pineda			CEDULA No.	1026280474
FECHA:	04/NOV/2020	CARGO	Tecnologo III	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Stella Pineda
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art 83 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso es para la Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Stella Pineda

CEDULA No.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Oscar Valles			CEDULA No.	79220093
FECHA:	02 NOV 2021	CARGO	Inspector	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Oscar Valles.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico psicológico y social Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley, a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Art 56 y Art 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 85 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas graves o disciplinarias El presente compromiso quedara archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente documento se toma para Dotacion y EPP Ropa de trabajo entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Oscar Valles

CEDULA No

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Camila Camba	CEDULA No.	1019796C4
FECHA	03/NOV/2020	CARGO	Aux
		FECHA INGRESO:	

ITEM	INGRESO PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1					Tapabocas	4	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante el tiempo laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social Declaro que he recibido instrucción sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de proteccion personal incluyendo ropa de trabajo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en el reglamento de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 80, DECRETO 1295 DE 1994 Art 22. Soy responsable de su uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas graves. El presente compromiso queda archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento de cumplimiento de deberes y derechos como empleado de la IMGRAG SAS

El trabajador firma al pie de la Dotación y EPP Ropa de trabajo entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

CEDULA No.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Meliza Janez				
FECHA:	05 MAY 2020	CARGO	Ing Residente	CEDULA No.	1077423387
				FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1								
2						Tapabocas	4	meliza janez
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Si no cumplo con el uso de los elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador según la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 84 y DECRETO 614 DE 1994 Art 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en una falta grave. El incumplimiento del presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El suscrito recibe a satisfacción los EPP Ropa de trabajo, entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO. Meliza Janez

CEDULA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACIÓN (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Edwin Forero			CEDULA No.	80239892.
FECHA:	03/NOV/2020	CARGO	Director Obra	FECHA INGRESO:	

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Kapa bomaj	4	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos / elementos de proteccion personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art 56 y Art 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979 Art 88 DECRETO 1295 DE 1994 Art 22 Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No

ANEXO 17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Bogotá D.C. 29 de Octubre del 2020

ACUERDO DE PRESTAMO DE BAÑO

El presente acuerdo se celebra y entra en vigor el 29 de Octubre del 2020, hasta el día 30 de Noviembre del 2020.

ENTRE: **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.**
NIT: 830.123.577-7

Y: Armando Saenz Pinzon
74.242.854

Para que se realice el préstamo del servicio de baños al personal que trabaja en la obra ubicada en la AV Boyaca con calle 80c SUR, esto con el fin de que la empresa AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. garantice el servicio de baño.

Nombre: Carolina Jeing
Cedula: 1012420278

Nombre: Armando Saenz Pinzon
Cedula: 74.242.854.

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Kra 69B x AC 26S

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1	26/NOV/20		
2	Base	1	1	26/NOV/20		
3	Gel antibacterial	1	1			
4	alcohol 91 70%	1	1			
5	Papeles Toallas	1	1			
6	Hipoclorito	1	1			
7	Detergente	1	1			
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jhon Martinez

CEDULA No: 85272 819

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Camion 1 42

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel antibacterial	2	2	03/11/NOV		
2	alcohol al 70%	2	2			
3	Toallas Papel	2	2			
4	Hipoclorito	2	2			
5						
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Giovanny Hurtado.

CEDULA No: 1054681093

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Kra 116 x Dg 16

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1	20/11/2020		
2	Base	1	1			
3	Gel antibacterial	1	1			
4	alcohol al 70%	1	1			
5	Paquete toallas de papel	1	1			
6	Hipoclorito	1	1			
7	Detergente	1	1			
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Adrian Useche

CEDULA No: 80082500

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Kra 13 x Cll 77 Bis Sur

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1	03/11/2020		
2	Base	1	1			
3	Gel antibacterial	1	1			
4	Alcohol al 70%	1	1			
5	Paquete Toallas de Papel	1	1			
6	Hipoclorito	1	1			
7	Detergente	1	1			
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jean Martinez

CEDULA No: 85 272 819

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN: AV Bolaca X Cll 60 C Sur

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1	03/NOV/20		
2	Base	1	1			
3	Gel antibacterial	1	1			
4	alcohol al 70%.	1	1			
5	Paquete de Toallas Papel	1	1			
6	Hipoclorito	1	1			
7	Detergente.	1	1			
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Estiven Sn Oliveros

CEDULA No: 91 153 6053

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Kra 23 x Cl 26 S

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1	03/NOV/2020		
2	Base	1	1			
3	Gel antibacterial	1	1			
4	alcohol al 70%.	1	1			
5	Paquete Toallas de Papel	1	1			
6	Hipoclorito	1	1			
7	Detergente	1	1			
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Estiven Sn Oliveros.

CEDULA No: 91 153 6053

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Kra 92 cll 158 Suba

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1			
2	Base	1	1			
3	Gel antibacterial	1	1			
4	alcohol al 70%	1	1			
5	Paquete Toallas de papel	1	1 Paquete.			
6	Hipoclorito	1				
7	Detergente	1				
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Juan Rafael Diaz M

CEDULA No: 1024499395.

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Av Batara cll 60C Sur

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de agua	1	1			
2	Base	1	1			
3	Gel antibacterial	1	1			
4	alcohol al 70%	1	1			
5	Paquete de toallas.	1	1 Paquete			
6	Hipoclorito	1				
7	Detergente.	1				
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 9155605 3

SEGUIMIENTO DE SALUD

ITEM	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	AM PRESENTARON SINTOMAS RELACIONADOS CON EL COVID 19	SEGUIMIENTO TEMPERATURA Semana 1							SEGUIMIENTO TEMPERATURA Semana 2							SEGUIMIENTO TEMPERATURA Semana 3							SEGUIMIENTO TEMPERATURA Semana 4												
						LUNES Festivo		MARTES 16/11/2020		MIERCOLES 18/11/2020		JUEVES 19/11/2020		VIERNES 20/11/2020		SABADO 21/11/2020		LUNES 23/11/2020		MARTES 24/11/2020		MIERCOLES 25/11/2020		JUEVES 26/11/2020		VIERNES 27/11/2020		SABADO 28/11/2020		LUNES 30/11/2020		MARTES 01/12/2020		MIERCOLES 02/12/2020		JUEVES 03/12/2020		VIERNES 04/12/2020		SABADO 05/12/2020		LUNES 07/12/2020	

ANEXO 18. FORMATOS CALIDAD

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

FORMATO 10 RESULTADO ENSAYO DE COMPACTACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	3/11/2020	NOMBRE DEL PROYECTO	SEMAFORIZACION 2019-1874
INTERSECCION	**ESQUINA**	**FECHA DE REALIZACION**	**RESULTADOS**
CL 53 X KR 24	SUR OCCIDENTAL	18/09/2020	98,3
	SUR OCCIDENTAL		98,1
	NOR OCCIDENTAL		98,0
CL 53 X KR 7	SUR OCCIDENTAL	22/09/2020	96,4
CL 53 X KR 21	NOR ORIENTAL	24/09/2020	96,7
	SUR ORIENTAL		98,0
CL 53 X KR 20	SUR ORIENTAL	28/09/2020	96,0
	NOR OCCIDENTAL		95,1
	SUR OCCIDENTAL		98,4
	SUR ORIENTAL		98,3
CL 53 X KR 18	SUR OCCIDENTAL	30/09/2020	95,0
	SUR OCCIDENTAL		95,5
	NOR OCCIDENTAL		96,1
KR 73 X CL 26 SUR	SUR ORIENTAL	17/10/2020	95.3
	SUR ORIENTAL		96.0
CL 183 CON KR 54D	NORTE	15/10/2020	95.3
	SUR		96.2
	SEPARADOR		95.8
CL 53 X KR 17	NOR ORIENTAL	6/10/2020	95.9
	SUR ORIENTAL		98.8
	SUR OCCIDENTAL		95.2
AV BOYACA X CL 60 C SUR	NOR OCCIDENTAL	25/11/2020	95,4
	NOR OCCIDENTAL	25/11/2020	95,8
	NOR OCCIDENTAL	25/11/2020	95,5
	ISLETA OCCIDENTAL	23/11/2020	96,6
	ISLETA OCCIDENTAL	23/11/2020	96,8
	SUR OCCIDENTAL	23/11/2020	97,2
	NOR ORIENTAL	13/11/2020	95,7
	ORIENTAL	13/11/2020	95,5
	ORIENTAL	13/11/2020	96,7
	ORIENTAL	5/11/2020	100,1
	ORIENTAL	5/11/2020	95,2
	SUR ORIENTAL	5/11/2020	95,9

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

VERSION 1 - V1

		INTERSECCIONES															
MATERIAL	TOTAL CONSUMIDO	CLL53 XKR 7	CLL53 X KR 17	CLL53 X KR 16	CLL53X KR 20	CLL53 X KR21	CLL53 X KR24	Emar CLL127 X9	Emar KR 116 X CL 16- FONTI-	KR 92 X CL 157C -SUBA	CLL183 X KR54D	KR 73 X CL 145 - KENNO	AV. Boyacá X CL 80CS MEISS	KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	KR 69B x AC 26 S – 1 Mayo	INGRESO DE MATERIAL
CINTA DE DEMARCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COLOMBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MALETIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO 3"	194	0	0	0	1	0	1	6	27	10	42	47	60	0	0	209
TUBO 2"	8	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	
CAMPANA TERMINAL 3"	233	0	0	0	5	0	1	0	26	19	40	75	67	0	0	379
CAMPANA TERMINAL 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CURVA 3"	44	1	0	0	2	0	4	0	1	3	7	10	9	6	1	58
ARENA DE PEÑA M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ARENA DE RIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BASE ASFALTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE SARDINEL A-10 20*50*80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE BORDILLO A-80 20*35*80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE BAJO RAMPA A-85 20*35*80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO) 20*50*60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO) 20*50*60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	
LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	1325	200	150	0	100	0	300	0	0	0	0	150	425	0	0	2000
LADRILLO	6400	60	0	0	0	0	50	200	750	630	1400	1930	1380	0	0	
MARCO SENCILLO	74	3	8	2	8	0	5	1	3	5	4	8	26	1	0	124
MARCO DOBLE	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	6	0	0	15
TAPA	112	3	9	2	8	0	5	1	5	7	17	22	32	1	0	240
TAPA ANTIVANDÁLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PH DIRIGIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PH NEUMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO GALVANIZADO DE 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UNION DE 2" ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CINTA BANDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACETE 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLARDO	106	7	19	3	28	0	12	0	0	0	0	6	31	0	0	135
BASE PARA POSTE	38	0	0	0	3	0	4	0	0	3	6	9	6	4	1	36
CEMENTO ARGOS	225	1	14	1	6	0	13	3	13	21	17	66	37	23	10	100
CEMENTO TEQUENDAMA	218	2	8	2	10	3	14	0	5	4	38	59	60	10	3	100
ADOQUIN ARCILLA	1200	0	400	0	0	500	0	0	0	20	80	0	200	0	0	4000

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO 14. DESPACHO DE MATERIALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		NOMBRE DEL PROYECTO			
INTERSECCION DESTINO	MATERIAL	FECHA	N° FORMATO	CANTIDAD	DESPACHADOR
CLL53 X KR 7	CURVA 3"	22/9/2020	14	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 8	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	18/09/20	9	200	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 9	LADRILLO	19/9/2020	10	60	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 10	MARCO SENCILLO	22/9/2020	14	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 12	TAPA	22/9/2020	14	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 13	BOLARDO	22/9/2020	14	7	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 14	CEMENTO ARGOS	18/09/20	9	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 15	CEMENTO TEQUENDAMA	18/09/20	9	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 17	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	05/10/20	27	150	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 18	MARCO SENCILLO	06/10/20	28	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 19	MARCO SENCILLO	07/10/20	29	7	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 20	TAPA	06/10/20	28	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 21	TAPA	07/10/20	29	7	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 22	BOLARDO	06/10/20	28	4	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 23	BOLARDO	07/10/20	29	15	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 24	CEMENTO ARGOS	2/10/2020	25	4	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 25	CEMENTO ARGOS	05/10/20	27	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 26	CEMENTO ARGOS	6/10/2020	28	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 27	CEMENTO ARGOS	07/10/20	29	5	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 28	CEMENTO TEQUENDAMA	6/10/2020	28	8	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR 29	ADOQUIN ARCILLA	06/10/20	28	400	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR18	MARCO SENCILLO	31/09/2020	23	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR19	TAPA	31/09/2020	23	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR20	BOLARDO	31/09/2020	23	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR21	CEMENTO ARGOS	31/09/2020	23	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR22	CEMENTO TEQUENDAMA	31/09/2020	23	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR20	TUBO 3"	29/09/20	22	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR21	CAMPANA TERMINAL 3"	25/09/20	18	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR22	CAMPANA TERMINAL 3"	29/09/20	22	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR23	CURVA 3"	25/09/20	18	2	FABIAN CHACIN

CLL53 X KR24	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	25/09/20	18	100	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR25	MARCO SENCILLO	25/09/20	18	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR26	MARCO SENCILLO	29/09/20	22	5	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR27	MARCO SENCILLO	01/10/20	24	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR28	TAPA	25/09/20	18	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR29	TAPA	29/09/20	22	5	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR30	TAPA	01/10/20	24	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR31	BOLARDO	25/09/20	18	6	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR32	BOLARDO	29/09/20	22	14	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR33	BASE PARA POSTE	25/09/20	18	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR34	BASE PARA POSTE	29/09/20	22	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR35	CEMENTO ARGOS	24/09/20	16	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR36	CEMENTO ARGOS	26/09/20	20	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR37	CEMENTO ARGOS	29/09/20	22	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR38	CEMENTO TEQUENDAMA	24/09/20	16	5	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR39	CEMENTO TEQUENDAMA	26/09/20	20	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR40	CEMENTO TEQUENDAMA	28/09/20	21	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR21	CEMENTO TEQUENDAMA	23/09/20	15	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR22	ADOQUIN ARCILLA	16/09/20	5	500	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR24	TUBO 3"	17/09/20	6	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR25	TUBO 2"	17/09/20	6	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR26	CAMPANA TERMINAL 3"	22/09/20	13	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR27	CURVA 3"	18/09/20	8	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR28	CURVA 3"	22/09/20	13	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR29	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	17/09/20	6	300	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR30	LADRILLO	12/09/20	1	50	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR31	MARCO SENCILLO	18/09/20	8	4	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR32	MARCO SENCILLO	22/09/20	13	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR33	TAPA	18/09/20	8	4	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR34	TAPA	22/09/20	13	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR35	BOLARDO	18/09/20	8	12	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR36	BOLARDO	18/09/20	8	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR37	BOLARDO	22/09/20	13	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR38	CEMENTO ARGOS	19/09/20	11	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR39	CEMENTO ARGOS	21/09/20	12	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR40	CEMENTO ARGOS	22/09/20	13	4	FABIAN CHACIN

CLL53 X KR41	CEMENTO ARGOS	08/10/20	30	3	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR42	CEMENTO ARGOS	08/10/20	32	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR43	CEMENTO TEQUENDAMA	12/09/20	1	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR44	CEMENTO TEQUENDAMA	15/09/20	3	4	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR45	CEMENTO TEQUENDAMA	16/09/20	4	1	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR46	CEMENTO TEQUENDAMA	17/09/20	6	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR47	CEMENTO TEQUENDAMA	21/09/20	12	2	FABIAN CHACIN
CLL53 X KR48	CEMENTO TEQUENDAMA	22/09/20	13	3	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X9	TUBO 3"	16/9/2020	4	6	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X9	TUBO 2"	16/9/2020	4	4	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X10	LADRILLO	16/9/2020	4	200	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X11	MARCO SENCILLO	17/09/20	7	1	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X12	TAPA	17/09/20	7	1	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X13	CEMENTO ARGOS	17/09/20	7	1	FABIAN CHACIN
Emer CLL127 X14	CEMENTO ARGOS	24/09/20	17	2	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	TUBO 3"	26/9/2020	19	1	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	TUBO 3"	21/11/2020	90	23	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	TUBO 3"	24/11/2020	94	3	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	CAMPANA TERMINAL 3"	26/9/2020	19	3	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	CAMPANA TERMINAL 3"	21/11/2020	90	20	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	CAMPANA TERMINAL 3"	24/11/2020	94	3	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	CURVA	24/11/2020	94	1	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	LADRILLO	21/11/2020	90	500	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	LADRILLO	23/11/20	92	150	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	LADRILLO	24/11/2020	94	100	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	MARCO SENCILLO	26/9/2020	19	1	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	MARCO SENCILLO	24/11/2020	94	2	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	TAPA	26/9/2020	19	1	FABIAN CHACIN
Emer KR 116 X CL 16- FONTI-	TAPA	24/11/2020	94	4	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TUBO 3"	19/10/20	54	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TUBO 3"	20/10/2020	55	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TUBO 3"	22/10/2020	59	4	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CAMPANA TERMINAL 3"	19/10/20	54	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CAMPANA TERMINAL 3"	20/10/2020	55	5	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CAMPANA TERMINAL 3"	22/10/2020	59	6	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CAMPANA TERMINAL 3"	23/10/2020	62	5	FABIAN CHACIN

KR 92 X CL 157C -SUBA	CURVA	21/10/2020	58	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CURVA	22/10/2020	59	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CURVA	22/10/2020	61	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	LADRILLO	19/10/2020	54	500	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	LADRILLO	22/10/2020	61	100	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	LADRILLO	23/10/2020	62	30	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	MARCO SENCILLO	20/10/20	57	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	MARCO SENCILLO	22/10/2020	61	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	MARCO SENCILLO	23/10/2020	62	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	MARCO DOBLE	21/10/2020	58	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TAPA	20/10/20	57	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TAPA	21/10/2020	58	2	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TAPA	22/10/2020	61	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	TAPA	23/10/2020	62	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	BASE PARA POSTE	21/10/2020	58	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	BASE PARA POSTE	22/10/2020	59	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	BASE PARA POSTE	22/10/2020	61	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO ARGOS	20/10/20	57	2	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO ARGOS	21/10/2020	58	2	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO ARGOS	22/10/2020	59	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO ARGOS	22/10/2020	61	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO ARGOS	23/10/2020	62	8	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO ARGOS	24/10/2020	65	5	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO TEQUENDAMA	19/10/20	54	3	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	CEMENTO TEQUENDAMA	21/10/2020	58	1	FABIAN CHACIN
KR 92 X CL 157C -SUBA	ADOQUIN ARCILLA	23/10/2020	62	20	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	TUBO 3"	08/10/20	31	6	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	TUBO 3"	09/10/20	33	4	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	TUBO 3"	09/10/20	34	6	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	TUBO 3"	10/10/20	36	18	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	TUBO 3"	13/10/20	37	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	TUBO 3"	15/10/2020	44	5	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CAMPANA TERMINAL 3"	09/10/20	34	10	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CAMPANA TERMINAL 3"	10/10/20	36	10	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CAMPANA TERMINAL 3"	14/10/20	42	10	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CAMPANA TERMINAL 3"	16/10/2020	45	10	FABIAN CHACIN

CLL183 X KR54D	CURVA 3"	09/10/20	33	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CURVA 3"	15/10/2020	44	5	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CURVA 3"	16/10/2020	48	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	LADRILLO	13/10/20	37	800	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	LADRILLO	16/10/2020	48	600	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO SENCILLO	10/10/20	36	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO SENCILLO	13/10/20	39	2	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO SENCILLO	16/10/2020	45	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO DOBLE	13/10/20	37	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO DOBLE	13/10/20	39	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO DOBLE	16/10/2020	45	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	MARCO DOBLE	17/10/2020	49	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	BASE PARA POSTE	09/10/20	33	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	BASE PARA POSTE	15/10/2020	44	5	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO ARGOS	09/10/20	33	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO ARGOS	09/10/20	35	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO ARGOS	10/10/20	36	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO ARGOS	13/10/20	39	2	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO ARGOS	14/10/20	42	2	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO ARGOS	15/10/2020	44	6	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	08/10/20	31	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	09/10/20	35	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	10/10/20	36	4	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	13/10/20	37	4	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	13/10/20	39	1	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	14/10/20	42	3	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	15/10/2020	44	9	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	16/10/2020	45	6	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	CEMENTO TEQUENDAMA	17/10/2020	49	5	FABIAN CHACIN
CLL183 X KR54D	ADOQUIN ARCILLA	19/10/2020	53	80	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	13/10/2020	38	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	14/10/2020	43	4	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	16/10/2020	47	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	20/10/2020	56	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	22/10/2020	60	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	24/10/2020	64	4	FABIAN CHACIN

KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	26/10/2020	66	4	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TUBO 3"	26/10/2020	67	15	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	13/10/2020	38	10	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	20/10/2020	56	10	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	22/10/2020	60	10	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	24/10/2020	64	10	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	26/10/2020	67	10	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	27/10/2020	68	20	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CAMPANA TERMINAL 3"	29/10/2020	71	5	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CURVA 3"	13/10/2020	38	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CURVA 3"	20/10/2020	56	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CURVA 3"	23/10/2020	63	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CURVA 3"	26/10/2020	66	3	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CURVA 3"	27/10/2020	68	3	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS	19/10/2020	52	150	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	20/10/2020	56	100	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-58	29/10/2020	71	50	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-59				FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LADRILLO	13/10/2020	38	180	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LADRILLO	16/10/2020	46	200	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LADRILLO	17/10/2020	50	350	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LADRILLO	19/10/2020	52	500	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LADRILLO	22/10/2020	60	200	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	LADRILLO	26/10/2020	66	500	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO SENCILLO	13/10/2020	38	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO SENCILLO	17/10/2020	50	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO SENCILLO	19/10/2020	52	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO SENCILLO	23/10/2020	63	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO SENCILLO	26/10/2020	66	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO DOBLE	27/10/2020	69	3	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO DOBLE	17/10/2020	50	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO DOBLE	23/10/2020	63	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	MARCO DOBLE	26/10/2020	66	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TAPA	22/10/2020	60	5	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TAPA	26/10/2020	66	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	TAPA	29/10/2020	71	10	FABIAN CHACIN

KR 73 X CL 26S - KENND	TAPA	31/10/2020	74	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	BOLARDO	22/10/2020	60	4	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	BOLARDO	29/10/2020	71	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	BASE PARA POSTE	20/10/2020	56	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	BASE PARA POSTE	23/10/2020	63	1	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	BASE PARA POSTE	26/10/2020	66	3	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	BASE PARA POSTE	27/10/2020	68	3	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	14/10/2020	41	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	20/10/2020	56	15	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	22/10/2020	60	15	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	24/10/2020	64	8	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	26/10/2020	66	4	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	27/10/2020	68	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	28/10/2020	70	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	29/10/2020	71	7	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO ARGOS	30/10/2020	72	3	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	13/10/2020	38	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	14/10/2020	41	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	16/10/2020	46	4	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	18/10/2020	51	8	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	19/10/2020	52	5	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	22/10/2020	60	4	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	23/10/2020	63	5	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	24/10/2020	64	2	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	26/10/2020	66	8	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	27/10/2020	68	7	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	28/10/2020	70	6	FABIAN CHACIN
KR 73 X CL 26S - KENND	CEMENTO TEQUENDAMA	29/10/2020	71	6	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	4/11/2020	76	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	4/11/2020	76	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	12/11/2020	83	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	14/11/2020	84	6	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	17/11/2020	85	6	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	18/11/2020	86	14	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	23/11/2020	91	6	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	25/11/2020	95	7	FABIAN CHACIN

AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TUBO 3"	27/11/2020	96	14	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CAMPANA TERMINAL 3"	30/10/20	73	10	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CAMPANA TERMINAL 3"	6/11/2020	77	10	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CAMPANA TERMINAL 3"	12/11/2020	83	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CAMPANA TERMINAL 3"	14/11/2020	84	5	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CAMPANA TERMINAL 3"	18/11/2020	86	20	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CAMPANA TERMINAL 3"	25/11/2020	95	20	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CURVA 3"	17/11/2020	85	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	3/11/2020	75	50	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-58	6/11/2020	78	100	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-59	12/11/2020	83	130	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-60	21/11/2020	89	80	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-61	28/10/2020	99	65	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LADRILLO	17/11/2020	85	400	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LADRILLO	18/11/2020	86	200	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LADRILLO	19/11/2020	87	300	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LADRILLO	21/11/2020	89	150	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LADRILLO	27/11/2020	96	180	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	LADRILLO	28/10/2020	99	150	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	31/10/2020	74	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	3/11/2020	75	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	4/11/2020	76	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	6/11/2020	78	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	12/11/2020	83	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	17/11/2020	85	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	19/11/2020	87	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	23/11/2020	91	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	25/11/2020	95	6	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO SENCILLO	27/11/2020	96	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO DOBLE	31/10/2020	74	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO DOBLE	3/11/2020	75	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO DOBLE	4/11/2020	76	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO DOBLE	12/11/2020	83	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO DOBLE	17/11/2020	85	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	MARCO DOBLE	25/11/2020	95	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	3/11/2020	75	3	FABIAN CHACIN

AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	6/11/2020	78	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	12/11/2020	83	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	14/11/2020	84	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	17/11/2020	85	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	19/11/2020	87	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	19/11/2020	87	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	23/11/2020	91	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	25/11/2020	95	6	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	TAPA	27/11/2020	96	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BOLARDO	6/11/2020	78	10	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BOLARDO	12/11/2020	83	5	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BOLARDO	17/11/2020	85	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BOLARDO	23/11/2020	91	9	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BOLARDO	25/11/2020	95	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BASE PARA POSTE	6/11/2020	78	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BASE PARA POSTE	17/11/2020	85	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BASE PARA POSTE	23/11/2020	91	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	BASE PARA POSTE	27/11/2020	96	1	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	4/11/2020	76	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	6/11/2020	79	7	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	11/11/2020	82	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	12/11/2020	83	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	14/11/2020	84	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	17/11/2020	85	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	18/11/2020	86	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	19/11/2020	87	4	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	10/11/2020	88	2	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	21/11/2020	89	3	FABIAN CHACIN
AV. Boyacá X CL 60CS MEISS	CEMENTO ARGOS	27/11/2020	96	4	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	CURVA	24/11/20	93	6	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	MARCO SENCILLO	07/11/20	80	1	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	TAPA	07/11/20	80	1	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	BASE PARA POSTE	24/11/20	93	4	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	CEMENTO ARGOS	07/11/20	80	17	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	CEMENTO ARGOS	24/11/20	93	6	FABIAN CHACIN
KR 17 X CL 71BIS SUR CEMEX	CEMENTO TEQUENDAMA	24/11/20	93	10	FABIAN CHACIN

KR 69B x AC 26 S – 1 Mayo	CURVA	28/11/20	98	1	FABIAN CHACIN
KR 69B x AC 26 S – 1 Mayo	BASE PARA POSTE	28/11/20	98	1	FABIAN CHACIN
KR 69B x AC 26 S – 1 Mayo	CEMENTO ARGOS	28/11/20	98	10	FABIAN CHACIN
KR 69B x AC 26 S – 1 Mayo	CEMENTO TEQUENDAMA	28/11/20	98	3	FABIAN CHACIN

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

VERSION 1 - V1

Ingeniería & Proyectos	LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTADOS	FORMATO 17
		FECHA: 30-07-2020

MATERIALES ☐ SERVICIOS ☐ CRITICOS ☐

PROVEEDOR	PERSONA A CONTACTAR	DIRECCION	TELEFONO / FAX	MATERIAL / SERVICIO
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 4"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 3"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 2"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CAMPANA TERMINAL 3"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CAMPANA TERMINAL 4"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CURVA
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	ARENA DE PEÑA M3
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	B 600
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	ARENA DE RIO
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	GRAVA
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	BASE ASFALTICA
MEGACONCRETOS	JUAN PABLO SERNA	Cra. 80a #No. 17 21, Bogotá, Cundinamarca	3223666794	CONCRETO 3000PSI
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE SARDINEL A 10 20X50X80
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE BORDILLO A 80
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE BORDILLO A 85
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO)
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO)
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57
LADRILLERA GRESPAN	GERMAN PANQUEBA	Km 5 vía, Zipaquirá-Ubaté, Cogua, Cundinamarca	3132827442	LADRILLO
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	ACERO
PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	RICARDO DIAZ	CR 72 J BIS No 34- 17 SUR CARVAJAL	632698- 3 10 6 98 49 37	PH DIRIGIDA
PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	RICARDO DIAZ	CR 72 J BIS No 34- 17 SUR CARVAJAL	632698- 3 10 6 98 49 38	PH NEUMATICA
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	TUBO GALVANIZADO DE 2 "
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	UNION DE 2" ELECTRICA

FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CAPACETE
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CINTA BANDIT
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CAPACETE
BRAKE PART N.S.C	NANCY REYES	Calle 9a # 7a -28 Valles de Santa Ana-Soacha	321 397 30 58	BOLARDO
CEMENTO ARGOS	Sodimac Colombia S.A.	Ak 68 # 80 - 77	310 242 7373	CEMENTO ARGOS
CEMENTOS TEQUENDAMA	MONICA HERRERA		3214795700	CEMENTO TEQUENDAMA
GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	GUSTAVO SANCHEZ RUIZ	Calle 53 # 85i -93	3112158743	MANO DE OBRA

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: [X] Proceso [ ] Producto [ ] Suministro [ ] Otro	
Descripción:	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 30 de noviembre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Durante el periodo entre el 16 al 30 de noviembre no se presentaron observaciones en la obra

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	[ ] Aceptado	[ ] Rechazado	[ ] Reprocesado	[ ] Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Lider de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Prado	NOMBRE: Ma. camila Gamba	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: [X] Proceso [ ] Producto [ ] Suministro [ ] Otro	
Descripción:	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 15 Noviembre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza informe # 1 de seguimiento y medición del 01 al 15 de noviembre en el cual se registra una unica observacion que fue atendida en su momento

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	[ ] Aceptado	[ ] Rechazado	[ ] Reprocesado	[ ] Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Lider Calidad.	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Macarena Garnica	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro	
Descripción:	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 03 noviembre 2020

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		
Apariencia		X		
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se descarga en el acopio un viaje de 7m³ de grava el cual se observa que su textura y granulometria no cumple con las condiciones de calidad para labores

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se procedera a devolver el material y reemplazar por uno de buena calidad.

Fecha Programada: 03 Noviembre. Responsable: Helma Janer

Verificación de acción tomada:

Se verifica el nuevo material el cual si cumple con las caracteristicas de calidad solicitada

Fecha toma de acción: 04 noviembre

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Lider calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Ma. Camila Gam	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: [X] Proceso [ ] Producto [ ] Suministro [ ] Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 31 Octubre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza tercer mes de seguimiento y medicion a partir de las observaciones en obra durante el periodo entre el 16 de octubre y el 31 de octubre en el que se observa que hubo una observación importante que fue atendida en su momento.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	[ ] Aceptado	[ ] Rechazado	[ ] Reprocesado	[ ] Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Auxiliar Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Ma. camila cam	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 19 Octubre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Canidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		Acabado de tapas deterioradas
Apariencia		X		
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

se realiza visita de inspeccion a los bodegas de materiales para verificar las tapas para cajas de paso

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se ordena la demolicion de 20 tapas que no cumplen con las caracteristicas de calidad

Fecha Programada: 19-Octubre 2020 Responsable: Melina Jaraz

Verificación de acción tomada:

En la misma fecha de la inspeccion se realiza la demolicion de las tapas que no cumplen.

Fecha toma de acción: 19-Octubre 2020

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Magcamila Gamba	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Lider de calidad	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: [X] Proceso [ ] Producto [ ] Suministro [ ] Otro	
Descripción:	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 15 Octubre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza el segundo informe de seguimiento y medición a partir de las observaciones en obra durante el periodo entre el 01 de octubre al 15 de octubre en la el cual se observa que hubo 3 observaciones que fueron detalladas en su momento con el fin de no llegar a una no conformidad en el producto final

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	[ ] Aceptado	[ ] Rechazado	[ ] Reprocesado	[ ] Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Maricamila Gamboa	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: Señalización | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 13-10-2020

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		los acabados de algunos tapas estaban deteriorados por
Apariencia		X		
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:

Se realizo inspección en Intersección calle 53 x carrera 24 18-17 y 20 en la cual se observo que algunos tapas de los que se instalaron en nuevas tuvieron acabados en deterioro

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se decide remplazar los tapas existentes por otras tapas nuevas que estuvieran exteriormente en buen estado y se procede a demoler 6 (seis) tapas retiradas.

Fecha Programada: 13-10-2020 Responsable: Melisa Jaramillo

Verificación de acción tomada:

Se realiza inspección el 16 de Octubre para asegurar que se haya hecho el cambio de todas las tapas observadas

Fecha toma de acción: 16-10-2020

Observaciones:

Se solicita revisión de las tapas disponibles en el almacén para identificar otros productos no conformes.

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pineda	NOMBRE: Maria Camila Gamba	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: Semaforización | Consecutivo No.:

Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista: Raquel Tapiero

Documento aplicable: | Fecha: 09-10-2020

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros		X		Base granular con textura y color poco favorable.
Apariencia				
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			NA

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:

Se recibe para la calle 33 x carrera 24 un viaje de 7m³ de base granular del cual se observa que su textura y color no son favorables para su compactación, adicional el material pretiene bastante humedad

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se decide hacer devolución del material y reemplazarlo por uno que cumpla con las características de calidad para su compactación

Fecha Programada: 09-10-2020 Responsable. Heliza Jaraz

Verificación de acción tomada:

Se realiza inspección visual del nuevo viaje de material de descargo el proveedor, el cual comple con las caracteristicas de calidad para su compactación

Fecha toma de acción: 09-10-2020

Observaciones:

Se deja la observación al proveedor sobre el color, textura y humedad del material para que no vuelva a ocurrir esta situación

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Analista Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pinedo	NOMBRE: Macarnila Gamba	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☒ Producto ☐ Suministro ☐ Otro	
Descripción:	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 05 octubre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad	X			
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros	X			
Apariencia		X		se observa mero en mal estado
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material	X			

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza verificación de orden terminado en la calle 53 x cra 24 el día 05 de octubre, en el cual se observa que por las lluvias en la tarde del 05 de octubre y por acción de la escorrentía en concreto se lavó y dañó el acabado

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☒ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Se ordena demoler la esquina noroccidental de la intersección calle 53 x cra 24

Fecha Programada: 09 Octubre 2020 Responsable: Melina Jaimes

Verificación de acción tomada:

Se realiza visita de seguimiento el 13 de octubre para verificar las terminadas de la esquina

Fecha toma de acción: 09 Octubre de 2020

Observaciones:

Se solicita cubrir el concreto para con plastico para evitar su deterioro ante posibles lluvias

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Elizabeth Pineda	CARGO: Lider de calidad	CARGO:
NOMBRE: Analista calidad	NOMBRE: Maria Camila Gamba	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: | Consecutivo No.: 1

Seguimiento realizado a: [X] Proceso [ ] Producto [ ] Suministro [ ] Otro

Descripción:

Tipo de seguimiento y/o medición: | Proveedor / Subcontratista:

Documento aplicable: | Fecha: 30 Septiembre

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Se realiza el primer informe de seguimiento y medicion a partir de las observaciones duen obra durante el periodo entre el 11 de septiembre al 30 de noviembre.
Al realizar las verificaciones se observa que a la fecha no se han presentado observaciones en obra

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	[ ] Aceptado	[ ] Rechazado	[ ] Reprocesado	[ ] Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: Arquitecta Calidad	CARGO: Líder de calidad	CARGO:
NOMBRE: Elizabeth Pineda	NOMBRE: Maria Camila Cama	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Ingeniería & Proyectos	LISTADO DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	FORMATO 22 FECHA. 20-08-2020 PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

							CALIBRACIÓN / VERIFICACION	
CODIGO	REFERENCIA	MARCA	DESCRIPCION	CAPACIDAD	PRECISION	INCERTIDUMBRE	ESTADO	FRECUENCIA
	ESTACIÓN TOTAL	LEICA	Estacion total Topcon GTS 252 SN KB1406 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado Trazable al NIST		5 "			

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com ®

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V2

Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

CERTIFICADO No 6ML1 435

PROPIETARIO DIEGO MAURICIO MORA
INSTRUMENTO ESTACIÓN TOTAL **MARCA:** LEICA
MODELO TC705 **NUMERO DE SERIE** SN 653637
IDENTIFICACION CLIENTE 1023 883 901
FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION 12 /SEP/2020
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017 **VENCE** 11 /MAR/2021
Instrumento Nuevo? SI NO X
@

PATRONES UTILIZADOS
Estacion total Topcon GTS 252 SN KB1406 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado Trazable al NIST

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Precision Angular (DIN 18723)		5 "		**Minima distancia Focal**	0.5	m
Precision en Distancia		2 mm+ 2ppm xD		**Medicion con un Prisma**	2500	m
Aumento del Telescopio			30X	**Compensador**		X Y
Apertura de Objetivo			30mm	**Exactitud del Compensador**		0.3"
Lectura en Pantalla			1"	**Medicion sin Prisma**	N/A	m
AJUSTES EFECTUADOS						
CODIGOs:	1: correcto	2: falla corregida		3: no corregida	4: no aplica	
Limpieza exterior		1		Ajuste del nivel Circular		2
Mantenimiento Interno		1		Ajuste del sistema de enfoque		1
Tornillo de movimiento Fino H		1		Ajuste del reticulo		1
Chequeo del Teclado		1		Ajuste de mirillas de punteria		2
Ajuste Compensador X Y		1				

VERIFICADO Y AJUSTADO POR INCOLTOP SAS

Reviso	Aprobo	Especialista Tecnologica
Alexander Piza	**Maria Claudia Fernandez**	Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniero Topografico	**Ingeniera Industrial**	**NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR		Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Cll 53	Operador	Jose Angel Chavez
Marca:	NA	Ayudante:	Brayla
Modelo:	NA	Fecha:	23/Dic/20
Serial:	NA	Inspector:	Yuliana C. Jeinq.

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	lo Cumpl	No Aplica	
1	Martillo -maceta				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
3	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	Otros				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Jose Angel
Responsable uso

INSPECCIÓN COMPRERSOR

Código: IN 15-1
Versión: 01
Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	24 #53 calle 21 #53	Operador	Adrian Ueche
Marca:	Ingersoll-Rand	Ayudante:	Marcos Mora
Identificación:	Air Source AUS 185 4C9973 U01B02	Fecha:	16/09/20
Inspector:			

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Puerta de acceso del panel de instrumentos	✓			
2	Elemento del separador y punto de llenado	✓			
3	Punto de llenado de aceite del motor	✓			
4	Punto de llenado de la botella de refrigerante	✓			
5	Punto de llenado de combustible	✓			
6	Filtro de aceite del motor	✓			
7	Salida de aire del paquete	✓			
8	Barra de tiro	✓			
9	Indicadores de aceite de motor refrigerante	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ NO

Cardina Jerrott
Responsable inspeccion

Responsable uso

INSPECCIÓN DE PLANTA ELECTRICA

Código: F INS 15-3
Versión: 01
Fecha: 27/06/2020

Ubicación:		Operador	
Marca:		Ayudante:	
Modelo:		Fecha:	
Serial:		Inspector:	

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Tanque de combustible				
2	Silenciador de escape				
3	Conexión a tierra				
4	Enchufe/conexión AC				
5	Filtro de aire				
6	Manija de arranque				
7	Llave de combustible				
8	Ahogador				
9	Estructura de soporte				
10	Bujía				
11	Tapa del combustible				
12	Interruptor automático de protección AC				
13	Contenedor de aceite				
14	Interruptor de encendido				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la planta

☐ Si No ☐

Responsable inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN COMPRERSOR	Código: IN 15-1 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Cra 53 # 24	Operador	Adrian Useche
Marca:	Ingersoll rand	Ayudante:	Mario Mata
Identificación:	Air Source 185	Fecha:	14/09/20
Inspector:	Carolina Serna		

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Puerta de acceso del panel de instrumentos	✓			
2	Elemento del separador y punto de llenado	✓			
3	Punto de llenado de aceite del motor	✓			
4	Punto de llenado de la botella de refrigerante	✓			
5	Punto de llenado de combustible	✓			
6	Filtro de aceite del motor	✓			
7	Salida de aire del paquete	✓			
8	Barra de tiro	✓			
9	Indicadores de aceite de motor refrigerante	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ · NO

Carolina Serna H.
Responsable Inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-3 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	calle 53	Operador	Jose Chavez
Marca:	Power edge	Ayudante:	Omar Lopez
Modelo:	PC1200i-B3	Fecha:	22/09/20
Serial:		Inspector:	Carolina Serna

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Tanque de combustible	✓			
2	Silenciador de escape	✓			
3	Conexión a tierra	✓			
4	Enchufe/conexión AC	✓	✓		Se notifica al contratista para la reparación de la planta.
5	Filtro de aire	✓			
6	Manija de arranque	✓	✓		
7	Llave de combustible	✓			
8	Ahogador	✓			
9	Estructura de soporte	✓			
10	Bujía	✓			
11	Tapa del combustible	✓			
12	Interruptor automático de protección AC	✓			
13	Contenedor de aceite	✓			
14	Interruptor de encendido	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la planta

SI ☑ No ☐

Responsable inspeccion

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	CII 53	Operador	Richar
Marca:	NA	Ayudante:	
Modelo:	NA	Fecha:	21/09/20
Serial:	NA	Inspector:	Carolina Jerna H

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	Martillo -maceta				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
3	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	Cincel	✓			
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	Otros				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

INSPECCIÓN COMPRERSOR

Código: IN 15-1	
Versión: 01	
Fecha: 27/06/2020	

Ubicación:	Calle 53 con 24	Operador	Adrian Useche
Marca:	Air boss club 185	Ayudante:	Mario Mata
Identificación:	Ingersoll Rand 26	Fecha:	15/09/20
Inspector:	Carolina Jerndt		

Item	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Puerta de acceso del panel de instrumentos	✓			
2	Elemento del separador y punto de llenado	✓			
3	Punto de llenado de aceite del motor	✓			
4	Punto de llenado de la botella de refrigerante	✓			
5	Punto de llenado de combustible	✓			
6	Filtro de aceite del motor	✓			
7	Salida de aire del paquete	✓			
8	Barra de tiro	✓			
9	Indicadores de aceite de motor refrigerante	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ NO

Carolina Jerndt
Responsable inspección

Responsable uso

INSPECCIÓN DE PLANTA ELECTRICA

Código. F INS 15-3	
Versión: 01	
Fecha: 27/06/2020	

Ubicación:	calle 53 cc24	Operador	estuenson olivero
Marca:	Porter cable	Ayudante:	
Modelo:		Fecha:	17/09/20
Serial:	PC12-200B3	Inspector:	Carolina Jerndt

Item	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Tanque de combustible	✓			
2	Silenciador de escape	✓			
3	Conexión a tierra	✓			
4	Enchufe/conexión AC	✓			
5	Filtro de aire	✓			
6	Manija de arranque	✓			
7	Llave de combustible	✓			
8	Ahogador	✓			
9	Estructura de soporte	✓			
10	Bujía	✓			
11	Tapa del combustible	✓			
12	Interruptor automático de protección AC	✓			
13	Contenedor de aceite	✓			
14	Interruptor de encendido	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la planta

☑ Si No ☐

Carolina Jerndt
Responsable inspección

Responsable uso

	DOCUMENTO:	CODIGO:
		VERSIÓN:

RESPONSABLE: Carolina Jerath FECHA: 27 Sep AREA: C1153 x K24

PROCESO: Semaforización

Espacios organizados y libres de obstaculos		✓	
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen danos a la comunidad y ambientales)		✓	
Intersección libre de escombros		✓	Se recoge escombro en la tarde
Herramientas almacenadas correctamente		✓	
Limpio y en Buen Estado Locativo		✓	
Material bien apilado o almacenado		✓	
Residuos correctamente separados y zona identificada		✓	
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓	
Paredes limpias	✓		
Pisos limpios, en buen estado, y secos		✓	
Recipientes de recolección de residuos en buen estado	✓		
Agua potable			
Insumos de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorito, toallas de unico uso)		✓	
Sanitarios limpios		✓	
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		✓	
Otros			

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

Nombre Responsable	Cargo	Firma
	Coordinador de Area	

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Kra 73 cl 25 Sur.	Operador	Richard Martinez
Marca:	NA	Ayudante:	Uriel Valencia.
Modelo:	NA	Fecha:	16/10/20
Serial:	NA	Inspector:	Carolina Garnath

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	Martillo -maceta				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado				
3	Carretilla	✓			
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	Otros				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	CII 183	Operador	Dan Diaz
Marca:	NA	Ayudante:	Robert Ruiz
Modelo:	NA	Fecha:	10/10/20
Serial:	NA	Inspector:	Carolina Jaramillo

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	**Palas**				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
3	**Carretilla**	✓			
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	**Palustre**				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	**Cincel**	✓			
	Punta libre de reababas				
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	**Flexómetro**	✓			
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	**Otros**				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

INSPECCIÓN COMPRERSOR

Código: IN 15-1
Versión: 01
Fecha: 27/06/2020

Ubicación:		Operador	Ruyter León
Marca:		Ayudante:	Adrian Ulare.
Identificación:		Fecha:	13/10/2020
Inspector:			

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Puerta de acceso del panel de instrumentos	✓			
2	Elemento del separador y punto de llenado	✓			
3	Punto de llenado de aceite del motor	✓			
4	Punto de llenado de la botella de refrigerante	✓			
5	Punto de llenado de combustible	✓			
6	Filtro de aceite del motor	✓			
7	Salida de aire del paquete	✓			
8	Barra de tiro	✓			
9	Indicadores de aceite de motor refrigerante	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI NO

Responsable inspeccion

Douglas.
Responsable uso

INSPECCIÓN DE PLANTA ELECTRICA

Código: F INS 15-3
Versión: 01
Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	CH 183	Operador	Juan Diaz
Marca:		Ayudante:	Robert Pérez
Modelo:		Fecha:	13/10/2020
Serial:		Inspector:	Cristina Faria.

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Tanque de combustible		✓		Se llena el tanque de combustible
2	Silenciador de escape	✓			
3	Conexión a tierra	✓			
4	Enchufe/conexión AC	✓			
5	Filtro de aire	✓			
6	Manija de arranque	✓			
7	Llave de combustible	✓			
8	Ahogador	✓			
9	Estructura de soporte	✓			
10	Bujía	✓			
11	Tapa del combustible	✓			
12	Interruptor automático de protección AC	✓			
13	Contenedor de aceite		✓		Cambio de aceite.
14	Interruptor de encendido	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la planta

☐ SI No ☐

Responsable Inspeccion

Responsable uso

13/10/20 CH 183 10:25

EKO741 Rojo 1990 CHEVROLET

Fredy Tapiero 1024535935 1024535935 3208817314

2 C2

EXTERIOR CARROCERIA	
Limpiaparabrisas y Vidrios	✓
Cerraduras, Bisagras, Vidrios y Espejos	✓
Direccionales, Stops y Luces	✓
Placas y Calcas	✓
Llanta	✓
ELECTRICO	
Bocina y Encendido	✓
Luces Internas	✓
Cableado	✓
Fusibles	✓
Luces de Freno y Reversa	✓
Luces de Parqueo y Direccionales	✓
Luces Altas y Bajas	✓
Pito	✓
Luces de Placa, Cabina, Motor y Baul	✓
PARTE MECANICA	
Estado y Nivel de Aceite y Liquidos	✓
Estado de Poleas y Correas	✓
Estado y Nivel de Refrigerante	✓
Tanque de Gasolina y Tapon	✓
Estado de Amortiguadores y Bujes	✓
Limpiabarros y Guias	✓
Estado de Carroceria y Suspension	✓
PARTE INTERNA	
Cinturones de Seguridad	✓
Pedales Superior y Caucho	✓
Estado Tapiceria Cielo y Asso	✓
Luz de Techo	✓
Indicadores	✓
Estado de Tablero	✓
Pedales y Caucho	✓
CARROCERIA	
Estructura y Pintura Completa y Total	✓
Estado de Pintura Parcial	✓
Completo Tornillos y Molduras, Cromo, Vidrios y Empaques	✓

DOCUMENTO:		CODIGO:
		VERSIÓN

RESPONSABLE: Carolina Jerna FECHA: 13/10/20 HORA: 11:183

PROYECTO: Semaforización

Espacios organizados y libres de obstáculos			✓	
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		✓		
Intersección libre de escombros		✓		Se realiza recolección a las 10:25 am
Herramientas almacenadas correctamente		✓		
Limpio y en Buen Estado Locativo			✓	
Material bien apilado o almacenado		✓		
Residuos correctamente separados y zona identificada		✓		
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓		
Paredes limpias	✓			
Pisos limpios, en buen estado, y secos			✓	
Recipientes de recolección de residuos en buen estado	✓			
Agua potable		✓		
Insumos de bioseguridad(Alcohol, jabon de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorito, bolsas de unico uso)		✓		
Sanitarios limpios		✓		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		✓		
Otros				Para los Items que no cumple se destina una persona para toda realizar la limpieza de la obra, Se corrigen observaciones de manera inmediata.

N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

Ingeniería & Proyectos	**INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR**	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Kra 23 calle 26 sur	Operador	Estiven Jon Olivero
Marca:	NA	Ayudante:	Heiner Navarro
Modelo:	NA	Fecha:	19/10/20
Serial:	NA	Inspector:	Carolina Jerez H

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	**Palas**				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
3	**Carretilla**				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	**Palustre**				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	**Cincel**				
	Punta libre de reabadas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	**Flexómetro**				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	**Otros**				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN COMPRERSOR	Código: IN 15-1
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Av Ingeniero Ibarra	Operador	Adrian Ulloa
Marca:	Mitsuire 188	Ayudante:	Douglas León
Identificación:		Fecha:	12/11/2020
Inspector:	Carolina Jara		

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Puerta de acceso del panel de instrumentos	✓			
2	Elemento del separador y punto de llenado	✓			
3	Punto de llenado de aceite del motor	✓			
4	Punto de llenado de la botella de refrigerante	✓			
5	Punto de llenado de combustible	✓			
6	Filtro de aceite del motor	✓			
7	Salida de aire del paquete	✓			
8	Barra de tiro	✓			
9	Indicadores de aceite de motor refrigerante	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ NO

Responsable inspección

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-3
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Av Bypass Km 60 C S U	Operador	Jhon Valencia
Marca:	Pato Cabiel	Ayudante:	Richard Martinez
Modelo:	PG 2000 - 8S	Fecha:	12/11/2020
Serial:		Inspector:	Carolina Jara

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Bueno	Malo	No Aplica	
1	Tanque de combustible	✓			
2	Silenciador de escape	✓			
3	Conexión a tierra	✓			
4	Enchufe/conexión AC	✓			
5	Filtro de aire	✓			
6	Manija de arranque	✓			
7	Llave de combustible	✓			
8	Ahogador	✓			
9	Estructura de soporte	✓			
10	Bujía	✓			
11	Tapa del combustible	✓			
12	Interruptor automático de protección AC	✓			
13	Contenedor de aceite	✓			
14	Interruptor de encendido	✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la planta

☑ SI No ☐

Responsable inspección

Richard

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	DOCUMENTO:	CODIGO: HS-IN-05
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	VERSIÓN: 1

RESPONSABLE: Carolina Serna FECHA: 12/NOV/2020 AREA: Metrén

PROYECTO: Señalización

LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS / GUIA DE LA INSPECCION	NA	SC	NC	OBSERVACIONES
Espacios organizados y libres de obstáculos		✓		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		✓		
Intersección libre de escombros		✓		
Herramientas almacenadas correctamente		✓		
Limpia y en Buen Estado Locativo		✓		
Material bien apilado o almacenado		✓		
Residuos correctamente separados y zona identificada		✓		
Uso racional del espacio de almacenamiento		✓		
Paredes limpias	✓			
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓			
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			
Agua potable		✓		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		✓		
Sanitarios limpios		✓		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		✓		
Otros				

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

Firma Responsable	Firma Jefe o Director de Area
FIRMA	FIRMA

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Mellsen	Operador	Daniela Leal
Marca:	NA	Ayudante:	Jesus Urango
Modelo:	NA	Fecha:	
Serial:	NA	Inspector:	Carolina Serna H

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
1	Martillo -maceta				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
2	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
3	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
4	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
5	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
6	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
7	Otros				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspección

Responsable uso

INDICADORES DE GESTION OBJETIVOS DE CALIDAD			
FECHA	30/11/2020	INFORME MENSUAL N°	8
OBJETIVO N°1	Cumplir con los plazos estipulados	META	DIAS DE RETRASO
		2 dias	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON RETRASO			
Presentacion del informe mensual de actividades presentado el dia 11 de Octubre de 2020			
OBJETIVO N°2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		2 quejas	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			
OBJETIVO N°3	Cumplir con especificaciones tecnicas y manuales de diseño del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		cumplir con especificaciones tecnicas, manuales de diseño y normas del contrato	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			

Ingeniería & Proyectos




AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO 09 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30/09/2020	NOMBRE DE PROYECTO	SEMAFORIZACION	
MATERIAL	**PROVEEDOR**	**CANTIDAD**	**SOLICITANTE**	**APROBADOR/ RESPONSABLE**
TUBO 4"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
TUBO 3"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
TUBO 2"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAMPANA TERMINAL 3"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAMPANA TERMINAL 4"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CURVA	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ARENA DE PEÑA M3	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
B 600	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ARENA DE RIO	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
GRAVA	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BASE ASFALTICA	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CONCRETO 3000PSI	MEGACONCRETOS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE SARDINEL A 10 20X50X80	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE BORDILLO A 80	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE BORDILLO A 85	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO)	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO)	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
LADRILLO	LADRILLERA GRESPAN	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
MARCO SENCILLO	ACERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
PH DIRIGIDA	PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
PH NEUMATICA	PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	

TUBO GALVANIZADO DE 2 "	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
UNION DE 2" ELECTRICA	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAPACETE	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CINTA BANDIT	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAPACETE	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BOLARDO	BRAKE PART N.S.C	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CEMENTO ARGOS	EASYCEM	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CEMENTO TEQUENDAMA	CEMENTOS TEQUENDAMA	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
