CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL No. 12

MARZO 01 DE 2021 – MARZO 31 DE 2021

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GÓMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
FECHA 01 -04 -2021	FECHA: 01-04-2021	FECHA: 01-04-2021
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

001

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1 ANTECEDENTES 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 6
5. ASPECTO JURÍDICO 7
6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 9
6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 11
7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11
7.1. INTRODUCCIÓN 11
7.2 OBJETIVOS 11
7.2.1 OBJETIVO GENERAL 11
7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 11
7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11
7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO 12
7.4 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS 12
7.5 VIGIA SST 14
7.6 CAPACITACION 14
7.7 DESCRIPCION SOCIEDEMOGRAFICA 14
7.8 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 23
7.9 AGUA POTABLE Y RESIDUOS 23
7.10 CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL 24
7.11 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 24
7.12 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 24
7.13 PROGRAMA DE MANTENIENTO 24
7.14 ENTREGA DE EPP 24
7.15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 25
7.16 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 25

002

8. INFORME DE OBRA 25

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 25

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE EL MES 28

9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 62

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 62

9.1 ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PROXIMO MES 65

10. INFORME DE DISEÑO 66

11. INFORME DE CALIDAD 67

11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 67

11.3 CONTROL DE ENSAYOS 72

12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 73

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Realizar el diseño de intersecciones de acuerdo con las priorizaciones establecidas en la Entidad e indicadas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas".
- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Atender las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo de la red semafórica existente.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" - Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

Con el objeto de contratar el diseño y construcción, de las obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento el sistema de semaforización de Bogotá D.C., incluyendo diseño semafórico de intersecciones para la implementación de nuevos controles semaforizados. Le adjudico a la empresa **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S** el contrato mediante la **Resolución N° 259 del 26 de DICIEMBRE de 2019**, cuyo objeto es: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."**

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de la red semafórica existente y donde se requiera nueva semaforización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal de la ciudad.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	01 de abril de 2021	PERIODO No.	12	DEL	01/03/2021	HASTA	31/03/2021

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA			
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71ª # 52ª -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com			
CONTRATO No.	N° 2019-1874		
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020		
REINICIO N°1	13 de abril de 2020		
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020		
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020		
PLAZO FINALIZACION INICIAL:	11 de octubre de 2020		
PRORROGA N°1:	4 meses		
PLAZO DE FINALIZACION:	11 de febrero de 2021		
PRORROGA N°2:	2 meses y 19 diecinueve días		
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACION:	30 de abril de 2021		
PERIODO TOTAL DEL CONTRATO:	6 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021		
PLAZO TRANSCURRIDO:	353 días	EQUIVALE AL	92.19% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
VALOR PAGADO:	-		
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido		
INTERVENTOR:	PIV ingeniería S.A.S		

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	386
DIAS TRANSCURRIDOS:	353
% DE EJECUCION	82%
DIAS DE RETRASO:	25
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	10%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	30/03//2020
ACTA DE REINICIO N°1	13/04/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	13/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020

ACTA DE INICIO DE OBRA	9/09/2020
PRORROGA N°1	7/10/2020
PRORROGA N°2	11/02/2021
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	30/03//2020
ACTA DE REINICIO N°1	13/04/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	13/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
PRORROGA N°1	7/10/2020
PRORROGA N°2	11/02/2021

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PRORROGA N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/08/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/08/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/02/2022	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS,	06/03/2020	11/02/2024	$316.045.998.80	APROBADO

	PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PRORROGA N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	30/04/2022	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	30/04/2024	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO


EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020
Se suscribe el acta de inicio de obras	08/09/2020

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		$ 139.207.349	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 1		$ 15.185.050	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1 OBRA Y CONSULTORIA			$ 154.392.399
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		$ 394.281.898	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 2		$ 3.037.011	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2 OBRA Y CONSULTORIA			$ 397.318.909
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3		$300.566.299	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 3		$6.074.022	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3 OBRA Y CONSULTORIA			$306.640.321
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4		$21.259.076	

VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 4		$360.716.844	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 4 OBRA Y CONSULTORIA			$ 381.975.920
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5		$383.094.818	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 5 OBRA			-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6		$ 591.404.991	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 6		$15.602.758	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 6 OBRA Y CONSULTORIA			-
VALOR ACUMULADO COBRADO A LA FECHA			$ 2.230.430.116
VALOR ACUMULADO PAGADO A LA FECHA			$ 1.240.327.549
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$990.102.267
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3.160.459.988

A la fecha se ha realizado la radicación de dos actas parciales de obra y un acta de consultoría correspondientes al corte N°4, N°5 Y N°6 por valor de $990.102.267, a la fecha han sido cobrados $2.230.430.116 de los cuales ya se encuentran pagas a la empresa un valor total correspondiente a $1.240.327.549.

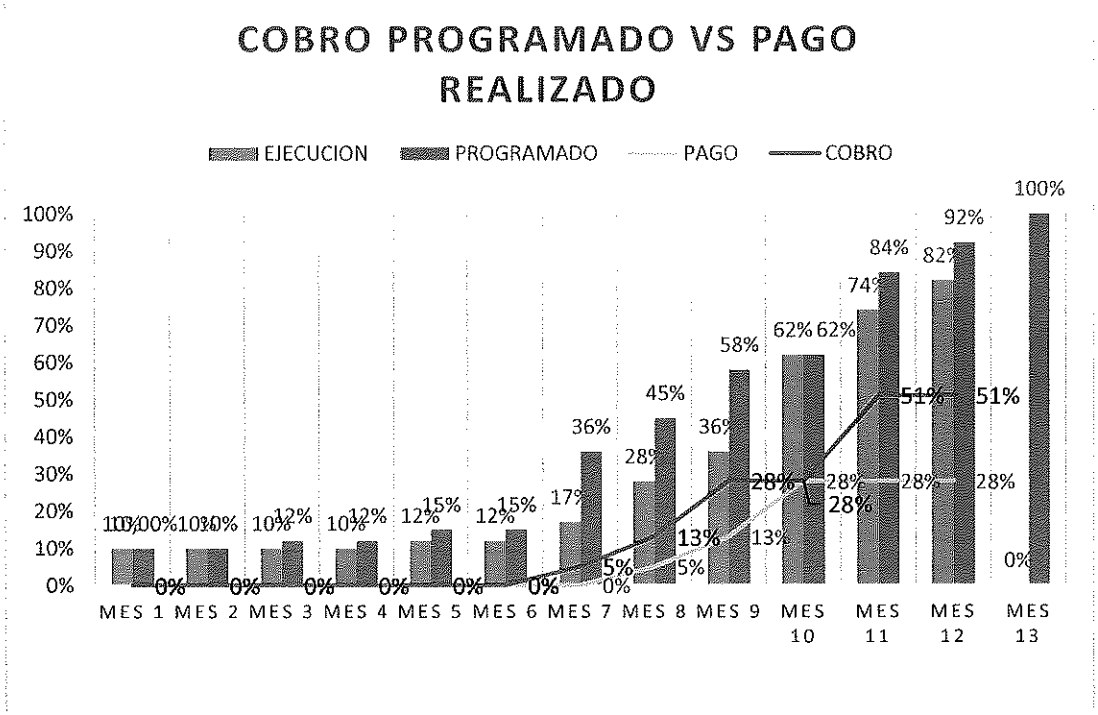

En el mes 12, el avance programado teniendo en cuenta la prorroga es de un 92.19% vs un avance ejecutado real del 82%.

6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	100%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 2.970.832.389
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	82%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 2.591.577.190

7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describen las actividades referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra N° 2019-1874 cuyo objeto es el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C

Este informe comprende las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 de Marzo y el 31 de Marzo de 2021.

7.2 OBJETIVOS

7.2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades implementadas en los frentes de obra para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, las medias de manejo ambiental y PG – RCD acorde con los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio Ambiente en el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra pública 2019-1874.

7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Velar por el cumplimiento el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo durante los trabajos ejecutados.

Implementar planes de mejora con el fin de identificar y mitigar los riesgos presentes en la ejecución del proyecto.

Describir las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los compromisos contractuales y la normatividad ambiental aplicable.

Verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato de obra 2019-1874.

7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseño y construcción de obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento de las obras civiles para el sistema de semaforización de Bogotá DC y contiene de manera general para su ejecución la Formulación y tramites de planes de manejo de tráfico,

Localización, verificación y replanteo, Estudio y trazado de redes existentes, Implementación planes de manejo de tráfico, Demoliciones, Excavaciones, Perforaciones y Construcción.

7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo se ejecutaron actividades constructivas o de mantenimiento en las siguientes intersecciones:

- Avenida carrera 86 X calle 64B bis
- Avenida carrera 86 X diagonal 63F
- Carrera 50B X calle 182
- Carrera 9 X calle 23
- TV 42 x calle 12

7.4 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

Todo el personal vinculado al contrato de obra 2019-1874 se encuentra afiliado al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS. **ANEXO 7 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

PERSONAL ADMINISTRATIVO					
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**EPS**	**AFP**	**ARL**
1	Edwin García	Director de Obra	Compensar	Porvenir	Positiva
2	Meliza Janes	Residente de Obra	Compensar	Colpensiones	Bolívar
3	Camila Gamba	Aux. de Ingeniería	Compensar	Porvenir	Bolívar
4	Stella Pineda	Tec. Ing. SISO	Sanitas	Protección	Bolívar
5	Carolina Serna	Profesional SST	Sura	Porvenir	Bolivar

PERSONAL OPERATIVO					
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**EPS**	**AFP**	**ARL**
6	Oscar Valles	Inspector de obra	Sanitas	Colpensiones	Bolívar
7	Adrián Useche	Maestro de obra	Medimás	Colfondos	Sura
8	Estevenson Oliveros	Oficial de obra	Famisanar	Colfondos	Sura
9	Jesús Urango	Ayudante de construcción	Nueva Eps	Porvenir	Sura

SUBCONTRATISTA GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS					
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**EPS**	**AFP**	**ARL**
10	Douglas León	Ayudante	Nueva Eps	Protección	Sura
11	José Ángel Chávez Cañas	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
12	Juan Rafael Diaz Mercado	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura

13	Fabian Chacin	Almacenista	Salud total	Porvenir	Bolivar
14	José Julio Zarza	Ayudante	Protección	Comparta	Sura
15	Ubaldo Zambrano	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
16	Wilfram Chavez	Oficial	Salud Total	Protección	Sura
17	Ricardo Robles	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
18	Antonio Cepeda	Maestro	Sura	Colfondos	Sura
19	Carlos Perez	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
20	Miguel Rico	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura

Personal temporalmente suspendido

N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Heiner Navarro	Ayudante	Sanitas	Colfondos	Sura
2	Yhon Valencia	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
3	Víctor Gamba	Ayudante	Sanitas	Protección	Sura
4	Rafael Soto	Ayudante	Compensar	Protección	Sura
5	James Bedoya	Ayudante	Salud Total	Colfondos	Sura
6	Nicolás Díaz	Ayudante	Salud Total	Colfondos	Sura
7	Harold Pulido	Ayudante	Coosalud	Porvenir	Sura
8	Jaider Pérez	Ayudante	Nueva Eps	Protección	Sura
9	Alexander Bedoya	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
10	Richard Martínez	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura

Personal Perforaciones Horizontales

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Nelson Suarez Rodríguez	Oficial de obra	Compensar	Colpensiones	Seguros Bolívar
Rafael Antonio Suarez Romero	Operario	Salud Total	Porvenir	Seguros Bolívar
Miguel Ángel Cubillos	Operario	Salud Total	Porvenir	Seguros Bolívar
Damaso Castaño Hernández	Operario	Sura	Protección	Seguros Bolívar
Jhon Sebastián Castaño	Operario	Sura	Protección	Seguros Bolívar
William Salamanca	Operario	Sura	Porvenir	Seguros Bolívar
José Dimas Diaz	Conductor	Compensar	--	Seguros Bolívar
Euclides Rivera	Operario	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Bolívar
JUSTO PASTOR MONTAÑA	Operario	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Bolívar

Retiros

007

Nairobis Jimenez	Ayudante	Sura	Colfondos	Sura
Hugo Oviedo	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
Carlos Julio Moreno Lara	Ayudante	ARL Bolivar	Colpensiones	Coosalud

7.5 VIGIA SST

Se adjunta acta vigía – Marzo de 2021 **ANEXO 8. VIGIA SST**

7.6 CAPACITACION

De acuerdo con el cronograma de capacitación se realizaron las siguientes actividades de capacitación en obra, con las cuales se da cumplimiento del 100% a las actividades programadas.

- Agua Potable
- Identificación de peligros
- Implementación de PMT en obra
- Inducción personal nuevo

ANEXO 9. CAPACITACION

ANEXO 10. INDICADORES

7.7 DESCRIPCION SOCIEDEMOGRAFICA

Se realiza encuesta telefónica para el perfil sociodemográfico a los trabajadores en obra y demás relacionados en el contrato. La información será actualizada mensualmente de acuerdo con los nuevos ingresos y retiros.

NOMBRE COMPLETO49	Meliza Janez	Richard Martinez
respuestas	Jesus urango	Jhon Valencia
Diana Carolina Serna	Oscar Valles	Hugo Oviedo
Douglas Leon	Edwin Gonzalo Garcia	Luis Madariaga
Estivenson Oliveros	Stela Pineda	Alberto NIvar
Edicxon Alvarez	Rafael suarez	Franklin Gutierrez
Jose Angel Chavez	Nelson Suarez	Alfonso Castro
Adrian Useche	Pedro Vargas	Moises Gutierrez
Juan Diaz	Luis Giovany Hurtado	JHAN CARLOS ROJAS
Omar Robelo	Gustavo Sanchez	REMBERTO ROJAS .
Heiner Navarro	Fabian Chacin	ANTONIO CEPEDA
	Jhon Jader Martinez	YAMITH ZAMBRANO

RICARDO ROBLES

HAROLD DAVID PULIDO

SAMIR PAEZ RAMOS

DAIRO LUIS HERNANDEZ

JOAQUIN OYAGA

ALEXANDER RAMIREZ

ARLIN NAVAS NAVA

WILFRAN CHAVEZ CAÑA

JAMES BEDOYA

KEVIN PEREZ RAYO

EDER WILLIAM HURTADO

VICTOR ZAMBRANO

URIEL CAMARGO


RAFAEL SOTO

NICOLAS DIAZ

Carlos Julio Moreno Lara


CARGO

49 respuestas

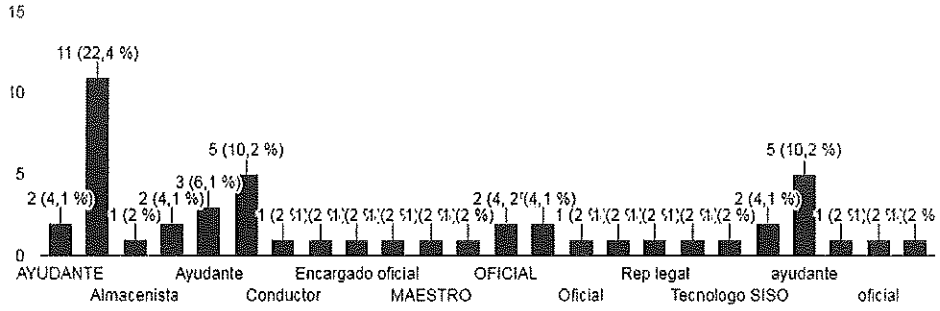

1. EDAD


49 respuestas



008


2. ESTADO CIVIL

49 respuestas




3. DATOS DE RESIDENCIA, DIRECCIÓN BARRIO Y LOCALIDAD

48 respuestas




4. ESTRATO SOCIOECONOMICO

49 respuestas



5. GRUPO ÉTNICO

49 respuestas




6. TURNO DE TRABAJO

49 respuestas



7. GENERO


49 respuestas



009


8. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

49 respuestas




9. NIVEL DE ESCOLARIDAD

49 respuestas




10. TENENCIA DE VIVIENDA

49 respuestas



11. USO DEL TIEMPO LIBRE

49 respuestas




12. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.V)

49 respuestas




13. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA

49 respuestas




14. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL

49 respuestas




15. TIPO DE CONTRATACIÓN

49 respuestas




16. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

49 respuestas




17. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD

49 respuestas




18. FUMA

49 respuestas



PROMEDIO DIARIO


4 respuestas



011


19. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

48 respuestas




CON QUE FRECUENCIA CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS


49 respuestas




20.PRACTICA ALGÚN DEPORTE

49 respuestas







7.8 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Se adjunta examen médico ocupacional del personal con su respectiva notificación de riesgos al trabajador.

ANEXO 7 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Carlos Perez	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
Miguel Rico	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura

7.9 AGUA POTABLE Y RESIDUOS

Se ha realizado suministro de agua potable y recolección de residuos en las intersecciones intervenidas.

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 12. DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

012

7.10 CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo y el 31 de Marzo de 2021 no se presentaron accidentes de trabajo.

Accidentalidad- **Anexo 10 INDICADORES**

HHT:

EMPRESA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			
PERIODO REPORTADO	Marzo DE 2021			
RESPONSABLE	STELLA PINEDA			
NUMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	5	RESUMEN		OBSERVACIONES
NUMERO DE EMPLEADOS OPERATIVOS	20	TOTAL	25	
DIAS TRABAJADOS ADMINISTRATIVOS	27	HHT	1080	
DIAS TRABAJADOS OPERATIVOS	27	HHT	4320	
TOTAL HORAS - HOMBRE - TRABAJADAS	5400	ACUMULADO	12912	

7.11 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No se han identificado peligros adicionales a los valorados inicialmente, por lo tanto, la matriz de peligros y valoración de riesgos no ha tenido actualizaciones. **ANEXO 13. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**

7.12 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2021 se implementaron las siguientes inspecciones como medidas de prevención y control

Inspección preoperacional de planta eléctrica	08/03/2021
Inspección preoperacional pulidora	24/03/2021
Inspección preoperacional de herramienta menor	12/03/2021
Inspección preoperacional de herramienta menor	23/03/2021
Inspección preoperacional de canguro	8/03/2021
Inspección preoperacional de canguro	23/03/2021

ANEXO 14. INSPECCIONES

7.13 PROGRAMA DE MANTENIENTO

Se adjuntan los documentos de los vehículos que ingresaron a operación en el mes de septiembre como seguimiento al programa de mantenimiento de vehículos. **ANEXO 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO**

7.14 ENTREGA DE EPP

Se realiza entrega de EPP a todo el personal

ANEXO 16. ENTREGA DE EPP

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Se implementa protocolo de bioseguridad en los fretes de trabajo abiertos entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2021. Se adjuntan los siguientes soportes **ANEXO 17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD**

- Registro de temperatura
- Convenio alquiler de baños
- Entrega de EPP . **ANEXO 16.**
- Entrega de kits de bioseguridad
- Registro fotográfico.

7.16 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se realiza implementación de las fichas de manejo ambiental y socialización de las medidas de manejo. **ANEXO 12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

8. INFORME DE OBRA

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

8.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°47 (DEL 1 MARZO AL 7 MARZO DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	AK 86 X AC 66 A	1.	Se realiza instalacuion de redes para conexión de cajas semaforización.	90%
		2.	Se realiza instalación de sardinel costados nor occidental y sur oriental.	
		3.	Se realiza construcción de cenefa costados sur oriental.	
		4.	Se realiza relleno de base granular costado sur oriental, oriental, noroccidental.	
		5.	Se realiza instalación de cenefa en los costados sur oriental, oritnela y nororiental.	
		6.	Se realiza construcción de anden conreto 3000 PSI costados sur oriental, oriental, nororiental.	
		7.	Se realiza construcción de la caja para poste semafórico costado sur oriental, oriental.	
		8.	Se realiza toma de densidades.	
		9.	Se realiza instalación de sardinel costado sur oriental.	
2.	AK 86 X AC 65 BIS	1.	Se realiza instalacion de sardinel.	90%
		2.	Se realiza instalación de cenefa.	
		3.	Se realiza instalación de ductos de 3" para conexión de cajas sencillas costados nororiental, suroriental, oriental y separador sur.	
		4.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI costado nororiental, suroriental, oriental, separador sur.	
		5.	Se realiza construcción de base para semáforo costado oriental, sur oriental.	
		6.	Se realiza toma de densidades.	
		7.	Se realiza limpieza de las zonas intervenidas.	
3.	KR 104 X AC 145	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	80%

4.	KR 50 X CL 24	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	60%
5.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo, a la espera de la decisión de la SDM en cuanto a la construccion de la intersección.	5%
6.	KR 116 X DG 16	1.	Se atiende emergencia, se realiza cambio de tapa.	100%
7.	AK 86 X CLL 64	1.	Se realiza replanteo.	5%

8.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°48 (DEL 8 MARZO AL 14 MARZO DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	AK 86 X AC 66 A	1.	Se Realiza demolición de anden concreto sur oriental.	90%
		2.	Se realiza instalación de sardinel costado sur oriental, oriental, nororiental.	
		3.	Se realiza relleno de base granualar costados suroriental.	
		4.	Se realiza instalación de ductos de 3" costado oriental.	
		5.	Se realiza instalación de cenefa y toperol costado suroriental, oriental, nor oriental.	
		6.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI.	
		7.	Se realiza construcción de bases para postes semafóricos.	
		8.	Se realiza toma de densidades costados sur oriental, oriental, nororiental.	
		9.	Se realiza limpieza de las zonas intervenidas.	
2.	AK 86 X CL 65 BIS	1.	Se realiza demolición de anden concreto costados nororiental, oriental, costado sur oriental.	90%
		2.	Se realiza instalación de sardinel costados suroriental, oriental, nororiental, seprados norte.	
		3.	Se realiza relleno de base granular en los costados suroriental, oriental, nororiental, seprados norte.	
		4.	Se realiza instalación de cenefa y toperol en los costados suroriental, oriental, nororiental, seprados norte.	
		5.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI.	
		6.	Se realiza instalación de bolardos.	
		7.	Se realiza toma de densidades costados suroriental, oriental y nororiental.	
3.	KR 104 X AC 145	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	80%
4.	KR 50 X CL 24	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	60%
5.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo, a la espera de la decisión de la SDM en cuanto a la construccion de la intersección.	5%
6.	KR 116 X DG 16	1.	Se atiende emergencia, se realiza cambio de tapa.	100%
7.	AK 86 X CLL 64	1.	Se realiza replanteo.	5%

8.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°49 (DEL 15 MARZO AL 21 MARZO DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	AK 86 X CL 64	1.	Se realiza demolición de anden concreto costados sur occidental, occidental, noroccidental.	98%
		2.	Se realiza la instalación de sardinel costados suroccidental, occidental y noroccidental.	
		3.	Se realiza relleno de base granular costados sur occidental, occidental y norccidental.	
		4.	Se realiza instalación de ductos costado noroccidental.	
		5.	Se realiza instalación de cenefa y toperol costados sur occidental, occidental y noroccidental.	

		6.	Se realiza demolición de anden concreto costado separador sur.	
		7.	Se realiza instalación de sardinel costados separador sur.	
		8.	Se realiza relleno de base granular costado separador sur.	
		9.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI.	
		10.	Se realiza construcción de bolardos.	
		11.	Se realiza construcción de base para poste semafórico.	
		12.	Se realiza toma de densidades en los costados suroccidental, occidental, noroccidental y separador sur.	
2.	AK 86 X CLL 65 BIS	1.	Se realiza limpieza de la obra y de las zonas intervenidas.	100%
3.	KR 104 X AC 145	1.	Se define la programacion para realizar la instalacion de la carpeta asfáltica.	80%
4.	KR 50 X CL 24	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	60%
5.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo, a la espera de la decisión de la SDM en cuanto a la construccion de la intersección.	5%
6.	KR 116 X DG 16	1.	Se atiende emergencia, se realiza cambio de tapa.	100%
7.	AK 86 X CLL 63F	1.	Se realizo emboquillado de adoquín.	98%
		2.	Se realiza emoquillado de loseta toperol.	
8.	AK 86 X AC 66 A	1.	Se realiza limpieza y entrega de obra.	100%
9.	KR 59B X CL 182	1.	Se realiza replanteo y la investigación de redes para perforaciones.	10%

8.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°50 (DEL 22 MARZO AL 28 MARZO DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	AK 86 X CL 64	1.	Se realiza limpieza de zonas intervenidas.	100%
2.	KR 50 X CL 182	1.	Se realiza perforación horizontal costados sur occidental, suroriental.	65%
		2.	Se realiza demolición anden adoquín arcilla costado suroccidental.	
		3.	Se realiza perforación horizontal de los costados suroccidental, noroccidental.	
		4.	Se realiza demolición de anden adoquín arcilla costado sur oriental.	
		5.	Se realiza instalación de ductos 3" costado nor occidental.	
		6.	Se realiza construcción de caja para equipo AUCE costado sur occidental.	
		7.	Se realiza construcción de cajas dobles y sencillas costados sur occidental, suroriental, noroccidental, nororiental.	
		8.	Se realiza perforación horizontal costados sur occidental, noroccidental.	
		9.	Se realiza construcción de cajas dobles y sencillas costado nororiental.	
		10.	Se realiza construcción e instalación de ductos costado sur occidental, sur oriental, nororiental, noroccidental.	
		11.	Se realiza instalación de sardinel costado sur occidental, sur oriental, nororiental, noroccidental.	
		12.	Se realiza conformación con base granular costado nororiental.	
		13.	Se realiza instalación de adoquín arcilla costados sur occidental y sur oriental.	
3.	KR 104 X AC 145	1.	Se define la programacion para realizar la instalacion de la carpeta asfáltica.	80%

4.	KR 50 X CL 24	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	60%
5.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo, a la espera de la decisión de la SDM en cuanto a la construccion de la intersección.	5%
6.	AK 86 X CLL 63F	1.	Se realiza limpieza de zonas verdes y aseo de obra.	100%
7.	TV 42 X CL 12	1.	Se realiza replanteo.	10%
8.	KR 9 X CL 127	1.	Se realiza replanteo.	5%
9.	KR 9 X CL 23	1.	Se realiza replanteo.	10%


8.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°51 (DEL 29 MARZO AL 04 ABRIL DE 2021)


INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	KR 50B X CL 182	1.	Se realiza conformación con base granular costado nororiental.	70%
		2.	Se instala toperol y cenefa costado nororiental.	
		3.	Se realiza toma de densidades.	
		4.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI.	
		5.	Se realiza instalación de bases para postes semafóricos costado nororiental, suroccidental y suroriental.	
		6.	Se realiza movimiento de bases por parte de la Secretaria de Movilidad.	
		7.	Se realiza construcción de cajas dobles costados nororiental y suroriental.	
2.	KR 9 X CLL 23	1.	Se realiza instalación de bajantes.	100%
		2.	Se realiza instalación de ductos 3", 2" costados sur occidental.	
3.	TV 42 X CL 12	1.	Se realiza perforación horizontal costados nororiental, sur oriental.	35%
4.	KR 104 X AC 145	1.	Se define la programacion para realizar la instalacion de la carpeta asfáltica.	80%
5.	KR 50 X CL 24	1.	En tramite de aprobacion de PMT.	60%
6.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo, a la espera de la decisión de la SDM en cuanto a la construccion de la intersección.	5%
7.	KR 9 X CL 127	1.	Se realiza replanteo.	10%

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE EL MES

AK 86 X CLL 65 BIS

	
Fotografía N°1	**Fotografía N°2**
	
Fotografía N°3	**Fotografía N°4**

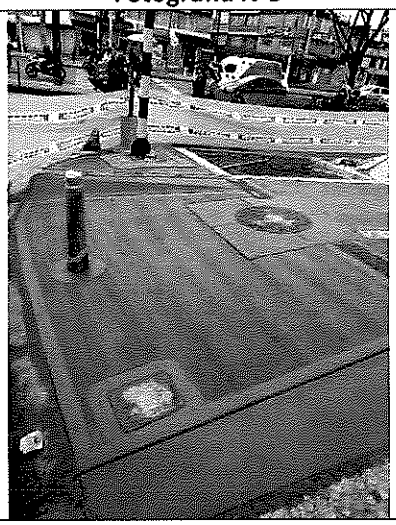	
Fotografía N°5	**Fotografía N°6**
	
Fotografía N°7	**Fotografía N°8**

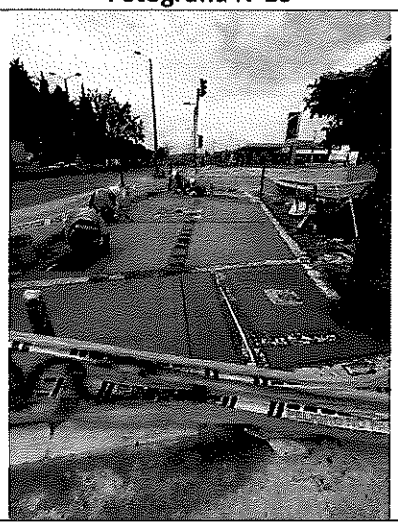	
Fotografía N°9	**Fotografía N°10**
	
Fotografía N°11	**Fotografía N°12**

AK 86 X CLL 64




Fotografía N°13



Fotografía N°14




Fotografía N°15

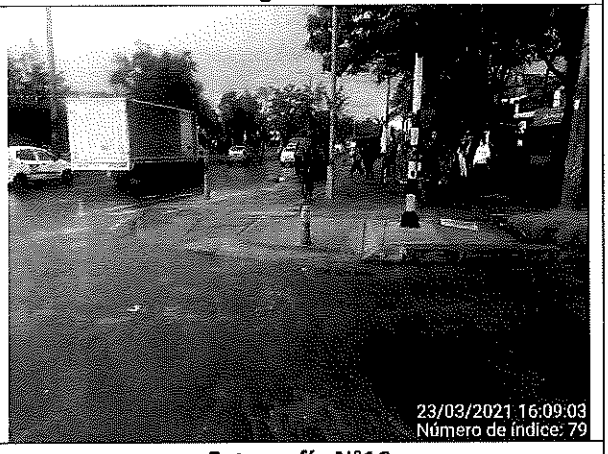

Fotografía N°16



Fotografía N°17

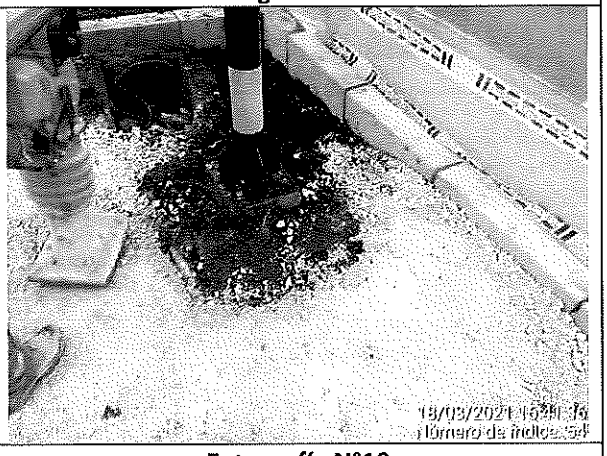

Fotografía N°18




Fotografía N°19



Fotografía N°20



Fotografía N°21

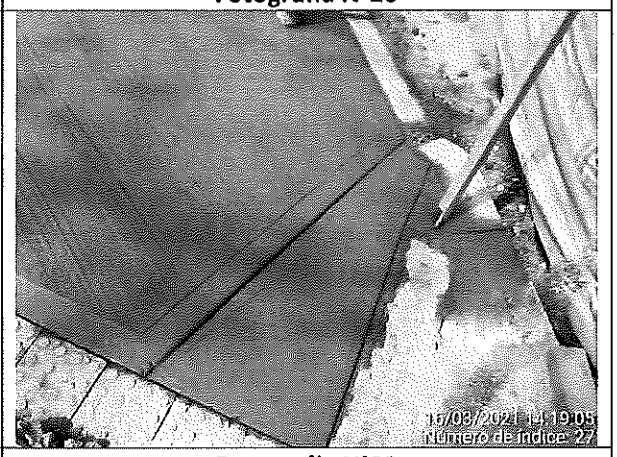

Fotografía N°22



Fotografía N°23



Fotografía N°24



Fotografía N°25



Fotografía N°26



Fotografía N°27



Fotografía N°28



Fotografía N°29



Fotografía N°30



Fotografía N°31



Fotografía N°32



Fotografía N°33



Fotografía N°34



Fotografía N°35



Fotografía N°36



Fotografía N°37



Fotografía N°38



Fotografía N°39



Fotografía N°40



Fotografía N°41



Fotografía N°42



Fotografía N°43



Fotografía N°44



Fotografía N°45



Fotografía N°46



Fotografía N°47



Fotografía N°48



Fotografía N°49



Fotografía N°50



Fotografía N°51



Fotografía N°52




Fotografía N°53


AK 86 X CLL 66 A



Fotografía N°54

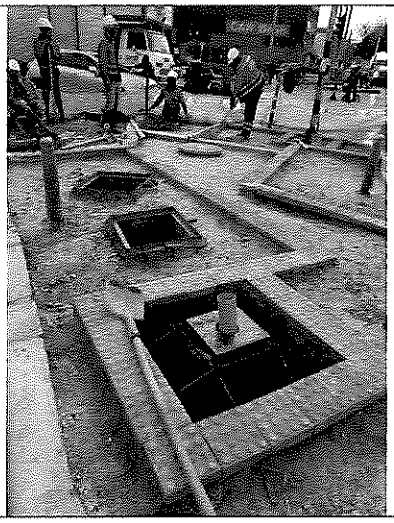

Fotografía N°55

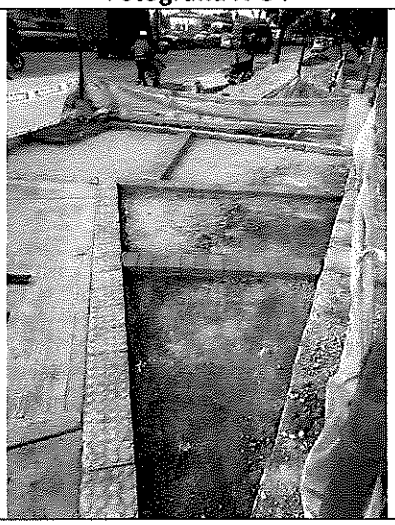

Fotografía N°56



Fotografía N°57



Fotografía N°58



Fotografía N°59

KR 50B X CL 182



Fotografía N°61



Fotografía N°62



Fotografía N°63



Fotografía N°64



Fotografía N°65



Fotografía N°66



Fotografía N°67



Fotografía N°68



Fotografía N°69



Fotografía N°70



Fotografía N°71



Fotografía N°72



Fotografía N°73



Fotografía N°74



Fotografía N°75



Fotografía N°76



Fotografía N°77




Fotografía N°78




Fotografía N°79




Fotografía N°80

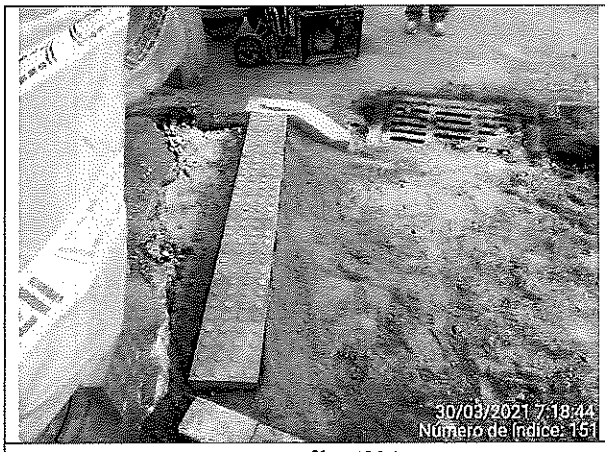

Fotografía N°81

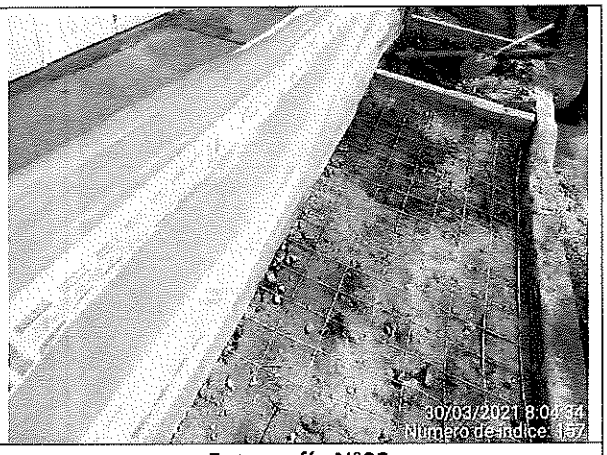

Fotografía N°82

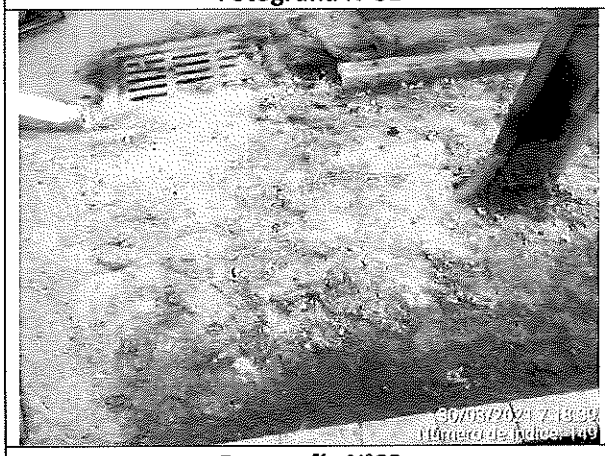

Fotografía N°83



Fotografía N°84



Fotografía N°85



Fotografía N°86



Fotografía N°87



Fotografía N°88



Fotografía N°89



Fotografía N°90



Fotografía N°91



Fotografía N°92



Fotografía N°93



Fotografía N°94




Fotografía N°95



Fotografía N°96



Fotografía N°97

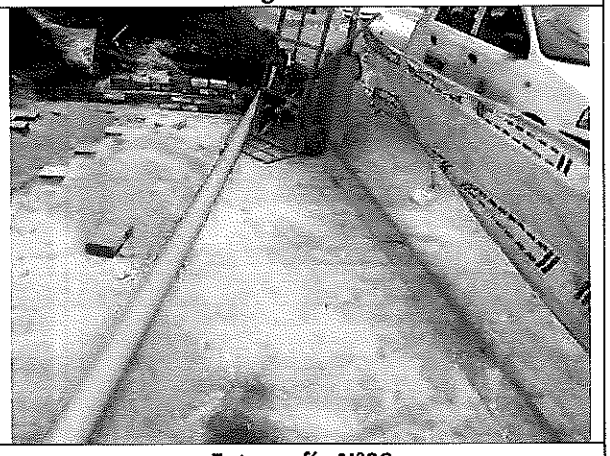

Fotografía N°98



Fotografía N°99



Fotografía N°100



Fotografía N°101



Fotografía N° 102



Fotografía N°103



Fotografía N° 104



Fotografía N°105



Fotografía N° 106




Fotografía N°107



Fotografía N° 108



Fotografía N°109

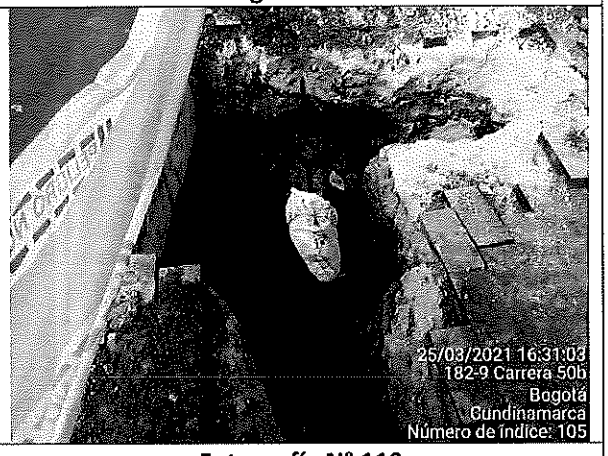

Fotografía N° 110



Fotografía N°111




Fotografía N° 112



Fotografía N°113



Fotografía N° 114

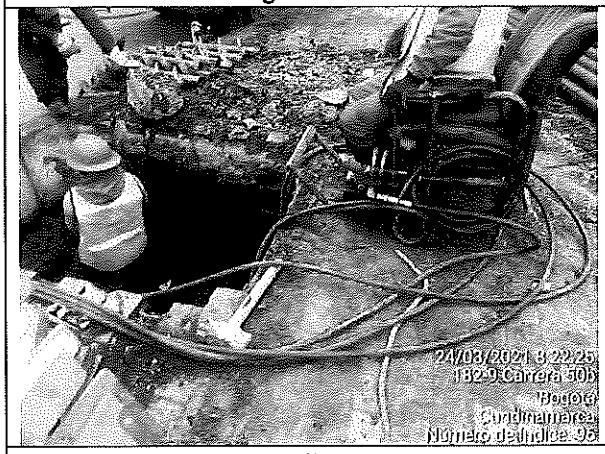

Fotografía N°115



Fotografía N° 116



Fotografía N°117



Fotografía N° 118



Fotografía N°119



Fotografía N° 120



Fotografía N°121



Fotografía N° 122



Fotografía N°123



Fotografía N° 124




Fotografía N°125



Fotografía N° 126



Fotografía N°127

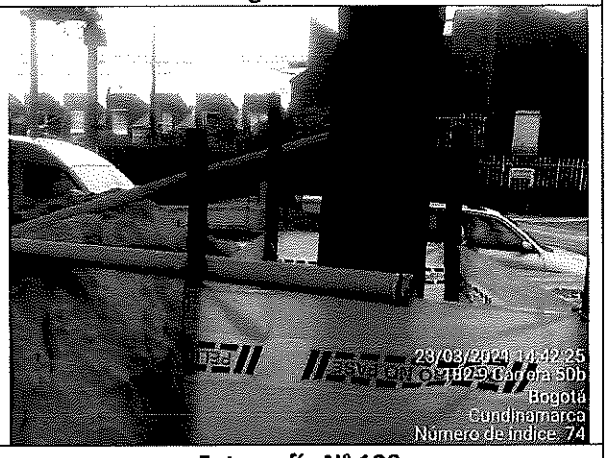

Fotografía N° 128



Fotografía N°129



Fotografía N° 130



Fotografía N°131



Fotografía N° 132



Fotografía N°133



Fotografía N° 134



Fotografía N°135



Fotografía N° 136



Fotografía N°137



Fotografía N° 138



Fotografía N°139



Fotografía N° 140

027



Fotografía N°142



Fotografía N°143



Fotografía N°144



Fotografía N°145



Fotografía N°146



Fotografía N°147



Fotografía N°148



Fotografía N°149



Fotografía N°150



Fotografía N°151

028

KR 9 X CL 23



Fotografía N°152



Fotografía N°153



Fotografía N°154



Fotografía N°155



Fotografía N°156



Fotografía N°157



Fotografía N°158




Fotografía N°159



Fotografía N°160




Fotografía N°161

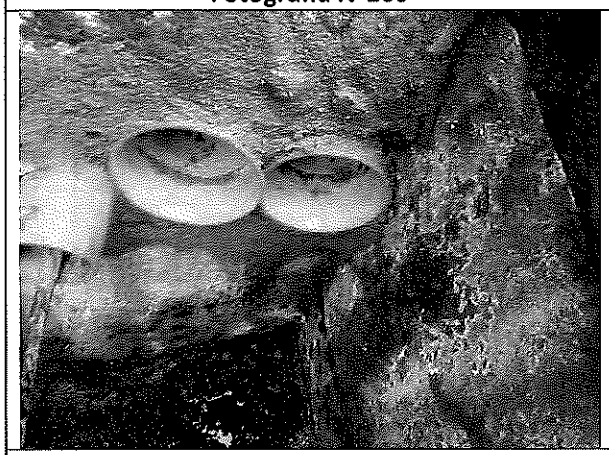

Fotografía N°162




Fotografía N°163

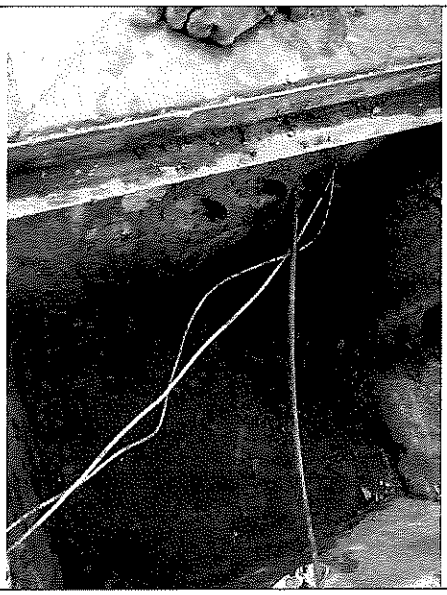

Fotografía N°164



Fotografía N°165

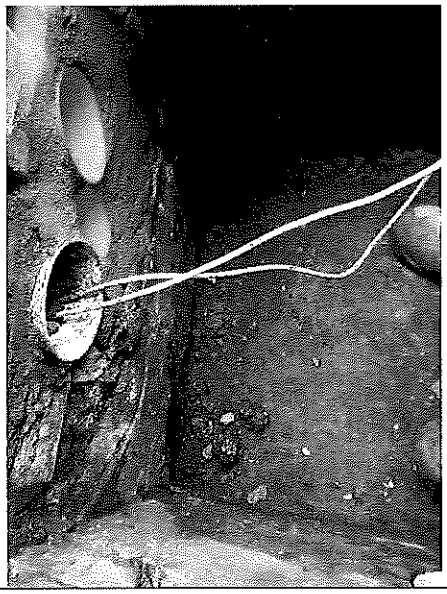


Fotografía N°166



Fotografía N°167



Fotografía N°168

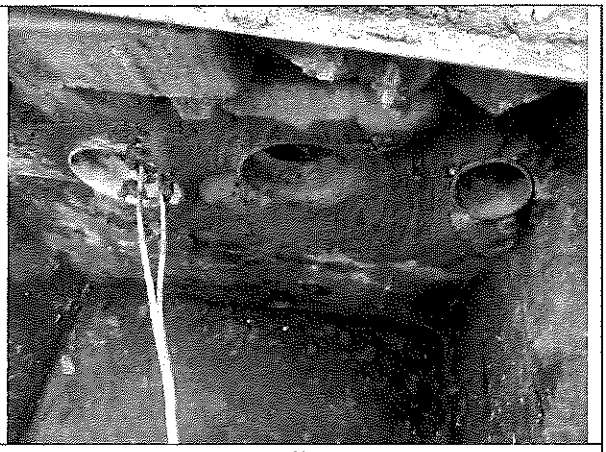

Fotografía N°169



Fotografía N°170




Fotografía N°171



Fotografía N°172



Fotografía N°173

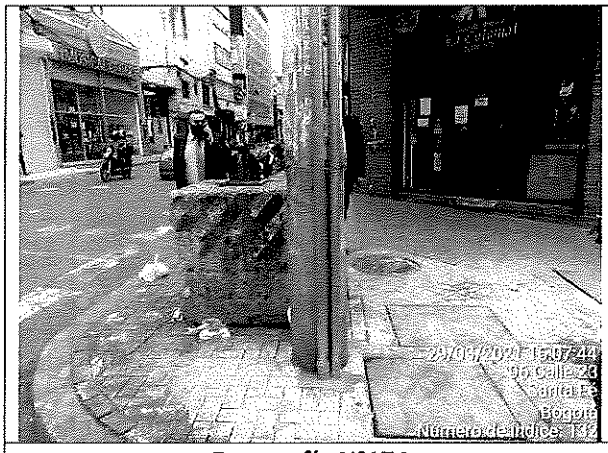

Fotografía N°174



Fotografía N°175



Fotografía N°176



Fotografía N°177



Fotografía N°178



Fotografía N°179

	
Fotografía N°180	**Fotografía N°181**

9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

9.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEMANA N°47 (DEL 1 MARZO AL 7 MARZO DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021	RADICADO SDM		
36		-	KR 116A X DG 16	EN TRAMITE DE DESARROLLO			
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06		
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
51	P1638		KR 27 X CL 5	15/02/2021	RADICADO INTERVENTORIA	19 DE FEBRERO DE 2021 OBSERVACIONES SDM	
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021	COOS 09		
59			KR 9 X CL 23	EN TRAMITE DE DESARROLLO			
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE DE DESARROLLO			

9.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°48 (DEL 8 MARZO AL 14 MARZO DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021	RADICADO SDM		
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021	RADICADO SDM		
36		-	KR 116A X DG 16	EN TRAMITE			
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06		
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		

49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
51	P1638		KR 27 X CL 5	15/02/2021	RADICADO INTERVENTORIA	19 DE FEBRERO DE 2021 OBSERVACIONES SDM	
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021	RADICADO SDM		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021	COOS 09		
59			KR 9 X CL 23	EN TRAMITE			
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE			

9.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°49 (DEL 15 MARZO AL 23 MARZO DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11		
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06		
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO	19/03/2021	

58			AK 104 X AC 145	25/12/2021	COOS 09		
59			KR 9 X CL 23	EN TRAMITE			
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE			

9.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°50 (DEL 23 MARZO AL 28 MARZO DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11		
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06		
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021	
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM		
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021	
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE			

9.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°51 (DEL 29 MARZO AL 31 MARZO DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11		
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		

36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06		
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021	
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM		
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021	
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021

9.1 ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PROXIMO MES

Realizar la aprobacion de los planes de manejo de tráfico y diseños de las siguientes direcciones:

1. KRA 78 X CL 40 SUR
2. KRA 50 X CL 24
3. KRA 104 X CL 145
4. KRA 116ª X DG 16

10. INFORME DE DISEÑO

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		APROBADO 25/02/2021	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020 03/12/2020		El diseño se encuentra en revisión por parte de SDM. Fue aprobado por parte de la SDM (Ing. Éric Galeano). Se tiene observación de interventoría en relación de un radio de giro. El contratista ajustó los radios en aras de cumplir con la solicitud. Esta fue enviada a la interventoría el 15/03/2021.	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		Atención de observaciones por parte del contratista.	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	Aprobado 17/03/2021	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		Está en revisión por SDM, una vez se cuente con el concepto, se programará mesa de trabajo conjunta.	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021	3/03/2021			9/03/2021 16/03/2021		Atención de observaciones por parte del contratista. En espera de mesa de trabajo conjunta SDM, contratista e interventoría	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 29/03/2021	29/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	19/02/2021 30/03/2021		Atención de observaciones por parte del contratista. En espera de mesa de trabajo conjunta SDM, contratista e interventoría	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	3/03/2021 31/03/2021		4/03/2021		Atención de observaciones por parte del contratista. En espera de mesa de trabajo conjunta SDM, contratista e interventoría	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2021 16/03/2021		En revisión por parte de interventoría	60%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						Atención de observaciones por parte del contratista. En espera de mesa de trabajo conjunta SDM, contratista e interventoría	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	9/03/2021					Atención de observaciones por parte del contratista. En espera de mesa de trabajo conjunta SDM, contratista e interventoría	60%

	P131 0		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/20 21		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	Atención de observaciones por parte del contratista.	80%
	P131 1		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	2/03/2021	5/03/2021					Atención de observaciones por parte del contratista. En espera de mesa de trabajo conjunta SDM, contratista e interventoría	

11. INFORME DE CALIDAD

En cumplimento a lo establecido en el numeral 8. Identificación Y Trazabilidad, se adjuntan los respectivos ensayos y certificados de calidad de los materiales:

1. Ensayo de compresión de cilindros de concreto.
2. Ensayo de compactación y granulometría de subbase granular SBG-1. (El ensayo de granulometría lo realiza la trituradora CONSTRITURAR semestralmente)
3. Certificado de calidad cemento argos
4. Certificado de calidad de Tubería TDP y TB (PVCENTER)
5. Formato 21 informe de seguimiento y medición

INDICADORES DE GESTIÓN

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

INDICADORES DE GESTION OBJETIVOS DE CALIDAD			
FECHA	31/03/2021	INFORME MENSUAL N°	11
OBJETIVO N°1	Cumplir con los plazos estipulados	META	DIAS DE RETRASO
		2 dias	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON RETRASO			
OBJETIVO N°2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		2 quejas	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			
OBJETIVO N°3	Cumplir con especificaciones tecnicas y manuales de diseño del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		cumplir con especificaciones tecnicas, manuales de diseño y normas del contrato	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			

11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
AC2R-SEM-144-2020	1/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	1/03/2021	Oficio AC2R-SEM-144-2020, con asunto RESPUESTA COMUNICADO PIV-IMS-20191810-0434.	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	5/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	5/03/2021	Fwd: INFORMES DE GESTION FEBRERO 2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R -SEM - 147 2021	5/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	5/03/2021	Comunicado de Interventoria PIV-IMS-20191810-0432	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-148-2020	5/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	5/03/2021	oficio AC2R-SEM-148-2020, Certificación personal vulnerable.	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-147-2020 /AC2R-SEM 136-2020/ AC2R-SEM-148-2020	5/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	5/03/2021	INFORMACIÓN RESPUESTA APREMIOS - CONTRATO 20191874	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-149-2021	6/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	6/03/2021	Informe N°11 Oficio AC2R-SEM-149-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	9/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	9/03/2021	Programaciones de obra AK 86 XDG 63F y AK 86 XDG 64B BIS	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	10/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	10/03/2021	Programaciones de obra AK 86 XDG 63F y AK 86 XDG 64B BIS	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	10/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	10/03/2021	Informe N°11 Oficio AC2R-SEM-149-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-150-2021	10/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	10/03/2021	Comunicado de Interventoria PIV-IMS-20191810-0432	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	11/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	11/03/2021	Fwd: cuentas	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	12/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Maryeth Vanegas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Maryeth Vanegas	12/03/2021	Subsanación de observaciones informe 11	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	12/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Maryeth Vanegas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Maryeth Vanegas	12/03/2021	Subsanación de observaciones informe 11	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	12/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	12/03/2021	Corte de obra 6	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	12/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	12/03/2021	Corte de obra 6	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	15/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	15/03/2021	Programación Kr 50 XCL 182	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-152-2021	15/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	15/03/2021	AC2R-SEM-152-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	17/03/2021	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	LAURA LILIANA JUNCA	Ing. Camilo Rosario	X		LAURA LILIANA JUNCA	17/03/2021	Proceso # 503 DIRECTIVA 001 De 2011-Decreto 380 de 2015	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS

	17/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	17/03/2021	Oficio AC2R SEM-153-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	18/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	18/03/2021	Corte de obra 6	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	19/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	18/03/2021	Corte de obra 6	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	19/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/03/2021	CAMBIO DE POLIZAS	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	20/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	20/03/2021	Oficio AC2R SEM-153-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	20/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	20/03/2021	Planos récord	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	20/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	20/03/2021	Planos récord	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	23/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	23/03/2021	Programación PAC	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	23/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	23/03/2021	Programación PAC	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	26/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	20/03/2021	Planos récord	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	26/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	26/03/2021	Cerramiento mal implementado KR 50B X CL 182	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	26/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	26/03/2021	PROGRAMACIONES DE OBRA	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R SEM-156-2021	29/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	29/03/2021	Oficio AC2R SEM-156-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	30/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	30/03/2021	Solicitud audio comité 30 de marzo del 2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	31/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	31/03/2021	Informe mensual marzo de 2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R SEM-153-2021	31/03/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	31/03/2021	Oficio AC2R SEM-153-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS

10.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Diseño calle 127 x carreras 9a y 11		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
1/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación replanteo		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
1/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Diseños faltantes de intersecciones		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
1/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 2 de mar de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
2/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mié 3 de mar de 2021 8am - 9:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
2/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado de Interventoría PIV-IMS-20191810-0432	X		10/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
3/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Levantamiento de redes 260-2054-Carrera 13 x calle 57		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
4/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	Apremio plan de mejora auditoria calidad		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
4/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: INFORMES DE GESTION FEBRERO 2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: INFORMES DE GESTION FEBRERO 2021	X		5/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
4/03/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	INFORMACION RESPUESTA APREMIOS - CONTRATO 20191874	X		5/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
4/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: Acta de comité semanal		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Respuesta oficio AC2R-SEM-140-2020		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Diseños semafóricos intersecciones		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 9 de mar de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Maryeth Vanegas	Ing. Camilo Rosario	Informe N°11 Oficio AC2R-SEM-149-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación Replanteo		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/03/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	Fwd: DISEÑO KR 23C X CL 64 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°11 Oficio AC2R-SEM-149-2021	X		10/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
10/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programaciones de obra AK 86 X DG 63F y AK 86 X DG 64B BIS		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
10/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud profesional de tránsito en implementación de cerramientos.		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/03/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°11 Oficio AC2R-SEM-149-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado de interventoría PIV-IMS-20191810-0432		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: cuentas	X		11/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Corte de obra 6	X		12/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Corte de obra 6	X		12/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Fwd: DISEÑO 1078		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/03/2021	Roqueme Salazar Christian	Correo electronico	Roqueme Salazar Christian	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
15/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Intersección ID 1243 NEI 1243 KR 9 X CL 23 - Cableado		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
15/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mar 16 de mar de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Seguimiento intersección 1340-1101- KR 8 X CL 67		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	AC2R-SEM-152-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación Kr 50 X CL 182		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Vigencia PMT intersección 260-2054-KR 13 X CL 57		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación PAC	X		23/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

17/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Cerramiento mal implementado KR 50B X CL 182	X		26/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
17/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Intersección ID 1243 NEI 1243 KR 9 X CL 23 - Cableado		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
17/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 23 de mar de 2021 8am - 9:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
18/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
18/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
18/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Planos récord	X		20/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
18/03/2021	Christian Roqueme Salazar	Correo electronico	Christian Roqueme Salazar	Ing. Camilo Rosario	Diseño TV 53 X CL 2		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
18/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Corte de obra 6	X		18/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
18/03/2021	Christian Roqueme Salazar	Correo electronico	Christian Roqueme Salazar	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/03/2021	Christian Roqueme Salazar	Correo electronico	Christian Roqueme Salazar	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/03/2021	MINISTERIO DE CULTURA	Correo electronico	Alberto Escovar Wilson-White	Ing. Camilo Rosario	Solicitud de Subsanes del proyecto de intervención aplicativo SIPA, Mincultura		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Corte de obra 6	X		19/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Corte de obra 6		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	ING. CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA	Ing. Camilo Rosario	Oficio AC2R SEM-153-2021	X		20/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud aclaración redes KR 50B X CL 182		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Planos récord	X		20/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Planos de PMT aprobados		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Planos de PMT aprobados		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comité de obra semanal		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Reubicación mobiliario intersección KR 50B X CL 182		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación PAC	X		23/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/03/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Leydy Tatiana Borda	Ing. Camilo Rosario	Oficio AC2R SEM-153-2021	X		31/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
23/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	Respuesta comunicado AC2R SEM 152 202 1		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
24/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación replanteo P736-TV 42 X CL 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
25/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Proyección económica obras en ejecución		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
25/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Delsy Lara Barbón	Ing. Camilo Rosario	Solicitud ajuste Póliza responsabilidad civil extracontractual contrato N. 2019 1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT POR EMERGENCIA - CTO SEMAFORIZACION 2019 1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Planos récord	X		26/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Plano récord P353-TV 53 X CL 2		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: movimiento bases portátiles por construcción de obras definitivas en la intersección Carrera 50B x Calle 182		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
27/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud correctivo 3010-AK 14 X CL 65 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
27/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud correctivo 3010-AK 14 X CL 65 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
27/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Reubicación base portátil flujo 1 AK 9 Y AK 11 X CL 127		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 30 de mar de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
30/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud audio comité 30 de marzo del 2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
30/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMS-20191810-0457		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
30/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO SEMAFORIZACION CARRERA 74A X CALLE 72		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
31/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe mensual marzo de 2021	X		31/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
31/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe mensual marzo de 2021	X		31/03/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
31/03/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: movimiento bases portátiles por construcción de obras definitivas en la intersección Carrera 50B x Calle 182		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

11.3 CONTROL DE ENSAYOS

INTERSECCION	ESQUINA	FECHA DE REALIZACION	RESULTADOS
AV CIUDAD CALI X CALLE 65	ANDEN ORIENTAL	20/03/2021	95,2
	ANDEN OCCIDENTAL	20/03/2021	96,7
	ANDEN ORIENTAL	20/03/2021	96,2
AV CIUDAD CALI X CALLE 65	ANDEN OCCIDENTAL	13/03/2021	95,6
	ANDEN OCCIDENTAL	13/03/2021	96,3
	ANDEN ORIENTAL	13/03/2021	97,1
AV CIUDAD CALI X CALLE 66	ANDEN NOR ORIENTAL	10/03/2021	95,3
	ANDEN NOR ORIENTAL	10/03/2021	96
	ANDEN NOR ORIENTAL	10/03/2021	90,2
	ANDEN SUR OCCIDENTAL	10/03/2021	96,1

12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

1. El acta de inicio del contrato de obra 2019-1874 fue suscrita el 6 de marzo de 2020, a causa de la pandemia causada por el virus COVID-19 al contrato se le realizo la suspensión N°1 el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 12 de abril de 2020, por motivo de continuación del estado de emergencia se genera la suspensión N°2 del 13 de abril de 2020 hasta el día 5 de mayo de 2020, desde el día de inicio hasta el día de hoy el contrato lleva de ejecución 353 días.
2. A la fecha el contrato tiene un porcentaje de ejecución programado del 92.19%, versus el porcentaje ejecutado real es del 82%, presentando a la fecha un atraso del 10% de la ejecución del contrato, el contrato tiene una fecha de terminacion del 30 de abril de 2021.

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES DE OBRA

038

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°47 - CONTRATO 2019-1874

DEL 01 DE MARZO AL 7 DE MARZO DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57		3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
42	723	2324	AK 86 X CLL 66 A		3	28/01/2020	28/01/2022	12/02/2021	11/06/2021		11/03/2021	15/02/2021		90%		
43	731	2550	AK 86 X CLL 65 B1S		3	28/01/2020	28/01/2022	12/02/2021	11/06/2021	15/02/2021	10/03/2021	22/02/2021		90%		
44			KR 116 X DG 16	EMERGENCIA cambio de tapa	3	28/01/2020	28/01/2022					6/02/2021	6/02/2021	100%		
45			AK 86 X CLL 64		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	26/02/2021	24/06/2021	6/02/2021	6/02/2021	5%		

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

039

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°48 - CONTRATO 2019-1874

DEL 08 DE MARZO AL 14 DE MARZO DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases		28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE		28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57			28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
42	723	2324	AK 86 X CLL 66 A			28/01/2020	28/01/2022	12/02/2021	11/06/2021		11/03/2021	15/02/2021		90%	$ 32.000.000	
43	731	2550	AK 86 X CLL 65 BIS			28/01/2020	28/01/2022	12/02/2021	11/06/2021	15/02/2021	10/03/2021	22/02/2021		90%	$ 18.000.000	
44			KR 116 X DG 16	EMERGENCIA cambio de tapa		28/01/2020	28/01/2022					8/02/2021	8/02/2021	100%		
45			AK 86 X CLL 64			28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	26/02/2021	24/06/2021	6/02/2021	6/02/2021	5%	$ 12.000.000	

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

040

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°49 - CONTRATO 2019-1874

DEL 15 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	ESTA SEMANA SE DEFINE LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA CARPETA ASFALTICA
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57		3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
42	723	2324	AK 86 X CLL 66 A		3	28/01/2020	28/01/2022	12/02/2021	11/06/2021	16/02/2021	11/03/2021	15/02/2021	19/03/2021	100%	$ 32.000.000	
43	731	2550	AK 86 X CLL 65 BIS		3	28/01/2020	28/01/2022	12/02/2021	11/06/2021	15/02/2021	10/03/2021	22/02/2021	19/03/2021	100%	$ 16.000.000	
44			KR 116 X DG 16	EMERGENCIA cambio de tapa	3	28/01/2020	28/01/2022					9/02/2021	8/02/2021	100%		
45	744	2530	AK 86 X CLL 64		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	26/02/2021	24/06/2021	6/03/2021		98%	$ 12.000.000	
46	747	2530	AK 86 X CLL 63F		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021			6/03/2021	27/03/2021	96%	$ 10.000.000	
47	1547	1865	KR 59B X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021		10%	$ 160.000.000	

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

041

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°50 - CONTRATO 2019-1874

DEL 23 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	ESTA SEMANA SE DEFINE LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA CARPETA ASFALTICA
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57		3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
45	744	2530	AK 86 X CLL 64		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	26/02/2021	24/06/2021	6/03/2021	22/03/2021	100%	$ 12.000.000	
46	747	2530	AK 86 X CLL 63F		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021			6/03/2021	27/03/2021	100%	$ 10.000.000	
47	1547	1865	KR 50B X CL 152		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021		65%	$ 160.000.000	
48			TV 42 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		10%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		5%	$ 28.000.000	
50			KR 9 X CL 23		4	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	26/03/2021		10%	$ 1.000.000	

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

042

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°51 - CONTRATO 2019-1874

DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	ESTA SEMANA SE DEFINE LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA CARPETA ASFALTICA
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57		3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISION DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
47	1547	1805	KR 50B X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021		70%	$ 160.000.000	
48			TV 42 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		35%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		10%	$ 28.000.000	
50			KR 9 X CL 23		4	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	26/03/2021	29/03/2021	100%	$ 1.000.000	

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES DE PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 47 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 1 MARZO AL 7 DE MARZO DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021	RADICADO SDM			
36		-	KR 116A X DG 16	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	15/02/2021	RADICADO INTERVENTORIA	19 DE FEBRERO DE 2021 OBSERVACIONES SDM		
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021	COOS 09			
59			KR 9 X CL 23	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE DE DESARROLLO				

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 48 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 8 MARZO AL 14 DE MARZO DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021	RADICADO SDM			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021	RADICADO SDM			
36		-	KR 116A X DG 16	EN TRAMITE				
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	15/02/2021	RADICADO INTERVENTORIA	19 DE FEBRERO DE 2021 OBSERVACIONES SDM		
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021	RADICADO SDM			
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021	COOS 09			
59			KR 9 X CL 23	EN TRAMITE				
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE				

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 49 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 15 MARZO AL 23 DE MARZO DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO	19/03/2021		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021	COOS 09			
59			KR 9 X CL 23	EN TRAMITE				
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE				

047

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 50 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 23 MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	EN TRAMITE				

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 51 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 29 MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
36		-	KR 116A X DG 15	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021	

049

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES DE DISEÑO

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 47 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 1 MARZO AL 7 DE MARZO DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2961	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021			24/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021						En tramite de desarrollo	80%
	P1538		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021				19/02/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021	2/03/2021	3/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	80%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021						En tramite de desarrollo	80%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						En tramite de desarrollo	80%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021						En tramite de desarrollo	80%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	EN TRAMITE						En tramite de desarrollo	40%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	EN TRAMITE						En tramite de desarrollo	40%

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 48 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 8 MARZO AL 14 DE MARZO DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021			9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021				9/03/2021		En tramite de desarrollo	80%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021	29/03/2021 5/04/2021			19/02/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021	2/03/2021	3/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	90%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021				10/03/2021		En tramite de desarrollo	80%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	EN TRAMITE						En tramite de desarrollo	80%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021	9/03/2021					En tramite de desarrollo	80%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021	12/03/2021		9/03/2021	12/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	EN TRAMITE							40%

SEMANA N° 49 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 15 MARZO AL 23 DE MARZO DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 508 X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/02/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021				9/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 29/03/2021	29/03/2021 5/04/2021			19/02/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021	3/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021				10/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 478 SUR	SI	NO	NO	EN TRAMITE						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021	9/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	12/03/2021 13/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	90%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	EN TRAMITE							60%

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 50 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 23 MARZO AL 28 DE MARZO DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1365	KR 50B X CL 162	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/03/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2982	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021				9/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021				19/02/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021	2/03/2021	3/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	EN TRAMITE						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021	9/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	EN TRAMITE							

SEMANA N° 51 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 29 MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		22/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 108	SI	NO	NO	1/03/2021				9/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 29/03/2021	29/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	19/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	3/03/2021 31/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 35 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23CX CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	9/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021							

ANEXO 4. RESULTADOS ENSAYOS DE DENSIDADES

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

Bogota DC 30 marzo de 2021

Señores
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
PROYECTO SEMAFORIZACION
Ciudad

Respetados Señores

Hacemos entrega de los ensayos realizados a las muestras tomadas para el contrato en referencia tal como se especifican a continuación

FECHA	MUESTRA	LOCALIZACION	ENSAYOS REALIZADOS
VARIOS	SUB-BASE	VARIOS	DENSIDADES EN EL TERRENO

Sin otro particular nos suscribimos, deseando éxitos en sus labores diarias.

Cordialmente

GEOCRETOS INGENIERIA S.A.S.
NIT.: 900.802.749 - 4

RICARDO LARROTA MANRIQUE
Gerente
GEOCRETOS
Laboratorio de Ingeniería Civil


GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13	VERSION No	1
		VIGENCIA D/M/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-13
LOCALIZACION	AV CIUDAD CALI CON CALLE 65	FECHA ENS.	20 de Marzo de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	30 de Marzo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)							
Peso frasco + arena inicial	gr	6301	6290	6282			
Peso frasco + arena final	gr	2954	2835	2901			
Peso total arena usada	gr	3347	3455	3381			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1745	1853	1779			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1229	1305	1253			
Peso material húmedo	gr	2674	2874	2755			
Humedad del material	%	9	8,6	8,9			
Peso material seco	gr	2453	2646	2530			
Densidad del material	gr/cm	1,996	2,028	2,019			
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098			
Grado de compactación	%	**95,2**	**96,7**	**96,2**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

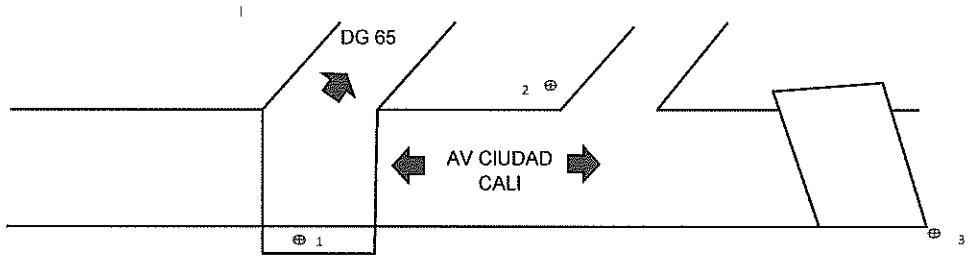

OBSERVACIONES

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO


GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13	VERSION No	1
		VIGENCIA D/M/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-12
LOCALIZACION	AV CIUDAD CALI CON CALLE 65	FECHA ENS.	13 de Marzo de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	30 de Marzo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)							
Peso frasco + arena inicial	gr	6541	6522	6506			
Peso frasco + arena final	gr	3164	3113	3050			
Peso total arena usada	gr	3377	3409	3456			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1775	1807	1854			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1250	1273	1306			
Peso material húmedo	gr	2736	2799	2898			
Humedad del material	%	9,1	8,9	9			
Peso material seco	gr	2508	2570	2659			
Densidad del material	gr/cm	2,006	2,020	2,036			
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098			
Grado de compactación	%	**95,6**	**96,3**	**97,1**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES



OBSERVACIONES

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO


GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13	VERSION No	1
		VIGENCIA DIM/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-11
LOCALIZACION	AV CIUDAD CALI CON CALLE 65	FECHA ENS.	10 de Marzo de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	30 de Marzo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3	4		
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA		
Abscisa (aproximada por lab)					S-W		
Peso frasco + arena inicial	gr	6435	6342	6302	6256		
Peso frasco + arena final	gr	2795	2815	2738	2795		
Peso total arena usada	gr	3640	3527	3564	3461		
Constante del cono	gr	1602	1602	1602	1602		
Peso arena en el hueco	gr	2038	1925	1962	1859		
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42	1,42		
Volumen del hueco	cm	1435	1356	1382	1309		
Peso material húmedo	gr	2936	2969	3022	2845		
Humedad del material	%	8,1	8,7	8,5	8,7		
Peso material seco	gr	2716	2731	2785	2617		
Densidad del material	gr/cm	1,892	2,015	2,016	1,999		
Densidad max del material	gr/cm	2,098	2,098	2,098	2,098		
Grado de compactación	%	**90,2**	**96,0**	**96,1**	**95,3**		

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

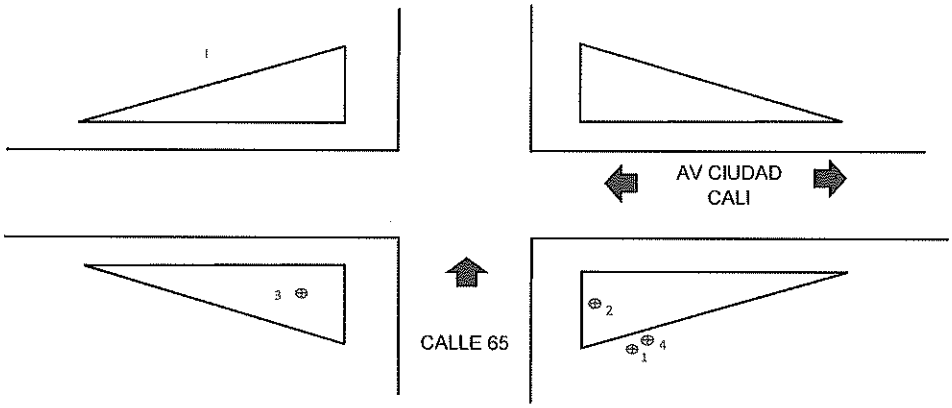

OBSERVACIONES

LA DENSIDAD 1 SE RETOMO Y EL RESULTADO ES EL 4.

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO

ANEXO 5. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PROVEEDORES Y CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL LABORATORIO

059

REPORTE DE CALIDAD: CEMENTO USO GENERAL
FEBRERO 2021
Presentación: SACOS
Cementos Argos S.A. - Planta Sogamoso

ARGOS

FECHA	PARÁMETROS QUÍMICOS					PARÁMETROS FÍSICOS						RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, Mpa			
	MgO %	SO_3 %	Pérdida ignición %	Blaine cm^2/g	Retenido Tamiz 45 µ %	Densidad g/cm^3	Cont Aire %	Exp. autoclave %	Exp. Barras de mortero %	Fraguado inicial minutos	Fraguado final minutos	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
3-feb	1.40	2.67	7.58	4945	7.50					177	300	3.8	10.1	15.2	
4-feb	1.38	2.68	7.25	4885	6.10					178	300	4.1	10.2	15.8	
5-feb	1.49	2.73	7.64	5003	6.30					169	300	4.2	10.8		
6-feb	1.24	2.83	7.59	4960	7.80					192	315	3.7	8.1		
7-feb	1.25	2.24	7.70	4685	6.60					183	315	3.7	9.5		
8-feb	1.53	2.55	7.60	4640	8.10					198	330	3.3	8.9		
9-feb	1.17	2.51	7.84	4666	7.00					186	315	3.7			
10-feb	1.17	2.51	7.84	4666	7.00					186	315	3.7			
PROMEDIO	1.33	2.59	7.63	4806	7.05					184	311	3.8	9.6	15.5	
DESV EST	0.14	0.18	0.19	156	0.71					9	11	0.3	1.0	0.4	
COEF VAR %	10.6	7.0	2.4	3.2	10.1					4.9	3.4	7.3	10.2	2.7	
MAX	1.53	2.83	7.84	5003	8.10					198	330	4.2	10.8	15.8	
MIN	1.17	2.24	7.25	4640	6.10					169	300	3.3	8.1	15.2	
DATOS	8	8	8	8	8					8	8	8	6	2	
CONTROL	**máx 6.0**	**máx 3.5**	--	--	--	--	**máx 12**	**máx 0.8**	**máx 0.02**	**mín 45**	**máx 420**		**mín 8.0**	**mín 15.0**	**mín 24.0**

Elaborado por: Mónica Gonzalez
Profesional de Calidad

Revisado por: Olga Lucía Díaz
Jefe de Calidad

090

DAICONC. SAS

REPORTE RESULTADOS RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETOS

Codigo	FORD-047
Version	01
Fecha de Emisión	15/03/2021
Páginas	1 de 1

Cliente: AC2R — **Fecha recepción:** 10/02/2021

Contacto: ELIZABETH — **Telefono:** 3187142306 — **Orden de trabajo:** 38

Proyecto: — **Informe N.** 002-20

Sede Laboratório Cra 90 # 88 A - 07 Bogotá - Tele-fax (057) 4569832

PORCENTAJES PROMEDIO DE EVOLUCION POR EDAD

	3 Días	90 - 100%	7 Diás	70 - 80%	28 Diás	> 100%

							RESISTENCIA Kg/cm2				
Cod. Int.	Cod. Cliente	Fecha Toma	Fecha ensayo	Elemento fundido	Resistencia diseño Kg/Cm2	Edad (Días)	Cilindro # 1	Cilindro # 2	Promedio	PSI	% Evolución
116	PRO - 22	18/01/2021	15/02/2021	ESTRUCTURA	210	28	215,2	218,8	217,0	3100	103,3
117	PRO - 22	27/01/2021	24/02/2021	ESTRUCTURA	210	28	209,4	211,8	210,6	3009	100,3
118	PRO - 22	29/01/2021	26/02/2021	ESTRUCTURA	210	28	225,8	229,7	227,8	3254	108,5
118	PRO - 22	1/02/2021	1/03/2021	ESTRUCTURA	210	28	218,7	219,7	219,2	3131	104,4

Ensayo para determinar la resistencia a compresión. **NTC 673**

Observaciones: Los cilindros fallados a las edades que se enuncian en el formato llevan una evolución aceptable

MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION NUMERO DE SERIE CODIGO INTERNO 001

RANGO DE MEDICION 100,96 KN -A- 706,65 KN

Ejecutó _____ Lillana Grajales A.

Reviso E.D. _____ Ing. Elquier Daza R.

Técnico de laboratorio

Director de Laboratório

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Marzo 12 de 2021
Referencia : TUBO DUCTO CORR ELECT Y TEL 3"
Norma : NTC 3363
Lote: 10091.201114.4

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR	NTC 3358	mm	88,62 - 89,18	89,08
OVALAMIENTO MÁXIMO	NTC 3358	mm	1,60	0,34
DIÁMETRO INTERIOR	NTC 3358	mm	75,00	78,36
ESPESOR VALLE	NTC 3358	mm	0,60	1,13
ESPESOR INTERNO	NTC 3358	mm	0,40	1,15
ESPESOR EXTERNO	NTC 3358	mm	0,40	0,60
LONGITUD DEL TUBO	NTC 3358	mm	6000 - 6012	6010
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	89,72 - 90,28	89,73
OVALAMIENTO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	1,52	1,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	73,00 - 79,00	78,58
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	81,00	CUMPLE
APLASTAMIENTO	NTC 3254	%	60 % de Diámetro Externo	CUMPLE
CALIDAD EXTRUSIÓN, Acetona	NTC 2983	Minutos	20 Minutos	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 3363	Visual	No desprendimiento de la pared	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO	NTC 3254	KN/m/m	414,00	1075,33
IMPERMEABILIDAD DE LAS UNIONES	NTC 3363	Psi	25 sin presentar fugas	CUMPLE
INFLAMABILIDAD	NTC 979	Visual	Autoextinguible	CUMPLE
ROTULADO	NTC 979	N/A	PVC GERFOR IND. COL. PVC DUCTO TELEFONICO Y ELECTRICO CORRUGADO D.E. 3" - 88 mm PS 414 KN/m/m (60 psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3363 - RETIE Res. 90708 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S.A.S
FABRICACION/IMPORTACION/EXPORTACION/DISTRIBUCION

DIVISIÓN DE METROLOGÍA - LABORATORIO DE MASA Y FUERZA
CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

NIT: 900.278.570-5

FECHA DE CALIBRACION: abril 20 de 2020
Date of Calibration

SOLICITANTE: GEOCRETOS INGENIERIA SAS
Customer

DIRECCION: Calle 42S No 79F-38
Address

CIUDAD: Bogotá D.C
City

INSTRUMENTO: Balanza Electrónica
Instrument

TIPO: NP
Type

FABRICANTE: LEXUS
Manufacturer

MODELO: NP
Model

SERIE: NP
Number

CAPACIDAD: 0,02 Kg a 30 Kg
Capacity

Número de Páginas del Certificado: 3
Number of pages of the certificate

Este informe de calibración solo puede ser reproducido totalmente con la autorización de Fabiequipos y Distribuciones S.A.S. Los informes de calibración no son válidos sin las firmas autorizadas y la estampilla de calibración.

This calibration report may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration report without signature are not valid.

Revisado Por:
Reviewed by:

Franklin Ricardo

Calibrado Por:
Calibrated by:

Edgar Rodriguez

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S A S
NIT. 900.278.570-5
CALLE 2A NO. 72-36 I 105
PBX: 805 17 77 25
BOGOTÁ - COLOMBIA

1. Notas Aclaratorias

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results of this report refer to the moment and conditions in wich the measurements were made . The issuing Laboratory no responsability for damages ensuing mis use of the calibratyed instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having the apparatus calibrated at apropiate intervals

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).

This Calibration certificate documents the traceability to national standards, wich realize the units of measurement according to the international systm of units (SI).

2. Norma Técnica Utilizada Para la calibración

El instrumento es calibrado según los requisitos de la Guía SIM para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático (2008).

3. Dispositivo Patrón Utilizado

Juego de Pesas

Capacidad de Medición:	1 g – 10 kg
Incertidumbre de Medición:	F1
Fecha de Calibración:	2009-08-03
Entidad que Calibra:	Laboratorios de Metrología Sigma E.U.

4. Temperatura Durante la Calibración

Temperatura Inicial:	21,2 °C
Temperatura Final:	20,4 °C

5. Resultados de la Calibración

FORMATO PARA CALIBRACION DE BALANZAS

FECHA		2020-04-20	
DATOS DE LA BALANZA			
SOLICITANTE	:	GEOCRETOS INGENIERIA SAS	
INSTRUMENTO	:	BALANZA ELECTRONICA	
FABRICANTE	:	LEXUS	
MODELO	:	NP	
SERIE	:	NP	
CARGA MÁXIMA (Max.)	:	30,000	kg
CARGA MÍNIMA (Min.)	:	0,040	kg
DIVISIÓN DE ESCALA	:	0,002	kg
DESVIACION ESTANDAR	:	0,004	kg
DESVIACION LINEAL	:	0,006	kg
SENSIBILIDAD TERMICA	:	2*10^-6	ppm/°C
EMP- POR EXCENTRICIDAD	:	0,001	kg

DATOS DE TRAZABILIDAD DE PATRONES

JUEGO DE PESAS CLASE	:	F1
NUMERO DE CERTIFICADO	:	
FECHA DEL CERTIFICADO	:	2020-04-20

CARGAS DE PRUEBA	VALOR NOMINAL	MASA CONVENCIONAL	INCERTIDUMBRE
0,2	0,2	199,999659	0,166500
0,5	0,5	499,999827	0,416500
1	1	1000,002497	1,003750
2	2	2000,004645	0,527100
5	5	5000,017201	1,683100
8	8	8000,024343	3,275450
10	10	10000,010878	2,608250
14	14	14000,020567	3,723950
18	18	18000,035620	5,883700
20	20	20000,040264	6,300200
25	25	25000,057466	6,716700
CARGA PARA EXCENTRICIDAD	5		Kg
CARGA PARA REPETIBILIDAD	5		Kg
CARGA PARA REPETIBILIDAD	10		Kg
REPETICIONES PARA REPETIBILIDAD		10	

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S.A.S
FABRICACION/IMPORTACION/EXPORTACION/DISTRIBUCION

DIVISIÓN DE METROLOGÍA - LABORATORIO DE MASA Y FUERZA
CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

NIT: 900.278.570-5

APLICACIÓN DE PRUEBAS

PRUEBA DE REPETIBILIDAD		
CARGA	5000	kg
REPETICION	INDICACION	UNIDADES
1	5,000	kg
2	5,000	kg
3	5,000	kg
4	5,000	kg
5	5,000	kg
6	5,000	kg
7	5,000	kg
8	5,000	kg
9	5,000	kg
10	5,000	kg
DESVIACION ESTANDAR	0,000000	0,0000
	g	mg

CARGA	10	kg
REPETICION	INDICACION	UNIDADES
1	10,000	kg
2	10,000	kg
3	10,000	kg
4	10,000	kg
5	10,000	kg
6	10,000	kg
7	10,000	kg
8	10,000	kg
9	10,000	kg
10	10,000	kg
DESVIACION ESTANDAR	0,000000	0,000
	g	mg


EXACTITUD O ERROR DE INDICACION			
CARGA (kg)	INDICACION (kg)	AUMENTO (kg)	ERROR (kg)
0,040	0,040	0,0009	0,0016
0,100	0,100	0,0008	0,0017
0,500	0,500	0,0009	0,0016
1,000	1,000	0,0008	0,0017
2,000	2,000	0,0009	0,0016
5,000	5,002	0,0009	0,0036
7,000	7,002	0,0008	0,0037
10,000	10,002	0,0009	0,0036
15,000	15,002	0,0008	0,0037
20,000	20,002	0,0009	0,0036
30,000	30,002	0,0009	0,0036
Desviación Estandar		0,00005	0,00104

Ti	Tf
20,0	21,0

OBSERVACIONES:
Método 2 exactitud

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD			
	CARGA	5	kg
POSICION	INDICACION (g)	AUMENTO (g)	ERROR (g)
1	5,000	0,0009	0,002
2	5,000	0,0010	0,002
3	5,000	0,0010	0,002
4	5,000	0,0010	0,002
5	5,000	0,0010	0,002

$E_{MX\,exc}$	0	mg



Incertidumbre estimada con un factor de cobertura de k=2.

Nota:

La calibración en cualquier equipo de medida solo reporta el comportamiento del quipo en el lugar y fecha en que se realizan las lecturas, por lo tanto no se puede garantizar la repetitividad de las mismas a través del tiempo.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-021

INFORME DE ENSAYO DE LIMITES NTC 4630/1999


Localización: ZONA DE ACOPIO **Fecha de toma:** 2020-11-23 **CR:** 2143
Cantera: CONSTRITURAR **Fecha de recibo:** 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Descripción: SBG-1 **Fecha de ensayo:** 2020-12-09

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

LÍMITES DE CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO:			
N° de golpes			
Vidrio N°.	NL-NP		
Masa humeda (g):			
Masa seca (g):			
Masa del recipiente (g)			
Masa Seca (g)			
Masa Agua (g)			
% Humedad			

LÍMITE PLÁSTICO:			
N° de vaso			
Masa humeda (g):			
Masa seca(g):			
Masa recipientes(g):			
Masa Seco (g)			
Masa Agua (g)			
% Humedad			

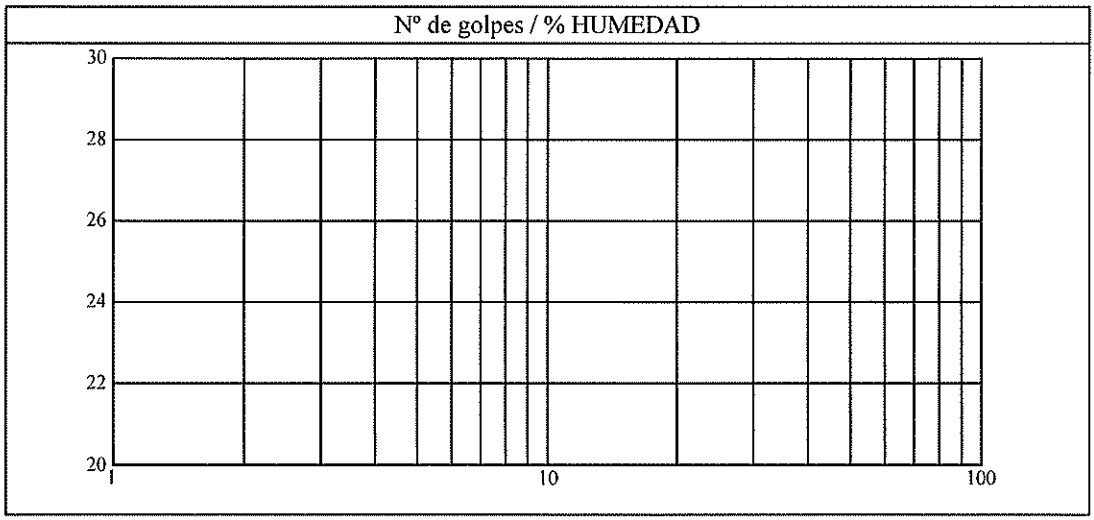

RESULTADOS	
LÍMITE LÍQUIDO (%)	0
LÍMITE PLÁSTICO (%)	0
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	0
HUMEDAD NATURAL (%)	4.09
GRAVAS (%)	62.62
ARENAS (%)	24.89
FINOS (%)	12.49

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: FL049/00
FIRMA:	FIRMA:	Inf N: 818339
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Fecha: 2020-12-14

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

068

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2017
07-LAB-021

INFORME DE ENSAYO DE GRANULOMETRIA POR TAMIZADO NTC 77:2018

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-09


Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO NTC 77/2018

Masa antes de lavado(g):	5275	Masa después de lavado(g):	4616

Tamiz (Pulg)	Tamiz (mm)	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
4"	101.60				
3 ½"	88.90				
3"	76.20				
2 ½"	63.50				
2"	50.80				
1 ½"	38.10	0.0	0.0	0.0	100.0
1"	25.40	526.0	10.0	10.0	90.0
3/4"	19.10	633.0	12.0	22.0	78.0
1/2"	12.70	882.0	16.7	38.7	61.3
3/8"	9.53	470.0	8.9	47.6	52.4
#4	4.76	792.0	15.0	62.6	37.4
#10	2.00	555.0	10.5	73.1	26.9
#40	0.42	144.0	2.7	75.9	24.1
#100	0.15	410.0	7.8	83.6	16.4
#200	0.07	204.0	3.9	87.5	12.5
Fondo		659.0	12.5	100.0	0.0

SIN ESPECIFICACION - Índice Máximo de Plasticidad:

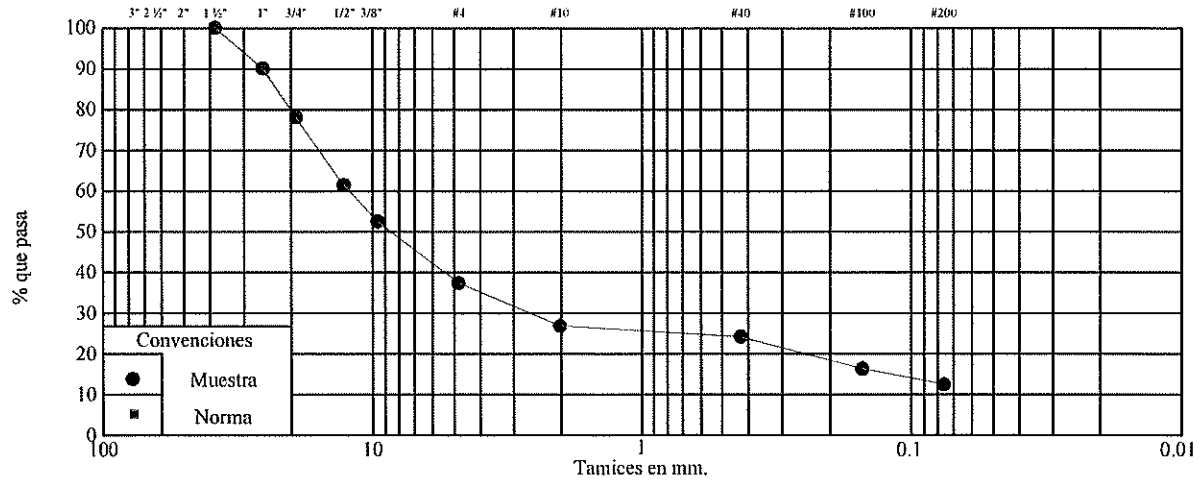

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: FL049/00
FIRMA:	FIRMA:	Inf N: 818339
Fernando Rodríguez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Fecha: 2020-12-14
		Pág. 1/1 | 2021-01-04

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 09-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV E-133/2013**

Localización: ZONA DE ACOPIO **Fecha de toma:** 2020-11-23 **CR:** 2143

Cantera: CONSTRITURAR **Fecha de recibo:** 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637

Descripción: SBG-1 **Fecha de ensayo:** 2020-12-02

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

PRUEBA	1	2	3
PROBETA N°	1	2	3
LECTURA DE ARENA	2.2	2.3	2.3
LECTURA DE ARCILLA	13.5	13.5	13.6
EQUIVALENTE DE ARENA (%)	16.3	17.0	16.9
PROMEDIO EQUIVALENTE DE ARENA (%)	17		

FUENTE	CONSTRITURAR
Especificación:	N.A.

FIN DE INFORME

LABORATORIO **FIRMA:** Fernando Rodríguez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	**RECIBIDO** **FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	**Código: F-EM-33/1** **Inf N: 818342** **Fecha: 2020-12-07** *Pág. 1/1 | 2021-01-04*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.		INFORME DE ENSAYO DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO COMPACTADO INVE 239/2013
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:		

Localización: ZONA DE ACOPIO **Fecha de toma:** 2020-11-23 **CR:** 2143

Cantera: CONSTRITURAR **Fecha de recibo:** 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637

Descripción: SBG-1 **Fecha de ensayo:** 2020-12-02

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

METODO A		1	2
P	Peso de la muestra mas cilindro en g	411.5	411.0
C	Peso del cilindro en g	279.8	279.8
W = P * C	Peso Neto de la muestra en g	131.7	131.2
V	Volumen del cilindro en cm3	100.06	100.06
G	Gravedad especifica de la muestra en g/cm3	2.60	2.60
U = (V-(W/G))/V*100	Porcentaje de Vacíos no compactados en % o ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO	49.4	49.6
PROMEDIO %		49.5	

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-56/0
FIRMA:	FIRMA:	Inf N: 819987
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Fecha: 2020-12-11
		Pág. 1/1 | 2021-01-04

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:	ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ISO/IEC 17025:2017 09-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES NTC 98/2012: NTC 93/2013**

Localización: ZONA DE ACOPIO **Fecha de toma:** 2020-11-23 **CR:** 2143

Cantera: CONSTRITURAR **Fecha de recibo:** 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637

Descripción: SBG-1 **Fecha de ensayo:** 2020-12-04

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Prueba	1	2	3	4	5
Gradación usada	A	A			
No. de esferas	12	12			
No. de revoluciones	100	500			
Peso muestra seca antes del ensayo (g)	5008	5008			
Peso muestra seca despues del ensayo (g)	4514	2911			
Pérdida (g)	494.0	2097.0			
% de desgaste	10	42			
Especificación : % menor que	N.A.	N.A.			

RESUMEN DE TABLAS NTC 93/1995 Y 98/2006 Datos sobre gradación, carga abrasiva y revoluciones.

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (g)						
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
3"	2½"					2500		
2½"	2"					2500		
2"	1½"					5000	5000	
1½"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4"	1250						5000
3/4"	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8"	1250	2500					
3/8"	1/4"			2500				
1/4"	#4			2500				
#4	#8				5000			
No. de esferas		12	11	8	6	12	12	12
No. de revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-21/1
FIRMA: Fernando Rodríguez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: _____ FECHA: _____	Inf N: 818341 Fecha: 2020-12-07

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Ingeniería Especializada y Consultoría Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 09-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO RELACION HUMEDAD-MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION INVE 142-2013**

Localización: ZONA DE ACOPIO **Fecha de toma:** 2020-11-23 **CR:** 2143


Cantera: CONSTRITURAR **Fecha de recibo:** 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637

Descripción: SBG-1 **Fecha de ensayo:** 2020-12-02

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

PRUEBA	1	2	3	4	5
N° de golpes	56	56	56	56	
Molde N°	MO363	MO363	MO363	MO363	
Humedad natural muestra (%)	4	4	4	4	
Humedad adicional (%)	2	4	6	8	
Peso muestra húmeda (g)	6000	6000	6000	6000	
Peso muestra seca (g)	5779	5779	5779	5779	
Agua adicional (%)	120	240	360	480	
Peso muestra húmeda + molde (g)	7308	7502	7522	7420	
Peso molde (g)	2680	2680	2680	2680	
Peso muestra húmeda (g)	4628	4822	4842	4740	
Humedad horno (%)	5.8	7.5	9.1	11.0	
Peso muestra seca (g)	4373.2	4486.3	4438.2	4269.4	
Volumen del molde (cm³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad muestra seca (g/cm³)	2.07	2.12	2.10	2.02	

HUMEDAD DE MOLDEO vs DENSIDAD

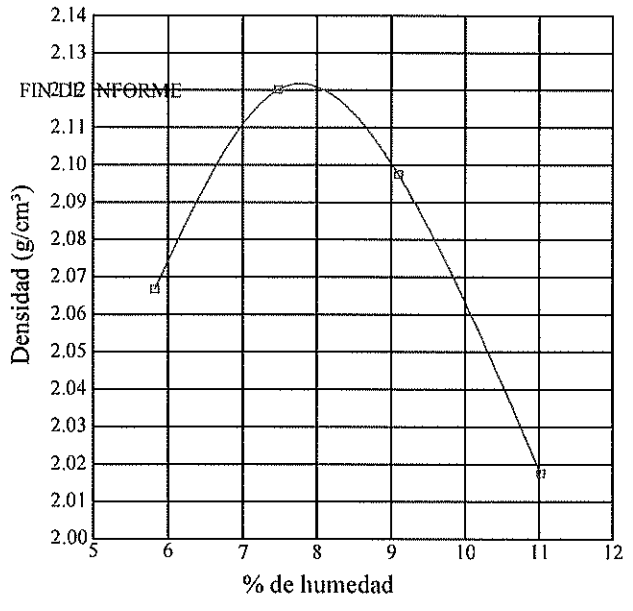

Densidad máxima (g/cm³)	2.122
Humedad óptima (%)	7.8
Material retenido tamiz 3/4" (g)	
Tipo de cara del pisón	PLANA

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-04/8
FIRMA: Fernando Rodríguez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: FECHA:	Inf N: 818344 Fecha: 2020-12-07

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

ANEXO 6. BITACORA DE OBRA

Clima = lluvia - nublado

1-03-2021 AK 86 x AC 66A

Se realiza instalacion de redes para conexion de cajas semaforizadas, se realiza instalacion de bordillos costados nor occidental y sur oriental

AK 86 x AC 65 BIS

Se realiza instalacion de bordillo, instalacion de sardinel, instalacion de ducto 3" para conexion de cajas sencillas costados nor oriental, sur oriental, oriental, separador sur.

2-03-2021 AK 86 x AC 65 BIS Clima = Nublado-lluvia

Se realiza construccion anden concreto 3000psi costados nor oriental, sur oriental, oriental, separador sur, se realiza construccion de Box para semaforo costados oriental, sur oriental se realiza demoliciones.

3-03-2021 AK 86 x AC 66A Clima = nublado

Se realiza construccion de de concreto costados sur oriental,

AK 86 x AL 65 BIS

Se realiza limpieza de las zonas intervenidas

Escaneado con CamScanner

Nota: Se reporta robo de señal subterránea en el PMT

1-03-21 Se AK BG X AC GG A Clima = nublado

Se realiza llenado de base granular contrato Sur oriental, oriental, nor oriental, Se realiza instalación de concreto en los registros sur oriental, oriental, nor oriental.

5-03-21 AK BG X AC GG A Clima = nublado

Se realiza construcción de Anden concreto 3000 psi contrato Sur oriental, oriental, Nor oriental, Se realiza construcción de de base para postes semaforos contrato sur oriental, oriental, se realiza [illegible] de excavación.

6-03-21 AK BG X AC GG A Clima = Soleado

Se realiza instalación de Sardinel contrato Sur oriental

8-03-21 AK BG X AC GG A Clima = nublado

Se realiza demolición de de anden concreto contrato sur oriental, se realiza instalación de Sardinel contrato sur oriental, oriental y nor oriental

Escaneado con CamScanner

80

9-03-21 AK BG X AC 66A Clima = nublado

Se realiza relleno de base granular costados sur oriental / oriental, nor oriental, se realiza instalacion de ductos 3" costado oriental, se realiza instalacion de cerca y retiro costado sur oriental, oriental, nor oriental

10-03-21 AK BG X AC 66A Clima = nublado - sol

Se realiza construccion de Anden concreto 3000 psi, construccion de Bajos para postes semaforo, tuvo dificultades costados sur oriental, oriental, nor oriental

11-03-21 AK BG X AC 66A Clima = nublado lluvia

Se realiza limpieza de las zonas intervenidas

AK BG X 64 Y 63

Se realiza demolicion de Anden concreto costados nor oriental, oriental, costado sur oriental

077

Escaneado con CamScanner

12-03-21 AK BC X AC 64 Y 67 Clima = nublado lluvia

Se realiza instalacion de sardinel costados sur oriental, oriental, nor oriental, segunda parte, se realiza llevo de base granular en los costados y a nacimiento, se realiza instalacion de cemento y topenal en los mismos costados.

13-03-21 AK BC X AC 64 Y 63 Clima = soleado

Se realiza construccion de anden concreto f'c 175, se realiza instalacion de bolardos, se realiza llevo de desalojos costados sur oriental, oriental nor oriental

15-03-21 AK BC X AC 64 Y 63 Clima = lluvia

Se realiza construccion de anden concreto costados sur occidental, occidental, nor occidental

16-03-21 AK BC X AC 64 Y 63 Clima = lluvia

Se realiza instalacion de sardinel costados sur occidental, occidental, nor occidental

17-03-21 AK BC X AC 64 Y 63 Clima = lluvia

Se realiza llevo de base granular costados sur occidental, occidental, nor occidental

Escaneado con CamScanner

18-03-21 AK BC X AC 64 Y 63 Clima = nublado

Se realiza instalación de dueto costado sur occidental, se realiza instalación de cepera y tapa costados sur occidental, occidental, sur occidental

19-03-21 AK BC A AC 64 y 63 Clima = nublado

Se realiza demolición de anden concreto costado separador sur, se realiza instalación de sardinel costado separador sur se realiza liso de bordillo costado separador sur

20-03-21 AK BG X AC 64 y 63 Clima = soleado

Se realiza construcción de concreto 3000PSI, construcción de bolardos, construcción de base para poste semafórico, tapa de cámaras en los costados, sur occidental, occidental, sur occidental, separador sur

23-03-21 Calle 182 X Kr 50 Clima = Soleado

Se realiza perforación horizontal costados sur occidental - sur oriental, se realiza demolición anden adoquín arcilla costado sur occidental.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

080

84

27-03-21 Calle 162 x AC 50 Clima = nublado

Se realiza conformación con base granular costado nor oriental, se instala adoquín arcilla costados sur occidental y sur oriental.

29-03-21 Kr 9 x calle 24 Clima = lluvia

Se realiza instalación de bajantes, instalación de ductos 3" pulgadas, instalación de ductos 2" costado sur occidental

Kr 50 x calle 162 Clima = lluvia

Se realiza conformación con base granular costados nor oriental en el cual costado se instala adoquín y cenefa

30-03-21 Kr 50 x calle 162

Se realiza toma de diagonales, construcción andén costado 3.00 mts, instalación de bajantes para pozos sentido costados nor oriental, sur occidental nor oriental.

Escaneado con CamScanner

31-03-21 Kr 50 x Calle 102 Clima: Soleado

Se realiza marcación de vías por parte de la Secretaría de movilidad
Se realiza construcción de cajas dobles costados nor oriental y sur oriental.

TV 42 x Calle 12

Se realiza perforación horizontal costados nor oriental — sur oriental

Escaneado con CamScanner

ANEXO 7. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C-- MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	19/03/2021	49379813	$554,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903790-5	74.900				74.900	0	0	74.900			749	74.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	0	0	80.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	74.900	74.900
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	554.900	554.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

084

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-03	2021-02	E	19/03/2021	49379813	$554,900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Activo	Extranjero	Estudiante	Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INC	IBL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1128577194	ESCOBAR CASTILLO KATHERINE	1	0			S																	23030	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	1	5,300	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
2	CC	80739852	GARCIA ANGULO EDWIN GONZALO	1	0			S																	23030	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	89,600	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900280713-8	INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES SAS	CARRERA 69B No 21 - 60 SUR	2601182	ph.ingenierialtda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS PH	23	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				24	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	07/04/2021	49730720	$10.098.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	439.600	0		0		0	0	0	0	439.600	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.400	0		0		0	0	0	0	130.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	171.500	0		0		0	0	0	0	171.500	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	67.000	0		0		0	0	0	0	67.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	332.400	0		0		0	0	0	0	332.400	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	33.000	0		0		0	0	0	0	33.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	553.700	0	0	0	0	0	0		553.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.456.500	0	0	0	0	0	0		3.456.500	14
231001	Colfondos	800227940-4	381.500	0	0	0	0	0	0		381.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	869.000	0	0	0	0	0	0		869.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.230.000				2.230.000	0	0	2.230.000			22.300	2.230.000	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.303.900	0	0	1.303.900	24

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900280713-8	INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES SAS		CARRERA 69B No 21 - 60 SUR	2601182	ph.ingenieriallda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS PH	23	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 24 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-04	2021-03	E	07/04/2021	49730720	$10.098.500

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.303.900	1.303.900
Pensión	4	5.260.700	5.260.700
Riesgos Laborales	1	2.230.000	2.230.000
CCF	1	1.303.900	1.303.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	10.098.500	10.098.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

480

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900280713-8	INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES SAS	CARRERA 69B No 21 - 60 SUR	2601182	ph.ingenierialtda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS PH	23	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				24	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	07/04/2021	49730720	$10.098.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Ajuste	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012354132	ROMERO SUAREZ OSCAR EDUARDO	1	0		S																	230301	2.173.913	347.900	0	0	0	0	EPS017	2.173.913	87.000	14-7	2.173.913	5	191.400	CCF24	2.173.913	87.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012438742	AREVALO MORANTES YENNY MILENA	1	0		S																	230301	1.090.183	174.500	0	0	0	0	EPS002	1.090.183	43.700	14-7	1.090.183	5	75.000	CCF24	1.090.183	43.700	0	0	0	0	0
3	CC	1014222877	SALAMANCA ZEA WILLIAM GUILLERMO	1	0		S																	230301	1.674.000	267.900	0	0	0	0	EPS010	1.674.000	67.000	14-7	1.674.000	5	116.600	CCF24	1.674.000	67.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018479445	ALVARADO CUELLAR WENDY DAYANNA	1	0		S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	5	139.000	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1022943540	JIMENEZ BONILLA LUZ GINA	1	0		S	K																230301	1.213.334	194.100	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	48.600	14-7	1.213.334	5	84.500	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
6	CC	1023882999	CASTAÑO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1	0		S																	230301	1.083.854	173.500	0	0	0	0	EPS017	1.083.854	43.400	14-7	1.083.854	5	75.500	CCF24	1.083.854	43.400	0	0	0	0	0
7	CC	79164210	MONTAÑA CONTRERAS JUSTO PASTOR	1	0		S																	25-14	1.733.000	277.300	0	0	0	0	EPS037	1.733.000	69.400	14-7	1.733.000	5	120.700	CCF24	1.733.000	69.400	0	0	0	0	0
8	CC	79935032	CIMBALOS CASALLAS MIGUEL ANGEL	1	0		S																	230301	1.670.087	267.300	0	0	0	0	EPS002	1.670.087	66.800	14-7	1.670.087	5	116.300	CCF24	1.670.087	66.800	0	0	0	0	0
9	CC	80188577	SALAMANCA ZEA OSCAR OSWALDO	1	0		S																	230301	1.674.000	267.900	0	0	0	0	EPS008	1.674.000	67.000	14-7	1.674.000	5	116.600	CCF24	1.674.000	67.000	0	0	0	0	0
10	CC	80247845	CASTILLO RODRIGUEZ ROGER STEVE	1	0		S																	230301	1.674.000	267.900	0	0	0	0	EPS017	1.674.000	67.000	14-7	1.674.000	5	116.600	CCF24	1.674.000	67.000	0	0	0	0	0
11	CC	80525841	SUAREZ TERREROS LUIS ALDEIRO	1	0		S																	25-14	1.514.724	242.400	0	0	0	0	EPS017	1.514.724	60.600	14-7	1.514.724	5	105.500	CCF24	1.514.724	60.600	0	0	0	0	0
12	CC	93811189	RIVERA RODRIGUEZ EDILSON	1	0		S																	230301	1.083.854	173.500	0	0	0	0	EPS005	1.083.854	43.400	14-7	1.083.854	5	75.500	CCF24	1.083.854	43.400	0	0	0	0	0
13	CC	3017702	ROMERO BARBOSA JOSE MIGUEL	1	0		S																	230301	2.173.913	347.900	0	0	0	0	EPS017	2.173.913	87.000	14-7	2.173.913	5	191.400	CCF24	2.173.913	87.000	0	0	0	0	0
14	CC	3051926	VARGAS CANO PEDRO PABLO	1	0		S																	25-14	1.083.854	173.500	0	0	0	0	EPS017	1.083.854	43.400	14-7	1.083.854	5	75.500	CCF24	1.083.854	43.400	0	0	0	0	0
15	CC	3060334	ZARATE LEON JOSE RODOLFO	1	0		S																	230301	1.083.854	173.500	0	0	0	0	EPS017	1.083.854	43.400	14-7	1.083.854	5	75.500	CCF24	1.083.854	43.400	0	0	0	0	0
16	CC	4245270	LAGOS MONSALVE JOSE SATURNINO	1	0		S																	230301	830.955	133.000	0	0	0	0	EPS017	830.955	33.300	14-7	830.955	5	57.900	CCF24	830.955	33.300	0	0	0	0	0
17	CC	4245270	LAGOS MONSALVE JOSE SATURNINO	1	0		S																7	230301	241.209	38.600	0	0	0	0	EPS017	241.209	9.700	14-7	241.209	5	0	CCF24	241.209	9.700	0	0	0	0	0
18	CC	72073917	SARMIENTO AGAMEZ ROGER EDUARDO	1	0		S																	230301	906.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	906.526	36.400	14-7	906.526	5	63.000	CCF24	906.526	36.400	0	0	0	0	0
19	CC	7542093	SUAREZ RODRIGUEZ NELSON	1	0		S																	25-14	795.034	127.300	0	0	0	0	EPS009	795.034	31.800	14-7	795.034	5	55.400	CCF24	795.034	31.800	0	0	0	0	0
20	CC	7542093	SUAREZ RODRIGUEZ NELSON	1	0		S												K					25-14	302.842	48.500	0	0	0	0	EPS005	302.842	12.200	14-7	302.842	5	0	CCF24	302.842	12.200	0	0	0	0	0
21	CC	1069373436	CHIMBI YENNY PAOLA	1	0		S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	1069373038	TRIANA CHIMBI YEISON	1	0		S																	230301	1.192.550	190.800	0	0	0	0	EPS002	1.192.550	47.800	14-7	1.192.550	5	83.100	CCF24	1.192.550	47.800	0	0	0	0	0
23	CC	12256027	CAMACHO MENDEZ JAVIER	1	0		S												X					230301	1.739.026	208.400	0	0	0	0	EPS002	1.739.026	0	14-7	1.739.026	5	0	CCF24	1.739.026	0	0	0	0	0	0
24	CC	16550791	PULIDO HORTUA NELSON	1	0		S	K																230301	823.334	214.100	0	0	0	0	EPS044	823.334	33.000	14-7	823.334	5	57.400	CCF24	823.334	33.000	0	0	0	0	0
25	CC	19027500	DIAZ VALDUENA JOSE DIMAS	1	1		S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.503.000	60.400	14-7	1.503.000	5	105.000	CCF24	1.503.000	60.400	0	0	0	0	0
26	CC	3017674	SUAREZ ROMERO RAFAEL ANTONIO	1	0		S																	230301	1.733.000	277.300	0	0	0	0	EPS002	1.733.000	69.400	14-7	1.733.000	5	120.700	CCF24	1.733.000	69.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado con **CC** número **1019079604**, aportó en nombre de **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado(a) con **CC** número **1019079604** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2021-02** y salud **2021-02** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	VSP	TDP	TAP	VTE	FTE	VTA	FTA	VCT	FCT	VCE	FCE	VAP	VAC	VST	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACION	IBC SOLIDARIDAD	IBC SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTEMPORANEO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar															0		30	$1.000.000	$20.000	$0	$0	Febrero - 2021	48691806	15/03/2021	N
EPS008	Compensar EPS															0		30	$1.000.000	$125.000	$0	$0	Febrero - 2021	48691806	15/03/2021	N
230301	Porvenir															0		30	$1.000.000	$160.000	$0	$0	Febrero - 2021	48691806	15/03/2021	N

El presente certificado se expide a los 13 días del mes Marzo de 2021

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

089

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C-- MIPYME	Obra1	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				36	0
2021-03	2021-02	E	19/03/2021	49380731	TOTAL A PAGAR	
					$8.018.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	184.600	0		0		0	0	0	0	184.600	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	37.700	0		0		0	0	0	0	37.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	110.500	0		0		0	0	0	0	110.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	234.200	0		0		0	0	0	0	234.200	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	219.700	0		0		0	0	0	0	219.700	7
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805001894-7	11.000	0		0		0	0	0	0	11.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	9.700	0		0		0	0	0	0	9.700	1
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.429.900	0	0	0	0	0	0		1.429.900	10
230301	Porvenir	800224808-8	1.967.200	0	0	0	0	0	0		1.967.200	19
231001	Colfondos	800227940-6	836.100	0	0	0	0	0	0		836.100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.692.800				1.692.800	0	0	1.692.800			16.928	1.692.800	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	973.600	0	0	973.600	36

PLANILLA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

090

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C– MIPYME	Obra1	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				36	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	19/03/2021	49360731	$8.018.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	973.600	973.600
Pensión	4	4.378.600	4.378.600
Riesgos Laborales	1	1.692.800	1.692.800
CCF	1	973.600	973.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	8.018.600	8.018.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

091

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136386-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Obra1	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 35 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-03	2021-02	E	19/03/2021	49380731	$8.018.680

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Ubicación	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002218690	AISLANT MARTINEZ ELECTO	1	0		S	X															230201	30,285	4,900	0	0	0	0	EPS002	30,285	1,300	14-11	30,285	5	2,200	CCF24	30,285	1,300	0	0	0	0	0
2	CC	1002444481	HOYOS URIELES JOSE LUIS	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
3	CC	1002444583	HOYOS URIELES LUIS ALFREDO	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS035	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
4	CC	1003777835	PEREZ RAYO JAIDER FARITH	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS034	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
5	CC	1003778054	PEREZ RAYO KEVIN YEZID	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
6	CC	1014240034	SANCHEZ RUIZ DAVID RICARDO	1	0		S																25-14	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
7	CC	85460483	JIMENEZ OLIVEROS RAIRONIS JOSE	1	0		S																231001	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS018	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
8	CC	91556053	OLIVEROS PEREZ ESTEVENSON	1	0		S																231001	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
9	CC	88653683	OVIEDO CORDERO HUGO ALBERTO	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
10	PE	9146552000111976	NAVAS NAVA ARLIN JOSE	1	0		S	X															230301	30,285	4,900	0	0	0	0	EPS005	30,285	1,300	14-11	30,285	5	2,200	CCF24	30,285	1,300	0	0	0	0	0
11	PE	9515056280511001	SOTO GARCIA RAFAEL ANTONIO	1	0		S																230201	423,979	67,900	0	0	0	0	EPS008	423,979	17,000	14-11	423,979	5	29,600	CCF24	423,979	17,000	0	0	0	0	0
12	PE	9515056280511001	SOTO GARCIA RAFAEL ANTONIO	1	0		S														X		230201	484,548	58,200	0	0	0	0	EPS008	484,548	0	14-11	484,548	5	0	CCF24	484,548	0	0	0	0	0	0
13	PE	9525250000311996	LEON PANDINO DOUGLAS EDUARDO	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
14	CC	80032580	LOZADA SOLANO ADRIAN	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS044	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
15	CC	80085588	DIAZ GARCIA MAURICIO	1	0		S	X	X														230301	60,569	9,700	0	0	0	0	EPS010	60,569	2,500	14-11	60,569	5	4,300	CCF24	60,569	2,500	0	0	0	0	0
16	CC	80770022	ROBAYO MARTINEZ JORGE ARMANDO	1	0		S	X															230301	878,242	140,600	0	0	0	0	EPS017	878,242	35,200	14-11	878,242	5	61,200	CCF24	878,242	35,200	0	0	0	0	0
17	CC	85270049	CHAVEZ CARA JOSE ANGEL	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
18	CC	85272782	CHAVEZ CARA WILFRAN	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS002	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
19	CC	8531124	OYAGA ELLES JOADUIN PAULO	1	0		S	X															230301	30,285	4,900	0	0	0	0	EPS002	30,285	1,300	14-11	30,285	5	2,200	CCF24	30,285	1,300	0	0	0	0	0
20	CC	1063144976	PAEZ RAMOS SAMIR ANDRES	1	0		S																230301	423,979	67,900	0	0	0	0	EPS017	423,979	17,000	14-11	423,979	5	29,600	CCF24	423,979	17,000	0	0	0	0	0
21	CC	1063144976	PAEZ RAMOS SAMIR ANDRES	1	0		S														X		230301	484,548	58,200	0	0	0	0	EPS017	484,548	0	14-11	484,548	5	0	CCF24	484,548	0	0	0	0	0	0
22	CC	1070820760	MADARIAGA DIAZ LUIS ALFONSO	1	0		S	X															230301	30,285	4,900	0	0	0	0	EPS037	30,285	1,300	14-11	30,285	5	2,200	CCF24	30,285	1,300	0	0	0	0	0
23	CC	1088244556	URANGO JIMENEZ JESUS ALBERTO	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS037	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
24	CC	1097990226	ROBLES ARIAS RICARDO	1	0		S																230301	272,558	43,700	0	0	0	0	ESSC07	272,558	11,000	14-11	272,558	5	19,000	CCF24	272,558	11,000	0	0	0	0	0
25	CC	1097990226	ROBLES ARIAS RICARDO	1	0		S														X		230301	635,969	76,400	0	0	0	0	ESSC07	635,969	0	14-11	635,969	5	0	CCF24	635,969	0	0	0	0	0	0
26	CC	1101440563	JULIO ZARTA JOSE JAVIER	1	0		S																230201	908,526	145,400	0	0	0	0	ESSC33	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
27	CC	7224440	CEPEDA GARCIA LUIS ANTONIO	1	0		S																231001	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS010	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
28	CC	1026560062	GAMBA SANCHEZ VICTOR ALFONSO	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
29	CC	1033731804	HERNANDEZ MESA DAIRO LUIS	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
30	CC	1043842534	VALENCIA ORTEGA YHON GEIDIS	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS002	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
31	CC	1043845569	PULIDO MIRANDA HAROLD DAVID	1	0		S																230301	242,274	38,800	0	0	0	0	ESSC24	242,274	9,700	14-11	242,274	5	16,900	CCF24	242,274	9,700	0	0	0	0	0
32	CC	1043845569	PULIDO MIRANDA HAROLD DAVID	1	0		S														X		230301	656,253	80,000	0	0	0	0	ESSC24	656,253	0	14-11	656,253	5	0	CCF24	656,253	0	0	0	0	0	0
33	CC	1043949111	MARTINEZ VILLA RICHAR DEAN	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS002	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
34	CC	1045895531	NAVARRO RUIZ HEINER	1	0		S														X		231001	908,526	109,100	0	0	0	0	EPS005	908,526	0	14-11	908,526	5	0	CCF24	908,526	0	0	0	0	0	0
35	CC	1016021461	SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ANDRES	1	0		S																230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	99,500	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
36	CC	1020789946	VARGAS SOLER ALEXIS YESID	1	0		S	X															230201	878,242	140,600	0	0	0	0	EPS010	878,242	35,200	14-11	878,242	5	61,200	CCF24	878,242	35,200	0	0	0	0	0
37	CC	1024486049	DIAZ MERCADO NICOLAS MATEO	1	0		S																231001	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS002	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
38	CC	1024495549	BEDOYA RAMIREZ JAMES HUMBERTO	1	0		S																231001	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS002	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
39	CC	1024509995	DIAZ MERCADO JUAN RAFAEL	1	0		S																230301	908,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	908,526	36,400	14-11	908,526	5	63,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
40	CC	1024530831	RAMIREZ BEDOYA ALEXANDER	1	0		S														X		230301	908,526	109,100	0	0	0	0	EPS002	908,526	0	14-11	908,526	5	0	CCF24	908,526	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

092

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Obras 2	004	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-03	2021-02	E	23/03/2021	45405881	$448.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1082318449	ZAMBRANO GOMEZ UBALDO	1	0			S															230301	906,526	145,400	0	0	0	0	EPS017	906,526	36,400	14-11	906,526	5	63,300	CCF24	906,526	36,400	0	0	0	0	0
2	CC	1045695146	ZAMBRANO JIMENEZ YAMITH	1	0			S															231001	302,842	48,500	0	0	0	0	ESSC07	302,842	12,200	14-11	302,842	5	21,100	CCF24	302,842	12,200	0	0	0	0	0
3	CC	1045695146	ZAMBRANO JIMENEZ YAMITH	1	0			S									X						231001	605,684	72,700	0	0	0	0	ESSC07	605,684	0	14-11	605,684	5	0	CCF24	605,684	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-03-16, 08:27:27 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1035864045

Periodo Cotización 202102 **Periodo Servicio** 202102

Cliente:

PAGADA 2021-03-16 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ STELLA PINEDA BUSTOS				
Documento	CC 1026260474	**Dirección**	CL 63 SUR #64 - 90 APARTAMENTO 217 INT 5		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102880634		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1026260474		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					PINEDA BUSTOS LUZ STELLA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.200.000	230201		16 %	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.200.000	$ 150.000	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.200.000	$ 12.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

094

ARL | sura

Medellín, 11 de marzo de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de G&G INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C106599842 3	RICO CAÑAS MIGUEL ANGEL	12/03/2021		24251232	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/03/2021 11:06:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.185.158, 198.143.41.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4006370521	1|1|0|3|2|0|2|1

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ / B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RICO (Primer apellido)	CAÑAS (Segundo apellido)	MIGUEL (Primer nombre)	ANGEL (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1065998423	Femenino ☐ Masculino ☒	2|7|1|1|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	908600

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 3 66A 18		3102335645	MIGUELRIOCO45@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de Identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de Identidad	26. Número de Identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS AMERICAS - UOD CPO AMERICAS	VSAMERICAS - UODCPOAMER
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	NIT	901136388	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 87 17 35	3601023	GYGINGENIEROSASOCIADOS@GMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA

No de Radicacion
4006370521

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de Identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de Identificación
- ☐ 3. Actualización documento de Identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la Inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|1|0|3|2|0|2|1

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.

48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran

52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013

53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MIGUEL ANGEL RICO CAÑAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.065.998.423**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 11 de Marzo del 2021.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

QUIRÓN UNIDAD MÉDICA	QUIRÓN UNIDAD MEDICA	VER 003 FEBRERO 2018
	CERTIFICADO MEDICO LABORAL	ELABORADO POR: ALEXANDER GOMEZ REVISADO POR: SANDRA MALAGON APROBADO POR: JULIANA PINEDA

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9691 DE 24 DE AGOSTO DE 2015 DIRECCION CRA 49B 93 - 35 TEL 6940333



FECHA	2021-03-09	CIUDAD	BOGOTÁ	H DE LLEGADA	8:09 AM	H DE SALIDA	8:42 AM
NOMBRE	**MIGUEL ANGEL RICO CAÑAS**					Hemoclasificación:	**O +**
C.C No	**1065998423**	EDAD	**27 años**	IMC.	**65.2kg * 176cm: 21**		
EMPRESA	**G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS**						
CARGO	**AYUDANTE**						
EXAMEN REALIZADO							
INGRESO							

PRUEBAS DE APOYO DIAGNÓSTICO

1. Énfasis Osteomuscular

2. Agudeza Visual

RECOMENDACIONES	OPTOMETRIA	FONOAUDIOLOGIA
HABITOS DE VIDA SALUDABLE	CONTROL ANUAL	

PROG. VIG. EPIDEMILÓGICO	

CONCEPTO MEDICO

CONCEPTO MEDICO	SIN RESTRICCION PARA EL CARGO
OBSERVACIONES	SE REALIZA EXAMEN CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL /SE RECOMIENDA HIGIENE POSTURAL / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO / CAPACITAR EN EL MANEJO ADECUADO DE CARGAS / REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL / CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL OFICIO A REALIZAR / ÉNFASIS EN EL TRABAJO SEGURO/ PROTECCIÓN SOLAR ADECUADA /REALIZAR PAUSAS ACTIVAS/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROFESIOGRAMA /EL TRABAJADOR NO REFIERE SINTOMATOLOGIA OSTEOMUSCULAR NI PRESENTA ALTERACIONES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR/ El TRABAJADOR NO PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID- 19, TAMPOCO HA VIAJADO NI TIENE CONTACTO CON ALGÚN NEXO EPIDEMIOLÓGICO, POR LO QUE NO ES CONSIDERADO UNA FUENTE DE PELIGRO DE CONTAGIO, NO PRESENTA COMORBILIDADES QUE SE ASOCIAN A COMPLICACIONES DE COVID- 19.

TRABAJO EN ALTURAS		MANIPULACION DE ALIMENTOS		LEVANTAR CARGAS	SIN RESTRICCIÓN

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO PUEDE SER CONFIRMADO Y ACEPTO LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE

Dra. Silena Cotes Arias
Médica
Esp en seguridad y salud en el trabajo
C C 49 771 764
Licencia 8065 de 16/09/2009

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA Y C.C DEL TRABAJADOR

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2021-04-05, 03:40:40 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 1036652052

Periodo Cotización: febrero de 2021

Periodo Servicio: febrero de 2021

PAGADO 21/03/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	OSCAR EDUARDO VALLES MAYORGA		
Documento	CC79220093	**Dirección**	CR 8A #22 - 38 BARRIO LA CAÑADA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8211961
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 150.000	$ 0	$ 150.000
Total Pagado				$ 342.000	$ 0	$ 342.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

100

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDU

Fecha creación reporte 2021-04-06, 09:06:10 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 48854839

Periodo Cotización 202102 **Periodo Servicio** 202102

PAGADA 2021-04-06 21:04:03.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CAROLINA SERNA HERRERA				
Documento	CC 1012420278	**Dirección**	CL 72C SUR #78 C - 27		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3973021		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1012420278		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					SERNA HERRERA DIANA CAROLINA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.160.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

compensar | miplanilla.com

Identificación		Sucursal		Telefono	
Razón Social		Dirección		Fecha Pago	
Clase de Aportante		Ciudad		Periodo Salud	
Banco		No. Planilla		Periodo Pensión	
Total a Pagar		Total Intereses Mora		Estado	
Número Dias en Mora					

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar

Totales

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
	1				$275.[illegible]								[illegible]000	$275.[illegible]

Totales

INFORMACION ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar

PAGADO

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 206-1

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-03-31, 01:10:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 48736188

Periodo Cotización: marzo de 2021 **Periodo Servicio:** marzo de 2021

PAGADO 31/03/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN ARTURO CHACIN QUINTERO		
Documento	CC1126123418	**Dirección**	CL 141 #7 B - 78
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7926121
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET IP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1126123418	FABIAN ARTURO CHACIN QUINTERO	59	00	X																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 200.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400	$ 0	$ 464.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARL | sura

Medellín, 08 de marzo de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de G&G INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000002 OBRA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C100786477 6	PEREZ PALACIN CARLOS ENRIQUE	09/03/2021		r213m140	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/03/2021 15:38:40 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.146.185.158, 198.143.41.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4006352560	0|8|0|3|2|0|2|1

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las Instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado	**5. Tipo de cotizante**		**Codigo** (a registrar por la EPS) 1
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
PEREZ (Primer apellido)	PALACIN (Segundo apellido)	CARLOS (Primer nombre)	ENRIQUE (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1007864776	Femenino ☐ Masculino ☒	0|1|0|6|1|9|9|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	COLFONDOS	908600

18.Residencia

CL NELSON MANDELA SEC LOS TRUPILO MZ 3 LT 19 (Dirección)	Telefono fijo	3215861857 (Telefono celular)	CARLOSARTURO@HOTMAIL.COM (Correo electronico)
CARTAGENA (Municipio/Distrito)	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOLIVAR (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de Identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de Identidad	26. Número de Identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	UAB CARTAGENA DE INDIAS CRA. 71 - TOTAL 22 SAS PROVIDENCIA	CGNAINDIAS - TOTAL22
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	NIT	901136388	01

39.Ubicación				
CR 87 17 35 (Dirección)	3610231 (Teléfono)	GYGINGENIEROSASOCIADOS@GMAIL.COM (Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio/distrito)	BOGOTA (Departamento)

No de Radicacion
4006352560

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de Identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|8|0|3|2|0|2|1

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46.☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47.☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48.☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49.☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50.☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51.☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52.☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53.☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de Identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐ Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ENRIQUE PEREZ PALACIN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.864.776**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 8 de Marzo del 2021.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

QUIRÓN UNIDAD MÉDICA	QUIRÓN UNIDAD MEDICA	VER 003 FEBRERO 2018
	CERTIFICADO MEDICO LABORAL	ELABORADO POR: ALEXANDER GOMEZ REVISADO POR: SANDRA MALAGON APROBADO POR: JULIANA PINEDA

PRESTADOR: 1100128646 LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESOLUCION 9891 DE 24 DE AGOSTO DE 2015 DIRECCION CRA 49D 93 - 35 TEL 6940333



FECHA	2021-03-04	CIUDAD	BOGOTÁ	H DE LLEGADA	1:06 PM	H DE SALIDA	1:32 PM
NOMBRE	**CARLOS ENRIQUE PEREZ PALCIN**					Hemoclasificación:	**O +**
C.C No	**1007864776**	EDAD	**25 años**	IMC.	**61kg * 175cm: 19.9**		
EMPRESA	**G&G INGENIEROS ASOCIADOS SAS**						
CARGO	**AYUDANTE**						
EXAMEN REALIZADO							
INGRESO							

PRUEBAS DE APOYO DIAGNÓSTICO

1. Énfasis Osteomuscular

2. Agudeza Visual

RECOMENDACIONES	OPTOMETRIA	FONOAUDIOLOGIA
HABITOS DE VIDA SALUDABLE	CONTROL ANUAL	

PROG. VIG. EPIDEMILÓGICO	

CONCEPTO MEDICO

CONCEPTO MEDICO	SIN RESTRICCION PARA EL CARGO
OBSERVACIONES	SE REALIZA EXAMEN CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL /SE RECOMIENDA HIGIENE POSTURAL / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO / CAPACITAR EN EL MANEJO ADECUADO DE CARGAS / REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL / CAPACITAR EN LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL OFICIO A REALIZAR / ÉNFASIS EN EL TRABAJO SEGURO/ PROTECCIÓN SOLAR ADECUADA /REALIZAR PAUSAS ACTIVAS/ USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PROFESIOGRAMA /NO REFIERE SINTOMATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NI PRESENTA ALTERACIONES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR/EI TRABAJADOR NO PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID- 19, TAMPOCO HA VIAJADO NI TIENE CONTACTO CON ALGÚN NEXO EPIDEMIOLÓGICO, POR LO QUE NO ES CONSIDERADO UNA FUENTE DE PELIGRO DE CONTAGIO, NO PRESENTA COMORBILIDADES QUE SE ASOCIAN A COMPLICACIONES DE COVID- 19 .

TRABAJO EN ALTURAS		MANIPULACION DE ALIMENTOS		LEVANTAR CARGAS	SIN RESTRICCIÓN

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERIDICO PUEDE SER CONFIRMADO Y ACEPTO LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE REPORTE

Dra. Silena Cotes Arias
Médica
Esp en seguridad y salud en el trabajo
C C 49 771 764
Licencia 8085 de 18/04/2013

FIRMA DEL PROFESIONAL

FIRMA Y C.C DEL TRABAJADOR

ANEXO 8. VIGIA SST

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

DESARROLLO DE TEMAS DEL SG-SST

Accidentalidad: Durante lo corrido del mes de Marzo de 2021 no se presenta ningún tipo de evento de origen laboral que haya sido reportado a la ARL, las curvas de tendencia de la accidentalidad se mantienen en 0%,

Para lo corrido del mes de marzo se inician los frentes de obra de semaforización, por ende, se continua con la implementación del protocolo de bioseguridad, de acuerdo con el reporte remitido por la obra se instalan lavamanos portátiles en Ak 86 x calle 66ª, Ak 86 x av 65 bis, Ak 86 x av 64 y 63, Calle 182 x KR 50, KR 9 x calle 24 y TV 42 x calle 12

En la oficina se continua con la implementación del protocolo a cabalidad

se verifican las inspecciones realizadas en obra. Sin ninguna novedad.

Se cierra la acción correctiva del cambio de overoles por unos de mejor calidad.

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	TEMA PROPUESTO

COMPROMISOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

Fecha	26–03– 2021
Numero de acta	12
Hora de inicio	3: 00 pm
Hora finalización	05: 00 pm

ORDEN DE LA REUNIÓN

Verificación del quórum. (Se debe realizar la reunión entre el vigía de SST, el líder del SG-SST y el representante legal de la empresa)	**Cumple ___X___**	**No cumple _____**
Lectura del acta anterior (Se deben revisar los temas planteados en el acta anterior con el fin de realizar seguimiento).	**Cumple ___X____**	**No cumple _____**

Realizar seguimiento de implementación de protocolos de bioseguridad en los frentes de obra y oficina.	Profesional SST	30/04/2021
Realizar seguimiento de inspecciones	Vigía SST y Profesional SST	30/04/2021

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO FELIPE LOPEZ	VIGIA SST	
CAMILO ROSARIO	REPRESENTANTE LEGAL	

ANEXO 9. CAPACITACIONES

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN DEL SG-SST	SG-SST – 12 - 1 V02
Ingeniería & Proyectos		2/05/2017

Nombre y apellido del colaborador:	Carlos Perez			Fecha	1007864776
Cargo que desempeña	Ayudante			Documento ID	
Proyecto o área de trabajo	Semaforización			Empresa contratista	E&G
ARL	Sura	EPS	Salud Total	Fondo de pensiones	Porvenir

De acuerdo a la inducción realizada por su empresa, marque la respuesta correcta:

1. Que significan las siglas SG-SST

a) Sistemas de gestión de soporte social y de trabajo

(b) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

c) Ninguna de las anteriores

2. Mencione cúal es la actividad economica de la empresa

a) Presta servicios de mensajeria a nivel nacional e internacional

(b) Contrucción de edificaciones, adecuaciones, mantenimiento de obras, servicios de ingeniería

c) Venta y comercialización de articulos al por mayor y al detal

3. Qué es accidente de trabajo

(a) Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que desencadene en el trabajador una lesión o muerte

b) Toda lesión que me ocurra fuera de las instalaciones del trabajo o empresa

c) Toda enfermedad que me suceda como consecuencia del trabajo

4. De acuerdo a su experiencia, escriba al menos tres accidentes de trabajo le pueden ocurrir en este proyecto

GOLPES, CAIDAS

5. Que es enfermedad laboral

a) Cualquier virus que se encuentre en el ambiente de trabajo

(b) Es una patologia contraida como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

c) Cuando me encuentro laborando y siento dolor de cabeza

6. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es un ACTO INSEGURO

(a) No usar los EPP que la empresa me suministra

(b) Manipular herramienta en mal estado

(c) Trabajar en alturas sin la adecuada protección contra caidas

(d) Manipular circuitos energizados sin la respectiva protección personal

7. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es una CONDICIÓN INSEGURA


(a) Andamio en mal estado, sin los soportes ni escaleras de acceso

(b) Día soleado o día lluvioso

(c) Equipo o herramienta sin guarda de seguridad

(d) Zonas de tolerancia con potencial de robos, atracos, secuestro

8. De acuerdo al gráfico, mencione en qué consiste la política de AC2R INGENIRÍA Y PROYECTOS S.A.S



SST



NO FUMAR




NO DROGAS

9. De acuerdo a la imagen, mencione el peligro al cúal se encuentra expuesto en su sitio de trabajo.



RUIDO



QUIMICO



CARGAS



ALTURAS



ELECTRICO



SISMO

10. Cuando me suceda un accidente de trabajo, debo hacer:

(a) Aviso inmediatamente a mi jefe inmediato sobre lo que me sucedió

b) Me quedo callado, no informo nada y me aguanto el dolor

c) Me voy a la EPS para que el médico me examine

11. Si veo que un compañero está realizando un acto inseguro, que hago:

a) No le digo nada, pues no es mi problema

(b) Le digo a mi jefe inmediato o ingeniero de obra

c) Le digo a mi compañero de una forma respetuosa, la forma segura de realizar la actividad.

12. Mis responsabilidades como colaborador frente a la seguridad y salud en el trabajo son:

(a) Suministrar información clara sobre mi estado de salud

(b) Cumplir las políticas de la empresa

(c) Participar en actividades de capacitación

(d) Cuidar mi seguridad y mi salud.

13. Las responsabilidades de mi empleador son:

(a) Asignar recursos para la seguridad y salud en el trabajo

(b) Cumplir los requisitos normativos en materia de SST

(c) Asignar y documentar las responsabilidades frente al SG-SST

14. Mencione al menos 5 herramientas que utilice en el trabajo

CALA DICA PULIDORA

15. De acuerdo a la imagen, escriba para que le sirve cada EPP.


CASCO CABEZA



OJOS


OIDOS


PULMONES


MANOS


BOTAS


CAIDAS

Calificación:	Si el Colaborador tiene 6 respuestas incorrectas, deberá repetir la evaluación, pero si el colaborador tiene menos de 5 respuestas incorrectas, se realizará una retroalimentación verbal.	
Respuestas correctas.	15	Retroalimentación sobre:
Respuestas incorrectas.	0	

Firma del colaborador CARLOS

Nombre del capacitador

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN DEL SG-SST	SG-SST – 12 - 1 V02
		2/05/2017

Nombre y apellido del colaborador:	Miguel Rico	Fecha	
Cargo que desempeña	Ayudante	Documento ID	1065998423.
Proyecto o área de trabajo	Señalización	Empresa contratista	6 y 6.
ARL Sura	EPS Salud Total	Fondo de pensiones	

De acuerdo a la inducción realizada por su empresa, marque la respuesta correcta:

1. Que significan las siglas SG-SST

a) Sistemas de gestión de soporte social y de trabajo
b) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
c) Ninguna de las anteriores

2. Mencione cúal es la actividad economica de la empresa

a) Presta servicios de mensajería a nivel nacional e internacional
b) Contrucción de edificaciones, adecuaciones, mantenimiento de obras, servicios de ingeniería
c) Venta y comercialización de artículos al por mayor y al detal

3. Qué es accidente de trabajo

a) Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que desencadene en el trabajador una lesión o muerte
b) Toda lesión que me ocurra fuera de las instalaciones del trabajo o empresa
c) Toda enfermedad que me suceda como consecuencia del trabajo

4. De acuerdo a su experiencia, escriba al menos tres accidentes de trabajo le pueden ocurrir en este proyecto

caidas Golpes caidas

5. Que es enfermedad laboral

a) Cualquier virus que se encuentre en el ambiente de trabajo
b) Es una patología contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
c) Cuando me encuentro laborando y siento dolor de cabeza


6. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es un ACTO INSEGURO

a) No usar los EPP que la empresa me suministra
b) Manipular herramienta en mal estado
c) Trabajar en alturas sin la adecuada protección contra caidas
d) Manipular circuitos energizados sin la respectiva protección personal

7. De los siguientes ejemplos, marque con una X cúal considera que es una CONDICIÓN INSEGURA

a) Andamio en mal estado, sin los soportes ni escaleras de acceso
b) Día soleado o día lluvioso
c) Equipo o herramienta sin guarda de seguridad
d) Zonas de tolerancia con potencial de robos, atracos, secuestro

8. De acuerdo al gráfico, mencione en qué consiste la política de AC2R INGENIRÍA Y PROYECTOS S.A.S



SST



no fumar



no drogas

9. De acuerdo a la imagen, mencione el peligro al cúal se encuentra expuesto en su sitio de trabajo.



ruido



cemento



cargas



alturas



electrico



herramientas

10. Cuando me suceda un accidente de trabajo, debo hacer:

a) Aviso inmediatamente a mi jefe inmediato sobre lo que me sucedió

b) Me quedo callado, no informo nada y me aguanto el dolor

c) Me voy a la EPS para que el médico me examine

11. Si veo que un compañero está realizando un acto inseguro, que hago:

a) No le digo nada, pues no es mi problema

b) Le digo a mi jefe inmediato o ingeniero de obra

c) Le digo a mi compañero de una forma respetuosa, la forma segura de realizar la actividad.

12. Mis responsabilidades como colaborador frente a la seguridad y salud en el trabajo son:

a) Suministrar información clara sobre mi estado de salud

b) Cumplir las políticas de la empresa

c) Participar en actividades de capacitación

d) Cuidar mi seguridad y mi salud.

13. Las responsabilidades de mi empleador son:

a) Asignar recursos para la seguridad y salud en el trabajo

b) Cumplir los requisitos normativos en materia de SST

c) Asignar y documentar las responsabilidades frente al SG-SST

14. Mencione al menos 5 herramientas que utilice en el trabajo

Cinta Cala Pega


15. De acuerdo a la imagen, escriba para que le sirve cada EPP.


cabeza


vajos


orejas


respiración


manos


pies


varias

Calificación:	Si el Colaborador tiene 6 respuestas incorrectas, deberá repetir la evaluación, pero si el colaborador tiene menos de 5 respuestas incorrectas, se realizará una retroalimentación verbal.	
Respuestas correctas.	10	Retroalimentación sobre:
Respuestas incorrectas.	0	

Firma del colaborador Miguel Rico

Nombre del capacitador

ANEXO 10. INDICADORES

NOMBRE INDICADOR	Indicador de Proceso - Plan de Capacitación
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evalua el Proceso del SG SST en cuanto al Cumplimiento del Plan de Capacitación
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☐
AREA RESPONSABLE	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
PERIODICIDAD	Este Indicador se medira anualmente
TENDENCIA	ASCENDENTE Y DESCENDENTE

FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	VALOR DE DATA INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Cronograma de capacitación	(Numero de Capacitaciones Ejecutadas / Numero de Capacitaciones Programadas)*100	90%	Mensual	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR


PERIODO DE ANÁLISIS 2021

VARIABLES	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
Numero de Capacitaciones Ejecutadas	3	3	3	3	3	3	2					
Numero de Capacitaciones Programadas	30	3	3	3	3	3	2					

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

ANALISIS DE DATOS

GRAFICA



CARGOS QUE DEBEN CONOCER LOS RESULTADOS : ALTA DIRECCIÓN : Gerencia General y COPASST

PLANES DE ACCION INMEDIATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evaluan el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto a la frecuencia de ocurrencia de accidentes de trabajo
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	El indicador así calculado se interpreta como el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO 1- RESULTADO ☑
A QUIEN SE EVALÚA (RESPONSABLES)	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO	METODO DE CALCULO	CRITERIO META PROCESOS	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DEL INDICADOR
Base de datos de accidentalidad	(Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes /numero de trabajadores en el mes)* 100	0.05	Mensual	Representante del SGSST

MEDICIÓN DE INDICADOR

PERIODO DE ANÁLISIS: 2021

VARIABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANÁLISIS DE DATOS
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS	0	0	0	0	0	0	0						
NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES	17	22	37	30	46	22	25						
VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
VALOR REAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
META	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

GRÁFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo
INTERPRETACIÓN INDICADOR	Indicador que evaluan el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto a la severidad de los accidentes de trabajo ocurridos
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO	El indicador así calculado se interpreta como el número de días perdidos o cargados por accidentes de trabajo en el mes
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARÁ A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA	METODO DE CALCULO	META O VALOR DE REFERENCIA	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
Base de datos de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / número de trabajadores en el mes) *100	0.05	Mensual	Representante del SGSST


REPORTE DE RESULTADOS

PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
numero de trabajadores en el mes	17	22	37	30	46	22	25					
Número de días perdidos de incapacidad por accidente	0	0	0	0	0	0	0					

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
META	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Mortalidad de Accidentes de Trabajo
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Indicador que involucra el Proceso y Resultado del SG-SST en cuanto al Número de accidentes mortales ocurridos en el año
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	El indicador así calculado se interpreta como el número de AT mortales en el año
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☑ RESULTADO ☑
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	Este indicador se medirá anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META DEL INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DEL REPORTE
Base de datos de accidentalidad	(Número de accidentes mortales que se presentaron en el año / total de accidentes presentados en el año) *100	0.00	Anual	Representante del SGSST

MEDICIÓN DEL INDICADOR
PERIODO DE ANÁLISIS: 2021
ENE - DIC

VARIABLE	ENE - DIC
total de accidentes presentados en el año	0
Número de accidentes mortales que se presentaron en el año	0

VARIABLE	ENE - DIC
VALOR REAL	0.0
META	0.00

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE


SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Prevalencia de la enfermedad laboral							
DEFINICION DEL INDICADOR	Numero de casos de enfermedad laboral presentes en una poblacion en un periodo de tiempo							
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA			PROCESO			RESULTADO	☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.							
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se medira anualmente							

SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0%	Semestral	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR	
PERIODO DE ANALISIS 2011	
VARIABLES	ENE - DIC
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0
VALOR REAL	0%
META	0%

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Incidencia de enfermedad laboral
DEFINICION DEL INDICADOR	Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en una poblacion determinada en un periodo de tiempo
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este Indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE DE REPORTE
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0%	ANUAL	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	ENE - DIC
(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0
VALOR REAL	0%
META	0%

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Ausentismo por causa medica
DEFINICION DEL INDICADOR	Ausentismo es la no asistencia al trabajo por incapacidad medica
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se medira Mensual

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de dias de ausencia por incapacidad laborat o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100	0%	MENSUAL	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
(Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100	0	0	0	7	3	0	0					
	28	25	23	24	26	24	27					
VALOR REAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	342,8571	866,65367	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
META	80%											

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS


PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTOGRAFÍA No.	01
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	

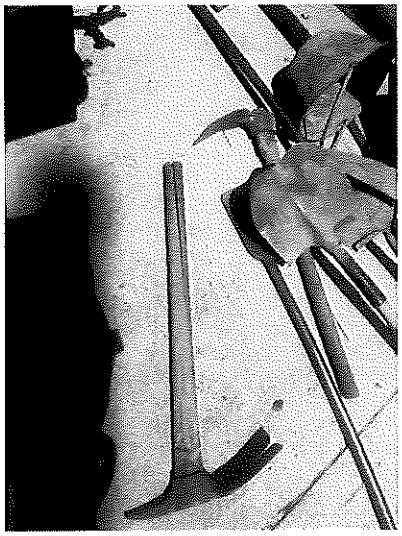


FOTOGRAFÍA No.	02
OBSERVACIONES	
DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTA	







FOTOGRAFÍA No.	03
OBSERVACIONES	
BAÑO	




FOTOGRAFÍA No.	04
OBSERVACIONES	
BAÑO	

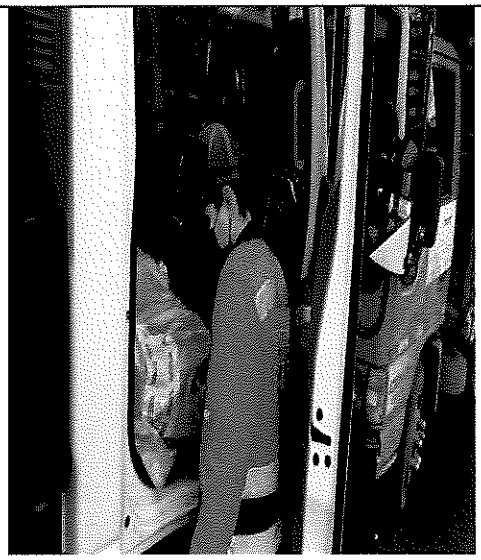			
FOTOGRAFÍA No.	05	**FOTOGRAFÍA No.**	06
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO	

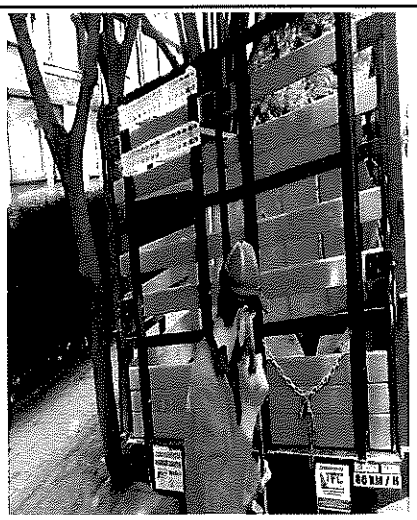
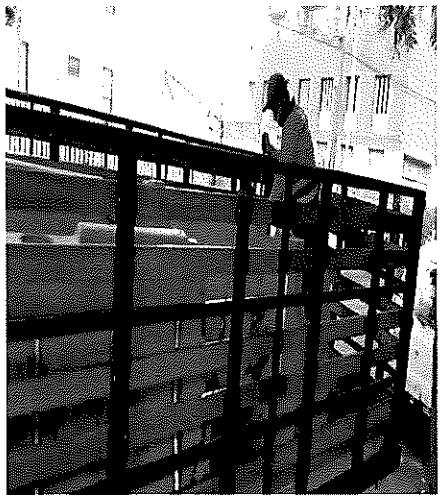
			
FOTOGRAFÍA No.	07	**FOTOGRAFÍA No.**	08
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO	

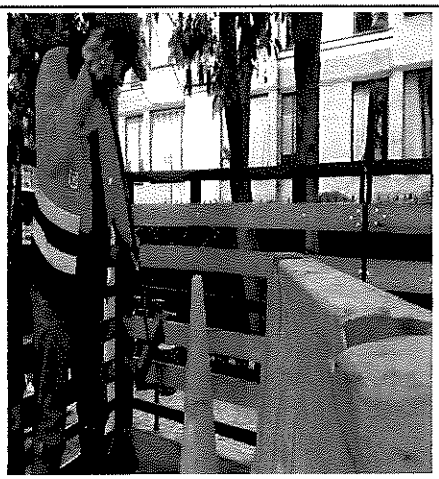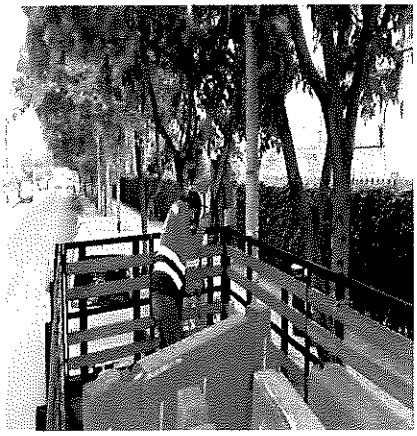			
FOTOGRAFÍA No.	09	**FOTOGRAFÍA No.**	10
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO	

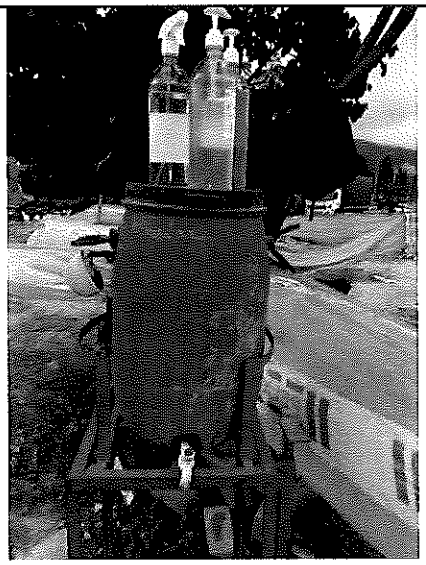
			
FOTOGRAFÍA No.	09	**FOTOGRAFÍA No.**	10
LUGAR	Kr 15 x av Boyacá	**LUGAR**	KR 21 x calle 50-51
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
LAVADO DE MANOS		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULO	

ANEXO 12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1. GESTIÓN DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.

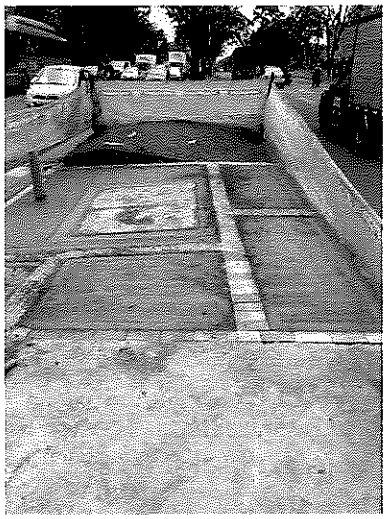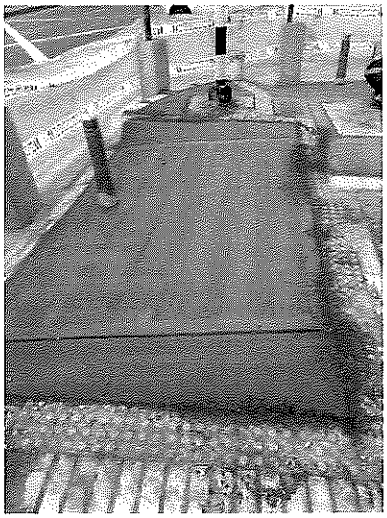
	
LUGAR: AV CALI X 65	LUGAR: AV CALI X 65
Implementación PMT	Implementación PMT


	
LUGAR: KR 50B X CLL 182	LUGAR: KR 50B X CLL 182
Implementación PMT	Implementación PMT

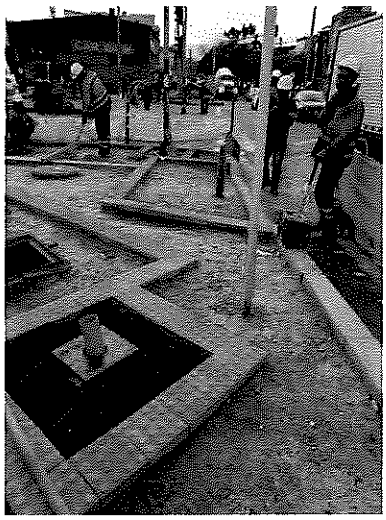
			
LUGAR	CLL 66 X AV CALI	LUGAR	CLL 23 CENTRO
Implementación PMT		Implementación PMT	

2. MANEJO DE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN



			
LUGAR	CLL 182 X KR 50	LUGAR	CLL 182 X KR 50
Almacenamiento seguro de material		Almacenamiento seguro de material	


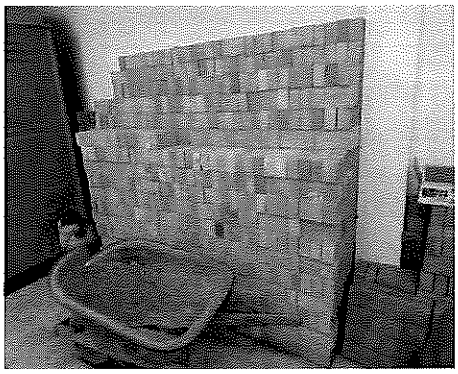
			
LUGAR	AV CALI X CLL 66	LUGAR	BODEGA
Almacenamiento seguro de material		Almacenamiento seguro de material en bodega	

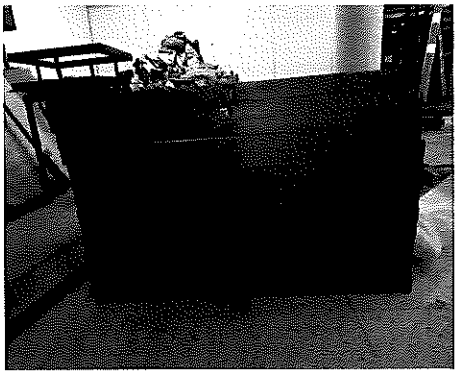			
LUGAR	BODEGA	LUGAR	BODEGA
Almacenamiento seguro de material		Almacenamiento seguro de material	

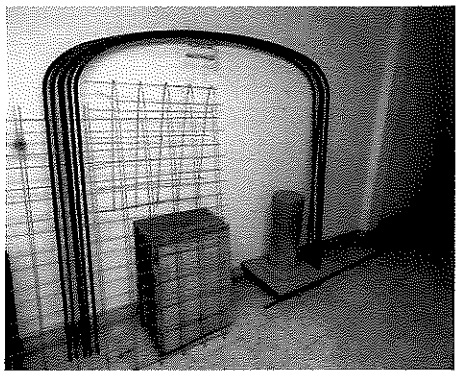			
LUGAR	BODEGA	LUGAR	BODEGA
Almacenamiento seguro de material		Almacenamiento seguro de material	

3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

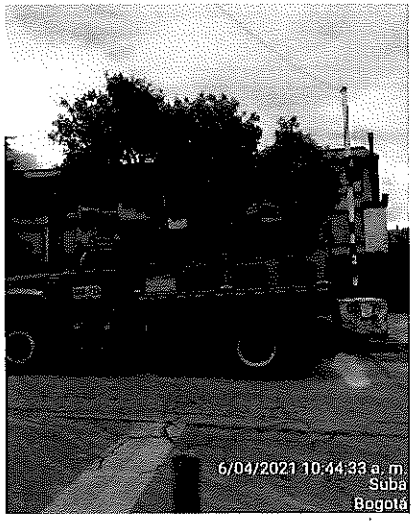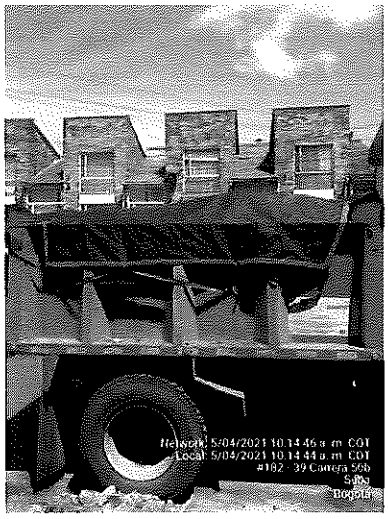			
LUGAR	KR 50B X CLL 182	LUGAR	KR 50B X CLL 182
Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados		Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados	

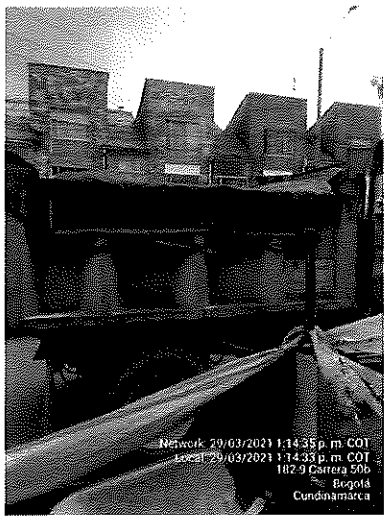	
LUGAR KR 50B X CLL 182	LUGAR KR 50 X CLL 182
Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados	Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados

4. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓNYDEMOLICIÓN

RCD APROVECHABLES - I - Residuos mezclados: 1.Residuos pétreos

			
LUGAR	AV CALI X CLL 66A	LUGAR	AV CALI X CLL 66A
Se realiza disposición en escombrera autorizada		Se realiza disposición en escombrera autorizada	


RCD APROVECHABLES - III- Otros Residuos 2. Residuos de carácter Metálico Acero, hierro, cobre, aluminio, Estaño y zinc.



FECHA	01/03/2021
LUGAR	Calle 99#61-49

Se realiza almacenamiento temporal en bodega hasta completar mínimo 20 kg

RCD NO APROVECHABLES- VI- Residuos contaminados con otros residuos Bolsas de cemento, recipientes de pintura y solventes.

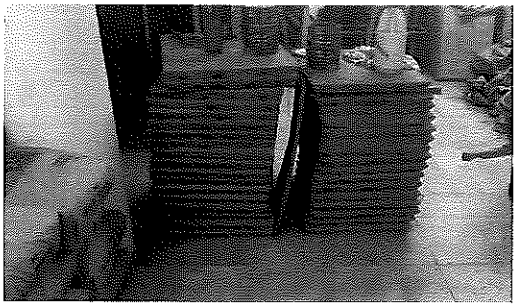


FECHA	01/03/2021
LUGAR	Calle 99#61-49


Se realiza almacenamiento temporal en bodega de tapas por demoler, posteriormente se hará disposición del material de hierro y acero


OTROS RESIDUOS - Se realiza disposición en las canecas dispuestas por la alcaldía de Bogotá para recolección de residuos.

5. REPPORTE DE RCD – APLICATIVO WEB SDA

Se realiza cargue de información del mes de Enero en aplicativo web de la SDA.

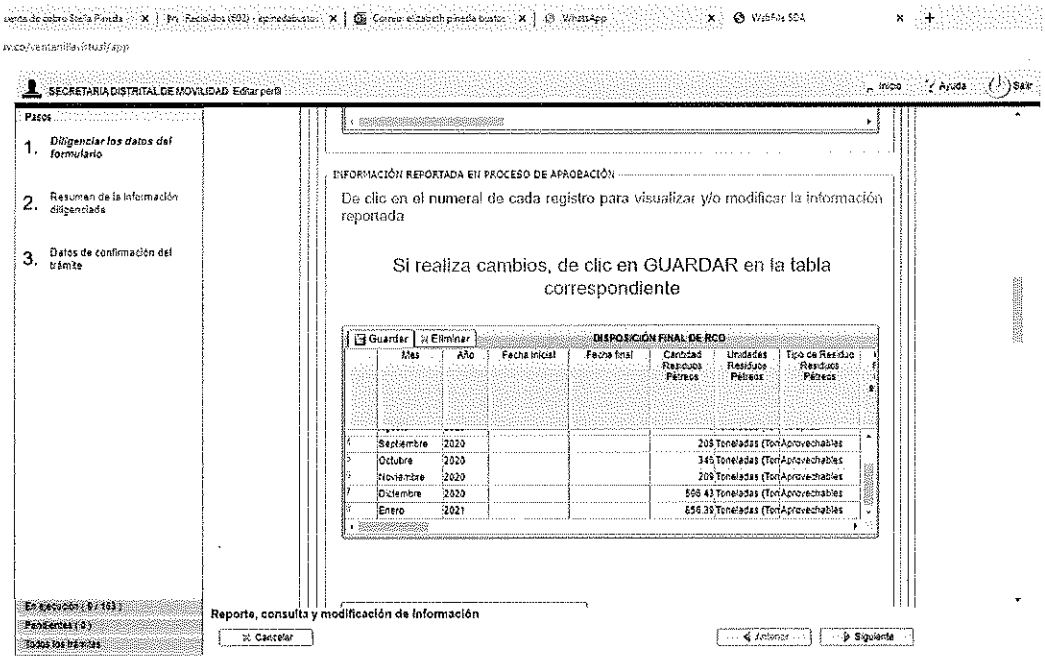

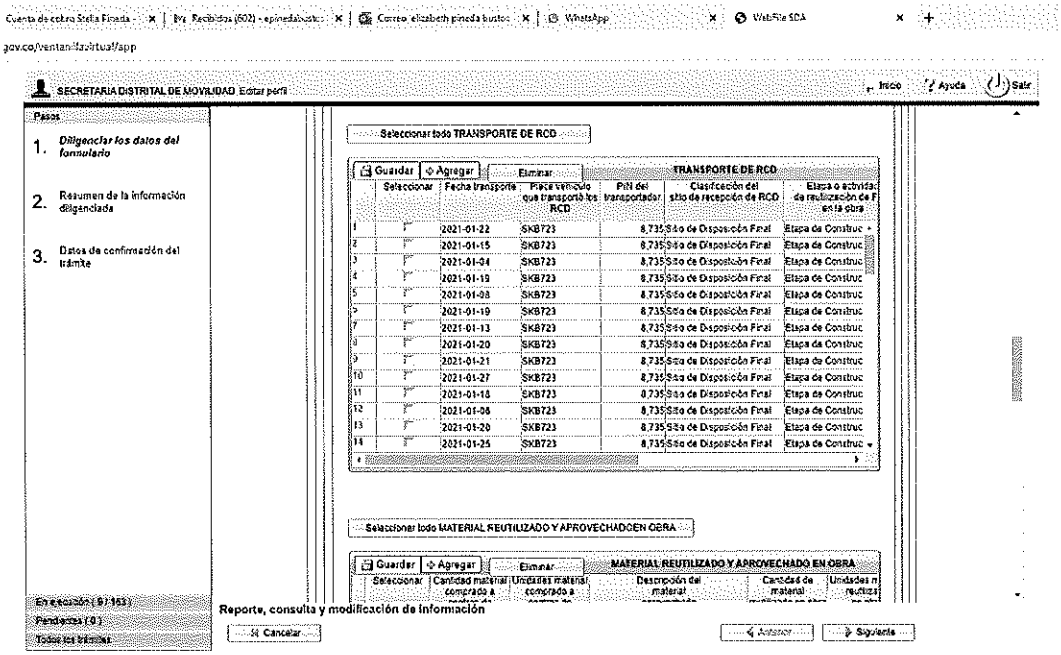

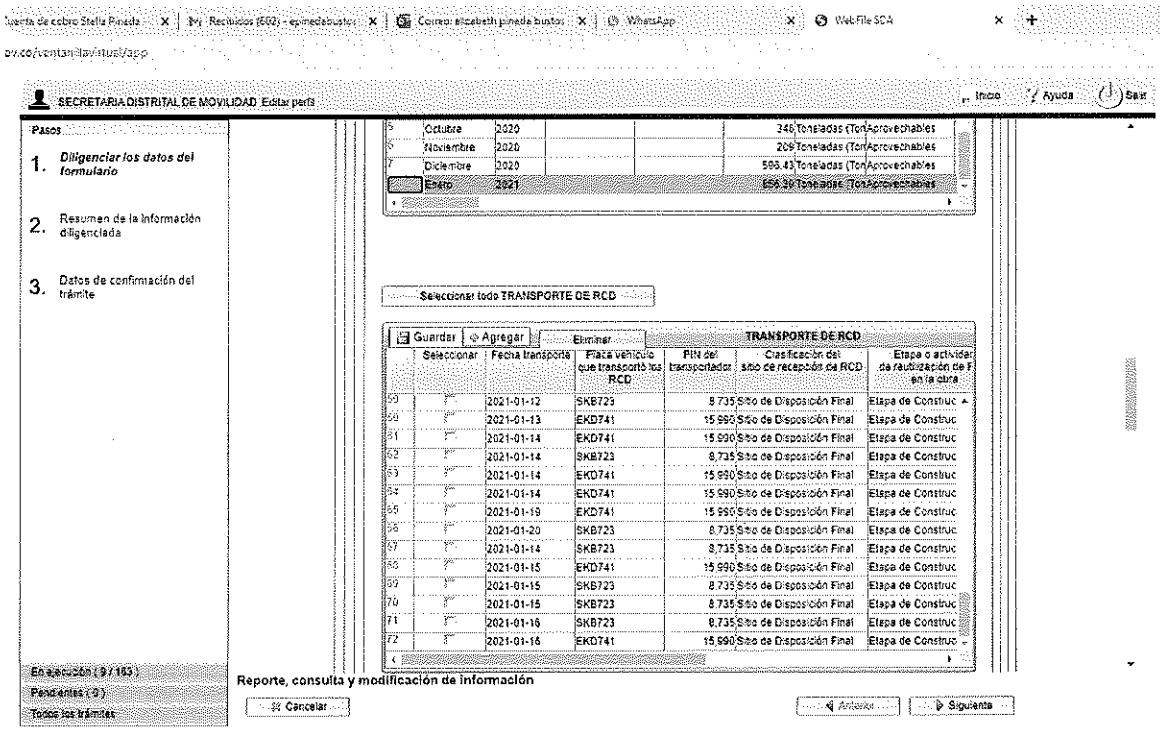

Se adjunta certificado de disposición de la escombrera Maquinas amarillas y pantallazo de la solicitud de certificados a la escombrera CEMEX sin embargo estos no han sido remitidos

Link de verificación

Certificación No.: CERT-788-2021

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcción y demolición) PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Identificada con NIT. 830123577-7, ingreso al sitio de reconformación morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 18 de febrero de 2021 hasta el día 18 de febrero de 2021, Ingresando un total de (1) Viajes, para un volúmen de SIETE M3. (7 M3) sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra CTO 2019-1874, PIN OBRA: 18616.

Id	Descripción Viaje	Total M3	Total Viajes
5	Sencillo- Demolición, Concreto, Mampostería	7,0	1,0

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 24 de marzo de 2021.

NICOLE STHEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO

YURY DAYANA OTALORA MUÑOZ
ASISTENTE DE FACTURACION

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

Gmail

Camilo andres Rosario Rubio <semaforizacionac2r@gmail.com>

Solicitud de certificados Febrero

2 mensajes

Camilo andres Rosario Rubio <semaforizacionac2r@gmail.com> 09 de marzo de 2021, 11:32
Para: Angie Katherine Pulido Buitrago <angiekatherine.pulido@cemex.com>

Cordial saludo,

Adjunto los documentos solicitados para la respectiva certificación de disposición de escombros

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

--

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 51A - 11 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1) 2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

3 adjuntos

SOLICITUD DE CERTIFICACION CEMEX 2021.pdf
68K

FOLIOS.xlsx
11K

Remisiones febrero.pdf
4361K

Camilo andres Rosario Rubio <semaforizacionac2r@gmail.com> 5 de abril de 2021, 15:12
Para: Angie Katherine Pulido Buitrago <angiekatherine.pulido@cemex.com>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

SOLICITUD DE CERTIFICACION CEMEX 2021.pdf
68K

FOLIOS.xlsx
11K

Remisiones febrero.pdf
4361K


ANEXO 13. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Elaborado por: LUZ STELLA PINTOR BUSTOS

Fecha: 17/06/2020

Ubicación: CTO OBRA 2019-1 KM 4 - DEMARCACIÓN

PROCESO	ACTIVIDAD RUTINARIA	TAREAS	TIPO DE ACTIVIDAD: RUTINARIA	TIPO DE ACTIVIDAD: NO RUTINARIA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: PELIGRO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: CLASIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: DESCRIPCIÓN	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES: ESTADO	CONTROLES EXISTENTES: MEDIDA	CONTROLES EXISTENTES: PROTOCOLO	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NO	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NP	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NIVEL NP	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NC	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NR	EVALUACIÓN DEL RIESGO: I/NR	EVALUACIÓN DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: NÚMERO DE EXPOSICIÓN	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: PEOR CONSECUENCIA	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: PEOR CONSECUENCIA (CUANTIFICABLE)	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: ELIMINACIÓN	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: SUSTITUCIÓN	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: CONTROLES DE INGENIERÍA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMIN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: EQUIPOS Y EPP
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN	TRABAJO	DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN			Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Ninguno
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Condiciones_de_Seguridad	Eléctrico	Cortes de cuchillos	Cortes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Quemaduras, Muerte	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades, capacitación sobre el uso, mantenimiento de cuchillos y uso de elementos de protección personal.	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Heridas, cortes	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Realizar capacitación sobre manejo de cuchillos y uso de elementos de protección personal. * Realizar inspección antes de iniciar actividades. * Realizar pausas activas. * Recomendar ejercicios compensatorios durante los descansos de trabajo. * Rotación a actividades que no requieran el uso de cuchillo y cutter.	Ninguno
					Biológico	Microorganismos patógenos	Microorganismos, bacterias, bacterias gram negativa	Contagio de enfermedades	Peligroso	Aislamiento social	Uso de tapabocas, cambio de camisa cada 4 horas, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.	10	3	30	ALTO	15	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte por contagio COVID 19	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de protocolos de bioseguridad	Uso de tapabocas, careta, guantes de nitrilo, gafas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.
					Fenomenos_Naturales	Tiempo	Tormenta	Lesiones osteomusculares, Golpes, Contusiones, Muerte	Ninguno	Ninguno	Evaluación de Primeros Auxilios y Camilla	2	2	4	BAJO	8	25	2	ACEPTABLE	3	Heridas, golpes, quebrantamientos,	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Continuar con las capacitaciones sobre ergonomía. * Seguir las recomendaciones emitidas en caso de emergencia o cambio bruscos del clima.	Ninguno
	OFICINA	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA			Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Ninguno
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Condiciones_de_Seguridad	Eléctrico	Cortes de cuchillos	Cortes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Quemaduras, Muerte	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cuchillos y uso de elementos de protección personal.	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Heridas, cortes	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Realizar capacitación sobre manejo de cuchillos y uso de elementos de protección personal. * Realizar inspección antes de iniciar actividades. * Realizar pausas activas. * Recomendar ejercicios compensatorios durante los descansos de trabajo. * Rotación a actividades que no requieran el uso de cuchillo y cutter.	Ninguno
					Biológico	Microorganismos patógenos	Microorganismos, bacterias, bacterias gram negativa	Contagio de enfermedades	Peligroso	Aislamiento social	Uso de tapabocas, cambio de camisa cada 4 horas, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.	10	3	30	ALTO	15	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte por contagio COVID 19	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de protocolos de bioseguridad	Uso de tapabocas, careta, guantes de nitrilo, gafas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.
					Fenomenos_Naturales	Tiempo	Tormenta	Lesiones osteomusculares, Golpes, Contusiones, Muerte	Ninguno	Ninguno	Evaluación de Primeros Auxilios y Camilla	2	2	4	BAJO	8	25	2	ACEPTABLE	3	Heridas, golpes, quebrantamientos,	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Se recomienda mantener simulacro de control de emergencias, con sus roles y primeros auxilios. * Continuar con las capacitaciones sobre ergonomía. * Seguir las recomendaciones emitidas en caso de emergencia o cambio bruscos del clima.	Ninguno
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Condiciones_de_Seguridad	Mecánico	Elementos de Maquinas	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Muerte	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación de inducción, exámenes técnicos de seguridad, Realización de medidas de seguridad, de manipulación de herramientas, maquinaria y equipos de trabajo. Uso de guías de seguridad	3	2	6	BAJO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Heridas	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Respetar las zonas señalizadas, Mantenimiento de construcciones inseguras, Capacitación en manejo de maquinaria, cargas y puntos de gravedad, Utilizar maquinaria apta para el uso, Uso de elementos de protección del cuerpo de trabajo, Establecer procedimientos para la operación de primeros auxilios.	Ninguno
					Condiciones_de_Seguridad	Mecánico	Superficies y Herramientas cortantes	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Muerte	Ninguno	Ninguno	Uso de elementos de protección personal	3	2	6	BAJO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Heridas	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las máquinas, herramientas y/o vías, supervisar y controlar el uso de las herramientas de trabajo, Capacitar en el uso de herramientas, Manuales, Leer y Diligenciar el formato de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	Uso de EPP
					Condiciones_de_Seguridad	Mecánico	Materiales Inflamables Sólidos	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Muerte	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación de inducción, exámenes técnicos de seguridad, Realización de medidas de seguridad, de manipulación de herramientas, maquinaria y equipos de trabajo. Uso de guías de seguridad	3	2	6	MEDIO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Heridas	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Respetar las zonas señalizadas, Mantenimiento de construcciones inseguras, Capacitación en manejo de maquinaria, cargas y puntos de gravedad, Utilizar maquinaria apta para el uso, Uso de elementos de protección del cuerpo de trabajo, Establecer procedimientos para la operación de primeros auxilios.	Ninguno
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, CANALIZACIONES, MUROS PARA APOYOS, MOVIMIENTO DE ESTRUCTURAS			Biológico	Microorganismos patógenos	Microorganismos, bacterias, bacterias gram negativa	Contagio de enfermedades	Peligroso	Aislamiento social	Uso de tapabocas, cambio de camisa cada 4 horas, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.	10	3	30	ALTO	15	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte por contagio COVID 19	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de protocolos de bioseguridad	Uso de tapabocas, careta, guantes de nitrilo, gafas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.
					Ruido	Ruido	Ruido Ambiental	Estrés, Trastornos del sueño, Pérdida de la audición	Controlado	Aislamiento social	Capacitación sobre el riesgo, Implementación de tapabocas, Uso de protección auditiva, Pausas activas	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Estrés, Pérdida de la audición	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación sobre el riesgo, Implementación de tapabocas, Uso de protección auditiva, Pausas activas	Ninguno
					Fenomenos_Naturales	Tiempo	Tormenta	Lesiones osteomusculares, Golpes, Contusiones, Muerte	Ninguno	Ninguno	Evaluación de Primeros Auxilios y Camilla	2	2	4	BAJO	8	25	2	ACEPTABLE	3	Heridas, golpes, quebrantamientos,	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Se recomienda mantener simulacro de control de emergencias, con sus roles y primeros auxilios. * Continuar con las capacitaciones sobre ergonomía. * Seguir las recomendaciones emitidas en caso de emergencia o cambio bruscos del clima.	Ninguno
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Biomecánico	Ergonómico	Posturas inadecuadas	Dolor muscular, Fatiga, Lesiones osteomusculares, Trastornos musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Realizar pausas activas, realizar las recomendaciones, rotación de actividades.	3	1	4	MEDIO	12	20	4	MODERADO	2	Lesiones osteomusculares, dolor muscular	25	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación sobre manejo de cargas, posturas, movimientos repetitivos, pausas activas, higiene postural, uso de EPP	Gafas antiparras, Guantes de nitrilo
					Condiciones_de_Seguridad	Eléctrico	Elementos de Maquinas	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Muerte	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación de inducción, exámenes técnicos de seguridad, Realización de medidas de seguridad, de manipulación de herramientas, maquinaria y equipos de trabajo. Uso de guías de seguridad	3	2	6	BAJO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Heridas	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Respetar las zonas señalizadas, Mantenimiento de construcciones inseguras, Capacitación en manejo de maquinaria, cargas y puntos de gravedad, Utilizar maquinaria apta para el uso, Uso de elementos de protección del cuerpo de trabajo, Establecer procedimientos para la operación de primeros auxilios.	Ninguno
					Condiciones_de_Seguridad	Mecánico	Superficies y Herramientas cortantes	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Muerte	Ninguno	Ninguno	Uso de elementos de protección personal	3	2	6	BAJO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Heridas	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las máquinas, herramientas y/o vías, supervisar y controlar el uso de las herramientas de trabajo, Capacitar en el uso de herramientas, Manuales, Leer y Diligenciar el formato de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	Uso de EPP
					Condiciones_de_Seguridad	Mecánico	Materiales Inflamables Sólidos	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Muerte	Ninguno	Ninguno	Realizar capacitación de inducción, exámenes técnicos de seguridad, Realización de medidas de seguridad, de manipulación de herramientas, maquinaria y equipos de trabajo. Uso de guías de seguridad	3	2	6	MEDIO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Heridas	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Respetar las zonas señalizadas, Mantenimiento de construcciones inseguras, Capacitación en manejo de maquinaria, cargas y puntos de gravedad, Utilizar maquinaria apta para el uso, Uso de elementos de protección del cuerpo de trabajo, Establecer procedimientos para la operación de primeros auxilios.	Ninguno
					Biológico	Microorganismos patógenos	Microorganismos, bacterias, bacterias gram negativa	Contagio de enfermedades	Peligroso	Aislamiento social	Uso de tapabocas, cambio de camisa cada 4 horas, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.	10	3	30	ALTO	15	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte por contagio COVID 19	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación de protocolos de bioseguridad	Uso de tapabocas, careta, guantes de nitrilo, gafas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, capacitación, lavado de manos cada una hora.
					Ruido	Ruido	Ruido Ambiental	Estrés, Trastornos del sueño, Pérdida de la audición	Controlado	Aislamiento social	Capacitación sobre el riesgo, Implementación de tapabocas, Uso de protección auditiva, Pausas activas	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Estrés, Pérdida de la audición	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación sobre el riesgo, Implementación de tapabocas, Uso de protección auditiva, Pausas activas	Ninguno
					Físico	Ruido	Ruido	Pérdida de la audición, Estrés, Trastornos del sueño	Peligroso	Aislamiento social	Evaluación de Primeros Auxilios y Camilla, Capacitación sobre el riesgo, Implementación de tapabocas, Uso de protección auditiva, Pausas activas	3	2	6	BAJO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Pérdida de la audición, Estrés	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Se recomienda mantener simulacro de control de emergencias, con sus roles y primeros auxilios. * Continuar con las capacitaciones sobre ergonomía. * Seguir las recomendaciones emitidas en caso de emergencia o cambio bruscos del clima.	Ninguno
					Mecánico	Vehicular	Vehiculos	Golpes, Heridas, Lesiones, Trastornos musculoesqueléticos, Quemaduras, Muerte	Ninguno	Ninguno	Uso de elementos de protección personal, capacitación sobre el uso, mantenimiento y manejo de vehículos, Realización de medidas de seguridad, de manipulación de herramientas, maquinaria y equipos de trabajo. Uso de guías de seguridad	3	2	6	BAJO	10	60	4	NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Heridas, Muerte	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos, Capacitar en el uso de vehículos, Manuales, Leer y Diligenciar el formato de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	Uso de EPP
					Psicosocial	Gestión Organizacional	Identificación de la Actividad y Tarea a Desarrollar	Estrés, Trastornos del sueño, Trastornos musculoesqueléticos, Trastornos digestivos, Trastornos cardiovasculares, Trastornos neurológicos, Trastornos de la conducta alimentaria, Trastornos mentales y del comportamiento, Síndrome de Burnout	Ninguno	Ninguno	Ninguno	3	1	4	BAJO	8	10	2	ACEPTABLE	2	Estrés	10	Ninguno	Ninguno	Ninguno	* Implementar un plan de vigilancia epidemiológica para el estrés, mediante el programa de pausas activas. * Implementar la celebración del día de la familia. * Continuar con la entrega de refrigerios durante el periodo. * Entregar a los trabajadores el formato de autoreporte de condiciones de salud. * Realizar el reglamento interno de trabajo. * Reportar el accidente de trabajo o enfermedad laboral en el formato establecido para tal fin (Ingresando a la página de la ARL). * Capacitar al personal sobre la importancia del reporte oportuno.	Ninguno

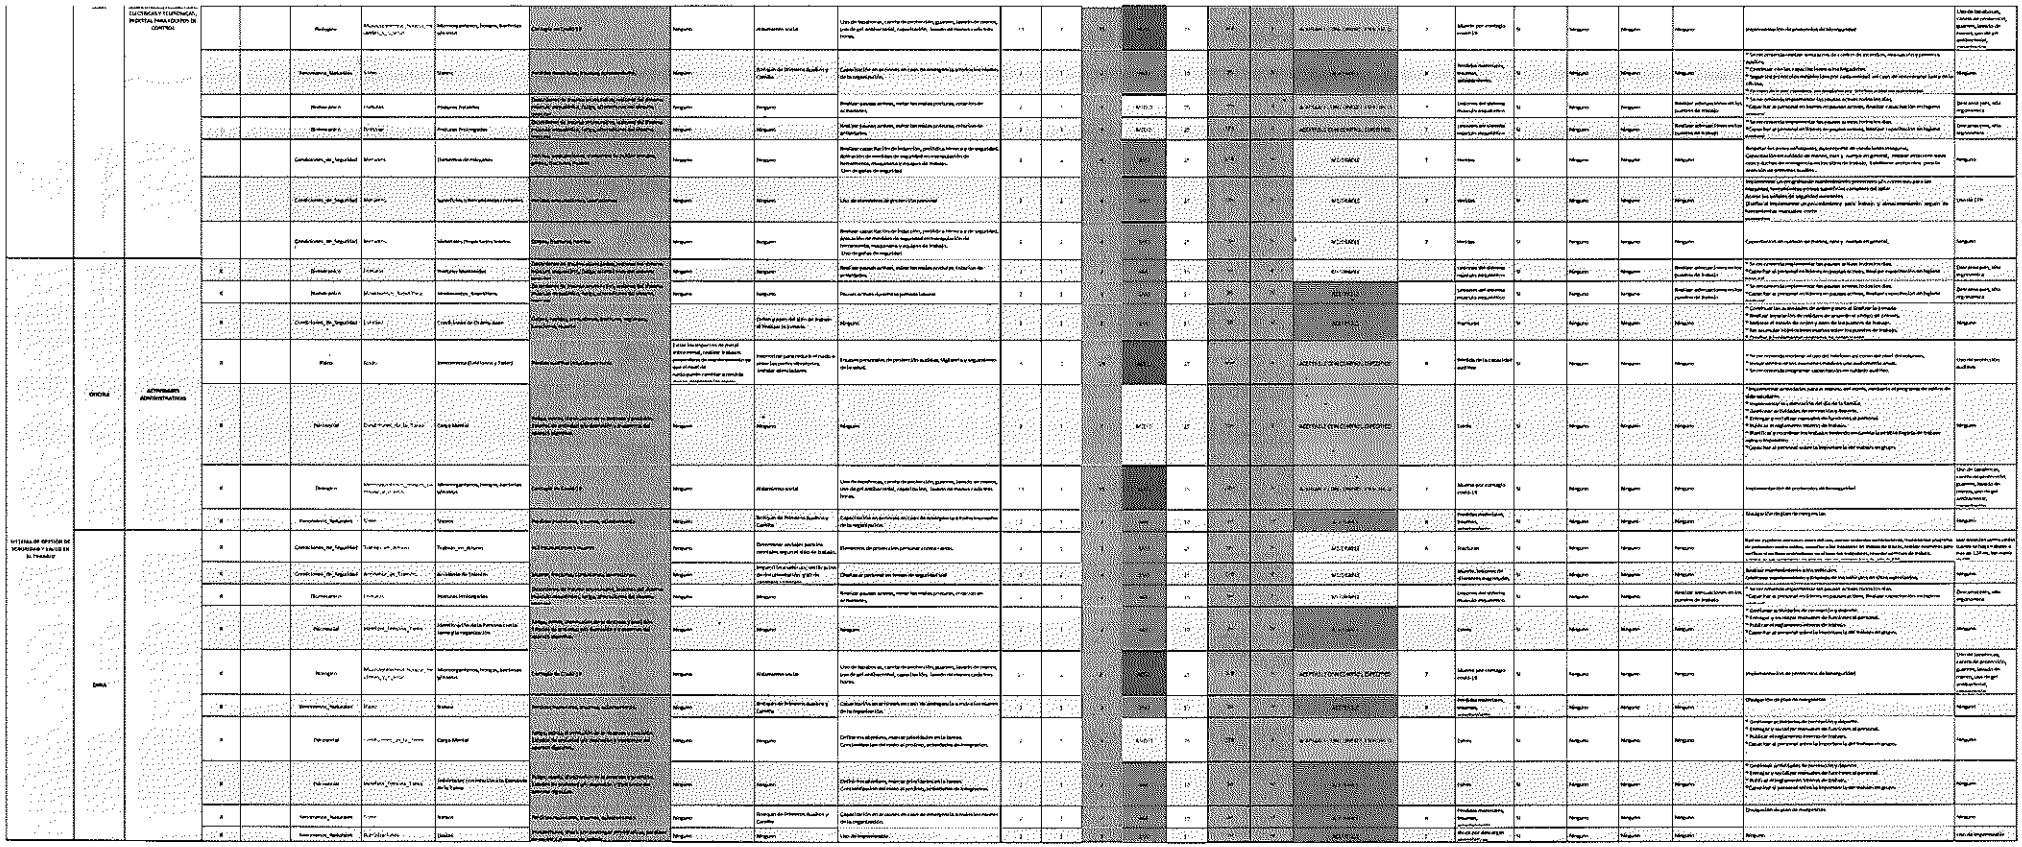

ANEXO 14. INSPECCIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código: F INS 15-7 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AB2 x SCB.	**Operador**	Miguel Rico
Marca:		**Ayudante:**	
Modelo:		**Fecha:**	24/03/2021
Serial:		**Inspector:**	Carolina Serna

Item	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓											
2	Ventilación		✓		✓											
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓											
4	Gafas de seguridad		✓		✓											
5	Protección auditiva		✓		✓											
6	Casco de seguridad		✓		✓											
7	Tapabocas		✓		✓											
8	Overol		✓		✓											
9	Botas de seguridad		✓		✓											
	Equipo															
10	Extensión electrica		✓		✓											
11	Disco de corte		✓		✓											
12	Guarda			✓		✓										
13	Manija de sujección															
14	Cracaza		✓		✓											
15	Encendido		✓		✓											
16	Cable		✓		✓											

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Miguel Rico
Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CANGURO	Código: F INS 15-11 Versión: 01 Fecha: 02/02/18

Ubicación:	Cra 50 # cll 187	**Operador**	William Chaves
Marca:		**Ayudante:**	
Modelo:		**Fecha:**	23 Marzo
Serial:		**Inspector:**	Carolina Serna

Ítem	Descripción		SEMANA													
		No Aplica	DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo				✓		✓		✓							
2	Ventilación				✓		✓		✓							
3	Superficie base granular				✓		✓		✓							
	EPP															
3	Guantes de vaqueta				✓		✓		✓							
4	Gafas de seguridad				✓		✓		✓							
5	Protección auditiva				✓		✓		✓							
6	Casco de seguridad				✓		✓		✓							
7	Tapabocas				✓		✓		✓							
8	Overol				✓		✓		✓							
9	Botas de seguridad				✓		✓		✓							
	Equipo															
10	Motor				✓		✓		✓							
11	Tanque de combustible (Sin fugas)				✓		✓		✓							
12	Palanca acelerador				✓		✓		✓							
13	filtro de aceite				✓		✓		✓							
14	valvula de drenaje				✓		✓		✓							
15	zapata				✓		✓		✓							
16	silenciador				✓		✓		✓							
17	palanca de compresion				✓		✓		✓							
18	Manilla de arranque				✓		✓		✓							
19	Manija de sujeción				✓		✓		✓							
20	Fuelle				✓		✓		✓							

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI NO ✓

Responsable Inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CANGURO	Código: F INS 15-11
		Versión: 01
		Fecha: 02/02/18

Ubicación:	9K 86 x C1166	Operador	Wilfran Chavez
Marca:		Ayudante:	Jair Javier Ruiz
Modelo:		Fecha:	28 Marzo 2021
Serial:		Inspector:	Carolina Jara

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo										✓		✓			
2	Ventilación										✓		✓			
3	Superficie base granular										✓		✓			
	EPP															
3	Guantes de vaqueta										✓		✓			
4	Gafas de seguridad										✓		✓			
5	Protección auditiva										✓		✓			
6	Casco de seguridad										✓		✓			
7	Tapabocas										✓		✓			
8	Overol										✓		✓			
9	Botas de seguridad										✓		✓			
	Equipo															
10	Motor										✓		✓			
11	Tanque de combustible (Sin fugas)										✓		✓			
12	Palanca acelerador										✓		✓			
13	filtro de aceite										✓		✓			
14	valvula de drenaje										✓		✓			
15	zapata										✓		✓			
16	silenciador										✓		✓			
17	palanca de compresion										✓		✓			
18	Manilla de arranque										✓		✓			
19	Manija de sujeción										✓		✓			
20	Fuelle										✓		✓			

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspeccion **Responsable uso**

INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR

Código: F INS 15-14
Versión: 01
Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	KR 50 x Cl 187.	Operador	Miguel Rico
Marca:	N/A	Ayudante:	Douglas Leon
Modelo:	N/A	Fecha:	23 Octubre 2021
Serial:	N/A	Inspector:	Catalina Serna

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Cabeza sin rebabas	X			
	Herramienda adecuada para la actividad	X			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	X			
	Pala afilada	X			
	Mnago de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Carretilla				
	Mangos bien fijos	X			
	Platón sin fisuras	X			
	Neumatico de llanta en buen estado	X			
	Soportes en buen estado	X			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	X			
	Palustre				
	Mango bien encabado	X			
	Borde sin filo	X			
	Cincel	X			
	Punta libre de reababas	X			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	X			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	X			
	Seguro en buen estado	X			
	Otros	X			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI / NO

Responsable inspeccion

Douglas Leon.
Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AK 86 x Cll 64 y 63.	Operador	Douglas Leon.
Marca:	N/A	Ayudante:	
Modelo:	N/A	Fecha:	8 Marzo 2021
Serial:		Inspector:	Carolina Torres.

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Cabeza sin rebabas	X			
	Herramienda adecuada para la actividad	X			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	X			
	Pala afilada	X			
	Mnago de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Carretilla	X			
	Mangos bien fijos	X			
	Platón sin fisuras	X			
	Neumatico de llanta en buen estado	X			
	Soportes en buen estado	X			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	X			
	Palustre	X			
	Mango bien encabado	X			
	Borde sin filo	X			
	Cincel	X			
	Punta libre de reababas	X			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	X			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	X			
	Seguro en buen estado	X			
	Otros	X			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspección

Douglas Leon

Responsable uso

	SPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-5
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AE 86 x 66	Operador	Douglas Leon.
Marca:		Ayudante:	
Modelo:		Fecha:	28 Marzo de 2021
Serial:		Inspector:	Carolina Serna.

Item	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓											
2	Ventilación		✓		✓											
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓											
4	Gafas de seguridad		✓		✓											
5	Protección auditiva		✓		✓											
6	Casco de seguridad		✓		✓											
7	Tapabocas		✓		✓											
8	Overol		✓		✓											
9	Botas de seguridad		✓		✓											
	Equipo															
10	Tanque de combustible		✓		✓											
11	Silenciador de escape		✓		✓											
12	Conexión a tierra		✓		✓											
13	Enchufe/conexión AC		✓		✓											
14	Filtro de aire		✓		✓											
15	Manija de arranque		✓		✓											
16	Llave de combustible		✓		✓											
17	Ahogador		✓		✓											
18	Estructura de soporte		✓		✓											
19	Bujía		✓		✓											
20	Tapa del combustible		✓		✓											
21	Interruptor automático de protección AC		✓		✓											
22	Contenedor de aceite		✓		✓											
23	Interruptor de encendido		✓		✓											

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Miguel Rico
Responsable uso

ANEXO 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Ingeniería & Proyectos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS

PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DEL MOTOR	KILOMETRAJE	FECHA	MARCA	CLASE DE VEHICULO	LINEA	CILINDRAJE	MODELO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO	DATOS DEL PROPIETARIO	TIENE SOAT	FECHA DE VIGENCIA	TIENE REVISION TECNICO-MECANICA	FECHA DE VIGENCIA	TIENE COMPARENDOS	REPORTE DE INCIDENTES	FECHA	LUGAR	AREA	FECHA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	HALLAZGOS	FECHA DE CIERRE
EA9723	06S010024			DODGE	VOLQUETA	D 400 157	6194	1980		RAFAEL ANTONIO TAPIERO	SI	6/09/2021	SI	7/09/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				
EE4744	93722155			CHEVROLET	VOLQUETA	SPARTAN EA	6000	1954		BELTRAN TAPIERO LUZ STELLA	SI	6/09/2021	SI	7/09/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				
520315	4BQGD-0045155A			HC	CAMIONETA	JEEP 1050	2672	2012		ACERO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	SI	29/04/2021	SI	11/07/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020209921

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKB723	DODGE	D 600 157	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
08G0100824	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT000119	N	DT000119	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TAPIERO RAFAEL ANTONIO	C.C. 80372291

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
83085	I	14/12/1979	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
14/08/1980	05/02/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA





LT07000152635

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2019-04-23	2019-04-30	2020-04-29

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE (CC)	MODELO
13820300019120	SKB723	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6194	1980

PASAJEROS	MARCA	LINEA
2	DODGE	D 600 157

CARROCERIA: PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
08GD100924	DT0001119		7.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TABIERO RAFAEL ANTONIO	3144443561	CC	80372281	BOGOTA D.C

CODIGO MUNICIPIO DE CIRCULACION	CLASE VEHICULO TRADICION	CLASE FABRICACION	VIA POR PEAJES	CIUDAD DE CIRCULACION
AT1929	30	164005054	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA NETA	CONTRIBUCION FONDO	TASA RUNT
320	$ 606700	$ 303950	$ 1900

TOTAL A PAGAR: $ 911950

AMPARO POR VICTIMA	SMLV	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	180	MINIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Firma del Tomador

- Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde que siempre su SOAT, los vehículos de tránsito se le pueden exigir en las vías. Recuerde:
Siempre validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
Está usted al momento en que debe reportar un hurto, ha leído SOAT tiende nuestra pólizas amparando la atención del vehículo y en caso de accidente de tránsito al cobro por todos los gastos de la atención de las víctimas del accidente.
Adquiera su SOAT en las siguientes oficinas:

En caso de accidente de tránsito:
El seguro resulta inútil, dado su alcance, por el prestador de servicio de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
Tenga presente que servicios de salud del POS nunca reparte a sus víctimas de accidentes de tránsito (artículo 167 Decreto Ley 663 de 1993). En este contexto, consulte en la Superintendencia Nacional de Salud.
Cuando los gastos médicos de la póliza SOAT, la aseguradora o el Fonpa le debe cubrir la totalidad presente de servicios de salud.
Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es necesario acudir a abogado.

Protección de datos personales:
Con la suscripción contrato de póliza y no demuestre la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, declaro que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuya responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia y transmisión nacional e internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá ejercitar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a acceder, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web aseguradoradelestado.com



CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

No. DE CONTROL 41881017

PLACA SKB723 | MARCA DODGE | LÍNEA D 600 157 | MODELO 1980

SERVICIO PUBLICO | CLASE AZUL

CARROCERIA B194 | COMBUSTIBLE DIESEL

PROPIETARIO VOLQUETA | No. IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO 08201100824 | No. CERTIFICADO RUNT C 800372291

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RAFAEL A. TAPIERO Y OTROS | No. IDENTIFICACIÓN 1A1308352

No. DE CONTROL 41881017

PLACA SKB723 | CHASIS DT0000349

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CENTRO NACIONAL DE REVISION | NIT 900081626

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO 2019 MES 05 DIA 02

FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2020 MES 05 DIA 02

FIRMA RESPONSABLE

No. IDENTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN 08-CIN-026-003

No. CERTIFICADO RUNT 1A1308352

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017911254

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EKD741	CHEVROLET	SIN LINEA	1954

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5,000	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOL QUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
937 22195	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
X	N	X	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

~~BELTRAN TAPIERO LUZ ESTELLA~~ — ~~C.C. 41760813~~

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	M/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
5058	I	26/09/1966	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/11/1967	01/03/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUNDICAJICA

LT07000019483

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2019	11	11	2019	11	12	2020	11	11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
23597924	EKD741	VOLQUETA	PARTICULAR	5000	1954

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	
	LÍNEA VEHÍCULO: SINLINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
93722195	X	NO APLICA	4.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	PRIMER NO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RAFAEL ANTONIO TAPIERO		CEDULA	80372291	


CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	3553	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 419,800	$ 209,900	$ 1,700

TOTAL A PAGAR $ 631,400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:


- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores; Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000518888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

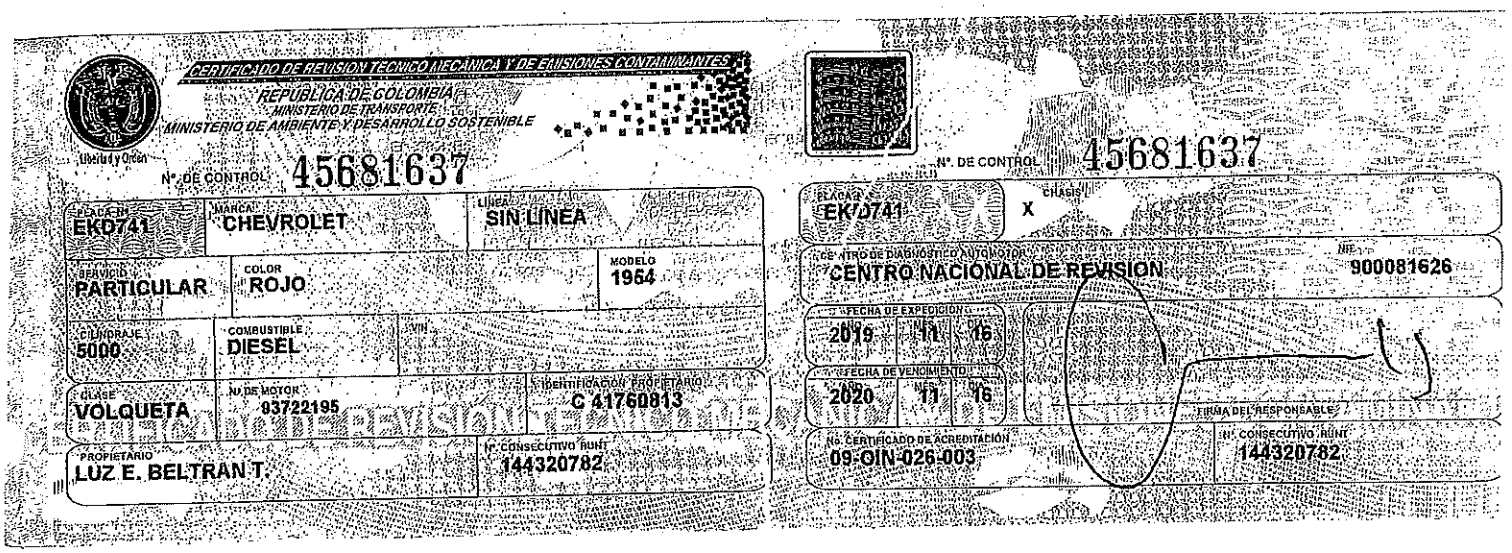

CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

N°. DE CONTROL 45681637

PLACA: EKD741
MARCA: CHEVROLET
LINEA: SIN LINEA
SERVICIO: PARTICULAR
COLOR: ROJO
MODELO: 1964
CILINDRAJE: 5000
COMBUSTIBLE: DIESEL
VIN:
CLASE: VOLQUETA
No. DE MOTOR: 93722195
IDENTIFICACION PROPIETARIO: C 41760813
PROPIETARIO: LUZ E. BELTRAN T.
Nº. CONSECUTIVO RUNT: 144320782

N°. DE CONTROL 45681637

PLACA: EKD741
CLASE: X
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR: CENTRO NACIONAL DE REVISION
NIT: 900081626
FECHA DE EXPEDICION: 2019 11 16
FECHA DE VENCIMIENTO: 2020 11 16
FIRMA DEL RESPONSABLE
No. CERTIFICADO DE ACREDITACION: 09-OIN-026-003
Nº. CONSECUTIVO RUNT: 144320782

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016284783

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZQ318	JBC	JBC 1030	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.672	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	1300

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
490QZL 0045165X	N	LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LSYCJD3R6CH000070	N	LSYCJD3R6CH000070	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — TIPO — NIT

ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS — NIT 9301[illegible]

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882011000108464

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/12/2011

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
17/01/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
20/06/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT0600141344 2

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2020-04-29	2020-04-30	2021-04-29

No.	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
300049800	SZQ318	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2672	2012

MARCA		CARROCERIA
	JBC	
LINEA VEHICULO	JBC 1030	ESTACAS

No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
L0045165X	LSYCJD3R6CH000070	LSYCJO3R6CH000070	1.30

NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NGENIERIA Y PROYECTOS SAS	3113531384	NIT	8301235777	BOGOTA D.C

ASEGURADORA	COD SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
	10	154005384	0	BOGOTA D.C

PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
$ 423300	$ 211650	$ 1700

No.	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
50	A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
	B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS LEGALES
	C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	DIARIOS
	D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	VIGENTES

FECHA

cación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos os en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de gunda) póliza expedida (expedida con posterioridad) iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la que ya se encuentra registrada en el RUNT.

ene tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

r portar siempre su SOAT las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en nomento

rifique que cuando sea requerido el RUNT

nte el incidente en que usted tenga su póliza los tenes SOAT vigente acuerde rgencias, la atención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por astos de la atención de las víctimas del accidente

ru SOAT en lugares autorizados

e accidente de tránsito

n resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención por las víctimas

prestador de servicios de salud del país puede reclamar a afectado víctima del t de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario consulte pertenencia (Ministerio de Salud

gastos médicos, el cobro lo hará la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la prestadora de servicios de salud

atender la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere contar a

Protección de datos personales

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales manifiesta que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A. para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos así como a conocer actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

4236924

SZO313 JBC JBC 1030

PUBLICO BLANCO 2012

2672 DIESEL LSYCJD3R8CH000070

CAMIONETA 490QZL 00451664 M 830123577

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 1408009913

CAR - RITS S.A.

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

NIT. 900.081.091-1

CARRERA 4 No. 16-08 ENTRADA 4 CAZUCA SOACHA

TELS: 2063644 - 11 7016 , 15 7[illegible]

4236924[illegible]

LSYCJD3R9CH000070

SZC0318

CDA CAR RITS SA

2016 03 27

2020 03 27

09-OIN-049-001

1408096913

ORIGINAL

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SZQ318

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016284783

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

JBC

LÍNEA:

JBC 1030

MODELO:

2012

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE MOTOR:

490QZL 0045165X

NÚMERO DE CHASIS:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE VIN:

LSYCJD3R6CH000070

CILINDRAJE:

2672

TIPO DE CARROCERÍA:

ESTACAS

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

17/01/2012

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
13653300049800	29/04/2020	30/04/2020	29/04/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
8028872600	21/04/2019	22/04/2019	21/04/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	NO VIGENTE
38996570	19/04/2018	20/04/2018	19/04/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
17185816	18/04/2017	19/04/2017	18/04/2018	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
17747365	17/04/2016	18/04/2016	17/04/2017	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2020	11/07/2021	PREVICAR 197	SI	147650001	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/03/2019	30/06/2020	CDA CAR PITS SA	NO	140809913	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2018	26/03/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LTDA	NO	135325989	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/03/2017	05/03/2018	CDA AVENIDA SEXTA LTDA.	NO	129720606	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/02/2016	26/02/2017	IVESUR COLOMBIA BOGOTA	NO	124619088	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

EKD741

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10017911254

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

SIN LINEA

MODELO:

1954

COLOR:

ROJO

NÚMERO DE SERIE:

X

NÚMERO DE MOTOR:

93722195

NÚMERO DE CHASIS:

X

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

5000

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

23/11/1967

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
25637762	11/11/2020	12/11/2020	11/11/2021	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE
23597924	11/11/2019	12/11/2019	11/11/2020	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
14220500000220	11/11/2018	12/11/2018	11/11/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
37073894	17/08/2017	18/08/2017	17/08/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
34068498	28/06/2016	29/06/2016	28/06/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2020	17/11/2021	CDA CAR PITS SA	SI	150056186	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/11/2019	16/11/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	144320782	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2018	17/11/2019	CDA MI CARRERA EXPRESS	NO	138648437	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/09/2017	26/09/2018	UBATEST	NO	132527013	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2016	14/01/2017	CONTROL AUTOS DE CHINQUIQUIRA	NO	124040389	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SKB723

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10020209921

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

DODGE

LÍNEA:

D 600 157

MODELO:

1980

COLOR:

AZUL

NÚMERO DE SERIE:

DT000119

NÚMERO DE MOTOR:

08G0100824

NÚMERO DE CHASIS:

DT000119

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

6194

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

14/08/1980

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
15083200055060	06/09/2020	07/09/2020	06/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
13620300013120	25/04/2019	30/04/2019	29/04/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
18792405	29/04/2018	30/04/2018	29/04/2019	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
36402488	28/04/2017	29/04/2017	28/04/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
1309149216395	29/04/2016	30/04/2016	29/04/2017	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

*Adquiera su **SOAT** en línea aquí*

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2020	07/09/2021	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	SI	148711429	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2019	30/06/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	141308352	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2018	02/05/2019	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	135809507	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2017	02/05/2018	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	130499723	SI	

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2016	02/05/2017	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	125442431	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

- Normalización y Saneamiento

- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SZQ318

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016284783

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

JBC

LÍNEA:

JBC 1030

MODELO:

2012

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE MOTOR:

490QZL 0045165X

NÚMERO DE CHASIS:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE VIN:

LSYCJD3R6CH000070

CILINDRAJE:

2672

TIPO DE CARROCERÍA:

ESTACAS

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

17/01/2012

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
13653300049800	29/04/2020	30/04/2020	29/04/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
8028872600	21/04/2019	22/04/2019	21/04/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	NO VIGENTE
38996570	19/04/2018	20/04/2018	19/04/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
17185816	18/04/2017	19/04/2017	18/04/2018	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
17747365	17/04/2016	18/04/2016	17/04/2017	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2020	11/07/2021	PREVICAR 197	SI	147650001	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/03/2019	30/06/2020	CDA CAR PITS SA	NO	140809913	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2018	26/03/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LTDA	NO	135325989	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/03/2017	05/03/2018	CDA AVENIDA SEXTA LTDA.	NO	129720606	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/02/2016	26/02/2017	IVESUR COLOMBIA BOGOTA	NO	124619088	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

EKD741

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10017911254

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

SIN LINEA

MODELO:

1954

COLOR:

ROJO

NÚMERO DE SERIE:

X

NÚMERO DE MOTOR:

93722195

NÚMERO DE CHASIS:

X

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

5000

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

23/11/1967

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
25637762	11/11/2020	12/11/2020	11/11/2021	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE
23597924	11/11/2019	12/11/2019	11/11/2020	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
14220500000220	11/11/2018	12/11/2018	11/11/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
37073894	17/08/2017	18/08/2017	17/08/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
34068498	28/06/2016	29/06/2016	28/06/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2020	17/11/2021	CDA CAR PITS SA	SI	150056186	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/11/2019	16/11/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	144320782	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2018	17/11/2019	CDA MI CARRERA EXPRESS	NO	138648437	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/09/2017	26/09/2018	UBATEST	NO	132527013	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2016	14/01/2017	CONTROL AUTOS DE CHINQUIQUIRA	NO	124040389	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SKB723

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10020209921

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

DODGE

LÍNEA:

D 600 157

MODELO:

1980

COLOR:

AZUL

NÚMERO DE SERIE:

DT000119

NÚMERO DE MOTOR:

08G0100824

NÚMERO DE CHASIS:

DT000119

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

6194

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

14/08/1980

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
15083200055060	06/09/2020	07/09/2020	06/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
13620300013120	25/04/2019	30/04/2019	29/04/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
18792405	29/04/2018	30/04/2018	29/04/2019	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
36402488	28/04/2017	29/04/2017	28/04/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
1309149216395	29/04/2016	30/04/2016	29/04/2017	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su SOAT en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2020	07/09/2021	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	SI	148711429	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2019	30/06/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	141308352	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2018	02/05/2019	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	135809507	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2017	02/05/2018	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	130499723	SI	

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2016	02/05/2017	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	125442431	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

- Normalización y Saneamiento

- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

ANEXO 16. ENTREGA DE EPP

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jose Angel Chavez	CEDULA No.	85271049
FECHA:	1 marzo 2021	CARGO Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	2 Par	Jose Angel
2						Tapabocas	4	Jose Angel
3						Gafas	1	Jose Angel
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jose Angel

CEDULA No: 85271049

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Wilfran Chavez	CEDULA No.	85272792
FECHA:	1 marzo 2021	CARGO Oficio	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	2 Par	
2						Tapabocas	4	
3						Gafas	1 Par	
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 85272792

2

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Miguel Pico	CEDULA No.	1065998423
FECHA:	12/03/2021	CARGO	Ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Overol	2	Miguel Angel
2						Tapabocas	4	Miguel Angel
3						Guantes	2 Pares	Miguel Angel
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Miguel Angel
CEDULA No:	1065 998 423

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Douglas Leon	CEDULA No.	21307158
FECHA:	11/03/2021	CARGO	Ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1 Par	x Douglas
2						Tapabocas	4	x Douglas.
3						Guantes	1 Par	Douglas.
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	x Douglas.
CEDULA No:	21307158

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ubaldo Zambrano			CEDULA No.	1002394449
FECHA:	11 Marzo 2021	CARGO	Ayudante.	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1 Par	Ubaldo
2						Tapabocas	4	Ubaldo
3						Gafas	1 Par	Ubaldo
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Ubaldo Zambrano

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	José Javier Julio Zapata			CEDULA No.	1014495583
FECHA:	11 Mar 2021	CARGO	Ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	2 Par	José Javier
2						Tapabocas	4	José Javier
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: José Javier

CEDULA No: 1.1014495583

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Rafael Soto			CEDULA No.	95159562808 1991
FECHA:	11 Marzo 2021	CARGO	Ayudante.	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Pantalon Jean	4	
2						Guantes	1 par	
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protaccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Brando Robles			CEDULA No.	1097990326
FECHA:	11 Marzo 2021	CARGO	ayudante.	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Pantalon Jean	4	
2						Guantes	1 par	
3						Guantes	1 par	
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protaccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Juan Diaz	CEDULA No.	1024[illegible]395
FECHA:	9 marzo 2021	CARGO	Oficial
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1 Par	
2						Gafas	1	
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinadas. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Carlos Perez	CEDULA No.	1000[illegible]776
FECHA:	9 mar 20 /2021	CARGO	Ayudante
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1 Par	Carlos
2						Gafas	2	Carlos
3						Tapabocas	4	Carlos
4						Botas.	1 Par	Carlos
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Carlos

CEDULA Nº 1000[illegible]776

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Estiverson Olivero	CEDULA No.	91536053
FECHA:	11 marzo	CARGO	Oficial
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	2 par	
2						Tapabocas	4	
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Fabian Chacon	CEDULA No.	1126123485
FECHA:	11 marzo	CARGO	Almacenista
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1 Par	Fabian Chacon
2						Tapabocas	4	Fabian Chacon
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Fabian Chacon

CEDULA No: 1126123485

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Arbanio Oseda			CEDULA No.	79214440
FECHA:	1 Marzo 2021	CARGO	Maestro	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1Par	
2						Tapabocas	4	
3						Overol		
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Adrian Oseche			CEDULA No.	80032500
FECHA:	1 Marzo 2021	CARGO	Maestro	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2						Guantes	1Par	
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 80032500

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jesus Cranco			CEDULA No.	1096244058
FECHA:	1 marzo 2021	CARGO	Ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Jesus
2						Blanket	2 Und	Jesus
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jesus

CEDULA No: 1096244058

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Edwin Garay			CEDULA No.	80739892
FECHA:	1 marzo 2021	CARGO	Directa obra	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 80739892

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Meliza Lanez			CEDULA No.	1077425387
FECHA:	1 Marzo 2021	CARGO	Residente	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1077425387

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Camila Gamba			CEDULA No.	1019796014
FECHA:	1 Marzo 2021	CARGO	AUX	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2							4	
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

10

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Stella Pineda			CEDULA No.	1026260494
FECHA:	1 marzo 2021	CARGO	Tecng SST	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Stella Pineda
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Stella Pineda

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Carling Yerng			CEDULA No.	1012420298
FECHA:	1 marzo 2021	CARGO	Prof SST	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

11

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Oscar Valles	CEDULA No.	79220093
FECHA:	1 Mar-2021	CARGO	Inspector	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Jogabacas	9	Oscar Valles
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Oscar Valles

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE		CEDULA No.	
FECHA:	CARGO		FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

180

ANEXO 17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Bogotá D.C. 11 de Mar20 del 2021

ACUERDO DE PRESTAMO DE BAÑO

El presente acuerdo se celebra y entra en vigor el 11 de Mar20 del 2021, hasta el día 31 de Mar20 del 2021.

ENTRE: **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.**
NIT: 830.123.577-7

Y: Hilro Humberto Forero
Bicicletera

Para que se realice el préstamo del servicio de baños al personal que trabaja en la obra ubicada en la kra 86 x calle 64, esto con el fin de que la empresa AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. garantice el servicio de baño.

JAIRO H. FORERO MARTINEZ
Nombre:
Cedula: 79277239.

Nombre: Cardina Jerna
Cedula:

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN Kra 9 x Calle 24

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque Agua	1				
2	Jabon liquido	1				
3	Gel Antibacterial	1				
4	Alcohol 70%	1				
5	Toallas Papel	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jhon Ramirez.

CEDULA No: 1.023.008.350

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque Agua	1				
2	Jabon liquido	1				
3	Gel Antibacterial	1				
4	Alcohol 70%	1				
5	Toallas Papel	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1.023.008.350 Jhon Ramirez

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN: AV Cra 86 x Cll 6 46

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de Agua	1		12 Marzo		
2	Jabón Liquido	1		12 Marzo		
3	Gel Antibacterial	1		12 Marzo		
4	Alcohol al 70%	1		12 Marzo		
5	Toallas de Papel	1		12 Marzo		
6				12 Marzo		
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 91.536.056 Fernando Olivera

Ingeniería & Proyectos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN: Calle 182 x KR 50

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Tanque de Agua		1	23 Marzo		
2	Jabón Liquido		1	23 Marzo		
3	Gel Antibacteral		1	23 Marzo		
4	Alcohol 70%		1	23 Marzo		
5	Toallas de Papel		1	23 Marzo		
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 7.929.470 Antonio Cepeda

ANEXO 18. FORMATOS CALIDAD

Ingeniería & Proyectos S.A.S	CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES	FORMATO 08
		Fecha Actualización : 30/07/2020

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	ADMINISTRATIVA	CONSECUTIVO	1
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 2019-1874 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUESTRAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."		
ELABORADO POR:	VIVIANA ALEJANDRA GARCIA AVILA		
RECIBE:	FELIPE LOPEZ		

No.	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR DEL PAGO	PROVEEDOR O BENDEFICIARIO	NIT O DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE PAGO
28	50 BOLARDOS M-63 METALICOS COLOR GRIS	$ 4.194.000	BRAKE PART N.S.C	80.166.710-5	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	025259912	
29	60 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA 3"	$ 247.251	PVCENTER	9000176749-8	EFECTIVO	N/A	N/A	
30	70 TUBO TELEFONICO TDP 3"	$ 3.912.659	PVCENTER	9000176749-8	EFECTIVO	N/A	N/A	
31	300 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA 3"	$ 1.236.255	PVCENTER	9000176749-8	EFECTIVO	N/A	N/A	
32	3000 LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO	$ 1.023.750	PANQUEBA LEAL GERMAN	3230428-6	BANCOLOMBIA	AHORROS	33213655430	14/12/2020
33	2700 LADRILLO COMUN RECOCIDO GRANDE	$ 1.869.075	PANQUEBA LEAL GERMAN	3230428-6	BANCOLOMBIA	AHORROS	33213655430	14/12/2020
34	5000 LADRILLO ADOQUIN 10X20X6 CANELO, 2000 LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO	$ 3.168.750	PANQUEBA LEAL GERMAN	3230428-6	BANCOLOMBIA	AHORROS	33213655430	18/12/2020
35	8 SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA FINA NORMAL, DESPACHO 23/11/2020	$ 2.848.000	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRANSCONCRETO SAS	901313671-4	BANCOLOMBIA	AHORROS	154000680-35	
36	6 SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA FINA NORMAL, DESPACHO 25/11/2020	$ 2.136.000	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRANSCONCRETO SAS	901313671-5	BANCOLOMBIA	AHORROS	154000680-36	
37	3,25 SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA FINA NORMAL, DESPACHO 02/12/2020	$ 1.157.000	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRANSCONCRETO SAS	901313671-5	BANCOLOMBIA	AHORROS	154000680-36	
38	TRANSPORTE DE CARGA MENOR	$ 105.000	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRANSCONCRETO SAS	901313671-5	BANCOLOMBIA	AHORROS	154000680-36	
39	14 210KFG/CM2 GRAVA FINA NORMAL 3000 PSI ZIPA	$ 3.672.794	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.337	BANCOLOMBIA	AHORROS		
40	TRANSPORTE	$ 1.311.194	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.337	BANCOLOMBIA	AHORROS		
41	4,5 210KFG/CM2 GRAVA FINA NORMAL 3000 PSI	$ 1.180.541	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.337	BANCOLOMBIA	AHORROS		
42	TRANSPORTE, TRANSPORTE ESPACIO VACIO	$ 448.566	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.337	BANCOLOMBIA	AHORROS		
43	4,5 210KFG/CM2 GRAVA FINA NORMAL 3000 PSI	$ 1.180.541	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.337	BANCOLOMBIA	AHORROS		
44	TRANSPORTE, TRANSPORTE ESPACIO VACIO	$ 448.566	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.337	BANCOLOMBIA	AHORROS		
45	6 210KFG/CM2 GRAVA FINA NORMAL 3000 PSI	$ 1.574.055	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.338	BANCOLOMBIA	AHORROS		
46	TRANSPORTE	$ 561.940	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.339	BANCOLOMBIA	AHORROS		
47	6,5 210KFG/CM2 GRAVA FINA NORMAL 3000 PSI	$ 1.705.226	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.338	BANCOLOMBIA	AHORROS		
48	TRANSPORTE	$ 608.769	MEGA CONCRETOS S.A.S	900.974.339	BANCOLOMBIA	AHORROS		
49	12 BLOQUE 20*35*80, 12 BLOQUE 20*50*80	$ 564.000	EL CONDOR	900.137.138-1	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	62435283729	
50	10 BLOQUE 20*50*60, 65 BLOQUE 20*35*80, 12 BLOQUE 20*50*80, TRANSPORTE PROD.TER	$ 2.076.112	EL CONDOR	900.137.138-1	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	62435283729	
51	40 BLOQUE 20*50*80, 150 BLOQUE 20*35*80, TRANSPORTE PROD. TER, 8 BLOQUE 20*50*60	$ 4.704.600	EL CONDOR	900.137.138-1	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	62435283729	
52	50 BOLARDO ALTO	$ 4.998.665	EL CONDOR	900.137.138-1	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	62435283729	
53	300 LOSETA LISA GRIS	$ 1.887.300	EL CONDOR	900.137.138-1	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	62435283729	
54	TRANSPORTE PROD.TER	$ 75.000	EL CONDOR	900.137.138-1	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	62435283729	
55	30 CEMENTO TIPO UG EMPACADOX 50 KG	$ 675.000	CEMENTOS TEQUENDAMA	830099238-2	DAVIVIENDA	CORRIENTE	5569999013	30/11/2020
56	CEMENTO TIPO UG EMPACADO 50 KG	$ 2.250.000	CEMENTOS TEQUENDAMA	830099238-3	DAVIVIENDA	CORRIENTE	5569999013	
57								
58								

APROBADO POR: _____





AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO 09 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30/01/2021	NOMBRE DE PROYECTO	SEMAFORIZACION	
MATERIAL	**PROVEEDOR**	**CANTIDAD**	**SOLICITANTE**	**APROBADOR/ RESPONSABLE**
TUBO 4"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
TUBO 3"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
TUBO 2"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAMPANA TERMINAL 3"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAMPANA TERMINAL 4"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CURVA	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ARENA DE PEÑA M3	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
B 600	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ARENA DE RIO	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
GRAVA	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BASE ASFALTICA	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CONCRETO 3000PSI	MEGACONCRETOS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE SARDINEL A 10 20X50X60	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE BORDILLO A 80	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE BORDILLO A 85	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO)	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO)	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
LADRILLO	LADRILLERA GRESPAN	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
MARCO SENCILLO	ACERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
PH DIRIGIDA	PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
PH NEUMATICA	PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	

TUBO GALVANIZADO DE 2 "	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
UNION DE 2" ELECTRICA	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAPACETE	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CINTA BANDIT	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAPACETE	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BOLARDO	BRAKE PART N.S.C	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CEMENTO ARGOS	EASYCEM	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CEMENTO TEQUENDAMA	CEMENTOS TEQUENDAMA	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	

VERSION 1 - V1

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO 10 RESULTADO ENSAYO DE COMPACTACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	1/02/2021	NOMBRE DEL PROYECTO	SEMAFORIZACION 2019-1874
INTERSECCION	**ESQUINA**	**FECHA DE REALIZACION**	**RESULTADOS**
AV CIUDAD CALI X CALLE 65	ANDEN ORIENTAL	20/03/2021	95,2
	ANDEN OCCIDENTAL	20/03/2021	96,7
	ANDEN ORIENTAL	20/03/2021	96,2
AV CIUDAD CALI X CALLE 65	ANDEN OCCIDENTAL	13/03/2021	95,6
	ANDEN OCCIDENTAL	13/03/2021	96,3
	ANDEN ORIENTAL	13/03/2021	97,1
AV CIUDAD CALI X CALLE 66	ANDEN NOR ORIENTAL	10/03/2021	95,3
	ANDEN NOR ORIENTAL	10/03/2021	96
	ANDEN NOR ORIENTAL	10/03/2021	90,2
	ANDEN SUR OCCIDENTAL	10/03/2021	96,1

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

VERSION 1 - V1


		INTERSECCIONES																										
MATERIAL																												
CAJA DE DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CELEMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HALETIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO 3"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO 4"	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAMPANA TERMINAL 1"	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAMPANA TERMINAL 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CURVA 1"	21	1	0	0	2	0	4	0	1	3	7	10	0	7	1	0	3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
CURVA 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARENA DE PEGA LIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALVULA COMPUERTA RECOBRIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARENA DE RIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BASE ASFALTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE BARDINET A-10 20*20*40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE ESCUDO A-10 20*20*40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE LISO NARIA A-15 20*15*40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE TRANSICION DERECHO A 10 HORNERO 20*10*30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLOQUE TRANSICION IZQUIERDO A 10 HORNERO 20*10*30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADHESIVO PEGATANK LAJAS GRIS	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOSETA TOPPING 30X30X5 A-57	2479	209	110	0	110	0	330	0	0	0	110	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LADRILLO	15419	63	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LADRILLO RECUELLE	132	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARCO DOBLE	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAPA	990	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAPA ANTIVANDALICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PH ORIGINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PH INDUSTRIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUBO GALVANIZADO DE 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JABON DE 2" ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CINTA BANDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACETE 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLARDO	215	7	10	1	23	0	10	0	3	0	0	0	0	24	0	4	4	28	65	21	0	0	0	0	0	0	0	
BASE PARA POSTE	50	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	
CEMENTO ARADO	427	1	11	1	4	0	13	0	1	17	31	17	0	65	10	0	25	15	0	10	54	103	0	4	27	0	0	
CEMENTO REFORZADO	435	2	3	0	2	0	12	0	1	15	1	24	0	59	0	0	47	10	5	3	14	47	153	0	0	59	25	0

Ingeniería & Proyectos	LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTADOS	FORMATO 17
		FECHA: 05/03/2021

MATERIALES ☐ SERVICIOS ☐ CRITICOS ☐

PROVEEDOR	PERSONA A CONTACTAR	DIRECCION	TELEFONO / FAX	MATERIAL / SERVICIO
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 4"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 3"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 2"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CAMPANA TERMINAL 3"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CAMPANA TERMINAL 4"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CURVA
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	ARENA DE PEÑA M3
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	B 600
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	ARENA DE RIO
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	GRAVA
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	BASE ASFALTICA
MEGACONCRETOS	JUAN PABLO SERNA	Cra. 80a #No. 17 21, Bogotá, Cundinamarca	3223666794	CONCRETO 3000PSI
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE SARDINEL A 10 20X50X80
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE BORDILLO A 80
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE BORDILLO A 85
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO)
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO)
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57
LADRILLERA GRESPAN	GERMAN PANQUEBA	Km 5 vía, Zipaquirá-Ubaté, Cogua, Cundinamarca	3132827442	LADRILLO
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	ACERO
PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	RICARDO DIAZ	CR 72 J BIS No 34- 17 SUR CARVAJAL	632698- 3 10 6 98 49 37	PH DIRIGIDA
PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	RICARDO DIAZ	CR 72 J BIS No 34- 17 SUR CARVAJAL	632698- 3 10 6 98 49 38	PH NEUMATICA
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	TUBO GALVANIZADO DE 2 "
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	UNION DE 2" ELECTRICA

FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CAPACETE
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CINTA BANDIT
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CAPACETE
BRAKE PART N.S.C	NANCY REYES	Calle 9a # 7a -28 Valles de Santa Ana-Soacha	321 397 30 58	BOLARDO
CEMENTO ARGOS	Sodimac Colombia S.A.	Ak 68 # 80 - 77	310 242 7373	CEMENTO ARGOS
CEMENTOS TEQUENDAMA	MONICA HERRERA		3214795700	CEMENTO TEQUENDAMA
GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	GUSTAVO SANCHEZ RUIZ	Calle 53 # 85I -93	3112158743	MANO DE OBRA
GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIRIA CIVIL	ROCARDO LARROTA MARIQUE	CALLE 42 SUR No 79F-38	3123583209	LABORATORIO DENSIDADES
ASESORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SOSTENIBLES S.A.S.	CRISTIAN ROQUEME		Christian Roqueme S.	Proveedor de diseños



	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: SEMAFORIZACION	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☐ Producto ☐ Suministro ☐ Otro	
Descripción: PROCESO CONSTRUCCIÓN	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 15 marzo de 2021

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Durante las inspecciones de seguimiento realizadas por el personal en obra no se presentaron observaciones

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☐ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO:ANALISTA DE CALIDAD	CARGO: LIDER DE CALIDAD	CARGO:
NOMBRE: ELIZABETH PINEDA	NOMBRE: MARIA CAMILA GAMBA	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	ISPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código: F INS 15-7
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	182 x 50B.	Operador	Miguel Rico
Marca:		Ayudante:	
Modelo:		Fecha:	24/03/2021
Serial:		Inspector:	Carolina Serna

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA DIA1 B	DIA1 M	DIA2 B	DIA2 M	DIA3 B	DIA3 M	DIA4 B	DIA4 M	DIA5 B	DIA5 M	DIA6 B	DIA6 M	DIA7 B	DIA7 M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓											
2	Ventilación		✓		✓											
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓											
4	Gafas de seguridad		✓		✓											
5	Protección auditiva		✓		✓											
6	Casco de seguridad		✓		✓											
7	Tapabocas		✓		✓											
8	Overol		✓		✓											
9	Botas de seguridad		✓		✓											
	Equipo															
10	Extensión electrica		✓		✓											
11	Disco de corte		✓		✓											
12	Guarda			✓		✓										
13	Manija de sujección		✓													
14	Cracaza		✓		✓											
15	Encendido		✓		✓											
16	Cable		✓		✓											

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI ✓ NO

David Salas
Responsable Inspeccion

Miguel Rico
Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CANGURO	Código: F INS 15-11
		Versión: 01
		Fecha: 02/02/18

Ubicación:	Cra 50 # cll 187	**Operador**	William chavez
Marca:		**Ayudante:**	
Modelo:		**Fecha:**	23 Marzo
Serial:		**Inspector:**	Carolina Serna

Ítem	Descripción		SEMANA													
		No Aplica	DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	Ventilación				✓	✓	✓		✓							
3	Superficie base granular				✓		✓		✓							
	EPP															
3	Guantes de vaqueta				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	Gafas de seguridad				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Protección auditiva				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	Casco de seguridad				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	Tapabocas				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	Overol				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
9	Botas de seguridad				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Equipo															
10	Motor				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
11	Tanque de combustible (Sin fugas)				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
12	Palanca acelerador				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
13	filtro de aceite				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
14	valvula de drenaje				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	zapata				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
16	silenciador				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
17	palanca de compresion				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
18	Manilla de arranque				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
19	Manija de sujeción				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
20	Fuelle				✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion **Responsable uso**

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CANGURO	Código: F INS 15-11 Versión: 01 Fecha: 02/02/18

Ubicación:	Cra 86 x Cl 16G	**Operador**	Wilfran Chavez
Marca:		**Ayudante:**	Jose David Luis
Modelo:		**Fecha:**	16 Marta Lozano
Serial:		**Inspector:**	Carolina Jaime

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6			DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M
	Condiciones del area de trabajo																
1	Orden y aseo										✓		✓				
2	Ventilación										✓		✓				
3	Superficie base granular										✓		✓				
	EPP																
3	Guantes de vaqueta										✓		✓				
4	Gafas de seguridad										✓		✓				
5	Protección auditiva										✓		✓				
6	Casco de seguridad										✓		✓				
7	Tapabocas										✓		✓				
8	Overol										✓		✓				
9	Botas de seguridad										✓		✓				
	Equipo																
10	Motor										✓		✓				
11	Tanque de combustible (Sin fugas)										✓		✓				
12	Palanca acelerador										✓		✓				
13	filtro de aceite										✓		✓				
14	valvula de drenaje										✓		✓				
15	zapata										✓		✓				
16	silenciador										✓		✓				
17	palanca de compresion										✓		✓				
18	Manilla de arranque										✓		✓				
19	Manija de sujeción										✓		✓				
20	Fuelle										✓		✓				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	**INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR**	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	KR 50 x CL 187.	**Operador**	Miguel Rico
Marca:	N/A	**Ayudante:**	Douglas leon
Modelo:	N/A	**Fecha:**	23 Marzo 2021
Serial:	N/A	**Inspector:**	Carolina Serna

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	lo Cumpl	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Cabeza sin rebabas	X			
	Herramienda adecuada para la actividad	X			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	X			
	Pala afilada	X			
	Mnago de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Carretilla				
	Mangos bien fijos	X			
	Platón sin fisuras	X			
	Neumatico de llanta en buen estado	X			
	Soportes en buen estado	X			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	X			
	Palustre				
	Mango bien encabado	X			
	Borde sin filo	X			
	Cincel	X			
	Punta libre de reababas	X			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	X			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	X			
	Seguro en buen estado	X			
	Otros	X			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Douglas leon.
Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AK 86 x Cll 69 y 63.	Operador	Douglas Leon
Marca:	N/A	Ayudante:	
Modelo:	N/A	Fecha:	8 Marzo 2021
Serial:		Inspector:	Carolina Serna

Item	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Cabeza sin rebabas	X			
	Herramienda adecuada para la actividad	X			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	X			
	Pala afilada	X			
	Mnago de madera	X			
	Mango bien encabado	X			
	Carretilla	X			
	Mangos bien fijos	X			
	Platón sin fisuras	X			
	Neumatico de llanta en buen estado	X			
	Soportes en buen estado	X			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	X			
	Palustre	X			
	Mango bien encabado	X			
	Borde sin filo	X			
	Cincel	X			
	Punta libre de reababas	X			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	X			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	X			
	Seguro en buen estado	X			
	Otros	X			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable inspección

Douglas Leon

Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-5
		Versión: 01
		Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	AK 86 x 66	Operador	Jacqueline Ram.
Marca:		Ayudante:	
Modelo:		Fecha:	28 Marzo de 2021
Serial:		Inspector:	Carolina Serna.

Item	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓											
2	Ventilación		✓		✓											
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓											
4	Gafas de seguridad		✓		✓											
5	Protección auditiva		✓		✓											
6	Casco de seguridad		✓		✓											
7	Tapabocas		✓		✓											
8	Overol		✓		✓											
9	Botas de seguridad		✓		✓											
	Equipo															
10	Tanque de combustible		✓		✓											
11	Silenciador de escape		✓		✓											
12	Conexión a tierra		✓		✓											
13	Enchufe/conexión AC		✓		✓											
14	Filtro de aire		✓		✓											
15	Manija de arranque		✓		✓											
16	Llave de combustible		✓		✓											
17	Ahogador		✓		✓											
18	Estructura de soporte		✓		✓											
19	Bujía		✓		✓											
20	Tapa del combustible		✓		✓											
21	Interruptor automático de protección AC		✓		✓											
22	Contenedor de aceite		✓		✓											
23	Interruptor de encendido		✓		✓											

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI ✓ NO

Responsable inspeccion

Miguel Rico
Responsable uso
