CONTRATO DE OBRA No. 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL No. 13

ABRIL 1 DE 2021 – ABRIL 28 DE 2021

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ARQ. MARÍA CAMILA GAMBA OSPINA	ING. MELISA JANEZ GÓMEZ PALACIOS	ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
FECHA 29 -04 -2021	FECHA: 29-04-2021	FECHA: 29-04-2021
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERÍA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

001

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2019-1874

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

BOGOTÁ D.C.
2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1 ANTECEDENTES 5
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO 6
5. ASPECTO JURÍDICO 7
6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 10
6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO 12
7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
7.1. INTRODUCCIÓN 12
7.2 OBJETIVOS 12
7.2.1 OBJETIVO GENERAL 12
7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12
7.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 13
7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO 13
7.4 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS 13
7.5 VIGIA SST 14
7.6 CAPACITACION 14
7.7 DESCRIPCION SOCIEDEMOGRAFICA 15
7.8 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 24
7.9 AGUA POTABLE Y RESIDUOS 24
7.10 CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL 25
7.11 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 25
7.12 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 25
7.13 PROGRAMA DE MANTENIENTO 25
7.14 ENTREGA DE EPP 25
7.15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 26
7.16 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26

002

8. INFORME DE OBRA 26

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 26

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE EL MES 28

9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO 66

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 66

9.2 ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PROXIMO MES 68

10. INFORME DE DISEÑO 69

11. INFORME DE CALIDAD 70

11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 71

11.3 CONTROL DE ENSAYOS 74

12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 75

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Realizar el diseño de intersecciones de acuerdo con las priorizaciones establecidas en la Entidad e indicadas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas".
- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Atender las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo de la red semafórica existente.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas" - Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

Con el objeto de contratar el diseño y construcción, de las obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento el sistema de semaforización de Bogotá D.C., incluyendo diseño semafórico de intersecciones para la implementación de nuevos controles semaforizados. Le adjudico a la empresa **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S** el contrato mediante la **Resolución N° 259 del 26 de DICIEMBRE de 2019**, cuyo objeto es: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."**

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de la red semafórica existente y donde se requiera nueva semaforización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal de la ciudad.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	01 de mayo de 2021	PERIODO No.	13	DEL	01/04/2021	HASTA	28/04/2021

OBJETO DEL CONTRATO	"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C.

CONTRATO DE OBRA	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO R.L. CC. 80.228.570 de BOGOTA CRA 71ª # 52ª -17 +57 (1) 210 9456 – 311 353 1384 Ac2ringenieria@gmail.com	
CONTRATO No.	N° 2019-1874
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de diciembre de 2019
PLAZO INICIAL:	6 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	06 de marzo de 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	05 de septiembre de 2020
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	30 de marzo de 2020 al 12 de abril de 2020
REINICIO N°1	13 de abril de 2020
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°2:	13 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020
REINICIO N°2:	5 de mayo de 2020
PLAZO FINALIZACION INICIAL:	11 de octubre de 2020
PRORROGA N°1:	4 meses
PLAZO DE FINALIZACION PRORROGA N°1 :	11 de febrero de 2021
PRORROGA N°2:	2 meses y 19 diecinueve días
PLAZO DE FINALIZACION PRORROGA N°2:	30 de abril de 2021
PERIODO DE SUSPENSION N°3:	29 de abril al 4 de mayo de 2021
REINICIO N°3	5 de mayo de 2021
PLAZO ACTUALIZADO DE FINALIZACIÓN:	6 de mayo de 2021
PERIODO TOTAL DEL CONTRATO:	6 de marzo de 2020 al 6 de mayo de 2021
PLAZO TRANSCURRIDO:	384 días | EQUIVALE AL | 99% Programado
VALOR INICIAL:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido
VALOR ADICION(ES):	-
VALOR ACTUALIZADO:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido
VALOR PAGADO:	-
VALOR POR PAGAR:	$3.160.459.988 AIU e IVA incluido
INTERVENTOR:	PIV Ingeniería S.A.S

ESTADO ACTUAL	
Presenta un desarrollo normal de las actividades según la programación	
DIAS TOTALES DEL CONTRATO:	386
DIAS TRANSCURRIDOS:	384
% DE EJECUCION	82%
DIAS DE RETRASO:	2
% DE RETRASO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	1%
DIAS DE ADELANTO:	0
% DE ADELANTO SEGÚN ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0%

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	30/03//2020

ACTA DE REINICIO N°1	13/04/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	13/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
ACTA DE INICIO DE OBRA	9/09/2020
PRORROGA N°1	7/10/2020
PRORROGA N°2	11/02/2021
ACTA DE SUSPENSION N°3	29/04/2021
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2019-1874	27/12//2019
ACTA DE INICIO	06/03/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	30/03//2020
ACTA DE REINICIO N°1	13/04/2020
ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	13/04/2020
ACTA DE REINICIO N°2	5/05/2020
PRORROGA N°1	7/10/2020
PRORROGA N°2	11/02/2021
ACTA DE SUSPENSION N°3	29/04/2021

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2019	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	27/06/2020	27/12/2020	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/06/2020	27/06/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/06/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/06/2020	27/06/2025	$948.137.996.40	APROBADO

POLIZAS ACTAS DE INICIO					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	07/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	05/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS,	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO

	PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	21/03/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	19/09/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	19/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PÓLIZA SUSPENSIÓN N°2 y REINICIACIÓN N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/04/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/10/2021	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/09/2023	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PRORROGA N°1					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	11/08/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	11/08/2021	$948.137.996.40	APROBADO

	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	11/02/2022	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	11/02/2024	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

PRORROGA N°2					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	APROBADO
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	30/04/2022	$1.264.183.995.20	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	30/04/2024	$316.045.998.80	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	APROBADO

SUSPENSION N°3					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	EN TRAMITE
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	EN TRAMITE
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	30/04/2022	$1.264.183.995.20	EN TRAMITE
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/05/2024	$316.045.998.80	EN TRAMITE
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	EN TRAMITE

SUSPENSION N°4

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	EN TRAMITE
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2020	30/10/2021	$948.137.996.40	EN TRAMITE
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	05/09/2020	30/04/2022	$1.264.183.995.20	EN TRAMITE
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESZ SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/03/2020	05/05/2024	$316.045.998.80	EN TRAMITE
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2020	05/09/2025	$948.137.996.40	EN TRAMITE

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de Inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020
Se suscribe el acta de inicio de obras	08/09/2020


EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se realizó un comité en donde se firma del Acta de Inicio.	Viernes / 06/03/2020
Se realizó la suspensión del contrato	30 /03/2020
Se realiza la reiniciación del contrato	05/05/2020
Se suscribe el acta de inicio de obras	08/09/2020

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.160.459.988		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		$ 139.207.349	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 1		$ 15.185.050	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1 OBRA Y CONSULTORIA			$ 154.392.399
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2		$ 394.281.898	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 2		$ 3.037.011	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2 OBRA Y CONSULTORIA			$ 397.318.909
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3		$300.566.299	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 3		$6.074.022	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3 OBRA Y CONSULTORIA			$306.640.321
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4		$21.259.076	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 4		$360.716.844	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 4 OBRA Y CONSULTORIA			$ 381.975.920
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5		$383.094.818	

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 5 OBRA			-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6		$ 591.404.991	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 6		$15.602.758	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 6 OBRA Y CONSULTORIA			-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7		$189.640.254	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 7		$26.649.999	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 7 OBRA Y CONSULTORIA			-
VALOR ACUMULADO COBRADO A LA FECHA			$ 2.446.720.369
VALOR ACUMULADO PAGADO A LA FECHA			$ 1.240.327.549
VALOR PENDIENTE DE PAGO		$1.206.392.820	
SUMAS IGUALES	$3.160.459.988	$3.160.459.988	$3.160.459.988

A la fecha se ha realizado la radicación de tres actas parciales de obra y dos actas de consultoría correspondientes al corte N°5, N°6 Y N°7 por valor de $1.206.392.820 que no han sido cancelados, a la fecha han sido cobrados $ 2.446.720.369 de los cuales ya se encuentran pagos a la empresa un valor total correspondiente a $1.240.327.549.

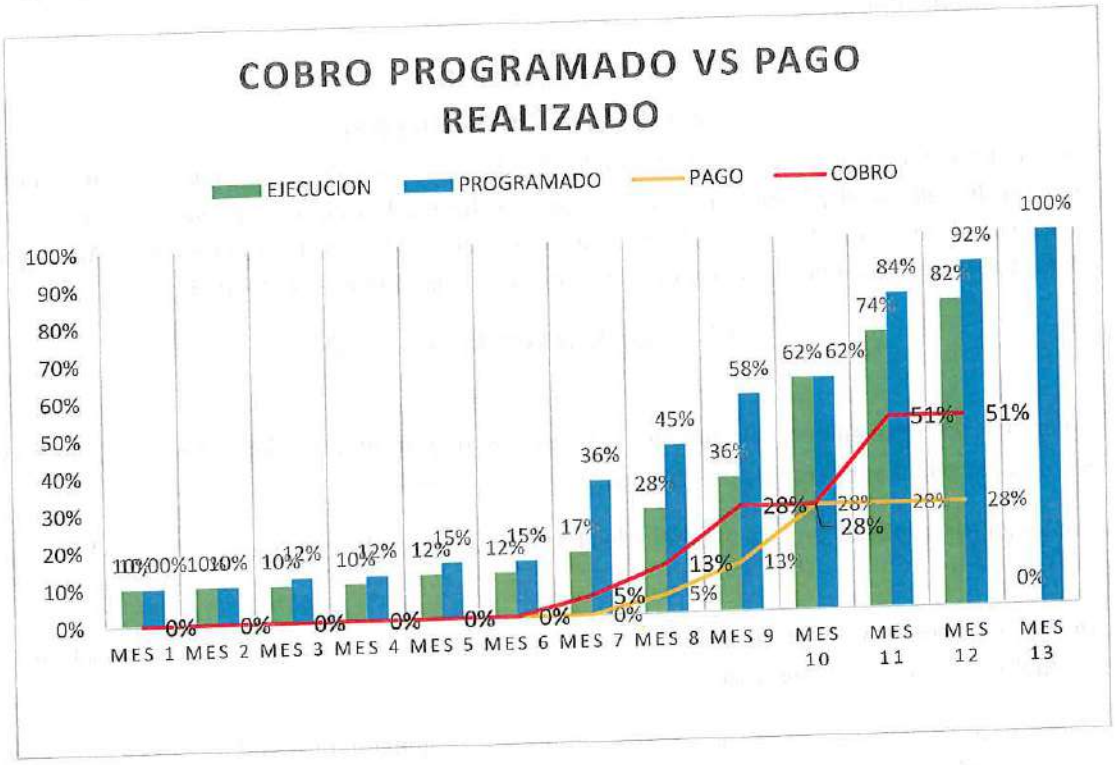

En el mes 13, el avance programado es de un 99% debido a que fueron suspendidos mediante la suspensión N° 3 dos días del contrato del 29 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, por lo que el ejecutado real para este mes es de 99%.

6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO EJECUTADO	
VALOR DE LA ACTIVIDADES TOTALES DEL CONTRATO	$ 3.160.459.988
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (%)	100%
VALOR DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$ 3.128.855.388
ACTIVIDADES EJECUTADAS (%)	99%
VALOR DE LA ACTIVIDADES EJECUTADAS	$ 3.128.855.388

7. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describen las actividades referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra N° 2019-1874 cuyo objeto es el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C

Este informe comprende las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 28 de abril de 2021.

7.2OBJETIVOS

7.2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades implementadas en los frentes de obra para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, las medias de manejo ambiental y PG – RCD acorde con los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio Ambiente en el desarrollo de las actividades propias del contrato de obra pública 2019-1874.

7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Velar por el cumplimiento el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo durante los trabajos ejecutados.

Implementar planes de mejora con el fin de identificar y mitigar los riesgos presentes en la ejecución del proyecto.

Describir las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los compromisos contractuales y la normatividad ambiental aplicable.

Verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato de obra 2019-1874.

7.3DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseño y construcción de obras civiles para nuevas intersecciones y mantenimiento de las obras civiles para el sistema de semaforización de Bogotá DC y contiene de manera general para su ejecución la Formulación y tramites de planes de manejo de tráfico, Localización, verificación y replanteo, Estudio y trazado de redes existentes, Implementación planes de manejo de tráfico, Demoliciones, Excavaciones, Perforaciones y Construcción.

7.3.1 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS O DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 28 de abril se ejecutaron actividades constructivas o de mantenimiento en las siguientes intersecciones:

- Calle 182 x KR 50B
- Kra 116 X DG 16
- TV 42 x calle 12
- Kra 9 x Calle 127
- Kra 97 x Dg 16
- Kra 50 x Calle 24
- Kra 104 x Calle 145

7.4APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

Todo el personal vinculado al contrato de obra 2019-1874 se encuentra afiliado al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS. **ANEXO 7 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

PERSONAL ADMINISTRATIVO					
N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	Edwin García	Director de Obra	Compensar	Porvenir	Positiva
2	Meliza Janes	Residente de Obra	Compensar	Colpensiones	Bolívar
3	Camila Gamba	Aux. de Ingeniería	Compensar	Porvenir	Bolívar
4	Stella Pineda	Tec. Ing. SISO	Sanitas	Protección	Bolívar
5	Carolina Serna	Profesional SST	Sura	Porvenir	Bolivar

PERSONAL OPERATIVO					
N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
6	Oscar Valles	Inspector de obra	Sanitas	Colpensiones	Bolívar
7	Adrián Useche	Maestro de obra	Medimás	Colfondos	Sura
8	Estevenson Oliveros	Oficial de obra	Famisanar	Colfondos	Sura
9	Jesús Urango	Ayudante de construcción	Nueva Eps	Porvenir	Sura

007

SUBCONTRATISTA GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS					
N°	NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
10	Douglas León	Ayudante	Nueva Eps	Protección	Sura
11	José Ángel Chávez Cañas	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
12	Juan Rafael Diaz Mercado	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
13	José Julio Zarza	Ayudante	Protección	Comparta	Sura
14	Ubaldo Zambrano	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
15	Wilfram Chávez	Oficial	Salud Total	Protección	Sura
16	Ricardo Robles	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Sura
17	Antonio Cepeda	Maestro	Sura	Colfondos	Sura
18	Carlos Pérez	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura
19	Miguel Rico	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Sura

Personal Perforaciones Horizontales

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Nelson Suarez Rodríguez	Oficial de obra	Compensar	Colpensiones	Seguros Bolívar
Rafael Antonio Suarez Romero	Operario	Salud Total	Porvenir	Seguros Bolívar
Miguel Ángel Cubillos	Operario	Salud Total	Porvenir	Seguros Bolívar
Damaso Castaño Hernández	Operario	Sura	Protección	Seguros Bolívar
Jhon Sebastián Castaño	Operario	Sura	Protección	Seguros Bolívar
William Salamanca	Operario	Sura	Porvenir	Seguros Bolívar
José Dimas Diaz	Conductor	Compensar	--	Seguros Bolívar
Euclides Rivera	Operario	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Bolívar
JUSTO PASTOR MONTAÑA	Operario	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Bolívar

7.5VIGIA SST

Se adjunta acta vigía – Abril de 2021 **ANEXO 8. VIGIA SST**

7.6CAPACITACION

De acuerdo con el cronograma de capacitación se realizaron las siguientes actividades de capacitación en obra, con las cuales se da cumplimiento del 100% a las actividades programadas.

- Trabajo en equipo
- Gestión de los RCD generados en el proyecto
- Protocolo de Bioseguridad, manejo del termómetro digital

ANEXO 9. CAPACITACION

ANEXO 10. INDICADORES


7.7 DESCRIPCION SOCIEDEMOGRAFICA

Se realiza encuesta telefónica para el perfil sociodemográfico a los trabajadores en obra y demás relacionados en el contrato. La información será actualizada mensualmente de acuerdo con los nuevos ingresos y retiros.

NOMBRE COMPLETO[49]		
respuestas	Nelson Suarez	RICARDO ROBLES
Diana Carolina Serna	Pedro Vargas	HAROLD DAVID PULIDO
Douglas Leon	Luis Giovany Hurtado	SAMIR PAEZ RAMOS
Estivenson Oliveros	Gustavo Sanchez	DAIRO LUIS HERNANDEZ
Edicxon Alvarez	Fabian Chacin	JOAQUIN OYAGA
Jose Angel Chavez	Jhon Jader Martinez	ALEXANDER RAMIREZ
Adrian Useche	Richard Martinez	ARLIN NAVAS NAVA
Juan Diaz	Jhon Valencia	WILFRAN CHAVEZ CAÑA
Omar Robelo	Hugo Oviedo	JAMES BEDOYA
Heiner Navarro	Luis Madariaga	KEVIN PEREZ RAYO
Meliza Janez	Alberto NIvar	EDER WILLIAM HURTADO
Jesus urango	Franklin Gutierrez	VICTOR ZAMBRANO
Oscar Valles	Alfonso Castro	URIEL CAMARGO
Edwin Gonzalo Garcia	Moises Gutierrez	RAFAEL SOTO
Stela Pineda	JHAN CARLOS ROJAS	NICOLAS DIAZ
Rafael suarez	REMBERTO ROJAS .	Carlos Julio Moreno Lara
	ANTONIO CEPEDA	
	YAMITH ZAMBRANO	


CARGO

49 respuestas




1. EDAD

49 respuestas




2. ESTADO CIVIL

49 respuestas




3. DATOS DE RESIDENCIA, DIRECCIÓN BARRIO Y LOCALIDAD

48 respuestas



4. ESTRATO SOCIOECONOMICO


49 respuestas





5. GRUPO ÉTNICO

49 respuestas






009


6. TURNO DE TRABAJO

49 respuestas




7. GENERO

49 respuestas




8. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO

49 respuestas




9. NIVEL DE ESCOLARIDAD

49 respuestas




10. TENENCIA DE VIVIENDA

49 respuestas



11. USO DEL TIEMPO LIBRE


49 respuestas



010


12. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.V)

49 respuestas




13. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA

49 respuestas




14. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL

49 respuestas




15. TIPO DE CONTRATACIÓN

49 respuestas




16. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

49 respuestas

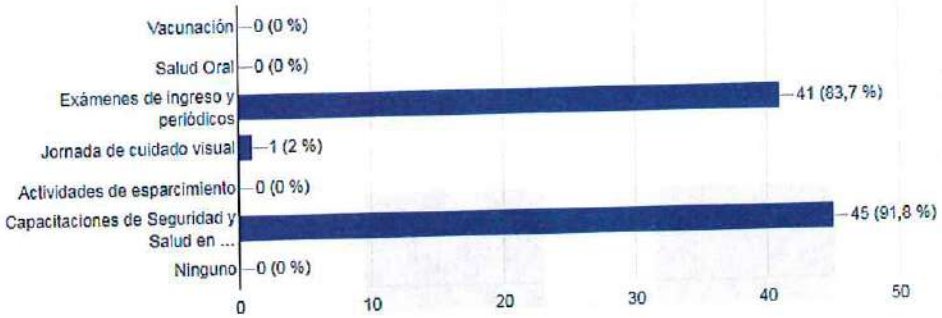

17. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD


49 respuestas



011


18. FUMA

49 respuestas




PROMEDIO DIARIO

4 respuestas




19. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

48 respuestas




CON QUE FRECUENCIA CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS

49 respuestas




20.PRACTICA ALGÚN DEPORTE

49 respuestas



CUÁL?

10 respuestas



012



7.8EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

No hay ingresos para el mes de abril no se adjuntan examen médico ocupacional del personal.

7.9AGUA POTABLE Y RESIDUOS

Se ha realizado suministro de agua potable y recolección de residuos en las intersecciones intervenidas.

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 12. DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

7.10 CONTROL DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 28 de abril de 2021 no se presentaron accidentes de trabajo.

Accidentalidad- **Anexo 10 INDICADORES**

HHT:

EMPRESA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S			
PERIODO REPORTADO	abr-21			
RESPONSABLE	STELLA PINEDA			
NUMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	5	RESUMEN		OBSERVACIONES
NUMERO DE EMPLEADOS OPERATIVOS	19	TOTAL	24	
DIAS TRABAJADOS ADMINISTRATIVOS	26	HHT	1040	
DIAS TRABAJADOS OPERATIVOS	26	HHT	3952	
TOTAL HORAS - HOMBRE - TRABAJADAS	4992	ACUMULADO	31592	

7.11 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No se han identificado peligros adicionales a los valorados inicialmente, por lo tanto, la matriz de peligros y valoración de riesgos no ha tenido actualizaciones. **ANEXO 13. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**

7.12 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2021 se implementaron las siguientes inspecciones como medidas de prevención y control

Inspección preoperacional de planta eléctrica	16/04/2021
Inspección preoperacional pulidora	05/04/2021
Inspección preoperacional de herramienta menor	07/04/2021
Inspección preoperacional de herramienta menor	27/04/2021
Inspección preoperacional de canguro	16/04/2021
Inspección preoperacional de compresor	16/04/2021

ANEXO 14. INSPECCIONES

7.13 PROGRAMA DE MANTENIENTO

Se adjuntan los documentos de los vehículos que ingresaron a operación en el mes de septiembre como seguimiento al programa de mantenimiento de vehículos. **ANEXO 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO**

7.14 ENTREGA DE EPP

Se realiza entrega de EPP a todo el personal

ANEXO 16. ENTREGA DE EPP

013

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Se implementa protocolo de bioseguridad en los fretes de trabajo abiertos entre el 01 de abril y el 28 de abril de 2021. Se adjuntan los siguientes soportes **ANEXO 17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD**

- Registro de temperatura
- Convenio alquiler de baños
- Entrega de EPP . **ANEXO 16.**
- Entrega de kits de bioseguridad
- Registro fotográfico.

7.16 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se realiza implementación de las fichas de manejo ambiental y socialización de las medidas de manejo. **ANEXO 12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

8. INFORME DE OBRA

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

8.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 51 (DEL 29 MARZO AL 4 ABRIL DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	KR 50 X CALLE 182	1.	Se realiza conformación de base granular costados nor occidental y nororiental.	70%
		2.	Se realiza instalación de cenefa y toperol costados nor occidental y nororiental.	
		3.	Se realiza ensayo de densidades costados nor- occidental y nor-oriental.	
		4.	Se realiza construcción de andenes en concreto costados nor- occidental y nor-oriental.	
		5.	Se realiza construcción de bases para postes semaforizados costados nor- occidental y nor-oriental.	
2.	KR 9 X CALLE 127	1.	Se realizan perforaciones horizontales costados occidental-oriental.	10%
		2.	Se realiza excavaciones de apique separador y costado occidental.	
		3.	Se realizan perforaciones costado separador- occidental.	
3.	KR 104 X AC 145	1.		80%
4.	KR 50 X CL 24	1.		60%
5.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo de obra.	5%
6.	TV 42 X CL 12	1.		35%
7.	KR 9 X CL 23	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%

8.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°52 (DEL 5 ABRIL AL 11 ABRIL DE 2021)

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

1.	KR 50 X CALLE 182	1.	Se realiza conformación en base granular costados sur occidental y sur oriental.	90%
		2.	Se realiza limpieza de sitios intervenidos.	
2.	KR 9 X CALLE 127	1.	Se realiza construcción de cajas dobles y sencillas costado occidental.	10%
		2.	Se realiza demolición de anden costado occidental.	
		3.	Se realiza demolición y excavación del terreno costado occidental.	
		4.	Se realiza conformación de base granular costados occidental y separador.	
		5.	Se realiza instalación de redes de 3" en ambos costados.	
		6.	Se realiza construcción de andenes en concreto costado occidental.	
		7.	Se realizan bases para semáforos costado occidental.	
		8.	Se realiza ensayo de densidades costado occidental.	
4.	KR 12 X TV 42	1.	Se realiza construcción de cajas costados nor-oriental sur -oriental.	35%
4.	KR 104 X AC 145	1.		80%
5.	KR 50 X CL 24	1.		60%
6.	KR 13 X CL 57	1.	Se realiza replanteo de obra.	5%
7.	KRA 116 X DG 16	1.		10%

8.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°53 (DEL 12 ABRIL AL 18 ABRIL DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	KR 104 X AC 145	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
2.	KR 12 X TV 42	1.	Se realiza construcción de cajas costado nor-occidental.	45%
		2.	Se realiza instalación de ductos de 3" costado sur occidental y nor oriental.	
		3.	Se realiza demolición de anden concreto costado nor oriental.	
		4.	Se realiza instalación de ductos de 3" costado nororiental.	
		5.	Se realiza conformación de terreno en base granular costados nororiental, suroriental.	
		6.	Se realiza instalación de cenefa y toperol costado sur oriental.	
		7.	Se realiza demolición de anden concreto costado noroccidental.	
		8.	Se realiza instalación de cenefa y toperol costado sur oriental y nor oriental.	
		9.	Se realiza ensayo de densidades costados sur oriental, nor oriental y nor occidental.	
		10.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI costados sur oriental, nor oriental y nor occidental.	
4.	KR 50 X CL 24	1.		90%
5.	KR 50B X CL 182	2.		99%
6.	KR 9 X CL 127	3.		99%
7.	KRA 116 X DG 16	1.		30%

8.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°54 (DEL 19 ABRIL AL 28 ABRIL DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	KR 116 X DG 16	1.	Se realizan perforaciones horizontales costados sur-norte.	30%
		2.	Se realiza perforación horizontal costados nor-occidental y sur-occidental.	

01

		3.	Se realiza construcción de cajas costados occidental-oriental.	
		4.	Se realiza instalación de ductos costados occidental-oriental.	
		5.	Se realizan excavaciones para instalación de ductos 3" para conectar cajas de paso costado sur-norte.	
		6.	Se realiza construcción de cajas dobles y sencillas costado sur, oriental, norte, oriental.	
2.	KR 12 X TV 42	1.	Se realiza ensayo de densidades costados sur oriental, nor oriental y nor occidental.	75%
		2.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI costados sur oriental, nor oriental y nor occidental.	
		3.	Se realiza construcción de anden concreto 300 PSI costado sur oriental.	
		4.	Se realiza ensayo de densidades costado sur oriental.	
		5.	Se realiza construcción anden concreto 3000 PSI costado sur oriental.	
		6.	Se realiza conformación de terreno pen base granular costado sur oriental.	
		7.	Se realiza conformación de terreno costados sur oriental.	
		8.	Se realiza demolición de anden concreto costado sur oriental.	
		9.	Se realiza conformación de anden concreto costado sur oriental.	
		10.	Se realiza instalación de cenefa costado oriental.	
4.	KR 104 X AC 145	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
5.	KR 50 X CL 24	2.		90%
6.	KR 50B X CL 182	3.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
7.	KR 9 X CL 127	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
8.	KRA 97 X AC 16	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%

8.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°55 (DEL 26 ABRIL AL 28 ABRIL DE 2021)

INTERSECCIÓN		ACTIVIDAD		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1.	KR 116 X DG 16	1.	Se realiza excavación para instalación de ductos 3" costados sur norte.	65%
2.	KR 12 X TV 42	1.	Se realiza construcción de anden concreto 3000 PSI costado sur oriental.	98%
		2.	Se realiza construcción de bases para semáforos costado sur oriental.	
		3.	Se realiza ensayo de densidades costado sur oriental.	
4.	KR 104 X AC 145	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
4.	KR 50 X CL 24	2.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
5.	KR 50B X CL 182	3.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
6.	KR 9 X CL 127	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%
7.	KR 9 X CL 23	1.	Se terminan actividades y se realiza aseo general de la obra.	100%

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE EL MES

TV 42 X CLL 12



Fotografía N°1



Fotografía N°2



Fotografía N°3



Fotografía N°4



Fotografía N°5



Fotografía N°6

015



Fotografía N°7



Fotografía N°8



Fotografía N°9



Fotografía N°10



Fotografía N°11



Fotografía N°12



Fotografía N°13



Fotografía N°14



Fotografía N°15



Fotografía N°16



Fotografía N°17



Fotografía N°18

016



Fotografía N°19



Fotografía N°20



Fotografía N°21



Fotografía N°22



Fotografía N°23



Fotografía N°24



Fotografía N°25



Fotografía N°26



Fotografía N°27



Fotografía N°28



Fotografía N°29



Fotografía N°30



Fotografía N°31



Fotografía N°32



Fotografía N°33



Fotografía N°34



Fotografía N°35




Fotografía N°36



Fotografía N°37



Fotografía N°38

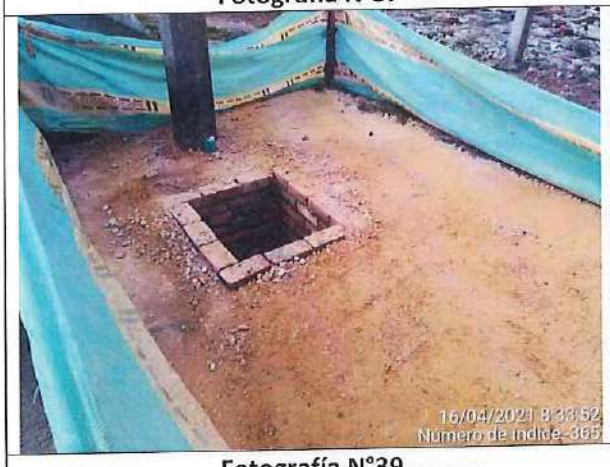

Fotografía N°39



Fotografía N°40



Fotografía N°41



Fotografía N°42

018



Fotografía N°43



Fotografía N°44



Fotografía N°45



Fotografía N°46



Fotografía N°47



Fotografía N°48



Fotografía N°49




Fotografía N°50



Fotografía N°51



Fotografía N°52

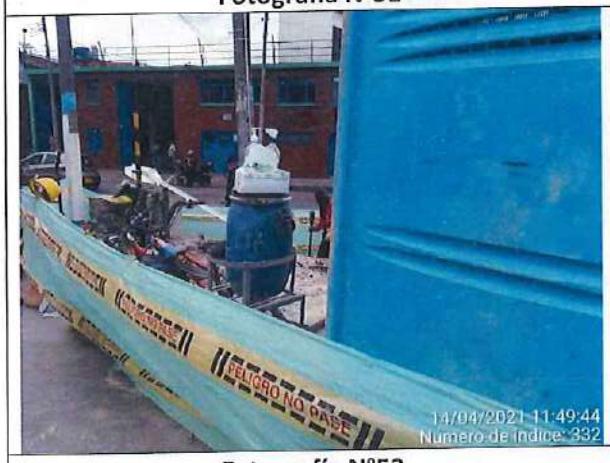

Fotografía N°53



Fotografía N°54



Fotografía N°55



Fotografía N°56



Fotografía N°57



Fotografía N°58



Fotografía N°59



Fotografía N°60



Fotografía N°61



Fotografía N°62



Fotografía N°63



Fotografía N°64



Fotografía N°65



Fotografía N°66



Fotografía N°67

KR 50 x CLL 182



Fotografía N°68



Fotografía N°69



Fotografía N°70



Fotografía N°71



Fotografía N°72



Fotografía N°73



Fotografía N°74



Fotografía N°75



Fotografía N°76



Fotografía N°77

021



Fotografía N°78



Fotografía N°78



Fotografía N°80



Fotografía N°81



Fotografía N°82



Fotografía N°83



Fotografía N°84



Fotografía N°85



Fotografía N°86



Fotografía N°87



Fotografía N°88



Fotografía N°89



Fotografía N°90



Fotografía N°91



Fotografía N°92



Fotografía N°93



Fotografía N°94



Fotografía N°95



Fotografía N°96



Fotografía N°97



Fotografía N°98



Fotografía N°99



Fotografía N°100



Fotografía N°101



Fotografía N° 102



Fotografía N°103



Fotografía N° 104



Fotografía N°105



Fotografía N° 106



Fotografía N°107



Fotografía N° 108



Fotografía N°109



Fotografía N° 110



Fotografía N°111



Fotografía N° 112



Fotografía N°113



Fotografía N° 114



Fotografía N°115



Fotografía N° 116



Fotografía N°117



Fotografía N° 118



Fotografía N°119



Fotografía N° 120



Fotografía N°121



Fotografía N° 122



Fotografía N°123



Fotografía N° 124



Fotografía N°125

KR 9 X CLL 127



Fotografía N° 126



Fotografía N°127



Fotografía N° 128



Fotografía N°129



Fotografía N° 130



Fotografía N°131



Fotografía N° 132



Fotografía N°133



Fotografía N° 134



Fotografía N°135



Fotografía N° 136



Fotografía N°137



Fotografía N° 138



Fotografía N°139



Fotografía N° 140



Fotografía N° 141



Fotografía N°142



Fotografía N°143



Fotografía N°144



Fotografía N°145



Fotografía N°146



Fotografía N°147



Fotografía N°148



Fotografía N°149



Fotografía N°150



Fotografía N°151



Fotografía N°152



Fotografía N°153



Fotografía N°154



Fotografía N°155



Fotografía N°156



Fotografía N°157




Fotografía N°158



Fotografía N°159



Fotografía N°160

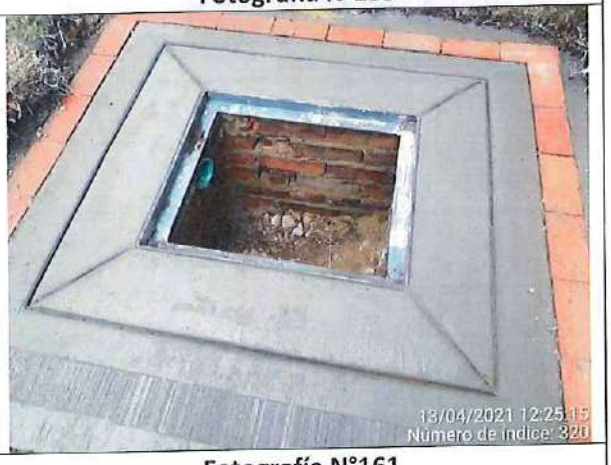

Fotografía N°161

028



Fotografía N°162



Fotografía N°163



Fotografía N°164



Fotografía N°165

AK 50 X CL24



Fotografía N°166



Fotografía N°167



Fotografía N°168



Fotografía N°169



Fotografía N°170



Fotografía N°171

029



Fotografía N°172



Fotografía N°173



Fotografía N°174



Fotografía N°175



Fotografía N°176



Fotografía N°177



Fotografía N°178



Fotografía N°179



Fotografía N°180



Fotografía N°181



Fotografía N°182



Fotografía N°183

030



Fotografía N°184



Fotografía N°185



Fotografía N°186



Fotografía N°187



Fotografía N°188



Fotografía N°189



Fotografía N°190



Fotografía N°191



Fotografía N°192



Fotografía N°193



Fotografía N°194



Fotografía N°195



Fotografía N°196



Fotografía N°197



Fotografía N°198



Fotografía N°199

CLL 116 X DG 16



Fotografía N°200



Fotografía N°201



Fotografía N°202



Fotografía N°203




Fotografía N°204



Fotografía N°205



Fotografía N°206

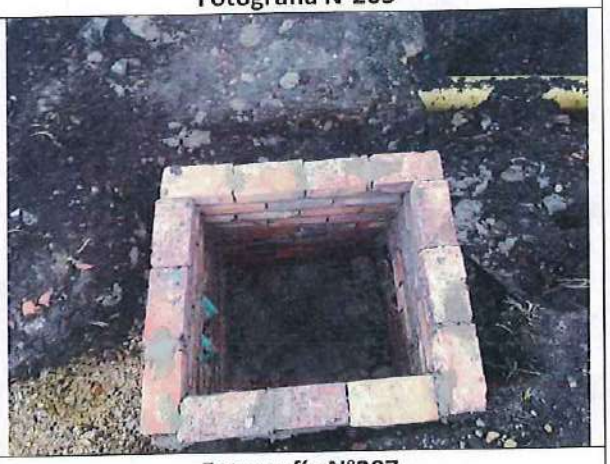

Fotografía N°207



Fotografía N°208



Fotografía N°209



Fotografía N°210



Fotografía N°211



Fotografía N°212



Fotografía N°213



Fotografía N°214



Fotografía N°215



Fotografía N°216



Fotografía N°217



Fotografía N°218

9. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

9.1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEMANA N°51 (DEL 29 MARZO AL 4 ABRIL DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11		
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06		
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08		
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA			
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09		
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021	
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM		
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021	
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021

9.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°52 (DEL 5 ABRIL AL 11 ABRIL DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	17/03/2021	18/03/2021	
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				

45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM	9/04/2021		
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM			
				8/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021	
				8/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA			

9.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°53 (DEL 12 ABRIL AL 18 ABRIL DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM	9/04/2021		
58			AK 104 X AC 145	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			
60			KR 50 X CL 24	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			

9.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°54 (DEL 19 ABRIL AL 25 ABRIL DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM			
58			AK 104 X AC 145	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA	29/03/2021	29/03/2021	
61			KRA 97 X AV CENTENARIO	20/04/2021 21/04/2021	RADICADO SDM E INTERVENTORIA COOS EMERGENCIA			

9.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N°55 (DEL 26 ABRIL AL 28 ABRIL DE 2021)

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES
				Fecha	Radicado		
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM	9/04/2021	
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021	
58			AK 104 X AC 145	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA		
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021	
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021 8/04/2021 09/04/2021	RADICADO SDM PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA	29/03/2021	29/03/2021
61			KRA 97 X AV CENTENARIO	20/04/2021 21/04/2021	RADICADO SDM E INTERVENTORIA COOS EMERGENCIA		

9.2 ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PROXIMO MES

Realizar la aprobación y atención de observaciones de los diseños de las siguientes direcciones:

1. KRA 78 X CL 40 SUR
2. KRA 116ª X DG 16
3. KRA 23 C X CL 64 SUR
4. CRA 70 X CL 103
5. CRA 97 X CL 23F

10. INFORME DE DISEÑO

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020 28/04/2021	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020 28/04/2021	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
29	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020 14/04/2021 23/04/2021	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021 20/04/2021		17/04/2021 21/04/2021 23/04/2021	14/12/2020 5/03/2021 30/04/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
30	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021 6/04/2021 19/04/2021 23/04/2021	28/04/2021 17/04/2021		6/04/2021	9/03/2021 16/03/2021 9/04/2021 19/04/2021 29/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
31	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 29/03/2021 28/04/2021	29/03/2021 5/04/2021 28/04/2021		29/03/2021	19/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	98%
32	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021 3/04/2021	3/03/2021 31/03/2021 7/04/2021		4/03/2021 29/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
33	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021 23/047/2021	26/03/2021 29/03/2021			10/03/2021 16/03/2021 29/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
34	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021 23/04/2021	14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021			28/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
35	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	11/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
36	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021 13/04/2021 23/04/2021	11/03/2021 17/03/2021 22/04/2021 26/04/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021 09/04/2021 30/04/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
37	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021	12/04/2021			23/03/2021 13/04/2021 30/04/2021			80%

11. INFORME DE CALIDAD

En cumplimento a lo establecido en el numeral 8. Identificación Y Trazabilidad, se adjuntan los respectivos ensayos y certificados de calidad de los materiales:

1. Ensayo de compresión de cilindros de concreto.
2. Ensayo de compactación y granulometría de subbase granular SBG-1. (El ensayo de granulometría lo realiza la trituradora CONSTRITURAR semestralmente)
3. Certificado de calidad cemento argos
4. Certificado de calidad de Tubería TDP y TB (PVCENTER)
5. Formato 21 informe de seguimiento y medición

INDICADORES DE GESTIÓN

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

INDICADORES DE GESTION OBJETIVOS DE CALIDAD				
FECHA	30/04/2021	INFORME MENSUAL N°	13	
OBJETIVO N°1	Cumplir con los plazos estipulados	META	DIAS DE RETRASO	
		2 dias	0	
ACTIVIDADES QUE GENERARON RETRASO				
OBJETIVO N°2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS	
		2 quejas	0	
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS				
OBJETIVO N°3	Cumplir con especificaciones tecnicas y manuales de diseño del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS	
		cumplir con especificaciones tecnicas, manuales de diseño y normas del contrato	0	
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS				

11.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No.	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
AC2R SEM-157-2021	3/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	3/04/2021	Oficio AC2R SEM-157-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	7/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	7/04/2021	Informe mensual marzo de 2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-158-2021	7/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	7/04/2021	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	8/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	8/04/2021	Fwd: Acta de comité de obra	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	8/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	8/04/2021	Programación actividades de obra conectantes	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-158-2021	12/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	12/04/2021	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	12/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	12/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	13/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	13/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	15/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	15/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-160-2021	19/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/04/2021	Comunicado PIV-IMS-20191810-0486	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-161-2021	19/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/04/2021	Oficio AC2R-SEM-161-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-158-2021	20/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	20/04/2021	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	22/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	22/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-162-2021	26/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S. y SECRETARIA DE MOVILIDAD	Ing. Jorge Garzon y Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	26/04/2021	RESPUESTA OFICIO SDM 20213222341721	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-163-2021	27/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S. y SECRETARIA DE MOVILIDAD	Ing. Jorge Garzon y Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	27/04/2021	oficio AC2R-SEM-163-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-164-2021	28/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	28/04/2021	oficio AC2R-SEM-164-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	29/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	29/04/2021	Urgente - Acta de suspensión N. 3 del contrato N 2019- 1874	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-173-2021	29/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	29/04/2021	Solicitud AC2R-SEM-173-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-169-2021	30/04/2021	ENEL- CODENSA	A quien corresponda	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	30/04/2021	SOLICITU DE PAZ Y SALVO	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS

10.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA DE RECIBO DOCUMENTO	ENTIDAD QUE EMITE	CONSECUTIVO DE EMISION DE LA ENTIDAD	PERSONA REMITENTE QUIEN FIRMA LA CORRESPONDENCIA	PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDA LA CORRESPONDENCIA	ASUNTO	PARA RESPONDER		No. CONSECUTIVO RESPUESTA	FIRMA	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 6 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Acta de comité de obra	X		8/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Rehabilitación carpeta asfáltica AK 104 X AC 145		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: FW: Canalización externo 2054		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Observaciones replanteo transversal 42 x calle 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	LEYDY TATIANA BORDA ROJAS	Ing. Camilo Rosario	Observaciones replanteo transversal 42 x calle 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud correctivo 3010-AK 14 X CL 65 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
6/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud correctivo 3010-AK 14 X CL 65 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
7/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe mensual marzo de 2021	X		7/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
7/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	X		12/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: (Sin asunto) jue 8 de abr de 2021 10:30am - 11:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	X		12/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Adriana Milena Guevara Vargas	Ing. Camilo Rosario	INFORME TECNICO DE NO APROVECHAMIENTO		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT POR EMERGENCIA		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT POR EMERGENCIA		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación actividades de obra conectantes	X		8/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación actividades de obra conectantes		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMS-20191810-0476		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Actas de comité 1 -10		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/04/2021	Christian Roqueme Salazar	Correo electronico	Christian Roqueme Salazar	Ing. Camilo Rosario	Aprobación PMT AC 72 X KR 74A		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: PMT EMERGENCIA CONTRATO SEMAFORIZACION SDM 2019 1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Permiso contingencia - abril		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 13 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Acta de comité semanal		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Urgente. Ajuste base 3688-KR 15 X CL 71B SUR		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Ra: DISEÑO KR 97 X CL 23F		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		12/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mié 14 de abr de 2021 2pm - 3:30pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mar 13 de abr de 2021 2pm - 3:30pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		13/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		13/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentación para impresión y firma		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentación para impresión y firma		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Observaciones replanteo transversal 42 x calle 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	X		20/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Diseño carrera 33 x calle 47 sur		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Intervención carrera 116A x diagonal 16		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
15/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		15/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
15/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Reunión de apertura Auditoría ISO 10005: 2005 vie 16 de abr de 2021 9am - 9:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Construcción de base para poste Carrera 97 por Av. Centenario		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: Documentación para liquidación de contrato.		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
17/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO KR 70 X CL 103		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMO-20191010-0486	X		19/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mar 20 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		22/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: Diseño AK 50 X AC 63		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Construcción de base para poste Carrera 97 por Av. Centenario		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT EMERGENCIA - INTERSECCION CARRERA 97 X AV CENTENARIO		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Autorización PMT por emergencia carrera 97 x avenida Centenario		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
22/042021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Retiro de material sobrante y cerramientos carrera 9 x calle 127		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
22/042021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Ejecución intersección nueva carrera 116A x diagonal 16		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 27 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S. y SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon y Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	oficio AC2R-SEM-163-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
27/04/2021	Rafael Tapiero	Correo electronico	Rafael Tapiero	Ing. Camilo Rosario	JORNADA DE PARO NACIONAL		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
28/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMS-20191810-0495		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

037

28/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	oficio AC2R-SEM-163-2021		x			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
28/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicación AC2R-SEM-163-2021 - Contrato 2019-1874		x			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Deisy Lara Barbón	Ing. Camilo Rosario	Urgente - Acta de suspensión N. 3 del contrato N 2019- 1874		x			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Urgente - Acta de suspensión N. 3 del contrato N 2019- 1874	x		29/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Notificación PQRS		x			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Acta de suspensión contrato 20191874		x			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
30/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	ING. CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA	Ing. Camilo Rosario	Incumplimiento suspensión contrato 2019-1874		x			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

11.3 CONTROL DE ENSAYOS

INTERSECCION	ESQUINA	FECHA DE REALIZACION	RESULTADOS
TV 42 X CL 12	SUR ESTE	28/04/2021	95.6
	SUR ESTE	28/04/2021	95.8
	SUR ESTE	28/04/2021	96.8
	SUR ESTE	23/04/2021	95.4
	SUR ESTE	23/04/2021	96.4
	SUR ESTE	23/04/2021	97.1
	NOR ESTE	22/04/2021	96.2
	SUR ESTE	22/04/2021	95.7
	SUR OESTE	22/04/2021	96.3
KR 50 X CL 182	SUR OESTE	30/03/2021	95.3
	NOR OESTE	30/03/2021	95.1
	NOR ESTE	30/03/2021	95.2
	NOR ESTE	30/03/2021	96.5
	SUR ESTE	30/03/2021	96.2

12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

1. El acta de inicio del contrato de obra 2019-1874 fue suscrita el 6 de marzo de 2020, a causa de la pandemia causada por el virus COVID-19 al contrato se le realizo la suspensión N°1 el día 30 de marzo de 2020 hasta el día 12 de abril de 2020, por motivo de continuación del estado de emergencia se genera la suspensión N°2 del 13 de abril de 2020 hasta el día 5 de mayo de 2020, en consecuencia de la jornada de paro nacional se realizo la suspensión del contrato del periodo comprendido desde el 29 de abril de 2021 al 4 de mayo del 2021, desde el día de inicio hasta el día de hoy el contrato lleva de ejecución 384 días.
2. A la fecha el contrato tiene un porcentaje de ejecución programado del 100%, versus el porcentaje ejecutado real es del 99%, presentando a la fecha un atraso del 1% de la ejecución del contrato, el contrato tiene una fecha de terminación actual al del 6 de mayo de 2021.
3. El contrato fue suspendido debido a las manifestaciones que se presentan desde el 28 de abril en el país, y por tal motivo los proveedores no garantizaban el envio de los materiales e insumos requeridos para terminar las actividades faltantes en las obras, como fue manifestado mediante el oficio AC2R-SEM-163-2021.

038

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES DE OBRA

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°51 - CONTRATO 2019-1874

DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	ESTA SEMANA SE DEFINE LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA CARPETA ASFALTICA
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 30.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57		3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
47	1547	1865	KR 500 X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021		70%	$ 160.000.000	
48			TV 42 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		35%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		10%	$ 28.000.000	
50			KR 9 X CL 23		4	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	26/03/2021	29/03/2021	100%	$ 1.000.000	

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

040

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°52 - CONTRATO 2019-1874

DEL 5 DE ABRIL AL 11 DE ABRIL DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		80%	$ 15.000.000	ESTA SEMANA SE DEFINE LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA CARPETA ASFALTICA
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		60%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
34	260	2054	KR 13 X CL 57		3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	18/03/2021					5%	$ 35.000.000	NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LA SDM EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION
47	1547	1885	KR 508 X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021		90%	$ 160.000.000	
48			TV 42 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		35%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		70%	$ 28.000.000	
50			KRA 116 X DG 26			28/01/2020	28/01/2022	19/03/2021	15/07/2021	13/04/2021	30/04/2021			10%		

RESIDENTE DE OBRA

041

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°53 - CONTRATO 2019-1874

DEL 12 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		100%	$ 15.000.000	
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		98%	$ 20.000.000	
47	1547	1865	KR 50B X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021		99%	$ 160.000.000	
48			TV <2 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		45%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		99%	$ 28.000.000	
50			KRA 116 X DG 16		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	26/03/2021		30%	$ 1.080.000	

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

042

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°54 - CONTRATO 2019-1874

DEL 19 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021		100%	$ 15.000.000	
33	650	2688	KR 50 X CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021		90%	$ 20.000.000	
47	1547	1865	KR 50B X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021	25/04/2021	100%	$ 160.000.000	
48			TV 42 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	29/03/2021		75%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021	23/04/2021	100%	$ 28.000.000	
51			KR 116 X DG 16		4	28/01/2020	28/01/2022	19/03/2021	15/07/2021	13/04/2021	30/04/2021	13/04/2021		30%		
52			KRA 97 X AC 18		4	28/01/2020	28/01/2022	22/04/2021	5/05/2021	24/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	100%		

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

043

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°55 - CONTRATO 2019-1874

DEL 26 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2021

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
32	643	1876	KR 104 X AC 145	Demolicion pompeyano revision redes de 2 bases	3	28/01/2020	28/01/2022	7/01/2021 10/04/2021	24/04/2021 11/04/2021	7/01/2021	24/04/2021	7/01/2021	14/04/2021	100%	$ 15.000.000	ESTA SEMANA SE DEFINE LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LA CARPETA ASFALTICA
33	650	2688	CR 50 K CL 24	Demolicion pompeyano CONTRUCCION DE 3 BASES PARA POSTE	3	28/01/2020	28/01/2022	25/12/2020	24/04/2021	7/01/2021	27/04/2021	9/02/2021- 10/04/2021	15/04/2021	100%	$ 20.000.000	EN TRAMITE DE APROBACION DE PMT
47	1547	1865	KR 508 X CL 182		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	23/03/2021	12/04/2021	100%	$ 160.000.000	
48			TV 42 X CL 12		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021		98%	$ 60.000.000	
49			KR 9 X CL 127		3	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	24/03/2021	18/04/2021	100%	$ 28.000.000	
50			KR 9 X CL 23		4	28/01/2020	28/01/2022	26/02/2021	24/06/2021	12/03/2021	13/04/2021	26/03/2021	29/03/2021	100%	$ 1.000.000	
51			KR 116 X DG 16		4	28/01/2020	28/01/2022	29/03/2021	15/07/2021	13/04/2021	30/04/2021	13/04/2021		65%		

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

050

ANEXO 2. INFORMES SEMANALES DE PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

045

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 51 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 29 MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021	

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 52 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 5 ABRIL AL 11 DE ABRIL DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
33	P736	-	TV 42 X CL 12	9/03/2021 18/03/2021	RADICADO SDM COOS 11			
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
44			CRA 50 X CL 63	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
45			CRA 50 x CL 182	23/02/2021 04/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
46	723	2324	AK 86 X CL 66A	2/02/2021 11/02/2021	RADICADO SDM COOS06			
47	744	2530	AK 86 X CL 64B BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
48	747	2530	AK 86 X DG 63F	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
49	731	2550	AK 86 X CL 65 BIS	2/02/2021 27/02/2021	RADICADO SDM COOS 08			
51	P1638		KR 27 X CL 5	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM	9/04/2021		
53	P1115		KR 107 X DG 78C	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
54	P947		AK 33 X CL 47B SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
55	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	EN TRAMITE DE DESARROLLO A LA ESPERA DE APROBACION DE DISEÑO PARA INICIO DE OBRA				
56	1547	1865	KR 50B X CL 182	23/02/2021 4/03/2021	RADICADO SDM COOS 09			
57	1691	1080	KR 74 A X AC 72	9/03/2021 23/03/2021 30/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA RADICADO INTERVENTORIA RADICADO SDM	19/03/2021		
58			AK 104 X AC 145	25/12/2021 25/03/2021	COOS 09 RADICADO SDM			
				8/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021	
				8/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA			

047

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 53 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 12 ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM	9/04/2021		
58			AK 104 X AC 145	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			
60			KR 50 X CL 24	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			

048

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 54 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 19 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
36		-	KR 116A X DG 16	9/03/2021 18/04/2021	RADICADO INTERVENTORIA COOS 11	17/03/2021	18/03/2021	
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM			
58			AK 104 X AC 145	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA	29/03/2021	29/03/2021	
61			KRA 97 X AV CENTENARIO	20/04/2021 21/04/2021	RADICADO SDM E INTERVENTORIA COOS EMERGENCIA			

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 55 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 26 ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2021

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
52	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	7/04/2021	RADICADO SDM	9/04/2021		
58			AK 104 X AC 145	8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			
59			KR 9 X CL 23	23/03/2021	RADICADO INTERVENTORIA	25/03/2021		
60			KR 50 X CL 24	25/03/2021	RADICADO SDM	29/03/2021	29/03/2021	
				8/04/2021 09/04/2021	PMT POR EMERGENCIA RADICADO INTERVENTORIA COI EMERGENCIA			
61			KRA 97 X AV CENTENARIO	20/04/2021 21/04/2021	RADICADO SDM E INTERVENTORIA COOS EMERGENCIA			

050

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES DE DISEÑO

Ingenieria & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 51 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 29 MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1365	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 8/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021				9/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 25/03/2021	29/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	19/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	3/03/2021 31/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	9/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 126 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021							

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 52 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 5 ABRIL AL 11 DE ABRIL DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1092	1078	AK 9 Y AK 13 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021 6/04/2021			6/04/2021	9/03/2021 16/03/2021 9/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 29/03/2021	29/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	18/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	98%
	P2142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	3/03/2021 31/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	80%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/08/2021			10/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	11/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021 09/04/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021							

053

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 52 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 5 ABRIL AL 11 DE ABRIL DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 508 X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	25/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 9/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	26/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021 6/04/2021			6/04/2021	9/03/2021 15/03/2021 9/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 29/03/2021	25/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	15/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	98%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	3/03/2021 31/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2022 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	11/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021 06/04/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021							

054

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 54 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 19 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	20/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de acepion de observacion generadas por Interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 9/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	26/11/2020 7/01/2021 18/01/2021			14/12/2020 5/03/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por Interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 108	SI	NO	NO	1/03/2021				9/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 25/03/2021	29/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	19/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	95%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	8/03/2021 31/03/2021		4/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2021 16/03/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 478 SUR	SI	NO	NO	31/03/2021						En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	9/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 126 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021	11/03/2021 17/03/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021							

050

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 55 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 26 ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2021

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 508 X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	10/11/2020 04/12/2020 V1 01/02/2021 V2		23/02/2021	23/11/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	26/11/2020 8/01/2021 04/02/2021			8/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	26/11/2020 5/01/2021			9/12/2020		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	27/11/2020 8/01/2021 01/02/2021 02/02/2021 9/03/2021	12/03/2021	23/02/2021	24/12/2020 9/03/2021	10/03/2021	En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020 14/04/2021 23/04/2021	26/11/2020 7/01/2021 19/01/2021 22/04/2021		17/04/2021 21/04/2021 23/04/2021	14/12/2020 5/03/2021 30/04/2021		En tramite de atencion de observacion generadas por interventoria y SDM	95%
	P679		AK 70 X CL 103	SI	NO	NO	1/03/2021 6/04/2021 23/04/2021	28/04/2021		6/04/2021	9/03/2021 16/03/2021 9/04/2021 19/04/2022 29/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1638		KR 27 X CL 5	SI	NO	NO	15/02/2021 25/03/2021	19/03/2021 5/04/2021		29/03/2021	19/02/2021 30/03/2021		En tramite de desarrollo	98%
	P1142		KR 78K X CL 40 SUR	SI	NO	NO	1/03/2021 29/03/2021	2/03/2021 30/03/2021	3/03/2021 31/03/2021		4/03/2021 29/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1115		KR 107 X DG 78C	SI	NO	NO	3/03/2021	26/03/2021			10/03/2021 16/03/2021 29/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P947		AK 33 X CL 47B SUR	SI	NO	NO	31/03/2021				28/04/2021		En tramite de desarrollo	60%
	P1309		KR 23C X CL 64 SUR	SI	NO	NO	2/03/2021 31/03/2021	11/03/2021					En tramite de desarrollo	60%
	P1310		KR 116 x DG 16	SI	SI	SI	9/03/2021 13/04/2021 23/04/2021	11/03/2021 17/03/2021 22/014/2021 26/04/2021	12/03/2021		3/03/2021 17/03/2021 19/03/2021 09/04/2021 30/04/2021	12/03/2021 18/03/2021 19/03/2021	En tramite de desarrollo	80%
	P1311		KR 97 X CL 23F	SI	SI	SI	31/03/2021				13/04/2021 30/04/2021			

056

ANEXO 4. RESULTADOS ENSAYOS DE DENSIDADES

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

Bogota DC 7 mayo de 2021

Señores
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
PROYECTO SEMAFORIZACION
Ciudad

Respetados Señores

Hacemos entrega de los ensayos realizados a las muestras tomadas para el contrato en referencia tal como se especifican a continuación

FECHA	MUESTRA	LOCALIZACION	ENSAYOS REALIZADOS
VARIOS	SUB-BASE	VARIOS	DENSIDADES EN EL TERRENO

Sin otro particular nos suscribimos, deseando éxitos en sus labores diarias.

Cordialmente

GEOCRETOS INGENIERIA S.A.S.
NIT.: 900.802.749 - 4

RICARDO LARROTA MANRIQUE
Gerente
GEOCRETOS
Laboratorio de Ingeniería Civil


GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13	VERSION No	1
		VIGENCIA D/M/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-17
LOCALIZACION	TRV 42 CL 12	FECHA ENS.	29 de abril de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	7 de Mayo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)		S-E	S-E	S-E			
Peso frasco + arena inicial	gr	6742	6716	6691			
Peso frasco + arena final	gr	3234	3270	3150			
Peso total arena usada	gr	3508	3446	3541			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1906	1844	1939			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1342	1299	1365			
Peso material húmedo	gr	2914	2837	3018			
Humedad del material	%	8,6	9,1	9,2			
Peso material seco	gr	2683	2600	2764			
Densidad del material	gr/cm	1,999	2,002	2,024			
Densidad max del material	gr/cm	2,091	2,091	2,091			
Grado de compactación	%	**95,6**	**95,8**	**96,8**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

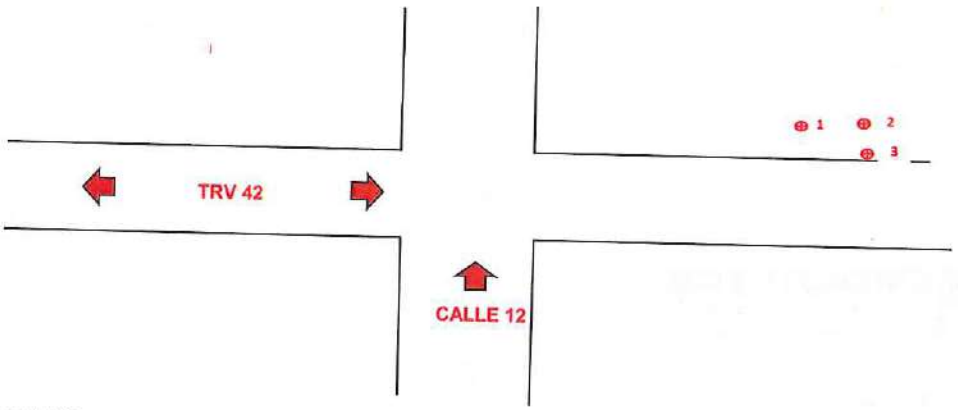

OBSERVACIONES

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO


GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13	VERSION No	1
		VIGENCIA D/M/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-16
LOCALIZACION	TRV 42 CL 12	FECHA ENS.	23 de abril de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	7 de Mayo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)		S-E	S-E	S-E			
Peso frasco + arena inicial	gr	6650	6631	6602			
Peso frasco + arena final	gr	3078	3185	3163			
Peso total arena usada	gr	3572	3446	3439			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1970	1844	1837			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1387	1299	1294			
Peso material húmedo	gr	3014	2839	2841			
Humedad del material	%	8,9	8,5	8,2			
Peso material seco	gr	2768	2617	2626			
Densidad del material	gr/cm	1,995	2,015	2,030			
Densidad max del material	gr/cm	2,091	2,091	2,091			
Grado de compactación	%	**95,4**	**96,4**	**97,1**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

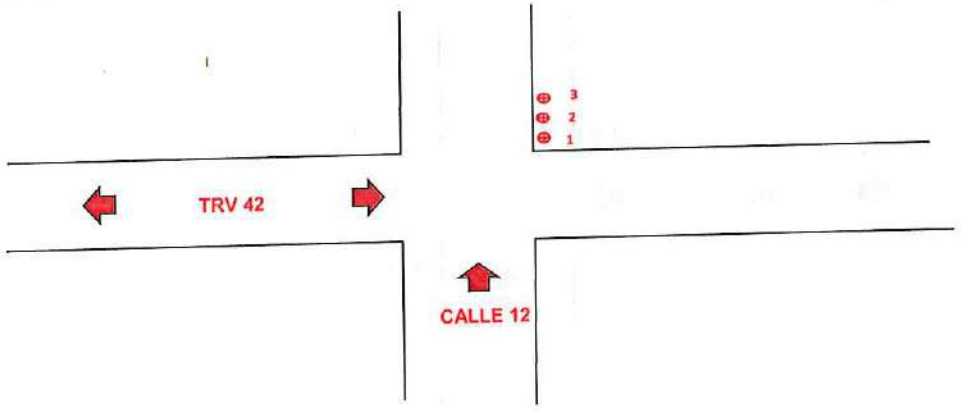

OBSERVACIONES

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL geocretoslaboratorio@gmail.com
pagina web www.geocretos.com.co

GEOCRETOS
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13


VERSION No	1
VIGENCIA D/M/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-15
LOCALIZACION	TRV 42 CL 12	FECHA ENS.	22 de abril de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	7 de Mayo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3			
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA			
Abscisa (aproximada por lab)		N-E	S-E	S-W			
Peso frasco + arena inicial	gr	6710	6982	6965			
Peso frasco + arena final	gr	3191	3520	3452			
Peso total arena usada	gr	3519	3462	3513			
Constante del cono	gr	1602	1602	1602			
Peso arena en el hueco	gr	1917	1860	1911			
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42			
Volumen del hueco	cm	1350	1310	1346			
Peso material húmedo	gr	2960	2845	2949			
Humedad del material	%	9	8,5	8,8			
Peso material seco	gr	2716	2622	2710			
Densidad del material	gr/cm	2,012	2,002	2,014			
Densidad max del material	gr/cm	2,091	2,091	2,091			
Grado de compactación	%	**96,2**	**95,7**	**96,3**			

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

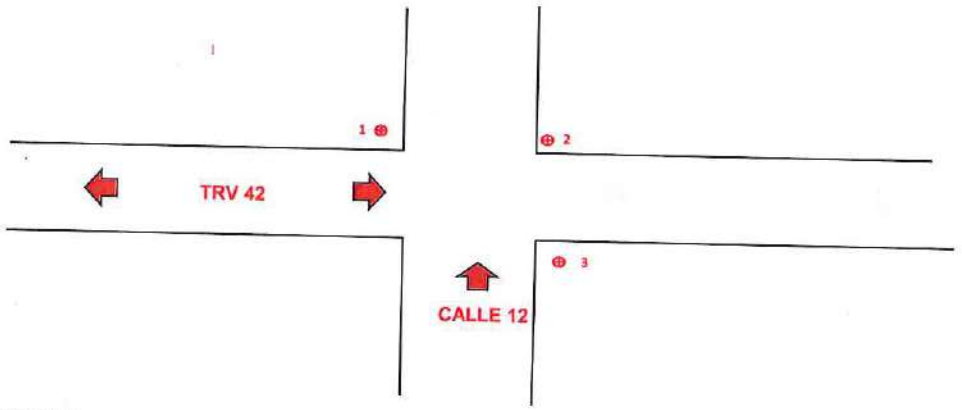

OBSERVACIONES

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO

OFICINA Y LABORATORIO CALLE 42 SUR No 79F-38 ESTADOS UNIDOS KENNEDY MOVIL 3123583209 TELEFAX 4831904 E MAIL geocretoslaboratorio@gmail.com
pagina web www.geocretos.com.co


GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA INV E -161-13	VERSION No	1
		VIGENCIA D/M/A	01/01/2021

EMPRESA - ENTIDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	REFERENCIA	120211-004-001
PROYECTO	SEMAFORIZACION	OS	D-14
LOCALIZACION	KR 50 CON CL 182	FECHA ENS.	30 de Marzo de 2021
MATERIAL	SUB-BASE	FECHA INF.	7 de Mayo de 2021

DATOS Y RESULTADOS

Densidad No		1	2	3	4	5	
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	
Abscisa (aproximada por lab)		S-W	N-W	N-E	N-E	S-E	
Peso frasco + arena inicial	gr	6722	6701	6686	6670	6656	
Peso frasco + arena final	gr	3186	3144	3141	3225	3191	
Peso total arena usada	gr	3536	3557	3545	3445	3465	
Constante del cono	gr	1602	1602	1602	1602	1602	
Peso arena en el hueco	gr	1934	1955	1943	1843	1863	
Densidad de la arena	gr/cm	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	
Volumen del hueco	cm	1362	1377	1368	1298	1312	
Peso material húmedo	gr	2948	2983	2974	2832	2867	
Humedad del material	%	8,6	9	9,2	8,1	8,6	
Peso material seco	gr	2715	2737	2723	2620	2640	
Densidad del material	gr/cm	1,993	1,988	1,990	2,019	2,012	
Densidad max del material	gr/cm	2,091	2,091	2,091	2,091	2,091	
Grado de compactación	%	**95,3**	**95,1**	**95,2**	**96,5**	**96,2**	

ESQUEMA DE LOCALIZACION DENSIDADES

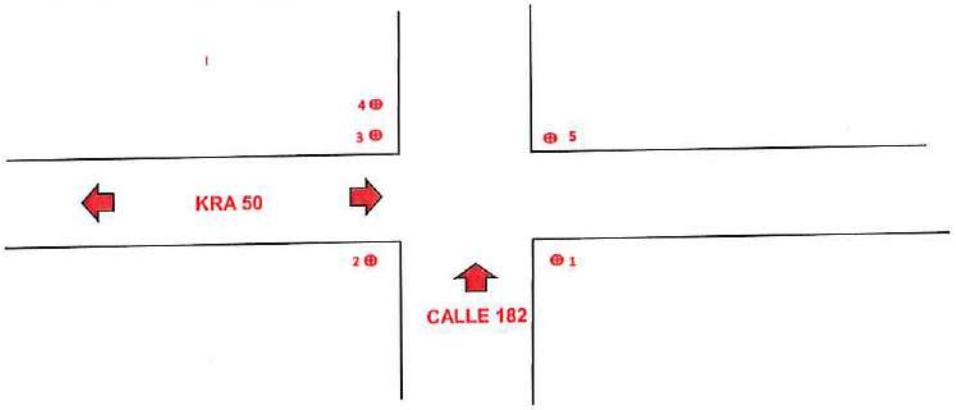

OBSERVACIONES

DENSIDADES INDICADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS VEGA	ING RICARDO LARROTA	
LABORATORISTA	ELABORO	REVISO Y APROBO

ANEXO 5. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PROVEEDORES Y CERTIFICADO DE ACREDITACION DEL LABORATORIO

REPORTE RESULTADOS RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETOS

DAICONC. SAS

Codigo	FORD-047
Version	01
Fecha de Emisión	15/03/2021
Páginas	1 de 1

Cliente: AC2R
Contacto: ELIZABETH Telefono: 3187142306
Proyecto:

Fecha recepción: 10/02/2021
Orden de trabajo: 38
Informe N. 002-20

Sede Laboratório Cra 90 # 88 A - 07 Bogotá - Tele-fax (057) 4569832

PORCENTAJES PROMEDIO DE EVOLUCION POR EDAD

	3 Días	90 - 100%	7 Diás	70 - 80%	28 Diás	> 100%

							RESISTENCIA Kg/cm2				
Cod. Int.	Cod. Cliente	Fecha Toma	Fecha ensayo	Elemento fundido	Resistencia diseño Kg/Cm2	Edad (Días)	Cilindro # 1	Cilindro # 2	Promedio	PSI	% Evolución
116	PRO - 22	18/01/2021	15/02/2021	ESTRUCTURA	210	28	215,2	218,8	217,0	3100	103,3
117	PRO - 22	27/01/2021	24/02/2021	ESTRUCTURA	210	28	209,4	211,8	210,6	3009	100,3
118	PRO - 22	29/01/2021	26/02/2021	ESTRUCTURA	210	28	225,8	229,7	227,8	3254	108,5
118	PRO - 22	1/02/2021	1/03/2021	ESTRUCTURA	210	28	218,7	219,7	219,2	3131	104,4

Ensayo para determinar la resistencia a compresión. NTC 673

Observaciones: Los cilindros fallados a las edades que se enuncian en el formato llevan una evolución aceptable

MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION NUMERO DE SERIE CODIGO INTERNO 001

RANGO DE MEDICION 100,96 KN -A- 706,65 KN

Ejecutó
Liliana Grajales A.

Reviso
Ing. Elquier Daza R.

062

Técnico de laboratorio

Director de Laboratório

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S.A.S
FABRICACIÓN/IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN/DISTRIBUCIÓN

DIVISIÓN DE METROLOGÍA - LABORATORIO DE MASA Y FUERZA
CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

NIT: 900.278.570-5

FECHA DE CALIBRACION: abril 20 de 2020
Date of Calibration

SOLICITANTE: GEOCRETOS INGENIERIA SAS
Customer

DIRECCION: Calle 42S No 79F-38
Address

CIUDAD: Bogotá D.C
City

INSTRUMENTO: Balanza Electrónica
Instrument

TIPO: NP
Type

FABRICANTE: LEXUS
Manufacturer

MODELO: NP
Model

SERIE: NP
Number

CAPACIDAD: 0,02 Kg a 30 Kg
Capacity

Número de Páginas del Certificado: 3
Number of pages of the certificate

Este informe de calibración solo puede ser reproducido totalmente con la autorización de Fabiequipos y Distribuciones S.A.S. Los informes de calibración no son válidos sin las firmas autorizadas y la estampilla de calibración.

This calibration report may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration report without signature are not valid.

Revisado Por:
Reviewed by:

Franklin Ricardo

Calibrado Por:
Calibrated by:

Edgar Rodríguez

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT. 900.278.570-5
CALLE 2A No. 72-36 I 105
PBX: 805 17 27 / 23
BOGOTÁ - COLOMBIA

1. Notas Aclaratorias

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results of this report refer to the moment and conditions in wich the measurements were made . The issuing Laboratory no responsability for damages ensuing mis use of the calibratyed instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having the apparatus calibrated at apropiate intervals

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).

This Calibration certificate documents the traceability to national standards, wich realize the units of measurement according to the international systm of units (SI).

2. Norma Técnica Utilizada Para la calibración

El instrumento es calibrado según los requisitos de la Guía SIM para la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático (2008).

3. Dispositivo Patrón Utilizado

Juego de Pesas

Capacidad de Medición:	1 g – 10 kg
Incertidumbre de Medición:	F1
Fecha de Calibración:	2009-08-03
Entidad que Calibra:	Laboratorios de Metrología Sigma E.U.

4. Temperatura Durante la Calibración

Temperatura Inicial:	21,2 °C
Temperatura Final:	20,4 °C

5. Resultados de la Calibración

FORMATO PARA CALIBRACION DE BALANZAS

FECHA	2020-04-20

DATOS DE LA BALANZA

SOLICITANTE	:	GEOCRETOS INGENIERIA SAS	
INSTRUMENTO	:	BALANZA ELECTRONICA	
FABRICANTE	:	LEXUS	
MODELO	:	NP	
SERIE	:	NP	
CARGA MÁXIMA (Max.)	:	30,000	kg
CARGA MÍNIMA (Min.)	:	0,040	kg
DIVISIÓN DE ESCALA	:	0,002	kg
DESVIACION ESTANDAR	:	0,004	kg
DESVIACION LINEAL	:	0,006	kg
SENSIBILIDAD TERMICA	:	2*10^-6	ppm/°C
EMP- POR EXCENTRICIDAD	:	0,001	kg

DATOS DE TRAZABILIDAD DE PATRONES

JUEGO DE PESAS CLASE	:	F1
NUMERO DE CERTIFICADO	:	
FECHA DEL CERTIFICADO	:	2020-04-20

CARGAS DE PRUEBA	VALOR NOMINAL	MASA CONVENCIONAL	INCERTIDUMBRE
0,2	0,2	199,999659	0,166500
0,5	0,5	499,999827	0,416500
1	1	1000,002497	1,003750
2	2	2000,004645	0,527100
5	5	5000,017201	1,683100
8	8	8000,024343	3,275450
10	10	10000,010878	2,608250
14	14	14000,020567	3,723950
18	18	18000,035620	5,883700
20	20	20000,040264	6,300200
25	25	25000,057466	6,716700
CARGA PARA EXCENTRICIDAD	5		Kg
CARGA PARA REPETIBILIDAD	5		Kg
CARGA PARA REPETIBILIDAD	10		Kg
REPETICIONES PARA REPETIBILIDAD		10	

FABIEQUIPOS & DISTRIBUCIONES S.A.S

DIVISIÓN DE METROLOGÍA - LABORATORIO DE MASA Y FUERZA
CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

NIT: 900.278.570-5

APLICACIÓN DE PRUEBAS

PRUEBA DE REPETIBILIDAD		
CARGA	5000	kg
REPETICION	INDICACION	UNIDADES
1	5,000	kg
2	5,000	kg
3	5,000	kg
4	5,000	kg
5	5,000	kg
6	5,000	kg
7	5,000	kg
8	5,000	kg
9	5,000	kg
10	5,000	kg
DESVIACION ESTANDAR	0,000000	0,0000
	g	mg

CARGA	10	kg
REPETICION	INDICACION	UNIDADES
1	10,000	kg
2	10,000	kg
3	10,000	kg
4	10,000	kg
5	10,000	kg
6	10,000	kg
7	10,000	kg
8	10,000	kg
9	10,000	kg
10	10,000	kg
DESVIACION ESTANDAR	0,000000	0,000
	g	mg


EXACTITUD O ERROR DE INDICACION			
CARGA (kg)	INDICACION (kg)	AUMENTO (kg)	ERROR (kg)
0,040	0,040	0,0009	0,0016
0,100	0,100	0,0008	0,0017
0,500	0,500	0,0009	0,0016
1,000	1,000	0,0008	0,0017
2,000	2,000	0,0009	0,0016
5,000	5,002	0,0009	0,0036
7,000	7,002	0,0008	0,0037
10,000	10,002	0,0009	0,0036
15,000	15,002	0,0008	0,0037
20,000	20,002	0,0009	0,0036
30,000	30,002	0,0009	0,0036
Desviación Estandar		0,00005	0,00104

Ti	Tf
20,0	21,0

OBSERVACIONES:
Método 2 exactitud

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD			
	CARGA	5	kg
POSICION	INDICACION (g)	AUMENTO (g)	ERROR (g)
1	5,000	0,0009	0,002
2	5,000	0,0010	0,002
3	5,000	0,0010	0,002
4	5,000	0,0010	0,002
5	5,000	0,0010	0,002

$E_{MAX\ EXC}$	0	mg



Incertidumbre estimada con un factor de cobertura de k=2.

Nota:

La calibración en cualquier equipo de medida solo reporta el comportamiento del quipo en el lugar y fecha en que se realizan las lecturas, por lo tanto no se puede garantizar la repetitividad de las mismas a través del tiempo.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-021

INFORME DE ENSAYO DE LIMITES NTC 4630/1999

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1


Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-09

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

LÍMITES DE CONSISTENCIA

LÍMITE LÍQUIDO:			
N° de golpes			
Vidrio N°.	NL-NP		
Masa humeda (g):			
Masa seca (g):			
Masa del recipiente (g)			
Masa Seca (g)			
Masa Agua (g)			
% Humedad			

LÍMITE PLÁSTICO:			
N° de vaso			
Masa humeda (g):			
Masa seca(g):			
Masa recipientes(g):			
Masa Seco (g)			
Masa Agua (g)			
% Humedad			

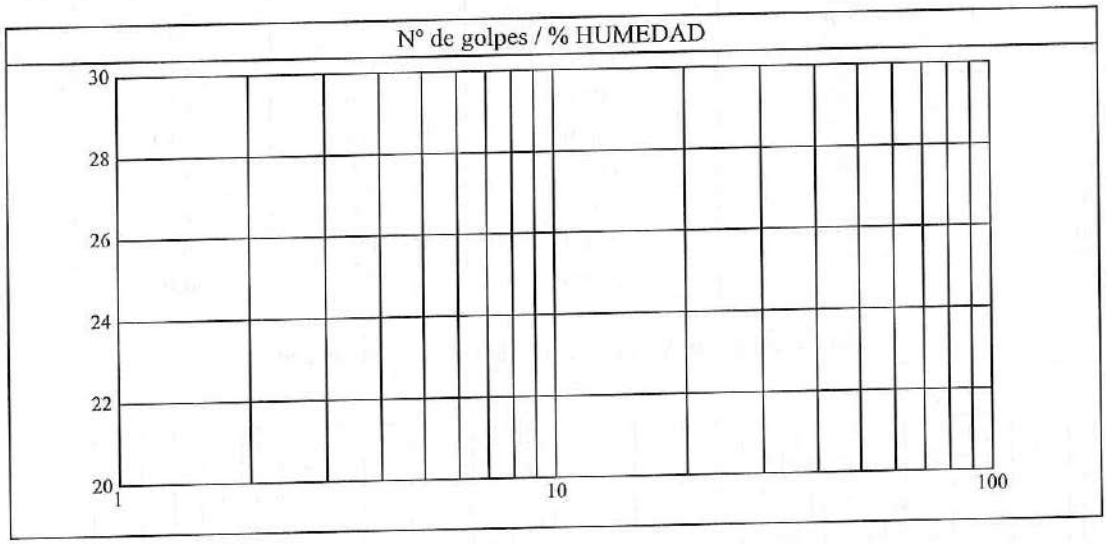

RESULTADOS	
LÍMITE LÍQUIDO (%)	0
LÍMITE PLÁSTICO (%)	0
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	0
HUMEDAD NATURAL (%)	4.09
GRAVAS (%)	62.62
ARENAS (%)	24.89
FINOS (%)	12.49

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: FL049/00
FIRMA:	FIRMA:	Inf N: 818339
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Fecha: 2020-12-14

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA
Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-021

INFORME DE ENSAYO DE GRANULOMETRIA POR TAMIZADO NTC 77:2018

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-09


Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO NTC 77/2018

Masa antes de lavado(g):	5275	Masa después de lavado(g):	4616

Tamiz (Pulg)	Tamiz (mm)	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa
4"	101.60				
3 ½"	88.90				
3"	76.20				
2 ½"	63.50				
2"	50.80				
1 ½"	38.10	0.0	0.0	0.0	100.0
1"	25.40	526.0	10.0	10.0	90.0
3/4"	19.10	633.0	12.0	22.0	78.0
1/2"	12.70	882.0	16.7	38.7	61.3
3/8"	9.53	470.0	8.9	47.6	52.4
#4	4.76	792.0	15.0	62.6	37.4
#10	2.00	555.0	10.5	73.1	26.9
#40	0.42	144.0	2.7	75.9	24.1
#100	0.15	410.0	7.8	83.6	16.4
#200	0.07	204.0	3.9	87.5	12.5
Fondo		659.0	12.5	100.0	0.0

SIN ESPECIFICACION - Índice Máximo de Plasticidad:

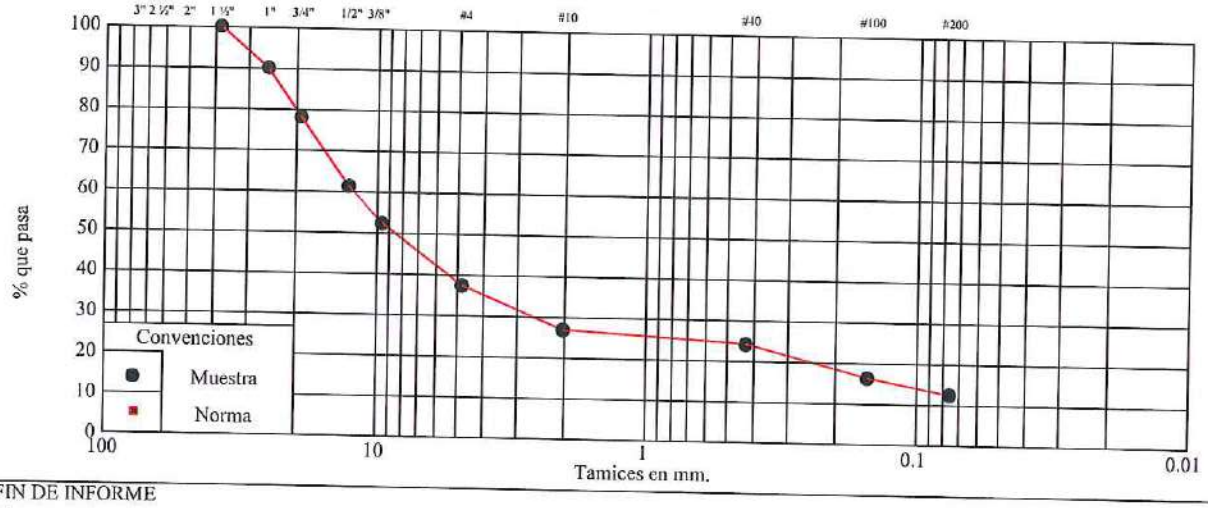

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: FECHA:	Código: FL049/00 Inf N: 818339 Fecha: 2020-12-14

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 09-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS INV E-133/2013**

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-02

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

PRUEBA	1	2	3
PROBETA Nº	1	2	3
LECTURA DE ARENA	2.2	2.3	2.3
LECTURA DE ARCILLA	13.5	13.5	13.6
EQUIVALENTE DE ARENA (%)	16.3	17.0	16.9
PROMEDIO EQUIVALENTE DE ARENA (%)	17		

FUENTE	CONSTRITURAR
Especificación:	N.A.

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-33/1
FIRMA: Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: _____ FECHA: _____	Inf N: 818342 Fecha: 2020-12-07 Pág. 1/1 | 2021-01-04

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

INFORME DE ENSAYO DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO COMPACTADO INVE 239/2013

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-02

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

METODO A		1	2
P	Peso de la muestra mas cilindro en g	411.5	411.0
C	Peso del cilindro en g	279.8	279.8
W = P * C	Peso Neto de la muestra en g	131.7	131.2
V	Volumen del cilindro en cm3	100.06	100.06
G	Gravedad especifica de la muestra en g/cm3	2.60	2.60
U = (V-(W/G))/V*100	Porcentaje de Vacíos no compactados en % o ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO	49.4	49.6
PROMEDIO %		49.5	

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-56/0
FIRMA:	FIRMA:	Inf N: 819987
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Fecha: 2020-12-11
		Pág. 1/1 | 2021-01-04

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2017 07-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES NTC 98/2012: NTC 93/2013**

Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-04

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Prueba	1	2	3	4	5
Gradación usada	A	A			
No. de esferas	12	12			
No. de revoluciones	100	500			
Peso muestra seca antes del ensayo (g)	5008	5008			
Peso muestra seca despues del ensayo (g)	4514	2911			
Pérdida (g)	494.0	2097.0			
% de desgaste	10	42			
Especificación : % menor que	N.A.	N.A.			

RESUMEN DE TABLAS NTC 93/1995 Y 98/2006 Datos sobre gradación, carga abrasiva y revoluciones.

Tamaños		Peso y gradación de la muestra (g)						
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
3"	2½"					2500		
2½"	2"					2500		
2"	1½"					5000	5000	
1½"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4"	1250						5000
3/4"	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8"	1250	2500					
3/8"	1/4"			2500				
1/4"	#4			2500				
#4	#8				5000			
No. de esferas		12	11	8	6	12	12	12
No. de revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-21/1
FIRMA: Fernando Rodríguez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FIRMA: _____ FECHA: _____	Inf N: 818341 Fecha: 2020-12-07 Pág. 1/1 | 2021-01-04

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

Bogotá - Calle 22C-130-51 BODEGA 6 Tel:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
07-LAB-021

INFORME DE ENSAYO RELACION HUMEDAD-MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION INVE 142-2013


Localización: ZONA DE ACOPIO
Cantera: CONSTRITURAR
Descripción: SBG-1

Fecha de toma: 2020-11-23 **CR:** 2143
Fecha de recibo: 2020-11-25 **No. de muestra:** 4637
Fecha de ensayo: 2020-12-02

Nota: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

PRUEBA	1	2	3	4	5
Nº de golpes	56	56	56	56	
Molde Nº	MO363	MO363	MO363	MO363	
Humedad natural muestra (%)	4	4	4	4	
Humedad adicional (%)	2	4	6	8	
Peso muestra húmeda (g)	6000	6000	6000	6000	
Peso muestra seca (g)	5779	5779	5779	5779	
Agua adicional (%)	120	240	360	480	
Peso muestra húmeda + molde (g)	7308	7502	7522	7420	
Peso molde (g)	2680	2680	2680	2680	
Peso muestra húmeda (g)	4628	4822	4842	4740	
Humedad horno (%)	5.8	7.5	9.1	11.0	
Peso muestra seca (g)	4373.2	4486.3	4438.2	4269.4	
Volumen del molde (cm³)	2116	2116	2116	2116	
Densidad muestra seca (g/cm³)	2.07	2.12	2.10	2.02	

HUMEDAD DE MOLDEO vs DENSIDAD

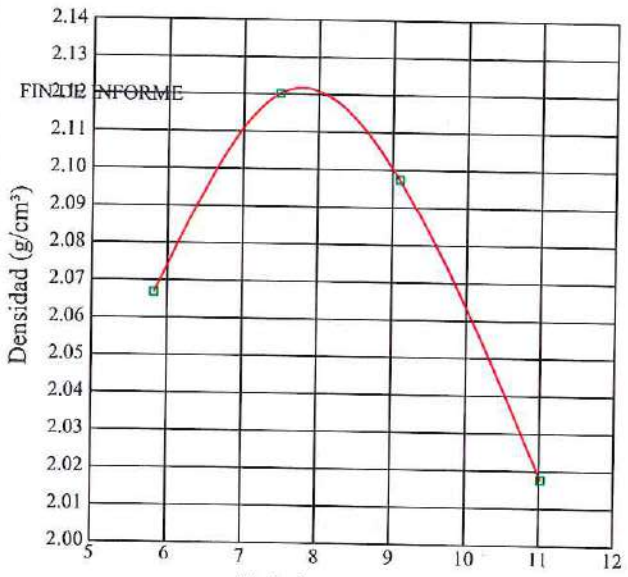

FIN DEL INFORME

Densidad máxima (g/cm³)	2.122
Humedad óptima (%)	7.8
Material retenido tamiz 3/4" (g)	
Tipo de cara del pisón	PLANA

LABORATORIO	RECIBIDO	Código: F-EM-04/8
FIRMA:	FIRMA:	Inf N: 818344
Fernando Rodri¿½guez Daza. DIRECTOR DE LABORATORIO	FECHA:	Fecha: 2020-12-07
		Pág. 1/1 | 2021-01-04

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE

D&L QUALITY CONSULTING LTDA

CERTIFICA

Que la empresa GEOCRETOS INGENIERIA S.A.S con NIT: 900.802.749-4, se encuentra en proceso de implementación del estándar "ISO 9001:2015 Requisitos para el Sistema de gestión de calidad"; actualmente el proceso se encuentra en la fase de implementación, de igual manera el laboratorio cuenta con los equipos, herramientas, insumos y personal competente para la toma de muestras y ejecución de ensayos bajo los criterios técnicos (Normas INVIAS), con la trazabilidad y registros de resultados de manera objetiva y de criterio profesional; como soporte se adjuntan las cartas de calibración de los equipos que se utilizarán en las pruebas.

Se expide a solicitud del interesado a los catorce (17) días del mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

LUZ DINED CARDONA PERDOMO
Representante Legal
Coordinador de Calidad

REPORTE DE CALIDAD: CEMENTO USO GENERAL
MARZO 2021
Presentación: SACOS
Cementos Argos S.A. - Planta Sogamoso

ARGOS

FECHA	PARÁMETROS QUÍMICOS					PARÁMETROS FÍSICOS						RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, Mpa			
	MgO %	SO_3 %	Pérdida ignición %	Blaine cm^2/g	Retenido Tamiz 45 µ %	Densidad g/cm^3	Cont Aire %	Exp. autoclave %	Exp. Barras de mortero %	Fraguado inicial minutos	Fraguado final minutos	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días
3-mar	1.40	2.67	7.58	4945	7.50					177	300	3.8	10.1	15.2	
4-mar	1.38	2.68	7.25	4885	6.10					178	300	4.1	10.2	15.8	
5-mar	1.49	2.73	7.64	5003	6.30					169	300	4.2	10.8		
6-mar	1.24	2.83	7.59	4960	7.80					192	315	3.7	8.1		
7-mar	1.25	2.24	7.70	4685	6.60					183	315	3.7	9.5		
8-mar	1.53	2.55	7.60	4640	8.10					198	330	3.3	8.9		
9-mar	1.17	2.51	7.84	4666	7.00					186	315	3.7			
10-mar	1.17	2.51	7.84	4666	7.00					186	315	3.7			
11-mar	1.38	2.68	7.25	4885	6.10					178	300	4.1	10.2		
12-mar	1.49	2.73	7.64	5003	6.30					169	300	4.2	10.8		
13-mar	1.24	2.83	7.59	4960	7.80					192	315	3.7	8.1		
14-mar	1.25	2.24	7.70	4685	6.60					183	315	3.7	9.5		
PROMEDIO	1.33	2.59	7.63	4806	7.05	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	184	311	3.8	9.6	15.5	#¡DIV/0!
DESV EST	0.14	0.18	0.19	156	0.71	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	9	11	0.3	1.0	0.4	#¡DIV/0!
COEF VAR %	10.6	7.0	2.4	3.2	10.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4.9	3.4	7.3	10.2	2.7	#¡DIV/0!
MAX	1.53	2.83	7.84	5003	8.10					198	330	4.2	10.8	15.8	
MIN	1.17	2.24	7.25	4640	6.10					169	300	3.3	8.1	15.2	
DATOS	8	8	8	8	8					8	8	8	6	2	
CONTROL	**máx 6.0**	**máx 3.5**	--	--	--	--	**máx 12**	**máx 0.8**	**máx 0.02**	**mín 45**	**máx 420**		**mín 8.0**	**mín 15.0**	**mín 24.0**

Elaborado por: Mónica Gonzalez
Profesional de Calidad

Revisado por: Olga Lucía Díaz
Jefe de Calidad

02.0

Gerfor

LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : Abril 6 de 2021
Referencia : TUBO DUCTO CORR ELECT Y TEL 3"
Norma : NTC 3363
Lote: 10091.201114.4

REQUISITO	NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIÁMETRO EXTERIOR	NTC 3358	mm	88,62 - 89,18	89,08
OVALAMIENTO MÁXIMO	NTC 3358	mm	1,60	0,34
DIÁMETRO INTERIOR	NTC 3358	mm	75,00	78,36
ESPESOR VALLE	NTC 3358	mm	0,60	1,13
ESPESOR INTERNO	NTC 3358	mm	0,40	1,15
ESPESOR EXTERNO	NTC 3358	mm	0,40	0,60
LONGITUD DEL TUBO	NTC 3358	mm	6000 - 6012	6010
DIÁMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	89,72 - 90,28	89,73
OVALAMIENTO DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	1,52	1,12
LONGITUD DE LA CAMPANA	NTC 3358	mm	73,00 - 79,00	78,58
RESISTENCIA AL IMPACTO	NTC 1125	Julios	81,00	CUMPLE
APLASTAMIENTO	NTC 3254	%	60 % de Diámetro Externo	CUMPLE
CALIDAD EXTRUSIÓN, Acetona	NTC 2983	Minutos	20 Minutos	CUMPLE
CALIDAD DE ADHERENCIA	NTC 3363	Visual	No desprendimiento de la pared	CUMPLE
RIGIDEZ DEL TUBO	NTC 3254	KN/m/m	414,00	1075,33
IMPERMEABILIDAD DE LAS UNIONES	NTC 3363	Psi	25 sin presentar fugas	CUMPLE
INFLAMABILIDAD	NTC 979	Visual	Autoextinguible	CUMPLE
ROTULADO	NTC 979	N/A	PVC GERFOR IND. COL. PVC DUCTO TELEFONICO Y ELECTRICO CORRUGADO D.E. 3" - 88 mm PS 414 KN/m/m (60 psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3363 - RETIE Res. 90708 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Monica Martinez

Monica Martinez
Inspector de Conformidad.

Reviso y Aprobó:

Julian Burgos
Lider de conformidad.

071

ANXO 6. BITACORA DE OBRA

072

31-03-21 Kr 50 x Calle 182 Clima: Soleado

Se realiza retiro de tubos por parte de la Secretaria de movilidad
Se realiza construccion de cuyes dobles costados nor oriental y sur oriental.

TV 42 x Calle 12

Se realiza perforacion horizontal costados nor oriental - sur oriental

5/04/21 Kr 9 x calle 127

Se realizan perforaciones horizontales costados occidental - oriental

Kr 50 x Calle 182

Se realiza conformacion a base grandes costados nor occidental y nor oriental

6-04-21 Kr 50 x Calle 182

Se realiza instalacion de concreto y topeval costados nor occidental y nor oriental

2 Kr 9 X calle 127

Se realiza excavaciones de aprox 1.5 separadas y costado occidental

7-04-21 Kr 50 X calle 182

Se realiza excavaciones de dos dados y construccion de anclajes concreto y pilotes para postes semaforizacion costados nor occidental y nor oriental

Kr 9 X Calle 127

Se realiza perforacion costado separador occidental

8-04-21 Kr 50 X calle 182

Se realiza conformacion de base granular costados sur occidental y sur oriental

9-04-21 Kr 9 X calle 127

Se realiza construccion de cajas dobles y sencillas costado occidental

Kr 80 X calle 132

Se realiza instalacion de cinta cebaguia andenes costado sur oriental y sur occidental

0-04/21 Kr 80 X calle 132

Se realiza limpieza de sitios intervenidos

Kr 9 X calle 172

Se realiza demolicion de cinta concreto costado occidental, se realiza demolicion y excavacion de terreno costado occidental

12-04-21 Kr 9 X calle 127

Se realiza conformacion en base granular costados occidental y separador, se realiza instalacion de redes de 311 en ambos costados

13-04-21 Kr 9 X calle 127

Se realiza construccion de andenes en concreto, bordo para sardineles, cruce de vehiculos costados occidental y separador.

88

12 14-04-21 Kr 12 x TV 42

Se realiza construccion de cajas cuneta nor oriental - sur oriental

7-c 15-04-21 Kr 12 x TV 42

Se realiza construccion de cajas cuneta nor occidental, se realiza instalacion de dichos 3" cuneta sur occidental y nor oriental

Kr 12 x TV 42

16-04-21 Se realiza demolicion anden concreto cuneta nor oriental

Kr 12 x TV 42

17-04-21 Se realiza instalacion de dichos de 3" cuneta nor oriental

8.

19-04-21 Kr 12 x TV 42

Se realiza conformacion de terreno en base granular cunetas nor oriental, sur oriental

9.

20-04-21 TV 42 x Kr 12

Se realiza instalacion de cerco y tapial costado sur oriental, se realiza demolicion de anden concreto costado sur occidental

21-04-21 TV 42 x Kr 12

Se realiza instalacion de cerco y tapial costado sur oriental y nor oriental

22-04-21 TV 42 x Kr 12

Se realiza excavacion desalojo, construccion de anden concreto 3000 psi costados sur oriental, nor oriental y nor occidental

23-04-21 TV 42 x Kr 12

Se realiza construccion anden concreto 3000 psi, excavacion desalojo costado sw oriental.

2 24-04-21 TR 42 x KV 12

Se realiza construccion anden concreto 3000 PSI costado SW oriental

DG x

7-

Se realiza perforacion horizontales costados SW - norte

25-04-21 TR 42 x KR 12

Se realiza conformacion de terreno con base granular costado SW oriental

8

DG x

Se realiza perforacion horizontal costados nor occidental y SW occidental
Se realiza construccion de cajas y instalacion de ductos costados occidental oriental

9

26-04-21 TV 42 X KV 12

Se realiza configuracion de troncal costados SW oriental

DG X

Se realiza construccion de cajas dobles costados occidental, se realiza instalacion de dichos costados occidental y oriental

27-04-21 TV 42 X KV 12

Se realiza desolicion de anclaje concreto costados SW oriental

DG X

Se realiza excavacion para instalacion de dichas J" para conectar cajas de paso costados SW, norte

12 28-04-21 TV 42 x Kr 12

Se realiza conformacion de anden concreto contiguo sw oriental, se realiza instalacion de cerfa contiguo oriental

7- D6 x

1. Se realiza construccion de cajas de bolos y sumideros contiguo sw, oriental norte oriental

29-04-21 TV 42 x Kr 12

i Se realiza construccion de anden concreto 3000 psi, construccion de bases para sumideros, ensayo de cilindros contiguo sw oriental

8

D6 x

Se realiza excavacion para instalacion de ductos y contiguos sw, norte

i

9

ANEXO 7. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL – SGSS

Identificación	1077425387	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3116397504
Razón Social	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS	Dirección	calle 64c #113c-45	Fecha Pago	23/04/2021
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Marzo-21
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	No. Planilla	50113663	Periodo Pensión	Marzo-21
Total a Pagar	$348,300	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

compensar | miplanilla.com

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	1	$1,200,000	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0		$192,000
Totales				$1,200,000	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0		$192,000

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$1,200,000	$150,000	$0	$0		$0		$0		150000	$150,000
Totales				$1,200,000	$150,000	$0	$0		$0		$0		$150,000	$150,000

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	1	$1,200,000	$6,300	$0				6300	$6,300

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2021-05-04, 03:20:44 PM **Tipo Planilla:** Planilla independientes: Planilla independientes **Número Planilla:** 1036898688

Periodo Cotización: marzo de 2021

Periodo Servicio: marzo de 2021

PAGADO 16/04/2021

Filtro Seleccionado
Ubicación Laboral CUNDINAMARCA

Datos del Aportante

Razón Social	OSCAR EDUARDO VALLES MAYORGA		
Documento	CC79220093	**Dirección**	CR 8A #22 - 38 BARRIO LA CAÑADA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8211961
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 150.000	$ 0	$ 150.000
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0
Total Pagado				$ 342.000	$ 0	$ 342.000

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral CUNDINAMARCA. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830123577	7	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 71a No 52a 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2109456	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	968325768	9419049828	Y	2021/05/20	2021/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$1,354,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (27 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$19,593,880	$1,354,100		$0	$0		$1,354,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (27 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$19,593,880	$1,354,100		$0	$0		$1,354,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$19,593,880	$1,354,100		$0	$0		$1,354,100
1	CC	1032483095	AROS JOHN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
2	CC	1110552576	ASPRILLA IVONNE	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	20	$605,684	$42,200	0	$0	$0	No	$42,200
3	CC	1073164894	BERMUDEZ JEISSON																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
4	CC	1010208109	CALDERON BRYAN	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
5	CC	1024565324	CELY ANDERSON																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
6	CC	1126123418	CHACIN FABIAN		X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	7	$211,990	$14,800	0	$0	$0	No	$14,800
7	CC	1019079604	GAMBA MARIA		X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	23	$696,537	$48,500	0	$0	$0	No	$48,500
8	CC	1032423173	GARZON KARLA	X	X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	14	$423,979	$18,500	0	$0	$0	No	$18,500
9	CC	1077425387	GOMEZ MELIZA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
10	CC	1023902943	GONZALEZ ERIKA		X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	23	$696,537	$48,500	0	$0	$0	No	$48,500
11	CC	1023966874	GUANUMEN DUVAN	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	19	$575,400	$40,100	0	$0	$0	No	$40,100
12	CC	80018145	HERNANDEZ EDGAR		X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	10	$302,842	$21,100	0	$0	$0	No	$21,100
13	CC	1054681093	HURTADO LUIS		X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	7	$211,990	$14,800	0	$0	$0	No	$14,800
14	CC	1014281123	LOPEZ FABIAN	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	20	$605,684	$42,200	0	$0	$0	No	$42,200
15	CC	80250114	MARROQUIN EDWIN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
16	CC	1000001825	OLARTE MABEL	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	20	$605,684	$42,200	0	$0	$0	No	$42,200
17	CC	1026260474	PINEDA LUZ																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
18	CC	1012213978	RAMIREZ DANIEL	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	20	$605,684	$42,200	0	$0	$0	No	$42,200
19	CC	1073604410	RAMIREZ DIEGO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
20	CC	1023008356	RAMIREZ JHON																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
21	CC	1023873559	RINCON JUAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
22	CC	19465978	RIVERA NELSON																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
23	CC	74082212	SALAMANCA OSCAR																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
24	CC	1012420278	SERNA DIANA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
25	CC	1032398724	TORRES LEIDY		X																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	24	$726,821	$50,600	0	$0	$0	No	$50,600
26	CC	1000219416	TORRES YESID	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	20	$605,684	$42,200	0	$0	$0	No	$42,200
27	CC	79220093	VALLES OSCAR																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		14-7	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0	No	$63,300
Total			**Afiliados(27)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$19,593,880	$1,354,100		$0	$0		$1,354,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2021/04/26 10:02 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830123577	7	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 71a No 52a 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2109456	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	968325768	9419049828	Y	2021/05/20	2021/04/26	BANCO AV VILLAS	0	$1,354,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	27	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100
TOTAL				27	$1,354,100	$0	$0	$1,354,100

2021/04/26 10:02 AM

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-05-02, 05:57:02 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 49048153

Periodo Cotización 202103 **Periodo Servicio** 202103

PAGADA 2021-04-15 13:43:35.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CAROLINA SERNA HERRERA				
Documento	CC 1012420278	Dirección	CL 72C SUR #78 C - 27		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3973021		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00				N	SERNA HERRERA DIANA CAROLINA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 I - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2021-04	2021-03	E	27/04/2021	50084260	TOTAL A PAGAR	
					$554.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	74.900				74.900	0	0	74.900			749	74.900	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	80.000	0	0	80.000	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	74.900	74.900
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	554.900	554.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	27/04/2021	50084260	$554.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en Exter.	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1129577194	ESCOBAR CASTILLO KATHERINE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	80736892	GARCIA ANGULO EDWIN GONZALO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

081

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado con **CC** número **1019079604**, aportó en nombre de **MARIA CAMILA GAMBA OSPINA**, identificado(a) con **CC** número **1019079604** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2021-03** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar															0		30	$1.000.000	$20.000	$0	$0	Marzo - 2021	49395682	12/04/2021	N
EPS008	Compensar EPS															0		30	$1.000.000	$125.000	$0	$0	Marzo - 2021	49395682	12/04/2021	N
230301	Porvenir															0		30	$1.000.000	$160.000	$0	$0	Marzo - 2021	49395682	12/04/2021	N

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Abril de 2021

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Semaforizacion	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	27/04/2021	50084266	$3.651.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	89.900	0		0		0	0	0	0	89.900	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	41.300	0		0		0	0	0	0	41.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	159.100	0		0		0	0	0	0	159.100	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	441.100	0	0	0	0	0	0		441.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.008.400	0	0	0	0	0	0		1.008.400	10
231001	Colfondos	800227940-6	436.200	0	0	0	0	0	0		436.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	821.000				821.000	0	0	821.000			8.210	821.000	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	472.300	0	0	472.300	17

PAGADA

280

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.		Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025550	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Semaforizacion	002	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				17	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	27/04/2021	50084266	$3.651.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	472.300	472.300
Pensión	3	1.885.700	1.885.700
Riesgos Laborales	1	821.000	821.000
CCF	1	472.300	472.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.651.300	3.651.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901136388-5	G&G Ingenieros Asociados S.A.S.	Calle 53 # 85 i - 93 Piso 1	7025650	gygingenierosasociados@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Semaforizacion	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-03	E	27/04/2021	50084266	$3.651.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022319449	ZAMBRANO GOMEZ UBALDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1007964776	PEREZ PALACIN CARLOS ENRIQUE	1	0			S	X																230301	696.537	111.500	0	0	0	0	EPS002	696.537	27.900	14-11	696.537	5	48.500	CCF24	696.537	27.900	0	0	0	0	0
3	CC	1016021481	SANCHEZ RUIZ GUSTAVO ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1024509395	DIAZ MERCADO JUAN RAFAEL	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1024530831	RAMIREZ BEDOYA ALEXANDER	1	0			S		X															230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS002	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
6	CC	1026550962	GAMBA SANCHEZ VICTOR ALFONSO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	62.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	1033731884	HERNANDEZ MESA DAIRO LUIS	1	0			S		X															230301	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS017	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
8	CC	1049895146	ZAMBRANO JIMENEZ YAMITH	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC07	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	1085998423	RICO CAÑAS MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	605.684	97.000	0	0	0	0	EPS002	605.684	24.300	14-11	605.684	5	42.200	CCF24	605.684	24.300	0	0	0	0	0
10	CC	1097990326	ROBLES ARIAS RICARDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC07	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	1101449583	JULIO ZARTA JOSE JAVIER	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC33	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	7624440	CEPEDA GARCIA LUIS ANTONIO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	85271049	CHAVEZ CAÑA JOSE ANGEL	1	0			S		X															230301	302.842	48.500	0	0	0	0	EPS017	302.842	12.200	14-11	302.842	5	21.100	CCF24	302.842	12.200	0	0	0	0	0
14	CC	85272792	CHAVEZ CAÑA WILFRAN	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
15	CC	91536053	OLIVEROS PEREZ ESTEVENSON	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
16	PE	9515850260010 91	SOTO GARCIA RAFAEL ANTONIO	1	0			S		X															230201	30.285	4.900	0	0	0	0	EPS008	30.285	1.300	14-11	30.285	5	2.200	CCF24	30.285	1.300	0	0	0	0	0
17	PE	9525250300310 85	LEON FANDIÑO DUGLAS EDUARDO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-04-16, 12:36:00 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1036583682

Periodo Cotización 202103 **Periodo Servicio** 202103

PAGADA 2021-04-14 16:12:03.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ STELLA PINEDA BUSTOS				
Documento	CC 1026260474	**Dirección**	CL 63 SUR #64 - 90 APARTAMENTO 217 INT 5		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102880634		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1026260474		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					PINEDA BUSTOS LUZ STELLA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.200.000	230201		16 %	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.200.000	$ 150.000	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.200.000	$ 12.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 8. VIGIA SST

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

Fecha	26–04– 2021
Numero de acta	13
Hora de inicio	3: 00 pm
Hora finalización	05: 00 pm

ORDEN DE LA REUNIÓN

Verificación del quórum. (Se debe realizar la reunión entre el vigía de SST, el líder del SG-SST y el representante legal de la empresa)	**Cumple ___X___**	**No cumple _____**
Lectura del acta anterior (Se deben revisar los temas planteados en el acta anterior con el fin de realizar seguimiento).	**Cumple ___X____**	**No cumple _____**

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

DESARROLLO DE TEMAS DEL SG-SST

Accidentalidad: Durante lo corrido del mes de Abril de 2021 no se presenta ningún tipo de evento de origen laboral que haya sido reportado a la ARL, las curvas de tendencia de la accidentalidad se mantienen en 0%,

Para lo corrido del mes de Abril se inician los frentes de obra de semaforización, por ende, se continua con la implementación del protocolo de bioseguridad, se realiza nueva entrega de termómetros digitales, de acuerdo con el reporte remitido por la obra se instalan lavamanos portátiles en, Calle 182 x KR 50, KR 9 x calle 127, TV 42 x calle 12,KRA 116 X DG 15, CRA 104 X CALLE, CRA 50 X CALLE 24, KRA 97 X DG 16 (Emergencia).

En la oficina se continua con la implementación del protocolo a cabalidad

se verifican las inspecciones realizadas en obra. Sin ninguna novedad.

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	TEMA PROPUESTO

COMPROMISOS

Ingeniería & Proyectos	ACTA DE REUNIÓN VIGÍA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST - 7 – 1 V02 Creado: 16 – 03 – 2017 Actualizado: 07 – 09 – 2019

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIEGO FELIPE LOPEZ	VIGIA SST	
CAMILO ROSARIO	REPRESENTANTE LEGAL	

ANEXO 9. CAPACITACIONES

087

ACR Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	Abril 8/21	**LUGAR:**	obra / oficina
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Carolina Serna	**DOCUMENTO ID**	1012420270

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación	x	Trabajo en equipo
Capacitación		
Capacitación		
Capacitación		
Otra		

OBJETIVO:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	[illegible]	1007864776	AYUDANTE	[illegible]	
2	[illegible]	7-924.1410	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	1049990326	AYUDANTE	[illegible]	
4	[illegible]	1002319441	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	85 271 049	Auxiliar	[illegible]	
6	[illegible]	1065 998 423	AY	[illegible]	
7	[illegible]	1.101.449583	Ay	[illegible]	
8	[illegible]	1096244052	[illegible]	[illegible]	
9	[illegible]	80032500	[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	1044509395	[illegible]	[illegible]	

880

ACR Ingeniería & Proyectos	REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	Abril/8/21	LUGAR:	obra / oficina
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Carolina Serna	DOCUMENTO ID	1012420270

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Capacitación	X	Trabajo en equipo
Capacitación		
Otra		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Edwin Garcia	80739892.	Director O		
2	Meliza Tanez	1077425387	Residente		
3	M Camila Gamba	1019079604	Aux de Ing	M.Camila	
4	Stella Pineda	1026260474	Tec Ing SISO	Stella P	
5	Oscar Valles	79220093	Inspector. O.	Oscar V	
6					
7					
8					
9					
10					

ACR Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	14/Abril/2021	**LUGAR:**	Obra/ Oficina
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Elizabeth. Pineda	**DOCUMENTO ID**	1032450451

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación	X	Gestion de los RCD generados en el Proyecto
Capacitación		
Capacitación		
Capacitación		
Otra.		

OBJETIVO:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Duvro Hernandez	1037737804	Oficial	Duvro_H	
2	Jose Rafael Diaz M.	1024509395	oficial		
3	Yamith Zambrano J	1.049.895.146	Ayudante		
4	Edwinson Olivero Pérez	9153605			
5	Darlos Enrique Perez Pavajeau	1007864746	Ayudante		
6	Luis Antonio Cepeda Garcia	7.922.012	Maestro de obra		
7	Ricardo Robles Arias	1097990326	Ayudante		
8	Hibaldo Zambrano	1002719469	Ayu		
9	Jose Angel Olivez	85201044	Auxiliar	Jose Angel	
10	miguel Angel	1065998423	Ay	miguel Angel	

ACSR Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	14/Abril/2021	**LUGAR:**	Obra/oficina
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Elizabeth Pineda	**DOCUMENTO ID**	1032450451

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación	x	Gestión de los RAP generados en el Proyecto
Capacitación		
Otra		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Edwin Garay	80739892	Director O		
2	Meliza Jan-2	1077425389	Residente		
3	M Camila Gamba	1019 c79604	Aux de Ing	M Camila G.	
4	Stella Pineda	1026260434	Tec Ing SISO	Stella P	
5	Oscar Valles.	79220093	Inspector O	Oscar V	
6	Carolina Jerna	1018420298	Prof SST		
7					
8					
9					
10					

Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act 04 - 04 - 2019

FECHA:	21/Abril/2021	**LUGAR:**	obra/oficina
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	cardina Jerna	**DOCUMENTO ID**	10124202[illegible]

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación	V	Importacia Protocolos de bioseguridad
Capacitación		toma de temperatura termometro digital
Capacitación		
Capacitación		
Otra		

OBJETIVO:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Carlos Enrique Perez Pulido	1004364476	ayudante	carlos	
2	Luis Antonio Tapia Co	1.101.449.[illegible]	Maestro de b.		
3	Ricardo Robles Arias	1097910326	Ayudante		
4	Hibaldo Zambrano	1002[illegible]	AYU	Hibaldo	
5	Jose Angel Chuiro	85 221 024	Ayudante	Jose Angel	
6	miyael Angel	1065998422	Ay	miguel Angel	
7	José Javier Julio Zarza	1.101.449583	Ayudante	José Javier	
8	Jesus Urango	1096744058	Ayudante	Jesus	
9	adrian Pleche	80032200	oficial		
10	JUAN DIAZ.	1024509395	OFICIAL.		

060

ACR Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	21/Abril/2021	**LUGAR:**	Obra / oficina
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Carolina Serna	**DOCUMENTO ID**	1012420226

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación	x	Importancia de los Protocolos de Bioseguridad toma de temperatura termometro digital
Capacitación		
Otra		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	Edwin Garcia		Director O.		
2	MEJIA JAVEZ		Residente.		
3	M Camila Gamba		Aux Ing	M. Camila G.	
4	Stella Pinzon		Tecn Ing Sig	Stella P.	
5	Oscar Valles		Inspector O	Oscar V	
6					
7					
8					
9					
10					

ANEXO 10. INDICADORES

091

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso - Plan de Capacitación
DEFINICION DEL INDICADOR	Indicador que evalua el Proceso del SG SST en cuanto al Cumplimiento del Plan de Capacitación
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☒ RESULTADO ☐
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se mediex anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICION
Cronograma de capacitación	(Numero de Capacitaciones Ejecutadas / Numero de Capacitaciones Programadas)*100	90%	Mensual	Representante del SGSST


MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANÁLISIS 2021

VARIABLES	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	ANALISIS DE DATOS
Numero de Capacitaciones Ejecutadas	3	3	3	3	3	3	2	2					
Numero de Capacitaciones Programadas	30	3	3	3	3	3	2	2					

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

GRAFICA



CARGOS QUE DEBEN CONOCER LOS RESULTADOS : ALTA DIRECCIÓN : Gerencia General y COPASST

PLANES DE ACCION INMEDIATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo
DEFINICION DEL INDICADOR	Indicador que evaluara el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto a la frecuencia de ocurrencia de accidentes de trabajo
INTERPRETACION DEL INDICADOR	El Indicador así calculado se interpreta como el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este Indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DEL MEDICION
Base de datos de accidentalidad	(Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes /numero de trabajadores en el mes)*100	0,05	Mensual	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR


PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0				
NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES	17	22	37	30	46	22	25	24				

ANALISIS DE DATOS

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
META	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evaluua el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto a la severidad de los accidentes de trabajo ocurridos
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	El indicador así calculado se interpreta como el número de días perdidos o cargados por accidentes de trabajo en el mes
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☒
A QUIEN SE LE DATA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADA	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICION
Base de datos de accidentalidad	((Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de días cargados en el mes) / numero de trabajadores en el mes) *100	0,05	Mensual	Representante del SGSST


MEDICIÓN DE INDICADORES

PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
numero de trabajadores en el mes	17	22	37	30	46	22	25	24				
Número de días perdidos de incapacidad por accidente	0	0	0	0	0	0	0	0				

VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
VALOR REAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
META	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado Indice de Mortalidad de Accidentes de Trabajo
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Indicador que evaluan el Proceso y Resultado del SG SST en cuanto al Numero de accidentes mortales ocurridos en el año
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	El indicador esl calculado se interpreta como el numero de AT mortales en el año
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☒ RESULTADO ☐
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Este indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	EQUIPO META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCION
Base de datos de accidentalidad	(Numero de accidentes mortales que se presentaron en el año /total de accidentes presentados en el año) * 100	0,00	Anual	Representante del SGSST


DESCRIPCIÓN DE INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	ENE - DIC
total de accidentes presentados en el año	0
Numero de accidentes mortales que se presentaron en el año	0

VARIABLES	ENE - DIC
VALOR REAL	0,0
META	0,00

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Prevalencia de la enfermedad laboral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Numero de casos de enfermedad laboral presentes en una poblacion en un periodo de tiempo
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA | | PROCESO | | RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Esto indicador se medire anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0%	Semestral	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS : 2021

VARIABLES	ENE - DIC
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z")* 100000	0
VALOR REAL	0%
META	0%

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Incidencia de enfermedad laboral
DEFINICION DEL INDICADOR	Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en una poblacion determinada en un periodo de tiempo
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Esta indicador se medira anualmente

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


FUENTE DE LA INFORMACION PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	ENVIO O RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z") * 100000	0%	ANUAL	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANALISIS 2021

VARIABLES	ENE - DIC
(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "z" / promedio de trabajadores en el periodo "z") * 100000	0
VALOR REAL	0%
META	0%

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de Proceso y Resultado - Ausentismo por causa medica
DEFINICION DEL INDICADOR	Ausentismo es la no asistencia al trabajo por incapacidad medica
TIPO DE INDICADOR	ESTRUCTURA ☐ PROCESO ☐ RESULTADO ☑
A QUIEN SE LE DARA A CONOCER	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia general y Trabajadores.
FRECUENCIA DE MEDICION	Este indicador se medira Mensual

SEGUIMIENTO Y MONITOREO


FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL	METODO DE CALCULO	LIMITE O META INDICADOR	PERIODICIDAD REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE LA MEDICION
Indice de Accidentes y Enfermedades	(Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programdos en el mes) * 100	0%	MENSUAL	Representante del SGSST

MEDICION DE INDICADOR

PERIODO DE ANÁLISIS 2021

VARIABLES	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21
(Numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programdos en el mes) * 100	0	0	0	7	3	0	0	0				
	28	25	23	24	26	24	27	26				
VALOR REAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	342,8571	866,66667	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
META	80%											

GRAFICA



ANALISIS DE DATOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE


ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA No.	01
OBSERVACIONES	
Entrega de termometro	



FOTOGRAFÍA No.	02
OBSERVACIONES	
Lavado de manos	

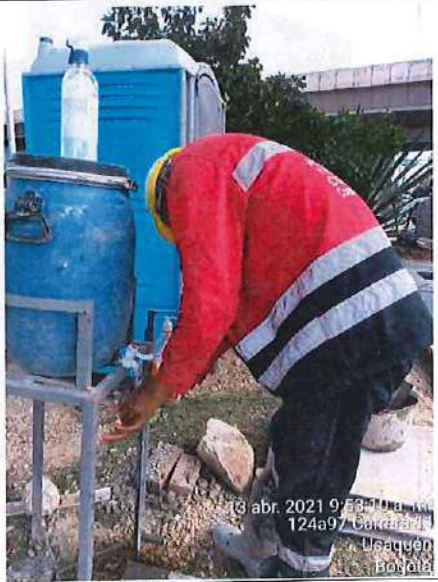


FOTOGRAFÍA No.	03
OBSERVACIONES	
Lavado de manos	



FOTOGRAFÍA No.	04
OBSERVACIONES	
Lavamanos y Baño	

			
FOTOGRAFÍA No.	05	**FOTOGRAFÍA No.**	06
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
Protección de sumideros		Protección de sumideros	


			
FOTOGRAFÍA No.	07	**FOTOGRAFÍA No.**	08
Entrega de termómetros		Entrega de termómetros	

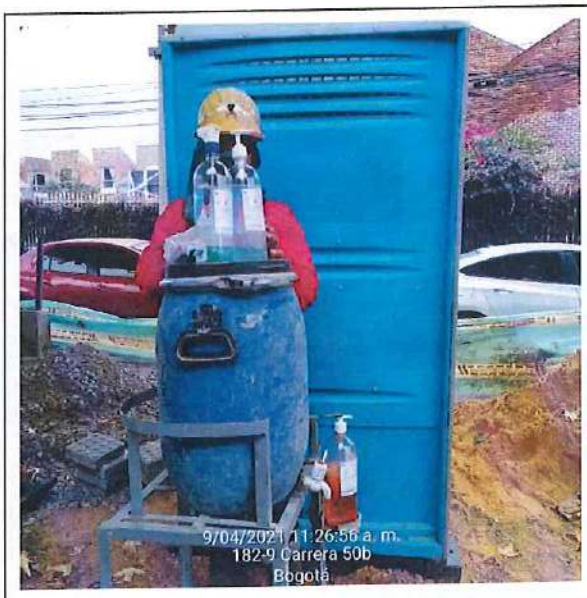

FOTOGRAFÍA No.	09
OBSERVACIONES	
Lavamanos y Baño	



FOTOGRAFÍA No.	10
OBSERVACIONES	
Lavamanos y Baño	

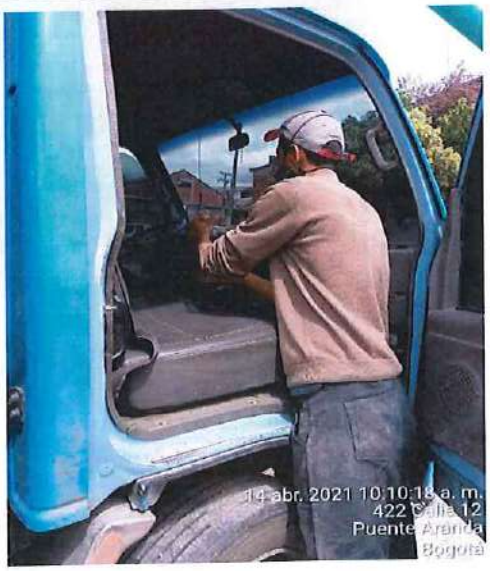

FOTOGRAFÍA No.	11
OBSERVACIONES	
Desinfección de vehículo	



FOTOGRAFÍA No.	12
OBSERVACIONES	
Lavamanos y Baño	



FOTOGRAFÍA No.	13
OBSERVACIONES	
Lavado de intersección	




FOTOGRAFÍA No.	14
OBSERVACIONES	
Lavado de intersección	



FOTOGRAFÍA No.	15
OBSERVACIONES	
Lavado de intersección	



FOTOGRAFÍA No.	16
OBSERVACIONES	
Lavado de intersección	

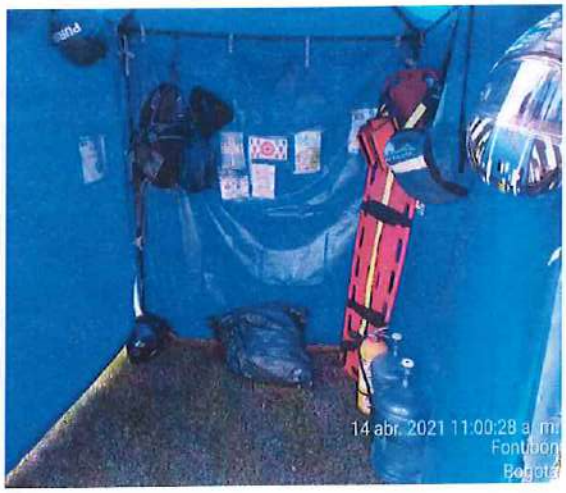


FOTOGRAFÍA No.	17
OBSERVACIONES	
Punto SST	



FOTOGRAFÍA No.	18
OBSERVACIONES	
Lavamanos	




FOTOGRAFÍA No.	19
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	

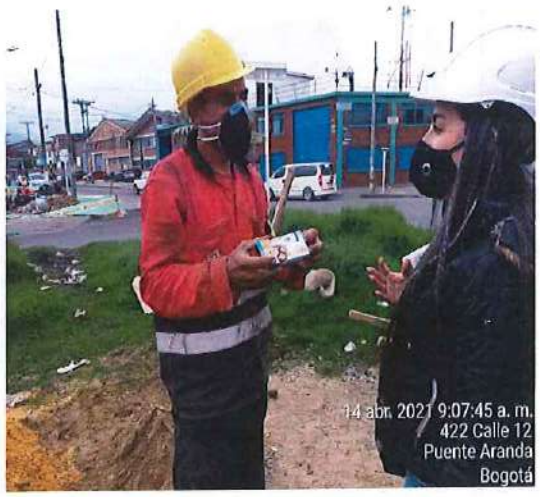

FOTOGRAFÍA No.	20
OBSERVACIONES	
Entrega de Termómetro	



FOTOGRAFÍA No.	21
OBSERVACIONES	
LAVADO DE MANOS	

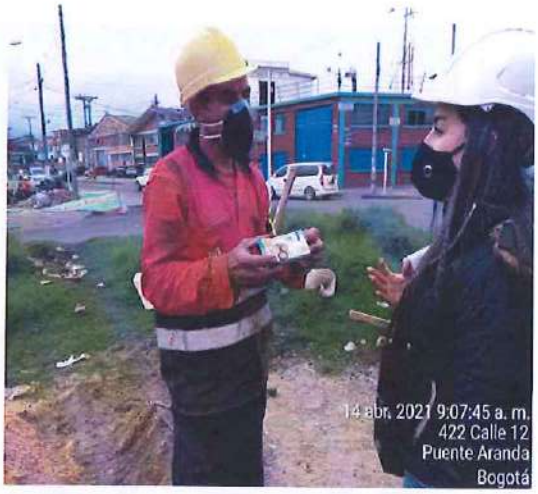

FOTOGRAFÍA No.	22
OBSERVACIONES	
Entrega de Termómetro	



FOTOGRAFÍA No.	24
OBSERVACIONES	
Lava manos y punto SST	



FOTOGRAFÍA No.	25
OBSERVACIONES	
Lavado de manos	

ANEXO 12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1. GESTIÓN DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.

			
LUGAR	TV 42 X CLL 12	**LUGAR**	TV 42 X CLL 12
Implementación PMT		**Implementación PMT**	

			
LUGAR	KR 50B X CLL 182	**LUGAR**	KR 50B X CLL 182
Implementación PMT		Implementación PMT	



LUGAR	KR 9 X CLL 127

Implementación PMT



LUGAR	KR 9 X CLL 127

Implementación PMT



LUGAR	Kr 116 X DG 16

Implementación PMT



LUGAR	KR 116 X DG 16

Implementación PMT

2. MANEJO DE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN

	
LUGAR: BODEGA	LUGAR: BODEGA
Almacenamiento seguro de material	Almacenamiento seguro de material en bodega

	
LUGAR: BODEGA	LUGAR: BODEGA
Almacenamiento seguro de material	Almacenamiento seguro de material

	
LUGAR: BODEGA	LUGAR: BODEGA
Almacenamiento seguro de material	Almacenamiento seguro de material

3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS

	
LUGAR:	LUGAR:
Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados	Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados

	
LUGAR	LUGAR
Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados	Vehículos de transporte de materiales y escombros debidamente carpados

4. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓNYDEMOLICIÓN

RCD APROVECHABLES - I - Residuos mezclados: 1.Residuos pétreos

	
LUGAR	LUGAR
Se realiza disposición en escombrera autorizada	Se realiza disposición en escombrera autorizada

RCD APROVECHABLES - III- Otros Residuos 2. Residuos de carácter Metálico Acero, hierro, cobre, aluminio, Estaño y zinc.



FECHA	01/03/2021
LUGAR	Calle 99#61-49

Se realiza almacenamiento temporal en bodega hasta completar mínimo 20 kg

RCD NO APROVECHABLES- VI- Residuos contaminados con otros residuos Bolsas de cemento, recipientes de pintura y solventes.




FECHA	01/03/2021
LUGAR	Calle 99#61-49


Se realiza almacenamiento temporal en bodega de tapas por demoler, posteriormente se hará disposición del material de hierro y acero

OTROS RESIDUOS - Se realiza disposición en las canecas dispuestas por la alcaldía de Bogotá para recolección de residuos.

5. REPPORTE DE RCD – APLICATIVO WEBSDA

Se realiza cargue de información del mes de Febrero en aplicativo web de la SDA.

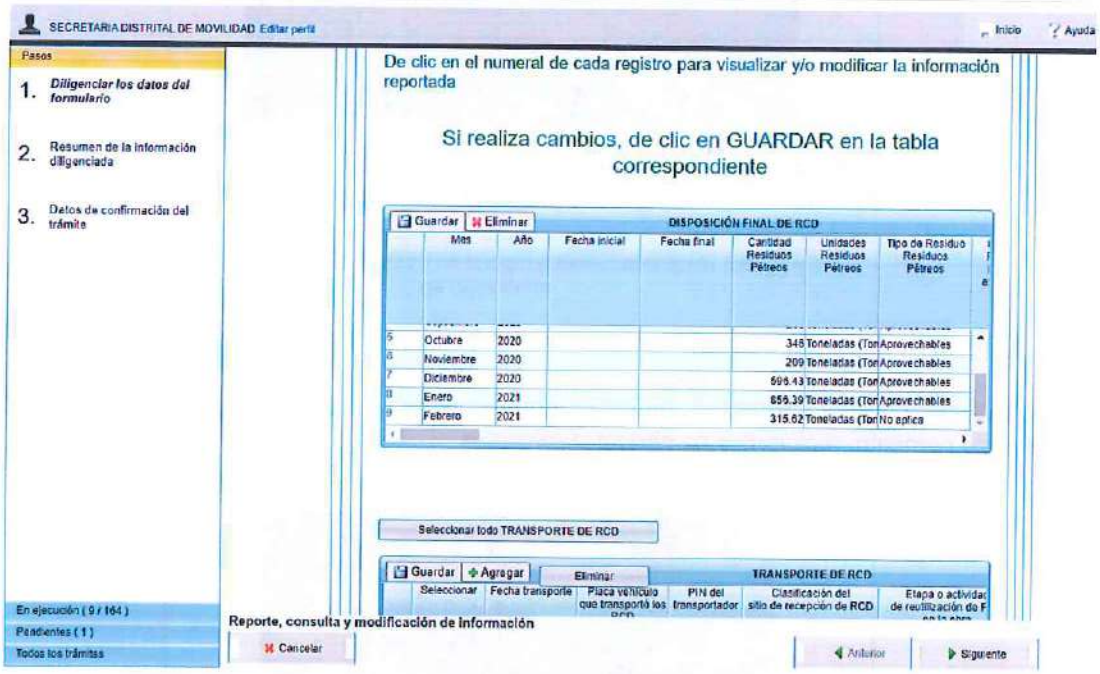

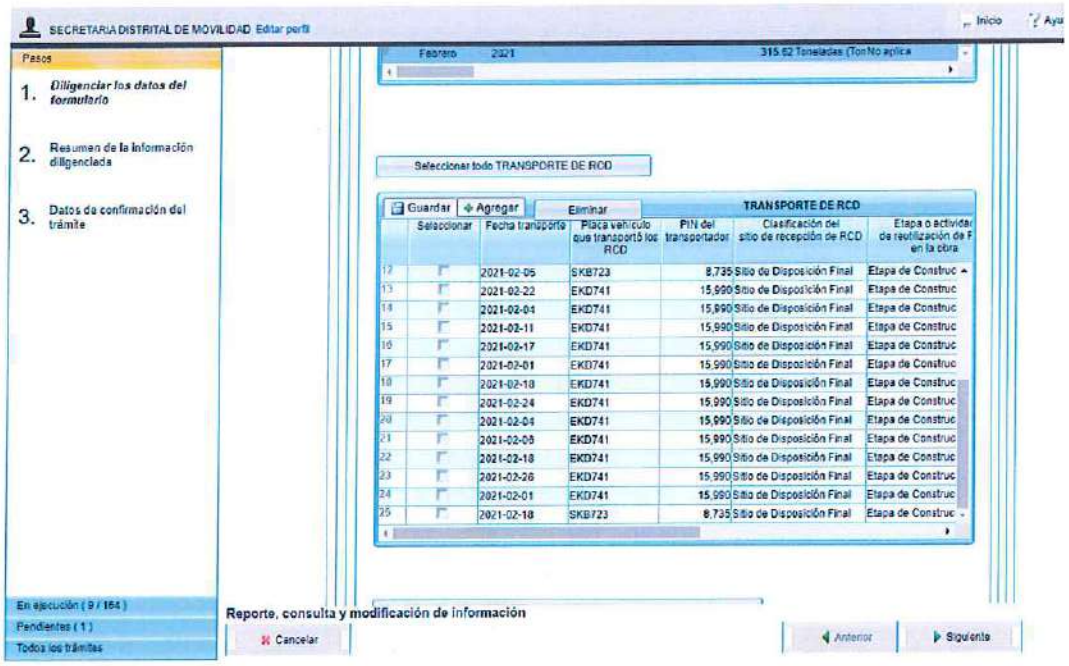
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Editar perfil
Inicio
Ayu
Pasos
1. Diligenciar los datos del formulario
2. Resumen de la información diligenciada
3. Datos de confirmación del trámite
Febrero 2021 315.62 Toneladas (Ton No aplica
Seleccionar todo TRANSPORTE DE RCD
Guardar
Agregar
Eliminar
TRANSPORTE DE RCD
Seleccionar
Fecha transporte
Placa vehículo que transportó los RCD
PIN del transportador
Clasificación del sitio de recepción de RCD
Etapa o actividad de reutilización de F en la obra
12 2021-02-05 SKB723 8,735 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
13 2021-02-22 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
14 2021-02-04 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
15 2021-02-11 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
16 2021-02-17 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
17 2021-02-01 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
18 2021-02-18 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
19 2021-02-24 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
20 2021-02-04 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
21 2021-02-08 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
22 2021-02-18 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
23 2021-02-26 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
24 2021-02-01 EKD741 15,990 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
25 2021-02-18 SKB723 8,735 Sitio de Disposición Final Etapa de Construc
En ejecución (9 / 164)
Pendientes (1)
Todos los trámites
Reporte, consulta y modificación de información
Cancelar
Anterior
Siguiente

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

Gmail

Camilo andres Rosario Rubio <semaforizacionac2r@gmail.com>

Solicitud de certificados Febrero

2 mensajes

Camilo andres Rosario Rubio <semaforizacionac2r@gmail.com> 09 de marzo de 2021, 11:32
Para: Angie Katherine Pulido Buitrago <angiekatherine.pulido@cemex.com>

Cordial saludo,

Adjunto los documentos solicitados para la respectiva certificación de disposición de escombros

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

--

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

3 adjuntos

- SOLICITUD DE CERTIFICACION CEMEX 2021.pdf 68K
- FOLIOS.xlsx 11K
- Remisiones febrero.pdf 4361K

Camilo andres Rosario Rubio <semaforizacionac2r@gmail.com> 5 de abril de 2021, 15:12
Para: Angie Katherine Pulido Buitrago <angiekatherine.pulido@cemex.com>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

- SOLICITUD DE CERTIFICACION CEMEX 2021.pdf 68K
- FOLIOS.xlsx 11K
- Remisiones febrero.pdf 4361K

ANEXO 13. MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS

TRABAJOS

Ubicación:

ACTIVIDAD RUTINARIA - TEMPORIZACIÓN

PROCESO	LUGAR DONDE SE DESARROLLA	ACTIVIDAD	CARGOS ACTIVIDAD RUTINARIA	CARGOS ACTIVIDAD NO RUTINARIA	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: PELIGRO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES: FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	EVALUACIÓN DEL RIESGO: ND	NE	NP	Exc. NP	NC	NR	Exc. NR	VALORACIÓN DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: NUMERO DE EXPOSITORES	PEOR CONSECUENCIA	EXPOSICIÓN DE TRABAJADORES (MAS DE 10 TRABAJADORES)	CONTRATACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	MEDIDAS DE INTERVENCION: SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMON	EQUIPOS Y EPP

ANEXO 14. INSPECCIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código: F INS 15-7 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Calle 182 x 50B	Operador	Jose Angel chavez
Marca:		Ayudante:	Yoiner Javier Julio.
Modelo:		Fecha:	3/Sept/2021
Serial:		Inspector:	Carolina Jorra

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
2	Ventilación		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4	Gafas de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
5	Protección auditiva		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
6	Casco de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
7	Tapabocas		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
8	Overol		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
9	Botas de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	Equipo															
10	Extensión electrica		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
11	Disco de corte		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
12	Guarda		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
13	Manija de sujección		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
14	Cracaza		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
15	Encendido		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
16	Cable		✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI / NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-5 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	TRANSV 42 x calle 12.	**Operador**	Jafet Angel Chalata
Marca:		**Ayudante:**	Khalid Jimbrano.
Modelo:		**Fecha:**	15/04/2021
Serial:		**Inspector:**	Carolina Jurna

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
2	Ventilación		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4	Gafas de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
5	Protección auditiva		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
6	Casco de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
7	Tapabocas		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
8	Overol		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
9	Botas de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	Equipo															
10	Tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
11	Silenciador de escape		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
12	Conexión a tierra		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
13	Enchufe/conexión AC		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
14	Filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
15	Manija de arranque		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
16	Llave de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
17	Ahogador		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
18	Estructura de soporte		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
19	Bujía		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
20	Tapa del combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
21	Interruptor automático de protección AC		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
22	Contenedor de aceite		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
23	Interruptor de encendido		✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI / NO

Responsable Inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CANGURO	Código: F INS 15-11 Versión: 01 Fecha: 02/02/18

Ubicación:	Manz 12 x 12	**Operador**	Jose Angel Chaves
Marca:		**Ayudante:**	Cristian Zambrano.
Modelo:		**Fecha:**	16/9/21
Serial:		**Inspector:**	Cristina Serna

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓		✓		✓							
2	Ventilación		✓		✓		✓		✓							
3	Superficie base granular		✓		✓		✓		✓							
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓		✓		✓							
4	Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓							
5	Protección auditiva		✓		✓		✓		✓							
6	Casco de seguridad		✓		✓		✓		✓							
7	Tapabocas		✓		✓		✓		✓							
8	Overol		✓		✓		✓		✓							
9	Botas de seguridad		✓		✓		✓		✓							
	Equipo															
10	Motor		✓		✓		✓		✓							
11	Tanque de combustible (Sin fugas)		✓		✓		✓		✓							
12	Palanca acelerador		✓		✓		✓		✓							
13	filtro de aceite		✓		✓		✓		✓							
14	valvula de drenaje		✓		✓		✓		✓							
15	zapata		✓		✓		✓		✓							
16	silenciador		✓		✓		✓		✓							
17	palanca de compresion		✓		✓		✓		✓							
18	Manilla de arranque		✓		✓		✓		✓							
19	Manija de sujeción		✓		✓		✓		✓							
20	Fuelle		✓		✓		✓		✓							

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspección

Responsable uso

PREOPERACIONAL COMPRERSOR

Código:	IN 15-2
Versión:	01
Fecha:	27/06/2020

Ubicación:	Trans 42 X cll 72	**Operador**	Daniel León
Marca:		**Ayudante:**	Jair Javier Julio
Identificación:		**Fecha:**	16/04/21
Inspector:		SEMANA	

Ítem	Descripción		DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		D
		No Aplica	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
	Condiciones del area de trabajo														
1	Orden y aseo		✓		✓		✓								
2	Ventilación		✓		✓		✓								
3	Superficie nivelada		✓		✓		✓								
	EPP														
4	Guantes de vaqueta		✓		✓		✓								
1	Gafas de seguridad		✓		✓		✓								
5	Protección auditiva		✓		✓		✓								
2	Casco de seguridad		✓		✓		✓								
6	Tapabocas		✓		✓		✓								
3	Overol		✓		✓		✓								
7	Botas de seguridad		✓		✓		✓								
	Equipo														
8	Puerta de acceso del panel de instrumentos		✓		✓		✓								
9	Elemento del separador y punto de llenado		✓		✓		✓								
10	Punto de llenado de aceite del motor		✓		✓		✓								
11	Punto de llenado de la botella de refrigerante		✓		✓		✓								
12	Punto de llenado de combustible		✓		✓		✓								
13	Filtro de aceite del motor		✓		✓		✓								
14	Salida de aire del paquete		✓		✓		✓								
15	Barra de tiro		✓		✓		✓								
16	Indicadores de aceite de motor refrigerante		✓		✓		✓								

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ NO

Responsable Inspeccion

Douglas León

Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Kra 9 X Calle 127.	Operador	Carlos Perez
Marca:		Ayudante:	Miguel Rico
Modelo:		Fecha:	2/6/2021
Serial:		Inspector:	Carolina Serna

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado		✓		Se mejora la capacitación de manera inmediata.
	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
	Otros				

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspeccion

Carlos Perez
Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR		Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Km 116 X Dg 15.	Operador	Juan Diaz
Marca:		Ayudante:	Ricardo Robles
Modelo:		Fecha:	27/04/21
Serial:		Inspector:	Carolina Jerez

Item	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras		✓		
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado				
	Palustre	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
	Otros				

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del equipo SI / NO

Responsable Inspeccion

Responsable uso

ANEXO 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Ingeniería & Proyectos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS

PLACA DEL VEHICULO	NUMERO DEL MOTOR	KILOMETRAJE	FECHA	MARCA	CLASE DE VEHICULO	LINEA	CILINDRAJE	MODELO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO	DATOS DEL PROPIETARIO	TIENE SOAT	FECHA DE VIGENCIA	TIENE REVISION TECNICO-MECANICA	FECHA DE VIGENCIA	TIENE COMPARENDOS	REPORTE DE INCIDENTES	FECHA	LUGAR	AREA	FECHA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO	HALLAZGOS	FECHA DE CIERRE
SKB723	0860100824			DODGE	VOLQUETA	D 600 157	6194	1980		RAFAEL ANTONIO TAPIERO	SI	6/09/2021	SI	7/09/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				
EDK741	93722195			CHEVROLET	VOLQUETA	SIN LINEA	5000	1954		BELTRAN TAPIERO LUZ STELLA	SI	6/09/2021	SI	7/09/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				
SZQ318	4500ZL 0045265X			JBC	CAMIONETA	JBC 1030	2672	2013		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	SI	29/04/2021	SI	11/07/2021	NO	N/A	N/A	N/A	N/A				

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020209921

PLACA:	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKB723	DODGE	D 600 157	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
08Q0100624	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT000119	N	DT000119	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

TAPIERO RAFAEL ANTONIO — C.C. 80372291

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	NE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
83085	I	14/12/1979	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
14/08/1980	05/02/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUNDICAJICA



LT07000152635

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Inicio de Vigencia (año - mes - día)	Hora	Fecha de Expedición (año - mes - día)	Fecha de Vencimiento (año - mes - día)
2019-04-28	00:00:00	2019-04-30	2020-04-29

No. de Póliza	Placa	Clase de Vehículo	Servicio	Cilindraje (c.c.)	Modelo
3602000018370	THK872	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5194	1980

Nombre del Tomador	Valor Prima	Valor Derechos de Tránsito	Valor Total
[redacted]	$ 1809167		

Clase de Combustible	Número de Motor	Número de Serie	Número de Chasis	Capacidad Total
DIESEL	DSG010042K	8TDD0116		7.00

Nombre del Propietario	Valor del Vehículo	Tipo de Identificación del Propietario	No. de Identificación del Propietario	Ciudad de Expedición
[redacted]	$ 144448851	CC	8037229	BOGOTA D.C.

Nombre del Asegurado	Fecha de Nacimiento del Asegurado	Valor Incapacidad	No. Pasajeros	Ciudad del Asegurado
[redacted]	10/	16400[redacted]054	0	BOGOTA D.C.

Tarifa	Prima	Derechos de Tránsito	Valor Total	Observaciones		
570	$ 1067703	$ 303950	$ 1900	A los valores aquí relacionados se les adicionará el IVA cuando aplique.	800	SALARIOS
$ 1371950				Se adicionará el FONAT	180	MINIMOS
				Se adicionará el RUNT	750	LEGALES
				Se adicionará el valor de la tasa de vigilancia y control de la Superintendencia Financiera	10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.


4188101?
DODGE
D 600 157
PURPURA
AZUL
1980
DIESEL
VOLQUETA
RAFAEL A. TAPIERO Y OTROS
DT000149
CENTRO NACIONAL DE REVISION
900081626
2019 05 02
2020 05 02
09-CIN-026-003
4188101?

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

El Mérito y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017911254

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EKD741	CHEVROLET	SIN LINEA	1954

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5,010	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
937 22195	N	******

[illegible]	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
X	N	X	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

~~DELTRAN FAPIERO LUZ ESTELLA~~ — ~~C.C. 41760813~~

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	PUERTAS
5058		26/09/1966	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/11/1967	01/03/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUNDICAJICA

LT07000019463

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2019	11	11	2019	11	12	2020	11	11

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
23597924	EKD741	VOLQUETA	PARTICULAR	5000	1954

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	
LÍNEA VEHÍCULO	SINLINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
93722195	X	NO APLICA	4.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	No. DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RAFAEL ANTONIO TAPIERO		CEDULA	80372291	


CÓDIGO ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	3553	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 419,800	$ 209,900	$ 1,700

TOTAL A PAGAR $ 631,400

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores; Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000518888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"



CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Radio y Color

Nº. DE CONTROL 45681637

PLACA No. EKO741 | MARCA CHEVROLET | LINEA SIN LINEA

SERVICIO PARTICULAR | COLOR ROJO | MODELO 1954

CILINDRAJE 5000 | COMBUSTIBLE DIESEL | VIN

CLASE VOLQUETA | Nº DE MOTOR 93722195 | Nº IDENTIFICACION PROPIETARIO C 41760813

PROPIETARIO LUZ E. BELTRAN T. | Nº CONSECUTIVO RUNT 144320782

Nº. DE CONTROL 45681637

PLACA No. EKO741 | TIPO DE VEHICULO X

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CENTRO NACIONAL DE REVISION | NIT 900081626

FECHA DE EXPEDICION AÑO 2019 MES 11 DIA 16

FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2020 MES 11 DIA 16

FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACION 09-OIN-026-003 | Nº CONSECUTIVO RUNT 144320782



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016284783

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZQ318	JBC	JBC 1030	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.672	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	DIESEL	1300

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
490QZL 0045165X	N	LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LSYCJD3R6CH000070	N	LSYCJD3R6CH000070	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS — NIT 830123577


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882011000108464
I/E
I
FECHA IMPORT.
27/12/2011
PUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA
17/01/2012
FECHA EXP. LIC. TTO.
20/06/2018
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.
LT06001413442

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 8600418758

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO
2020-04-29	2020-04-30	2021-04-29

	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/POTENCIA	MODELO
300049800	SZQ318	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2672	2012

MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CAPACIDAD
JBC	JBC 1030	ESTACAS

No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
L0045165X	LSYCJ03R6CH000070	LSYCJ03R6CH000070 3.30

NOMBRE DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NGENIERIA Y PROYECTOS SAS	3113531384	NIT	8301235777	BOGOTA D.C

REGIONAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	CLAVE PRODUCTOR	No. SOLICITUD	CIUDAD EXPEDICIÓN
	10	154005384	0	BOGOTA D.C

PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	FASE RUNT	PRIMA TOTAL
$ 423300	$ 211650	$ 1700	

VR	
50	

FIRMA

AMPAROS POR VÍCTIMA	CANTIDAD	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	VIGENTES
C. INCAPACIDAD Y GASTOS FUNERARIOS	750	DIARIOS
	180	MÍNIMOS LEGALES

cación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos s en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de gunda) póliza expedida (expedida con posterioridad) iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la que ya se encuentre registrada en el RUNT.

Para tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

Para adquirir su SOAT no necesita de ninguna de la previa revisión en [illegible]

Verifique que su póliza sea registrada en el RUNT

Pues se encuentra en que dicha renovar su póliza sea tenga SOAT vigente, acerca económicas la duración del vehículo y la cual de siguiente te brinde el cierre que [illegible] adquirir de este vehículo del accidente

Su SOAT es legítimo [illegible]

Accidente de tránsito

Si [illegible] hecho sea [illegible] por el propietario de [illegible] de cinco días al lugar del accidente informe que tenga la capacidad para brindar la atención para las víctimas

[illegible] de servicio de salud del país puede retirar a diversas víctimas de [illegible] (Decreto 663 Decreto 056 de 1972). En este momento [illegible] personal durante [illegible] $ [illegible]

[illegible] médicos, el cobro [illegible] de seguridad social o al Fosyga no debe [illegible] prestadora de salud con [illegible]

[illegible] la reclamación ante la compañía aseguradora [illegible]

Declaración de datos personales

[illegible] requisitos conocido de [illegible] y no [illegible] presente, y sin cumplimiento de [illegible] responsabilidad vigente de protección de datos particulares reglamenta que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A. para que mis datos sean [illegible] con base en la gestión y ejecución integral del contrato de seguro los cuales serán ubicados en una base de datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS quienes podrán hacer [illegible] internacional cuando sea necesario para la ejecución del servicio. Usted podrá ejercitar la negativa al tratamiento de sus datos así como a conocer actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com




CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nº DE FORMATO 42369249

SZQ318	JBC	JBC 1030
PÚBLICO	BLANCO	2012
2672	DIESEL	LSYCJD3R8CH000070
CAMIONETA	490QZL 0045165X	N 830123577
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		140809913

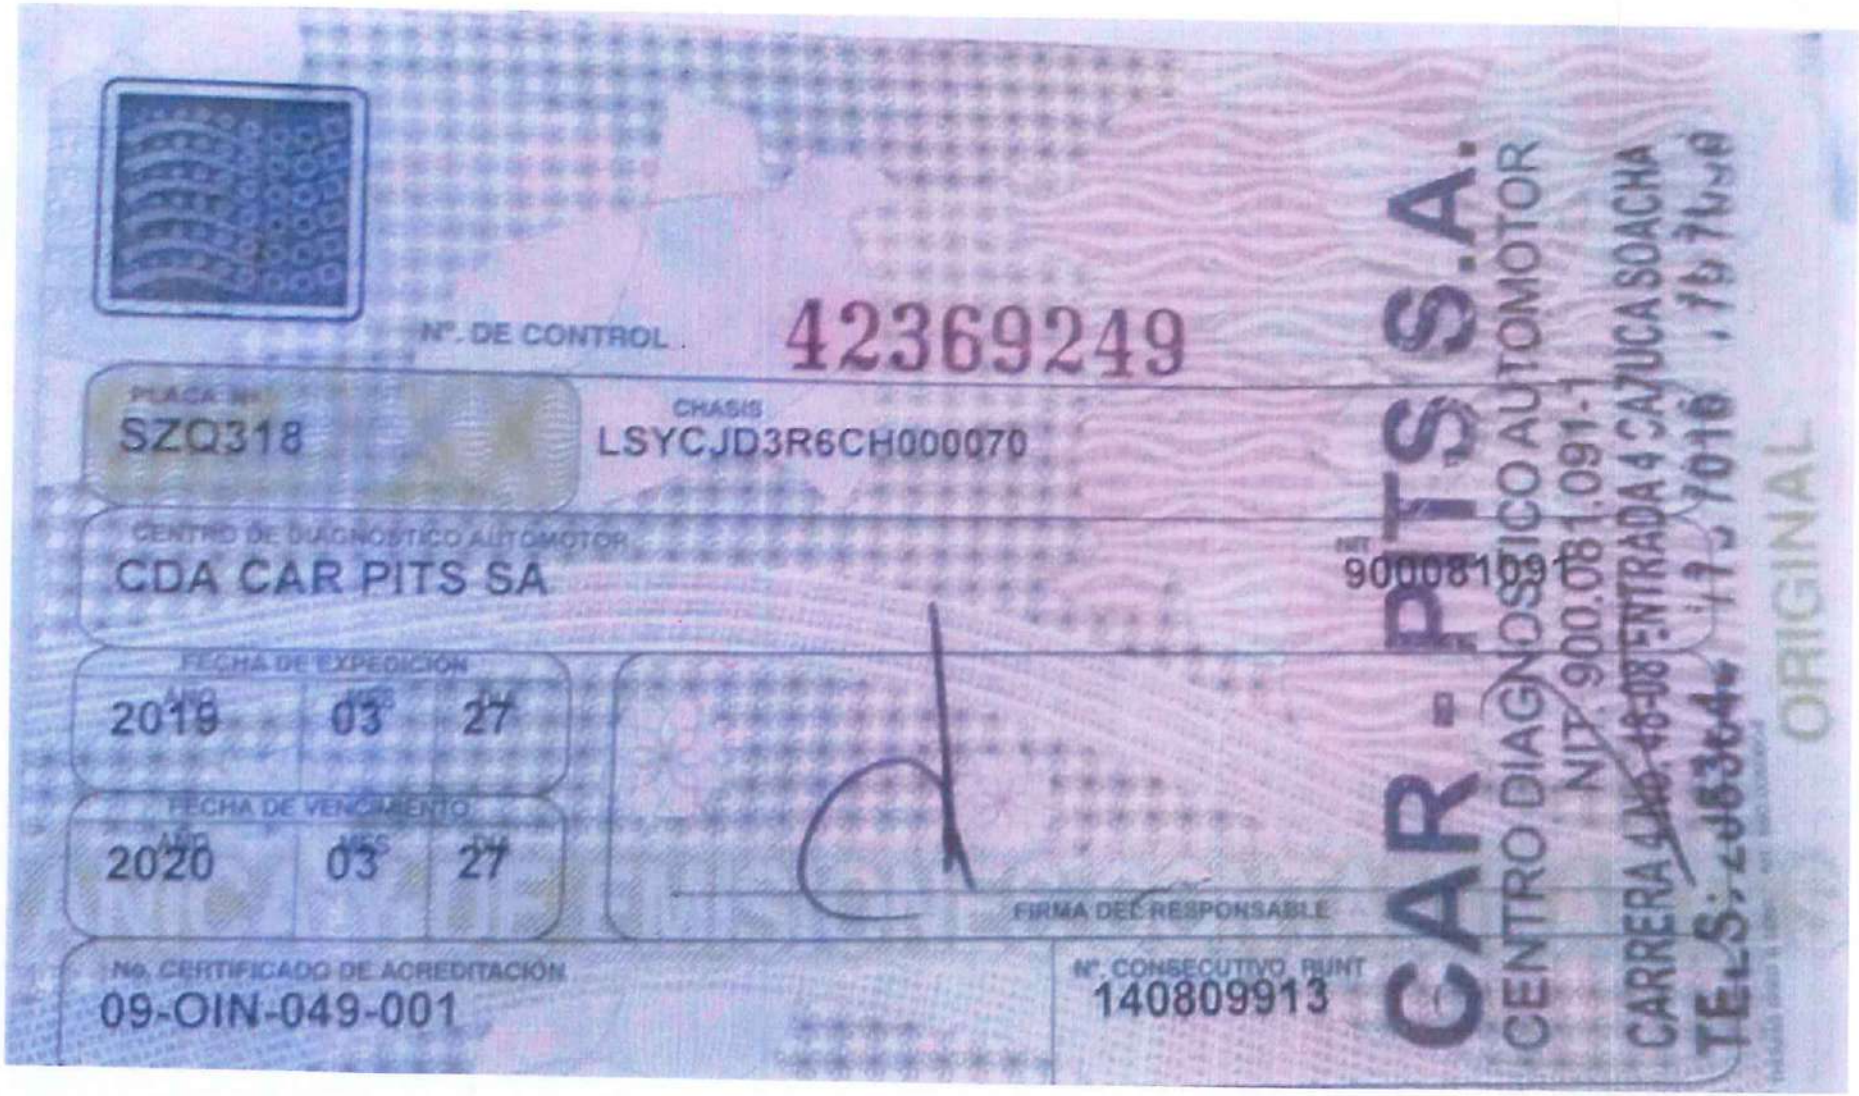

Nº. DE CONTROL 42369249

PLACA Nº SZQ318

CHASIS LSYCJD3R6CH000070

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA CAR PITS SA

NIT 900081091

FECHA DE EXPEDICION AÑO 2019 MES 03 DIA 27

FECHA DE VENCIMIENTO AÑO 2020 MES 03 DIA 27

FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACION 09-OIN-049-001

Nº. CONSECUTIVO RUNT 140809913

CAR - PITS S.A.

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

NIT 900.081.091-1

CARRERA 4A No. 4B-08 ENTRADA 4 CAZUCA SOACHA

TEL: 7863644

ORIGINAL

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SZQ318

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016284783

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

JBC

LÍNEA:

JBC 1030

MODELO:

2012

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE MOTOR:

490QZL 0045165X

NÚMERO DE CHASIS:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE VIN:

LSYCJD3R6CH000070

CILINDRAJE:

2672

TIPO DE CARROCERÍA:

ESTACAS

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

17/01/2012

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
13653300049800	29/04/2020	30/04/2020	29/04/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
8028872600	21/04/2019	22/04/2019	21/04/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	NO VIGENTE
38996570	19/04/2018	20/04/2018	19/04/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
17185816	18/04/2017	19/04/2017	18/04/2018	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
17747365	17/04/2016	18/04/2016	17/04/2017	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2020	11/07/2021	PREVICAR 197	SI	147650001	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/03/2019	30/06/2020	CDA CAR PITS SA	NO	140809913	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2018	26/03/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LTDA	NO	135325989	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/03/2017	05/03/2018	CDA AVENIDA SEXTA LTDA.	NO	129720606	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/02/2016	26/02/2017	IVESUR COLOMBIA BOGOTA	NO	124619088	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

EKD741

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10017911254

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

SIN LINEA

MODELO:

1954

COLOR:

ROJO

NÚMERO DE SERIE:

X

NÚMERO DE MOTOR:

93722195

NÚMERO DE CHASIS:

X

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

5000

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

23/11/1967

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
25637762	11/11/2020	12/11/2020	11/11/2021	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE
23597924	11/11/2019	12/11/2019	11/11/2020	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
14220500000220	11/11/2018	12/11/2018	11/11/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
37073894	17/08/2017	18/08/2017	17/08/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
34068498	28/06/2016	29/06/2016	28/06/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2020	17/11/2021	CDA CAR PITS SA	SI	150056186	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/11/2019	16/11/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	144320782	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2018	17/11/2019	CDA MI CARRERA EXPRESS	NO	138648437	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/09/2017	26/09/2018	UBATEST	NO	132527013	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2016	14/01/2017	CONTROL AUTOS DE CHINQUIQUIRA	NO	124040389	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SKB723

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10020209921

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

DODGE

LÍNEA:

D 600 157

MODELO:

1980

COLOR:

AZUL

NÚMERO DE SERIE:

DT000119

NÚMERO DE MOTOR:

08G0100824

NÚMERO DE CHASIS:

DT000119

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

6194

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

14/08/1980

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
15083200055060	06/09/2020	07/09/2020	06/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
13620300013120	25/04/2019	30/04/2019	29/04/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
18792405	29/04/2018	30/04/2018	29/04/2019	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
36402488	28/04/2017	29/04/2017	28/04/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
1309149216395	29/04/2016	30/04/2016	29/04/2017	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2020	07/09/2021	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	SI	148711429	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2019	30/06/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	141308352	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2018	02/05/2019	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	135809507	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2017	02/05/2018	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	130499723	SI	

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2016	02/05/2017	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	125442431	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SZQ318

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016284783

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

JBC

LÍNEA:

JBC 1030

MODELO:

2012

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE MOTOR:

490QZL 0045165X

NÚMERO DE CHASIS:

LSYCJD3R6CH000070

NÚMERO DE VIN:

LSYCJD3R6CH000070

CILINDRAJE:

2672

TIPO DE CARROCERÍA:

ESTACAS

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

17/01/2012

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el ***Histórico Vehicular*** *Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
13653300049800	29/04/2020	30/04/2020	29/04/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
8028872600	21/04/2019	22/04/2019	21/04/2020	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C	NO VIGENTE
38996570	19/04/2018	20/04/2018	19/04/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
17185816	18/04/2017	19/04/2017	18/04/2018	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
17747365	17/04/2016	18/04/2016	17/04/2017	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2020	11/07/2021	PREVICAR 197	SI	147650001	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/03/2019	30/06/2020	CDA CAR PITS SA	NO	140809913	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/03/2018	26/03/2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LTDA	NO	135325989	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/03/2017	05/03/2018	CDA AVENIDA SEXTA LTDA.	NO	129720606	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/02/2016	26/02/2017	IVESUR COLOMBIA BOGOTA	NO	124619088	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

EKD741

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10017911254

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

SIN LINEA

MODELO:

1954

COLOR:

ROJO

NÚMERO DE SERIE:

X

NÚMERO DE MOTOR:

93722195

NÚMERO DE CHASIS:

X

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

5000

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

23/11/1967

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el ***Histórico Vehicular*** *Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
25637762	11/11/2020	12/11/2020	11/11/2021	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	VIGENTE
23597924	11/11/2019	12/11/2019	11/11/2020	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
14220500000220	11/11/2018	12/11/2018	11/11/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
37073894	17/08/2017	18/08/2017	17/08/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
34068498	28/06/2016	29/06/2016	28/06/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2020	17/11/2021	CDA CAR PITS SA	SI	150056186	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/11/2019	16/11/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	144320782	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/11/2018	17/11/2019	CDA MI CARRERA EXPRESS	NO	138648437	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	26/09/2017	26/09/2018	UBATEST	NO	132527013	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/01/2016	14/01/2017	CONTROL AUTOS DE CHINQUIQUIRA	NO	124040389	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SKB723

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10020209921

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

DODGE

LÍNEA:

D 600 157

MODELO:

1980

COLOR:

AZUL

NÚMERO DE SERIE:

DT000119

NÚMERO DE MOTOR:

08G0100824

NÚMERO DE CHASIS:

DT000119

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

6194

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

14/08/1980

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DPTAL TTEyTTO CUND/CAJICA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el ***Histórico Vehicular*** *Aquí*

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
15083200055060	06/09/2020	07/09/2020	06/09/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE
13620300013120	25/04/2019	30/04/2019	29/04/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
18792405	29/04/2018	30/04/2018	29/04/2019	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
36402488	28/04/2017	29/04/2017	28/04/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
1309149216395	29/04/2016	30/04/2016	29/04/2017	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2020	07/09/2021	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	SI	148711429	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2019	30/06/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	141308352	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2018	02/05/2019	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	135809507	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2017	02/05/2018	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	130499723	SI	

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	02/05/2016	02/05/2017	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	125442431	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

ANEXO 16. ENTREGA DE EPP

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Carlos Perez	CEDULA No.	1002864776
FECHA:	05/04/21	CARGO Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Carlos
2						Cornet	1	Carlos
3				X		Termometro	1	Carlos
4						Tapaidos	1	Carlos
5						monogafas	1	Carlos
6						Guantes - Overo	1	Carlos

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Carlos

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ubaldo Zambrano	CEDULA No.	1002319449
FECHA:	05/04/21	CARGO Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Ubaldo
2						Guantes	1 Par	Ubaldo
3				X		Termometro	1	Ubaldo
4						monogafas	1	Ubaldo
5						Overol	1	Ubaldo
6						Guantes	1 Par	Ubaldo

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Ubaldo

CEDULA No: 1002 319449

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Juan Rafael Diaz			CEDULA No.	
FECHA:	05/04/21	CARGO	Oficial	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termometro	1	
2						Semi Facial		
3						Guantes	1 Par	
4						Overol	1	
5						Tapabocas	4	
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	
CEDULA No:	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jale Angel Chavez			CEDULA No.	85271049.
FECHA:	05/04/21	CARGO	Ayudante.	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	xJose Angel
2				X		Termómetro	1	Jose Angel
3						Gafas	1	Jose Angel
4						Tapabocas	1	Jose Angel
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	xJose Angel
CEDULA No:	85 271 049

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Esliver Jon Oliveros	CEDULA No.	
FECHA:	05/04/21	CARGO Oficial	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termómetro	1	
2						Overol	1	
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ricardo Robles	CEDULA No.	1097990536
FECHA:	05/04/21	CARGO ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1 Par	
2						Tapabocas	4	
3				X		Termometro	1	
4						monogafas	1	
5						Overol	1	
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Miguel Rico	CEDULA No.	1065998423.
FECHA:	05/04/21	CARGO ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Miguel Angel
2						Guantes	1	miguel Angel
3				X		Termometro	1	miguel Angel
4						Gafas	1	miguel Angel
5						Monogafas	1	miguel Angel
6						overol	1	miguel Angel

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBÉ EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Miguel Angel

CEDULA No: 1065 998423

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jose Javier Julio	CEDULA No.	1014495 83.
FECHA:	05/04/21	CARGO ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	José Javier Julio
2						Guantes	1	José Javier Julio
3						Monogafas	1	José Javier Julio
4				X		Termometro	1	José Javier Julio
5						monogafas	1	José Javier Julio
6						Guantes - overol	1	José Javier Julio

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: José Javier Julio

CEDULA No: 1.101.449.583

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Douglas León			CEDULA No.	21307158
FECHA:	05/04/24	CARGO	Ayudante.	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termómetro	1	Douglas.
2						Guantes	1 Par	Douglas.
3						Tapabocas	4	Douglas.
4						Tacacidas	1	Douglas
5						Mancapitas	1	Douglas.
6						Overol	1	Douglas.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: Douglas. León

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Antonio Cadena			CEDULA No.	79799440
FECHA:	05/04/24	CARGO	Maestro	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termometro	1	7.979.440
2						Tacacidas		
3						Mancapitas		
4						Tapabocas	4	
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: 7.979.440

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Carolina Jara	CEDULA No.	1012420298
FECHA:	05/04/24	CARGO: Dpto SST	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1012420298

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Oscar Valles	CEDULA No.	79220093
FECHA:	05/04/2021	CARGO: Inspector O	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						tapabocas	4	Oscar V
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Oscar V

CEDULA No: 79.220.093

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Camila Somba	CEDULA No.	1019079604
FECHA:	05/04/21	CARGO Aux Ingeniera	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	M. Camila G
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: M. Camila G

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Stella Pineda	CEDULA No.	1026260 474
FECHA:	05/04/21	CARGO Tecna SST	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	stella Pineda
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Stella Pineda

CEDULA No: 1026474

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Adrian Cifuentes			CEDULA No.	8003250
FECHA:	05/04/21	CARGO	oficial	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1Par	
2						Tapabocas	4	
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 8003250

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jesus Crango			CEDULA No.	1091624058
FECHA:	05/04/21	CARGO	ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guantes	1	Jesus
2						Tapabocas	4	Jesus
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jesus

CEDULA No: 1091624058

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	EDWIN GARCIA	CEDULA No.	80739892
FECHA:	04/05/21	CARGO	Dir. Obra
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Melba Lanes	CEDULA No.	1077425389
FECHA:	04/05/21	CARGO	Residente
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

ANEXO 17. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN Kra 50 x 24

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel antibacterial	1				
2	Alcohol	1				
3	Toallas de Manos	1Paquete				
4	Jabón de Manos	1				
5	Tanque de agua	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Oscar Valles

CEDULA No: 79220093

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN Kra 104 x calle 145.

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel antibacterial	1				
2	Alcohol	1				
3	Toallas de Manos	Paquete				
4	Jabón de manos	1				
5	Tanque agua	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Estiverson

CEDULA No: 91 536 057

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN | Tv 42 x Calle 12.

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel Antibacteria	Lt	1			
2	Alcoho	Lt	1			
3	Toallas manos	Paquete	1			
4	Jabón manos	Lt	1			
5	Tanque de agua	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 7.92x.x10

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN | Vehiculo Materiales

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel Antibacterial	Lt	1			
2	Alcohol	Lt	1			
3						
4						
5						
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Antonio Cepeda

CEDULA No: 91536053. Estiverson Olivera 7012424.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD

DIRECCION INSTERSECCIÓN | Kra 116 x Dg 16

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel antibacterial	1				
2	Alcohol	1				
3	Toallas Manos	Paquete				
4	Jabón de manos	1				
5	Tanque de agua	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Antonio Cepeda

CEDULA No: 7924460

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DIRECCION INSTERSECCIÓN | Kra 9 x calle 127

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTEGADOS

ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA INICIAL	RECARGA
1	Gel antibacterial	1				
2	Alcohol	1				
3	Toallas manos	Paquete				
4	Jabon manos	1				
5	Tanque de agua	1				
6						
7						
8						

COMPROMISO

Quien recibe se compromete a velar por el correcto uso de los insumos de bioseguridad suministrados para cada frente de obra

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Juan Diaz

CEDULA No: 1024509395

Bogotá D.C. 14 de Abril del 2021

ACUERDO DE PRESTAMO DE BAÑO

El presente acuerdo se celebra y entra en vigor el 14 de Abril del 2021, hasta el día 30 de Abril del 2021.

ENTRE: **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.**
NIT: 830.123.577-7

Y: Estación de Servicio el Tesoro Primax

Para que se realice el préstamo del servicio de baños al personal que trabaja en la obra ubicada en la KRA 116A X DG 16, esto con el fin de que la empresa AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. garantice el servicio de baño.

Nombre: Carolina Serna
Cedula: 1012420278

Nombre: Olga Lucia Moreno
Cedula: 51.918.273 Bta

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	carlos Perez	CEDULA No.	1007864776
FECHA:	05/04/21	CARGO Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						tapabocas	4	carlos
2						Gafas	1	carlos
3				X		Termometro	1	carlos
4						Tapaidos	1	carlos
5						monogafas	1	carlos
6						Guantes - Overol	1	carlos

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	carlos
CEDULA No:	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ubaldo Zambrano	CEDULA No.	1002319449
FECHA:	05/04/21	CARGO Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Ubaldo
2						Gafas	1 Par	Ubaldo
3				X		Termómetro	1	Ubaldo
4						monogafas	1	Ubaldo
5						Overol	1	Ubaldo
6						Guantes	1 Par	Ubaldo

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Ubaldo
CEDULA No:	1002319449

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Juan Pablo Diaz	CEDULA No.	
FECHA:	05/04/21	CARGO: Oficial	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termometro	1	
2						Gafas Protect		
3						Guantes	1 Par	
4						Overol	1	
5						Tapabocas	4	
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jose Angel Chavez	CEDULA No.	85271049.
FECHA:	05/04/21	CARGO: Ayudante.	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Jose Angel
2				X		Termómetro	1	Jose Angel
3						Gafas	1	Jose Angel
4						Tapabocas	1	Jose Angel
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jose Angel

CEDULA No: 85 27 1 04 9

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Estiven Fernando Oliveros	CEDULA No.	
FECHA:	05/04/21	CARGO Oficial	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termómetro	1	
2						Overol	1	
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Ricardo Robles	CEDULA No.	1097990526
FECHA:	05/04/21	CARGO Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Guante	1 Par	
2						Tapabocas	4	
3				X		Termómetro	1	
4						Monogafas	1	
5						Overol	1	
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Miguel Ango	CEDULA No.	1065998423.
FECHA:	05/04/21	CARGO: Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	xmiguel Angel
2						Guantes	1	miguel Angel
3				x		Termometro	1	miguel Angel
4						Gafas	1	miguel Angel
5						Monogafas	1	miguel Angel
6						Overol	1	miguel Angel

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: miguel Angel

CEDULA No: 1065 998 423

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jose Javier Julio	CEDULA No.	1014495833.
FECHA:	05/04/21	CARGO: Ayudante	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	José Javier Julio
2						Guantes	1	José Javier Julio
3						Monogafas	1	Jose Javier Julio
4				x		Termometro	1	José Javier Julio
5						Monogafas	1	José Javier Julio
6						Guantes - Overol	1	José Javier Julio

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: José Javier Julio

CEDULA No: 1.101.449.583

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Douglas León			CEDULA No.	2.307.158
FECHA:	05/04/24	CARGO	Ayudante.	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termómetro	1	Douglas.
2						Guantes	1 Par	Douglas.
3						Tapabocas	4	Douglas.
4						Tacacidas	1	Douglas
5						Monogafas	1	Douglas.
6						overol	1	Douglas.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: Douglas. León

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Antonio Cepeda			CEDULA No.	7924440
FECHA:	05/04/24	CARGO	Maestro	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1				X		Termometro	1	7.924.440
2						tacacidas		
3						monogafas		
4						Tapabocas	4	
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: 7.924.440

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Carolina Jena	CEDULA No.	1024202398
FECHA:	05/04/24	CARGO Prof SST	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1024202398

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Oscar Valles	CEDULA No.	79220093
FECHA:	05/04/2024	CARGO Inspector O	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	Oscar V
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Oscar V

CEDULA No: 79220093

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Camila Somba	CEDULA No.	1019079604
FECHA:	05/04/24	CARGO Aux Ingeniera	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	M. Camila G
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: M. Camila G

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Stella Pineda	CEDULA No.	1026260474
FECHA:	05/04/24	CARGO Tecna SST	FECHA INGRESO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	stella Pineda
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Stella Pineda

CEDULA No: 1026474

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Adrian Sierra			CEDULA No.	8003250
FECHA:	05/04/21	CARGO	oficial	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						guantes	1Par	
2						tapabocas	4	
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 8003250

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jesus Crango			CEDULA No.	1096244058
FECHA:	05/04/21	CARGO	ayudante	FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						guantes	1	Jesus
2						tapabocas	4	Jesus
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jesus

CEDULA No: 1096244058

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	EDWIN Garcia	CEDULA No.	80739892
FECHA:	04/05/21	CARGO	Dir. Obra
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Meiza Janeo	CEDULA No.	1077421389
FECHA:	04/05/21	CARGO	Residente
		FECHA INGRESO:	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1						Tapabocas	4	MEIZA J
2								
3								
4								
5								
6								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: MEIZA J

CEDULA No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MP1	Profesional en seguridad y salud en el trabajo categoría 6 dedicación 30%	mimes	$ 4.931.338	1	$ 4.932.339
MP2	Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo dedicación 30%	mimes	$ 1.259.681		$ -
MP3	Alquiler mensual de inversores sonidos	mimes	$ 57600	2,39	$ 171.671
MP4	Dotación de agua para el lavado de manos, pila desechable	hombre/mes	$ 612	756	$ 462.672
MP5	Dotación de alcohol mensual por frente de obra, para la implementación de protocolo de bioseguridad en obra	frente obra/mes	$ 82.214	2,39	$ 196.253
MP6	Dotación de toallas de papel doble hoja (aquiana 150 hojas) al mes por frente de obra	frente obra/mes	$ 17.165	2,39	$ 40.631
MP7	Dotación de alcohol al mes para la implementación del protocolo de bioseguridad	frente obra/mes	$ 54.742	2,39	$ 130.770
MP8	Dotación de Hipoclorito al 6.15% al mes para implementación de protocolo de bioseguridad en obra	frente obra/mes	$ 13.865	2,39	$ 33.937
MP9	Dotación de Hipoclorito al 5.15% al mes para implementación de protocolo de bioseguridad para (2) vehículos	frente obra/mes	$ 66.862	2,39	$ 159.890
MP10	Dotación de detergente al mes para implementación de protocolo de bioseguridad en obra	frente obra/mes	$ 28.008	2,39	$ 66.959
MP11	Dotación de antisolorial al mes para la implementación del protocolo de bioseguridad en obra	frente obra/mes	$ 72.008	2,39	$ 171.990
MP12	Dotación de antisolorial por frente de obra al mes, para la implementación del protocolo de bioseguridad en obra (1) vehículo	frente obra/mes	$ 95.984	2,39	$ 229.147
MP13	Dotación de jabón para manos, al mes, para la implementación del protocolo de bioseguridad en obra	frente obra/mes	$ 39.013	2,39	$ 93.734
MP14	Dotación de un (1) overol adicional a la dotación diseminada por hombre cada cuatro (4) meses por cada trabajador en obra	hombre	$ 92.002	0	$ -
MP15	Dotación de cuatro (4) tapabocas por trabajador del personal operativo y administrativo	hombre/mes	$ 4.000	18	$ 72.000
MP16	Dotación de un termómetro digital por trabajador, del personal operativo y administrativo	hombre	$ 15.000	10	$ 150.000
					$ 6.927.371

Intersección	Inicio	Fin	Frente obra/mes
Troncal 42 X calle 12	7-abr	28-abr	0.90
Carrera 500 X calle 182	1-abr	12-abr	0.39
Av carrera 9 X 122	5-abr	16-abr	0.45
Carrera 198A X Dg 16	13-abr	27-abr	0.48
Av carrera 97 X Dg 16	21-abr	24-abr	0.03
Carrera 90 X calle 24	5-abr	18-abr	0.06
Carrera 90 X calle 24	15-abr	15-abr	0.03
Carrera 103 X calle 145	14-abr	14-abr	0.03
Total			2.99

Cantidad	Fecha ingreso	Fecha salida	Identificación	Nombre	Tapabocas	Termómetro	Overol	Observación	ubicación	Hoja	Dias Trabajados
1	13/09/2020	na	81.536.053	Estverson Olivros	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	3	27
2	14/09/2020	na	80.032.560	Adrian Ubacha	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	8	27
3	14/09/2020	na	21.107.158	Douglas Leon	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	5	27
4	21/09/2020	na	1.024.509.395	Juan Diaz	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	2	27
5	14/09/2020	na	1.098.244.058	Jesus Urango	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	8	27
6	23/09/2020	na	85.241.049	José Angel Chavez	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	2	27
7	11/08/2020	na	80.739.892	Edwins Garcia	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	9	27
8	6/03/2020	na	1.077.425.387	Meiza Jares	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	9	27
9	6/03/2020	na	101.979.604	Camila Gamba	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	7	27
10	6/03/2020	na	1.026.260.474	Stella Pineda	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	7	27
11	11/09/2020	na	1.012.420.278	Carolina Serna	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	6	27
12	6/03/2020	na	79.230.093	Oscar Vallas	1	0	0	Abril	Entrega de EPP	8	27
13	1/12/2020	na	7.924.440	Antonio Cepeda	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	5	27
14	7/01/2021	na	1.101.449.583	José Julio Zarza	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	4	27
15	7/01/2021	na	1.002.319.449	Ubaldo Zambrano	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	1	27
16	18/01/2021	na	1.067.890.326	Ricardo Robles	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	3	27
17	12/03/2021	na	1.065.998.423	Miguel Rico	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	4	27
18	9/03/2021	na	1.007.884.776	Carlos Perez	1	1	0	Abril	Entrega de EPP	1	27
				TOTAL	18	10	0				

PERSONAL DE PH (SE TIENE EN CUENTA PARA SUMINISTRO DE AGUA)											
19	NA	NA	7.542.963	Nelson Suarez Rodriguez	0	0	0				27
20	NA	NA	3.017.678	Rafael Antonio Suarez Romer	0	0	0				27
21	NA	NA	79.639.032	Miguel Angel Cuellos	0	0	0				27
22	NA	NA	1.030.756.714	Dameso Castaño Hernandez	0	0	0				27
23	NA	NA	80.371.218	Hernando Ruiz Casas	0	0	0				27
24	NA	NA	1.023.862.499	Jhon Sebastian Castaño	0	0	0				27
25	NA	NA	1.014.222.877	Wilson Salamanca	0	0	0				27
26	NA	NA	1.002.487.541	José Dimas Diaz	0	0	0				27
27	NA	NA	93.011.180	Euclides Rivera	0	0	0				27
28	NA	NA	79.104.200	JUSTO PASTOR MONTA	0	0	0				27
											27
											756

ANEXO 18. FORMATOS CALIDAD

	ISPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Código: F INS 15-7 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Calle 182 x 30B	Operador	Jose Angel Chavez
Marca:		Ayudante:	Jose Javier Julio.
Modelo:		Fecha:	5/08/2024
Serial:		Inspector:	Carolina Jorra

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓		✓									
2	Ventilación		✓		✓		✓									
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓		✓									
4	Gafas de seguridad		✓		✓		✓									
5	Protección auditiva		✓		✓		✓									
6	Casco de seguridad		✓		✓		✓									
7	Tapabocas		✓		✓		✓									
8	Overol		✓		✓		✓									
9	Botas de seguridad		✓		✓		✓									
	Equipo															
10	Extensión electrica		✓		✓		✓									
11	Disco de corte		✓		✓		✓									
12	Guarda		✓		✓		✓									
13	Manija de sujección		✓		✓		✓									
14	Craceza		✓		✓		✓									
15	Encendido		✓		✓		✓									
16	Cable		✓		✓		✓									

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI / NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

Ingeniería & Proyectos	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA	Código: F INS 15-5 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	TRANSV 42 x calle 12	Operador	José Angel Chalbaldo Zambrano
Marca:		Ayudante:	
Modelo:		Fecha:	15/04/2021
Serial:		Inspector:	Carolina Jaramillo

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA													
			DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓		✓									
2	Ventilación		✓		✓		✓									
	EPP															
3	Guantes de vaquela		✓		✓		✓									
4	Gafas de seguridad		✓		✓		✓									
5	Protección auditiva		✓		✓		✓									
6	Casco de seguridad		✓		✓		✓									
7	Tapabocas		✓		✓		✓									
8	Overol		✓		✓		✓									
9	Botas de seguridad		✓		✓		✓									
	Equipo															
10	Tanque de combustible		✓		✓		✓									
11	Silenciador de escape		✓		✓		✓									
12	Conexión a tierra		✓		✓		✓									
13	Enchufe/conexión AC		✓		✓		✓									
14	Filtro de aire		✓		✓		✓									
15	Manija de arrangue		✓		✓		✓									
16	Llave de combustible		✓		✓		✓									
17	Ahogador		✓		✓		✓									
18	Estructura de soporte		✓		✓		✓									
19	Bujía		✓		✓		✓									
20	Tapa del combustible		✓		✓		✓									
21	Interruptor automático de protección AC		✓		✓		✓									
22	Contenedor de aceite		✓		✓		✓									
23	Interruptor de encendido		✓		✓		✓									

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso de la pulidora SI / NO

Responsable inspeccion

Responsable uso

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CANGURO	Código: F INS 15-11 Versión: 01 Fecha: 02/02/18

Ubicación:	Tramo 12 x 12	**Operador**	Jose Angel Chaves
Marca:		**Ayudante:**	Cibaco Zambrano.
Modelo:		**Fecha:**	16/9/21
Serial:		**Inspector:**	Carolina Jerez

Ítem	Descripción	No Aplica	SEMANA DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		DIA7	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Condiciones del area de trabajo															
1	Orden y aseo		✓		✓		✓		✓							
2	Ventilación		✓		✓		✓		✓							
3	Superficie base granular		✓		✓		✓		✓							
	EPP															
3	Guantes de vaqueta		✓		✓		✓		✓							
4	Gafas de seguridad		✓		✓		✓		✓							
5	Protección auditiva		✓		✓		✓		✓							
6	Casco de seguridad		✓		✓		✓		✓							
7	Tapabocas		✓		✓		✓		✓							
8	Overol		✓		✓		✓		✓							
9	Botas de seguridad		✓		✓		✓		✓							
	Equipo															
10	Motor		✓		✓		✓		✓							
11	Tanque de combustible (Sin fugas)		✓		✓		✓		✓							
12	Palanca acelerador		✓		✓		✓		✓							
13	filtro de aceite		✓		✓		✓		✓							
14	valvula de drenaje		✓		✓		✓		✓							
15	zapata		✓		✓		✓		✓							
16	silenciador		✓		✓		✓		✓							
17	palanca de compresion		✓		✓		✓		✓							
18	Manilla de arranque		✓		✓		✓		✓							
19	Manija de sujeción		✓		✓		✓		✓							
20	Fuelle		✓		✓		✓		✓							

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspección

Responsable uso

PREOPERACIONAL COMPRERSOR

Código:	IN 15-2
Versión:	01
Fecha:	27/06/2020

Ubicación:	Trans 42 X cll 72	**Operador**	Daniel León
Marca:		**Ayudante:**	Jose Javier Soto.
Identificación:		**Fecha:**	16/04/21
Inspector:		SEMANA	

Ítem	Descripción		DIA1		DIA2		DIA3		DIA4		DIA5		DIA6		D
		No Aplica	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
	Condiciones del area de trabajo														
1	Orden y aseo		✓		✓		✓								
2	Ventilación		✓		✓		✓								
3	Superficie nivelada		✓		✓		✓								
	EPP														
4	Guantes de vaqueta		✓												
1	Gafas de seguridad		✓		✓		✓								
5	Protección auditiva		✓		✓		✓								
2	Casco de seguridad		✓		✓		✓								
6	Tapabocas		✓		✓		✓								
3	Overol		✓		✓		✓								
7	Botas de seguridad		✓		✓		✓								
	Equipo														
8	Puerta de acceso del panel de instrumentos		✓		✓		✓								
9	Elemento del separador y punto de llenado		✓		✓		✓								
10	Punto de llenado de aceite del motor		✓		✓		✓								
11	Punto de llenado de la botella de refrigerante		✓		✓		✓								
12	Punto de llenado de combustible		✓		✓		✓								
13	Filtro de aceite del motor		✓		✓		✓								
14	Salida de aire del paquete		✓		✓		✓								
15	Barra de tiro		✓		✓		✓								
16	Indicadores de aceite de motor refrigerante		✓		✓		✓								

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI ✓ NO

Responsable Inspeccion

Douglas León

Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Kra 9 X Calle 127.	Operador	Carlos Perez
Marca:		Ayudante:	Miguel Rico
Modelo:		Fecha:	7/6/2021
Serial:		Inspector:	Catalina Serna

Item	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado		✓		Se Mejora la condición de manera inmediata.
	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras	✓			
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
	Palustre				
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
	Otros				

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspeccion

Carlos Perez
Responsable uso

	INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Código: F INS 15-14 Versión: 01 Fecha: 27/06/2020

Ubicación:	Kra 116 x Dg 15.	Operador	Juan Diaz
Marca:		Ayudante:	Ricardo Robles
Modelo:		Fecha:	27/04/21
Serial:		Inspector:	Carolina Jerez

Ítem	Descripción	Estado			ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
		Cumple	No Cumpl	No Aplica	
1	**Martillo -maceta**				
	Mango de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Cabeza sin rebabas	✓			
	Herramienda adecuada para la actividad	✓			
	Palas				
	Longitud de mango de acuerdo con la actividad	✓			
	Pala afilada	✓			
	Mnago de madera	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Carretilla				
	Mangos bien fijos	✓			
	Platón sin fisuras		✓		
	Neumatico de llanta en buen estado	✓			
	Soportes en buen estado	✓			
	Eje de llanta y tornillo en buen estado	✓			
	Palustre	✓			
	Mango bien encabado	✓			
	Borde sin filo	✓			
	Cincel				
	Punta libre de reababas	✓			
	Cuerpo de cincel sin ondulaciones	✓			
	Flexómetro				
	Libre de sustancias deslizantes	✓			
	Seguro en buen estado	✓			
	Otros				

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del equipo SI ✓ NO

Responsable Inspeccion

Responsable uso

Nº TRAINING 5555

Certificado de Formación

Grupo Elite Organizacional

Certifica que:

WENDY JOHANA FRANCO MARULANDA

C.C. 1.012.392.463

Asistió y aprobó el curso de Formación como

Actualización de Técnicas de Auditoría ISO 19011:2018

Con una Intensidad de 8 Horas

Realizado el 25 y 26 de octubre de 2018

Tutor: Sandra Jaramillo Arias
Auditor Líder

Se expide y se Firma el 8 de noviembre de 2018

Bogota,D.C.,Colombia

158

Grupo Elite Organizacional Ltda
Calle 37 No.13-08 Piso 3 +(571) 3810688

International Alliance of certified Professionals

IAC

Nº GEC686932

GRUPO ELITE ORGANIZACIONAL

CERTIFICATE OF SUCCESSFUL COMPLETION

THIS CERTIFIES THAT

WENDY JOHANA FRANCO MARULANDA

I.D. 1.012.392.463

Has successfully completed an internal Auditor training Course by passing the written examination and continuous assessment in:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Quality, Environment, Occupational Health and Safety Management System

Sandra Jaramillo O.

Lead Auditor: Sandra Jaramillo Arias

Duration: 56 Hours
Course Date: october 16th to october 26th of 2018
Issued In: Bogotá, D.C., Colombia

CERTIFICATE OF TRAINING

1000 N Bayshore Dr. #3515, MIAMI, FL 33132

	FORMATO 01	
AC2R Ingeniería & Proyectos	CORRESPONDENCIA ENVIADA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 30-07-2020 PÁGINA: N/A

OBJETO DEL PROYECTO: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."

CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE Y/O REN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
AC2R SEM-157-2021	3/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	3/04/2021	Oficio AC2R SEM-157-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	7/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	7/04/2021	Informe mensual marzo de 2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-158-2021	7/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	7/04/2021	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	8/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	8/04/2021	Fwd: Acta de comité de obra	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	8/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	8/04/2021	Programación actividades de obra conectantes	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-158-2021	12/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	12/04/2021	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	12/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	12/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	13/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	13/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	15/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	15/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-160-2021	19/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/04/2021	Comunicado PIV-IMS-20191810-0486	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-161-2021	19/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	19/04/2021	Oficio AC2R-SEM-161-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-158-2021	20/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	20/04/2021	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	22/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	22/04/2021	Documentos corte 7	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-162-2021	26/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S. y SECRETARIA DE MOVILIDAD	Ing. Jorge Garzon y Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	26/04/2021	RESPUESTA OFICIO SDM 20213222341721	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-163-2021	27/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S. y SECRETARIA DE MOVILIDAD	Ing. Jorge Garzon y Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	27/04/2021	oficio AC2R-SEM-163-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-164-2021	28/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	28/04/2021	oficio AC2R-SEM-164-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
	29/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	29/04/2021	Urgente - Acta de suspensión N. 3 del contrato N 2019- 1874	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-173-2021	29/04/2021	PIV INGENIERIA	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	29/04/2021	Solicitud AC2R-SEM-173-2021	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS
AC2R-SEM-169-2021	30/04/2021	ENEL- CODENSA	A quien corresponda	Ing. Camilo Rosario	X		Ing. Jorge Garzon	30/04/2021	SOLICITU DE PAZ Y SALVO	CORRESPONDENCIA ENVIADA CORREOS

FORMATO 02

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA ACTUALIZACION: 30-07-2020

PÁGINA: N/A

OBJETO PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C

FECHA DE RECIBO DOCUMENTO	ENTIDAD QUE EMITE	CONSECUTIVO DE EMISION DE LA ENTIDAD	PERSONA REMITENTE QUIEN FIRMA LA CORRESPONDENCIA	PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDA LA CORRESPONDENCIA	ASUNTO	PARA RESPONDER		No. CONSECUTIVO RESPUESTA	FIRMA	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 6 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Acta de comité de obra	X		8/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Rehabilitación carpeta asfáltica AK 104 X AC 145		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: FW: Canalización externo 2054		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Observaciones replanteo transversal 42 x calle 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	LEYDY TATIANA BORDA ROJAS	Ing. Camilo Rosario	Observaciones replanteo transversal 42 x calle 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
5/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud correctivo 3010-AK 14 X CL 65 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
6/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Solicitud correctivo 3010-AK 14 X CL 65 S		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
7/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe mensual marzo de 2021	X		7/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
7/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	X		12/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: (Sin asunto) jue 8 de abr de 2021 10:30am - 11:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	X		12/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Adriana Milena Guevara Vargas	Ing. Camilo Rosario	INFORME TECNICO DE NO APROVECHAMIENTO		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT POR EMERGENCIA		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT POR EMERGENCIA		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación actividades de obra conectantes	X		8/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Programación actividades de obra conectantes		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMS-20191810-0476		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
8/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Actas de comité 1 -10		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/04/2021	Christian Roquema Salazar	Correo electronico	Christian Roquema Salazar	Ing. Camilo Rosario	Aprobación PMT AC 72 X KR 74A		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: PMT EMERGENCIA CONTRATO SEMAFORIZACION SDM 2019 1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
9/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Permiso contingencia - abril		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
11/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 13 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Acta de comité semanal		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Urgente. Ajuste base 3688-KR 15 X CL 71B SUR		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO KR 97 X CL 23F		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		12/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mié 14 de abr de 2021 2pm - 3:30pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
12/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mar 13 de abr de 2021 2pm - 3:30pm (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		13/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		13/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentación para impresión y firma		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
13/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentación para impresión y firma		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Observaciones replanteo transversal 42 x calle 12		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021	X		20/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Diseño carrera 33 x calle 47 sur		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
14/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Intervención carrera 116A x diagonal 16		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
15/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		15/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS





15/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Reunión de apertura Auditoria ISO 10005: 2005 vie 16 de abr de 2021 9am - 9:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Construcción de base para poste Carrera 97 por Av. Centenario		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
16/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: Documentación para liquidación de contrato.		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
17/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Re: DISEÑO KR 70 X CL 103		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMS-20191810-0486	X		19/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
19/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación actualizada: Comité de obra semanal mar 20 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Claudia Trejos	Ing. Camilo Rosario	Informe N°12 Oficio AC2R-SEM-158-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Documentos corte 7	X		22/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Luz Dary Vásquez Cañas	Ing. Camilo Rosario	Re: Diseño AK 50 X AC 53		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
20/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Construcción de base para poste Carrera 97 por Av. Centenario		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: SOLICITUD PMT EMERGENCIA - INTERSECCION CARRERA 97 X AV CENTENARIO		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
21/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Autorización PMT por emergencia carrera 97 x avenida Centenario		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
22/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Retiro de material sobrante y cerramientos carrera 9 x calle 127		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
22/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Ejecución intersección nueva carrera 116A x diagonal 16		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Invitación: Comité de obra semanal mar 27 de abr de 2021 9am - 10:30am (COT) (semaforizacionac2r@gmail.com)		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
26/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S. Y SECRETARIA DE MOVILIDAD	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon y Leydy Tatiana Borda Rojas	Ing. Camilo Rosario	oficio AC2R-SEM-163-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
27/04/2021	Rafael Tapiero	Correo electronico	Rafael Tapiero	Ing. Camilo Rosario	JORNADA DE PARO NACIONAL		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
28/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicado PIV-IMS-20191810-0495		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
28/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	oficio AC2R-SEM-163-2021		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
28/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Comunicación AC2R-SEM-163-2021 - Contrato 2019-1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Deisy Lara Barbón	Ing. Camilo Rosario	Urgente - Acta de suspensión N. 3 del contrato N 2019- 1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Urgente - Acta de suspensión N. 3 del contrato N 2019- 1874	X		29/04/2021	Ing. Camilo Rosario	CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Notificación PQRS		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
29/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	Ing. Jorge Garzon	Ing. Camilo Rosario	Fwd: Acta de suspensión contrato 20191874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS
30/04/2021	PIV INGENIERIA S.A.S.	Correo electronico	ING. CIRO HERNAN JIMENEZ OCHOA	Ing. Camilo Rosario	Incumplimiento suspensión contrato 2019-1874		X			CORRESPONDENCIA RECIBIDA CORREOS

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO 09 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	30/01/2021	NOMBRE DE PROYECTO	SEMAFORIZACION	
MATERIAL	**PROVEEDOR**	**CANTIDAD**	**SOLICITANTE**	**APROBADOR/ RESPONSABLE**
TUBO 4"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
TUBO 3"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
TUBO 2"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAMPANA TERMINAL 3"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAMPANA TERMINAL 4"	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CURVA	PVCENTER	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ARENA DE PEÑA M3	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
B 600	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ARENA DE RIO	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
GRAVA	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BASE ASFALTICA	RAFAEL TAPIERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CONCRETO 3000PSI	MEGACONCRETOS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE SARDINEL A 10 20X50X80	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE BORDILLO A 80	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE BORDILLO A 85	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO)	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO)	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
LADRILLO	LADRILLERA GRESPAN	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
MARCO SENCILLO	ACERO	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
PH DIRIGIDA	PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
PH NEUMATICA	PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	

TUBO GALVANIZADO DE 2 "	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
UNION DE 2" ELECTRICA	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAPACETE	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CINTA BANDIT	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CAPACETE	FERRETERIA MULTIALAMBRES	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
BOLARDO	BRAKE PART N.S.C	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CEMENTO ARGOS	EASYCEM	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	
CEMENTO TEQUENDAMA	CEMENTOS TEQUENDAMA	Información unicamente para uso interno	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS - FABIAN CHACIN	

VERSION 1 - V1

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

FORMATO 10 RESULTADO ENSAYO DE COMPACTACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	1/02/2021	NOMBRE DEL PROYECTO	SEMAFORIZACION 2019-1874
INTERSECCION	**ESQUINA**	**FECHA DE REALIZACION**	**RESULTADOS**
TV 42 X CL 12	SUR ESTE	28/04/2021	95.6
	SUR ESTE	28/04/2021	95.8
	SUR ESTE	28/04/2021	96.8
	SUR ESTE	23/04/2021	95.4
	SUR ESTE	23/04/2021	96.4
	SUR ESTE	23/04/2021	97.1
	NOR ESTE	22/04/2021	96.2
	SUR ESTE	22/04/2021	95.7
	SUR OESTE	22/04/2021	96.3
KR 50 X CL 182	SUR OESTE	30/03/2021	95.3
	NOR OESTE	30/03/2021	95.1
	NOR ESTE	30/03/2021	95.2
	NOR ESTE	30/03/2021	96.5
	SUR ESTE	30/03/2021	96.2

Ingeniería & Proyectos	LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTADOS	FORMATO 17
		FECHA: 05/03/2021

MATERIALES ☐ SERVICIOS ☐ CRITICOS ☐

PROVEEDOR	PERSONA A CONTACTAR	DIRECCION	TELEFONO / FAX	MATERIAL / SERVICIO
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 4"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 3"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	TUBO 2"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CAMPANA TERMINAL 3"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CAMPANA TERMINAL 4"
PVCENTER	ANGELICA FRANCO	Cra. 25 #15-83, Bogotá	3114512330	CURVA
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	ARENA DE PEÑA M3
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	B 600
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	VIAJES VOLQUETA ESCOMBROS
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	ARENA DE RIO
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	GRAVA
RAFAEL TAPIERO	RAFAEL TAPIERO	CRA 20 # 68-46 SUR	3144443861	BASE ASFALTICA
MEGACONCRETOS	JUAN PABLO SERNA	Cra. 80a #No. 17 21, Bogotá, Cundinamarca	3223666794	CONCRETO 3000PSI
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE SARDINEL A 10 20X50X80
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE BORDILLO A 80
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE BORDILLO A 85
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE TRANSICIÓN DERECHO A 100 (HOMBRO)
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	BLOQUE TRANSICIÓN IZQUIERDO A 100 (HOMBRO)
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	ADOQUIN PEATONAL A-25/6 GRIS
EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	XIOMARA ALFONSO	Kilometro 2 Via Fusunga Vereda Panamá, Soacha	3134230803	LOSETA TOPEROL 20X20X6 A-57
LADRILLERA GRESPAN	GERMAN PANQUEBA	Km 5 vía, Zipaquirá-Ubaté, Cogua, Cundinamarca	3132827442	LADRILLO
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	ACERO
PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	RICARDO DIAZ	CR 72 J BIS No 34- 17 SUR CARVAJAL	632698- 3 10 6 98 49 37	PH DIRIGIDA
PH INGENIERIA DE PERFORACIONES HORIZONTALES	RICARDO DIAZ	CR 72 J BIS No 34- 17 SUR CARVAJAL	632698- 3 10 6 98 49 38	PH NEUMATICA
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	TUBO GALVANIZADO DE 2 "
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	UNION DE 2" ELECTRICA

FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CAPACETE
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CINTA BANDIT
FERRETERIA MULTIALAMBRES	WILMAR	Carrera 16 # 11 - 50	8776655	CAPACETE
BRAKE PART N.S.C	NANCY REYES	Calle 9a # 7a -28 Valles de Santa Ana-Soacha	321 397 30 58	BOLARDO
CEMENTO ARGOS	Sodimac Colombia S.A.	Ak 68 # 80 - 77	310 242 7373	CEMENTO ARGOS
CEMENTOS TEQUENDAMA	MONICA HERRERA		3214795700	CEMENTO TEQUENDAMA
GYG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	GUSTAVO SANCHEZ RUIZ	Calle 53 # 85i -93	3112158743	MANO DE OBRA
GEOCRETOS LABORATORIO DE INGENIRIA CIVIL	ROCARDO LARROTA MARIQUE	CALLE 42 SUR No 79F-38	3123583209	LABORATORIO DENSIDADES
ASESORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS SOSTENIBLES S.A.S.	CRISTIAN ROQUEME		Christian Roqueme S.	Proveedor de diseños



Ingeniería & Proyectos	**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**	FORMATO 19 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 de 4

FECHA DE AUDITORIA 16-abr-21 **AUDITORIA No.** 2

PROCESO O AREA AUDITADA: PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE OBRA 2019-1874
"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C.".

RESPONSABLE PROCESO / AREA: (Nombre y Cargo) Elizabeth Pineda Bustos (Anàlista de Calidad)

AUDITORES:
LIDER: N/A
AUDITOR: Wendy Johana Franco Marulanda
AUDITOR: N/A

OBJETIVO Y ALCANCE: Contrato de Obra No. 2019-1874

PERSONAL ENTREVISTADO:

NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Elizabeth Pineda Bustos	Anàlista de Calidad		
Maria Camila Gamba Ospina	Lider de calidad		

CRITERIOS DE AUDITORIA (Documentos de referencia) : VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD; BASADO EN LA NORMA ISO 10005 : 2005

Ingeniería & Proyectos	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FORMATO 19 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 2 de 4

NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

Se adjunta lista de chequeo e la cal se determinaròn 17 no conformidades

Firma Auditor Lider
Fecha: 16-abr-21

Firma Reponsable Proceso
Fecha:

VoBó Director de Obra

Ingeniería & Proyectos	**LISTA DE CHEQUEO** **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD; BASADO EN LA NORMA ISO 10005 : 2005**

FECHA DE AUDITORIA 16 de abril 2021
NOMBRE DEL AUDITOR Wendy Johana Franco Marulanda

ANEXOS DOCUMENTALES O REGISTROS					
DESCRIPCIÓN	CUMPLE				OBSERVACIONES
	SI	NO	Cumple parcialmente	N/A	
4. DESARROLLO DE UN PLAN DE LA CALIDAD					
4.1 Identificación de la necesidad de un plan de la calidad					
Mostrar cómo el sistema de gestión de la calidad de la organización se aplica a un caso especifico	x				EL plan de calidad se encunatra enfocado al DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens por parte del cliente
En el desarrollo y validación de nuevos productos o procesos	x				
Demostrar, interna y externamente, cómo se cumpliran los requisitos de calidad	x				Se cuenta con estrategias que demuestran como se cumplirá con los requisitos dedcalidad como lo son objetivos, metas y procedimientos de ejcución
Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y objetivos de la calidad	x				
Optimizar el uso del recursos para el cumplimiento de los objetivos de la calidad	x				

utilizarlos como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los requisitos para la calidad	x				
En ausencia de un sistema de gestión de calidad documentado	x				Se encuentra documentado un plan de calidad , más no un sistema de calidad
4.2 Entradas para el plan de la calidad					
Los requisitos para el caso específico	x				En el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020 se mencionana entradas al proyecto como lo son la documentación contractual y externa que es aplicada
Los requisitos para el plan de calidad, incluyendo aquellos en especificaciones del cliente, legales, reglamentarios y de la industria	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens por parte del cliente
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización	x				En el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020, se decribe el plan de la calidad para el proyecto
La evaluación de los riesgos para el caso específico	x				En el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020, se menciona como responsabilidad/ función del Tecnologo en Ingeniera (SISO) la Identificar los riesgos en los puestos de trabajo (matriz de riesgos), Se cuenta con matriz de riesgos
información sobre necesidades de aquellos que tienen el compromiso de llevar a cabo actividades cubiertas por el plan de calidad	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICASLICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."
información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el plan de calidad	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

Otros planes de calidad Pertinentes				X	
Otrosplanes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes ambientales, de salud y seguridad en el trabajo, de protección y de gestión de la información	x				Se cuenta con plan de seguridad industrial, plan de manejo ambiental, plan de manejo de trafico y plan de RCD
4.3 Alcance del plan de la calidad					
La organización debebería determinar qué será cubierto por el plan de calidad y qué está o estará cubierto por otros documentos	x				En el documento En el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020,se identifica el alcance del Plan de la calidad
4.4 Preparación del plan de calidad					
Iniciación: La persona responsable de la preparación del plan de la calidad debería ser claramente identificada	x				En el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020, define al Director de Obra y Líder de Calidad
Documentación del plan de calidad: Procedimientos documentados, listas de verificación, manual de la calidad, cómo se modifican o sustituyen	x				Se cuenta con Procedimientos documentados, listas de verificación, manual de la calidad, y en el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020 establece como deben ser modificados o sustituidos
Responsabilidades: La Organización debería acordar y definir las funciones, responsabilidades y obligaciones respectivamente tanto en el interior de la organización como con el cliente, las autoridades reglamentarias u otras partes interesadas.	x				En el documento plan de calidad Versión:07, define las definir las funciones, responsabilidades y obligaciones respectivamente tanto en el interior de la organización como con el cliente
Coherencia y compatibilidad: El contenido y el formato del plan de la calidad, los elementos del plan y las ncesidades de los usuarios previstos.	x				Se evidencia una compatibilidad en el contenido y los formatos del plan de la calidad
Presentación y estructura: Descripción textual , una tabla, una matriz de documentos, un mapa de procesos , un diagrama de flujo de trabajo o un manual.	x				El plan de la calidad es de tipo texto, nombrado PC Contrato 2019-1874 plan de calidad Versión:07

5. CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD					
Alcance	x				En el numeral 1.3 del documento PC Contrato de obra 2019-1874 Versión: 07 se envidencia el alcandel del Plan de la calidad
elementos de entrada del plan de la calidad	x				En el documento plan de calidad Versión:07, fecha de actualización: 20/08/2020 se mencionan entradas al proyecto como lo son la documentación contractual y externa que es aplicada, Se evidencian cambios en algunos documentos más no se evidencia una solicitud por escrito y aprobación del mismo segun el procedimiento establecido
Objetivos de la calidad	x				En el numeral 3.2 del documento PC Contrato de obra 2019-1874 Versión: 07 se envidencian los objetivos de calidad y su meta lo cual les permite ser medibles
Responsabilidades de la Dirección: Asegurarse de que las actividades requeridas por el sistema de gestión de la caliadad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se de seguimiento a su proceso	x				Se evidencia dentro de la carpeta Anexo 1.programación av carrera 24 x cll 53 y su respectivo seguimiento en informe semanal .
b) determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al caso específico;	x				Se evidencia secuencia e interacción en los procesos
c) comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que surjan en las interfases entre dichos grupos;	x				Dentro de la carpeta Anexco B. Se evidencia el procedimiento 01 comunicación interna, correspondencia y archivo, el cual tiene como objetivo la establecer lineamientos de comunicación efectiva dentro de la organización y al exterior de la misma, adicional se cuenta con formato 01 correspondencia enviada y formato 02 correspondencia recibida vacios. Se revisó Archivo de correspondencia
d) revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas;	x				Se cuenta con auditoría realizada por el interventor PIV Ingeniería, el 27 de enero de 2020
e) autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización;				x	No se ha solicitado ninguna excencion
f) controlar las acciones correctivas y preventivas;	x				En el Plan de la calidad PC Contrato de obra 2019-1874 Versión: 07 se establece que el director de obra será el responsable de programar y coordinar las reuniones o comités de obra internos, con el fin de evaluar y realizar seguimiento de las actividades ejecutadas en cada proceso, así como de las acciones correctivas y preventivas implementadas hasta el cierre de las mismas. Se revisa formato de acciones correctivas y preventivas Anexo 3

g) revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad.		x			Se evidencia FORMATO 16 REGISTRO MANEJO DE CAMBIO en blanco, lo cual hace referencia a que no se ha solicitad ni autorizado ningun cambio hasta la fecha desde el incio del proyecto, pero si se evidencia en procedimiento cuadro de aprobacipon en donde se encuentra la aprobación por parte de la dirección en el numeral 7.1 del documento PC Contrato 2019-1874 versión 7 se menciona el proceso de solicitud de cambios y se incluye flujograma. En el FORMATO 15 listado maestro de documentos no se menciona la versión del documento para llevar una trazabilidad y los cambios que se le han hecho a cada documento.
5.6 Control de documentos y datos					
a) cómo serán identificados los documentos y datos;	x				La documentación y registros se identifican con el nombre del proyecto y de acuerdo con el procedimiento 01 Comunicación Interna, Correspondencia y Archivo. Cuando los planos no vienen identificados con alguna codificación asignada por el cliente, la asignación del código se realiza de la siguiente manera: ABC – PL - ### Donde: ABC: corresponde a tres letras del titulo u objeto del proyecto. PL: significa plano. ###: Corresponde a un número consecutivo. Página 52	68 Carrera 71ª no 51ª - 17 – BOGOTÁ – COLOMBIA PBX: (5109104 / 3113831384/3124327726/3114987499 E-mail [illegible] BOGOTA - COLOMBIA
b) por quién serán revisados y aprobados los documentos y datos;	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 en el titulo 4.4.3 aprobación se menciona que el director de obra, quien será el encargado de aprobar o no los documento y datos
c) a quién se le distribuirán los documentos, o se le notificará su disponibilidad;	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 se establce a quien se le distribuirán los documentos

d) cómo se puede obtener acceso a los documentos y datos.	x				En el procedimiento 01 comunicación interna, correspondencia y archivo en el titulo 4.5 Archivo se establece que los documentos estarán localizados y archivados en la oficina principal de AC2R INGENIERIA Foto de carpetas rotuladas 
5.7 Control de los registros					
a) cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardarán los registros;	x				El documento PC contrato obra 2019-1874 Versión, establece el cómo, dónde y por cuánto tiempo se guardarán los registros
b) cuáles son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a satisfacer;	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens por parte del cliente
c) en qué medio se guardarán los registros (tal como papel o medios electrónicos);	x				Los registros se guardaran en medio fi'sico y en digital
d) cómo se definirán y cumplirán los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperación, disposición y confidencialidad;	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el
e) qué métodos se utilizarán para asegurarse de que los registros están disponibles cuando sea requerido;	x				Los responsables del plan de calidad conocen la ubicación de cada registro y documento que se requiere entorno al plan de la calidad
f) qué registros se proporcionarán al cliente, cuándo y por qué medios;	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 se establce a quien se le distribuirán los documentos
g) donde sea aplicable, en qué idioma se proporcionarán los registros de texto;				x	No aplica
h) la eliminación de registros.	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 se establece el proceso para la eliminación de documentos

5.8 Recursos					
5.8.1 Provisión de recursos. El plan de la calidad debería definir el tipo y cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan. Estos recursos pueden incluir materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens por parte del cliente
5.8.2 Materiales. Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias primas y/o compo- nentes), deberán declararse o hacer referencia en el plan de la calidad a las especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser conformes.	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens por parte del cliente
5.8.3 Recursos humanos. El plan de la calidad debería especificar, donde sea necesario, las competencias particulares requeridas para las funciones y actividades definidas dentro del caso específico. El plan de la calidad debería definir cualquier formación específica u otras acciones requeridas en relación con el personal.	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens por parte del cliente
5.8.4 Infraestructura y ambiente de trabajo. El plan de la calidad debería indicar los requisitos particulares del caso específico con respecto a la instalación para la fabricación o el servicio, espacio de trabajo, herramientas y equipo, tecnología de información y comunicación, servicios de apoyo y equipo de transporte necesarios para su terminación con éxito.	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 se establece la infraestructura y ambiente de trabajo
5.9 Requisitos					
El plan de la calidad debería indicar cuándo, cómo y por quién serán revisados los requisitos especificados para el caso específico. El plan de la calidad también debería indicar cómo se registrarán los resultados de esta revisión y cómo se resolverán los conflictos o ambigüedades en los requisitos.	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7, establece que el Director de la Obra programará comites de revisión y seguimiento del plan con el fin de resolver conflictosy ambigüedades en los requisito
5.10 Comunicación con el cliente					

a) quién es responsable de la comunicación con el cliente en casos particulares; b) los medios a utilizar para la comunicación con el cliente; c) cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto para clientes o funciones específicos; d) los registros a conservar de la comunicación con el cliente; e) el proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja de un cliente.	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 y el PROCEDIMIENTO 01COMUNICACIÓN INTERNA, CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO se establece lo que relacione la comunicación con el cliente.
5.11 Diseño y desarrollo					
5.11.1 Proceso de diseño y desarrollo.	x				Se cuenta con INSTRUCTIVO 3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PROCEDIMIENTO 3 DISEÑO DE INTERSECCIONES Y DOCUMENTO REPORTE EJECUTIVO DE DISEÑOS . Se revisa reporte ejecutivo de PMT y de Diseño
5.11.2 Control de cambios del diseño y desarrollo:					No se evidencia cómo se controlarán las solicitudes de cambios al diseño; quién está autorizado para iniciar la solicitud de cambio; cómo se revisarán los cambios en términos de su impacto; quién está autorizado para aprobar o rechazar cambios; y cómo se verificará la implementación de los cambios. Según lo establecido en la norma ISO 10005
5.12 Compras					
a) las características críticas de los productos comprados que afecten a la calidad del producto de la organización;	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificacioens de materiales a utilizar
b) cómo se van a comunicar esas características a los proveedores, para permitir el control adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio;	x				El auditoado manifiesta realiza el envio de las especificaiones tecnicas del material, via correo electronico
c) los métodos a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores;	x				Se cuenta con PROCEDIMIENTO 04 SELECCIÓN DE PROVEEDORES y adicionalemente se cuenta con un FORTMATO 17 LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTADOS . Se revisa selección de proveedores (Concreto) y listado de proveedores aceptados.

e) los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos pertinentes de aseguramiento de la calidad, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios que apliquen a los productos comprados;	x				Se revisa selección de proveedores y listado de proveedores aceptados.
f) cómo pretende verificar la organización la conformidad del producto comprado respecto a los requisitos especificados; y	x				Se revisa selección de proveedores y listado de proveedores aceptados.
g) las instalaciones y servicios requeridos que serán contratados externamente.	x				Se revisa selección de proveedores y listado de proveedores aceptados.
5.13 Producción y prestación del servicio					
Puede ser necesario verificar los procesos de producción y servicio, para asegurarse de que son capaces de producir los resultados requeridos; dicha verificación debería llevarse a cabo siempre si el resultado de un proceso no puede ser verificado por un seguimiento o medición subsiguiente. El plan de la calidad debería identificar los elementos de entrada, las actividades de realización y los resultados requeridos para llevar a cabo la producción y/o la prestación del servicio.	x				El plan de calidad define cómo se asegurará la prestación del servicio Son identificados todos los procesos dentro del contrato Se cumple a través de las bitácoras las cuales son diligenciadas a diario en cada frente de trabajo . El avance de obras se cumple de acuerdo con las programaciones que ac2r presenta a la interventoría. Así mismo se observa que se han presentado en su totalidad los informes semanales y mensuales que sustentan el cumplimiento de este numeral
Cuando la instalación o la puesta en servicio sean un requisito, el plan de la calidad debería indicar cómo será instalado el producto y qué características tienen que ser verificadas y validadas en ese momento. Cuando el caso específico incluya actividades posteriores a la entrega (por ejemplo servicios de mantenimiento, apoyo o formación), el plan de la calidad debería indicar cómo pretende la organización asegurar la conformidad con los requisitos aplicables	x				Se describen los procedimientos basados en las especificaciones técnicas requeridas por del cliente
5.14 Identificación y trazabilidad					
a) cómo se van a identificar los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a incorporar a los documentos de trabajo;	x				Se cuenta con el documento ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-099-2019 para el "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C." el cual incluye especificaciones por parte del cliente
b) qué registros se van a generar respecto a dichos requisitos de trazabilidad, y cómo se van a controlar y distribuir; y	x				no se evidencia cumplimiento

c) los requisitos y métodos específicos para la identificación del estado de inspección y de ensayo/prueba de los productos.	x				se cuenta con Procedimiento 02 Ensayos, Certificado de calibración comprobación y mantenimiento de equipos
5.15 Propiedad del cliente					
a) cómo se van a identificar y controlar los productos proporcionados por el cliente (tales como material, herramientas, equipo de ensayo/prueba, software, datos, información, propiedad intelectual o servicios),	x				se cuenta con Procedimiento 02 Ensayos, Certificado de calibración comprobación y mantenimiento de equipos ; Adicional se revisa listado de proveedores aprobados
b) los métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados por el cliente cumplen los requisitos especificados,	x				Se cuenta con procedimiento para selecciòn de proveedores
c) cómo se controlarán los productos no conformes proporcionados por el cliente; y		x			No está definido
d) cómo se controlará el producto dañado, perdido o inadecuado.		x			No está definido
5.16 Preservación del producto					
a) los requisitos para la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega, y como se van a cumplir estos requisitos; y b) (si la organización va a ser responsable de la entrega) cómo se entregará el producto en el sitio especificado, de forma tal que asegure que sus características requeridas no se degraden.	X				Se conserva registro de acta de recibido a satisfacción de las obras
5.17 Control del producto no conforme					
El plan de la calidad debería definir cómo se va a identificar y controlar el producto no conforme para prevenir un uso inadecuado, hasta que se complete una eliminación apropiada o una aceptación por concesión.	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 , establece el proceso para ael control de producto no conforme y se tiene un control de los mismos en el Formato 03. Control Salidas No conformes.
5.18 Seguimiento y medición					
Los procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios por los cuales se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad. En algunos casos, los clientes solicitan la presentación de los planes de seguimiento y medición (generalmente denominados "planes de inspección y ensayo/prueba") solos, sin otra información del plan de la calidad, como una base para dar seguimiento a la conformidad con los requisitos especificados.	x				Se utilizaran la Plantilla 02 Informe Semanal y la Plantilla 03 informe mensual

f) cuándo se requiere que las inspecciones o los ensayos/pruebas sean presenciados o llevados a cabo por autoridades reglamentarias y/o clientes	x				se cuenta con Procedimiento 02 Ensayos, Certificado de calibración comprobación y mantenimiento de equipos de inspección, medición y ensayo emitidos por INPASUELC
El plan de la calidad debería identificar los controles a utilizar para el equipo de seguimiento y medición que se pretende usar para el caso específico, incluyendo su estado de confirmación de la calibración.	x				Se revisan ensayos y certificados de calibración de tubería, cemento y balanza electrónica
5.19 Auditoria					
El plan de la calidad debería identificar las auditorias a ser llevadas a cabo para el caso específico, la naturaleza y extensión de dichas auditorias y cómo deberían utilizarse los resultados de las auditorias.	x				En el documento PC contrato obra 2019-1874 Versión 7 se establece la metodología para la ejecución de auditorias internas Se cuenta con el Anexo E el cual contiene PROCEDIMIENTO 05 AUDITORIAS INTERNAS, FORMATO 19. INFORME DE AUDITORIA y FORMATO 18. PLAN DE AUDITORIA
6 REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE LA CALIDAD					
6.1 Revisión y aceptación del plan de la calidad					
El plan de la calidad debería ser revisado respecto a su adecuación y eficacia, y ser formalmente aprobado por una persona autorizada o por un grupo que incluya representantes de las funciones pertinentes dentro de la organización.	x				Se cuenta con documento PIV-IMS- 20191810-0309, del dia 27 de agosto de 2020 en el que se da aprovación al plan de calidad V por parte de la intervetoria
6.2 Implementación del plan de la calidad					
a) Distribución del plan de la calidad	X				Se registra acta de divulgación
b) Formación en el uso de los planes de la calidad	X				Se registra acta de divulgación
6.3 Revisión del plan de la calidad					
a) para reflejar cualquier cambio a los elementos de entrada del plan de la calidad,	x				No se ven registrado los cambios realizados en el formato de control de cambios
b) para incorporar al plan de la calidad las mejoras acordadas.	x				Se han realizado las actualizaciones permitentes
6.4 Retroalimentación y mejora					
Donde sea apropiado, la experiencia obtenida de la aplicación de un plan de la calidad debería revisarse y la información se debería utilizar para mejorar planes futuros o el propio sistema de gestión de la calidad.	X				Se realiza auditoria interna

Ingeniería & Proyectos	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: SEMAFORIZACION	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☐ Producto ☐ Suministro ☐ Otro	
Descripción: PROCESO CONSTRUCCIÓN	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 31/04/2021

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Durante las inspecciones de seguimiento realizadas por el personal en obra no se presentaron observaciones

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☐ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: ANALISTA DE CALIDAD	CARGO: LIDER DE CALIDAD	CARGO:
NOMBRE: ELIZABETH PINEDA	NOMBRE: MARIA CAMILA GAMBA	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

ACR Ingeniería & Proyectos	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	FORMATO 21 FECHA: 20-08-2020 PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto: SEMAFORIZACION	Consecutivo No.:
Seguimiento realizado a: ☐ Proceso ☐ Producto ☐ Suministro ☐ Otro	
Descripción: PROCESO CONSTRUCCIÓN	
Tipo de seguimiento y/o medición:	Proveedor / Subcontratista:
Documento aplicable:	Fecha: 14/04/2021

DILIGENCIAR SOLO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

CARACTERISTICA POR VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
Cantidad			X	
Características del material: Color, textura, diámetro o especificación, entre otros			X	
Apariencia			X	
Certificado de Calidad o Registros de ensayo del material			X	

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Durante las inspecciones de seguimiento realizadas por el personal en obra no se presentaron observaciones

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
(Diligenciar sólo para Producto y Suministro)

Estado del producto:	CONFORME	NO CONFORME		
	☐ Aceptado	☐ Rechazado	☐ Reprocesado	☐ Aceptado por concesión

Acción a tomar:

Fecha Programada: Responsable:

Verificación de acción tomada:

Fecha toma de acción:

Observaciones:

ELABORÓ	VERIFICÓ	CLIENTE (Cuando Aplique)
CARGO: ANALISTA DE CALIDAD	CARGO: LIDER DE CALIDAD	CARGO:
NOMBRE: ELIZABETH PINEDA	NOMBRE: MARIA CAMILA GAMBA	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

INDICADORES DE GESTION OBJETIVOS DE CALIDAD			
FECHA	30/04/2021	INFORME MENSUAL N°	13
OBJETIVO N°1	Cumplir con los plazos estipulados	META	DIAS DE RETRASO
		2 dias	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON RETRASO			
OBJETIVO N°2	Queja y/o reclamo por parte del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		2 quejas	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			
OBJETIVO N°3	Cumplir con especificaciones tecnicas y manuales de diseño del cliente	META	N° DE QUEJAS Y RECLAMOS
		cumplir con especificaciones tecnicas, manuales de diseño y normas del contrato	0
ACTIVIDADES QUE GENERARON QUEJAS Y RECLAMOS			
