

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES

NIT 900053482-9
CL 4 # CR 6 4, Nueva Granada, Magdalena,
Tel: 3215541089
cooperativamag20@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV7
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 7 No. 29 - 259 Territorial Ocaña, Colombia, Ocaña, N. de Santander			06/02/2021
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	5611670	**NIT**	800215807-2	06/02/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Contrato 1265 del 2020(Acta Nº4 Mantenimiento Rutinario de vías a cargo de INVIAS Dirección Territorial Ocaña, Via Cod. 7007 Aguaclara - Ocaña -Sector PR0+0000 -PR43+0000 PERIODO: 1 al 30 de Enero del 2020)	Unidad	$35,133,334	1		$35,133,334
2	Contrato 1265 del 2020(Acta Nº4 AIU (10%))	Unidad	$3,513,333	1		$3,513,333
3	Contrato 1265 del 2020(Acta Nº4 Gastos reembolsable implementación protocolo de bioseguridad)	Unidad	$115,020	1		$115,020
4	Contrato 1265 del 2020(Acta Nº4 Valor básico administración protocolo de bioseguridad (2,5%))	Unidad	$2,876	1		$2,876

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-02-06T09:41:19
Fecha y hora de expedición: 2021-02-06T09:40:20
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 5ac14a59c779ce10d8dcc279434e69f14910573b66f6c1a6eabb755f93a23791b571fbe08f393ded4478c4267513711c

Firma digital: GdP6Zy3CtI09zC5ClJFstmAwfS+nbC7HDRtwVHxNFPR//jziE8LOTimI4mQo9EZ/87X1D39JJsg+5dyqN74x462s7NuC6ZqMqIresqIrDRgMPGU/
azL3fkKZDPtSOSm3WgaWUhjT81Ilk4mJZkRPqAX5zaKF/Y15mwXX5uh/T2m4YlKMeWGQu1axd9GQSSUYgcGWxf9pq/tBFdOQGw7c7xXlaO4+smn16kv8xqr2gZ5V
78Ko/WNEKTIawldvPcaXcpLVVUneCTeZiQS8wjYmQ8oXmpnmeCnolZRf+4neg/eq3iRDj+Bvl8nNF+VtA1TR5cFQA2HDGPe2+5iRtIrqzw==

Treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos

IVA (OBRA) $ 667,533 IVA(BIOSEGURIDAD) $ 546

Subtotal	$38,764,563
IVA (19.00%)	$668,079
Total	$39,432,642

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Emil Cardales

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764005606894 de 2020-10-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV500 con vigencia hasta 2021-10-14

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $38.764.563,00 PERIODO MES ENERO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		FEBRERO	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ana Lucia Martinez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		FEBRERO	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ana Lucia Martinez		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		FEBRERO	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Elías Jaimes Fernández	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		FEBRERO	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Elías Jaimes Fernández	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1265 DE 2020 NIT. 900.053.482-9

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA PR0+0000 - PR43+0000

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA autoriza el pago a favor del contratista COPERATIVA COOTRANDES por valor de : **$ 39.432.642,00** Letras: **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS** M/CTE.
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al **acta No. 04** del periodo de **Enero de 2021** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula: No. 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 2 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 38.764.563,00 **MES** ENERO DE 2021

ACTA FINAL SI ☐ **NO** ☒ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1265 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 70 Tramo 07 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1212 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES Y 20 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 6/10/2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19 DE FEBRERO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 115.806.195,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 57.069.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 172.875.195,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES AÑO (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ___		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA PR0+0000 - PR43+0000	mes	4,50	37.400.000,00	$ 168.300.000,00			1,03	$ 38.646.667,00	3,87	$ 144.613.333,00
2				GASTOS REEMBOLSABLES IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	Global mes (según compro bante)	3,00	540.000,00	$ 1.620.000,00			0,21	$ 115.020,00	1,47	$ 795.060,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 169.920.000,00**				**$ 38.761.687,00**		**$ 145.408.393,00**
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)													
*	VALOR IVA (OBRA)							$ 2.907.000,00				$ 667.533,00		$ 2.497.867,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)													
	VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)							$ 40.500,00				$ 2.876,00		$ 19.877,00
	VALOR IVA (ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 2,5%)							$ 7.695,00				$ 546,00		$ 3.777,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													
*	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**													
*														
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 172.875.195,00**				**$ 39.432.642,00**		**$ 147.929.914,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	2 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

AIU 10 %
Utilidad %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 552420 de Fecha 2020-10-05
Saldo del Registro: $ 24.945.281,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 38.761.687,00	$ 667.533,00	$ 39.429.220,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
VALOR BASICO ADMINISTRACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)	$ 2.876,00	$ 546,00	$ 3.422,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 38.764.563,00	$ 668.079,00	$ 39.432.642,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO		
1 Obras de Explanación				
2 Sub-bases y bases				
3 Transporte de materiales				
4 Aceros y elementos metálicos				
5 Acero Estructural y cables de acero				
6 Concretos, morteros y obras varias				
7 Concreto para superestructuras				
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles				
(N) Ítems no sujetos a ajuste				

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1265/2020

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	4	ENERO DE 2021
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 552420	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 39.432.642,00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. __	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. __	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	$ 39.432.642,00

Firma: _____ Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°1265 de 2020 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

Acta N° 04 Valor basico $ 38.764.563,00 Período ENERO DE 2021

Valor Incluido Iva $ 39.432.642,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7007	Aguaclara-Rio de Oro			$ 39.432.642,00	$ 39.432.642,00
2						
3						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 39.432.642,00**	**$ 39.432.642,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.300.123-1	MUNICIPIO 1	RIO DE ORO	$ 32.279.745,00	$ 31.732.852,00
800.096.561-4	MUNICIPIO 2	AGUACHICA	$ 7.152.897,00	$ 7.031.711,00
	MUNICIPIO			
	MUNICIPIO			
	MUNICIPIO			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 39.432.642,00**	**$ 38.764.563,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma Emil Cardales

Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
COOTRANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Firma Ana Lucia Martinez O.

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053482	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 N 4-04 BARRIO 10 DE ENERO	NUEVA GRANADA-MAGDALENA	4257087	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	874981347	9415538160	E	2021/02/18	2021/01/29	BANCOLOMBIA	0	$4,504,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (16 Afiliados)						$14,536,416	$2,326,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$1,012,800		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (16 Afiliados)						$14,536,416	$2,326,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$1,012,800		$0	$0
Ciudad: NUEVA GRANADA Depto: MAGDALENA (16 Afiliados)						$14,536,416	$2,326,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$1,012,800		$0	$0
1	CC	1091666195	ARDILA EDUARDO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
2	CC	13167964	ARDILA JAIRO	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
3	CC	18911724	BARBOSA ALIRIO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
4	CC	18912749	BUENO JOSE	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	1048275987	CARDALES EMIL	230201	30	$908,526	$145,400	CCFC55	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	18918234	FIGUEROA MARCO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	18921139	GALVIZ ANTONIO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
8	CC	13168862	GARCIA ELIDIS	230301	30	$908,526	$145,400	CCFC50	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	13379224	GARCIA WILLINGTON	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	9716119	PAEZ EDGAR	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	13362156	PAREDES RAMON	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	18926702	PORTILLO LUIS	231001	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	18916764	RINCON CIRO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	1091675974	SANCHEZ YOHAN	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	18913024	SERNA GABRIEL	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	18928257	VEGA ALEXANDER	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$14,536,416	$2,326,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$582,400			$14,536,416	$1,012,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900053482	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 6 N 4-04 BARRIO 10 DE ENERO	NUEVA GRANADA-MAGDALENA	4257087	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	874981347	9415538160	E	2021/02/18	2021/01/29	BANCOLOMBIA	0	$4,504,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,326,400	$0	$0	$2,326,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$1,890,200	$0	$0	$1,890,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,012,800	$0	$0	$1,012,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,012,800	$0	$0	$1,012,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$582,400	$0	$0	$582,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	$582,400	$0	$0	$582,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$582,400	$0	$0	$582,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$254,800	$0	$0	$254,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$72,800	$0	$0	$72,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$109,200	$0	$0	$109,200
TOTAL				16	$4,504,000	$0	$0	$4,504,000

CONSORCIO KOVIAL

CERTIFICACIÓN

Que revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta parcial No. 04, correspondiente al período del 01 al 30 de enero de 2021, presentada durante la ejecución del contrato No. 1265 de 2020, suscrito con el contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES-COOTRANDES, cuyo objeto objeto es "**MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA PR0+0000 - PR43+0000**", ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016, Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; y queda exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE, según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018.

Para constancia se firma en Ocaña, a los dos (2) días del mes de Febrero de 2021.



ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
Representante Legal
CONSORCIO KOVIAL
Administración de mantenimiento vial

CERTIFICACIÓN

Yo, **EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS** Representante Legal de la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES, identificada con el NIT 900.053.482-9, en desarrollo del Contrato No. 1265 de 2020, certifico que se pagaron durante el período del 01 al 30 de enero de 2021, los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y caja de compensación familiar y quedo exonerado de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018 y demás normas reglamentarias en la materia.

Para constancia se firma en Ocaña, a los dos (2) días del mes de febrero de 2021.



EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1265 DE 2020 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES " COOTRANDES"

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA CÓD.7007

SECTOR: AGUACLARA – RIO DE ORO, SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	552420	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	1265 DE 2020	$ 115.806.195,00
2020	552420	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL No..1	57.069.000,00
			TOTAL			$ 172.875.195,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 172.875.195,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 552420 De (2020-10-05)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Obra	06-30 OCT	$ 31.627.917,00	$ 540.471,00	$ 32.168.388,00			$ 140.706.807,00	$ 32.168.388,00	$ 140.706.807,00		X		
2	Obra	01-30 NOV	$ 37.517.896,00	$ 646.546,00	$ 38.164.442,00			$ 102.542.365,00	$ 70.332.830,00	$ 102.542.365,00		X		
3	Obra	01-30 DIC	$ 37.517.896,00	$ 646.546,00	$ 38.164.442,00			$ 64.377.923,00	$ 108.497.272,00	$ 64.377.923,00		X		
4	Obra	01-30 ENE	$ 38.764.563,00	$ 668.079,00	$ 39.432.642,00			$ 24.945.281,00	$ 147.929.914,00	$ 24.945.281,00				EN TRAMITE
TOTALES			**$ 145.428.272,00**	**$ 2.501.642,00**	**$ 147.929.914,00**			**$ 24.945.281,00**	**$ 147.929.914,00**	**$ 24.945.281,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 145.408.393,00	$ 2.497.867,00	$ 147.906.260,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
VALOR BASICO ADMINISTRACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)	$ 19.877,00	$ 3.777,00	$ 23.654,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 145.428.270,00**	**$ 2.501.644,00**	**$ 147.929.914,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
COOTRANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14703668486

(415)7707212489984(8020) 000001470366848 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 5 3 4 8 2	9	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOTRA-ANDES

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Nueva Granada 4 6 0

41. Dirección principal
CL 4 CR 6 4 04 BRR DIEZ DE ENERO LOS ANDES

42. Correo electrónico cooperativamag20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 5 5 4 1 0 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 5 0 9 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 7 61. Fecha 2020 - 08 - 14 / 12 : 09: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OROZCO ZARCO SUGEIDY ESTHER
985. Cargo Facilitador III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04

CONTRATO No. 1265 DE 2020: "MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA, DEL PR0+0000 AL PR43+0000**".**

PERIODO: 01 al 30 de enero de 2021
Ocaña, 01 de febrero de 2021



CONTRATO No. 1212 DE 2020

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA, DEL PR0+0000 AL PR43+0000**.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL No. 04 **MES O PERIODO:** Enero de 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		7
2.3	Características técnicas del proyecto		X		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		8
3.1	Información general del contrato		X		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		9
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		10
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		26
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		X	
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		28
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		30
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		32
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		34
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		36
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		39
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1			
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		42
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		44
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		12
5.1	Información general del contrato		X		12
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		12
5.3	Informes especialistas			X	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		15
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		55
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		57
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		59
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		61
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		63
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		X		15
8	**Anexos**		X		17
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		17
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		21
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....6
2.1 Localización....6
2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía....7
2.3 Características Técnicas del Proyecto....8
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA....8
3.1 Información General del Contrato....8
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes....9
3.3 Seguimiento ítems no previstos....10
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría....10
1. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....10
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto....11
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra....11
4.3 Personal Contrato de Obra....11
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra....11
4.5 Estado General del Tiempo....11
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio....11
4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra....11
4.8 Informe Avance Físico-Financiero....11
4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra....11
4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra....11
4.11 Otros documentos seguimiento mensual:....12
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA....12
5.1 Información general del contrato....12
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor....13
5.3 Informes especialistas....14
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC....14
5.5 Información otros programas y aplicativo....14
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....15
6.1 Equipo Contrato de Interventoría....15
6.2 Personal Contrato de Interventoría....15
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría....15
6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría....15
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría....15
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría....15
6.7 Otros documentos seguimiento mensual....15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....15
8. ANEXOS....17
8.1 *Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.*....17
8.2 Informe mensual protocolo de Bioseguridad (Anexo 15)....20
8.3 Informe Capacitación personal mto rutinario (Anexo 16)....20
8.4 Registro fotográfico del avance de las obras.....21
Retiro y corte de árbol caído PR 19+869....21
Bacheo manual PR 33+835 LI....21

Rocería manual PR 04+080.....21
Limpieza de obras de arte PR 07+456.....21
8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales.....22

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3
Anexo 2	Personal Contrato de Obra Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6
Anexo 3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8
Anexo 4	Estado General del Tiempo Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10
Anexo 5	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12
Anexo 6	Informe Avance Físico-Financiero Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14
Anexo 7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15
Anexo 8	Seguimiento programa de inversiones Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2
Anexo 9	Informes semanales Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Anexo10	Equipo Contrato de Interventoría Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5
Anexo 11	Personal Contrato de Interventoría Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7

Anexo 12	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9
Anexo 13	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13
Anexo 14	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16
Anexo 15	Informe mensual protocolo de bioseguridad
Anexo 16	Informe Capacitación personal mto rutinario

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías destinó inicialmente $ $151.288.984,00 para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA GRUPO 2 y $ 115.806.195,00 para ejecutar el MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL OCAÑA, con el fin de mantener las condiciones actuales de las vías objeto del alcance: Vía 7007, carretera Aguaclara – Rio de Oro desde PR 00+0000 al PR 43+000; posteriormente y en aras de continuar garantizando el mantenimiento al corredor vial se adicionaron los contratos en un 50% cada uno, como lo determina la Ley.

Regional y localmente estas carreteras sirven de arteria vial para comunicar la provincia de Ocaña y los municipios de Sur del Cesar con el oriente del país desarrollando su integración regional mediante el intercambio comercial, industrial, cultural y de servicios sobre la cual gira la economía de esta estratégica zona del país.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El Instituto Nacional de Vías destino recursos para adicionar los contratos de Mantenimiento Rutinario 1265 del 2020 ($ 57.069.000) y el de la administración vial contrato 1212 del 2020 ($75.644.492) por ende con la adición se prorrogo los contratos en 50 días calendario, con el objeto de mantener el corredor vial carretera Aguaclara-Ocaña, Ruta 7007 sector PR 0 al PR 43, con el recurso humano y logístico para mantener la transitabilidad y disminuir el riesgo sobre el usuario en la temporada de vacaciones de fin del año 2020 e inicio del 2021.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 1212 de 2020, por parte del CONSORCIO KOVIAL como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 1265 de 2020, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de enero del 2021.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Cesar y Norte de Santander, en las vías: Aguaclara – Ocaña desde el PR 00+0000 al PR 54+0787, corredor vial ruta 70 tramo 07, sector Aguaclara – Rio de Oro, que une a Ocaña con la frontera Colombo Venezolana y la región del Catatumbo una subregión colombiana ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander con el interior del país, el valle del Magdalena, y la costa Caribe colombiana utilizando la Troncal central, RUTA DEL SOL, hasta los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta al norte y los centros de producción del país ubicados en Bogotá, Medellín y Cali; con la salvedad que la actividad de mantenimiento rutinario se ejecuta por parte del contratista en el sector PR00+0000 al PR 43+0000, sector Aguaclara-Rio de Oro, ruta 7007.



El corredor vial en mención se encuentra situado en el nororiente del país en el departamento del Cesar. Como referencia histórica este corredor fue revertido al Instituto Nacional de Vías INVIAS el 17 de octubre de 2017 por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, como consecuencia de una terminación unilateral de la Concesionaria Ruta del Sol Tramo II; lo que generó obras civiles y de infraestructura vial inconclusas.

En el cuadro se observa la localización del corredor vial donde se ejecuta la actividad de mantenimiento rutinario, y se describen las siguientes características:

a) Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscritas las vías del proyecto en mención.
b) Códigos de las vías.
c) Límites de las vías, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud de cada una de ellas.

Cuadro 1 Datos corredor vial.

TERRITORIAL	COD. VIA	NOMBRE DE LA VIA	SECTOR	PR INICIAL	PR FINAL	LONG. (Km)
OCAÑA	70 07	Aguaclara - Ocaña	Aguaclara - Rio de Oro	00+000	43+000	42,994

Fuente: INVIAS

Imagen 1 Detalle Ruta 7007



Fuente: Google Earth-Consorcio AMV-IDF-2020

2.2 Inventario y Estado Inicial de la Vía

En general, la carretera se encuentra en condiciones de transitabilidad normales, aunque hay sectores en los cuales la carpeta presenta características de falla; piel de cocodrilo, escamas, fisuras y desprendimientos, los cuales en los sitios donde se han generado baches, han sido tratados preventivamente con bacheos manuales con MDC. La territorial viene realizando gestiones para realizar inversiones que brinden seguridad y mejoras en la transitabilidad del corredor vial, el INVIAS realizo durante las vigencias anteriores una gran inversión con el contrato No 1180 del 2018 para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

A continuación, se presenta el estado actual del corredor vial de acuerdo a los parámetros de evaluación de Criterio Técnico:

CONDICION	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	42,99	0,00	0,0%	33,97	79,0%	7,04	16,4%	1,99	4,6%	0,00	0,0%
No Pavimentado	0,00										

Es relevante tener en cuenta que se hace necesario contar con las actividades del contrato de mantenimiento rutinario, mediante el cual se mantiene en condiciones de transitabilidad y seguridad para el usuario el corredor vial.

2.3 Características Técnicas del Proyecto

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

CONTRATO No.	1265 DE 2020
OBJETO	Mantenimiento rutinario de vías a cargo del instituto nacional de vías - dirección territorial Ocaña, vía código 7007 Aguaclara - Ocaña sector PR0+0000 al PR43+0000.
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANDES.
REPRESENTANTE LEGAL	EMIL CARDALES TRESPALACIOS.
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES HASTA 31/12/2020.
PLAZO FINAL	CUATRO (04) MESES Y 20 DIAS.
FECHA INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA TERMINACIÓN	19 DE FEBRERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 115.806.195,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 172.875.195,00 (incluido IVA)

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Semana del 01 al 06 de enero de 2021:

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000. 2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000. 3. Vigilancia diaria al corredor vial. 4. Rocería manual del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000. 5. Limpieza de cunetas del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000. 6. Limpieza de encoles y descoles del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000. 7. Poda y despeje de señales verticales del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000.

Semana del 07 al 13 de enero de 2021:

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000. 2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000. 3. Vigilancia diaria al corredor vial. 4. Rocería manual del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000. 5. Limpieza de cunetas del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000. 6. Limpieza de encoles y descoles del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000. 7. Poda y despeje de señales verticales del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.

Semana del 14 al 20 de enero de 2021:

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000. 2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000. 3. Vigilancia diaria al corredor vial. 4. Rocería manual del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800. 5. Limpieza de cunetas del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800. 6. Limpieza de encoles y descoles del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800. 7. Poda y despeje de señales verticales del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.

Semana del 21 al 27 de enero de 2021:

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000. 2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000. 3. Vigilancia diaria al corredor vial. 4. Rocería manual del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500. 5. Limpieza de cunetas del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500. 6. Limpieza de encoles y descoles del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR

27+500. 7. Poda y despeje de señales verticales del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.

Semana del 28 al 31 de enero de 2021:

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+0000. 2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000. 3. Vigilancia diaria al corredor vial. 4. Limpieza y despeje de puentes PR 00+090 al PR 07+800 y del PR 09+100. 5. Limpieza de cunetas del PR 20+000 al PR 21+000 y del PR 27+500 al PR 32+000. 6. Limpieza de encoles PR 29+850. 7. Retiro de ángulos sin tablero del PR 00+000 al PR 01+000 y del PR 21+000 al PR 43+000. 8. Demarcación obras de arte PR 00+000 al PR 03+000 y del PR 21+000 al PR 24+000.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

(No aplica).

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Durante el periodo evaluado el contrato de mantenimiento rutinario se ejecuta con normalidad en las programaciones semanales, se generan pequeñas emergencias por caídas de árboles debido a los vientos fuertes; se ha observado un incremento en el volumen de tráfico pesado y particular como comportamiento normal por la finalización de temporada de vacaciones por el corredor vial.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión al único contrato en ejecución en el corredor vial, el cual corresponde al Mantenimiento rutinario, efectuando recorridos y visitas periódicas a la vía para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la empresa, empleo de herramienta exigida en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución del contrato asignado.

1. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 (Anexo 1)

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 **No Aplica**

4.3 Personal Contrato de Obra

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 (Anexo 2)

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 (Anexo 3)

4.5 Estado General del Tiempo

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10 (Anexo 4)

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 **No Aplica**

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 (Anexo 5)

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

Ver formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14 (Anexo 6)

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15 (Anexo 7)

4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 **No Aplica**

4.11 Otros documentos seguimiento mensual:

- Programa de Inversiones y seguimiento Programa de inversiones

Ver Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2 (Anexo 8)

- Actas de comité de obra

Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1 **No Aplica**

- Acta de reunión

Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2 **No Aplica**

- Informe Semanal

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2 (Anexo 9)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	1212 de 2020
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA, DEL PR0+0000 AL PR43+0000
INTERVENTOR	CONSORCIO KOVIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO FINAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTE(20) DIAS
FECHA INICIACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA FINAL CTO	19 DE FEBERRO DEL 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 151.288.984,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 226.933.476.oo (Incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las actividades para el contrato de Mantenimiento Rutinario, verificando que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.

- Supervisión sobre la programación semanal de actividades contractuales.

- Capacitación al personal de mantenimiento rutinario, encaminada a mejorar su percepción sobre la ejecución de actividades.

- Identificación de sitios críticos en el corredor vial.

- Recorrido y presencia diaria en la ejecución de las actividades sobre la vía para el control técnico de los trabajos realizados.

- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.

- Requerimiento al contratista para la señalización de sitios que generasen riesgo para el usuario.

- Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que actualmente se presenta en el país, se solicitó a la empresa de mantenimiento rutinario cumplir con la elaboración del Protocolo de Bioseguridad adaptado a todas las actividades objeto del contrato conforme a lo reglado en la Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020, elaborada por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, en el capítulo 1 RESPONSABILIDADES, numeral 1 contratista, en el literal f y g, y con establecido por el Instituto Nacional de Vías, en la circular 002 del 13-04-2020.

- El Protocolo de Bioseguridad presentado fue revisado, aprobado y remitido al INVIAS por esta Interventoría. Así mismo, se solicitó que se hiciera conocer dicho protocolo a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales para que realice el respectivo acompañamiento.

- Diariamente se verifica que este protocolo sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas

(No aplica).

5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

(No aplica).

5.5 Información otros programas y aplicativo

(No aplica)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato de Interventoría

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 (Anexo 10)

6.2 Personal Contrato de Interventoría

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 (Anexo 11)

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 (Anexo 12)

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 (Anexo 13)

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 (Anexo 14)

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 **No Aplica**

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

• Programa de Inversión del anticipo y Seguimiento a la inversión del Anticipo

Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**

Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista viene ejecutando las actividades programadas semanalmente objeto del contrato, las cuales a la fecha se encuentran con cumplimiento al 100% (el personal es nuevo y cuenta con experiencia en las actividades).

- El Contratista mejoro y labora con dos frentes de obra cada uno con su personal y equipos.

- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías, ser explicito en los pliegos y solicitar abrir dos frentes de obra diarios con su respectivo vehículo y herramienta; continuar realizando el mantenimiento rutinario de la vía, estos mantenimientos mantienen en condiciones normales la vía evitando así su pronto deterioro.

- Se sugiere contar con un contrato de obra, con el cual se pueda atender el retiro de derrumbes y las obras civiles que representan riesgo para el usuario del corredor vial.

8. ANEXOS

8.1 ***Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.***

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RELACIÓN CORRESPONDENCIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	3	2	2021

Contrato de obra	**1265 DE 2020**
Contratista:	COOTRANDES
Conformación:	
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000
Fecha de Inicio:	6/10/2020
Valor Inicial:	$ 115.806.195
Adición 1:	$ 57.069.000,00
Adición 2:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 172.875.195
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Plazo Actualizado:	4 MESES Y 20 DIAS
Fecha de Iniciación:	01 de octubre de 2020
Fecha de Vencimiento:	19 DE FEBRERO DE 2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO ENERO 2021

CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA
ADM-KOV-01-2021-001	5/01/2021	INVIAS	Accidentalidad Diciembre 2020	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-002	5/01/2021	INVIAS	Informe trimestral ruta 7007	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-003	6/01/2021	COOTRANDES	Programacion semana 14	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-004	7/01/2021	INVIAS	Informe semanal 13 cto 1212 de 2020	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-005	13/01/2021	COOTRANDES	Programacion semana 15	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-006	14/01/2021	INVIAS	Informe semanal 14 cto 1212 de 2020	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-007	18/01/2021	COOTRANDES	Visita previa para recibo definitivo	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-008	20/01/2021	COOTRANDES	Programacion semana 16	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-009	21/01/2021	INVIAS	Informe semanal 15 cto 1212 de 2020	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-010	25/01/2021	COOTRANDES	Reiteración No. Programa de optimización Mto rutinario	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-011	25/01/2021	CENTRO DE CONVIVENCIA	Sala de conferencia alcaldia Ene. 2021	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-012	27/01/2021	COOTRANDES	Capacitación No.4 personal Cto 1265 de 2020	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-013	27/01/2021	COOTRANDES	Programacion semana 17	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-014	28/01/2021	INVIAS	Informe semanal 16 cto 1212 de 2020	INFORMATIVO
ADM-KOV-01-2021-015	29/01/2021	INVIAS	Accidentalidad Enero 2021	INFORMATIVO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No. OFICIO	FECHA	REMITE	ASUNTO	RESPUESTA
CARGUE PAC 2021	12/01/2021	INVIAS	SF-GT-348 -5ene2021 cargue PAC 2021	INFORMATIVA
Memorando Circular SRN 1774 15 01 2020	15/01/2021	INVIAS	Memorando Circular SRN 1774 15 01 2020	INFORMATIVA
POLIZA GU169654 CONSORCIO KOVIAL ADICION 50% Y PRORROGA	18/01/2021	INVIAS	POLIZA GU169654 CONSORCIO KOVIAL ADICION 50% Y PRORROGA	INFORMATIVA
MEMO DO 3507 del 23 de enero 2021	23/01/2021	INVIAS	MEMO DO 3507 del 23 de enero 2021	INFORMATIVA

8.2 Informe mensual protocolo de Bioseguridad (Anexo 15)

8.3 Informe Capacitación personal mto rutinario (Anexo 16)

8.4 Registro fotográfico del avance de las obras.

CONTRATO N.º 1265 DE 2020
CARRETERA: 7007 AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+000 - PR 43+0000

COOTRANDES – ENE. 2021

	
Retiro y corte de árbol caído PR 19+869	Bacheo manual PR 33+835 LI
	
Rocería manual PR 04+080**.**	Limpieza de obras de arte PR 07+456.

CONTRATO N.º 1212 DE 2020: CARRETERA: 7007
AGUACLARA – RIO DE ORO, PR 00+000 - PR 43+0000

CONSORCIO KOVIAL – ENE. 2021

	
Charla con personal de uno de los frentes de obra.	Identificación y Valoración de sitio critico PR 31+748.
	
Verificación de sitio critico PR 37+277	Capacitación programada personal.

8.5 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

(No Aplica)

ANEXOS

Anexo 1

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3 (Día) / 2 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **PERIODO MES:** ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1265 DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATISTA: COOTRANDES

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIACION: 6 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 115.806.195,00
VALOR ACUMULADO: $ 172.875.195,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 50 DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ 57.069.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1212 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 39.432.642,00	$ 39.432.642,00		$ 39.432.642,00	1,00	$ 45.811.906,00	1,00	1,16
Acumulado:	$ 147.929.914,00	$ 147.929.914,00		$ 147.929.914,00	1,00	$ 183.042.587,00	1,00	1,24

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 172.875.195,00
Total	**$ 172.875.195,00**

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,34	3,83	0,82	0,83	$ 24.945.281,00		$ 24.945.281,00	$ 24.945.281,00
Interventor:	0,30	4,00	0,86	0,66	$ 43.890.889,00		$ 43.890.889,00	$ 43.890.889,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	2-oct-20	13-oct-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	2-oct-20	13-abr-24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra		

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual		
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: Aprobación de garantias de fecha dic/2020.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 2

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO DE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** 1265 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** AGUACLARA - OCAÑA

CONTRATISTA: COOTRANDES **SECTOR:** AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1212 de 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO KOVIAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ARDILA EDUARDO	OBRERO																															
ARDILA JAIRO	OBRERO																															
BARBOSA ALIRIO	OBRERO																															
BUENO JOSE	OBRERO																															
FIGUEROA MARCO	OBRERO																															
GALVIZ ANTONIO	OBRERO																															
GARCIA ELIDIS	OBRERO																															
GARCIA WILLINGTON	OBRERO																															
PAEZ EDGAR	OBRERO																															
PAREDES RAMON	OBRERO																															
PORTILLO LUIS	OBRERO																															
RINCON CIRO	OBRERO																															
SANCHEZ YOHAN	OBRERO																															
SERNA GABRIEL	OBRERO																															
VEGA ALEXANDER	OBRERO																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Emil Cardales

Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
COOTRANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Ana Lucia Martinez O.

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 3

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1265 DE 2020 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES " COOTRANDES"

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA AGUACLARA , OCAÑA CÓD.7007

SECTOR: AGUACLARA – RIO DE ORO, SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	552420	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	1265 DE 2020	$ 115.806.195,00
2020	552420	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL No..1	57.069.000,00
			TOTAL			$ 172.875.195,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 172.875.195,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 552420 De (2020-10-05)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Obra	06-30 OCT	$ 31.627.917,00	$ 540.471,00	$ 32.168.388,00			$ 140.706.807,00	$ 32.168.388,00	$ 140.706.807,00		X		
2	Obra	01-30 NOV	$ 37.517.896,00	$ 646.546,00	$ 38.164.442,00			$ 102.542.365,00	$ 70.332.830,00	$ 102.542.365,00		X		
3	Obra	01-30 DIC	$ 37.517.896,00	$ 646.546,00	$ 38.164.442,00			$ 64.377.923,00	$ 108.497.272,00	$ 64.377.923,00		X		
4	Obra	01-30 ENE	$ 38.764.563,00	$ 668.079,00	$ 39.432.642,00			$ 24.945.281,00	$ 147.929.914,00	$ 24.945.281,00				EN TRAMITE
TOTALES			**$ 145.428.272,00**	**$ 2.501.642,00**	**$ 147.929.914,00**			**$ 24.945.281,00**	**$ 147.929.914,00**	**$ 24.945.281,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 145.408.393,00	$ 2.497.867,00	$ 147.906.260,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
VALOR BASICO ADMINISTRACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%)	$ 19.877,00	$ 3.777,00	$ 23.654,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 145.428.270,00**	**$ 2.501.644,00**	**$ 147.929.914,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
COOTRANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	3	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1265 DE 2020 **CONTRATISTA:** COOTRANDES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** AGUACLARA – OCAÑA

SECTOR: PR0+0000 – PR43+0000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas				1							1													1								3
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Emil Cardales

Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
COOTRANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Ana Lucia Martinez O.

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 5

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA
Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	2 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1265 DE 2020 **CONTRATISTA:** COOTRANDES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA 7007, AGUACLARA - OCAÑA

SECTOR: AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
ARDILA EDUARDO	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	1091666195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30	P O S I T I V A	9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
ARDILA JAIRO	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	13167964	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
BARBOSA ALIRIO	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18911724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
BUENO JOSE	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18912749	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
FIGUEROA MARCO	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18918234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
GALVIZ ANTONIO	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18921139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
GARCIA ELIDIS	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	13168862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
GARCIA WILLINGTON	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	13379224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
PAEZ EDGAR	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	9716119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
PAREDES RAMON	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	13362156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
PORTILLO LUIS	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18926702	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
RINCON CIRO	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18916764	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
SANCHEZ YOHAN	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	1091675974	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
SERNA GABRIEL	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18913024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	
VEGA ALEXANDER	OBRERO	01 al 30 de Enero de 2021	30	18928257	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9415538160	30		9415538160	30	9415538160	30	COOTRANDES	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma Emil Cardales

Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
COOTRANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Firma

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 6

INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 (Día) / 2 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 4 **PERIODO MES:** ENERO DE 2021 **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 38.764.563,00**

CONTRATO DE OBRA No : 1265 DE 2020
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 50 DIAS

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000
FECHA DE INICIACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: COOTRANDES
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19 DE FEBRERO DE 2021

SECTOR: 7007 AGUACLARA - RIO DE ORO
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 115.806.195,00
VALOR ADICIONALES: $ 57.069.000,00

RUTA 7007
VALOR ACUMULADO: $ 172.875.195,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: VÍA 7007, PR 00+0000 A PR 43+0000
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1212 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1265 DE 2020	3 MESES Y 50 DIAS	19 DE FEBRERO DE 2021	$ 172.875.195,00	$ 172.875.195,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 172.875.195,00
Total	**$ 172.875.195,00**

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1212	3 MESES Y 50 DIAS	19 DE FEBRERO DE 2021	$ 151.288.984,00	$ 226.933.476,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 39.432.642,00	$ 39.432.642,00		$ 39.432.642,00	1,00	$ 45.811.906,00	1,00	1,16
Acumulado:	$ 147.929.914,00	$ 147.929.914,00		$ 147.929.914,00	1,00	$ 183.042.587,00	1,00	1,24

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,34	3,83	0,82	0,83	$ 24.945.281,00		$ 24.945.281,00	$ 24.945.281,00
Interventor:	0,30	4,00	0,86	0,66	$ 43.890.889,00		$ 43.890.889,00	$ 43.890.889,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 (Día) / 2 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 4 **PERIODO MES:** ENERO DE 2021 **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 38.764.563,00**

CONTRATO DE OBRA No : 1265 DE 2020
PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 50 DIAS

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000
FECHA DE INICIACIÓN: 6 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: COOTRANDES
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19 DE FEBRERO DE 2021

SECTOR: 7007 AGUACLARA - RIO DE ORO
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 115.806.195,00
VALOR ADICIONALES: $ 57.069.000,00

RUTA: 7007
VALOR ACUMULADO: $ 172.875.195,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: VÍA 7007, PR 00+0000 A PR 43+0000
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1212 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000														$ 39,43	$ 39,43	$ 147,93	$ 147,93
GPP2																	
GPP3																	
GPPn																	

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Emil Cardales
Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Ana Lucia Martinez O.
Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Anexo 7

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

FECHA: 3 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 1265 DE 2020 **CONTRATISTA:** COOTRANDES

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS A CARGO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA OCAÑA SECTOR PR0+0000 PR43+0000.

FECHA DE INICIO: 6/10/2020

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19 DE FEBRERO DE 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 115.806.195,00

VALOR ACUMULADO: $ 172.875.195,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1212 DE 2020 **INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 11.580.619,00	2	OCT	2020	1	JUL	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 13.038.788,20	2	OCT	2020	31	DIC	2023
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 326-47-994000005310

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	3	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 17.287.520	2	10	2020	13	10	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 34.575.039,00	2	10	2020	13	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **326-47-994000005310**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: DICIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma 

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 8

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES
MINFRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 3 (Día) / 2 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** ENERO DE 2021 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 38.764.563,00

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1265 DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, VIA CODIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA SECTOR PR0+0000 – PR43+0000

CONTRATISTA: COOTRANDES **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Carreteras: Aguaclara-Rio de Oro (7007) Del PR 00+0000 - PR 43+0000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1212 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO KOVIAL

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 50 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2020 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/02/2021 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 115.806.195,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 57.069.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 172.875.195,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado								OCTUBRE DE 2020	NOVIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2020	ENERO DE 2021	FEBRERO 2021
Mantenimiento rutinario a través de microempresas, en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial OCAÑA, carreteras: 7007 Aguaclara - Ocaña, PR 43+0000 - PR 54+0787 y 7008: OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR 00+0000 - PR 07+0000.	$ 170.929,50	100,00%	85,08%	85,08%								18,50%	21,95%	21,95%	22,68%	
				$ 145.428,27								$31.627,92	$37.517,90	$37.517,90	$38.764,56	
			$ 145.428,27	$ 145.428,27								$31.627,92	$37.517,90	$37.517,90	$38.764,56	
				85,08%								18,50%	21,95%	21,95%	22,68%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 170.929,50	100%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ -**	**0%**														

100%
50%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									18,50%	21,95%	21,95%	22,68%	
	VALOR (Miles de Pesos)									$31.627,92	$37.517,90	$37.517,90	$38.764,56	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									18,50%	40,45%	62,40%	85,08%	
	VALOR (Miles de Pesos)									$31.627,92	$69.145,81	$106.663,71	$145.428,27	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									18,50%	21,95%	21,95%	22,68%	
	VALOR (Miles de Pesos)									$31.627,92	$37.517,90	$37.517,90	$38.764,56	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									18,50%	40,45%	62,40%	85,08%	
	VALOR (Miles de Pesos)									$31.627,92	$69.145,81	$106.663,71	$145.428,27	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ - / $ -
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 170.929,50**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: EMIL ENRIQUE CARDALES TRESPALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES
C.C. No.: 1.048.275.987 de Malambo (Atl)

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Anexo 9

INFORMES SEMANALES

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 7 (Día) / 1 (Mes) / 21 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: TRONCAL DEL MAGDALENA Y TRANSVERSAL GAMARRA - OCAÑA

TRAMO Y/O SECTOR(S): AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 13 del 31/12/2020 al 6/01/2021 (Numeración consecutiva)

PARA EL CTO 1212 DEL 2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA DEL PR0+0000 AL PR43+0000

FECHA DE INICIO: 6/10/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS: ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1265 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 115.806.195,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 57.069.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03)MESES UN DIA	VALOR ACUMULADO:	$ 172.875.195,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KOVIAL		
INTEGRANTES:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION (60%) -ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO (40%)		
CONTRATO No.	1212 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 151.288.984,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 75.644.492,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03) MESES SEIS DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 226.933.476,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**		**2020**	
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 172.875.195		$ 226.933.476	
EJECUTADO	$ 108.497.272		$ 137.230.700	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 113.860.500,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.806.195,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.497.272,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 93,69
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20

VALOR FACTURA: $ 38.164.442,00 FECHA FACTURA: 9/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 64.336.776,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 137.230.700,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20


VALOR FACTURA: $ 40.489.512,00 FECHA FACTURA: 14/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 80.701.316,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS	43		43



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	X
EMISIONES:	SI NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
OTROS:	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La Administración vial realizó recorridos para verificar el corredor vial y la ejecución de la programación semanal para el contrato de Mto rutinario.

Actividades programadas para ejecucion semana 13.

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000.
5. Limpieza de cunetas del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 00+000 al PR 05+000 y del PR 38+000 al PR 43+000.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisión actividades de Mantenimiento rutinario.

Verificación y seguimiento a las actividades realizadas por el personal de mantenimiento rutinario, de acuerdo a programación semanal (Formato correspondiente al informe semanal de mantenimiento rutinario)

Programación semanal de actividades de mantenimiento Rutinario semana 12:

1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	7 (Día)	1 (Mes)	21 (Año)

5. Limpieza de cunetas del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corte y retiro de arbol caido sobre la via PR 09+950, Ruta 7007



Roceria manual PR 01+300 LI, Ruta 7007



Limpieza de obras de arte PR 00+235, Ruta 7007



Roceria manual PR 42+550 LI, Ruta 7007



Limpieza de descole PR 40+630 LD, Ruta 7007



Admon vial en charla con Microempresarios.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE ADMON VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	FIRMA NOMBRE: Giovanni Ariza Arias No. MAT: 25202 74644 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 14 (Día) / 1 (Mes) / 21 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: TRONCAL DEL MAGDALENA Y TRANSVERSAL GAMARRA - OCAÑA

TRAMO Y/O SECTOR(S): AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 14 del 7/01/2021 al 13/01/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA DEL PR0+0000 AL PR43+0000

FECHA DE INICIO: 6/10/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS: ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1265 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 115.806.195,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 57.069.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03)MESES UN DIA	VALOR ACUMULADO:	$ 172.875.195,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KOVIAL		
INTEGRANTES:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION (60%) -ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO (40%)		
CONTRATO No.	1212 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 151.288.984,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 75.644.492,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03) MESES SEIS DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 226.933.476,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020		2020	
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 172.875.195		$ 226.933.476	
EJECUTADO	$ 108.497.272		$ 137.230.700	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 113.860.500,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.806.195,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.497.272,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 93,69
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20

VALOR FACTURA: $ 38.164.442,00 FECHA FACTURA: 9/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 108.497.272,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 137.230.700,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20


VALOR FACTURA: $ 40.489.512,00 FECHA FACTURA: 14/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 137.230.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS	43		43



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A X
EMISIONES:	SI	NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:			

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La Administración vial realizó recorridos para verificar el corredor vial y la ejecución de la programación semanal para el contrato de Mto rutinario.
Actividades programadas para ejecucion semana 14.
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.
5. Limpieza de cunetas del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 05+000 al PR 10+000 y del PR 33+000 al PR 38+000.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisión actividades de Mantenimiento rutinario.
Verificación y seguimiento a las actividades realizadas por el personal de mantenimiento rutinario, de acuerdo a programación semanal (Formato correspondiente al informe semanal de mantenimiento rutinario)
Programación semanal de actividades de mantenimiento Rutinario semana 15:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	14 (Día)	1 (Mes)	21 (Año)

5. Limpieza de cunetas del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de cunetas PR 06+950 LI, Ruta 7007



Roceria manual PR 06+530 LD, Ruta 7007



Limpieza de obras de arte PR 07+456, Ruta 7007



Limpieza de cunetas PR 36+370 LI, Ruta 7007



Limpieza de descole PR 35+720 LD, Ruta 7007



Reposicion señal vertical PR 23+540 LI, Ruta 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE ADMON VIAL
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	FIRMA NOMBRE: Giovanni Ariza Arias No. MAT: 25202 74644 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 21 (Día) / 1 (Mes) / 21 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: TRONCAL DEL MAGDALENA Y TRANSVERSAL GAMARRA - OCAÑA

TRAMO Y/O SECTOR(S): AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 15 del 14/01/2021 al 20/01/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA DEL PR0+0000 AL PR43+0000

FECHA DE INICIO: 6/10/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1265 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 115.806.195,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 57.069.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03)MESES UN DIA	VALOR ACUMULADO:	$ 172.875.195,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KOVIAL		
INTEGRANTES:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION (60%) -ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO (40%)		
CONTRATO No.	1212 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 151.288.984,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 75.644.492,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03) MESES SEIS DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 226.933.476,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020		2020	
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 172.875.195		$ 226.933.476	
EJECUTADO	$ 108.497.272		$ 137.230.700	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 113.860.500,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.806.195,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.497.272,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 93,69
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20

VALOR FACTURA: $ 38.164.442,00 FECHA FACTURA: 9/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 108.497.272,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO($ 137.230.700,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20


VALOR FACTURA: $ 40.489.512,00 FECHA FACTURA: 14/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 137.230.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS	43		43



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A X
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
OTROS:	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La Administración vial realizó recorridos para verificar el corredor vial y la ejecución de la programación semanal para el contrato de Mto rutinario.
Actividades programadas para ejecucion semana 15:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.
5. Limpieza de cunetas del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 10+000 al PR 15+000 y del PR 21+000 al PR 24+800.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisión actividades de Mantenimiento rutinario.
Verificación y seguimiento a las actividades realizadas por el personal de mantenimiento rutinario, de acuerdo a programación semanal (Formato correspondiente al informe semanal de mantenimiento rutinario)
Programación semanal de actividades de mantenimiento Rutinario semana 16:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	21 (Día)	1 (Mes)	21 (Año)

5. Limpieza de cunetas del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de encoles PR 11+435 LI, Ruta 7007



Roceria manual PR 15+000 LD, Ruta 7007



Corte y retiro de arbol caido sobra la via PR 13+800, Ruta 7007



Limpieza de obras de arte PR 23+705, Ruta 7007



Limpieza de calzada PR 38+450, Ruta 7007



Reposicion señal vertical PR 24+500 LI, Ruta 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**INGENIERO RESIDENTE ADMON VIAL**
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	FIRMA NOMBRE: Giovanni Ariza Arias No. MAT: 25202 74644 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 28 (Día) / 1 (Mes) / 21 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: TRONCAL DEL MAGDALENA Y TRANSVERSAL GAMARRA - OCAÑA

TRAMO Y/O SECTOR(S): AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 16 del 21/01/2021 al 27/01/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA DEL PR0+0000 AL PR43+0000

FECHA DE INICIO: 6/10/2020

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1265 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 115.806.195,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 57.069.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03)MESES UN DIA	VALOR ACUMULADO:	$ 172.875.195,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KOVIAL		
INTEGRANTES:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION (60%) -ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO (40%)		
CONTRATO No.	1212 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 151.288.984,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 75.644.492,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03) MESES SEIS DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 226.933.476,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020		2020	
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 172.875.195		$ 226.933.476	
EJECUTADO	$ 108.497.272		$ 137.230.700	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 113.860.500,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.806.195,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.497.272,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 93,69
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20

VALOR FACTURA: $ 38.164.442,00 FECHA FACTURA: 9/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 108.497.272,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO($ 137.230.700,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20


VALOR FACTURA: $ 40.489.512,00 FECHA FACTURA: 14/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 137.230.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS	43		43



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:			

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La Administración vial realizó recorridos para verificar el corredor vial y la ejecución de la programación semanal para el contrato de Mto rutinario.
Se realizo identificacion de sitios criticos en el corredor vial.
Se oficio al contratista recordando el incumplimiento en la entrega del compromiso de optimizacion del programa de mantenimiento Rutinario mediante oficio ADM-KOV-01-2021-010 del 26 de enero del 2021.
Actividades programadas para ejecucion semana 16:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Rocería manual del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.
5. Limpieza de cunetas del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.
6. Limpieza de encoles y descoles del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.
7. Poda y despeje de señales verticales del PR 15+000 al PR 20+000 y del PR 24+800 al PR 27+500.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisión actividades de Mantenimiento rutinario.
Verificación y seguimiento a las actividades realizadas por el personal de mantenimiento rutinario de acuerdo a programación semanal (Formato correspondiente al informe semanal de mantenimiento rutinario)
Capacitacion No 04 personal de Mantenimiento Rutinario para el 30/01/2021.
Programación semanal de actividades de mantenimiento Rutinario semana 17:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Limpieza y despeje de puentes PR 00+090 al PR 07+800 y del PR 09+100.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	21 (Año)

5. Limpieza de cunetas del PR 20+000 al PR 21+000 y del PR 27+500 al PR 32+000.
6. Limpieza de encoles PR 29+850.
7. Retiro de angulos sin tablero del PR 00+000 al PR 01+000 y del PR 21+000 al PR 43+000.
8. Demarcacion obras de arte PR 00+000 al PR 03+000 y del PR 21+000 al PR 24+000.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Bacheo manual con MDC PR 17+350, Ruta 7007



Limpieza de descoles PR 17+190 LD, Ruta 7007



Roceria manual PR 17+300, Ruta 7007



Bacheo manual con MDC PR 33+800, Ruta 7007



Limpieza de descoles PR 26+500, Ruta 7007



Limpieza de cunetas PR 26+450 LI, Ruta 7007

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE ADMON VIAL
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	FIRMA NOMBRE: Giovanni Ariza Arias No. MAT: 25202 74644 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 4 (Día) / 2 (Mes) / 21 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: TRONCAL DEL MAGDALENA Y TRANSVERSAL GAMARRA - OCAÑA

TRAMO Y/O SECTOR(S): AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

SEMANA No.: 17 del 28/01/2021 al 3/02/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. VIA CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA DEL PR0+0000 AL PR43+0000

FECHA DE INICIO: 6/10/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS: ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LOS ANDES- COOTRANDES		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1265 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 115.806.195,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 57.069.000,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03)MESES UN DIA	VALOR ACUMULADO:	$ 172.875.195,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KOVIAL		
INTEGRANTES:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA EN REORGANIZACION (60%) -ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO (40%)		
CONTRATO No.	1212 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 151.288.984,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ 75.644.492,00
PLAZO FINAL:	CUATRO PUNTO SEIS (4.6) MESES		
PLAZO ACUMULADO:	TRES (03) MESES SEIS DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 226.933.476,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**		**2020**	
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 172.875.195		$ 226.933.476	
EJECUTADO	$ 108.497.272		$ 137.230.700	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 113.860.500,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.806.195,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 108.497.272,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	$ 93,69
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20

VALOR FACTURA: $ 38.164.442,00 FECHA FACTURA: 9/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 108.497.272,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO($ 137.230.700,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: dic-20


VALOR FACTURA: $ 40.489.512,00 FECHA FACTURA: 14/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 137.230.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS	43		43



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: AGUACLARA - RIO DE ORO (PR0+000 a PR43+000)

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	X
EMISIONES:	SI NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:			

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La Administración vial realizó recorridos para verificar el corredor vial y la ejecución de la programación semanal para el contrato de Mto rutinario.
Se realizo capacitacion correspondiente al mes de enero del 2021.
Actividades programadas para ejecucion semana 17:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Limpieza y despeje de puentes PR 00+090 al PR 07+800 y del PR 09+100.
5. Limpieza de cunetas del PR 20+000 al PR 21+000 y del PR 27+500 al PR 32+000.
6. Limpieza de encoles PR 29+850.
7. Retiro de angulos sin tablero del PR 00+000 al PR 01+000 y del PR 21+000 al PR 43+000.
8. Demarcacion obras de arte PR 00+000 al PR 03+000 y del PR 21+000 al PR 24+000.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Supervisión actividades de Mantenimiento rutinario.
Verificación y seguimiento a las actividades realizadas por el personal de mantenimiento rutinario, de acuerdo a programación semanal (Formato correspondiente al informe semanal de mantenimiento rutinario)
Programación semanal de actividades de mantenimiento Rutinario semana 18:
1. Atención de emergencias PR 00+000 al PR 43+000.
2. Limpieza de calzada del PR 00+0000 al PR 43+0000.
3. Vigilancia diaria al corredor vial.
4. Limpieza de cunetas del PR 04+000 al PR 07+000 y del PR 23+400 al PR 27+000.
5. Demarcacion obras de arte PR 00+000 al PR 03+000 y del PR 21+000 al PR 24+000 (demarcacion nomenclatura).

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

RUTA No. 7007 PR 00+0000 PR 43+ 0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	4 (Día)	2 (Mes)	21 (Año)



Limpieza de calzada PR 29+0100, Ruta 7007



Corte y retiro de arbol con riesdo sobre el usuario PR 19+770 LI, Ruta 7007



Limpieza de obra de arte PR 02+950, Ruta 7007



Demarcacion de muros PR 22+200 LD, Ruta 7007



Retiro de señales hurtadas PR 42+040, Ruta 7007



etiro de pequeño derrumbe sobre la cuneta PR 28+900 LI, Ruta 70

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE ADMON VIAL
Realizar recorridos para verificar cumplimiento de metas e indicadores en la programación semanal Realizar inspecciones para garantizar cumplimiento de protocolo de bioseguridad	FIRMA NOMBRE: Giovanni Ariza Arias No. MAT: 25202 74644 CND

Anexo 10

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 2 (Día) / 2 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CONTRATO No.** 1212 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 7007

INTERVENTORÍA: CONSORCIO KOVIAL **SECTOR:** Aguaclara-Rio de Oro (7007) Del PR 00+0000 al PR 43+000

EQUIPO	**DESCRIPCIÓN**	**ENERO DE 2021**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIONETA PLACA DUP100	Camioneta doble cabina marca Ford MOD. 2019 de 2.488 CC. Color plata	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Anexo 11

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO DE 2021 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1212 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 7007

INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL **SECTOR:** Aguaclara-Rio de Oro (7007) Del PR 00+0000 al PR 43+000

NOMBRE	CARGO	ENERO DE 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GIOVANNI ARIZA ARIAS	Ingeniero Residente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ANDREA DEL PILAR GELVEZ NAVARRO	Inspectora vial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JULIETH PAOLA CARO ARÉVALO	Inspectora SISO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WILLIAM JOSÉ MIRANDA PABON	Conductor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 12

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	2 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1212 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO KOVIAL

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 7007

SECTOR: Aguaclara-Rio de Oro (7007) Del PR 00+0000 al PR 43+000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	532220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	$ 151.288.984,00
2020	735420	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Adición No.1	$ 75.644.492,00
				TOTAL		$ 226.933.476,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$226.933.476,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro presupuestal No. 532220	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 226.933.476,00				CONTRATO PRINCIPAL
1	**01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020**	$ 33.908.116,00	$ 6.442.542,00	$ 40.350.639,00			$ 186.582.837,00	$ 40.350.639,00	$ 186.582.837,00		
2	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**	$ 47.387.000,00	$ 9.003.530,00	$ 56.390.530,00			$ 130.192.307,00	$ 96.741.169,00	$ 130.192.307,00		
3	**01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020**	$ 34.024.800,00	$ 6.464.712,00	$ 40.489.512,00			$ 89.702.795,00	$ 137.230.681,00	$ 89.702.795,00		
4	**01 AL 30 DE ENERO DE 2021**	$ 38.497.400,00	$ 7.314.506,00	$ 45.811.906,00			$ 43.890.889,00	$ 183.042.587,00	$ 43.890.889,00		PRESENTE ACTA
TOTALES		**$ 153.817.316,00**	**$ 29.225.290,00**	**$ 183.042.587,00**			**$ 43.890.889,00**	**$ 183.042.587,00**	**$ 43.890.889,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 2 (Día) / 2 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1212 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO KOVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: 7007

SECTOR: Aguaclara-Rio de Oro (7007) Del PR 00+0000 al PR 43+000

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	GIOVANNI ARIZA ARIAS	88.138.476	Ingeniero Residente	$ 5.193.000,00	$ 5.193.000,00	$ 361.433,00	$ 207.720,00	$ 830.880,00	$ 207.720,00	$ -	$ -
2	ANDREA DEL PILAR GELVEZ NAVARRO	1.094.274.950	Inspectora vial	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ -
3	JULIETH PAOLA CARO ARÉVALO	1.093.789.091	Inspectora SISO	$ 1.450.000,00	$ 1.450.000,00	$ 100.920,00	$ 58.000,00	$ 232.000,00	$ 58.000,00	$ -	$ -
4	WILLIAM JOSÉ MIRANDA PABON	13.509.923	Conductor	$ 1.360.000,00	$ 1.360.000,00	$ 94.656,00	$ 54.400,00	$ 217.600,00	$ 54.400,00	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.503.000,00	$ 2.942.129,00						

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Anexo 14

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA	3 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIR. TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1212 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO KOVIAL

OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA, DEL PR0+0000 AL PR43+0000

FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19 DE FEBRERO DE 2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 151.288.984,00

VALOR ACUMULADO: $ 226.933.476,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 22.693.347,60	23	9	2020	24	06	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 45.386.695,20	23	9	2020	24	06	2021
Calidad del servicio	20%	$ 45.386.695,20	24	12	2020	24	6	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-30-3060247839

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CONFIANZA S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	3 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 22.693.347,60	14	12	2020	19	08	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 45.386.695,20	14	12	2020	19	02	2024
Calidad del servicio	20%	$ 68.008.042,00	19	02	2021	19	08	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30 GU169654

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CONFIANZA S.A

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Aprobación de anexos modificatorios de pólizas, modificacion efectuada diciembre de 2020

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: ANA LUCIA MARTÍNEZ OROZCO
CONSORCIO KOVIAL
C.C 34.536.548 Santander de Quilichao (Cau)

Firma

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Anexo 15

INFORME MENSUAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORÍA No. 04

CONTRATO No. 1265 DE 2020: "MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRIRORIAL OCAÑA. CARRETERA 7007 AGUACLARA-OCAÑA PR00+000 AL PR43 + 000**".**

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
Ocaña, 03 DE FEBRERO DE 2021



CONTRATO No. 1265 DE 2020

MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRIRORIAL OCAÑA. CARRETERA 7007 AGUACLARA-OCAÑA PR00+000 AL PR43 + 000.

INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta el informe mensual de las actividades realizadas sobre el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, dando cumplimiento a la resolución No. 666 del 24 de Marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y a la circular externa No. 003 del 07 de Mayo expedida por el Invías en cuanto al cumplimiento y seguimiento de los protocolos de bioseguridad que los contratistas y las interventorías deben realizar respectivamente.

La interventoría diariamente en sus visitas a las vías a cargo realiza el control a cada trabajador sobre la utilización obligatoria de tapaboca y guantes, además del distanciamiento preventivo que deben tener como mínimo 2MTS entre cada trabajador, así mismo hace una toma aleatoria de temperatura de los obreros.

Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Semana del 01 al 06 de Enero de 2021**:**

Durante el transcurso de la semana la Cooperativa de trabajo asociado los Andes cumplió a cabalidad con el protocolo de bioseguridad, utilizando los elementos adecuados para la prevención del contagio por Covid-19, así mismo el inspector siso de la administración vial realizó las visitas y las charlas pertinentes, esta semana fue: uso del alcohol, lavado de manos y autocuidado, protocolo de actuación frente a emergencias viales y protocolo de bioseguridad.

Cooperativa de trabajo asociado los Andes diariamente al inicio de cada jornada y al final de la misma hace la toma la temperatura corporal al personal en obra con un termómetro digital, está información se registra en el formato de condiciones diaria de salud. Posterior a esto semanalmente se le hace entrega a cada trabajador de los elementos de bioseguridad entre estos un (1) par de guantes, dos (2) tapabocas reutilizable de tela, jabón líquido antibacterial, alcohol antiséptico y gel antibacterial, todo esto se encuentra ubicado en un punto estratégico dentro de la obra para su continuo uso. Antes de iniciar la jornada se realiza la desinfección de las herramientas de trabajo y se lleva a cabo la actividad de lavado de manos cada tres horas para la prevención del contagio por COVID-19.

Semana del 07 al 13 de Enero de 2021**:**

Durante el transcurso de la semana la Cooperativa de trabajo asociado los Andes cumplió a cabalidad con el protocolo de bioseguridad, haciendo uso correcto de los elementos de protección personal y de bioseguridad para la prevención del contagio por Covid-19, así mismo el inspector siso de la administración vial llevó a cabo las charlas diarias de prevención, esta semana se trataron los siguientes temas: Actualidad de la pandemia, elementos de protección personal; características, uso adecuado y disposición final.

Posteriormente para dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad Cooperativa de trabajo asociado los Andes realiza al inicio de cada jornada y al final de la misma se hace la toma la temperatura corporal al personal en obra con un termómetro digital,

está información se registra en el formato de condiciones diaria de salud. Posterior a esto semanalmente se le hace entrega a cada trabajador de los elementos de bioseguridad entre estos un (1) par de guantes, dos (2) tapabocas reutilizable de tela, jabón líquido antibacterial, alcohol antiséptico y gel antibacterial, todo esto se encuentra ubicado en un punto estratégico dentro de la obra para su continuo uso. Antes de iniciar la jornada se realiza la desinfección de las herramientas de trabajo y se lleva a cabo la actividad de lavado de manos cada tres horas para la prevención del contagio por COVID-19.









Semana del 14 al 20 de Enero de 2021:

Durante el transcurso de la semana la Cooperativa de trabajo asociado los Andes cumplió a cabalidad con el protocolo de bioseguridad, haciendo uso correcto de los elementos de protección personal y de bioseguridad para la prevención del contagio por Covid-19, así mismo el inspector siso de la administración vial llevó a cabo las charlas diarias de prevención, esta semana se trataron los siguientes temas: Distanciamiento social y la nueva "normalidad", cuidado en el hogar, la prevención es un trabajo en equipo.

Al inicio de cada jornada y al final de la misma se hace la toma la temperatura corporal al personal en obra con un termómetro digital, está información se registra en el formato de condiciones diaria de salud. Posterior a esto semanalmente se le hace entrega a cada trabajador de los elementos de bioseguridad entre estos un (1) par de guantes, dos (2) tapabocas reutilizable de tela, jabón líquido antibacterial, alcohol antiséptico y gel antibacterial, todo esto se encuentra ubicado en un punto estratégico dentro de la obra para su continuo uso. Antes de iniciar la jornada se realiza la desinfección de las herramientas de trabajo y se lleva a cabo la actividad de lavado de manos cada tres horas para la prevención del contagio por COVID-19.









Semana del 21 al 31 Enero de 2021**:**

Durante el transcurso de la semana el inspector siso de la administración vial llevó a cabo las charlas preventivas, esta semana se trataron los siguientes temas: Peligros del área de trabajo, responsabilidades en cuanto al orden y la limpieza, reglas críticas de prevención de accidentes.

Así mismo se llevó a cabo la capacitación por parte de la interventoría, quien a través de un bombero acreditado, capacita a los trabajadores sobre primeros auxilios, RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y utilización correcta de los elementos y camilla para prestar la atención inmediata de forma adecuada. Este tema se trató con el fin de dotar a los trabajadores de herramientas para saber reaccionar ante cualquier emergencia que suceda durante las labores de mantenimiento rutinario.

De igual manera al inicio de cada jornada y al final de la misma se hace la toma la temperatura corporal al personal en obra con un termómetro digital, está información se registra en el formato de condiciones diaria de salud. Posterior a esto semanalmente se le hace entrega a cada trabajador de los elementos de bioseguridad entre estos un (1) par de guantes, dos (2) tapabocas reutilizable de tela, jabón líquido antibacterial, alcohol antiséptico y gel antibacterial, todo esto se encuentra ubicado en un punto estratégico dentro de la obra para su continuo uso. Antes de iniciar la jornada se realiza la desinfección de las herramientas de trabajo y se lleva a cabo la actividad de lavado de manos cada tres horas para la prevención del contagio por COVID-19.

Cootrandes viene cumpliendo con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en la resolución No. 666 del 24 de Marzo del 2020 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social además de lo ordenado por Invías en la circular externa No. 003 del 07 Mayo del 2020.

A la fecha no se han presentado contagios ni sospechosos con COVID-19. El estado de salud de los trabajadores es bueno.

CONTRATO No. 1212 DE 2020: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA, DEL PR0+0000 AL PR43+0000**.".**

PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
Ocaña, 04 DE FEBRERO de 2020



CONTRATO No. 1212 DE 2020

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – OCAÑA, DEL PR0+0000 AL PR43+0000**.".**

INTRODUCCIÓN

Consorcio KOVIAL adopta las medidas de bioseguridad establecidas en la re No. 666 del 24 de Marzo del 2020 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social además de lo ordenado por Invías en la circular externa No. 003 del 07 Mayo del 2020.

Dentro de las actividades que se realizan para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad se encuentran:

- Toma de temperatura.
- Uso de los elementos de bioseguridad en la oficina.
- Desinfección de manos.
- Distanciamiento 2 MTS.
- Desinfección del vehículo.
- Reporte diario de condiciones de salud.

Consorcio KOVIAL viene cumpliendo a cabalidad con la implementación del protocolo de bioseguridad, según lo establecido en la resolución No. 666 del 24 de Marzo del 2020 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social además de lo ordenado por Invías en la circular externa No. 003 del 07 Mayo del 2020.

A la fecha no se han presentado contagios ni sospechosos con COVID-19. El estado de salud de los trabajadores es bueno.

TOMA DE TEMPERATURA









DESINFECCIÓN DE MANOS Y CALZADO













DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO










ANEXO

Informe semanal condiciones de Salud de los trabajadores MES DE ENERO.

Semana del 31 Diciembre al 06 de Enero de 2021

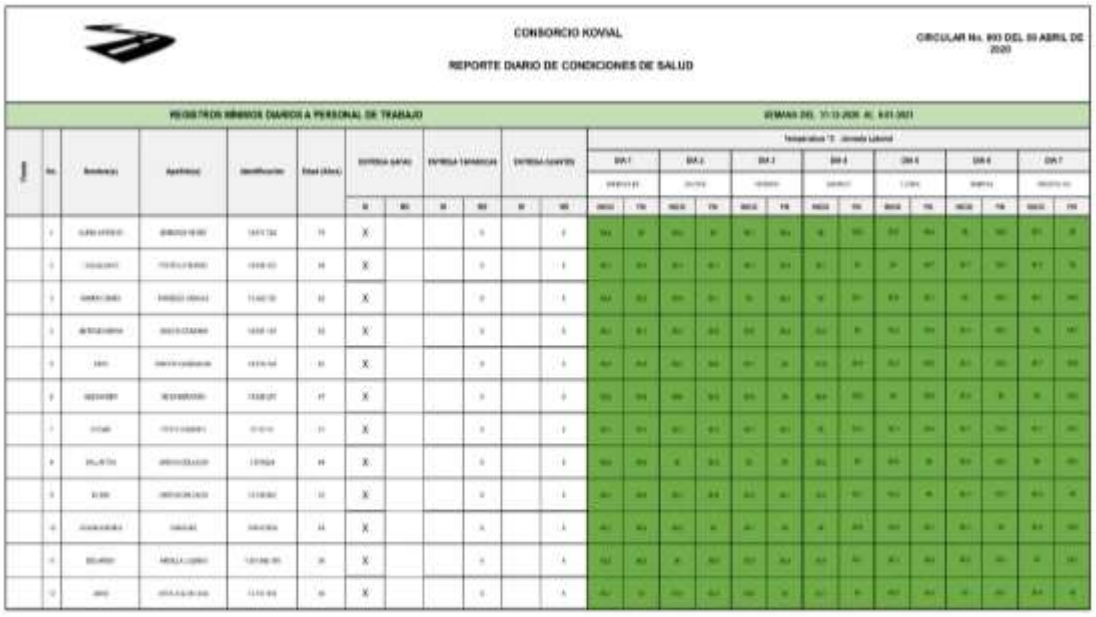


CONSORCIO KOVIAL

REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

CIRCULAR No. 893 DEL 09 ABRIL DE 2020

Semana del 7 al 13 de Enero de 2021

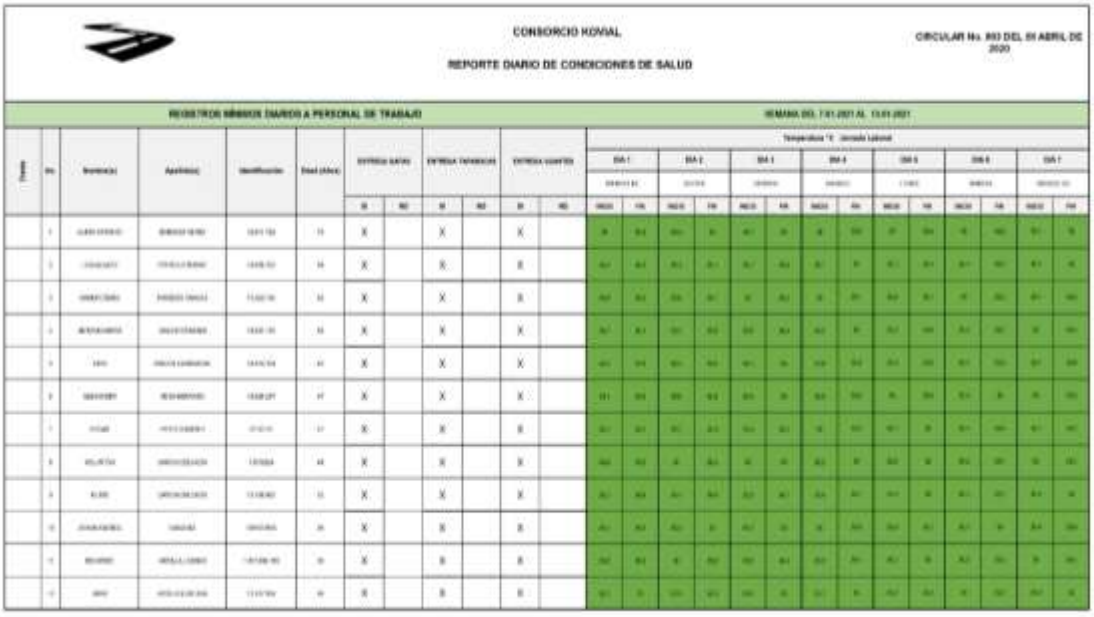

CONSORCIO KOVIAL


REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

CIRCULAR No. 003 DEL 03 ABRIL DE 2020

REGISTROS MÍNIMOS DIARIOS A PERSONAL DE TRABAJO

SEMANA DEL 7-01-2021 AL 13-01-2021

Semana del 14 al 20 de Enero de 2021

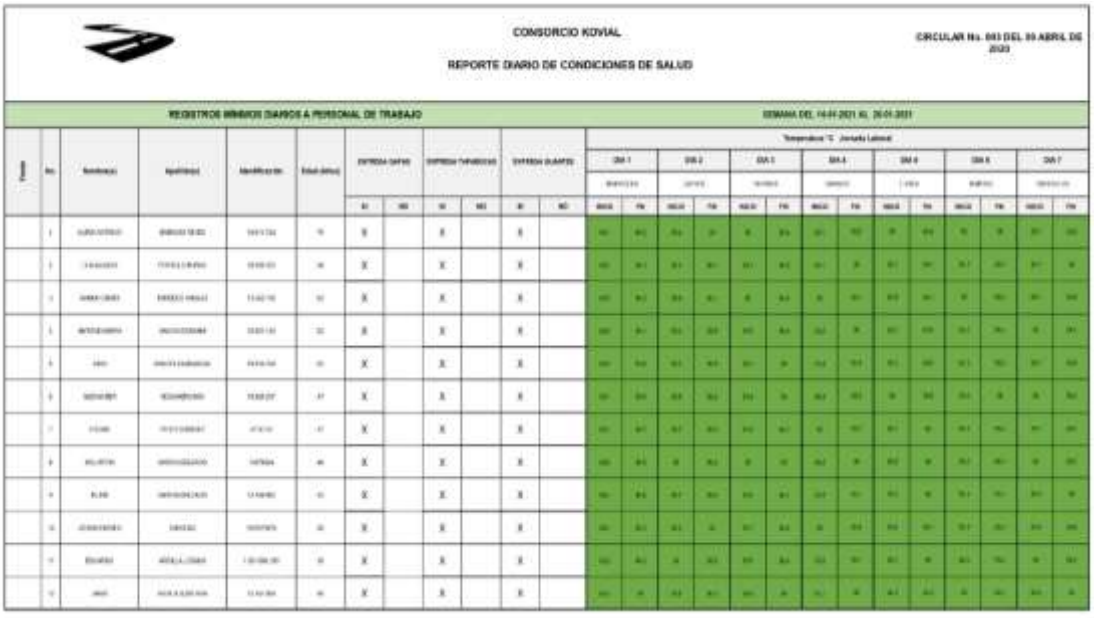


CONSORCIO KOVIAL

REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

CIRCULAR No. 003 DEL 03 ABRIL DE 2020

REGISTROS MÍNIMOS DIARIOS A PERSONAL DE TRABAJO

Semana del 21 al 31 de Enero 2021

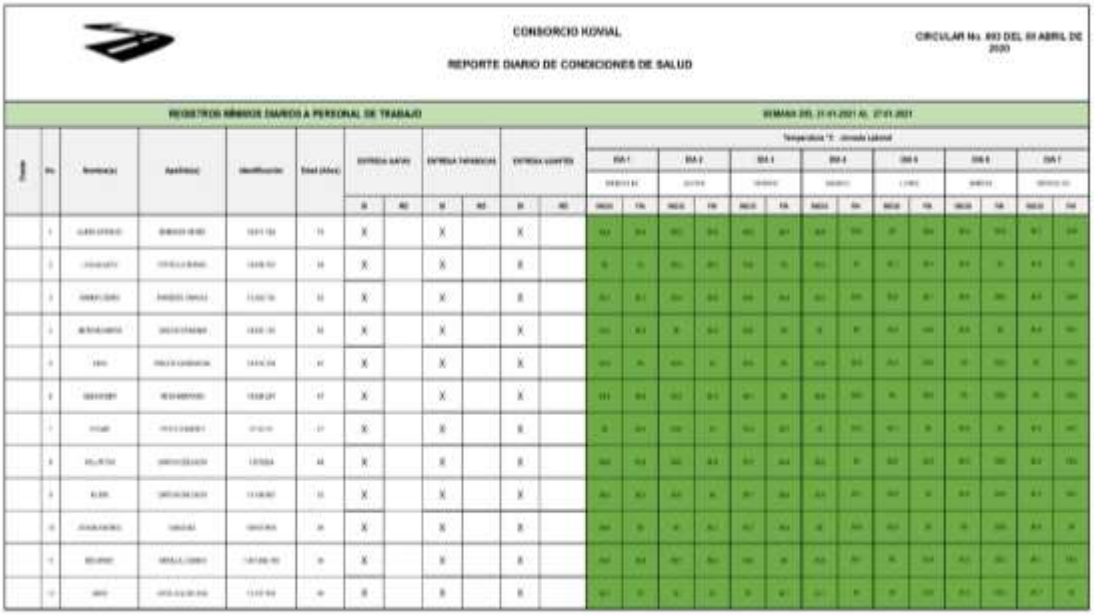

CONSORCIO KOVIAL

REPORTE DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD

CIRCULAR No. 003 DEL 09 ABRIL DE 2020

REGISTROS MÍNIMOS DIARIOS A PERSONAL DE TRABAJO

SEMANA DEL 21.01.2021 AL 27.01.2021

Temperatura °C - Jornada Laboral

Área	No.	Nombre(s)	Apellidos	Identificación	Edad (Años)	Entrega Gafas		Entrega Tapabocas		Entrega Guantes		DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	MAÑ	TA	MAÑ	TA	MAÑ	TA	MAÑ	TA	MAÑ	TA	MAÑ	TA	MAÑ	TA
	1				71	X		X		X		36.4	36.4	36.5	36.5	36.5	36.7	36.8	36.8	37	36.9	36.6	36.6	36.7	36.8
	2				58	X		X		X		36	36	36.4	36.5	36.6	36	36.4	36	36.7	36.4	36.6	36	36.6	36
	3				53	X		X		X		36.7	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.6	36.6	36.7	36.6	36.5	36.6	36.6
	4				53	X		X		X		36.5	36.6	36	36.5	36.5	36	36	36.6	36.6	36.6	36.6	36	36.6	36.6
	5				41	X		X		X		36.5	36	36.6	36	36.6	36	36.6	36.5	36.7	36.6	36	36.5	36	36.5
	6				47	X		X		X		36.5	36.6	36.5	36.5	36.7	36	36.6	36.6	36	36.6	36	36.6	36	36.5
	7				47	X		X		X		36	36.6	36.6	36	36.5	36.7	36	36.6	36.7	36	36.6	36	36.6	36.7
	8				44	X		X		X		36.6	36.6	36.6	36.6	36.7	36.6	36.6	36	36.6	36.6	36.7	36.6	36.6	36.6
	9				51	X		X		X		36.6	36.7	36.6	36	36.7	36.6	36.6	36.7	36.7	36	36.6	36.6	36.6	36.7
	10				34	X		X		X		36.6	36	36	36.7	36.7	36.6	36	36.6	36.6	36	36	36.6	36.6	36
	11				41	X		X		X		36.7	36.6	36.7	36.7	36.6	36	36.6	36.7	36	36.6	36.7	36.6	36.7	36.6
	12				49	X		X		X		36.7	36	36	36.7	36	36.7	36.7	36	36.7	36	36.7	36.6	36.7	36.6

Lista asistencia capacitación enero

CONSORCIO KOVIAL — **REUNION DE ENTRENAMIENTO** — CONSORCIO KOVIAL

TECNICA ☐ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ☐ FINANCIERA ☐ ASEGURAMIENTO CALIDAD ☐

☐ AREA ☐ CONTRATO Nº: 1265 DE 2020 / 1212 DEL 2020

FECHA: DIA 30 MES ENERO AÑO 2021 HORA: 8:00 A 10:00 AM

CAPACITACIÓN Nº: 04 LUGAR: OFICINAS ADMÓN ☐ OTRO ☐

METODO UTILIZADO: TALLER ☒ ACETATOS ☐ CHARLA ☐ VIDEO BEAM ☒ VIDEO ☐ CARTELERA ☐

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION CONSORCIO KOVIAL / GIOVANNI APIAY AVILA.

CARGO: RESIDENTE FIRMA:

TEMA CENTRAL

* Primeros Auxilios Basicos.

ASPECTOS TRATADOS

* Evaluacion escena del accidente, ABC en atencion al paciente, Reanimacion cardio pulmonar (RCP), atencion inicial de heridas hemorragica, esguinces, luxaciones, fracturas, vendajes, Translado de lesionados.

OBSERVACIONES

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cirro Guerrero	obrero	Cirro Guerrero
2	Luis Alan Padilla Bueno	obrero	Luis Padilla
3	Gabriel A Serna M.	obrero	Gabriel Serna
4	Jose C Bueno Bayona.	obrero	Jose Bueno
5	ANTONIO M GALVIS	obrero	ANTONIO M GALVIS
6	Marco A Figueroa	obrero	Marco
7	Ramon Acevedo	obrero	Ramon Acevedo
8	Alexander Vega Mercado	Obrero	

CONSORCIO KOVIAL	REUNION DE ENTRENAMIENTO		CONSORCIO KOVIAL
9	Elidis Garcia Jeiz	Obrero	
10	Jairo ardila	obrero	Jairo ardila
11	Willington Garcia S	obrero	Willington G. S.
12	Eduardo ARDILA	obrero	Eduardo
13			
14			
15			
16			
17			
18			
		TOTAL PARTICIPANTES:	

Anexo 16

INFORME CAPACITACIÓN PERSONAL MTO RUTINARIO

INFORME DE CAPACITACION
EMPRESAS DE MANTENIMINTO RUTINARIO

CONTRATO No. 1265 de 2020



ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.

CONSORCIO KOVIAL
CONTRATO 1212 DE 2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
2.1. Generales
2.2. Específicos
3. TEMATICA
4. DESARROLLO
5. ASISTENCIA
6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Calle 7 No 34-40 Local 1
Avenida Francisco Fernández de Contreras, Ocaña – NS
Cel: 317 641 2399 – 311 594 0703
E-mail: admvialconsorciokovial@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías a traves de la ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, busca mejorar las capacidades interactivas y de manera integral, complementar la experiencia del personal que conforman las Empresas de mantenimiento rutinario las cuales prestan su servicio a la DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA; este mejoramiento encaminado a los aspectos personales, laborales, de seguridad y salud.

Con el fin atrás mencionado se programan capacitaciones para que se abra el espacio y la oportunidad para mantener una comunicación laboral y personal con los integrantes de las empresas de mantenimiento rutinario, en busca de generar el bienestar de los integrantes de las empresas y Cooperativas de tal forma que se garantice una operación segura en las carreteras a cargo de la Territorial Ocaña y en completo engranaje con la Administración Vial.

2. OBJETIVOS

2.1. Generales

- ✓ Ampliar el panorama en los miembros de las empresas de, mantenimiento rutinario sobre aspectos de contractuales de la actividad.
- ✓ Dar cumplimiento a los aspectos contractuales para la administración vial.
- ✓ Reiterar los objetivos del Instituto Nacional de Vías.

2.2. Específicos.

- ✓ Profundizar en aspectos sobre el protocolo de Bioseguridad.

- ✓ Enfatizar el objetivo del Mantenimiento Rutinario vial.

3. TEMATICA

- ✓ Primeros auxilios.

4. DESARROLLO

Se inicia la capacitación con la evaluación del lugar, indicando las salidas de emergencia, y la presentación del grupo de la administración vial; seguidamente la SISO de la administración vial, realiza la presentación del profesional, el cual es paramédico y miembro activo del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y mediante ayuda audiovisual expone los alcances de la normatividad actual que regulan el tema de primeros auxilios aplicada a la realidad e inherentes con las actividades de Mantenimiento Rutinario y se le realiza el análisis aterrizado en el escenario laboral y personal de las implicaciones legales para el usuario de las vías.

Durante el segundo bloque de la programación, se realiza con ayuda de Kit de maniquí para RCP y la dinámica del instructor consigue la participación del personal de mantenimiento rutinario en lo pertinente con la prestación de primeros auxilios en casos de accidentes de tránsito, se realiza evaluación practica para determinar la atención de los miembros de la cooperativa COOTRANDES.

5. ASISTENCIA

CONTRATO No.	1265 de 2020
OBJETO	Mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, carretera código 7007, Aguaclara - Ocaña; sector PR 00+0000 al PR 43 + 0000.
CONTRATISTA	Cooperativa de Trabajo Asociado " COOTRANDES. "
REPRESENTANTE LEGAL	EMIL CARDALES TRESPALACIOS
MIEMBROS	12



REUNION DE ENTRENAMIENTO

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	obrero	[illegible]
2	Luis Alvaro Padilla Ruina	Obrero	[illegible]
3	Gabriel A Sierra M.	obrero	[illegible]
4	[illegible]	obrero	[illegible]
5	Antonio Galvis	obrero	[illegible]
6	Marco N. Figueroa	obrero	[illegible]
7	[illegible]	obrero	[illegible]
8	Alexander Vega Maldonado	Obrero	[illegible]



REUNION DE ENTRENAMIENTO

9	Eldo Cuna Jun	obrero	[illegible]
10	Jairo Padilla	obrero	[illegible]
11	Luis Alvaro Padilla	obrero	[illegible]
12	Edwin Padilla	obrero	[illegible]

4. REGISTRO FOTOGRAFICO. (ANEXO)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
	INFORME SOPORTE CONSUMO DE INSUMOS CONTRACTUALES			VERSIÓN	1	
	REGISTRO FOTOGRÁFICO			PAGINA	1	DE
				FECHA CAPACITACION	30 (Dia)	1 (Mes) / 2021 (Año)
1. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA	CONSORCIO KOVIAL	**CONTRATO N°**	1212 DE 2020	**CAPACITACION EMPRESAS DE MTO RUTINARIO S.A.S.**		
SUPERVISOR CONTRATO	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	**ITEM CONTRACTUAL**	CAPACITACION			
NOMBRE DEL PROYECTO	ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA"					



Descripción: Protocolo de Bioseguridad preliminar al inicio de la capacitacion.



Descripción: Asistencia de la Cooperativa COOTRANDES, en auditorio cerrado.



Descripción: Profesional en primeros auxilios.



Descripción: Participacion del personal de Mto rutinario en RCP en auditorio cerrado.



Descripción: Evaluacion de capacitacion al personal por profesional.



Descripción: Interaccion entre el personal y el profesional de la capacitacion.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor
