CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   12
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   14

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20000644 H3 02 DE 2020
Nombre del Contratista:	GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S con NIT. 900.646.295-3
Periodo informe:	D01 de octubre de 2020 al 01 de noviembre de 2020
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Contrato 20000584 H4 02

Cumplimiento de programación: actividades, presupuesto y balance.

Aeropuerto de Puerto Berrio

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del 74.81%, evidenciado en el avance de las actividades de limpieza, rocería, adecuación de secciones de cerramiento, proceso constructivo de mangaveleta e instalación de carpeta asfáltica.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del 74.81%, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: $ 383.730.490,95 quedando pendiente por ejecutar un 25.19% equivalente a $ 129.233.556,81 para un total contractual de $ 512.964.047,76

Aeropuerto de Cimitarra

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del 18.33%, evidenciado en el avance de las actividades de limpieza de residuos de poda, rocería, concreto ciclópeo. Vaciado de concreto de 3000 PSI en viga de amarre, instalación de pedestales, limpieza de cerramiento, limpieza de sedimento en canales, finalización de rocería 2 y 3.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del 37.9%, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: $ 104.467.639.61, quedando pendiente por ejecutar un 62.1% equivalente a $ 171.222.494.39 para un total contractual de $ 275.690.134

Planes de trabajo ejecutados y programados.

Aeropuerto de Puerto Berrio

Ejecutado:

 Se realizó reunión entre las partes (constructor – interventoría) para la socialización de la metodología de trabajo, dicha reunión se realizó por medio de la plataforma virtual ZOOM.

Programado:

 Se tiene prevista reunión entre partes (constructor– interventoría) para verificar la ejecución de la obra de acuerdo a la programación.

Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la interventoría (llamados de atención contractual).

Durante este periodo la interventoría presento observaciones a el residente de obra de la disposición de los materiales, así como la señalización de las áreas intervenidas.

Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

La interventoría cito por medio de la plataforma ZOOM a las partes (supervisión – contratista de obra) a los siguientes comités:
 COMITÉ N° 3 – 02 octubre de 2020
 COMITÉ N° 4 – 08 octubre de 2020

Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.
Posterior al comité N° 4 de contratista, se especificaron las fechas de pagos y se informó que el avance del contrato está de acuerdo a lo programado.

Aeropuerto de Cimitarra

Ejecutado:
 Se realizó reunión entre las partes (constructor – interventoría) para la socialización de la metodología de trabajo, dicha reunión se realizó por medio de la plataforma virtual ZOOM.
 El constructor presento a la interventoría los oficios para la radicación ante las entidades oficiales para solicitud de información y documentación necesaria para el desarrollo inicial del contrato.
Programado:
 Presentación de la socialización del proyecto por parte del constructor a la comunidad del municipio de Cimitarra, Santander.
 Se tiene prevista reunión entre partes (constructor– interventoría) para verificar la ejecución de la obra de acuerdo a la programación.

Durante este periodo el contratista atendió al llamado de atención echo por parte de la interventoría para que se
hiciera evacuación de residuos de poda para poder dar finalidad a la rocería etapa 2, de igual manera se dio inicio a la rocería etapa 3.

Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

La interventoría cito por medio de la plataforma ZOOM a las partes (supervisión – contratista de obra) a los siguientes comités:
 COMITÉ N° 4 – 30/10/2020

Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del

contrato.
Posterior al comité N° 4 de contratista, se definió que en el corte numero 3 entraría la rocería N° 2 y N° 3

Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

- En ambos aeropuertos. A la fecha el constructor ha cumplido de manera paulatina con los requerimientos de la interventoría.

CONTROL DE PROGRAMACION

Aeropuerto de Puerto Berrio

Avance de actividades de las obras

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del 74.81%, evidenciado en el avance de las actividades de limpieza, rocería, desmonte de cerramiento existente, concreto ciclópeo.
Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del 74.81%, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: $ 383.730.490,95, quedando pendiente por ejecutar un 25.19% equivalente a $ 129.233.556,81 para un total contractual de $ 512.964.047,76.

Actividades ejecutadas en el periodo

El Constructor durante el presente periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020, ejecutando las siguientes actividades.

- Mantenimiento de zonas verdes, 1. Rocería zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).

Consiste en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base de cerramiento. 2. Limpieza manual
del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye cargue disposición de material sobrante al botadero autorizado.

- Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros. E=20 cm.

- Entresuelo en piedra, E=10 cm. Incluye recebo compactado en arenilla E=5 cm, Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.
- Construcción de señalización de mangaveletas en concreto ciclópeo, forma: (anillo circular) donde su radio mayor es 7,5 m y su radio menor es 6m, espesor e=0.07 m, ancho =1.50 m. juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco. Para demarcación de mangaveletas.
- Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 13 mt). Incluye construcción, suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2" cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo, viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2" de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8" , pisa malla en platina de ½" x 1/8" , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8" con marco en ángulo de 11/2" x 1/8", cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
- Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 7,5 mt). Incluye construcción, suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2" cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo, viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2" de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8" , pisa malla en platina de ½" x 1/8" , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8" con marco en ángulo de 11/2" x 1/8", cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
- Localización replanteo. Con equipo de precisión en la pista para instalación de carpeta.
- Suministro, colocación y compactación de súbase granular estabilizada con cemento, con materiales de la zona mejorada en sitio con equipo, espesor 30 cms (incluye excavación y retiro de material existente).
- Suministro y aplicación de imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica.
- Suministro e instalación de geotextil tipo NT -2500 o similar.
- Suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla densa en caliente Norma P-401 FAA.
- Demolición de placa en concreto anillo perimetral-mangaveleta.

Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento

Durante la ejecución del contrato, no se presentaron acciones preventivas y/o correctivas.

Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Durante este periodo no se realizaron actas de liberación de obra.

Programación de actividades para el siguiente periodo

 Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consiste en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye aplicación de matamalezas (combatram, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base de cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida quimico.Incluye cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado.

 Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.

 Resane y Koraza sobre muros exterior (tres manos o las necesarias para un correcto acabado).

 Muro divisorio (bloque Nº4).

 Enchape piso en cerámica.

 Enchape muro en cerámica.

 Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC – PRESION, con un DIAMETRO DE ½”, RDE 11100 PSI, Incluye todos los accesorios de PVC de diámetro ½” que se requieran para su correcta instalación.

 Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA, con un DIAMETRO de 4”

 Punto Hidráulico de ½”

 Punto Sanitario de 4”

 Demolición de Losa de piso

 Relleno

 Pañete liso impermeabilizado muros 1:4(incluye filos y dilataciones)

 Punto eléctrico.

 Construcción de viga y columneta en concreto reforzado de 12cmx20cm para confinar muros de mampostería.

 Conexión a caja existente de aguas negras.

 Suministro e instalación de caja de inspección de 60x60

 Acometida parcial 2Nº 10+1Nº 12 con tubería EMT ¾” incluye todos los accesorios.

 Adecuación de rejilla de cárcamo existente, incluye fijación y cinta en concreto perimetral.

 Suministro e instalación de malla tipo angeo con marco en aluminio, superpuesta a la ventaneria y puerta existente.

Aeropuerto de Cimitarra

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Descripción del ítem	Programado			Real Ejecutado			01/08/2020	
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad a por actividad	Día s	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días Ejecutado s	Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
1	**Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).**								
1,1	RONDA No.1	29/07/2020	05/08/2020	8	29/07/2020	12/08/2020	15	0	-7
1,2	RONDA No.2	05/09/2020	12/09/2020	8	10/09/2020	24/10/2020	44	05	42
1,3	RONDA No.3	05/10/2020	12/10/2020	8	19/10/2020	31/10/2020	13	14	-19
1,4	RONDA No.4	09/11/2020	16/11/2020	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,5	RONDA No.5	14/12/2020	21/12/2020	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	**Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.**								
2,1	RONDA No.1	05/08/2020	10/08/2020	6	05/08/2020	15/08/2020	11	0	-5
2,2	RONDA No.2	12/10/2020	16/10/2020	5	28/10/2020	31/10/2020	4	16	-15
2,3	RONDA No.3	14/12/2020	18/12/2020	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	**CONSTRUCCION CERRAMIENTO**								
3,1	Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).	12/08/2020	07/09/2020	27	12/08/2020			0	ejecución
3,2	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	22/08/2020	12/10/2020	52	15/10/2020		16 a la fecha	54	-19 a la fecha
3,3	Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.	22/08/2020	12/10/2020	52	05/10/2020		27 a la fecha	43	-19 a la fecha
3,4	Mortero 1:4. para pie de amigo	29/10/2020	09/11/2020	12			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,5	suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8 incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	10/09/2020	09/11/2020	61			no iniciado	no iniciado	no iniciado

3,6	Desmonte de cerramiento existente (En poste de concreto y alambre de púas), incluye disposición final donde la entidad indique.	10/08/2020	29/08/2020	20	10/08/2020	22/08/2020	13	0	7
3,7	Cimiento concreto ciclópeo	18/08/2020	11/09/2020	25	26/08/2020			-8	50 a la fecha
Plazo del proyecto en días			**161**						

Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento

se contempló el inicio de las siguientes actividades el día 22/08/2020:
ítem 3.4 Mortero 1:4. Para pié de amigo.
ítem 3.5 Suministro e instalación cerramiento tipo 1 en malla eslabonada con recubrimiento en PVC calibre 8 incluyendo el recubrimiento incluye tubería (poste, pie de apoyo y pié de amigo) 4:hilos de alambre de púas y accesorios.

Durante este periodo no se realizaron actas de liberación de obra.
Programación de actividades para el siguiente periodo
 Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.
 Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).
 Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.
 Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.
 Mortero 1:4. para pie de amigo
 suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8 incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo).
 Cimiento concreto ciclópeo

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.
Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

Aeropuerto de Puerto Berrio

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION		
VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCION + IVA	**$ 512.964.047,76**	100%
VALOR PROGRAMADO AGOSTO	**$ 33.759.029.08**	9.72%
VALOR EJECUTADO AGOSTO	**$ 33.759.029.08**	9.72%
VALOR PROGRAMADO SEPTIEMBRE	**$210.418.830.00**	60.59%
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE	**$210.418.830.00**	60.59%
VALOR PROGRAMADO OCTUBRE	**$139.552.631.00**	27.21%
VALOR EJECUTADO OCTUBRE	**$139.552.631.00**	27.21%
TOTAL PROGRAMADO	**$383.730.490.95**	74.81%
TOTAL EJECUTADO	**$383.730.490.95**	74.81%

CONTROL DE COBROS Y PAGOS CONSTRUCCION			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1	9.72%	**$ 33.759.029.08**	**$ 33.759.029.08**
PAGO N° 2	60.59%	**$210.418.830.00**	**$210.418.830.00**
PAGO Nº 3	27.21%	**$139.552.631.00**	-

Activar Windows

Aeropuerto de Cimitarra

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION		
VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCION + IVA	$ 275.690.134.00	100%
VALOR PROGRAMADO AGOSTO	$ 32.007.163	11.61%
VALOR EJECUTADO AGOSTO	$ 32.931.468.75	11.95%
VALOR PROGRAMADO SEPTIEMBRE	$ 32.007.163	11.61%
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE	$ 21.009.209.40	7.62%
VALOR EJECUTADO OCTUBRE	$ 50.526.961.46	18.33%
TOTAL EJECUTADO	$ 104.467.639.61	37.9%

6.2. Soporte de las actas de pago.

CONTROL DE COBROS Y PAGOS CONSTRUCCION			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1	11.95%	$ 32.931.468.75	$ 32.931.468.75
PAGO N° 2	7.62%	$ 21.009.209.40	$ 21.009.209.40
PAGO N° 3	18.33%		-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 77.158.410,00									
			ACTA 1		ACTA2		ACTA 3	SALDO RP	
$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		
$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		
$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		
$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00						
VALOR RP	% ACTA 1	60%		% ACTA 2		% ACTA 3			%ACUMULADO
$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807	60,59%	$ 13.999.325	27,21%	$ 6.286.873	$ 9.374.912	98%
$ 38.650.062	11,95%	$ 23.190.037,20	$ 2.771.209	7,62%	$ 1.767.081	18,33%	$ 4.250.734	$ 23.235.313	38%
$ 77.158.410	21,67%	$ 46.295.046,00		68,21%		45,54%			
+		TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.017.016		$ 15.766.406		$ 10.537.607		
		TOTAL	$ 9.426.068,30		$ 20.175.457,67		$ 14.946.658,72		

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Al cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado los pliegos de condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Concurso de Méritos Abierto No. 20000644 H3, propuesta general y económica de fecha 11 de mayo de 2020, la Resolución de Adjudicación No. No 035 del 3 de junio de 2020, el lote 2 del Proceso de Concurso de Concurso de Méritos Abierto No. 20000644 H3 de 2020 al proponente GAC-PMF ARQUITECTOS S.A.S, con el objeto de REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO, por un valor total de SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($77.158.410.00), INCLUIDO IVA y un plazo de ejecución SIETE (7) MESESy a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.

2. Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia

3. Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

4. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 20000644 H3

5. A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

3.2. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó a al AEROCIVIL los siguientes productos por parte de YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA.

- INFORMES SEMANALES

SEMANAL No.	PERIODO
11	Del 1 al 7 de octubre de 2020
12	Del 8 al 14 de octubre de 2020
13	Del 15 al 21 de octubre de 2020
14	Del 22 al 28 de octubre de 2020
15	Del 29 de octubre de 2020 al 4 de noviembre de 2020

- INFORME MENSUAL

MENSUAL No.	PERIODO
03	01 DE OCTUBRE DE 2020 A EL 31 DE OCTUBRE 2020

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
27 de julio de 2020	

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
27 de julio de 2020	

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
3		
4		
5		
6		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
20000644 H3 02 DE 2020	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($77.158.410.00), INCLUIDO IVA	23 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2020	$ 77.158.410	-	$ 9.426.068.30
20000644 H3 02 DE 2020	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($77.158.410.00), INCLUIDO IVA	01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020	$ 67.732.341,7	-	$ 20.175.457.67
20000644 H3 02 DE 2020	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($77.158.410.00), INCLUIDO IVA	01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020	$ 47.556.884	29.601.525,9	$ 14.946.678.72

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 57.7% hasta el 31 de octubre de 2020

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 31 de octubre, se entregaron los 15 informes semanales y el mensual correspondiente.

Para un porcentaje entregado del contrato de 57.7% hasta el 31 de octubre de 2020

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR



INFORME MENSUAL N° 3 DE INTERVENTORIA

CONTRATO **N°20000644 H3 02 DE 2020**

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2020 A EL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

ELABORO LA INTERVENTORIA –GACPMF ARQUITECTOS S.AS

CONTENIDO

1. **Introducción**

2. **Antecedentes del contrato**

3. **Datos generales**

4. **Condiciones de cumplimiento del contrato.**

   4.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance.
   4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados.
   4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA.
   4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.
   4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.
   4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

5. **Control de la programación.**

   5.1. Avance de actividades de las obras
   5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra.
   5.3. Actividades ejecutadas en el periodo.
   5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.
   5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.
   5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

6. **Control presupuestal del contrato.**

   6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.
   6.2. Soporte de las actas de pago.
   6.3. Grafica presupuestal.
   6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos INTERVENTORÍA.

7. **Formatos de control.**

   7.1. Relación de personal en obra de obra e INTERVENTORÍA.
   7.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.
   7.3. Control climatológico y de horas trabajadas.
   7.4. Materiales en obra y programados para labor.

8. **Registro fotográfico fechado, redactado y localizado.**

9. **Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes**.

10. **Copia del libro diario de obra.**

11. Certificaciones y fichas técnicas.

12. Informe de gestión SISOMA, para las actividades de campo, vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta área.

13. Plan de Cargas de INTERVENTORÍA

13.1. Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.
13.2. Información para el seguimiento al avance y estado del contrato de obra e INTERVENTORÍA en Project.

1. INTRODUCCION

La Aeronáutica civil para REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO. adjudico a GACPMF ARQUITECTOS S.A.S para la verificación del cumplimiento del Contrato de obra N° 20000584 H4 DE 2020.

El presente informe se desarrolla acorde a la metodología de trabajo de GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S, complementándolo con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas de Interventoría de la Aeronáutica Civil y contiene la descripción de las actividades: administrativas y técnicas que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de 2020 en el contrato de obra.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría para lograr el alcance del contrato y para atender los eventos imprevistos que han afectado la normal ejecución de la obra en el plazo, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica:

En su Artículo 2°: “la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye, prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

En su Artículo 3°: “Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. (…)”

Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere implementar un mantenimiento en los aeropuertos para garantizar adecuadamente su operación y servicio.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios de navegación aérea, cuenten con la capacidad y eficacia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambiental sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad en el aeropuerto, Gustavo Rojas Pinilla en Cimitarra, para que se ejecuten actividades de mantenimiento que garanticen la seguridad, operatividad, eficacia, funcionalidad y servicio, bajo la normatividad y los alineamientos establecidos por la Entidad.

“La Aeronáutica Civil mediante la Resolución número 024 del 23 de abril de 2020, ordenó la apertura del proceso de contratación, bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, identificado con el número 20000644 H3 de 2020.

Que LA AEROCIVIL adjudicó mediante la Resolución 035 del 03 de junio de 2020, el lote dos del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 20000644 H3 de 2020 al proponente GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S con el

objeto de " REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO. por un valor total de ($77.158.410) INCLUIDO IVA, y un plazo de ejecución de SIETE (7) MESES.

3. DATOS GENERALES

MES: OCTUBRE

Del: 01/10/2020. **Al**: 31/10/2020

Nombre del supervisor: ING. ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista.	CONSTRUCTORA VMJ LTDA.	**Contratista.**	GACPMF ARQUITECTOS SAS
Contrato N°	**N°20000584 H4 03 DE 2020**	**Contrato N°**	**N°20000644 H3 02 DE 2020**
Fecha de firma del contrato	17/06/2020	**Fecha de firma del contrato**	09/06/2020
Valor inicial	$275.690.134.00	**Valor inicial**	$ 77.158.410.00
Valor actualizado	N/A	**Valor actualizado**	N/A
Plazo inicial	7 MESES	**Plazo inicial**	7 MESES
Plazo final	5 MESES	**Plazo final**	5 MESES
Fecha de iniciación	23/02/2021	**Fecha de iniciación**	23/07/2020
Fecha de terminación	23/12/2020	**Fecha de terminación**	31/12/2020

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

4.1. Cumplimiento de programación: actividades, presupuesto y balance.

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del 18.33%, evidenciado en el avance de las actividades de limpieza de residuos de poda, rocería, concreto ciclópeo. Vaciado

de concreto de 3000 PSI en viga de amarre, instalación de pedestales, limpieza de cerramiento, limpieza de sedimento en canales, finalización de rocería 2 y 3.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del **37.9%**, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: **$ 104.467.639.61**, quedando pendiente por ejecutar un 62.1% equivalente a $ 171.222.494.39 para un total contractual de $ 275.690.134

4.2. planes de trabajo ejecutados y programados.

Ejecutado:

- Se realizó reunión entre las partes (constructor – interventoría) para la socialización de la metodología de trabajo, dicha reunión se realizó por medio de la plataforma virtual ZOOM.
- El constructor presento a la interventoría los oficios para la radicación ante las entidades oficiales para solicitud de información y documentación necesaria para el desarrollo inicial del contrato.

Programado:

- Presentación de la socialización del proyecto por parte del constructor a la comunidad del municipio de cimitarra, Santander.
- Se tiene prevista reunión entre partes (constructor– interventoría) para verificar la ejecución de la obra de acuerdo a la programación.

4.3. cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la interventoría (llamados de atención contractual).

Durante este periodo el contratista atendió al llamado de atención echo por parte de la interventoría para que se hiciera evacuación de residuos de poda para poder dar finalidad a la rocería etapa 2, de igual manera se dio inicio a la rocería etapa 3 .

4.4. informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

La interventoría cito por medio de la plataforma ZOOM a las partes (supervisión – contratista de obra) a los siguientes comités:

- COMITÉ N° 4 – 30/10/2020

4.5. acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Posterior al comité N° 4 de contratista, se definió que en el corte numero 3 entraría la rocería N° 2 y N° 3

4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

A la fecha el constructor ha cumplido de manera paulatina con los requerimientos de la interventoría.


5. CONTROL DE PROGRAMACION

5.1. Avance de actividades de las obras

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del 18.33%, evidenciado en el avance de las actividades de limpieza de residuos de poda, rocería, concreto ciclópeo. Vaciado de concreto de 3000 PSI en viga de amarre, instalación de pedestales, limpieza de cerramiento, limpieza de sedimento en canales, finalización de rocería 2 y 3.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del **37.9%**, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: **$ 104.467.639.61**, quedando pendiente por ejecutar un 62.1% equivalente a $ 171.222.494.39 para un total contractual de $ 275.690.134

5.2. Grafica de avance físico del contrato de obra

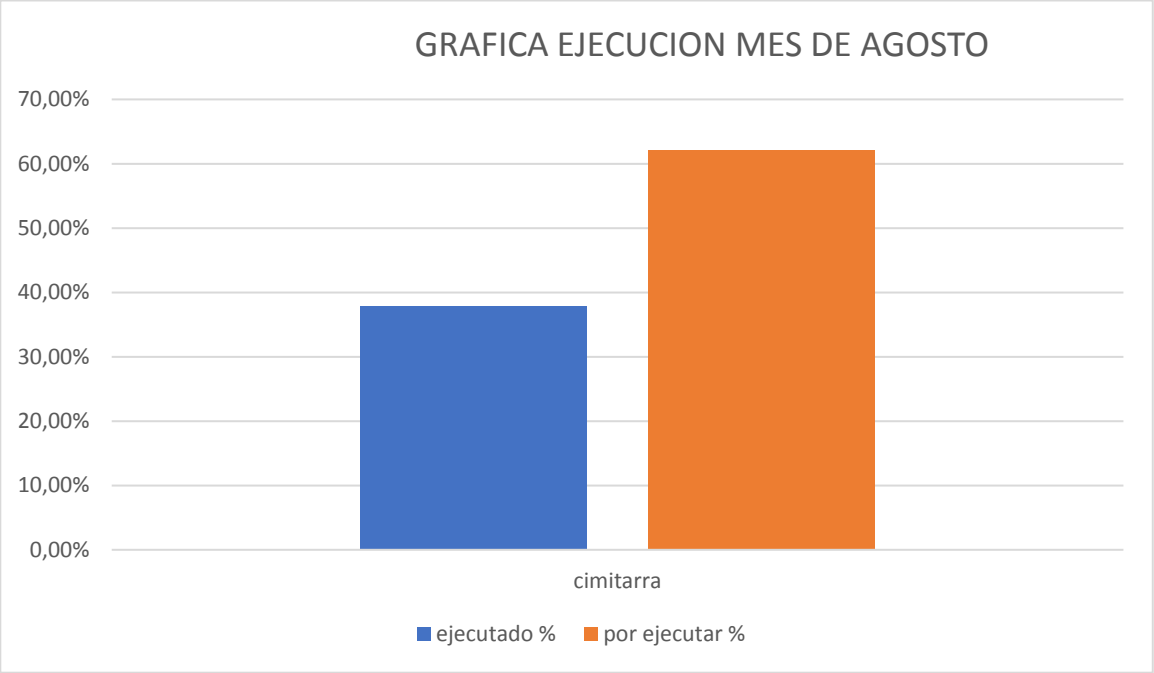

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Descripción del ítem	Programado			Real Ejecutado			01/08/2020	
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días Ejecutados	Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
1	**Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).**								
1,1	RONDA No.1	29/07/2020	05/08/2020	8	29/07/2020	12/08/2020	15	0	-7
1,2	RONDA No.2	05/09/2020	12/09/2020	8	10/09/2020	24/10/2020	44	05	42
1,3	RONDA No.3	05/10/2020	12/10/2020	8	19/10/2020	31/10/2020	13	14	-19
1,4	RONDA No.4	09/11/2020	16/11/2020	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,5	RONDA No.5	14/12/2020	21/12/2020	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	**Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.**								
2,1	RONDA No.1	05/08/2020	10/08/2020	6	05/08/2020	15/08/2020	11	0	-5
2,2	RONDA No.2	12/10/2020	16/10/2020	5	28/10/2020	31/10/2020	4	16	-15
2,3	RONDA No.3	14/12/2020	18/12/2020	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	**CONSTRUCCION CERRAMIENTO**								
3,1	Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).	12/08/2020	07/09/2020	27	12/08/2020			0	ejecución
3,2	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	22/08/2020	12/10/2020	52	15/10/2020		16 a la fecha	54	-19 a la fecha
3,3	Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.	22/08/2020	12/10/2020	52	05/10/2020		27 a la fecha	43	-19 a la fecha
3,4	Mortero 1:4. para pie de amigo	29/10/2020	09/11/2020	12			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,5	suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8 incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	10/09/2020	09/11/2020	61			no iniciado	no iniciado	no iniciado

3,6	Desmonte de cerramiento existente (En poste de concreto y alambre de púas), incluye disposición final donde la entidad indique.	10/08/2020	29/08/2020	20	10/08/2020	22/08/2020	13	0	7
3,7	Cimiento concreto ciclópeo	18/08/2020	11/09/2020	25	26/08/2020			-8	50 a la fecha
Plazo del proyecto en días			**161**						

5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento

se contempló el inicio de las siguientes actividades el día 22/08/2020:

ítem 3.4 Mortero 1:4. Para pié de amigo.
ítem 3.5 Suministro e instalación cerramiento tipo 1 en malla eslabonada con recubrimiento en PVC calibre 8 incluyendo el recubrimiento incluye tubería (poste, pie de apoyo y pié de amigo) 4:hilos de alambre de púas y accesorios.

5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Durante este periodo no se realizaron actas de liberación de obra.

5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo.

- Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.
- Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).
- Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.
- Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.
- Mortero 1:4. para pie de amigo
- suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8 incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo).
- Cimiento concreto ciclópeo

6. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.


6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION		
VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCION + IVA	$ 275.690.134.00	100%
VALOR PROGRAMADO AGOSTO	$ 32.007.163	11.61%
VALOR EJECUTADO AGOSTO	$ 32.931.468.75	11.95%
VALOR PROGRAMADO SEPTIEMBRE	$ 32.007.163	11.61%
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE	$ 21.009.209.40	7.62%
VALOR EJECUTADO OCTUBRE	$ 50.526.961.46	18.33%
TOTAL EJECUTADO	$ 104.467.639.61	37.9%

6.2. Soporte de las actas de pago.

CONTROL DE COBROS Y PAGOS CONSTRUCCION			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1	11.95%	$ 32.931.468.75	$ 32.931.468.75
PAGO N° 2	7.62%	$ 21.009.209.40	$ 21.009.209.40
PAGO N° 3	18.33%		-

6.3. Grafica presupuestal.

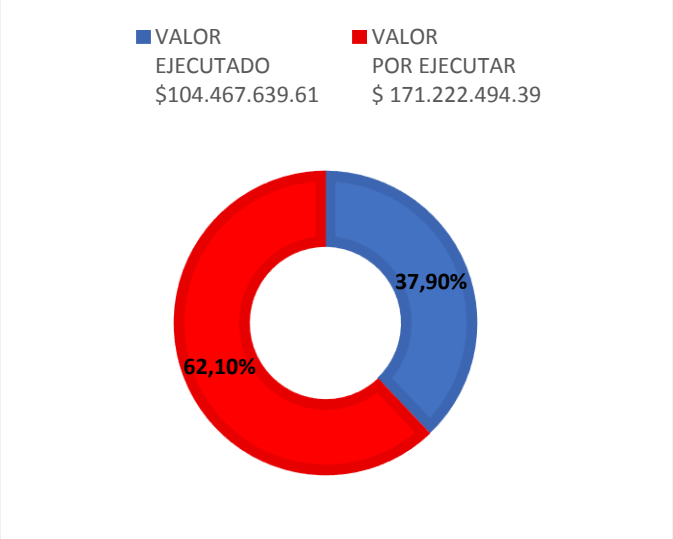

6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos INTERVENTORÍA.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.016.696,00			
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	CIMITARRA	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.002.385,14	40%	$ 4.409.052,00
					$ 4.400.954,06
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%	
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807
	CIMITARRA	$ 38.508.348	11,95%	$ 23.105.008,80	$ 2.761.049
		$ 77.016.696	21,67%	$ 46.210.017,60	
		+		TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.006.855
				TOTAL	$ 9.415.907,41

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORTE N° 2

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.158.410,00			
PLAZO MESES	7				**ACTA 2**
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	CIMITARRA	$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00
		$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00

		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%	
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	60,59%	$ 23.105.008,80	$ 13.999.325
	CIMITARRA	$ 38.650.062	7,62%	$ 23.190.037,20	$ 1.767.081
		$ 77.158.410	68,21%	$ 46.295.046,00	
		+		TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 15.766.406
				TOTAL	$ 20.175.457,67

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CORTE N° 3

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.158.410,00							
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**		**ACTA2**		**ACTA 3**
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03
	CIMITARRA	$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00
		$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00				
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%		**% ACTA 2**		**% ACTA 3**	
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807	60,59 %	$ 13.999.325	27,21 %	$ 6.286.873
	CIMITARRA	$ 38.650.062	11,95%	$ 23.190.037,20	$ 2.771.209	7,62 %	$ 1.767.081	18,33 %	$ 4.250.734

	$ 77.158.410	21,67%	$ 46.295.046,00		68,21 %		45,54 %	
+			TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.017.016		$ 15.766.406		$ 10.537.607
			TOTAL	$ 9.426.068,30		$ 20.175.457,67		$ 14.946.658,72

CONTROL DE COBROS Y PAGOS INTERVENTORIA			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1 CIMITARRA FIJO	11.95% (40%)	$ 2.200.477.03	$ 2.200.477.03
PAGO N° 1 CIMITARRA VARIABLE	11.95% (60%)	$ 2.761.049	$ 2.761.049
TOTAL PAGO N° 1 CIMITARRA		$ 4.961.525,58	$ 4.961.525,58
PAGO N° 2 CIMITARRA FIJO	7.62% (40%)	$ 2.208.574,97	$ 2.208.574,97
PAGO N° 2 CIMITARRA VARIABLE	7.62% (60%)	$ 1.767.081	$ 1.767.081
TOTAL PAGO N° 2 CIMITARRA		$ 3.975.655.97	$ 3.975.655.97
PAGO N° 3 CIMITARRA FIJO	7.62% (40%)	$ 2.208.574,97	-
PAGO N° 3 CIMITARRA VARIABLE	18.33% (60%)	$ 4.250.734	-
TOTAL PAGO N° 3 CIMITARRA		$ 6.459.308.97	-

7. FORMATOS DE CONTROL.

7.1. Relación de personal en obra de obra e INTERVENTORÍA.

PROFESIONALES CONSULTOR			
N°	**CARGO**	**PROFESION**	**NOMBRE PROFESIONAL**
1.	Director de obra	Ingeniero	Juan Carlos Sánchez
2.	Residente de obra	Ingeniero	Brayan Ferney paez

PROFESIONALES INTERVENTORIA			
N°	**CARGO**	**PROFESION**	**NOMBRE PROFESIONAL**
1.	Representante legal	Arquitecta	Patricia Molina Fonseca
2.	Director de Interventoría	Arquitecta	Patricia Molina Fonseca
3.	Residente de interventoría	Ingeniera	Silvia Ayala
4.	Auxiliar residente de obra	Tecnóloga	Ledys López
5.	Profesional de apoyo	Ingeniera	Alejandra Sánchez
6.	Secretaria	Bachiller	Yeimi Vargas

1.1. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

EQUIPO	HORARIO TRABAJADO	DIAS
MEZCLADORA DE CONCRETO	9:00 am -12:00 / 13:00 pm- 16.30 pm	30 días

1.2. Control climatológico y de horas trabajadas.

FECHA	HORA -LLUVIAS	TOTAL HORAS REGISTRADAS
MIERCOLES 07/10/2020	06:00 AM – 11:45 AM	3:00 HORAS
MARTES 20/10/2020	06:00 PM – 06:00 AM	12:00 HORAS
TOTAL DE HORAS LLUVIAS MES DE SEPTIEMBRE		**15 HORAS**

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO.

Rocería etapa 2 y 3

















Viga de amarre









8. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

OFICIO NUMERO	FECHA	ASUNTO
OFC-VMJ-20000-001	25/06/2020	POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
OFC-VMJ-20000-002	25/06/2020	REMISION DE DOCUMENTACION
OFC-VMJ-20000-003	27/07/2020	INFORME VISITA A EL SITIO DE OBRA
OFC-VMJ-20000-004	27/07/2020	COMUNICADO SOBRE SUBCONTRATACION
OFC-VMJ-20000-005	28/07/2020	REMISION DOCUMENTACION DE PERSONAL
OFC-VMJ-20000-006	03/08/2020	REMISION DOCUMENTACION DE PERSONAL
OFC-VMJ-20000-007	04/08/2020	PROGRAMACION DE OBRA
OFC-VMJ-20000-008	06/08/2020	POLIZAS ACTUALIZADAS - ACTA DE INICIO
OFC-VMJ-20000-009	06/08/2020	REMISION DOCUMENTACION DE PERSONAL
OFC-VMJ-20000-010	10/08/2020	REMISION DOCUMENTACION DE PERSONAL

OFC-VMJ-20000-011	12/08/2020	BALANCE CANTIDADES CONDICIONES CONTRACTUALES
OFC-VMJ-20000-012	20/08/2020	ITEM NP-1 CERRAMIENTO POSTE DE CONCRETO SECTOR CANCHA DE FUTBOL
OFC-VMJ-20000-013	24/08/2020	SITUACION PRESENTADA EN ALINEAMIENTO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO NUMERO	FECHA	ASUNTO
OFC-AEROCIVIL-001-20	07/07/2020	APERTURA DE CORREO OFICIAL DE OBRA PARA COMUNICACIONES Y MANEJO EXCLUSIVO DE AERONAUTICA
OFC-AEROCIVIL-002-20	23/07/2020	INVITACION A REUNION ETAPA PRECONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AEROCIVIL-003-20	04/08/2020	AVAL PROGRAMACIÓN DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-004-20	11/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-005-20	12/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-006-20	24/08/2020	INVITACION A COMITÉ N° 1 ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AEROCIVIL-007-20	01/07/2020	AVAL DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-008-20	16/09/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-009-20	22/09/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-010-20	23/09/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-011-20	24/09/2020	POSIBLE INCUMPLIMIENTO PROGRAMACION DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-012-20	24/08/2020	AVAL DE POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-013-20	24/09/2020	AVAL DE BALANCE CANTIDADES CONTRACTUALES REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-014-20	24/09/2020	AVAL DE ITEM NP-1 CERRAMIENTO POSTE CONCRETO SECTOR CANCHA FUTBOL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA
OFC-AEROCIVIL-015-20	28/09/2020	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE FLUJO SEMANAL Y DETALLES DE DISEÑO CERRAMIENTO.)
OFC-AEROCIVIL-016-20	29/09/2020	INVITACION A COMITÉ N° 2 ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AEROCIVIL-017-20	29/09/2020	OBSERVACIONES DE INFORMES SEMANALES DE OBRA.)

9. COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA.
ANEXO N. 2

10. CERTIFICACIONES.

- **Certificación aprobación de tercer corte de obra**



GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 19 de noviembre de 2020.

Como Interventor designado del Contrato de obra **N°20000584 H4 03 DE 2020**, me permito recibir a Satisfacción tercer corte por parte del **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** NIT 899.999.059-3, con objeto de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA, del Acta de recibo parcial No.3 por valor CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 50.526.961.46).

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

- **Certificación de parafiscales**

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 19 de noviembre de 2020.

CERTIFICACION PARAFISCALES

Yo, PATRICIA MOLINA FONSECA, doy fe que recibo a satisfacción los documentos parafiscales exigidos por la ley correspondientes del Contrato de obra N°20000584 H4 03 DE 2020, por parte del **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** NIT 899.999.059-3, correspondientes a PAGO DE ARP, SALUD, PENSIONES, CAJA DE COMPENSACION.

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

11. INFORME DE GESTIÓN SISOMA, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO							REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CONTROL Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	CALIFICACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	CALIFICACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO				
Mantenimineto de zonas verdes	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Roceria	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Limpieza manual de cerramiento	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Excavaciones	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Cimiento pedestales	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso de camisa para rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Desmonte del cerramiento en mal estado	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Instalacion de cerramiento malla	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

- **Uso de EPP**



12. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA

La interventoría, **al mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de cimitarra y puerto Berrio** se hará de manera presencial a través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe ofrecer además de la aplicación de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, objeto de interventoría.

La ejecución de la obra de **mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de cimitarra**, se llevará a cabo considerando el presupuesto y los análisis de precios unitarios aprobados previamente por la AEROCIVIL, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de colaboración constante entre el interventor, contratante, contratista de obra, supervisor, personal profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del presupuesto y de la programación de la obra.

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la interventoría debe cumplir durante la obra, estas se califican de la siguiente manera:

- Actividades Técnicas
- Actividades Administrativas y Financieras
- Actividades de Control

Las tres (3) actividades anteriores se deben cumplir en sus tres fases durante la ejecución del contrato de obra a intervenir:

- Preliminares e iniciación del contrato
- Desarrollo y ejecución de la obra
- Recibo de la Obra

12.1. Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

A. ACTIVIDADES TÉCNICAS

✓ Revisión, análisis de planos y especificaciones

✓ Programación y presupuesto

✓ Escogencia y coordinación de formatos

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

✓ Revisión de pólizas

✓ Revisión de reglamentos

- Seguridad de trabajo

- Salud ocupacional

C. ACTIVIDADES DE CONTROL

✓ Revisión y Control

- Análisis de precios unitarios

- Presupuesto y cantidades de obra

- Escogencia y coordinación de formatos

No siendo más se da por terminado el **INFORME MENSUAL N° 03 - 2020 DE LA INTERVENTORÍA** la entrega de anexos complementarios a este informe los cuales se incluirán en medio físico y digital, los originales permanecerán en custodia de la Interventoría, para ser incluidos en informe final de liquidación.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios para proceder.

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3	**GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S** ING. SILVIA NATHALIA AYALA PARRA RESIDENTE DE OBRA



INFORME MENSUAL N° 3 DE INTERVENTORIA

CONTRATO **N°20000644 H3 02 DE 2020**

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2020 A EL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CONTENIDO

1. **Introducción**

2. **Antecedentes del contrato**

3. **Datos generales**

4. **Condiciones de cumplimiento del contrato.**

   4.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance.
   4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados.
   4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA.
   4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.
   4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.
   4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

5. **Control de la programación.**

   5.1. Avance de actividades de las obras
   5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra.
   5.3. Actividades ejecutadas en el periodo.
   5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.
   5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.
   5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

6. **Control presupuestal del contrato.**

   6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.
   6.2. Soporte de las actas de pago.
   6.3. Grafica presupuestal.
   6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos INTERVENTORÍA.

7. **Formatos de control.**

   7.1. Relación de personal en obra de obra e INTERVENTORÍA.
   7.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.
   7.3. Control climatológico y de horas trabajadas.

8. **Registro fotográfico fechado, redactado y localizado.**

9. **Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes**.
10. **Copia del libro diario de obra.**
11. **Certificaciones.**
12. **Informe de gestión SISOMA, para las actividades de campo.**
13. **Plan de Cargas de INTERVENTORÍA**

    13.1. Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

1. INTRODUCCION

La Aeronáutica civil para REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO. Adjudico a GACPMF ARQUITECTOS S.A.S para la verificación del cumplimiento del Contrato de obra N° 20000584 H4 DE 2020.

El presente informe se desarrolla acorde a la metodología de trabajo de GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S, complementándolo con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas de Interventoría de la Aeronáutica Civil y contiene la descripción de las actividades: administrativas y técnicas que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de 2020 en el contrato de obra.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría para lograr el alcance del contrato y para atender los eventos imprevistos que han afectado la normal ejecución de la obra en el plazo, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica:

En su Artículo 2°: “la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye, prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

En su Artículo 3°: “Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. (…)”

Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere implementar un mantenimiento en los aeropuertos para garantizar adecuadamente su operación y servicio.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios de navegación aérea, cuenten con la capacidad y eficacia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambiental sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad en el aeropuerto, Gustavo Rojas Pinilla en Cimitarra, para que se ejecuten actividades de mantenimiento que garanticen la seguridad, operatividad, eficacia, funcionalidad y servicio, bajo la normatividad y los alineamientos establecidos por la Entidad.

“La Aeronáutica Civil mediante la Resolución número 024 del 23 de abril de 2020, ordenó la apertura del proceso de contratación, bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, identificado con el número 20000644 H3 de 2020.

Que LA AEROCIVIL adjudicó mediante la Resolución 035 del 03 de junio de 2020, el lote dos del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 20000644 H3 de 2020 al proponente GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S con el objeto de " REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO. por un valor total de ($77.158.410) INCLUIDO IVA, y un plazo de ejecución de SIETE (7) MESES.

3. DATOS GENERALES

MES: OCTUBRE

Del: 01/10/2020. **Al**: 31/10/2020

Nombre del supervisor: ING. ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista.	CONSORCIO DE OBRAS SAN FRANCISCO.	**Contratista.**	GACPMF ARQUITECTOS SAS
Contrato N°	**N°20000584 H4 02 DE 2020**	**Contrato N°**	**N°20000644 H3 02 DE 2020**
Fecha de firma del contrato	17/06/2020	**Fecha de firma del contrato**	09/06/2020
Valor inicial	$347.309.851.76	**Valor inicial**	$ 77.158.410.00
Valor actualizado	$ 512.964.047.76	**Valor actualizado**	N/A
Plazo inicial		**Plazo inicial**	7 MESES
Plazo final	5 MESES	**Plazo final**	5 MESES
Fecha de iniciación	23/02/2021	**Fecha de iniciación**	23/07/2020
Fecha de terminación	23/12/2020	**Fecha de terminación**	31/12/2020

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

4.1. Cumplimiento de programación: actividades, presupuesto y balance.

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del **74.81%,** evidenciado en el avance de las actividades de limpieza, rocería, adecuación de secciones de cerramiento, proceso constructivo de mangaveleta e instalación de carpeta asfáltica.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del **74.81%**, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: **$ 383.730.490**,95 quedando pendiente por ejecutar un **25.19%** equivalente a **$ 129.233.556,81** para un total contractual de **$ 512.964.047,76**

4.2. planes de trabajo ejecutados y programados.

Ejecutado:

- Se realizó reunión entre las partes (constructor – interventoría) para la socialización de la metodología de trabajo, dicha reunión se realizó por medio de la plataforma virtual ZOOM.

Programado:

- Se tiene prevista reunión entre partes (constructor– interventoría) para verificar la ejecución de la obra de acuerdo a la programación.

4.3. cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la interventoría (llamados de atención contractual).

Durante este periodo la interventoría presento observaciones al residente de obra de la disposición de los materiales, así como la señalización de las áreas intervenidas.

4.4. informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

La interventoría cito por medio de la plataforma ZOOM a las partes (supervisión – contratista de obra) a los siguientes comités:

- COMITÉ N° 3 – 02 octubre de 2020
- COMITÉ N° 4 – 08 octubre de 2020

4.5. acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Posterior al comité N° 4 de contratista, se especificaron las fechas de pagos y se informó que el avance del contrato está de acuerdo a lo programado.

4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

A la fecha el constructor ha cumplido de manera paulatina con los requerimientos de la interventoría.


5. CONTROL DE PROGRAMACION

5.1. Avance de actividades de las obras

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del **74.81%,** evidenciado en el avance de las actividades de limpieza, rocería, desmonte de cerramiento existente, concreto ciclópeo.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del **74.81%**, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: **$ 383.730.490,95**, quedando pendiente por ejecutar un **25.19%** equivalente a **$ 129.233.556,81** para un total contractual de **$ 512.964.047,76**

5.2. Grafica de avance físico del contrato de obra

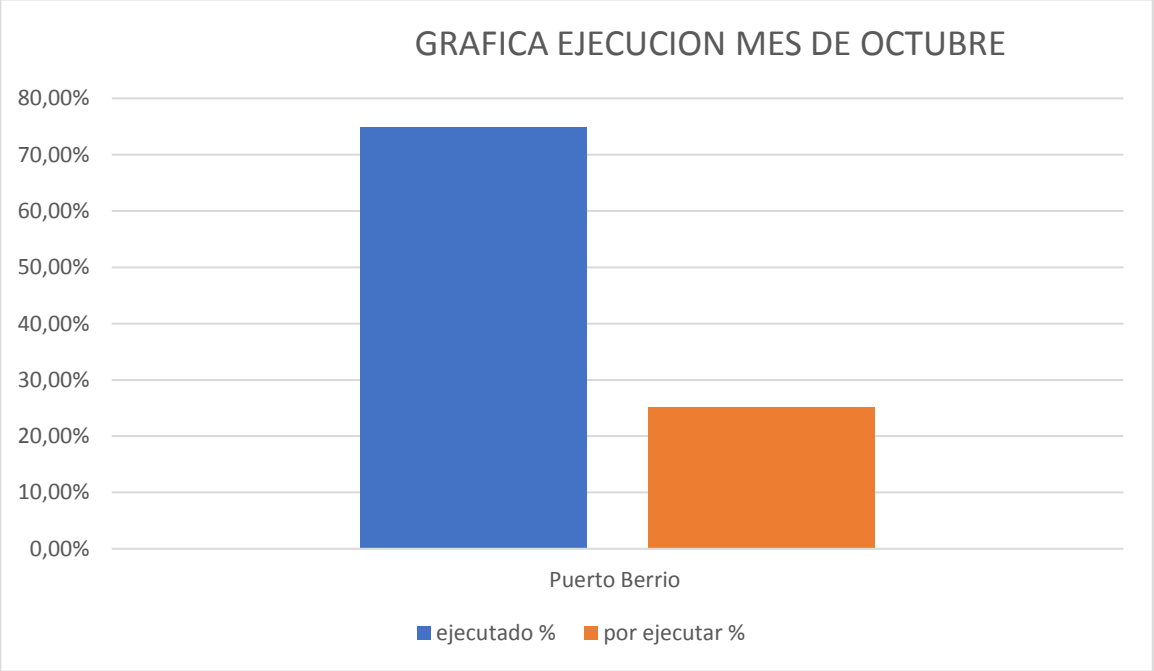

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo

El Constructor durante el presente periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020, ejecutando las siguientes actividades.

- Mantenimiento de zonas verdes, 1. Rocería zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consiste en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base de cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye cargue disposición de material sobrante al botadero autorizado.

- Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros. E=20 cm.

- Entresuelo en piedra, E=10 cm. Incluye recebo compactado en arenilla E=5 cm, Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.

- Construcción de señalización de mangaveletas en concreto ciclópeo, forma: (anillo circular) donde su radio mayor es 7,5 m y su radio menor es 6m, espesor e=0.07 m, ancho =1.50 m. juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco. Para demarcación de mangaveletas.

- Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 13 mt). Incluye construccion , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2” cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2” de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8” , pisa malla en platina de ½” x 1/8” , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8” con marco en angulo de 11/2” x 1/8” , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

- Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 7,5 mt). Incluye construccion , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2” cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2” de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8” , pisa malla en platina de ½” x 1/8” , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8” con marco en ángulo de 11/2” x 1/8” , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

- Localización replanteo. Con equipo de precisión en la pista para instalación de carpeta.

- Suministro, colocación y compactación de súbase granular estabilizada con cemento, con materiales de la zona mejorada en sitio con equipo, espesor 30 cms (incluye excavación y retiro de material existente).

- Suministro y aplicación de imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica.

- Suministro e instalación de geotextil tipo NT -2500 o similar.

- Suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla densa en caliente Norma P-401 FAA.

- Demolición de placa en concreto anillo perimetral-mangaveleta.

5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento

Durante la ejecución del contrato, no se presentaron acciones preventivas y/o correctivas.

5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Durante este periodo no se realizaron actas de liberación de obra.

5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo.
• Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).Consiste en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye aplicación de matamalezas (combatram, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base de cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida quimico.Incluye cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado.
• Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.
• Resane y Koraza sobre muros exterior (tres manos o las necesarias para un correcto acabado).
• Muro divisorio (bloque Nº4).
• Enchape piso en cerámica.
• Enchape muro en cerámica.
• Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC – PRESION , con un DIAMETRO DE ½",RDE 11100 PSI ,Incluye todos los accesorios de PVC de diámetro ½" que se requieran para su correcta instalación.
• Suministro,transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA,con un DIAMETRO de 4"
• Punto Hidraulico de ½"
• Punto Sanitario de 4"
• Demolición de Losa de piso
• Relleno
• Pañete liso impermeabilizado muros 1:4(incluye filos y dilataciones)
• Punto eléctrico.
• Construcción de viga y columneta en concreto reforzado de 12cmx20cm para confinar muros de mampostería.
• Conexión a caja existente de aguas negras.
• Suministro e instalación de caja de inspección de 60x60
• Acometida parcial 2Nº 10+1Nº 12 con tubería EMT ¾" incluye todos los accesorios.

• Adecuación de rejilla de cárcamo existente, incluye fijación y cinta en concreto perimetral.
• Suministro e instalación de malla tipo angeo con marco en aluminio , superpuesta a la ventaneria y puerta existente.

6. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.


6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION		
VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCION + IVA	**$ 512.964.047,76**	100%
VALOR PROGRAMADO AGOSTO	**$ 33.759.029.08**	9.72%
VALOR EJECUTADO AGOSTO	**$ 33.759.029.08**	9.72%
VALOR PROGRAMADO SEPTIEMBRE	**$210.418.830.00**	60.59%
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE	**$210.418.830.00**	60.59%
VALOR PROGRAMADO OCTUBRE	**$139.552.631.00**	27.21%
VALOR EJECUTADO OCTUBRE	**$139.552.631.00**	27.21%
TOTAL PROGRAMADO	**$383.730.490.95**	74.81%
TOTAL EJECUTADO	**$383.730.490.95**	74.81%

CONTROL DE COBROS Y PAGOS CONSTRUCCION			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1	9.72%	**$ 33.759.029.08**	**$ 33.759.029.08**
PAGO N° 2	60.59%	**$210.418.830.00**	**$210.418.830.00**
PAGO Nº 3	27.21%	**$139.552.631.00**	-

6.2. Soporte de las actas de pago.

6.3. Grafica presupuestal.

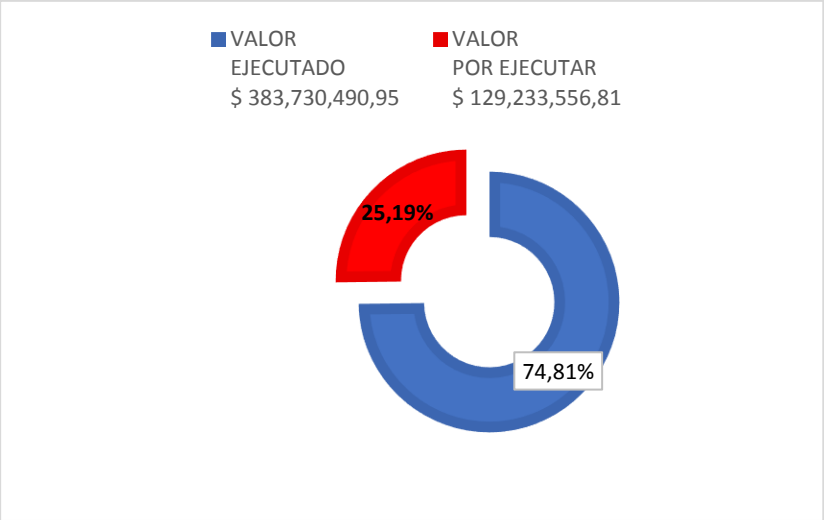

6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos INTERVENTORÍA.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.016.696,00			
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	CIMITARRA	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.002.385,14	40%	$ 4.409.052,00
					$ 4.400.954,06
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%	
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807
	CIMITARRA	$ 38.508.348	11,95%	$ 23.105.008,80	$ 2.761.049
		$ 77.016.696	21,67%	$ 46.210.017,60	

TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.006.855
TOTAL	$ 9.415.907,41

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.158.410,00							
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**		**ACTA2**	**SALDO RP**	
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		
	CIMITARRA	$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		
		$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00				
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%		**% ACTA 2**			**%ACUMULADO**
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807	60,59 %	$ 13.999.325	$ 17.862.262	70%
	CIMITARRA	$ 38.650.062	11,95%	$ 23.190.037,20	$ 2.771.209	8%	$ 1.767.081	$ 29.694.622	20%
		$ 77.158.410	21,67%	$ 46.295.046,00					
	+			TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.017.016		$ 15.766.406		
				TOTAL	$ 9.426.068,30		$ 20.175.457,67		

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.158.410,00									
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**		**ACTA2**		**ACTA 3**	**SALDO RP**	
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		
	CIMITARRA	$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		
		$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00						
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%		**% ACTA 2**		**% ACTA 3**			**%ACUMULADO**
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807	60,59%	$ 13.999.325	27,21%	$ 6.286.873	$ 9.374.912	98%
	CIMITARRA	$ 38.650.062	11,95%	$ 23.190.037,20	$ 2.771.209	7,62%	$ 1.767.081	18,33%	$ 4.250.734	$ 23.235.313	38%
		$ 77.158.410	21,67%	$ 46.295.046,00		68,21%		45,54%			
	+			TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.017.016		$ 15.766.406		$ 10.537.607		
				TOTAL	$ 9.426.068,30		$ 20.175.457,67		$ 14.946.658,72		

CONTROL DE COBROS Y PAGOS INTERVENTORIA			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1 PUERTO BERRIO FIJO	9.72% (40%)	$2.200.477,03	$2.200.477,03
PAGO N° 1 PUERTO BERRIO VARIABLE	9.72% (60%)	$ 2.245.807	$ 2.245.807
TOTAL PAGO N° 1 PUERTO BERRIO		$ 4.446.284,03	$ 4.446.284,03
PAGO N° 2 PUERTO BERRIO FIJO	60.59% (40%)	$2.200.477,03	$2.200.477,03
PAGO N° 2 PUERTO BERRIO VARIABLE	60.59% (60%)	$ 13.999.325	$ 13.999.325
TOTAL PAGO N° 2 PUERTO BERRIO		$ 16.199.802.03	$ 16.199.802.03
PAGO N° 3 PUERTO BERRIO FIJO	27.21% (40%)	$2.200.477,03	$2.200.477,03
PAGO N° 3 PUERTO BERRIO VARIABLE	27.21% (60%)	$ 6.286.873	
TOTAL PAGO N° 3 PUERTO BERRIO		$ 8.487.350.03	

7. FORMATOS DE CONTROL.

7.1. Relación de personal en obra de obra e INTERVENTORÍA.

PROFESIONALES CONSULTOR			
N°	**CARGO**	**PROFESION**	**NOMBRE PROFESIONAL**
1.	Director de obra	Ingeniero	Gustavo de Jesus López
2.	Residente de obra	Ingeniero	Marcela Zambrano

PROFESIONALES INTERVENTORIA			
N°	**CARGO**	**PROFESION**	**NOMBRE PROFESIONAL**
1.	Representante legal	Arquitecta	Patricia Molina Fonseca
2.	Director de Interventoría	Arquitecta	Patricia Molina Fonseca
3.	Residente de interventoría	Ingeniera	Silvia Ayala
4.	Auxiliar residente de obra	Tecnóloga	Ledys López
5.	Profesional de apoyo	Ingeniera	Alejandra Sánchez
6.	Secretaria	Bachiller	Yeimi Vargas

7.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

EQUIPO	HORARIO TRABAJADO	DIAS
MEZCLADORA DE CONCRETO	9:00 am -12:00 / 13:00 pm- 16.30 pm	24 días
MEZCLADORA ASFALTICA FINISHER	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día
RODILLO COMPACTADOR	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día
COMPACTADOR NEUMATICO	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día
MAQUINARIA PARA IMPRIMACION DE ASFALTO	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día

7.3. Control climatológico y de horas trabajadas.

FECHA	HORA -LLUVIAS	TOTAL HORAS REGISTRADAS
JUEVES 01/10/2020	06:00 AM – 10:00 AM	4:00 HORAS
MARTES 13/10/2020	12:00 PM – 3:30 AM	3:30 HORAS
MARTES 20/10/2020	06:00 AM – 2:00 PM	08:00 HORAS
VIERNES 23/10/2020	07:00 AM – 11:30 AM	04:30 HORAS
TOTAL DE HORAS LLUVIAS MES DE OCTUBRE		**20 HORAS**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

- ITEM 1 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 1. ROCERIA ZONAS DE SEGURIDAD Y DEMAS AREAS DEL AEROPUERTO. DEBE INCLUIR LA LIMPIEZA DE LAS AREAS PERIMETRALES INTERNAS (DESDE LAS ZONAS DE SEGURIDAD HASTA EL CERRAMIENTO). CONSISTE EN DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS. INCLUYE APLICACIÓN DE MATAMALEZAS (COMBATRAN, RANDALL O SIMILAR) A TODAS LAS ZONAS DE SEGURIDAD INCLUIDA LA BASE DEL CERRAMIENTO. 2. LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (MALLAS), RETIRANDO TODO ELEMENTO ORGANICO E INORGANICO. SE HARA ADEMAS LA FUMIGACION CON UN HERBICIDA QUIMICO. INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE AL BOTADERO AUTORIZADO.

En este periodo se ejecutó al 100 % la tercera ronda de mantenimiento de zonas verdes rocería. Esta actividad fue desarrollada con los implementos necesarios para la ejecución de la misma y la seguridad de los trabajadores. Su desarrollo fue dado en el corte de pasto, fumigación de las zonas, acopio de material sobrante y retiro del mismo.

1 ROCERIA



Mantenimiento zonas verdes , Rocería



Ejecución de Rocería zona oriental.



Limpieza material sobrante rocería.



Rocería zona occidental



Zona Norte-occidental antes de mantenimiento de zonas verdes.



Zona Norte-occidental con Rocería.



Proceso de ejecución de Rocería.



Ejecucion de Roceria en zona oriental.

- ITEM 10 Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros. E=20 cm

La excavación se llevó acabo en las dos mangaveletas existentes de acuerdo a las especificaciones para llevar acabo el mejoramiento de ese terreno y proceder a la construcción de la señalización de mangaveleta. Esta actividad se desarrolló al 100% durante este periodo.



Excavación de para entresuelo y mangaveleta.

- ITEM 11 Entresuelo en piedra, E=10 cm. Incluye recebo compactado en arenilla E=5 cm, Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.

Se llevó acabo el desarrollo de esta actividad al 100%. De acuerdo a las especificaciones técnicas para este ítem.





Instalación de entresuelo y compactación del mismo.






- ITEM 12 Construcción de señalización de mangaveletas en concreto ciclópeo, forma: (anillo circular) donde su radio mayor es 7,5 m y su radio menor es 6m, espesor e=0.07 m, ancho =1.50 m. juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco. Para demarcación de mangaveletas.

Se ejecutó al 100% esta actividad. Se desarrolló acorde a las especificaciones técnicas respectando las medidas impartidas por esta.






Proceso constructivo de señalización de mangaveletas.

- ITEM AD-02 Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 13 mt). Incluye construccion , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2" cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2" de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8" , pisa malla en platina de ½" x 1/8" , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8" con marco en angulo de 11/2" x 1/8" , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Se desarrolló el 100% de esta actividad acorde a las especificaciones.









Proceso de adecuación de cerramiento.

- ITEM AD-03 Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 7,5 mt). Incluye construcción , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2" cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2" de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8" , pisa malla en platina de ½" x 1/8" , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8" con marco en ángulo de 11/2" x 1/8" , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

Se desarrolló al 100% esta actividad.









Proceso constructivo de adecuación de cerramiento en zona de canales

- ITEM AD-04 Localización replanteo. Con equipo de precisión en la pista para instalación de carpeta.



Replanteo de zona a intervenir con asfalto.

- ITEM AD-05 Suministro, colocación y compactación de súbase granular estabilizada con cemento, con materiales de la zona mejorada en sitio con equipo, espesor 30 cms (incluye excavación y retiro de material existente).

Se desarrolló al 100% esta actividad. Se llevó a cabo el retiro del material asfaltico y base en mal estado debido a las filtraciones de agua que se presentaban en ciertas zonas. Y a su vez se hizo el mejoramiento.









Mejoramiento de súbase en zona afectadas por filtraciones.

- ITEM AD-06 Suministro y aplicación de imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica.

Se llevó acabo la ejecución total de esta actividad.





Aplicación de imprimación.

- ITEM AD-07 Suministro e instalación de geo textil tipo NT -2500 o similar

Se ejecutó al 100% la instalación de geo malla en la zona de intervención para aplicación de carpeta de rodadura.







Instalación de Geo malla.

- ITEM AD-08 Suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla densa en caliente Norma P-401 FA

Se llevó a cabo el desarrollo de esta actividad al 100%. Se ejecutó de acuerdo a los lineamientos de las especificaciones y lo requerimientos de la misma.











Proceso de instalación de carpeta de rodadura en mezcla caliente.

- ITEM AD-46 Demolición de placa en concreto anillo perimetral- mangaveleta

Se ejecutó al 100% la ejecución de anillo de señalización de mangaveleta .







Registro de demolición de mangaveleta existente.

9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.


CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO NUMERO	FECHA	ASUNTO
OFC-AERO-001-20	07/07/2020	APERTURA DE CORREO OFICIAL DE OBRA PARA COMUNICACIONES Y MANEJO EXCLUSIVO DE AERONAUTICA
OFC-AERO-002-20	08/07/2020	AVAL DE INTERVENTORIA MUESTRA DE MALLA PARA CERRAMIENTO
OFC-AERO-003-20	23/07/2020	INVITACIÓN A REUNIÓN ETAPA PRE-CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-004-20	30/07/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA E INICIO DE ACTIVIDADES
OFC-AERO-005-20	05/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-006-20	13/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-007-20	13/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-008-20	14/08/2020	SOLICITUD Y APROBACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES
OFC-AERO-009-20	18/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-010-20	18/08/2020	OBSERVACIONES ITEM CONTRACTUAL
OFC-AERO-011-20	20/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-012-20	25/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-013-20	28/08/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A LAS PROPUESTAS DE DISEÑOS PRESENTADAS PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-014-20	28/08/2020	SOLICITUD Y APROBACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES
OFC-AERO-015-20	28/08/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A LAS PROPUESTAS DE DISEÑOS PRESENTADAS PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-016-20	28/08/2020	SOLICITUD NOTAM
OFC-AERO-017-20	02/09/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A COTIZACION DE CARPETA ASFALTICA
OFC-AERO-018-20	02/09/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 1 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-019-20	02/09/2020	SOCIALIZACION DE RESPUESTA SUPERVISION A OFC-AERO-015-20 AVAL DE INTERVENTORIA A LAS PROPUESTAS DE DISEÑOS PRESENTADAS PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-020-20	14/09/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 2 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-021-20	15/09/2020	SOLICITUD NOTAM
OFC-AERO-022-20	22/09/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A EL ACTA DE COMPENSACION MAYORES Y MENORES PRESENTADA PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-023-20	25/09/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A EL ACTA DE COMPENSACION MAYORES Y MENORES PRESENTADA PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-024-20	01/10/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 3 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-025-20	07/10/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 4 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM

OFC-AERO-026-20	19/10/2020	SOLICITUD DE ADICION A INTERVENTORIA DE ACUERDO A EL ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES PRESENTADA PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-027-20	14/10/2020	SOLICITUD Y APROBACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES

10. COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA.

Se anexa copia del libro de obra, para evidenciar su diligenciamiento, donde se puede constatar que la Interventoría ha recomendado su diligenciamiento riguroso.

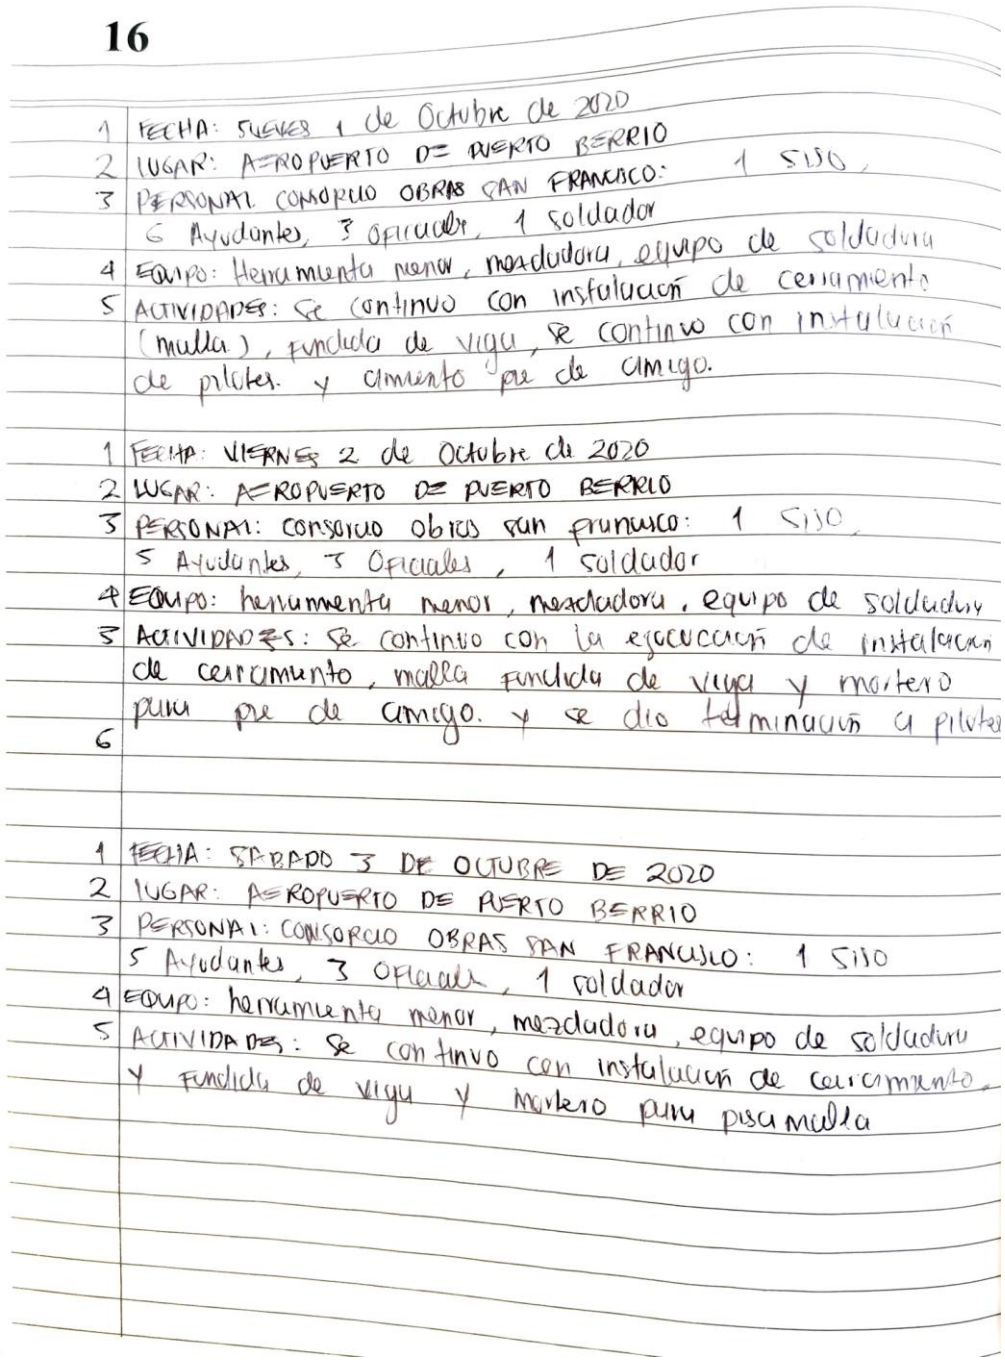

16

1 FECHA: JUEVES 1 de Octubre de 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
5 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento (malla), fundida de viga, se continuo con instalacion de pilotes. y almuerzo por de amigo.

1 FECHA: VIERNES 2 de Octubre de 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: consorcio obras san francisco: 1 SISO,
5 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 soldador
4 EQUIPO: herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la ejecucion de instalacion de cerramiento, malla fundida de viga y mortero para por de amigo. y se dio terminacion a pilotes
6

1 FECHA: SABADO 3 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
5 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 soldador
4 EQUIPO: herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento. y fundida de viga y mortero para pisa malla

17

1 FECHA: DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
2 OFICIALES, 2 Ayudantes, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento y fundida de viga y mortero puzolanico para pañete.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
5 Ayudantes, 3 OFICIALES, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento fundida de viga
6 OBSERVACIONES: Se realizo una socialización con el administrador Cairo Barrientos y el director de obra y representante legal Arq Gustavo lopez donde se dio a conocer los adicionales que se tienen contemplados en el contrato actual. Con el fin de consolidar los mismos y realizar las respectivas mejoras de acuerdo con los tres pilares administración de aeropuerto, Director de obra del contratista e interventoria.

1 FECHA: MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
6 Ayudantes, 3 OFICIALES, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de malla y cimbrado y fundida de viga.

18

1 FECHA: 7 OCTUBRE DE 2020 - MIERCOLES
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: 1 SISO, 2 OFICIALES, 6 Ayudantes, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, equipo soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento y viga de amarre
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: 8 OCTUBRE DE 2020 - JUEVES
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 1 Soldador, 4 Ayudantes, 3 OFICIALES
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento y viga de amarre.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: VIERNES 9 OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 3 OFICIALES, 7 Ayudantes, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezclador, equipo soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento y viga de amarre y mortero para pie de amigo.
6 OBSERVACIONES:

19

FECHA: SABADO 10 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 3 OFICIALES, 1 SOLDADOR, 7 AYUDANTES
EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora, equipo soldadura
ACTIVIDADES: Se dio terminación a viga de amarre de todo el cerramiento y al muro de pie de amigo y se continuo con la instalación de cerramiento.
OBSERVACIONES:


FECHA: LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 1 SOLDADOR, 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL
EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento (instalación de alambron parte superior y alambre de puas)
OBSERVACIONES

FECHA: MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 7 AYUDANTES, 1 SOLDADOR, 1 OFICIAL
EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento

20

1 FECHA: MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 OFICIAL
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo desarrollando la actividad de instalacion de cerramiento.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
7 Ayudantes, 1 Soldador, 2 OFICIALES.
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la actividad de cerramiento y se inicio con la adecuacion de canales (pilotes). y se inicio con limpieza y excavacion para mangavieleta.

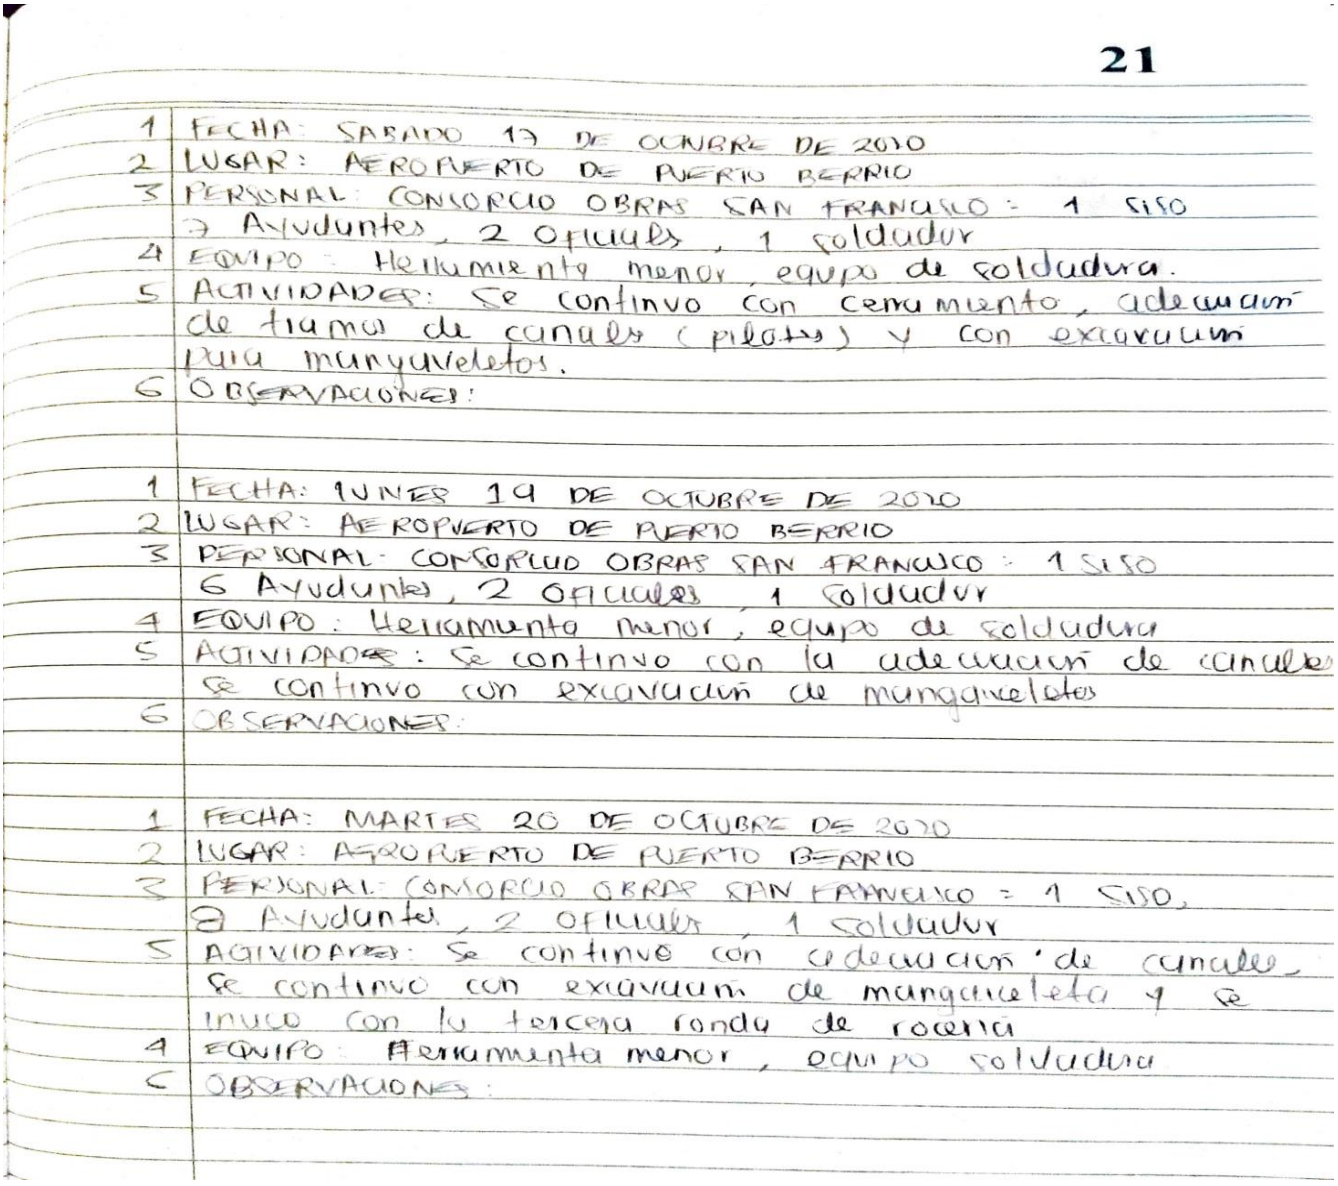

21

1 FECHA: SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO = 1 SISO
7 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con cerramiento, adecuacion de franja de canales (pilotes) y con excavacion para manguiveletas.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO = 1 SISO
6 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuacion de canales
Se continuo con excavacion de manguiveletas
6 OBSERVACIONES:


1 FECHA: MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO = 1 SISO,
8 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Soldador
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de canales,
Se continuo con excavacion de manguiveleta y se inicio con la tercera ronda de roseria
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo soldadura
6 OBSERVACIONES:

22

1 FECHA: MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 8 Ayudantes, 1 Soldador, 2 Oficiales
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de canals, excavacion de mangueletas y con rocetta.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 8 Ayudantes, 1 Soldador, 2 OFICIALES.
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura, motoniveladora asfaltica Finisher, Rodillo compactador, Compactador neumatico, maquinaria para imprimacion de asfalto
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuacion de canals excavacion de mangueleta, rocetta y se nevo acabo la actividad instalacion de asfalto en la zona cabecera de la pista.

1 FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES, 1 SOLDADOR
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuacion de canals actividades para construccion de mangueletes, rocetta

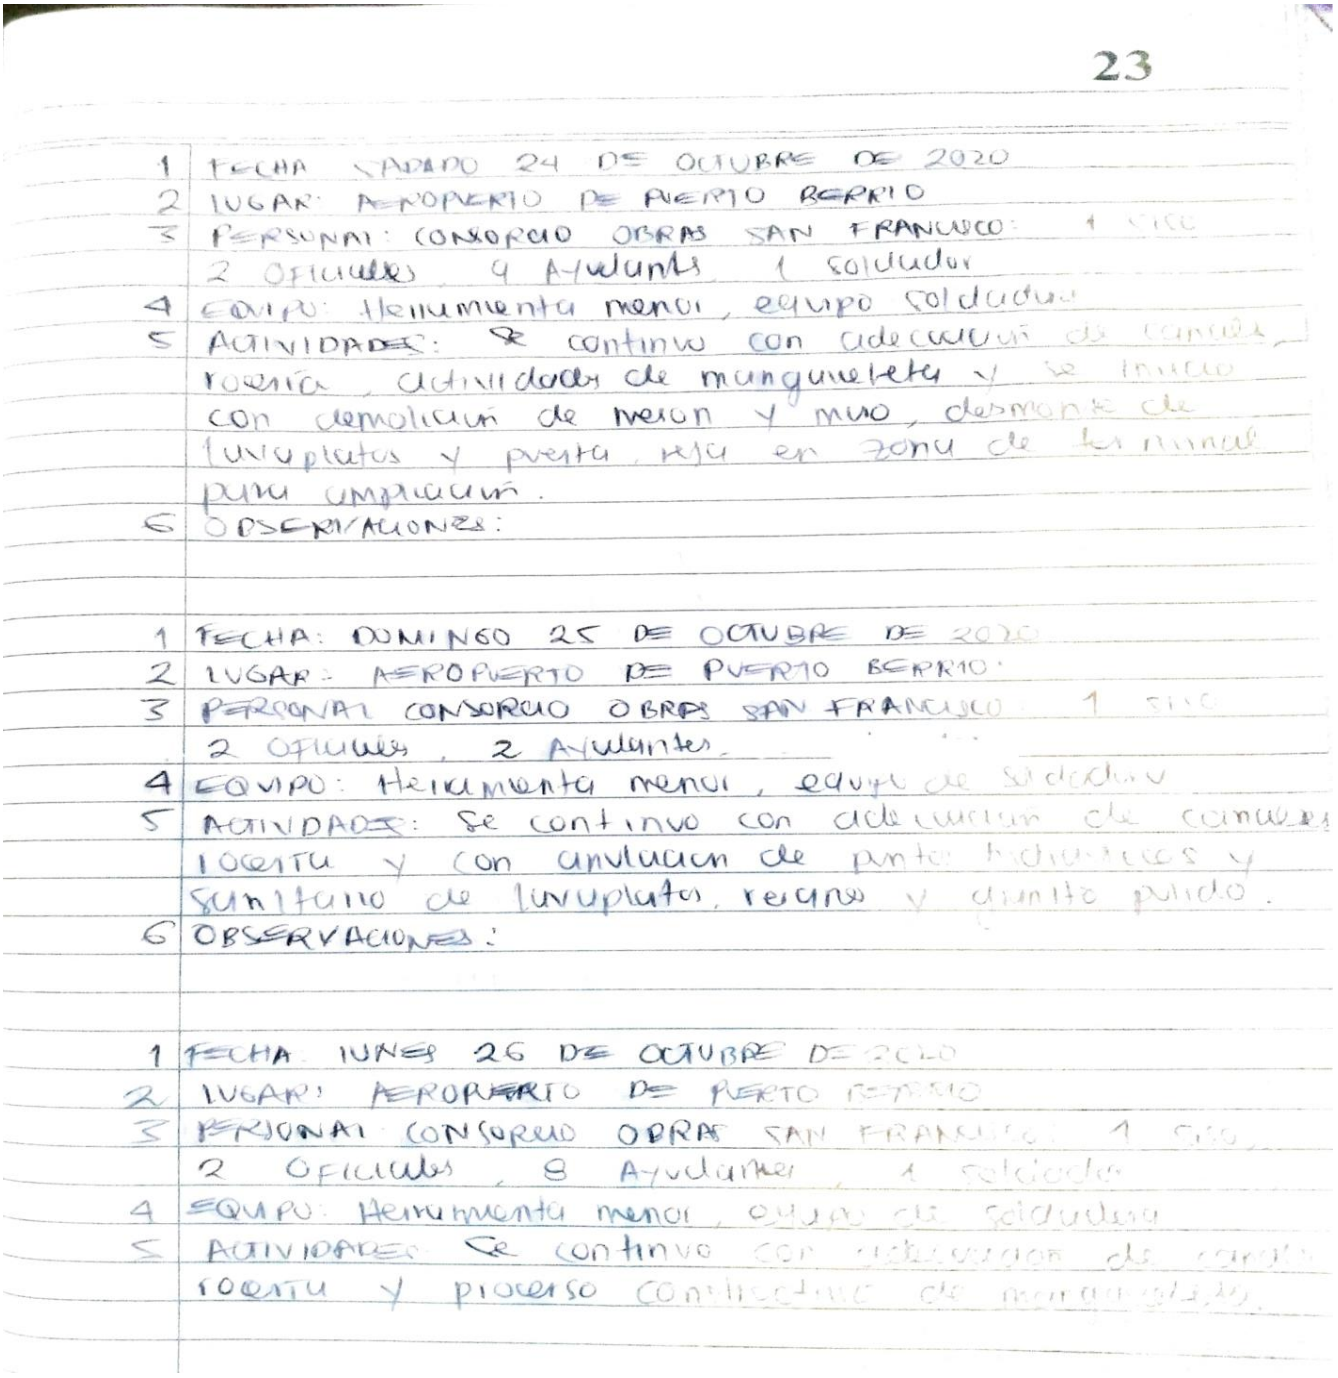


23

1 FECHA SABADO 24 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
2 OFICIALES, 4 AYUDANTES, 1 SOLDADOR
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continua con adecuación de cunetas, roseta, actividades de manguetera y se inicia con demolición de muro y muro, desmonte de luminarias y puesta hoja en zona de terminal para ampliación.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
2 OFICIALES, 2 AYUDANTES.
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continua con adecuación de cunetas roseta y con anulación de puntos hidráulicos y sanitarios de luminarias, recinto y demás pulido.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
2 OFICIALES, 8 AYUDANTES, 1 SOLDADOR
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continua con adecuación de cunetas roseta y proceso constructivo de manguetería.

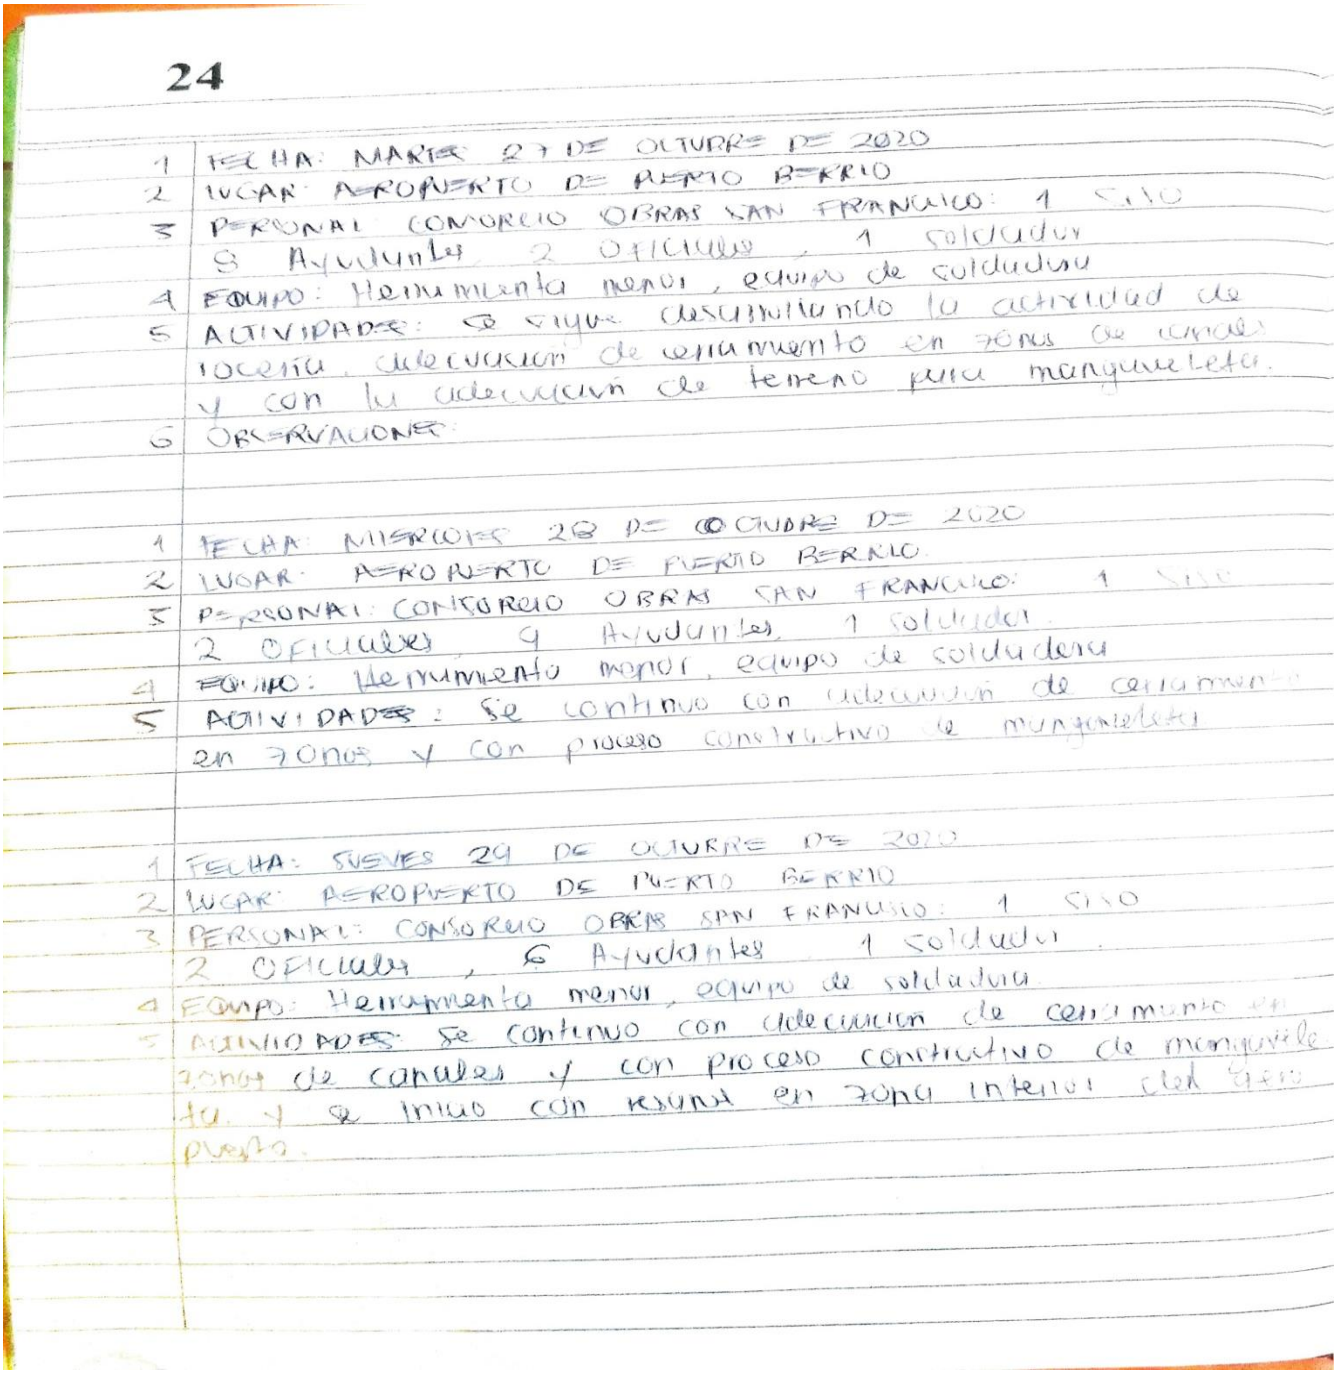


24

1 FECHA: MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 Sisso
8 Ayudantes 2 Oficiales 1 soldadura
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se sigue desarrollando la actividad de
hincada, adecuacion de cerramiento en zonas de canales
y con la adecuacion de terreno para manguerete.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 Sisso
2 Oficiales, 9 Ayudantes, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de cerramiento
en zonas y con proceso constructivo de mangueretes

1 FECHA: JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 Sisso
2 Oficiales, 6 Ayudantes 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de cerramiento en
zonas de canales y con proceso constructivo de manguerete
tu. y se inicio con resana en zona interior del tanque
puesto.

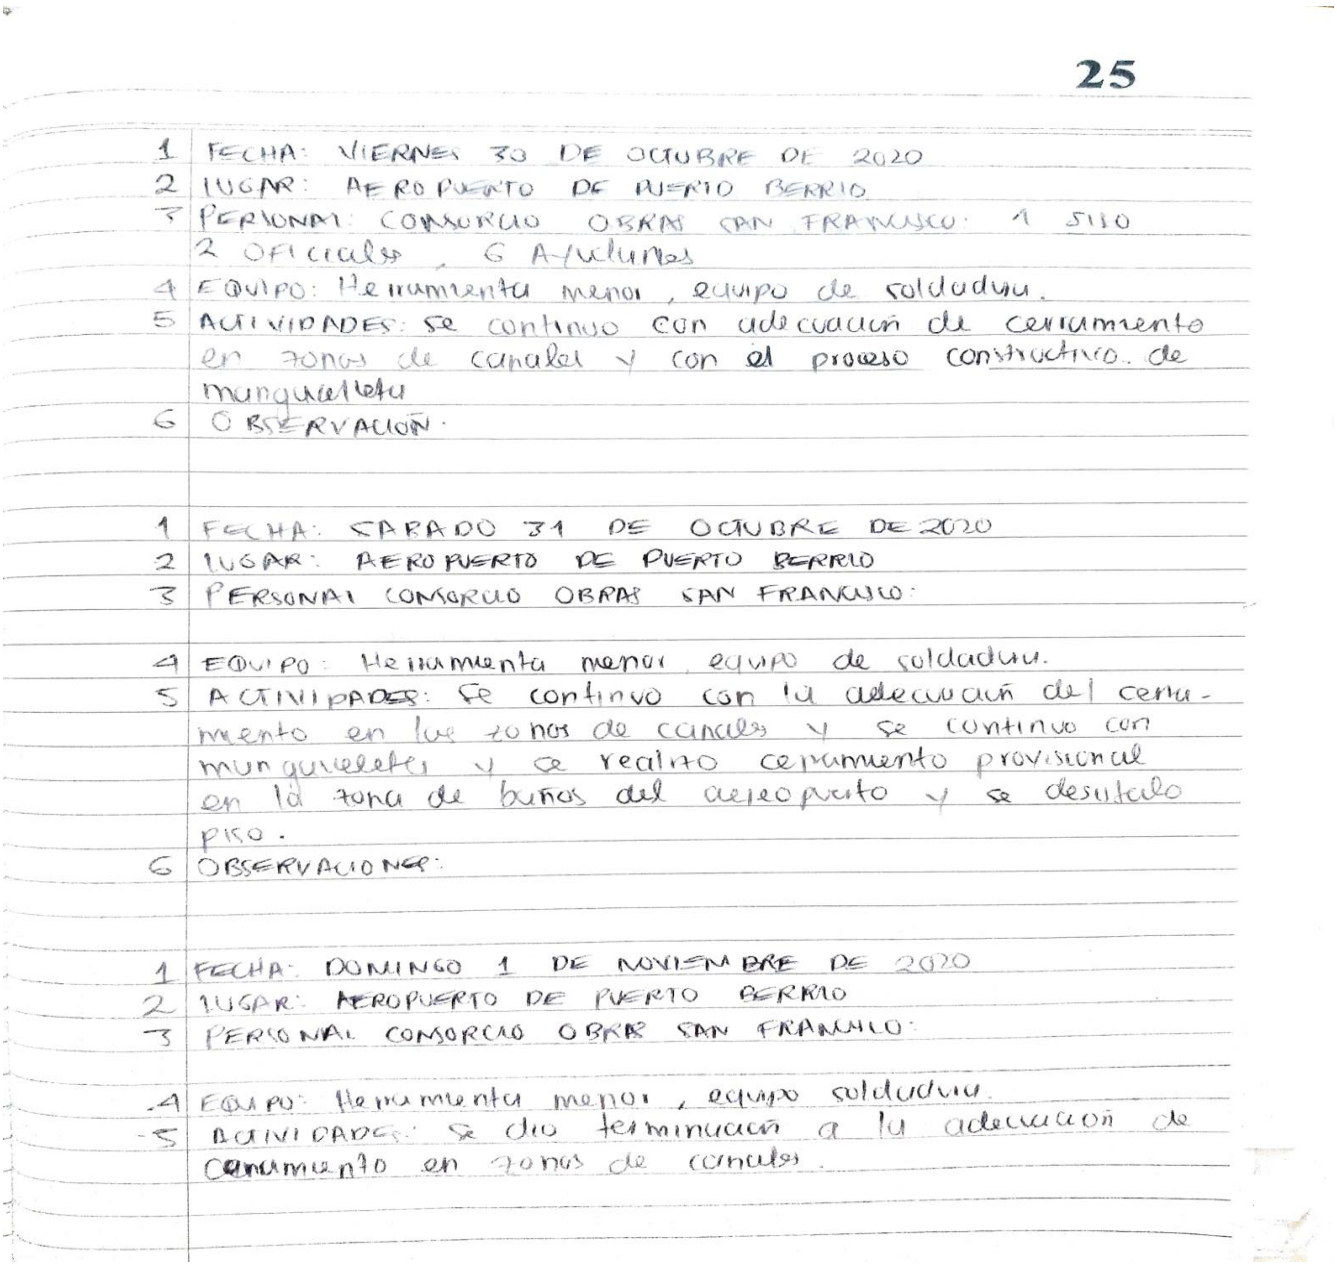

25

1 FECHA: VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
2 OFICIALES, 6 AYUDANTES
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuación de cerramiento en zonas de canales y con el proceso constructivo de mangueteria
6 OBSERVACIÓN.

1 FECHA: SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO:
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuación del cerramiento en las zonas de canales y se continuo con mangueteria y se realizo cerramiento provisional en la zona de baños del aeropuerto y se desistalo piso.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO:
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se dio terminación a la adecuación de cerramiento en zonas de canales.

Anexo físico Nº4 (COPIA DEL LIBRO DE OBRA)

11. CERTIFICACIONES.

- **Certificación aprobación de tercer corte de obra**

- **Certificación de parafiscales**

12. INFORME DE GESTIÓN SISOMA, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO							REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CONTROL Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	CALIFICACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	CALIFICACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO				
Mantenimineto de zonas verdes	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

										ultravioletas	
Mantenimineto de zonas verdes	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Roceria	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Limpieza manual de cerramiento	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Excavaciones	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Contruccion de vigas	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

										jornada laboral	
Cimiento pedestales	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso de camisa para rayos ultraviolet as	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Desmonte del cerramiento en mal	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

SEGUIMIENTO SST DEL PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO

ID PROYECTO: 20000584 H4 02 2020 Contratista: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO Nit: 901384159-8 Periodo: 16/09/2020 -15/10/2020

Item	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO	CARGO	FECHA INGRESO	NUMERO TELEFONICO	INFORMACIÓN MEDICA BASICA				CONTACTO EMERGENCIA		APORTE A ENTIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ACTIVAS)			
							VACUNAS APLICADAS	GRUPO SANGUINEO Y RH	ALERGIAS Y/O CONDICIÓN MEDICA	MEDICAMENTOS	NOMBRE	NUMERO DE CONTACTO	ARL ACTIVA	EPS ACTIVA	AFP ACTIVO	FECHA MAXIMA PAGO
1	ALFONSO RAMOS	8.829.269	27/10/1978	OFICIAL	31/07/2020	3195750473	NO	A+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
2	JULIO CESAR UYOA	1.104.124.375	12/06/1984	AYUDANTE	31/07/2020	3175474581	NO	A+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
3	PAOLA CORREAL	1.050.554.430	26/01/1997	SST	31/07/2020	3183631471	NO	A+	NO	NO	PAULA RAMOS	3505953503	SURA			
4	SAMUEL BERONA	1.099.553.887	10/11/1995	AYUDANTE	05/08/2020	3013847229	NO	O+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
5	JHON SERNA	1.039.694.333	13/01/1992	AYUDANTE	07/08/2020	3122202942	NO	0+	NO	NO	ALBEIRO	3122202142	SURA			
6	SEBASTIAN GOMEZ	1.007.114.599	28/12/1992	AYUDANTE	10/08/2020	3146788932	NO	A+	NO	NO	NANCY	3215050629	SURA			
7	JESUS HINCAPIE	71.192.494	29/01/1981	GUADAÑADOR	11/08/2020	3148427592	NO	O+	NO	NO	TERESA HINCAPIE	3148271754	SURA			
8	MIGUEL BARAJAS	91.157.331	28/04/1976	OFICIAL	14/08/2020	3144450685	NO	O+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
9	RAFAEL CASTAÑEDA	850.006.814	27/07/1976	AYUDANTE	19/08/2020	3162733942	NO	A+	NO	NO	MARTA MARTINEZ	3162733942	SURA			
10	OSCAR MARULANDA	71.184.637	23/07/1965	AYUDANTE	19/08/2020	3135285869	NO	O+	NO	NO	EFERSON MARULANDA	3114393445	SURA			
11	FERNANDO RODRIGUEZ	1.039.700.618	18/01/1995	AYUDANTE	19/08/2020	3205446304	NO	O+	NO	NO	VANESSA	3116036045	SURA			
12	DANIEL RUIZ	984.804.494	04/07/1968	AYUDANTE	21/08/2020	3148427592	NO	A+	NO	NO	JESUS HINCAPIE	3148427592	SURA			
13	LUIS MIRA	711.884.919	09/06/1972	AYUDANTE	24/08/2020	3234730287	NO	O+	NO	NO	OLGA MIRA	3187504729	SURA			
14	YOVANI ACEVEDO	71.194.247	08/04/1984	AYUDANTE	27/08/2020	3166274562	NO	O+	NO	NO	YURANI	3142552883	SURA			
15	ORLY GARCIA	1.034.309.179	09/05/1983	OFICIAL	27/08/2009	3154844226	NO	O+	NO	NO	ERIKA	3223490925	SURA			
16	GABRIEL GARCIA	1.232.598.804	19/05/1993	OFICIAL	27/08/1998	3214494704	NO	A+	NO	NO	ERIKA	3223490925	SURA			
17	EDWIN FERREIRA	17.072.062	17/02/1884	AYUDANTE	27/08/1987	3223702714	NO		NO	NO	ROSA SANCHEZ	3223017143	SURA			
18	CRISTIAN MERCHAN	1.022.973.445	27/02/1992	OFICIAL	08/09/2020	3175168923	NO	O+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
19	ALEXANDER NAJERA	91.444.494	27/08/1975	SOLDADOR	31/07/2020	3134685303	NO	A+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	05/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	**NOMBRE**	**CARGO**	**¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?**	**¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun pacientepositivo para COVID-19?**	**¿Esta teniendo escalofrios?**	**¿Tiene dolor de garganta?**	**¿Esta teniendo dolor de cabeza?**	**¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?**	**¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?**	**¿Esta teniendo tos?**	**¿Ha perdido el olfato?**	**¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)**	**¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)**	**¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?**	**¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?**	**¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?**	**RESULTADO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION**
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.022.973.445	CRISTIAN MERCHAN	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.157.331	MIGUEL BARAJAS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	JHON ANDRES SERNA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	12/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	**NOMBRE**	**CARGO**	**¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?**	**¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun pacientepositivo para COVID-19?**	**¿Esta teniendo escalofrios?**	**¿Tiene dolor de garganta?**	**¿Esta teniendo dolor de cabeza?**	**¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?**	**¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?**	**¿Esta teniendo tos?**	**¿Ha perdido el olfato?**	**¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)**	**¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)**	**¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?**	**¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?**	**¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?**	**RESULTADO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION**
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	LUIS MIRA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	19/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	NOMBRE	CARGO	¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?	¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun padentepositivo para COVID-19?	¿Esta teniendo escalofrios?	¿Tiene dolor de garganta?	¿Esta teniendo dolor de cabeza?	¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?	¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?	¿Esta teniendo tos?	¿Ha perdido el olfato?	¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)	¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)	¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?	¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?	¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?	RESULTADO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	LUIS MIRA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	26/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	NOMBRE	CARGO	¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?	¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun padentepositivo para COVID-19?	¿Esta teniendo escalofrios?	¿Tiene dolor de garganta?	¿Esta teniendo dolor de cabeza?	¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?	¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?	¿Esta teniendo tos?	¿Ha perdido el olfato?	¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)	¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)	¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?	¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?	¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?	RESULTADO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	LUIS MIRA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Alfonso Ramos Enciso
CEDULA	88242649
CARGO	Oficial.

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Alfonso Ramos

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Julio Cesa Uyoa
CEDULA	1041243375
CARGO	Guadañador

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Julio

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Paola Andrea Correal Ramos
CEDULA	1030554430
CARGO	SST

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Paola Correal.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Alexander Najera.
CEDULA	91444494
CARGO	Soldador

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID 19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Sandra Barona
CEDULA	1.097552388
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID 19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Jhon Andres Serna Echavarría
CEDULA	1039694333
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

Serna

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Sebastian Gomez Gaviria
CEDULA	1002114599
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Sebastian Gomez Gaviria
FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Jesus Alberto Hincapie.
CEDULA	71192 044
CARGO	Guadañador.

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Jesus Alberto Hincapie
FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Cristian Felipe Merchan Perez.
CEDULA	1022975495
CARGO	Oficial

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos apartados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

Cristian Merchan

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID 19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Miguel M. Bargas Carrillo
CEDULA	91151331
CARGO	Oficial

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?			
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos apartados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

Miguel Bargas

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Daniel Rafael Castañeda
CEDULA	9500068
CARGO	Ayudante.

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Daniel Castañeda

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Oscar de Jesus Morokunda
CEDULA	71184637
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermeda d inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que los respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Fernando Esteban Rodriguez
CEDULA	1039700618
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Fernando Rodriguez

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Daniel de Jesus Ruiz
CEDULA	98480 944
CARGO	Guadañador

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Daniel Ruiz

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Luis Fernando Mira
CEDULA	7188491
CARGO	Guardañador

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

•Luis Fernando Mira

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	YOVANI ACEVEDO
CEDULA	1194247
CARGO	AUXILIAR

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

. Yovani Acevedo

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Gabriel García
CEDULA	1232598800
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Orly García
CEDULA	1034349174
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?			
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?			
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?			
¿Padece una enfermedad cardiaca?			
¿Padece hipertensión arterial			
¿Padece una enfermedad renal?			
¿Padece de diabetes?			
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?			
¿Padece lupos?			
¿Padece cáncer?			
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?			
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?			
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?			

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Edwin Gregorio Ferreira
CEDULA – Permiso	17072062
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

13. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA

La interventoría, **al mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de cimitarra y puerto Berrio** se hará de manera presencial a través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe

ofrecer además de la aplicación de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, objeto de interventoría.

La ejecución de la obra de **mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de cimitarra**, se llevará a cabo considerando el presupuesto y los análisis de precios unitarios aprobados previamente por la AEROCIVIL, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de colaboración constante entre el interventor, contratante, contratista de obra, supervisor, personal profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del presupuesto y de la programación de la obra.

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la interventoría debe cumplir durante la obra, estas se califican de la siguiente manera:

- Actividades Técnicas
- Actividades Administrativas y Financieras
- Actividades de Control

Las tres (3) actividades anteriores se deben cumplir en sus tres fases durante la ejecución del contrato de obra a intervenir:

- Preliminares e iniciación del contrato
- Desarrollo y ejecución de la obra
- Recibo de la Obra

13.1. Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

A. ACTIVIDADES TÉCNICAS

✓ Revisión, análisis de planos y especificaciones

✓ Programación y presupuesto

✓ Escogencia y coordinación de formatos

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

✓ Revisión de pólizas

✓ Revisión de reglamentos

- Seguridad de trabajo

- Salud ocupacional

C. ACTIVIDADES DE CONTROL

✓ Revisión y Control

- Análisis de precios unitarios
- Presupuesto y cantidades de obra
- Escogencia y coordinación de formatos

No siendo más se da por terminado el **INFORME MENSUAL N° 03 - 2020 DE LA INTERVENTORÍA** la entrega de anexos complementarios a este informe los cuales se incluirán en medio físico y digital, los originales permanecerán en custodia de la Interventoría, para ser incluidos en informe final de liquidación.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios para proceder.

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3	**GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S** ING. SILVIA NATHALIA AYALA PARRA RESIDENTE DE OBRA



INFORME MENSUAL N° 3 DE INTERVENTORIA

CONTRATO **N°20000644 H3 02 DE 2020**

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2020 A EL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CONTENIDO

1. **Introducción**

2. **Antecedentes del contrato**

3. **Datos generales**

4. **Condiciones de cumplimiento del contrato.**

   4.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance.
   4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados.
   4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la INTERVENTORÍA.
   4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.
   4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.
   4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

5. **Control de la programación.**

   5.1. Avance de actividades de las obras
   5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra.
   5.3. Actividades ejecutadas en el periodo.
   5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.
   5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.
   5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

6. **Control presupuestal del contrato.**

   6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.
   6.2. Soporte de las actas de pago.
   6.3. Grafica presupuestal.
   6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos INTERVENTORÍA.

7. **Formatos de control.**

   7.1. Relación de personal en obra de obra e INTERVENTORÍA.
   7.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.
   7.3. Control climatológico y de horas trabajadas.

8. **Registro fotográfico fechado, redactado y localizado.**

9. **Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes**.
10. **Copia del libro diario de obra.**
11. **Certificaciones.**
12. **Informe de gestión SISOMA, para las actividades de campo.**
13. **Plan de Cargas de INTERVENTORÍA**

    13.1. Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

1. INTRODUCCION

La Aeronáutica civil para REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO. Adjudico a GACPMF ARQUITECTOS S.A.S para la verificación del cumplimiento del Contrato de obra N° 20000584 H4 DE 2020.

El presente informe se desarrolla acorde a la metodología de trabajo de GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S, complementándolo con los requerimientos de las Especificaciones Técnicas de Interventoría de la Aeronáutica Civil y contiene la descripción de las actividades: administrativas y técnicas que se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de octubre de 2020 en el contrato de obra.

El informe entrega los indicadores, conclusiones y recomendaciones de la interventoría para lograr el alcance del contrato y para atender los eventos imprevistos que han afectado la normal ejecución de la obra en el plazo, de manera que mitiguen las implicaciones de tales eventos.

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica:

En su Artículo 2°: “la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye, prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

En su Artículo 3°: “Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. (…)”

Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere implementar un mantenimiento en los aeropuertos para garantizar adecuadamente su operación y servicio.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios de navegación aérea, cuenten con la capacidad y eficacia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambiental sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad en el aeropuerto, Gustavo Rojas Pinilla en Cimitarra, para que se ejecuten actividades de mantenimiento que garanticen la seguridad, operatividad, eficacia, funcionalidad y servicio, bajo la normatividad y los alineamientos establecidos por la Entidad.

“La Aeronáutica Civil mediante la Resolución número 024 del 23 de abril de 2020, ordenó la apertura del proceso de contratación, bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, identificado con el número 20000644 H3 de 2020.

Que LA AEROCIVIL adjudicó mediante la Resolución 035 del 03 de junio de 2020, el lote dos del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. 20000644 H3 de 2020 al proponente GAC PMF ARQUITECTOS S.A.S con el objeto de " REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO. por un valor total de ($77.158.410) INCLUIDO IVA, y un plazo de ejecución de SIETE (7) MESES.

3. DATOS GENERALES

MES: OCTUBRE

Del: 01/10/2020. **Al**: 31/10/2020

Nombre del supervisor: ING. ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO.

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista.	CONSORCIO DE OBRAS SAN FRANCISCO.	**Contratista.**	GACPMF ARQUITECTOS SAS
Contrato N°	**N°20000584 H4 02 DE 2020**	**Contrato N°**	**N°20000644 H3 02 DE 2020**
Fecha de firma del contrato	17/06/2020	**Fecha de firma del contrato**	09/06/2020
Valor inicial	$347.309.851.76	**Valor inicial**	$ 77.158.410.00
Valor actualizado	$ 512.964.047.76	**Valor actualizado**	N/A
Plazo inicial		**Plazo inicial**	7 MESES
Plazo final	5 MESES	**Plazo final**	5 MESES
Fecha de iniciación	23/02/2021	**Fecha de iniciación**	23/07/2020
Fecha de terminación	23/12/2020	**Fecha de terminación**	31/12/2020

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

4.1. Cumplimiento de programación: actividades, presupuesto y balance.

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del **74.81%,** evidenciado en el avance de las actividades de limpieza, rocería, adecuación de secciones de cerramiento, proceso constructivo de mangaveleta e instalación de carpeta asfáltica.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del **74.81%**, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: **$ 383.730.490**,95 quedando pendiente por ejecutar un **25.19%** equivalente a **$ 129.233.556,81** para un total contractual de **$ 512.964.047,76**

4.2. planes de trabajo ejecutados y programados.

Ejecutado:

- Se realizó reunión entre las partes (constructor – interventoría) para la socialización de la metodología de trabajo, dicha reunión se realizó por medio de la plataforma virtual ZOOM.

Programado:

- Se tiene prevista reunión entre partes (constructor– interventoría) para verificar la ejecución de la obra de acuerdo a la programación.

4.3. cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la interventoría (llamados de atención contractual).

Durante este periodo la interventoría presento observaciones al residente de obra de la disposición de los materiales, así como la señalización de las áreas intervenidas.

4.4. informe de comités y avance de compromisos, planes de acción

La interventoría cito por medio de la plataforma ZOOM a las partes (supervisión – contratista de obra) a los siguientes comités:

- COMITÉ N° 3 – 02 octubre de 2020
- COMITÉ N° 4 – 08 octubre de 2020

4.5. acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Posterior al comité N° 4 de contratista, se especificaron las fechas de pagos y se informó que el avance del contrato está de acuerdo a lo programado.

4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

A la fecha el constructor ha cumplido de manera paulatina con los requerimientos de la interventoría.


5. CONTROL DE PROGRAMACION

5.1. Avance de actividades de las obras

Según la programación presentada por el contratista, el contrato a este mes tiene una ejecución del **74.81%,** evidenciado en el avance de las actividades de limpieza, rocería, desmonte de cerramiento existente, concreto ciclópeo.

Teniendo en cuenta la ejecución actual del contrato del **74.81%**, se ha ejecutado una inversión de obra a la fecha de: **$ 383.730.490,95**, quedando pendiente por ejecutar un **25.19%** equivalente a **$ 129.233.556,81** para un total contractual de **$ 512.964.047,76**

5.2. Grafica de avance físico del contrato de obra

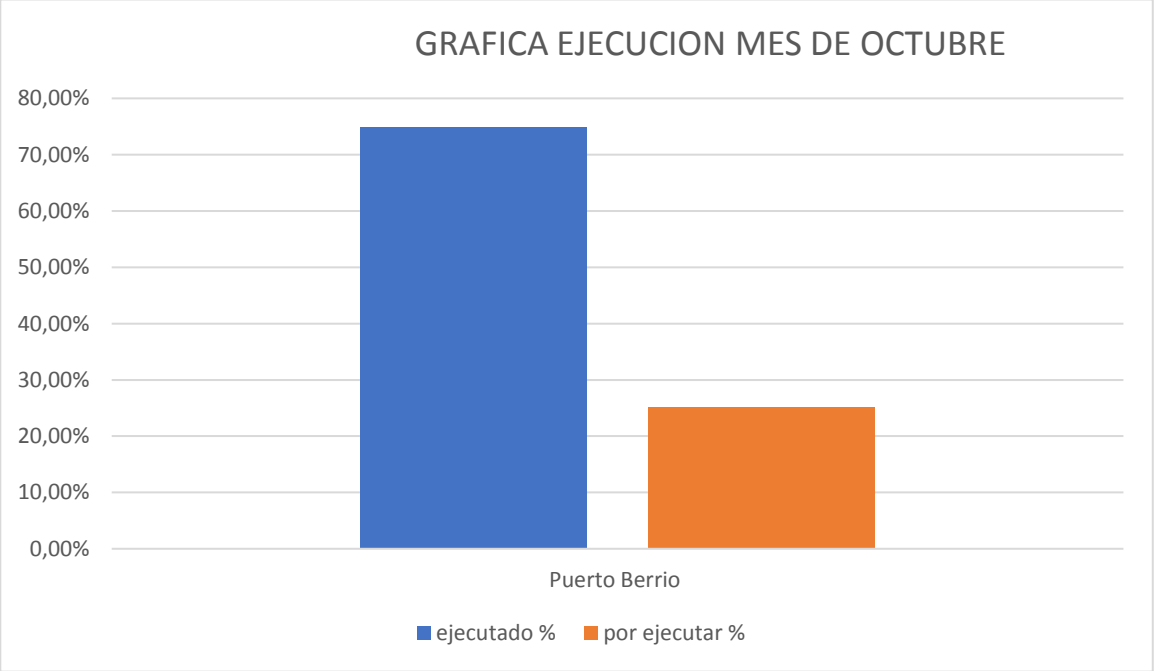

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo

El Constructor durante el presente periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020, ejecutando las siguientes actividades.

- Mantenimiento de zonas verdes, 1. Rocería zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consiste en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base de cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye cargue disposición de material sobrante al botadero autorizado.

- Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros. E=20 cm.

- Entresuelo en piedra, E=10 cm. Incluye recebo compactado en arenilla E=5 cm, Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.

- Construcción de señalización de mangaveletas en concreto ciclópeo, forma: (anillo circular) donde su radio mayor es 7,5 m y su radio menor es 6m, espesor e=0.07 m, ancho =1.50 m. juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco. Para demarcación de mangaveletas.

- Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 13 mt). Incluye construccion , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2” cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2” de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8” , pisa malla en platina de ½” x 1/8” , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8” con marco en angulo de 11/2” x 1/8” , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

- Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 7,5 mt). Incluye construccion , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2” cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2” de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8” , pisa malla en platina de ½” x 1/8” , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8” con marco en ángulo de 11/2” x 1/8” , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

- Localización replanteo. Con equipo de precisión en la pista para instalación de carpeta.

- Suministro, colocación y compactación de súbase granular estabilizada con cemento, con materiales de la zona mejorada en sitio con equipo, espesor 30 cms (incluye excavación y retiro de material existente).

- Suministro y aplicación de imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica.

- Suministro e instalación de geotextil tipo NT -2500 o similar.

- Suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla densa en caliente Norma P-401 FAA.

- Demolición de placa en concreto anillo perimetral-mangaveleta.

5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento

Durante la ejecución del contrato, no se presentaron acciones preventivas y/o correctivas.

5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Durante este periodo no se realizaron actas de liberación de obra.

5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo.
• Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento).Consiste en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye aplicación de matamalezas (combatram, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base de cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida quimico.Incluye cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado.
• Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.
• Resane y Koraza sobre muros exterior (tres manos o las necesarias para un correcto acabado).
• Muro divisorio (bloque Nº4).
• Enchape piso en cerámica.
• Enchape muro en cerámica.
• Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC – PRESION , con un DIAMETRO DE ½",RDE 11100 PSI ,Incluye todos los accesorios de PVC de diámetro ½" que se requieran para su correcta instalación.
• Suministro,transporte e instalación de TUBERIA PVC-SANITARIA,con un DIAMETRO de 4"
• Punto Hidraulico de ½"
• Punto Sanitario de 4"
• Demolición de Losa de piso
• Relleno
• Pañete liso impermeabilizado muros 1:4(incluye filos y dilataciones)
• Punto eléctrico.
• Construcción de viga y columneta en concreto reforzado de 12cmx20cm para confinar muros de mampostería.
• Conexión a caja existente de aguas negras.
• Suministro e instalación de caja de inspección de 60x60
• Acometida parcial 2Nº 10+1Nº 12 con tubería EMT ¾" incluye todos los accesorios.

• Adecuación de rejilla de cárcamo existente, incluye fijación y cinta en concreto perimetral.
• Suministro e instalación de malla tipo angeo con marco en aluminio , superpuesta a la ventaneria y puerta existente.

6. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.


6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION		
VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCION + IVA	**$ 512.964.047,76**	100%
VALOR PROGRAMADO AGOSTO	**$ 33.759.029.08**	9.72%
VALOR EJECUTADO AGOSTO	**$ 33.759.029.08**	9.72%
VALOR PROGRAMADO SEPTIEMBRE	**$210.418.830.00**	60.59%
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE	**$210.418.830.00**	60.59%
VALOR PROGRAMADO OCTUBRE	**$139.552.631.00**	27.21%
VALOR EJECUTADO OCTUBRE	**$139.552.631.00**	27.21%
TOTAL PROGRAMADO	**$383.730.490.95**	74.81%
TOTAL EJECUTADO	**$383.730.490.95**	74.81%

CONTROL DE COBROS Y PAGOS CONSTRUCCION			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1	9.72%	**$ 33.759.029.08**	**$ 33.759.029.08**
PAGO N° 2	60.59%	**$210.418.830.00**	**$210.418.830.00**
PAGO Nº 3	27.21%	**$139.552.631.00**	-

6.2. Soporte de las actas de pago.

6.3. Grafica presupuestal.

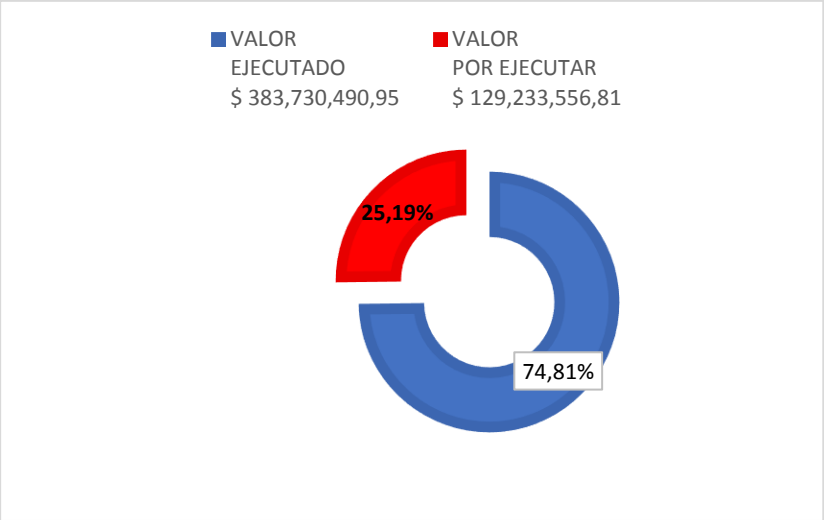

6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos INTERVENTORÍA.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.016.696,00			
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	CIMITARRA	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.002.385,14	40%	$ 4.409.052,00
					$ 4.400.954,06
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%	
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807
	CIMITARRA	$ 38.508.348	11,95%	$ 23.105.008,80	$ 2.761.049
		$ 77.016.696	21,67%	$ 46.210.017,60	

TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.006.855
TOTAL	$ 9.415.907,41

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.158.410,00							
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**		**ACTA2**	**SALDO RP**	
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		
	CIMITARRA	$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		
		$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00				
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%		**% ACTA 2**			**%ACUMULADO**
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807	60,59 %	$ 13.999.325	$ 17.862.262	70%
	CIMITARRA	$ 38.650.062	11,95%	$ 23.190.037,20	$ 2.771.209	8%	$ 1.767.081	$ 29.694.622	20%
		$ 77.158.410	21,67%	$ 46.295.046,00					
	+			TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.017.016		$ 15.766.406		
				TOTAL	$ 9.426.068,30		$ 20.175.457,67		

VALOR DE CONTRATO	$ 77.158.410,00	$ 77.158.410,00									
PLAZO MESES	7				**ACTA 1**		**ACTA2**		**ACTA 3**	**SALDO RP**	
COSTOS FIJOS	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348,00	$ 5.501.192,57		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		$ 2.200.477,03		
	CIMITARRA	$ 38.650.062,00	$ 5.521.437,43		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		$ 2.208.574,97		
	PAGO BASICO	$ 11.022.630,000	$ 11.022.630,00	40%	$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		$ 4.409.052,00		
		$ 77.158.410,00			$ 4.409.052,00						
		VALOR RP	**% ACTA 1**	60%		**% ACTA 2**		**% ACTA 3**			**%ACUMULADO**
COSTOS POR AVANCE	PUERTO BERRIO	$ 38.508.348	9,72%	$ 23.105.008,80	$ 2.245.807	60,59%	$ 13.999.325	27,21%	$ 6.286.873	$ 9.374.912	98%
	CIMITARRA	$ 38.650.062	11,95%	$ 23.190.037,20	$ 2.771.209	7,62%	$ 1.767.081	18,33%	$ 4.250.734	$ 23.235.313	38%
		$ 77.158.410	21,67%	$ 46.295.046,00		68,21%		45,54%			
	+			TOTAL COSTO POR AVANCE	$ 5.017.016		$ 15.766.406		$ 10.537.607		
				TOTAL	$ 9.426.068,30		$ 20.175.457,67		$ 14.946.658,72		

CONTROL DE COBROS Y PAGOS INTERVENTORIA			
PAGOS CONTRATO	**% DE PAGO**	**VALOR FACTURA**	**VALOR PAGADO**
PAGO N° 1 PUERTO BERRIO FIJO	9.72% (40%)	$2.200.477,03	$2.200.477,03
PAGO N° 1 PUERTO BERRIO VARIABLE	9.72% (60%)	$ 2.245.807	$ 2.245.807
TOTAL PAGO N° 1 PUERTO BERRIO		$ 4.446.284,03	$ 4.446.284,03
PAGO N° 2 PUERTO BERRIO FIJO	60.59% (40%)	$2.200.477,03	$2.200.477,03
PAGO N° 2 PUERTO BERRIO VARIABLE	60.59% (60%)	$ 13.999.325	$ 13.999.325
TOTAL PAGO N° 2 PUERTO BERRIO		$ 16.199.802.03	$ 16.199.802.03
PAGO N° 3 PUERTO BERRIO FIJO	27.21% (40%)	$2.200.477,03	$2.200.477,03
PAGO N° 3 PUERTO BERRIO VARIABLE	27.21% (60%)	$ 6.286.873	
TOTAL PAGO N° 3 PUERTO BERRIO		$ 8.487.350.03	

7. FORMATOS DE CONTROL.

7.1. Relación de personal en obra de obra e INTERVENTORÍA.

PROFESIONALES CONSULTOR			
N°	**CARGO**	**PROFESION**	**NOMBRE PROFESIONAL**
1.	Director de obra	Ingeniero	Gustavo de Jesus López
2.	Residente de obra	Ingeniero	Marcela Zambrano

PROFESIONALES INTERVENTORIA			
N°	**CARGO**	**PROFESION**	**NOMBRE PROFESIONAL**
1.	Representante legal	Arquitecta	Patricia Molina Fonseca
2.	Director de Interventoría	Arquitecta	Patricia Molina Fonseca
3.	Residente de interventoría	Ingeniera	Silvia Ayala
4.	Auxiliar residente de obra	Tecnóloga	Ledys López
5.	Profesional de apoyo	Ingeniera	Alejandra Sánchez
6.	Secretaria	Bachiller	Yeimi Vargas

7.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

EQUIPO	HORARIO TRABAJADO	DIAS
MEZCLADORA DE CONCRETO	9:00 am -12:00 / 13:00 pm- 16.30 pm	24 días
MEZCLADORA ASFALTICA FINISHER	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día
RODILLO COMPACTADOR	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día
COMPACTADOR NEUMATICO	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día
MAQUINARIA PARA IMPRIMACION DE ASFALTO	9:00 am – 12:00 / 13:00 pm – 15:00 pm	1 día

7.3. Control climatológico y de horas trabajadas.

FECHA	HORA -LLUVIAS	TOTAL HORAS REGISTRADAS
JUEVES 01/10/2020	06:00 AM – 10:00 AM	4:00 HORAS
MARTES 13/10/2020	12:00 PM – 3:30 AM	3:30 HORAS
MARTES 20/10/2020	06:00 AM – 2:00 PM	08:00 HORAS
VIERNES 23/10/2020	07:00 AM – 11:30 AM	04:30 HORAS
TOTAL DE HORAS LLUVIAS MES DE OCTUBRE		**20 HORAS**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

- ITEM 1 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 1. ROCERIA ZONAS DE SEGURIDAD Y DEMAS AREAS DEL AEROPUERTO. DEBE INCLUIR LA LIMPIEZA DE LAS AREAS PERIMETRALES INTERNAS (DESDE LAS ZONAS DE SEGURIDAD HASTA EL CERRAMIENTO). CONSISTE EN DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS. INCLUYE APLICACIÓN DE MATAMALEZAS (COMBATRAN, RANDALL O SIMILAR) A TODAS LAS ZONAS DE SEGURIDAD INCLUIDA LA BASE DEL CERRAMIENTO. 2. LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (MALLAS), RETIRANDO TODO ELEMENTO ORGANICO E INORGANICO. SE HARA ADEMAS LA FUMIGACION CON UN HERBICIDA QUIMICO. INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE AL BOTADERO AUTORIZADO.

En este periodo se ejecutó al 100 % la tercera ronda de mantenimiento de zonas verdes rocería. Esta actividad fue desarrollada con los implementos necesarios para la ejecución de la misma y la seguridad de los trabajadores. Su desarrollo fue dado en el corte de pasto, fumigación de las zonas, acopio de material sobrante y retiro del mismo.

1 ROCERIA



Mantenimiento zonas verdes , Rocería



Ejecución de Rocería zona oriental.



Limpieza material sobrante rocería.



Rocería zona occidental



Zona Norte-occidental antes de mantenimiento de zonas verdes.



Zona Norte-occidental con Rocería.



Proceso de ejecución de Rocería.



Ejecucion de Roceria en zona oriental.

- ITEM 10 Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros. E=20 cm

La excavación se llevó acabo en las dos mangaveletas existentes de acuerdo a las especificaciones para llevar acabo el mejoramiento de ese terreno y proceder a la construcción de la señalización de mangaveleta. Esta actividad se desarrolló al 100% durante este periodo.



Excavación de para entresuelo y mangaveleta.

- ITEM 11 Entresuelo en piedra, E=10 cm. Incluye recebo compactado en arenilla E=5 cm, Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.

Se llevó acabo el desarrollo de esta actividad al 100%. De acuerdo a las especificaciones técnicas para este ítem.





Instalación de entresuelo y compactación del mismo.






- ITEM 12 Construcción de señalización de mangaveletas en concreto ciclópeo, forma: (anillo circular) donde su radio mayor es 7,5 m y su radio menor es 6m, espesor e=0.07 m, ancho =1.50 m. juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco. Para demarcación de mangaveletas.

Se ejecutó al 100% esta actividad. Se desarrolló acorde a las especificaciones técnicas respectando las medidas impartidas por esta.






Proceso constructivo de señalización de mangaveletas.

- ITEM AD-02 Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 13 mt). Incluye construccion , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2" cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2" de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8" , pisa malla en platina de ½" x 1/8" , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8" con marco en angulo de 11/2" x 1/8" , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Se desarrolló el 100% de esta actividad acorde a las especificaciones.









Proceso de adecuación de cerramiento.

- ITEM AD-03 Cerramiento sección adecuación canal 1 (largo 7,5 mt). Incluye construcción , suministro e instalación de 6 pilotes en concreto reforzado diámetro 0.30 mt x largo 1.5 mt , con tubería galvanizada de 2" cal 16 que conforman (postes o parales, pie de apoyo, pie de amigo,viga interior y viga superior), cuerpo del cerramiento en malla eslabonada de 2" de hueco con recubrimiento en PVC , calibre 8" , pisa malla en platina de ½" x 1/8" , en la parte inferior en reja en varilla de 5/8" con marco en ángulo de 11/2" x 1/8" , cuatro hilos de alambre de púa , tapón galvanizados , pintura anticorrosivo y esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación

Se desarrolló al 100% esta actividad.









Proceso constructivo de adecuación de cerramiento en zona de canales

- ITEM AD-04 Localización replanteo. Con equipo de precisión en la pista para instalación de carpeta.



Replanteo de zona a intervenir con asfalto.

- ITEM AD-05 Suministro, colocación y compactación de súbase granular estabilizada con cemento, con materiales de la zona mejorada en sitio con equipo, espesor 30 cms (incluye excavación y retiro de material existente).

Se desarrolló al 100% esta actividad. Se llevó a cabo el retiro del material asfaltico y base en mal estado debido a las filtraciones de agua que se presentaban en ciertas zonas. Y a su vez se hizo el mejoramiento.









Mejoramiento de súbase en zona afectadas por filtraciones.

- ITEM AD-06 Suministro y aplicación de imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica.

Se llevó acabo la ejecución total de esta actividad.





Aplicación de imprimación.

- ITEM AD-07 Suministro e instalación de geo textil tipo NT -2500 o similar

Se ejecutó al 100% la instalación de geo malla en la zona de intervención para aplicación de carpeta de rodadura.







Instalación de Geo malla.

- ITEM AD-08 Suministro e instalación de carpeta de rodadura mezcla densa en caliente Norma P-401 FA

Se llevó a cabo el desarrollo de esta actividad al 100%. Se ejecutó de acuerdo a los lineamientos de las especificaciones y lo requerimientos de la misma.











Proceso de instalación de carpeta de rodadura en mezcla caliente.

- ITEM AD-46 Demolición de placa en concreto anillo perimetral- mangaveleta

Se ejecutó al 100% la ejecución de anillo de señalización de mangaveleta .







Registro de demolición de mangaveleta existente.

9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.


CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO NUMERO	FECHA	ASUNTO
OFC-AERO-001-20	07/07/2020	APERTURA DE CORREO OFICIAL DE OBRA PARA COMUNICACIONES Y MANEJO EXCLUSIVO DE AERONAUTICA
OFC-AERO-002-20	08/07/2020	AVAL DE INTERVENTORIA MUESTRA DE MALLA PARA CERRAMIENTO
OFC-AERO-003-20	23/07/2020	INVITACIÓN A REUNIÓN ETAPA PRE-CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-004-20	30/07/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA E INICIO DE ACTIVIDADES
OFC-AERO-005-20	05/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-006-20	13/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-007-20	13/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-008-20	14/08/2020	SOLICITUD Y APROBACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES
OFC-AERO-009-20	18/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-010-20	18/08/2020	OBSERVACIONES ITEM CONTRACTUAL
OFC-AERO-011-20	20/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-012-20	25/08/2020	SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA
OFC-AERO-013-20	28/08/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A LAS PROPUESTAS DE DISEÑOS PRESENTADAS PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-014-20	28/08/2020	SOLICITUD Y APROBACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES
OFC-AERO-015-20	28/08/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A LAS PROPUESTAS DE DISEÑOS PRESENTADAS PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-016-20	28/08/2020	SOLICITUD NOTAM
OFC-AERO-017-20	02/09/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A COTIZACION DE CARPETA ASFALTICA
OFC-AERO-018-20	02/09/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 1 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-019-20	02/09/2020	SOCIALIZACION DE RESPUESTA SUPERVISION A OFC-AERO-015-20 AVAL DE INTERVENTORIA A LAS PROPUESTAS DE DISEÑOS PRESENTADAS PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-020-20	14/09/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 2 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-021-20	15/09/2020	SOLICITUD NOTAM
OFC-AERO-022-20	22/09/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A EL ACTA DE COMPENSACION MAYORES Y MENORES PRESENTADA PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-023-20	25/09/2020	AVAL DE INTERVENTORIA A EL ACTA DE COMPENSACION MAYORES Y MENORES PRESENTADA PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-024-20	01/10/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 3 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
OFC-AERO-025-20	07/10/2020	INVITACIÓN A COMITÉ N° 4 SEGUIMIENTO DE OBRA ETAPA CONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM

OFC-AERO-026-20	19/10/2020	SOLICITUD DE ADICION A INTERVENTORIA DE ACUERDO A EL ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES PRESENTADA PARA EL AEROPUERTO PUERTO BERRIO
OFC-AERO-027-20	14/10/2020	SOLICITUD Y APROBACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES

10. COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA.

Se anexa copia del libro de obra, para evidenciar su diligenciamiento, donde se puede constatar que la Interventoría ha recomendado su diligenciamiento riguroso.

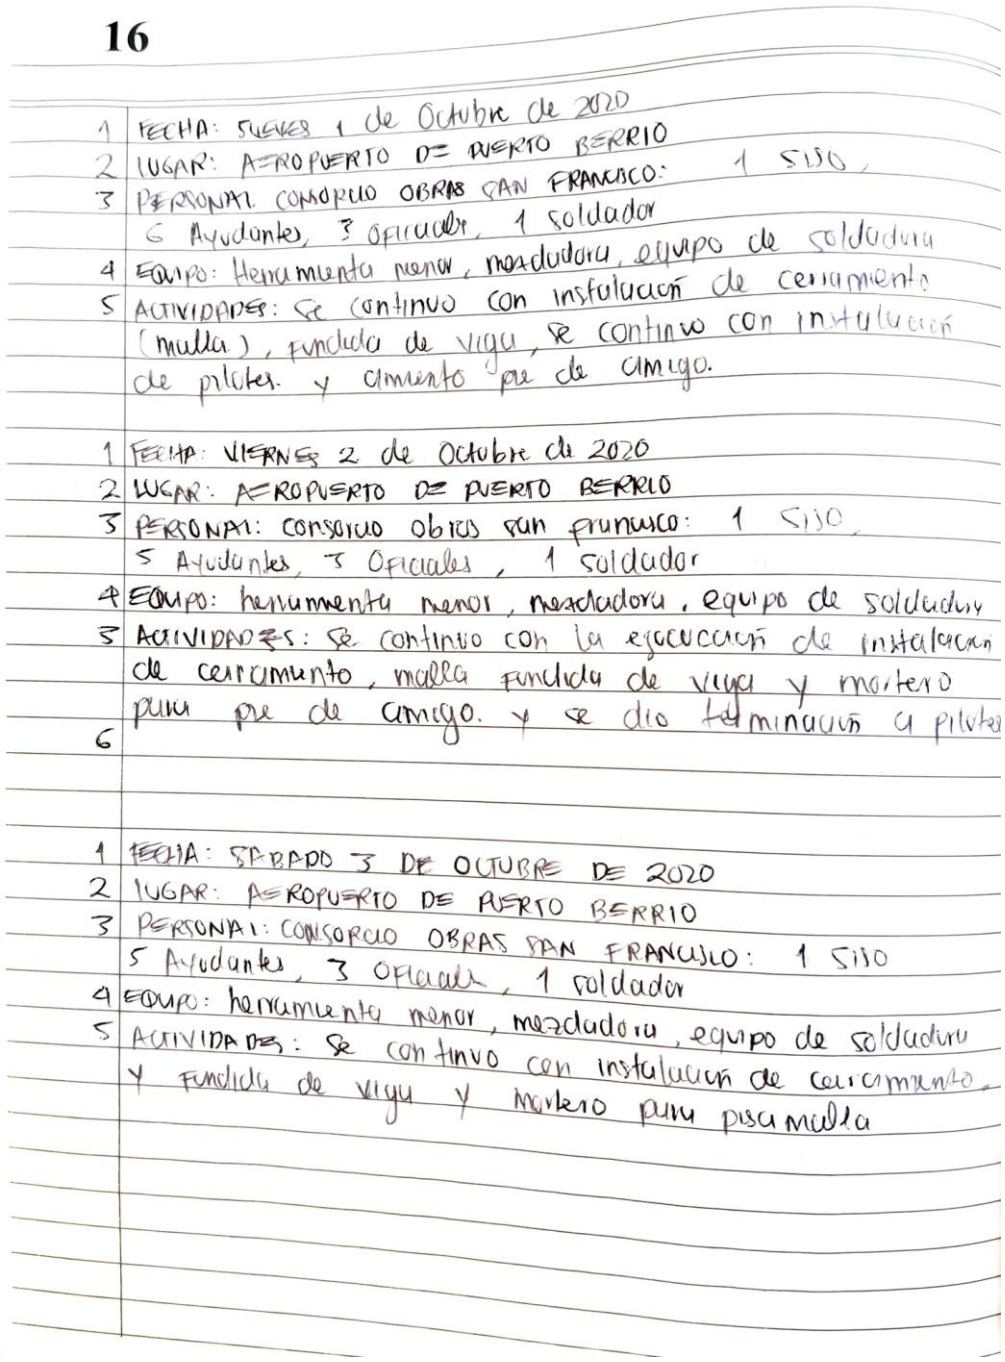

16

1 FECHA: JUEVES 1 de Octubre de 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
5 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento (malla), fundida de viga, se continuo con instalacion de pilotes. y almuerzo por de amigo.

1 FECHA: VIERNES 2 de Octubre de 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: consorcio obras san francisco: 1 SISO,
5 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 soldador
4 EQUIPO: herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la ejecucion de instalacion de cerramiento, malla fundida de viga y mortero para por de amigo. y se dio terminacion a pilotes
6

1 FECHA: SABADO 3 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
5 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 soldador
4 EQUIPO: herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento. y fundida de viga y mortero para pisa malla

17

1 FECHA: DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
2 OFICIALES, 2 Ayudantes, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento y fundida de viga y mortero puzolanico para pañete.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
5 Ayudantes, 3 OFICIALES, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento fundida de viga
6 OBSERVACIONES: Se realizo una socialización con el administrador Cairo Barrientos y el director de obra y representante legal Arq Gustavo lopez donde se dio a conocer los adicionales que se tienen contemplados en el contrato actual. Con el fin de consolidar los mismos y realizar las respectivas mejoras de acuerdo con los tres pilares administración de aeropuerto, Director de obra del contratista e interventoria.

1 FECHA: MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
6 Ayudantes, 3 OFICIALES, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de malla y cimbrado y fundida de viga.

18

1 FECHA: 7 OCTUBRE DE 2020 - MIERCOLES
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: 1 SISO, 2 OFICIALES, 6 Ayudantes, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, equipo soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento y viga de amarre
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: 8 OCTUBRE DE 2020 - JUEVES
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 1 Soldador, 4 Ayudantes, 3 OFICIALES
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento y viga de amarre.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: VIERNES 9 OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 3 OFICIALES, 7 Ayudantes, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, mezclador, equipo soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con instalacion de cerramiento y viga de amarre y mortero para pie de amigo.
6 OBSERVACIONES:

19

FECHA: SABADO 10 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 3 OFICIALES, 1 SOLDADOR, 7 AYUDANTES
EQUIPO: Herramienta menor, motosoldadora, equipo soldadura
ACTIVIDADES: Se dio terminación a viga de amarre de todo el cerramiento y al muro de pie de amigo y se continuo con la instalación de cerramiento.
OBSERVACIONES:


FECHA: LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 1 SOLDADOR, 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL
EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento (instalación de alambron parte superior y alambre de puas)
OBSERVACIONES

FECHA: MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 7 AYUDANTES, 1 SOLDADOR, 1 OFICIAL
EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
ACTIVIDADES: Se continuo con instalación de cerramiento

20

1 FECHA: MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
7 Ayudantes, 1 Soldador, 1 OFICIAL
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo desarrollando la actividad de instalacion de cerramiento.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
7 Ayudantes, 1 Soldador, 2 OFICIALES.
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la actividad de cerramiento y se inicio con la adecuacion de canales (pilotes). y se inicio con limpieza y excavacion para mangavieleta.

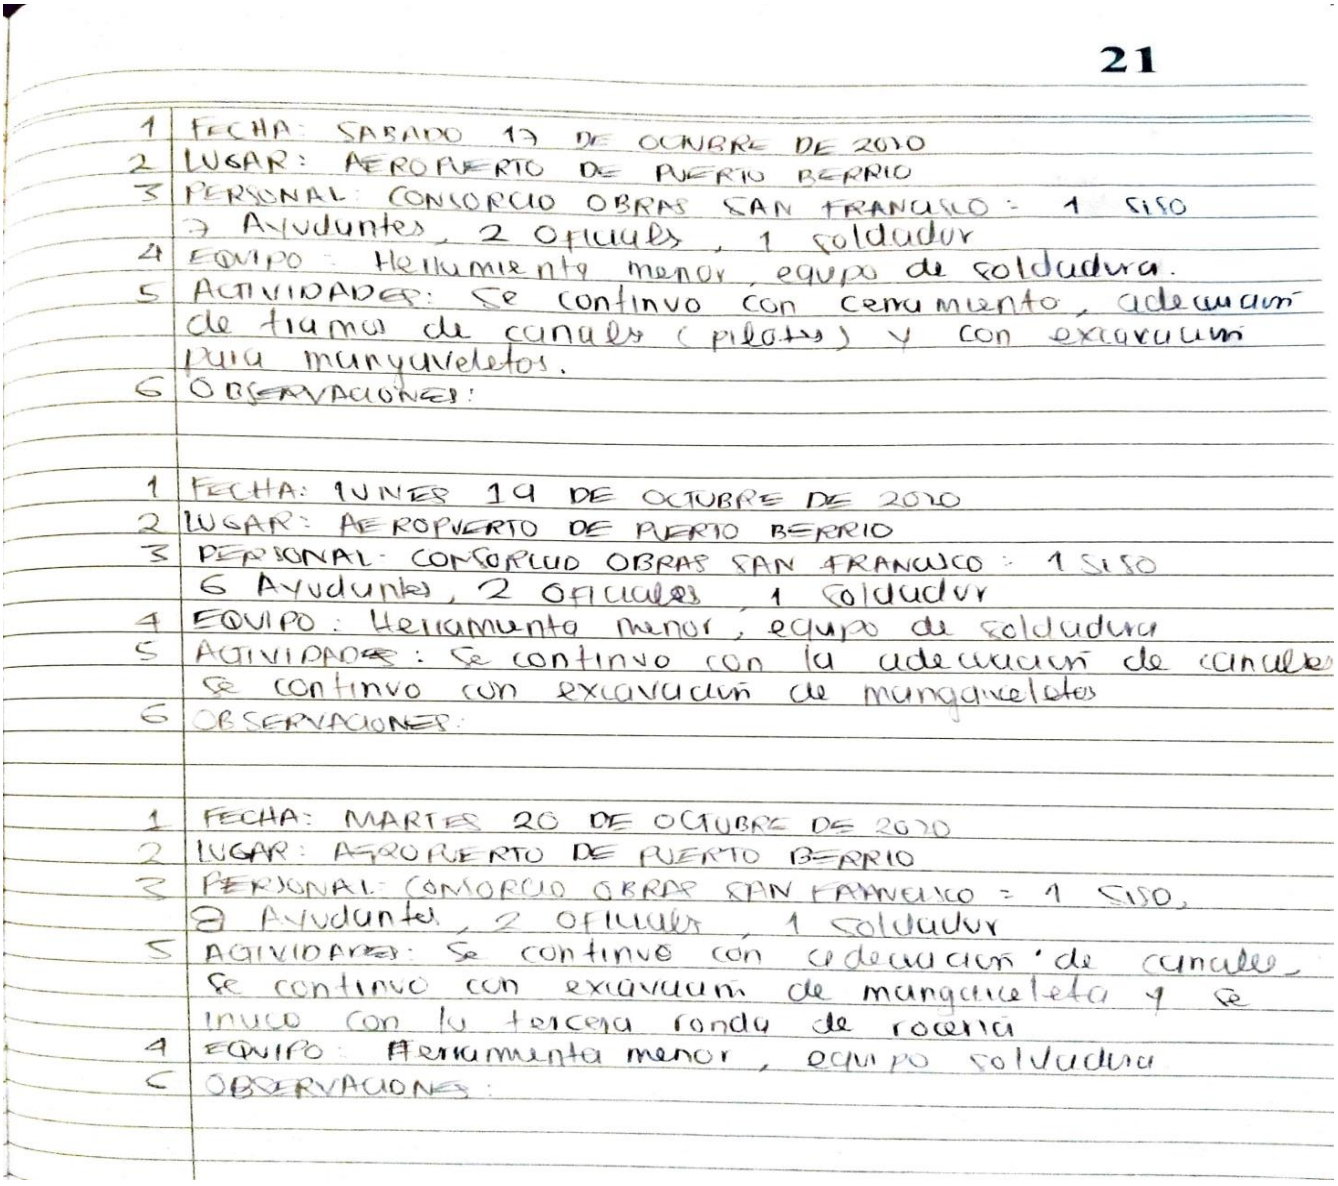

21

1 FECHA: SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO = 1 SISO
7 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con cerramiento, adecuacion de franja de canales (pilotes) y con excavacion para manguiveletas.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO = 1 SISO
6 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuacion de canales
Se continuo con excavacion de manguiveletas
6 OBSERVACIONES:


1 FECHA: MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO = 1 SISO,
8 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Soldador
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de canales,
Se continuo con excavacion de manguiveleta y se inicio con la tercera ronda de roseria
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo soldadura
6 OBSERVACIONES:

22

1 FECHA: MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 8 Ayudantes, 1 Soldador, 2 Oficiales
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de canals, excavacion de mangueletas y con rocetta.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 8 Ayudantes, 1 Soldador, 2 OFICIALES.
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura, motoniveladora asfaltica Finisher, Rodillo compactador, Compactador neumatico, maquinaria para imprimacion de asfalto
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuacion de canals excavacion de mangueleta, rocetta y se nevo acabo la actividad instalacion de asfalto en la zona cabecera de la pista.

1 FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO, 2 OFICIALES, 9 AYUDANTES, 1 SOLDADOR
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuacion de canals actividades para construccion de mangueletes, rocetta

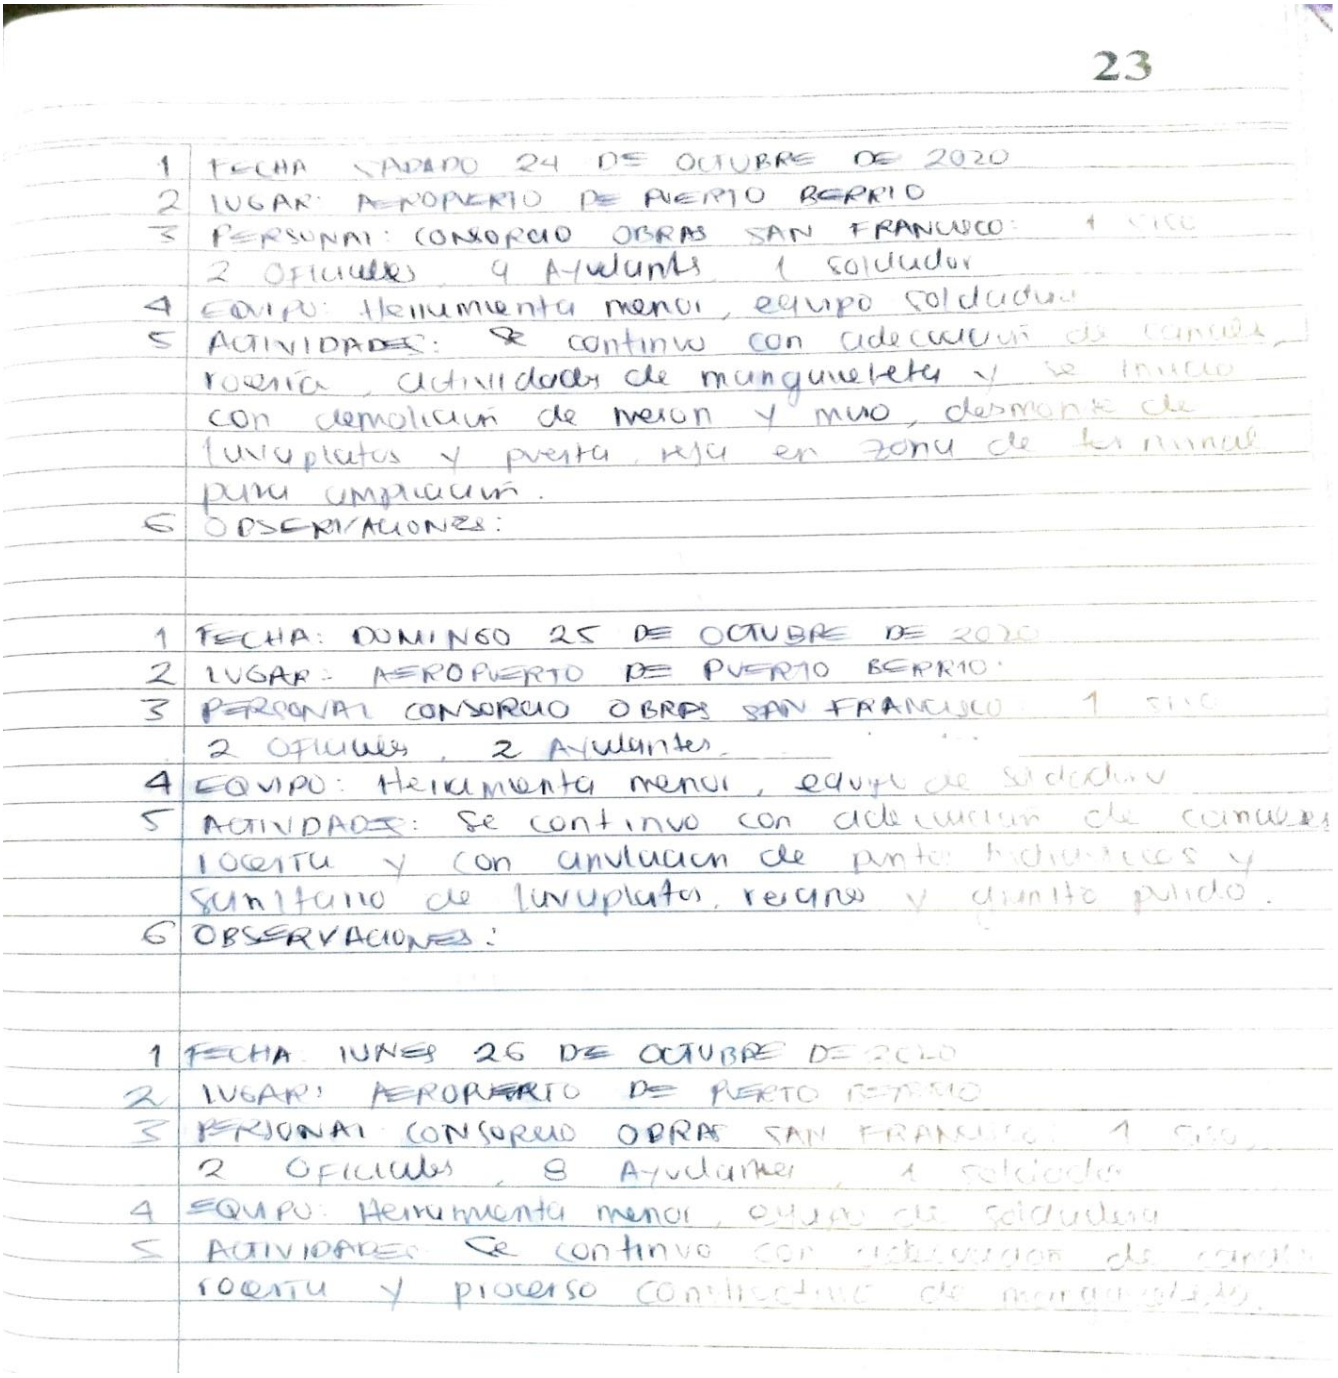


23

1 FECHA SABADO 24 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
2 OFICIALES, 4 AYUDANTES, 1 SOLDADOR
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continua con adecuación de cunetas, roseta, actividades de manguetera y se inicia con demolición de muro y muro, desmonte de luminarias y puesta hoja en zona de terminal para ampliación.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
2 OFICIALES, 2 AYUDANTES.
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continua con adecuación de cunetas roseta y con anulación de puntos hidráulicos y sanitarios de luminarias, recinto y demás pulido.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO,
2 OFICIALES, 8 AYUDANTES, 1 SOLDADOR
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continua con adecuación de cunetas roseta y proceso constructivo de manguetería.

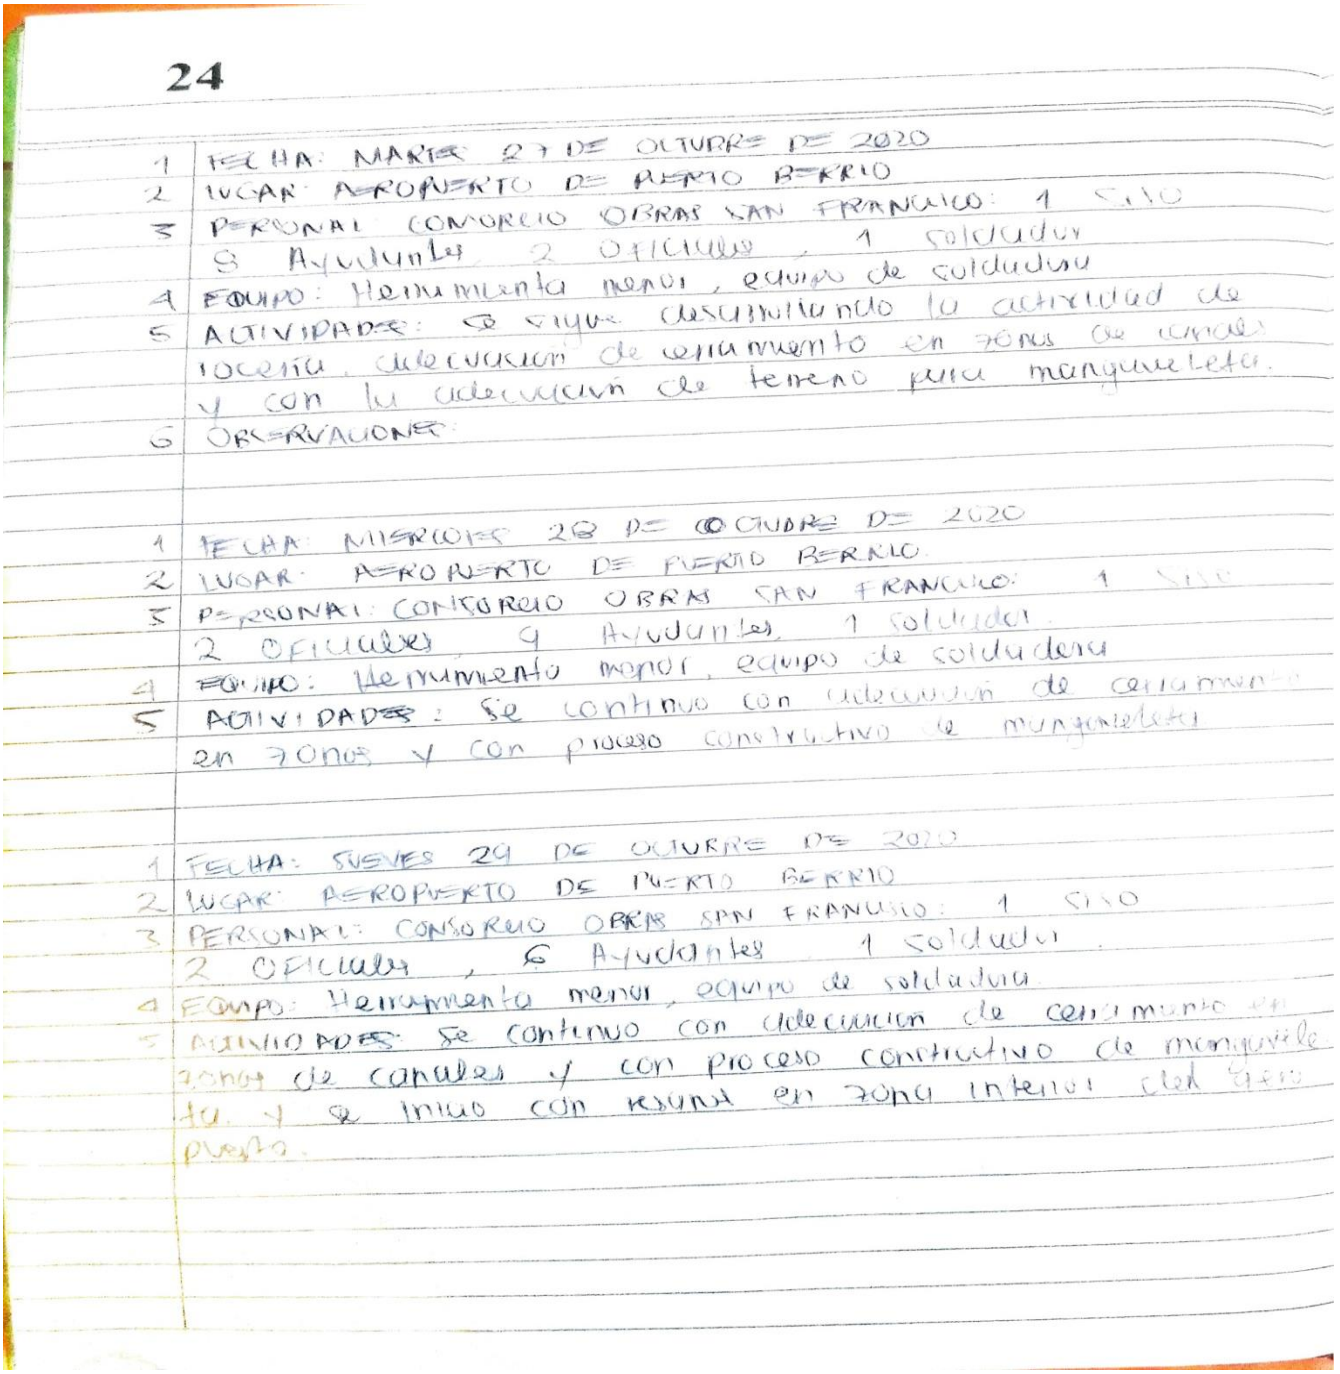


24

1 FECHA: MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 Sisso
8 Ayudantes 2 Oficiales 1 soldadura
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se sigue desarrollando la actividad de
hincada, adecuacion de cerramiento en zonas de canales
y con la adecuacion de terreno para manguerete.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 Sisso
2 Oficiales, 9 Ayudantes, 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de cerramiento
en zonas y con proceso constructivo de mangueretes

1 FECHA: JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 Sisso
2 Oficiales, 6 Ayudantes 1 soldador
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuacion de cerramiento en
zonas de canales y con proceso constructivo de manguerete
tu. y se inicio con resana en zona interior del tanque
puesto.

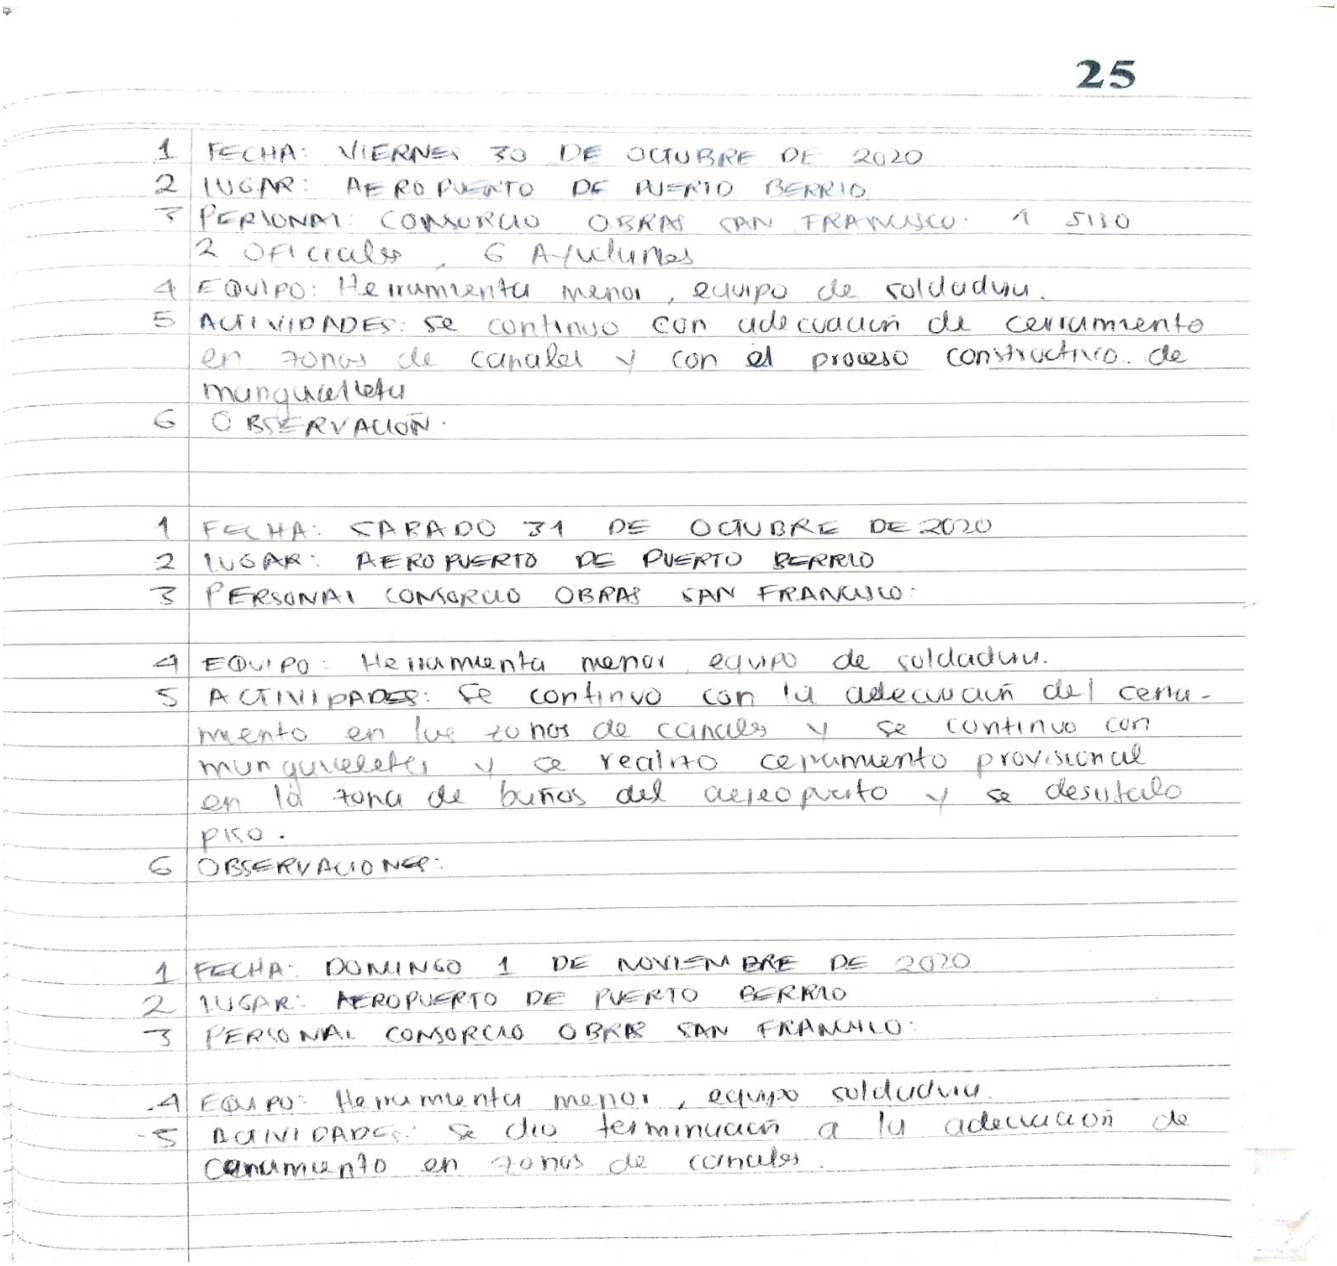

25

1 FECHA: VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO: 1 SISO
2 OFICIALES, 6 AYUDANTES
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con adecuación de cerramiento en zonas de canales y con el proceso constructivo de mangueteria
6 OBSERVACIÓN.

1 FECHA: SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO:
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo de soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se continuo con la adecuación del cerramiento en las zonas de canales y se continuo con mangueteria y se realizo cerramiento provisional en la zona de baños del aeropuerto y se desistalo piso.
6 OBSERVACIONES:

1 FECHA: DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020
2 LUGAR: AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
3 PERSONAL CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO:
4 EQUIPO: Herramienta menor, equipo soldadura.
5 ACTIVIDADES: Se dio terminación a la adecuación de cerramiento en zonas de canales.

Anexo físico Nº4 (COPIA DEL LIBRO DE OBRA)

11. CERTIFICACIONES.

- **Certificación aprobación de tercer corte de obra**

- **Certificación de parafiscales**

12. INFORME DE GESTIÓN SISOMA, PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO							REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CONTROL Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	CALIFICACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	CALIFICACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO				
Mantenimineto de zonas verdes	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

										ultravioletas	
Mantenimineto de zonas verdes	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Mantenimineto de zonas verdes	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Roceria	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Roceria	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza manual de cerramiento	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Limpieza manual de cerramiento	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Limpieza de canales de evacuacion de aguas	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Excavaciones	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Excavaciones	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Contruccion de vigas	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Contruccion de vigas	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

										jornada laboral	
Cimiento pedestales	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Cimiento pedestales	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso de camisa para rayos ultraviolet as	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal estado	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Desmonte del cerramiento en mal	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

Desmonte del cerramiento en mal	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Biologico	10	4	40	100	III	II	Normas asociadas a la pandemia del COVID 19	Protocolo de Bioseguridad, COVID 19	Soportes de toma de temperaturas, lavado de manos, aplicación de gel anti bacterial y alcohol	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Fisico	2	2	2	10	IV	IV	GTC 45	Procedimientos en SST	Uso constante de EPP y camisa manga larga para los rayos ultravioletas	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Biomecanico	2	2	2	10	IV	IV	GATISOS	Programa Osteomuscular	Tomar pausas activas y descansos prolongados durante la jornada laboral	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Fenomenos Naturales	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Plan de Emergencias	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Quimico	3	1	2	25	III	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia
Instalacion de cerramiento malla	Condiciones de seguridad	2	2	2	10	IV	IV	Decreto 1072 de 2015	Programa de orden y aseo	Jornadas de orden y aseo	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo / Gerencia

SEGUIMIENTO SST DEL PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO

ID PROYECTO: 20000584 H4 02 2020 Contratista: CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO Nit: 901384159-8 Periodo: 16/09/2020 -15/10/2020

Item	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO	CARGO	FECHA INGRESO	NUMERO TELEFONICO	INFORMACIÓN MEDICA BASICA				CONTACTO EMERGENCIA		APORTE A ENTIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ACTIVAS)			
							VACUNAS APLICADAS	GRUPO SANGUINEO Y RH	ALERGIAS Y/O CONDICIÓN MEDICA	MEDICAMENTOS	NOMBRE	NUMERO DE CONTACTO	ARL ACTIVA	EPS ACTIVA	AFP ACTIVO	FECHA MAXIMA PAGO
1	ALFONSO RAMOS	8.829.269	27/10/1978	OFICIAL	31/07/2020	3195750473	NO	A+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
2	JULIO CESAR UYOA	1.104.124.375	12/06/1984	AYUDANTE	31/07/2020	3175474581	NO	A+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
3	PAOLA CORREAL	1.050.554.430	26/01/1997	SST	31/07/2020	3183631471	NO	A+	NO	NO	PAULA RAMOS	3505953503	SURA			
4	SAMUEL BERONA	1.099.553.887	10/11/1995	AYUDANTE	05/08/2020	3013847229	NO	O+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
5	JHON SERNA	1.039.694.333	13/01/1992	AYUDANTE	07/08/2020	3122202942	NO	0+	NO	NO	ALBEIRO	3122202142	SURA			
6	SEBASTIAN GOMEZ	1.007.114.599	28/12/1992	AYUDANTE	10/08/2020	3146788932	NO	A+	NO	NO	NANCY	3215050629	SURA			
7	JESUS HINCAPIE	71.192.494	29/01/1981	GUADAÑADOR	11/08/2020	3148427592	NO	O+	NO	NO	TERESA HINCAPIE	3148271754	SURA			
8	MIGUEL BARAJAS	91.157.331	28/04/1976	OFICIAL	14/08/2020	3144450685	NO	O+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
9	RAFAEL CASTAÑEDA	850.006.814	27/07/1976	AYUDANTE	19/08/2020	3162733942	NO	A+	NO	NO	MARTA MARTINEZ	3162733942	SURA			
10	OSCAR MARULANDA	71.184.637	23/07/1965	AYUDANTE	19/08/2020	3135285869	NO	O+	NO	NO	EFERSON MARULANDA	3114393445	SURA			
11	FERNANDO RODRIGUEZ	1.039.700.618	18/01/1995	AYUDANTE	19/08/2020	3205446304	NO	O+	NO	NO	VANESSA	3116036045	SURA			
12	DANIEL RUIZ	984.804.494	04/07/1968	AYUDANTE	21/08/2020	3148427592	NO	A+	NO	NO	JESUS HINCAPIE	3148427592	SURA			
13	LUIS MIRA	711.884.919	09/06/1972	AYUDANTE	24/08/2020	3234730287	NO	O+	NO	NO	OLGA MIRA	3187504729	SURA			
14	YOVANI ACEVEDO	71.194.247	08/04/1984	AYUDANTE	27/08/2020	3166274562	NO	O+	NO	NO	YURANI	3142552883	SURA			
15	ORLY GARCIA	1.034.309.179	09/05/1983	OFICIAL	27/08/2009	3154844226	NO	O+	NO	NO	ERIKA	3223490925	SURA			
16	GABRIEL GARCIA	1.232.598.804	19/05/1993	OFICIAL	27/08/1998	3214494704	NO	A+	NO	NO	ERIKA	3223490925	SURA			
17	EDWIN FERREIRA	17.072.062	17/02/1884	AYUDANTE	27/08/1987	3223702714	NO		NO	NO	ROSA SANCHEZ	3223017143	SURA			
18	CRISTIAN MERCHAN	1.022.973.445	27/02/1992	OFICIAL	08/09/2020	3175168923	NO	O+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			
19	ALEXANDER NAJERA	91.444.494	27/08/1975	SOLDADOR	31/07/2020	3134685303	NO	A+	NO	NO	PAOLA CORREAL	3183631471	SURA			

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	05/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	**NOMBRE**	**CARGO**	**¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?**	**¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun pacientepositivo para COVID-19?**	**¿Esta teniendo escalofrios?**	**¿Tiene dolor de garganta?**	**¿Esta teniendo dolor de cabeza?**	**¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?**	**¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?**	**¿Esta teniendo tos?**	**¿Ha perdido el olfato?**	**¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)**	**¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)**	**¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?**	**¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?**	**¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?**	**RESULTADO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION**
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.022.973.445	CRISTIAN MERCHAN	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.157.331	MIGUEL BARAJAS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	JHON ANDRES SERNA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	12/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	**NOMBRE**	**CARGO**	**¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?**	**¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun pacientepositivo para COVID-19?**	**¿Esta teniendo escalofrios?**	**¿Tiene dolor de garganta?**	**¿Esta teniendo dolor de cabeza?**	**¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?**	**¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?**	**¿Esta teniendo tos?**	**¿Ha perdido el olfato?**	**¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)**	**¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)**	**¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?**	**¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?**	**¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?**	**RESULTADO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION**
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	LUIS MIRA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	19/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	NOMBRE	CARGO	¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?	¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun padentepositivo para COVID-19?	¿Esta teniendo escalofrios?	¿Tiene dolor de garganta?	¿Esta teniendo dolor de cabeza?	¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?	¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?	¿Esta teniendo tos?	¿Ha perdido el olfato?	¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)	¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)	¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?	¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?	¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?	RESULTADO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	LUIS MIRA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19
- SINTOMAS -

IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO		CONSORCIO OBRAS SAN FRANCISCO					FECHA:	26/10/2020	EJECUCION AL INGRESO O SALIDA			INGRESO		RESPONSABLE DE VERIFICAR Y DILIGENCIAR			ING. SILVIA AYALA	
CEDULA	NOMBRE	CARGO	¿Ha tenido fiebre mayor de 37.8°? o ¿Se identifica esto en la medicion de temperatura?	¿ Ha estado en contacto directo o cuidado a algun padentepositivo para COVID-19?	¿Esta teniendo escalofrios?	¿Tiene dolor de garganta?	¿Esta teniendo dolor de cabeza?	¿Esta teniendo dolor de cuerpo (malestar general)?	¿Convive o tiene contacto directo con trabajadores de la salud?	¿Esta teniendo tos?	¿Ha perdido el olfato?	¿Esta teniendo dificultades para respirar? (como si no entrara el aire al pecho)	¿Esta experimentando Fatiga? (Deterioro real de los movimienttos)	¿ Ha viajado los ultimos 14 dias?	¿Ha viajado o estado en un area afectada por COVID-19?	¿En este momento o en los dias previos ha tenido diarrea?	RESULTADO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACION
8.829.269	ALFONSO RAMOS	OFICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.050.554.430	PAOLA CORREAL	SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.099.553.887	SAMUEL BERONA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.007.114.599	SEBASTIAN GOMEZ	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
850.006.814	RAFAEL CASTAÑEDA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
71.194.247	YOVANI ACEVEDO	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
91.444.494	ALEXANDER NAJERA	SOLDADOR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	
1.039.694.333	LUIS MIRA	AYUDANTE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Alfonso Ramos Enciso
CEDULA	88242649
CARGO	Oficial.

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Alfonso Ramos

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Julio Cesa Uyoa
CEDULA	1041243375
CARGO	Guadañador

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Julio

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Paola Andrea Correal Ramos
CEDULA	1030554430
CARGO	SST

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Paola Correal.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Alexander Najera.
CEDULA	91444494
CARGO	Soldador

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID 19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Sandra Barona
CEDULA	1.097552388
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID 19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Jhon Andres Serna Echavarría
CEDULA	1039694333
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

Serna

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Sebastian Gomez Gaviria
CEDULA	1002114599
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Sebastian Gomez Gaviria
FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Jesus Alberto Hincapie.
CEDULA	71192 044
CARGO	Guadañador.

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Jesus Alberto Hincapie
FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Cristian Felipe Merchan Perez.
CEDULA	1022975495
CARGO	Oficial

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos apartados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

Cristian Merchan

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID 19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Miguel M. Bargas Carrillo
CEDULA	91151331
CARGO	Oficial

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?			
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos apartados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS

Miguel Bargas

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Daniel Rafael Castañeda
CEDULA	9500068
CARGO	Ayudante.

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Daniel Castañeda

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Oscar de Jesus Morokunda
CEDULA	71184637
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermeda d inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que los respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Fernando Esteban Rodriguez
CEDULA	1039700618
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Fernando Rodriguez

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA UNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Daniel de Jesus Ruiz
CEDULA	98480 944
CARGO	Guadañador

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud publica emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

Daniel Ruiz

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Luis Fernando Mira
CEDULA	7188491
CARGO	Guardañador

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

•Luis Fernando Mira

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	YOVANI ACEVEDO
CEDULA	1194247
CARGO	AUXILIAR

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID 19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud publica, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

. Yovani Acevedo

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Gabriel García
CEDULA	1232598800
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Orly García
CEDULA	1034349174
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	RESULTADO SI	RESULTADO NO	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
¿Es mayor de 60 años?			
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?			
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?			
¿Padece una enfermedad cardiaca?			
¿Padece hipertensión arterial			
¿Padece una enfermedad renal?			
¿Padece de diabetes?			
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?			
¿Padece lupos?			
¿Padece cáncer?			
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?			
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?			
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?			

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

GAC-PMF arquitectos S.A.S

CUESTIONARIO PREVENTIVO COVID-19 - SUSCEPTIBILIDAD

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON PLENA LIBERTAD, YA QUE TODOS SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE MANERA CONFIDENCIAL POR TODOS LOS ENCARGADOS DE SU RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO. LA INFORMACION RECOLECTADA SERÁ USADA ÚNICAMENTE PARA APLICAR POLÍTICAS DE CUIDADO DE PERSONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MANIFIESTA FRENTE AL CONTAGIO DE COVID-19 ASÍ COMO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN A ENTIDADES DE SALUD PUBLICA.

Puede consultar mayor información sobre nuestra política de protección de datos personales en la dirección web: http://gacpmfarquitectos.com

NOMBRE	Edwin Gregorio Ferreira
CEDULA – Permiso	17072062
CARGO	Ayudante

CUESTIONARIO	**RESULTADO**		**OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN**
	SI	**NO**	
¿Es mayor de 60 años?		X	
¿ Presume o ha confirmado su estado de embarazo?		X	
¿Padece una enfermedad pulmonar crónica?		X	
¿Padece una enfermedad cardiaca?		X	
¿Padece hipertensión arterial		X	
¿Padece una enfermedad renal?		X	
¿Padece de diabetes?		X	
¿Ha sido beneficiario de un trasplante de órganos?		X	
¿Padece lupos?		X	
¿Padece cáncer?		X	
¿Padece alguna otra enfermedad inmunosupresora?		X	
¿Padece algun tipo de alergia cutanea o enfermedad en la piel conocida ?		X	
¿Se compromete en atender todas las recomendaciones publicadas e impartidas para la prevención de contagio de COVID-19?	X		

El solicitante declara bajo su responsabilidad que las respuestas y datos aportados en este cuestionario de salud son veraces y completos. La firma de este documento acredita su responsabilidad legal frente a las medidas de salud pública emitidas por el gobierno nacional en base al riesgo inherente de su condición médica. La información que se recabe podrá ser cedida a los organismos de salud pública, entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales. LA NEGATIVA PARA LA CONTESTACIÓN DEL PRESENTE CUESTIONARIO TENDRÁ COMO MEDIDA PREVENTIVA POR PARTE DE GACPMF ARQUITECTOS S.A.S LA RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO AL CUAL PRETENDE INGRESAR DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DISPUESTAS PARA MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RESPIRATORIAS.

FIRMA DEL ENCUESTADO

13. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA

La interventoría, **al mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de cimitarra y puerto Berrio** se hará de manera presencial a través del personal asignado por el interventor. En esta, se debe

ofrecer además de la aplicación de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, objeto de interventoría.

La ejecución de la obra de **mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos de cimitarra**, se llevará a cabo considerando el presupuesto y los análisis de precios unitarios aprobados previamente por la AEROCIVIL, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de colaboración constante entre el interventor, contratante, contratista de obra, supervisor, personal profesional, técnico, administrativo y asesores para el control del presupuesto y de la programación de la obra.

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la interventoría debe cumplir durante la obra, estas se califican de la siguiente manera:

- Actividades Técnicas
- Actividades Administrativas y Financieras
- Actividades de Control

Las tres (3) actividades anteriores se deben cumplir en sus tres fases durante la ejecución del contrato de obra a intervenir:

- Preliminares e iniciación del contrato
- Desarrollo y ejecución de la obra
- Recibo de la Obra

13.1. Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes.

A. ACTIVIDADES TÉCNICAS

✓ Revisión, análisis de planos y especificaciones

✓ Programación y presupuesto

✓ Escogencia y coordinación de formatos

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

✓ Revisión de pólizas

✓ Revisión de reglamentos

- Seguridad de trabajo

- Salud ocupacional

C. ACTIVIDADES DE CONTROL

✓ Revisión y Control

- Análisis de precios unitarios
- Presupuesto y cantidades de obra
- Escogencia y coordinación de formatos

No siendo más se da por terminado el **INFORME MENSUAL N° 03 - 2020 DE LA INTERVENTORÍA** la entrega de anexos complementarios a este informe los cuales se incluirán en medio físico y digital, los originales permanecerán en custodia de la Interventoría, para ser incluidos en informe final de liquidación.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios para proceder.

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3	**GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S** ING. SILVIA NATHALIA AYALA PARRA RESIDENTE DE OBRA
