BALANCE DE OBRA							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES							
CONTRATO No.	00-133-2020	**OBJETO:**	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS				
CONTRATISTA	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	**FECHA ACTA DE INICIO**	11/08/2020	**VALOR DEL CONTRATO**	844464650		
SUPERVISOR:	EMPERATRIZ BONILLA V			**VALOR ADICIONAL**	0	**MES**	ABRIL
SUPERVISOR SECCIONAL:	PABLO ANTONIO HERNANDEZ CORREDOR			**VALOR TOTAL**	844464650	**FECHA**	3/05/2021
APOYO A LA SUPERVISION:	ANDRÉS ALBERTO RUIZ T	**APOYO A LA SUPERVISION:**	JAVIER GALEANO FERNÁNDEZ				

OBRA CONTRATADA						OBRA A EJECUTAR						FACTURACIONES									
Item.	PRESUPUESTO CONTRACTUAL									CONDICIONES ACTUALIZADAS		FACTURA #1		FACTURA #2		FACTURA #3		FACTURA #4		FACTURA #5	
	Actividad	Unidad	Canti dad	Vr.Unitario	Vr.Total	MAYO RES (+)	VR. TOTAL	MENORES (-)	VR. TOTAL	Canti dad	Vr. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES																					
1.1	DESMONTE DE MESONES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	ML	10,50	13.744,00	$ 144.312			5,67	$ 77.928	4,83	$ 66.383,52	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,93	$ 40.270	0,00	$ 0,00	1,90	$ 26.113,60
1.2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MURO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	20,00	4.761,00	$ 95.220	98,40	$ 468.469			118,40	$ 563.688,59	73,77	$ 351.218,97	0,00	$ 0,00	17,18	$ 81.801	0,00	$ 0,00	27,45	$ 130.668,45
1.3	DESMONTE DE VIDRIOS Y ESPEJOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	M2	20,00	10.103,00	$ 202.060			15,20	$ 153.566	4,80	$ 48.494,40	2,31	$ 23.337,93	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	2,49	$ 25.156,47
1.4	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	UND	100,00	4.740,00	$ 474.000	37,00	$ 175.380			137,00	$ 649.380,00	60,00	$ 284.400,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 189.600	37,00	$ 175.380,00	0,00	$ 0,00
1.5	CANCELACION DE PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS--	UND	69,00	17.344,00	$ 1.196.736	4,00	$ 69.376			73,00	$ 1.266.112,00	33,00	$ 572.352,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 572.352	0,00	$ 0,00	7,00	$ 121.408,00
1.6	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	M2	42,00	12.469,00	$ 523.698			5,67	$ 70.699	36,33	$ 452.998,77	27,20	$ 339.156,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	8,00	$ 99.752,00	1,13	$ 14.089,97
1.7	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA INCLUYE TUBERIA, CABLES, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONAL RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	UND	100,00	7.710,00	$ 771.000	12,00	$ 92.520			112,00	$ 863.520,00	61,00	$ 470.310,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 393.210	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN PISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	28,00	6.542,00	$ 183.176	70,72	$ 462.670			98,72	$ 645.845,87	59,93	$ 392.062,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	21,34	$ 139.606,28	17,45	$ 114.177,53
1.9	DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O ALUMINIO INCLUYE VIDRIOS RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	M2	60,00	10.103,00	$ 606.180	9,33	$ 94.286			69,33	$ 700.466,25	45,12	$ 455.847,36	0,00	$ 0,00	14,31	$ 144.528	0,00	$ 0,00	9,91	$ 100.090,42
1.10	DESMONTE DE PASAMANOS METALICOS YO MADERA EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	ML	10,00	7.764,00	$ 77.640			3,10	$ 24.068	6,90	$ 53.571,60	6,90	$ 53.571,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	PASE MURO(PERFORACION 6") A ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RESANE--	UND	15,00	48.619,00	$ 729.285	2,00	$ 97.238			17,00	$ 826.523,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 194.476,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	13,00	$ 632.047,00
1.12	DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA --	M2	750,00	19.787,00	$ 14.840.250	25,53	$ 505.162			775,53	$ 15.345.412,11	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	775,53	$ 15.345.412	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	DEMOLICIÓN DE PAÑETE BAJO PLACA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	252,00	10.253,00	$ 2.583.756			1,88	$ 19.276	250,12	$ 2.564.480,36	0,00	$ 0,00	126,00	$ 1.291.878,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	124,12	$ 1.272.602,36
1.14	DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN MADERA, VIDRIO, PANELERIA PISO TECHO INCLUYE PUERTAS RETIRO Y DISPOSICION	M2	26,00	19.006,00	$ 494.156	9,32	$ 177.136			35,32	$ 671.291,92	22,35	$ 424.784,10	0,00	$ 0,00	11,37	$ 216.079	1,60	$ 30.409,60	0,00	$ 19,01
1.15	-LIMPIEZA DE PLACA Y CASETONES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	250,00	4.989,00	$ 1.247.250			250,00	$ 1.247.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.16	DEMOLICIÓN MUROS 0.23 A 0.35 CMS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)--	M2	94,00	22.696,00	$ 2.133.424			0,90	$ 20.381	93,10	$ 2.113.042,99	64,32	$ 1.459.806,72	0,00	$ 0,00	17,99	$ 408.301	0,00	$ 0,00	10,79	$ 244.935,23
1.17	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO, INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL--	ML	20,00	8.167,00	$ 163.340	66,00	$ 539.022			86,00	$ 702.362,00	18,00	$ 147.006,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	4,00	$ 32.668,00	64,00	$ 522.688,00
1.18	DESMONTE DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO SENCILLOS O DOBLES. INCLUYE CABLEADO UTP, TOMAS REGULADOS, NO REGULADOS, CANALETAS Y DEMAS ACCESORIOS--	UND	25,00	22.504,00	$ 562.600	105,00	$ 2.362.920			130,00	$ 2.925.520,00	57,00	$ 1.282.728,00	0,00	$ 0,00	63,00	$ 1.417.752	0,00	$ 0,00	10,00	$ 225.040,00
1.19	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	750,00	9.151,00	$ 6.863.250			229,55	$ 2.100.566	520,46	$ 4.762.683,71	733,00	$ 6.707.683,00	0,00	$ 0,00	-356,18	-$ 3.259.403	0,00	$ 0,00	143,64	$ 1.314.403,89
1.20	LIMPIEZA DE CUBIERTA Y MUROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA--	M2	50,00	4.676,00	$ 233.800	678,75	$ 3.173.812			728,75	$ 3.407.612,09	0,00	$ 0,00	50,00	$ 233.800,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	678,75	$ 3.173.812,09
1.21	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y/O METALICA DE CUBIERTA EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	120,00	14.708,00	$ 1.764.960			59,78	$ 879.288	60,22	$ 885.671,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,70	$ 775.097	0,00	$ 0,00	7,52	$ 110.574,74
1.22	ESCARIFICACION DE PUNTOS DE FISURA EN FACHADA Y SELLO ELASTICO SIKA FLEX CONSTRUCTION O EQUIVALENTE	ML	50,00	11.847,00	$ 592.350					50,00	$ 592.350,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 592.350,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	M2	250,00	14.665,00	$ 3.666.250	26,52	$ 388.886			276,52	$ 4.055.136,47	233,00	$ 3.416.945,00	43,52	$ 638.191,47	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS	ML	300,00	13.908,00	$ 4.172.400			96,15	$ 1.337.254	203,85	$ 2.835.145,80	170,00	$ 2.364.360,00	80,00	$ 1.112.640,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	-46,15	-$ 641.854,20
1.25	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL-- ALTURAS MAYORES A 7 MTS	UND	25,00	10.069,00	$ 251.725					25,00	$ 251.725,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	25,00	$ 251.725,00
1.26	PASE MURO(PERFORACION 2") A ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RESANE--	UND	15,00	34.373,00	$ 515.595	21,00	$ 721.833			36,00	$ 1.237.428,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 206.238,00	0,00	$ 0	9,00	$ 309.357,00	21,00	$ 721.833,00
1.27	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMIENTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	11,00	38.092,00	$ 419.012	3,00	$ 114.276			14,00	$ 533.288,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 228.552	0,00	$ 0,00	8,00	$ 304.736,00
1.28	DEMOLICION DE MEDIACAÑA EN GRAVILLA ALTURA 60 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	180,00	4.761,00	$ 856.980			77,65	$ 369.692	102,35	$ 487.288,35	78,00	$ 371.358,00	22,00	$ 104.742,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	2,35	$ 11.188,35
1.29	DESMONTE DE CABALLETES ASBESTO CEMENTO EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	ML	110,00	10.973,00	$ 1.207.030					110,00	$ 1.207.030,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 1.207.030	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	MANTENIMIENTO DE FACHADA LADRILLO A LA VISTA INCLUYE ENBOQUILLADO , SELLADOR A LTURAS MAYORES A 20 METROS	M2	610,00	28.270,00	$ 17.244.700	118,75	$ 3.356.924			728,75	$ 20.601.623,98	0,00	$ 0,00	231,00	$ 6.530.370,00	422,22	$ 11.936.145	0,00	$ 0,00	75,53	$ 2.135.108,71
1.31	DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--	UND	4,00	68.841,00	$ 275.364					4,00	$ 275.364,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	4,00	$ 275.364,00
1.32	DEMOLICION DE CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	12,00	197.439,00	$ 2.369.268			10,60	$ 2.092.557	1,40	$ 276.710,76	4,20	$ 829.243,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	-2,80	-$ 552.533,04
1.33	DESMONTES DE TORRES DE COMUNICACIÓN ALTURAS HASTA 15 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL--	UND	2,00	806.818,00	$ 1.613.636					2,00	$ 1.613.636,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 806.818	1,00	$ 806.818,00	0,00	$ 0,00
1.34	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--	UND	22,00	28.601,00	$ 629.222	2,00	$ 57.202			24,00	$ 686.424,00	10,00	$ 286.010,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 228.808	0,00	$ 0,00	6,00	$ 171.606,00
1.35	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15	M2	35,00	42.337,00	$ 1.481.795			12,34	$ 522.439	22,66	$ 959.356,42	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	22,66	$ 959.356,42
1.36	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	2,00	53.667,00	$ 107.334			0,99	$ 53.238	1,01	$ 54.096,34	1,00	$ 53.667,00	1,00	$ 53.667,00	-1,00	-$ 53.667	0,00	$ 0,00	0,01	$ 429,34
1.37	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	0,50	78.708,00	$ 39.354			0,50	$ 39.354	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	REPLANTEO GENERAL (SIN COMISION TOPOGRAFICA) INCLUYE ACTA DE VECINDAD	M2	2.500,00	440,00	$ 1.100.000					2500,00	$ 1.100.000,00	2500,00	$ 1.100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.39	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M	ML	50,00	6.377,00	$ 318.850			32,50	$ 207.253	17,50	$ 111.597,50	12,00	$ 76.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	5,50	$ 35.073,50
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 72.750.958**						**$ 76.393.261**		**$ 21.462.372**		**$ 10.958.352**		**$ 30.678.686**		**$ 1.593.990,88**		**$ 11.699.859,83**
2 CIMIENTOS																					
2.1	ZAPATA EN CONCRETO COMUN 3000 PSI	M3	3,50	599.655,00	$ 2.098.793			0,91	$ 544.487	2,59	$ 1.554.305,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	2,59	$ 1.554.305,76
2.2	VIGA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,00	540.235,00	$ 540.235			1,00	$ 540.235	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Total CIMENTOS					**$ 2.639.028**						**$ 1.554.305,76**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 1.554.305,76**
3 MAMPOSTERÍA																					
3.1	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM	M2	10,00	75.527,00	$ 755.270			1,30	$ 98.185	8,70	$ 657.084,90	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	8,70	$ 657.084,90
3.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5--	M2	5,50	38.867,00	$ 213.769	67,98	$ 2.642.334			73,48	$ 2.856.102,63	5,50	$ 213.768,50	29,14	$ 1.132.584,38	12,10	$ 470.135	14,40	$ 559.684,80	12,35	$ 479.929,72
3.3	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO	M2	7,00	89.194,00	$ 624.358					7,00	$ 624.358,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 624.358	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACIÓN VERTICAL PARED DOBLE	M2	16,80	105.165,00	$ 1.766.772			15,00	$ 1.577.475	1,80	$ 189.297,00	1,60	$ 168.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,20	$ 21.033,00
3.5	VIGA DE AMARRE DE 12*20 CMS EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	12,00	107.501,00	$ 1.290.012					12,00	$ 1.290.012,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.290.012,00
3.6	PLACA FACIL BLOQUELON	M2	4,50	294.553,00	$ 1.325.489	0,50	$ 147.277			5,00	$ 1.472.765,00	5,00	$ 1.472.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Total MAMPOSTERÍA					**$ 5.975.669**						**$ 7.089.619,53**		**$ 1.854.797,50**		**$ 1.132.584,38**		**$ 1.094.493**		**$ 559.684,80**		**$ 2.448.059,62**
4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO																					
4.1	PLACA EN CONCRETO 30 CM-3000 PSI. MALLA ELECTROSOLDADA	M2	10,00	180.161,00	$ 1.801.610			10,00	$ 1.801.610	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	ANCLAJE EN CONCRETO EN VARILLA DE 1/2"	UND	94,00	15.204,00	$ 1.429.176			54,00	$ 821.016	40,00	$ 608.160,00	40,00	$ 608.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	ACERO DE REFUERZO	KG	100,00	3.617,00	$ 361.700			50,00	$ 180.850	50,00	$ 180.850,00	50,00	$ 180.850,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	INSTALACION DE CERCHAS Y PARALES	M2	48,00	60.001,00	$ 2.880.048			48,00	$ 2.880.048	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	40,00	110.469,00	$ 4.418.760			40,00	$ 4.418.760	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO					**$ 10.891.294**						**$ 789.010,00**		**$ 789.010,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
5 CUBIERTAS																					
5.1	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR ARENA O GRIS, AISLAMIENTO CON POLIURETANO IGNIFUGO DE ALTA DENS 38KG/M3 ESPESOR DE 30MM, CARA INTER EN LÁMINA DE ACERO GAL CAL 28	M2	750,00	143.808,00	$ 107.856.000	25,53	$ 3.671.418			775,53	$ 111.527.418,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	775,53	$ 111.527.418	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 30 CMS DE ANCHO-	ML	100,00	29.388,00	$ 2.938.800					100,00	$ 2.938.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 2.938.800	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA INCLUYE INMUNIZACION Y PINTURA	M2	120,00	62.542,00	$ 7.505.040			67,30	$ 4.209.139	52,70	$ 3.295.900,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	52,70	$ 3.295.901	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Total CUBIERTAS					**$ 118.299.840**						**$ 117.762.119,10**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 117.762.119**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
6 CIELOS RASOS																					
6.1	CIELO RASO TIPO LAY IN DE HUNTER DOUGLAS PERFORADO O SIMILAR--	M2	27,20	133.192,00	$ 3.622.822	20,57	$ 2.739.813			47,77	$ 6.362.635,12	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	35,17	$ 4.684.363	0,00	$ 0,00	12,60	$ 1.678.272,48
Total CIELORRASOS					**$ 3.622.822**						**$ 6.362.635,12**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.684.363**		**$ 0,00**		**$ 1.678.272,48**
7 ENCHAPES Y ACCESORIOS																					
7.1	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO .30 X .45M TIPO ARTIC DE CORONA O SIMILAR, INCLUYE PEGA Y EMBOQUILLE, WIN PLASTICO. INCLUYE PEGA Y BOQUILLA----	M2	48,00	55.118,00	$ 2.645.664	70,97	$ 3.911.449			118,97	$ 6.557.112,87	56,26	$ 3.100.938,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	47,38	$ 2.611.215,25	15,33	$ 844.958,94
7.2	ESPEJO BISELADO CRISTAL DE 5 MM--	M2	7,00	59.572,00	$ 417.004			3,40	$ 202.545	3,60	$ 214.459,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,60	$ 214.459,20
7.3	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM PLEGABLES INCLUYE ACCESORIOS Y SEÑALIZACION--	M2	6,00	492.671,00	$ 2.956.026			6,00	$ 2.956.026	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.4	TAPAS REGISTRO 20X20--	UND	5,00	13.326,00	$ 66.630					5,00	$ 66.630,00	2,00	$ 26.652,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 39.978,00	0,00	$ 0,00
Total ENCHAPES Y ACCESORIOS					**$ 6.085.324**						**$ 6.838.202,07**		**$ 3.127.590,68**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 2.651.193,25**		**$ 1.059.418,14**

8	**RED SANITARIA**																					
	8.1	SALIDA SANITARIA 6"--	**UND**	25,00	213.642,00	$ 5.341.050			3,00	$ 640.926	22,00	$ 4.700.124,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,00	$ 427.284,00	20,00	$ 4.272.840,00
	8.2	REJILLAS SOSCO 3X2--	**UND**	5,00	4.777,00	$ 23.885			1,00	$ 4.777	4,00	$ 19.108,00	3,00	$ 14.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	2,00	$ 9.554,00	-1,00	-$ 4.777,00
	8.3	SALIDA SANITARIA 3"--	**UND**	4,00	72.074,00	$ 288.296					4,00	$ 288.296,00	4,00	$ 288.296,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8.4	RED SANITARIA PVC DE 2"	**ML**	10,22	25.648,00	$ 262.123	15,08	$ 386.772			25,30	$ 648.894,40	6,40	$ 164.147,20	0,00	$ 0,00	3,80	$ 97.462	0,00	$ 0,00	15,10	$ 387.284,80
	8.5	REJILLA TIPO CÚPULA CONCENTRICA, A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO COLREJILLAS CC 4"-2", CC 6" - 3", CC 6" - 4", CC 8" - 4", CC 8" - 6" O EQUIVALENTE O SUPERIOR. (ANEXAR FICHA TÉCNICA).	**UND**	10,00	38.929,00	$ 389.290					10,00	$ 389.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 389.290,00	0,00	$ 0,00
	8.6	RED DE BAJANTE AGUAS LLUVIA 6	**ML**	80,00	94.662,00	$ 7.572.960			44,70	$ 4.231.391	35,30	$ 3.341.568,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	80,00	$ 7.572.960,00	-44,70	-$ 4.231.391,40
	8.7	TUBERÍA PVCS 4	**ML**	47,00	43.671,00	$ 2.052.537	2,70	$ 117.912			49,70	$ 2.170.448,70	23,00	$ 1.004.433,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.048.104	0,00	$ 0,00	2,70	$ 117.911,70
	8.8	CAJA INSPECCIÓN 60X60	**UND**	1,00	381.463,00	$ 381.463					1,00	$ 381.463,00	1,00	$ 381.463,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8.9	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80X80 INCLUYE TAPA Y MARCO METALICO	**UND**	4,00	636.276,00	$ 2.545.104			4,00	$ 2.545.104	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8.10	SALIDA SANITARIA 2"--	**UND**	18,00	76.065,00	$ 1.369.170			8,00	$ 608.520	10,00	$ 760.650,00	6,00	$ 456.390,00	6,00	$ 456.390,00	0,00	$ 0	6,00	$ 456.390,00	-8,00	-$ 608.520,00
	8.11	SALIDA SANITARIA 4"--	**UND**	24,00	101.477,00	$ 2.435.448			15,00	$ 1.522.155	9,00	$ 913.293,00	12,00	$ 1.217.724,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	-3,00	-$ 304.431,00
	8.12	RED SANITARIA COLECTORA 8 SIN ACCESORIOS	**ML**	50,00	127.711,00	$ 6.385.550			31,00	$ 3.959.041	19,00	$ 2.426.509,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 2.426.509	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8.13	REVENTILACIÓN 3--	**ML**	20,00	28.180,00	$ 563.600	3,90	$ 109.902			23,90	$ 673.502,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	23,90	$ 673.502,00
Total	**RED SANITARIA**					**$ 29.610.476**						**$ 16.713.146,70**		**$ 3.526.784,20**		**$ 456.390,00**		**$ 3.572.075**		**$ 8.855.478,00**		**$ 302.419,10**
9	**RED ELÉCTRICA**																					
	9.1	ACOMETIDA 1#12AWG-FASE + 1#12AWG-NEUTRO + 1#12AWG TIERRA ó 2#12AWG-FASES + 1#12AWG TIERRA EN CABLE HF FR LS CT, INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN--	**ML**	400,00	8.563,00	$ 3.425.200	-234,67	-$ 2.009.479			165,33	$ 1.415.720,79	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	400,00	$ 3.425.200	0,00	$ 0,00	-234,67	-$ 2.009.479,21
	9.2	ACOMETIDA 1#10AWG-FASES + 1#10AWG-NEUTRO + 1#10AWG TIERRA ó 2#10AWG-FASES + 1#10AWG TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	**ML**	150,00	10.883,00	$ 1.632.450	128,70	$ 1.400.642			278,70	$ 3.033.092,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	278,70	$ 3.033.092,10
	9.3	ACOMETIDA 3#8AWG-FASES + 1#8AWG-NEUTRO + 1#10AWG- TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	**ML**	100,00	23.955,00	$ 2.395.500	96,20	$ 2.304.471			196,20	$ 4.699.971,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	100,00	$ 2.395.500,00	96,20	$ 2.304.471,00
	9.4	ACOMETIDA 3#6-FASES + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	**ML**	50,00	28.481,00	$ 1.424.050	38,10	$ 1.085.126			88,10	$ 2.509.176,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	88,10	$ 2.509.176,10
	9.5	ACOMETIDA 3#6-FASES + 1#6-NEUTRO + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	**ML**	100,00	35.372,00	$ 3.537.200	17,00	$ 601.324			117,00	$ 4.138.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	117,00	$ 4.138.524,00
	9.6	ACOMETIDA 3#4-FASES + 1#4-NEUTRO + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	**ML**	100,00	47.788,00	$ 4.778.800	24,00	$ 1.146.912			124,00	$ 5.925.712,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	124,00	$ 5.925.712,00
	9.7	ACOMETIDA 3#2-FASES + 1#6-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	**ML**	20,00	58.945,00	$ 1.178.900	12,90	$ 760.391			32,90	$ 1.939.290,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	32,90	$ 1.939.290,50
	9.8	ACOMETIDA 3#1/0-FASES + 1#6-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--	**ML**	50,00	84.242,00	$ 4.212.100	16,00	$ 1.347.872			66,00	$ 5.559.972,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	66,00	$ 5.559.972,00
	9.9	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 60 X 400	**ML**	50,00	89.009,00	$ 4.450.450			50,00	$ 4.450.450	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.10	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DOBLE 6A: TOMA DATOS DOBLE, TOMA NORMAL, TOMA REGULADA. INCLUYE CANALETA PERIMETRAL, CABLEADO ELÉCTRICO (NORMAL Y REGULADO), RACK, PATCH CORD, PATCH PANEL Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS. RACK EXISTENTE	**UND**	40,00	1.008.112,00	$ 40.324.480					40,00	$ 40.324.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	40,00	$ 40.324.480,00	0,00	$ 0,00
	9.11	BANDEJA PORTACABLE CON DIVISION 30x8 cms INCLUYE ANCLAJES Y RIEL METALICOS	**ML**	50,00	59.558,00	$ 2.977.900			50,00	$ 2.977.900	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.12	Interruptor Senc. Conmutable Ave Clásica	**UND**	3,00	11.528,00	$ 34.584					3,00	$ 34.584,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 34.584	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.13	Interruptor Senc. Conmutable Luminex Clásica	**UND**	3,00	11.262,00	$ 33.786					3,00	$ 33.786,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 33.786,00	0,00	$ 0,00
	9.14	Interruptor Sencillo Ave Clásica	**UND**	3,00	47.039,00	$ 141.117	24,00	$ 1.128.936			27,00	$ 1.270.053,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 141.117	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.128.936,00
	9.15	Interruptor Triple Luminex Clásica	**UND**	10,00	19.477,00	$ 194.770			1,00	$ 19.477	9,00	$ 175.293,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 19.477	0,00	$ 0,00	8,00	$ 155.816,00
	9.16	Interruptor Triple Luminex Ambia	**UND**	10,00	15.900,00	$ 159.000			10,00	$ 159.000	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.17	DESCONEXION Y DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS HASTA 42 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES	**UND**	5,00	25.617,00	$ 128.085	1,00	$ 25.617			6,00	$ 153.702,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	1,00	$ 25.617,00	5,00	$ 128.085,00
	9.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE PRESENCIA PARA ILUMINACION MULTIFUNCON--	**UND**	3,00	105.051,00	$ 315.153					3,00	$ 315.153,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,00	$ 315.153,00
	9.19	LUMINARIA PANEL LED 18W DE SOBREPONER O INCRUSTAR, 100- 240V, 6500K, MINIMO 1170 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 70, MINIMO 65LM/W, MINIMO 25.000 HRS.-- REF 24338 O SIMILAR	**UND**	30,00	51.513,00	$ 1.545.390	16,00	$ 824.208			46,00	$ 2.369.598,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 875.721	0,00	$ 0,00	29,00	$ 1.493.877,00
	9.20	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0,90, Y MINIMO 30.000 HRS	**UND**	150,00	195.887,00	$ 29.383.050			78,00	$ 15.279.186	72,00	$ 14.103.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	72,00	$ 14.103.864,00
	9.21	-LUMINARIA LED HERMETICA 50W (STRIP), 100-240V, 6000- 6500K, MINIMO 4500 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, MINIMO IP65, MINIMO 90LM/W, DRIVER INDEPENDIENTE, MINIMO 50.000 HRS.--	**UND**	5,00	158.942,00	$ 794.710			5,00	$ 794.710	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.22	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SUSPENDER, CHASIS DE ALUMINIO, 100-277V, 6000K, MINIMO 3600 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, MINIMO 90LM/W, F.P MAYOR A 0.92, MINIMO 50.000 HRS-- ALTURAS MAYORES A 7 MTS	**UND**	20,00	208.210,00	$ 4.164.200	4,00	$ 832.840			24,00	$ 4.997.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 4.164.200	0,00	$ 0,00	4,00	$ 832.840,00
	9.23	TUBO EMT DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	**ML**	120,00	8.458,00	$ 1.014.960			120,00	$ 1.014.960	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	120,00	$ 1.014.960,00	-120,00	-$ 1.014.960,00
	9.24	TUBO EMT DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	**ML**	100,00	9.959,00	$ 995.900			-91,23	-$ 908.560	191,23	$ 1.904.459,57	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 995.900	0,00	$ 0,00	91,23	$ 908.559,57
	9.25	TUBO EMT DE 1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	**ML**	40,00	26.537,00	$ 1.061.480	80,90	$ 2.146.843			120,90	$ 3.208.323,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	120,90	$ 3.208.323,30
	9.26	TUBO EMT DE 1". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	**ML**	50,00	17.222,00	$ 861.100	16,70	$ 287.607			66,70	$ 1.148.707,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	27,00	$ 464.994,00	39,70	$ 683.713,40
	9.27	TUBO EMT DE 2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE	**ML**	30,00	30.619,00	$ 918.570	119,60	$ 3.662.032			149,60	$ 4.580.602,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	6,00	$ 183.714,00	143,60	$ 4.396.888,40
	9.28	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MIN, INCLUYE DOS (2) BOMBILLAS.	**UND**	10,00	78.577,00	$ 785.770					10,00	$ 785.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	10,00	$ 785.770,00
	9.29	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X8 + 1X10 AWG Ø 1 EMT	**ML**	100,00	53.445,00	$ 5.344.500	87,80	$ 4.692.471			187,80	$ 10.036.971,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	187,80	$ 10.036.971,00
	9.30	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X2/0 + 1X1/0 AWG Ø 2 EMT	**ML**	50,00	180.446,00	$ 9.022.300	21,42	$ 3.865.153			71,42	$ 12.887.453,32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	71,42	$ 12.887.453,32
	9.31	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X2 + 1X4 AWG Ø 1- 1/2 EMT	**ML**	50,00	170.793,00	$ 8.539.650	8,70	$ 1.485.899			58,70	$ 10.025.549,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	58,70	$ 10.025.549,10
	9.32	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X4 + 1X6 AWG Ø 1- 1/2 EMT	**ML**	50,00	76.167,00	$ 3.808.350			50,00	$ 3.808.350	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.33	ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X6 + 1X8 AWG Ø 1- 1/2 EMT	**ML**	100,00	59.713,00	$ 5.971.300	107,90	$ 6.443.033			207,90	$ 12.414.332,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	207,90	$ 12.414.332,70
	9.34	SALIDA CAMPANA EXTRACTORA	**UND**	2,00	102.469,00	$ 204.938			2,00	$ 204.938	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.35	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT--	**UND**	1,00	95.928,00	$ 95.928	2,00	$ 191.856			3,00	$ 287.784,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,00	$ 287.784,00
	9.36	SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, TOMA DOBLE, CLAVIJA, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	160,00	107.801,00	$ 17.248.160			18,00	$ 1.940.418	142,00	$ 15.307.742,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,00	$ 5.066.647	32,00	$ 3.449.632,00	63,00	$ 6.791.463,00
	9.37	SALIDA DE INTERRUPTOR INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	8,00	111.479,00	$ 891.832					8,00	$ 891.832,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 445.916	4,00	$ 445.916,00	0,00	$ 0,00
	9.38	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	8,00	101.332,00	$ 810.656			3,00	$ 303.996	5,00	$ 506.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	8,00	$ 810.656,00	-3,00	-$ 303.996,00
	9.39	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	8,00	88.372,00	$ 706.976			7,00	$ 618.604	1,00	$ 88.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	8,00	$ 706.976,00	-7,00	-$ 618.604,00
	9.40	SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	4,00	107.873,00	$ 431.492					4,00	$ 431.492,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	4,00	$ 431.492,00
	9.41	SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	4,00	111.876,00	$ 447.504	1,00	$ 111.876			5,00	$ 559.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 111.876	2,00	$ 223.752,00	2,00	$ 223.752,00
	9.42	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	4,00	108.149,00	$ 432.596	6,00	$ 648.894			10,00	$ 1.081.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 432.596	0,00	$ 0,00	6,00	$ 648.894,00
	9.43	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	4,00	123.324,00	$ 493.296	3,00	$ 369.972			7,00	$ 863.268,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 493.296	0,00	$ 0,00	3,00	$ 369.972,00
	9.44	Salida Bifásica+ Toma Tubo Emt Ø 1/2	**UND**	10,00	150.434,00	$ 1.504.340			7,00	$ 1.053.038	3,00	$ 451.302,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,00	$ 451.302,00
	9.45	Salida Bomba Trifásica Tubo Emt--	**UND**	3,00	198.273,00	$ 594.819			1,00	$ 198.273	2,00	$ 396.546,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	2,00	$ 396.546,00
	9.46	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V - 15A CON PROTECCIÓN GFCI, INCLUYE CABLEADO NO. 12 AWG THHN (F-N-T), TOMA DOBLE GFCI, DUCTERIA EMT 1/2", CAJA METALICA TIPO RAWELT, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	**UND**	10,00	146.255,00	$ 1.462.550			7,00	$ 1.023.785	3,00	$ 438.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,00	$ 438.765,00
	9.47	SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V, 15A INCLUYE TOMA DOBLE COLOR BLANCO, CAJA METÁLICA TIPO RAWLET, DUCTERÍA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG THHN (F-N-T), ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA	**UND**	20,00	102.569,00	$ 2.051.380	10,00	$ 1.025.690			30,00	$ 3.077.070,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.025.690	10,00	$ 1.025.690,00	10,00	$ 1.025.690,00
	9.48	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) SOBREPUESTO. INCLUYE TOMA, TAPA, CAJA TIPO RAWELT 2X4, DUCTERÍA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG THHN. 3ML X SALIDA	**UND**	10,00	105.234,00	$ 1.052.340					10,00	$ 1.052.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.052.340,00
	9.49	Salida Toma Trifásica 50 A Tubo Emt	**UND**	1,00	144.846,00	$ 144.846			1,00	$ 144.846	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	9.50	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 30 A 50 AMP AJUSTABLE-	**UND**	1,00	150.925,00	$ 150.925					1,00	$ 150.925,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 150.925,00
	9.51	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 56 A 80 AMP AJUSTABLE-	**UND**	1,00	238.154,00	$ 238.154					1,00	$ 238.154,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 238.154,00
	9.52	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 87 A 125 AMP AJUSTABLE-	**UND**	1,00	432.282,00	$ 432.282	2,00	$ 864.564			3,00	$ 1.296.846,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.296.846,00
	9.53	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 44-63 AMP 25KA AJUSTABLE--	**UND**	1,00	236.963,00	$ 236.963			1,00	$ 236.963	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

9.54	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 70-100 AMP 25KA AJUSTABLE--	UND	1,00	251.953,00	$ 251.953					1,00	$ 251.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 251.953,00
9.55	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 112-160A 25kA AJUSTABLE--	UND	1,00	496.833,00	$ 496.833					1,00	$ 496.833,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 496.833,00
9.56	BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 140-200A 25kA AJUSTABLE--	UND	1,00	676.245,00	$ 676.245					1,00	$ 676.245,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 676.245,00
9.57	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A ó 2X30A DE 10KA-	UND	10,00	51.639,00	$ 516.390					10,00	$ 516.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	10,00	$ 516.390,00
9.58	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40A DE 10KA-	UND	10,00	63.633,00	$ 636.330			3,00	$ 190.899	7,00	$ 445.431,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	7,00	$ 445.431,00
9.59	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X30A o 3X40A DE 10KA-	UND	5,00	110.625,00	$ 553.125					5,00	$ 553.125,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	5,00	$ 553.125,00
9.60	BREAKER TIPO RIEL DE 2x25A o 2X32A, DE 10KA--	UND	1,00	51.250,00	$ 51.250			1,00	$ 51.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.61	BREAKER TIPO RIEL DE 2x40A, DE 10KA--	UND	1,00	83.170,00	$ 83.170			1,00	$ 83.170	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.62	BREAKER TIPO RIEL DE 3X32A o 3X40A DE 10KA--	UND	1,00	75.346,00	$ 75.346			1,00	$ 75.346	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.63	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 12 Ctos	UND	2,00	262.756,00	$ 525.512	1,00	$ 262.756			3,00	$ 788.268,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	3,00	$ 788.268,00
9.64	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 24 Ctos	UND	1,00	259.752,00	$ 259.752			1,00	$ 259.752	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.65	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 36 Ctos	UND	1,00	504.226,00	$ 504.226					1,00	$ 504.226,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 504.226,00
9.66	Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 18 Ctos	UND	3,00	449.889,00	$ 1.349.667			2,00	$ 899.778	1,00	$ 449.889,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 449.889,00
Total	**RED ELÉCTRICA**				**$ 181.166.531**						**$ 181.793.508,28**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 17.232.220**		**$ 51.105.673,00**		**$ 113.455.615,28**
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**																				
10.1	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 (INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO-- INOX)--	UND	15,00	1.175.955,00	$ 17.639.325			2,00	$ 2.351.910	13,00	$ 15.287.415,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	13,00	$ 15.287.415,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PARA VENTANERÍA DE TRÁFICO PESADO, TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DOBLE VIDRIO EN COLOR HUMO TEMPLADO LAMINADO (4MM+4MM) CON PELÍCULA INTERMEDIA	M2	60,00	447.387,00	$ 26.843.220	0,04	$ 19.014			60,04	$ 26.862.233,95	40,72	$ 18.217.598,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	19,32	$ 8.644.635,31
10.3	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1.8 MTS ALT 2.20 (INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRAULICA, CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO-- INOX)--	UND	2,00	2.999.169,00	$ 5.998.338					2,00	$ 5.998.338,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	2,00	$ 5.998.338,00
10.4	ESCALERA DE GATO CON GUARDA HOMBRE INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y ANCLAJES	ML	2,50	275.899,00	$ 689.748					2,50	$ 689.747,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	2,50	$ 689.747,50
Total	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 51.170.631**						**$ 48.837.734,45**		**$ 18.217.598,64**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 30.620.135,81**
11	**PINTURAS**																				
11.1	ESTUCO Y PINTURA BAJO TECHOS --	M2	350,00	17.800,00	$ 6.230.000	227,00	$ 4.040.600			577,00	$ 10.270.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	175,06	$ 3.116.070,44	401,94	$ 7.154.529,56
11.2	PINTURA ESMALTE TUBERIA DIAMETROS VARIOS ALTURA MAYORES A 4 METROS	ML	15,00	11.656,00	$ 174.840	4,35	$ 50.704			19,35	$ 225.543,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	15,00	$ 174.840,00	4,35	$ 50.703,60
11.3	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, CAMBIO DE RODACHINES, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS	M2	30,00	89.175,00	$ 2.675.250			30,00	$ 2.675.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.4	VINILO TIPO I 3 MANOS INCLUYE RESANES	M2	856,00	12.133,00	$ 10.385.848	100,82	$ 1.223.249			956,82	$ 11.609.097,06	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	956,82	$ 11.609.097,06
11.5	- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE INCLUYE LIJADO, PINTURA, INMUZANTE Y CAMBIO DE PIEZAS	M2	650,00	39.594,00	$ 25.736.100			310,88	$ 12.308.785	339,13	$ 13.427.315,25	0,00	$ 0,00	487,00	$ 19.282.278,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	-147,88	-$ 5.854.962,75
11.6	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL INCLUYE PRIMER MANO PARA TUBERIAS GALVANIZADAS	ML	10,00	11.475,00	$ 114.750			10,00	$ 114.750	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.7	ESTUCO PLASTICO --	M2	182,00	8.107,00	$ 1.475.474	141,65	$ 1.148.331			323,65	$ 2.623.805,42	0,00	$ 0,00	150,00	$ 1.216.050,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	173,65	$ 1.407.755,42
Total	**PINTURAS**				**$ 46.792.262**						**$ 38.156.361,33**		**$ 0,00**		**$ 20.498.328,00**		**$ 0**		**$ 3.290.910,44**		**$ 14.367.122,89**
12	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**																				
12.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 1500 P.S.I.	M3	10,00	246.651,00	$ 2.466.510			9,77	$ 2.409.682	0,23	$ 56.828,39	10,00	$ 2.466.510,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	-9,77	-$ 2.409.681,61
12.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	M2	182,00	29.742,00	$ 5.413.044	49,98	$ 1.486.446			231,98	$ 6.899.489,68	87,92	$ 2.614.916,64	89,00	$ 2.647.038,00	0,00	$ 0	52,46	$ 1.560.265,32	2,60	$ 77.269,72
Total	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				**$ 7.879.554**						**$ 6.956.318,07**		**$ 5.081.426,64**		**$ 2.647.038,00**		**$ 0**		**$ 1.560.265,32**		**-$ 2.332.411,89**
13	**RED DE GAS**																				
13.1	DESMONTES Y REINSTALACION DE AIRES TIPO CONDENSADORAS INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACION POSTERIOR EN SITIO INDICADO	UND	22,00	471.154,00	$ 10.365.388					22,00	$ 10.365.388,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 5.182.694	11,00	$ 5.182.694,00	0,00	$ 0,00
13.2	VÁLVULA DE BOLA 1/2	UND	1,00	29.179,00	$ 29.179			1,00	$ 29.179	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Total	**RED DE GAS**				**$ 10.394.567**						**$ 10.365.388,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.182.694**		**$ 5.182.694,00**		**$ 0,00**
14	**ANÁLISIS URBANISMO**																				
14.1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	50,00	12.525,00	$ 626.250			50,00	$ 626.250	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2	EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS	M3	10,00	19.135,00	$ 191.350			10,00	$ 191.350	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Total	**ANÁLISIS URBANISMO**				**$ 817.600**						**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15	**IMPERMEABILIZACIÓN**																				
15.1	PREPARACIÓN SUSTRATO (SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR) MODO MANUAL O MECÁNICO QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM D 42 58 Y PERFIL DE ANCLAJE ICR Y GRADO MÍNIMO CSP 2 .	M2	250,00	5.468,00	$ 1.367.000	26,52	$ 145.000			276,52	$ 1.512.000,42	276,52	$ 1.512.000,42	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.2	SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPRIMANTE	M2	250,00	19.833,00	$ 4.958.250	26,52	$ 525.931			276,52	$ 5.484.181,49	0,00	$ 0,00	276,52	$ 5.484.181,49	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.3	-SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL (CERESTIC, BRONCOELASTICO O EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	M2	250,00	72.053,00	$ 18.013.250	26,52	$ 1.910.701			276,52	$ 19.923.951,45	138,26	$ 9.961.975,73	0,00	$ 0,00	138,26	$ 9.961.976	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.4	REGATEO EN ANTEPECHOS PARA SELLOS POR MEDIOS MECÁNICO.	ML	100,00	5.406,00	$ 540.600					100,00	$ 540.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 540.600	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Total IMPERMEABILIZACIÓN				**$ 24.879.100**						**$ 27.460.733,37**		**$ 11.473.976,15**		**$ 5.484.181,49**		**$ 10.502.576**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
16 RED HIDRÁULICA																					
16.1	PUNTO A.F. DE 1/2"--	**UND**	22,00	35.622,00	$ 783.684	1,00	$ 35.622			23,00	$ 819.306,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 356.220,00	12,00	$ 427.464	0,00	$ 0,00	1,00	$ 35.622,00
16.2	SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CONFORMADO POR: 2 BOMBAS DE 2 A 3 HP CADA UNA, UN TANQUE HIDROFLO DE 200 LITROS, INCLUYE TABLERO ELECTRICO Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO --	**UND**	1,00	6.328.001,00	$ 6.328.001					1,00	$ 6.328.001,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.328.001,00
16.3	RED DE TUBERIA PVCP DE 1/2" RDE 13.5 CON ACCESORIOS.-	**ML**	70,50	9.652,00	$ 680.466	5,00	$ 48.260			75,50	$ 728.726,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	55,00	$ 530.860	0,00	$ 0,00	20,50	$ 197.866,00
16.4	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	**UND**	1,00	41.358,00	$ 41.358					1,00	$ 41.358,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	1,00	$ 41.358,00
16.5	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2	**UND**	5,00	81.391,00	$ 406.955					5,00	$ 406.955,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 325.564	0,00	$ 0,00	1,00	$ 81.391,00
Total RED HIDRÁULICA					**$ 8.240.464**						**$ 8.324.346,00**		**$ 0,00**		**$ 356.220,00**		**$ 1.283.888**		**$ 0,00**		**$ 6.684.238,00**
17 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS																					
17.1	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM PELICULA PVB COLOR TIPO PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y ACEESORIOS EN ACERO INOX--	**M2**	58,60	489.975,00	$ 28.712.535			9,38	$ 4.593.516	49,23	$ 24.119.019,38	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	49,23	$ 24.119.019,38
Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					**$ 28.712.535**						**$ 24.119.019,38**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 24.119.019,38**
18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS																					
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE O SIMILAR--	**UND**	8,00	583591,00	$ 4.668.728	1,00	$ 583.591			9,00	$ 5.252.319,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 5.252.319	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA---	**UND**	4,00	956.707,00	$ 3.826.828					4,00	$ 3.826.828,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.826.828	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.3	MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 10 CMS INCLUYE ESTRUCTURA METALICA --	**ML**	10,30	789.481,00	$ 8.131.654			1,50	$ 1.184.222	8,80	$ 6.947.432,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,30	$ 8.131.654,30	-1,50	-$ 1.184.221,50
18.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA EN ACERO INOX MUEBLE BAJO DE 2.10 MTS Y MUEBLE ALTO DE 1.35 INCLUYE ESTUFA ELECTRICA DE 4 PUESTOS, CAMPANA EXTRACTORA ACCESORIOS Y CIERRES LENTOS--	**UND**	2,00	5.260.197,00	$ 10.520.394			2,00	$ 10.520.394	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.5	SUMINISTRO E INT DE EXTRACTOR DE AIRE DE 4" INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE--	**UND**	2,00	102.696,00	$ 205.392			2,00	$ 205.392	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.6	LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA TI'PO PUSH-Y VALVULA DE PEDAL	**UND**	9,00	709.492,00	$ 6.385.428	1,00	$ 709.492			10,00	$ 7.094.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	10,00	$ 7.094.920,00	0,00	$ 0,00
Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS					**$ 33.738.424**						**$ 23.121.499,80**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.079.147**		**$ 15.226.574,30**		**-$ 1.184.221,50**
19 PISOS																					
19.1	PISO EN GRANITO DE 33X 33 PULIDO Y SELLADO	**M2**	62,83	110.341,00	$ 6.932.725	35,89	$ 3.960.470			98,72	$ 10.893.194,54	59,93	$ 6.612.736,13	0,00	$ 0,00	16,74	$ 1.847.108	0,00	$ 0,00	22,05	$ 2.433.350,07
19.2	MEDICAÑA EN GRAVILLA FINA	**ML**	180,00	20.223,00	$ 3.640.140			167,50	$ 3.387.353	12,50	$ 252.787,50	0,00	$ 0,00	12,00	$ 242.676,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00	0,50	$ 10.111,50
19.3	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON XYPEX O EQUIVALENTE	**ML**	120,00	16.122,00	$ 1.934.640			42,30	$ 681.961	77,70	$ 1.252.679,40	0,00	$ 0,00	46,00	$ 741.612,00	0,00	$ 0	14,00	$ 225.708,00	17,70	$ 285.359,40
19.4	PISO EN GRANITO DE 33X 33 PULIOD Y SELLADO ANCHOS MENORES A 60 CMS	**ML**	35,00	73.431,00	$ 2.570.085					35,00	$ 2.570.085,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 2.202.930,00	0,00	$ 0	5,00	$ 367.155,00	0,00	$ 0,00
19.5	ALISTADO DE PISO 4CM	**M2**	35,00	17.864,00	$ 625.240	83,76	$ 1.496.199			118,76	$ 2.121.439,32	0,00	$ 0,00	98,00	$ 1.750.672,00	90,69	$ 1.620.086	0,00	$ 0,00	-69,93	-$ 1.249.318,84
19.6	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO--	**M2**	20,48	30.562,00	$ 625.910	78,24	$ 2.391.263			98,72	$ 3.017.172,33	48,65	$ 1.486.841,30	0,00	$ 0,00	22,74	$ 694.980	0,00	$ 0,00	27,33	$ 835.351,15
Total PISOS					**$ 16.328.740**						**$ 20.107.358,09**		**$ 8.099.577,43**		**$ 4.937.890,00**		**$ 4.162.174**		**$ 592.863,00**		**$ 2.314.853,28**
NO PREVISTOS																					
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	**M2**				92,23	$ 70.042			92,23	$ 6.459.623,45					73,08	$ 5.118.669	0,00	$ 0,00	19,15	$ 1.340.954,09
NP.2	GUARDAESCOBA EN GRANO DE MARMOL O SIMILAR AL EXISTENTE	**ML**				64,10	$ 21.122			64,10	$ 1.353.920,20					64,10	$ 1.353.920	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.3	FRISO LISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES MURO-CUBIERTA	**ML**				347,10	$ 13.633			347,10	$ 4.732.014,30					219,00	$ 2.985.627	0,00	$ 0,00	128,10	$ 1.746.387,30
NP.4	ESTUCO Y RESANES	**ML**				440,10	$ 7.309			440,10	$ 3.216.690,90					149,00	$ 1.089.041	0,00	$ 0,00	291,10	$ 2.127.649,90
TOTAL DE NO PREVISTOS											**$ 15.762.248,85**						**$ 10.547.258**		**$ 0**		**$ 5.214.991**
	SUBTOTAL				**$ 659.995.818,05**		**$ 97.628.617**		**$ 119.117.620**		**$ 638.506.815**		**$ 73.633.134**		**$ 46.470.984**		**$ 215.781.693**		**$ 90.619.327**		**$ 212.001.677**
	ADMINISTRACION 21.00 %	21%			**$ 138.599.121,79**		**$ 20.502.010**		**$ 25.014.700**		**$ 134.086.431**		**$ 15.462.958**		**$ 9.758.907**		**$ 45.314.156**		**$ 19.030.059**		**$ 44.520.352**
	IMPREVISTOS 1.00 %	1%			**$ 6.599.958,18**		**$ 976.286**		**$ 1.191.176**		**$ 6.385.068**		**$ 736.331**		**$ 464.710**		**$ 2.157.817**		**$ 906.193**		**$ 2.120.017**
	UTILIDAD 5.00 %	5%			**$ 32.999.790,90**		**$ 4.881.431**		**$ 5.955.881**		**$ 31.925.341**		**$ 3.681.657**		**$ 2.323.549**		**$ 10.789.085**		**$ 4.530.966**		**$ 10.600.084**
	I.V.A / UTILIDAD 19%	19%			**$ 6.269.960,27**		**$ 927.472**		**$ 1.131.617**		**$ 6.065.815**		**$ 699.515**		**$ 441.474**		**$ 2.049.926**		**$ 860.884**		**$ 2.014.016**
	TOTAL OBRA				**$ 844.464.649,19**		**$ 124.915.816**		**$ 152.410.995**		**$ 816.969.470,18**		**$ 94.213.594,00**		**$ 59.459.624,31**		**$ 276.092.676,00**		**$ 115.947.428,88**		**$ 271.256.146,29**

CARLOS ANDRES NARVAEZ GONZALEZ
CC No. 1.065.634.367 DE VALLEDUPAR
R.L. BROKA CONSTRUCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

PABLO A HERNANDEZ CORREDOR
Supervisor

EMPERATRIZ BONILLA V
Supervisor

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.1**	**DESMONTE DE MESONES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Juridica	2,93			1,00						
Cocina	1,90			1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				2,93						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,90						
			TOTAL	**4,83**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.2 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MURO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**		**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Punto fijo escalera 1er piso		7,10	2,45	17,40						
Baño jefe de recaudo		3,80	2,25	8,55						
Pasillo escalera pequeña 2do piso		2,05	2,20	4,51						
Pasillo escalera pequeña 2do piso		1,10	2,25	2,48						
Baño RAC		1,00	2,25	2,25						
Baño pasillo 2do piso		2,20	4,10	9,02						
Pasillo 2do piso		1,40	2,10	2,94						
Baño Pablo		5,00	2,50	12,50						
Baño ing. Sistemas		5,90	2,30	13,57						
Baño director		7,40	2,30	17,02						
Bodega secretaria de direccion		7,00	2,20	15,40						
Punto fijo escalera pequeña		6,10	0,70	4,27						
Punto fijo escalera demolida		7,40	0,65	4,81						
Punto fijo escalera demolida		2,30	1,60	3,68						
			SUBTOTAL	**118,40**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				73,77						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				17,18						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				27,45						
			TOTAL	**118,40**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.3 DESMONTE DE VIDRIOS Y ESPEJOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño Pablo		0,60	0,80	0,48						
Baño 1 RAC		0,60	0,80	0,48						
Baño 2 RAC		0,60	0,80	0,48						
Baño ing. Sistemas		0,60	0,80	0,48						
Baño director		0,60	0,80	0,48						
Bodega secretaria direccion		0,60	0,80	0,48						
Baño juridica		0,60	0,80	0,48						
Baño jefe de recaudo		0,60	0,80	0,48						
Baño fiscalizacion	2,00	0,60	0,80	0,96						
			SUBTOTAL	**4,80**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				2,31						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,49						
			TOTAL	**4,80**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

Carlos Narvaez.

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

Emperatriz Bonilla V.

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.4 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
PRIMER PISO										
Fiscalizacion				19,00						
Pasillo, vigilancia, vano escalera grande				19,00						
Documentacion				11,00						
Juridica				13,00						
Recaudo				15,00						
SEGUNDO PISO										
Direccion				12,00						
Secretaria de direccion				9,00						
Auditorio				12,00						
Comercial				8,00						
Pasillos				13,00						
Ing. Sistemas				6,00						
			SUBTOTAL	**137,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				60,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				40,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				37,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**137,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. NA**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.5 CANCELACION DE PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS--**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño Pablo				6,00						
Baño 1 RAC				6,00						
Baño 2 RAC				6,00						
Baño ing. Sistemas				6,00						
Baño director				6,00						
Bodega secretaria direccion				6,00						
Baño juridica				6,00						
Baño jefe de recaudo				6,00						
Baño fiscalizacion				12,00						
Baño 1 pasillo 2do piso				7,00						
Baño 2 pasillo 2do piso				6,00						
			SUBTOTAL	**73,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				33,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				33,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				7,00						
			TOTAL	**73,00**						

CROQUIS

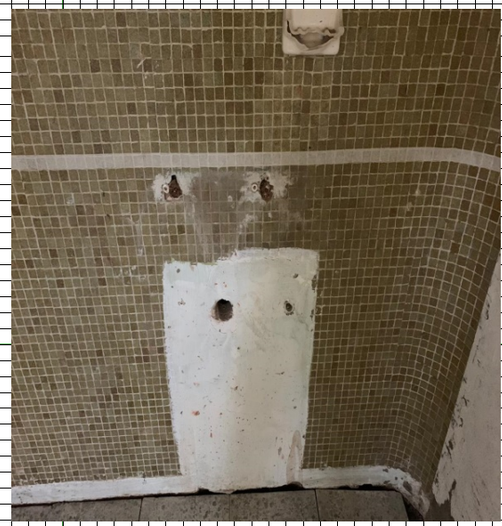

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**NA**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.6 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL**	**UNIDAD:**	**m2** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Puerta baño pablo		0,90	2,10	1,89						
Puerta baño 1 RAC		0,90	2,10	1,89						
Puerta baño 2 RAC		0,90	2,10	1,89						
Puerta baño ing. Sistemas		0,90	2,10	1,89						
Puerta oficina ing. Sistemas		0,90	2,10	1,89						
Puerta auditorio		2,00	2,10	4,20						
Puerta 1 comercial		0,90	2,10	1,89						
Puerta 2 comercial		0,90	2,10	1,89						
Puerta baño 1 pasillo		0,90	2,10	1,89						
Puerta baño 2 pasillo		0,90	2,10	1,89						
Puerta 1 secretaria direccion		0,90	2,10	1,89						
Puerta 2 secretaria de direccion		0,90	2,10	1,89						
Puerta bodega secretaria de direccion		0,90	2,10	1,89						
Puerta baño jefe recaudo		0,90	2,10	1,89						
Puerta 1 baño fiscalizacion		0,90	2,10	1,89						
Puerta 2 baño fiscalizacion		0,90	2,10	1,89						
Puerta cocina		0,90	2,10	1,89						
Puerta bodega recaudo		0,90	2,10	1,89						
			SUBTOTAL	**36,33**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				27,20						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				8,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,13						
			TOTAL	**36,33**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

Carlos Narvaez.

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

Emperatriz Bonilla V.

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA** / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. NA**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

	CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.7**	**DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA INCLUYE TUBERIA, CABLES, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONAL RETIRO Y DISPOSICON FINAL--**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		**L**	**a**	**h**		
PRIMER PISO										
Fiscalizacion				8,00						
Pasillo, vigilancia, vano escalera grande				6,00						
Documentacion				9,00						
Juridica				16,00						
Cocina				4,00						
Recaudo				8,00						
SEGUNDO PISO										
Direccion				9,00						
Secretaria de direccion				12,00						
Auditorio				10,00						
Comercial				5,00						
Pasillos				15,00						
Ing. Sistemas				3,00						
Jefe gestion administracion				7,00						
			SUBTOTAL	**112,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				61,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				51,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**112,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**		
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. NA**		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**		
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.8 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN PISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**		**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bateria baño nuevo 1er piso	2,30	3,15		7,25						
Bateria baño nuevo 1er piso	3,00	1,15		3,45						
Bateria baño nuevo 1er piso	1,60	1,95		3,12						
Bateria baño nuevo 1er piso	4,50	1,00		4,50						
Bajo nueva placa	2,50	1,86		4,65						
Juridica	2,00	1,60		3,20						
Recaudo	1,30	1,96		2,55						
Bateria baño nuevo 2do piso	3,30	2,40		7,92						
Bateria baño nuevo 2do piso	3,10	1,30		4,03						
Bateria baño nuevo 2do piso	2,40	2,55		6,12						
Baño direccion	1,80	1,85		3,33						
Pasillo	4,80	3,50		16,80						
Pasillo	2,90	4,90		14,21						
Sala amiga	2,00	2,40		4,80						
Placa nueva	4,86	2,00		9,72						
Cocina	1,10	2,80		3,08						
			SUBTOTAL	**98,72**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				59,93						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				21,34						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				17,45						
			TOTAL	**98,72**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

Carlos Narvaez.

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

Emperatriz Bonilla V.

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA** / **MES** / **AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

	CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.9**	**DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O ALUMINIO INCLUYE VIDRIOS RETIRO Y DISPOSICON FINAL--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL		L	a	h		
PRIMER PISO										
Baño nuevo	1,75	1,00	8,00	14,00						
Cocina	2,20	1,50	1,00	3,30						
SEGUNDO PISO										
Comercial	1,20	0,85	4,00	4,08						
RAC	1,20	0,85	2,00	2,04						
Auditorio	1,20	0,85	11,00	11,22						
Direccion	1,20	0,85	5,00	5,10						
Secretaria direccion	1,20	0,85	5,00	5,10						
Secretaria direccion	1,30	0,60	1,00	0,78						
Baño nuevo	1,35	2,50	1,00	3,38						
Baño nuevo	0,85	0,85	1,00	0,72						
Placa cubierta grande	1,35	0,80	3,00	3,24						
Placa cubierta grande	14,90	0,50	1,00	7,45						
Placa cubierta grande	10,50	0,85	1,00	8,93						
			SUBTOTAL	**69,33**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				45,12						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				14,31						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				9,91						
			TOTAL	**69,33**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.10**	**DESMONTE DE PASAMANOS METALICOS YO MADERA EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL**	**UNIDAD:**	**ml**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL		L	a	h		
Escalera demolida	6,90			6,90						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				6,90						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**6,90**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			13/11/2020	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE CONTRATO:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.11 PASE MURO(PERFORACION 6") A ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RESANE--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
SEGUNDO PISO				2,00						
Secretaria de despacho				4,00						
Auditorio				1,00						
Direccion				1,00						
RAC				2,00						
Comercial				1,00						
Oficina Pablo				1,00						
PRIMER PISO										
Fiscalizacion				2,00						
Recaudo				2,00						
Juridica				1,00						
			SUBTOTAL	**17,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				13,00						
			TOTAL	**17,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.12 DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA --**	**UNIDAD:**	**m2**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Baños 1er piso	3,30	9,60		31,68						
Baños 1er piso	5,70	9,60		54,72						
Auditorio	2,50	24,40		61,00						
Auditorio	5,80	24,40		141,52						
Comercial	5,80	5,00		29,00						
Oficina Pablo	5,80	1,40		8,12						
Oficina Pablo	3,30	12,00		39,60						
Polfa	5,50	2,30		12,65						
Baños 1er piso	4,00	4,00		16,00						
Direccion y secretaria	5,50	17,10		94,05						
Fiscalizacion	4,10	15,10		61,91						
Fiscalizacion	4,30	15,10		64,93						
Frontal a parque	1,90	26,00		49,40						
Comercial	6,40	8,10		51,84						
Polfa	2,30	25,70		59,11						
			SUBTOTAL	**775,53**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				775,53						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**775,53**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA**
				13/11/2020
				DIA / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.13 DEMOLICIÓN DE PAÑETE BAJO PLACA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Frente al forum	3,00	0,80		2,40						
Frente al forum	17,00	1,50		25,50						
Frente al forum	24,50	1,50		36,75						
Polfa	15,00	1,50		22,50						
Frente al sena	15,00	1,50		22,50						
Frente al sena	6,10	1,50		9,15						
Frente al sena	8,60	1,50		12,90						
Frente al parque	33,00	1,90		62,70						
Frente al parque	24,00	1,50		36,00						
Frente cruz roja	11,60	1,70		19,72						
			SUBTOTAL	**250,12**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				126,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				124,12						
			TOTAL	**250,12**						

CROQUIS







Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

	CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.14**	**DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN MADERA, VIDRIO, PANELERIA PISO TECHO INCLUYE PUERTAS RETIRO Y DISPOSICION**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		**L**	**a**	**h**		
Auditorio		2,00	2,50	5,00						
Director		4,40	2,10	9,24						
Oficina Pablo		3,10	2,10	6,51						
Secretaria direccion		0,80	2,00	1,60						
Documentacion		3,10	2,40	7,44						
Juridica		3,00	1,40	4,20						
Juridica		1,90	0,70	1,33						
			SUBTOTAL	**35,32**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				22,35						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				11,37						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				1,60						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				0,001						
			TOTAL	**35,32**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V

Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.16 DEMOLICIÓN MUROS 0.23 A 0.35 CMS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**	**CROQUIS**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		**L**	**a**	**h**			
Oficina ing. Sistemas		3,35	2,40	8,04							
Baños pasillo 2do piso		9,60	2,40	23,04							
Baño RAC		6,55	2,30	15,07							
Baño RAC		3,90	2,93	11,43							
muro escalera pequeña		1,40	2,30	3,22							
Muro escalera demolida		3,10	0,70	2,17							
Muro escalera demolida		0,15	3,10	0,47							
Escalera demolida		1,00	0,85	0,85							
Escalera demolida		3,60	1,60	5,76							
Vano puerta fiscalizacion		1,00	2,45	2,45							
Baño fiscalizacion		0,90	2,10	1,89							
Juridica		2,35	1,10	2,59							
Juridica		2,35	1,60	3,76							
Cocina		3,20	1,10	3,52							
Ventana recepcion	1,50	1,40	2,00	4,20							
Muro baño recaudo		2,00	2,00	4,00							
Fuga fiscalizacion		1,10	0,60	0,66							
			SUBTOTAL	**93,10**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				64,32							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				17,99							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				10,79							
				-							
				-							
			TOTAL	**93,10**							





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V

Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.17**	**REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Tuberia sanitaria baño 2do piso				17,20						
Tuberia sanitaria baño 1er piso				13,80						
Tuberia hidraulica baño 2do piso				21,30						
Tuberia hidraulica baño 1er piso				20,50						
Tuberia sanitaria baño dorector				1,50						
Tuberia hidraulica baño director				6,50						
Tuberiahidraulica sala amiga				5,20						
			SUBTOTAL	**86,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				18,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				64,00						
			TOTAL	**86,0**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.18**	**DESMONTE DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO SENCILLOS O DOBLES. INCLUYE CABLEADO UTP, TOMAS REGULADOS, NO REGULADOS, CANALETAS Y DEMAS ACCESORIOS--**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PRIMER PISO										
Fiscalizacion				32,00						
Documentacion				15,00						
Juridica y recaudo				26,00						
SEGUNDO PISO										
Ing. Sistemas				3,00						
Direccion				9,00						
Secretaria de direccion				13,00						
Oficina Pablo				4,00						
Comercial				6,00						
Auditorio				22,00						
			SUBTOTAL	**130,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				57,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				63,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				10,00						
			TOTAL	**130,00**						

CROQUIS



Observaciones **La totalidad de los puntos logicos no se encontraban conectados a RAC, pero se encontraba el punto logico en canaleta debido a que no fueron desmontados correctamente con anterioridad.**

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V

Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.19 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Auditorio	14,80	6,00		2,00	177,60					
Direccion	9,20	6,00		2,00	110,40					
Secretaria direccion	6,00	5,30		2,00	63,60					
Comercial	5,90	4,90			28,91					
Oficina Pablo	5,40	3,00		2,00	32,40					
Vano escalera	2,55	6,10			15,56					
Cuarto ing. Sistemas	3,35	2,40			8,04					
Pasillo	17,50	3,10			54,25					
Sala amiga	2,50	2,00			5,00					
Juridica	6,50	3,80			24,70					
				SUBTOTAL	**520,46**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				733,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-356,18						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				143,64						
				TOTAL	**520,46**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		13/11/2020	
		DIA	**MES** / **AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.20 LIMPIEZA DE CUBIERTA Y MUROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA--**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Polfa				188,65						
Frente al parque				113,01						
Frente al sena				86,73						
Segundo piso				162,86						
Frente al farum				177,50						
				SUBTOTAL	**728,75**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				50,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				678,75						
				TOTAL	**728,75**					

CROQUIS

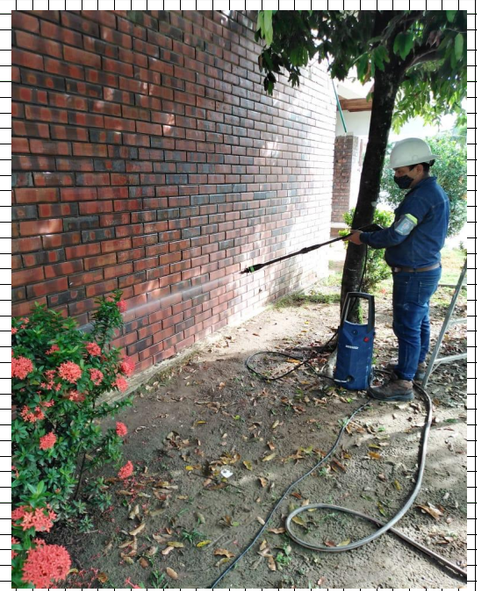

Observaciones	**A continuacion se discriminan las operaciones matematicas para encontrar el metraje cuadrado de cada area.**
POLFA	**(15,7*5,2)+(6,15*7)+(7,28*3,05)+(2,95*4,93)+(3,75*3,95)+(3,7*3,35)**
FRENTE AL PARQUE	**(11,1*2,3)+(6,3*2,3)+(16,5*0,5)+(5*3,25)+(2*3,05)+(2,2*2,75)+(5*2)+(1,5*2)+(8*0,45)+(14,5*0,24)+(28,05*0,55)+(1,1*0,76)**
FRENTE AL SENA	**(6,5*4,4)+(3*1,7)+(1,7*2,1)+(4*1,65)+(5,25*0,6)+(10,1*0,25)+(2,1*2,5)+(1,45*2,3)+(6,5*4,4)**
SEGUNDO PISO	**(6*1,5)+(5,5*1,9)+(21,3*0,32)+(1,9*0,65)+(3*2,11)+(6*2,2)+(13*2,6)+(17*4,2)+(5,2*0,24)+(1*1,7)+(0,8*1,7)+(4,79*0,94)+(1,4*1,3)**
FRENTE AL FORUM	**(20,35*2,3)+(3,85*8)+(2,75*5)+(7,3*5,9)+(7,3*5,9)**

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA** / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.21**	**DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y/O METALICA DE CUBIERTA EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Director	5,42	0,90		4,88						
Secretaria de director	4,90	2,40		11,76						
Pasillo 2do piso	1,80	1,50	5,00	13,50						
Documentacion	2,40	4,20		10,08						
Juridica	4,60	2,80		12,88						
Salientes de cubierta	0,90	7,91		7,12						
			SUBTOTAL	**60,22**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				52,70						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				7,52						
			TOTAL	**60,22**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		13/11/2020		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**NA**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.22**	**ESCARIFICACION DE PUNTOS DE FISURA EN FACHADA Y SELLO ELASTICO SIKA FLEX CONSTRUCTION O EQUIVALENTE**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa grande de cubierta	33,00			33,00						
Placa pequeña de cubierta	17,00			17,00						
			SUBTOTAL	**50,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				50,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**50,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA: **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.** **00-133-2020**
INTERVENTORIA: **N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** **N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA: **EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA** **DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME **DESDE 1/01/2021** **HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:** **90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.23** **LIMPIEZA DE SUPERFICIES, RETIRO DE MANTO Y/O IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**m2**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa grande	24,10	2,75		66,28						
Placa grande	7,30	2,40		17,52						
Placa grande	0,53	24,10		12,77						
Placa grande	14,10	1,50		21,15						
Placa grande	0,55	5,20		2,86						
Placa grande	12,80	0,50		6,40						
Placa grande	16,40	2,00		32,80						
Placa grande	15,60	2,00		31,20						
Placa grande	28,10	1,80		50,58						
Placa pequeña	9,20	3,80		34,96						
			SUBTOTAL	**276,52**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				233,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				43,52						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 0,00						
			TOTAL	**276,52**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V

Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		13/11/2020		
		DIA	**MES**	**AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.24**	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		**L**	**a**	**h**		
Bajante interno viga polfa			7,80	4,00	31,20					
Frente a cruz roja			9,75		9,75					
Frente a el sena			19,60		19,60					
Frente al forum			22,00		22,00					
Frente al parque			19,00		19,00					
Bajante interno viga frente forum			8,30	5,00	41,50					
Bajante interno viga frente parque			7,20	4,00	28,80					
Bajantes externos en placa de cubierta			32,00		32,00					
			SUBTOTAL	**203,85**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				170,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				80,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 46,15						
			TOTAL	**203,85**						

CROQUIS



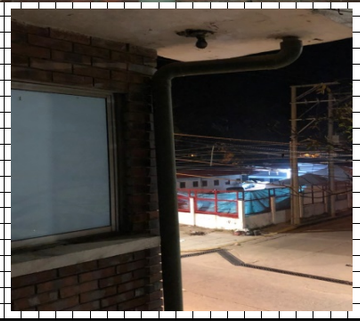

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **13/11/2020** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.25** **DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL-- ALTURAS MAYORES A 7 MTS**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Lamparas en viga canal				25,00						
SUBTOTAL				**25,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				25,00						
TOTAL				**25,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			13/11/2020	
			DIA	**MES** / **AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.26 PASE MURO(PERFORACION 2") A ALTURA MAYORES A 2 MTS INCLUYE RESANE--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Comercial				2,00						
RAC				1,00						
Auditorio				1,00						
Pasillo				6,00						
Oficina Pablo				1,00						
Secretaria direccion				4,00						
Director				2,00						
Baño 2do piso				3,00						
Fiscalizacion				2,00						
Recaudo				3,00						
Juridica				3,00						
Baño 1er piso				3,00						
Archivo recaudo				2,00						
Cocina				2,00						
Cuarto electrico				1,00						
			SUBTOTAL	**36,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				6,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				9,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				21,00						
			TOTAL	**36,00**						

CROQUIS

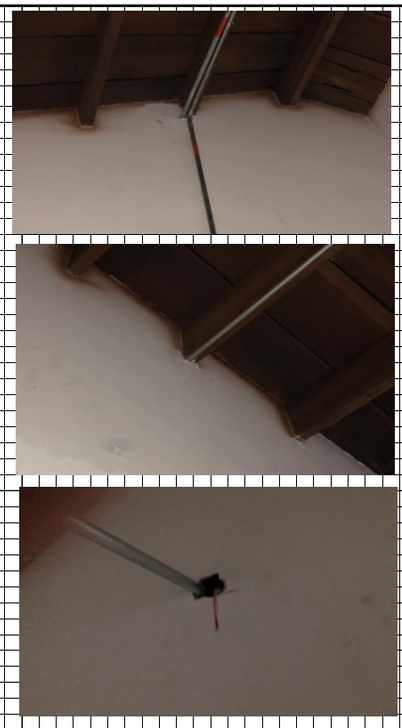

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA** / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.27**	**DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMIENTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Juridica				2,93						
Cocina				3,07						
Baños 1er piso	4,00	2,00	1,00	8,00						
			SUBTOTAL	**14,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				6,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				8,00						
			TOTAL	**14,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **13/11/2020** **DIA / MES / AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.28**	**DEMOLICION DE MEDIACAÑA EN GRAVILLA ALTURA 60 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Media caña fachada dfrente al forum	22,00			22,00						
Media caña placa de cubierta pequeña	22,20			22,20						
Media caña placa de cubierta granfe	58,15			58,15						
SUBTOTAL				**102,35**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				78,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				22,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,35						
TOTAL				**102,35**						

CROQUIS



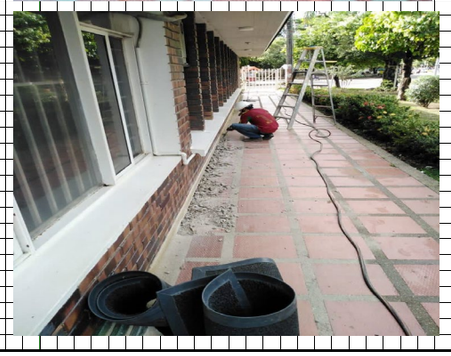

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.29**	**DESMONTE DE CABALLETES ASBESTO CEMENTO EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Auditorio	24,40			24,40						
Baños 1er piso	5,00			5,00						
Secretaria direccion	12,00			12,00						
Fiscalizacion	17,10			17,10						
Direccion	15,10			15,10						
Comercial	10,40			10,40						
Polfa	26,00			26,00						
			SUBTOTAL	**110,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				110,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**110,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.30**	**MANTENIMIENTO DE FACHADA LADRILLO A LA VISTA INCLUYE ENBOQUILLADO , SELLADOR A LTURAS MAYORES A 20 METROS**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Polfa				188,65						
Frente al parque				113,01						
Frente al sena				86,73						
Segundo piso				162,86						
Frente al farum				177,50						
			SUBTOTAL	**728,75**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				231,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				422,22						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				75,53						
			TOTAL	**728,75**						

CROQUIS





Observaciones	**A continuacion se discriminan las operaciones matematicas para encontrar el metraje cuadrado de cada area.**
POLFA	**(15,7*5,2)+(6,15*7)+(7,28*3,05)+(2,95*4,93)+(3,75*3,95)+(3,7*3,35)**
FRENTE AL PARQUE	**(11,1*2,3)+(6,3*2,3)+(16,5*0,5)+(5*3,25)+(2*3,05)+(2,2*2,75)+(5*2)+(1,5*2)+(8*0,45)+(14,5*0,24)+(28,05*0,55)+(1,1*0,76)**
FRENTE AL SENA	**(6,5*4,4)+(3*1,7)+(1,7*2,1)+(4*1,65)+(5,25*0,6)+(10,1*0,25)+(2,1*2,5)+(1,45*2,3)+(6,5*4,4)**
SEGUNDO PISO	**(6*1,5)+(5,5*1,9)+(21,3*0,32)+(1,9*0,65)+(3*2,11)+(6*2,2)+(13*2,6)+(17*4,2)+(5,2*0,24)+(1*1,7)+(0,8*1,7)+(4,79*0,94)+(1,4*1,3)**
FRENTE AL FORUM	**(20,35*2,3)+(3,85*8)+(2,75*5)+(7,3*5,9)+(7,3*5,9)**

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.31 DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL--**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Direccion				2,00						
Juridica				1,00						
Documentacion				1,00						
			SUBTOTAL	**4,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				4,00						
			TOTAL	**4,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.32 DEMOLICION DE CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL**	**UNIDAD:**	**m3**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Escalera antigua	0,85	0,26	0,20	15,00						
Muro soporte escalera	2,65	0,85	0,20	1,00						
Placa exterior frente a el sena	1,20	1,20	0,20	1,00						
			SUBTOTAL	**1,40**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				4,20						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 2,80						
			TOTAL	**1,40**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMARES**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**1.33**	**DESMONTES DE TORRES DE COMUNICACI0N ALTURAS HASTA 15 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL--**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cubierta				2,00						
			SUBTOTAL	**2,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**2,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.34 DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL--**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño Ing. Sistemas				2,00						
Baño RAC				2,00						
Baño RAC				2,00						
Baño oficina Pablo				2,00						
Bodega oficina secretaria direccion				2,00						
Baño direccion				2,00						
Baño pasillo 2do piso				2,00						
Baño pasillo 2do piso				2,00						
Baño fiscalizacion				2,00						
Baño fiscalizcion				2,00						
Baño juridica				2,00						
Baño recaudo				2,00						
			SUBTOTAL	**24,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				8,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				6,00						
			TOTAL	**24,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V

Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.35 DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15**	**UNIDAD:** **m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Pasillo		5,10	3,00	15,30						
Placa de patio		3,20	2,30	7,36						
			SUBTOTAL	**22,66**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				22,66						
			TOTAL	**22,66**						

CROQUIS





Observaciones
La placa de patio hace referencia a la placa que se encontraba en mal estado y posibe a caer, ubicada en la salida de la cacina hacia el patio frente al parque.

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **13/11/2020** **DIA** / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.36 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS**	**UNIDAD:**	**m3**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Viga escalera	2,80	0,30	0,30	2,00	0,50					
Viga descanso de escalera	2,80	0,30	0,30	2,00	0,50					
			SUBTOTAL	**1,01**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				0,01						
			TOTAL	**1,01**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **13/11/2020** **DIA** / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**1.39 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Bodega	12,00			12,00						
Documentacion	3,00			3,00						
Juridica	2,50			2,50						
			SUBTOTAL	**17,50**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				12,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				5,50						
			TOTAL	**17,50**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **13/11/2020** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**2. CIMIENTOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**2.1 ZAPATA EN CONCRETO COMUN 3000 PSI**	**UNIDAD:** **m3**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Postes de iluminacion	0,60	0,60	0,90	8,00	2,59					
SUBTOTAL				**2,59**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,59						
TOTAL				**2,59**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**3. MAMPOSTERIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**3.1 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Diagonal caido frente al sena	6,60	0,50		3,30						
Fuera del baño, frente al sena	2,70	2,00		5,40						
			SUBTOTAL	**8,70**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				8,70						
			TOTAL	**8,70**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**3. MAMPOSTERIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**		
ITEM:	**3.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño 1er piso		9,80	2,65	25,97						
Baño 1er piso		2,00	0,90	1,80						
Baño 1er piso	8,00	0,96	0,80	6,14						
Baño 1er piso	4,00	1,00	2,00	8,00						
Baño 1er piso		1,00	0,81	0,81						
Puerta recaudo		1,00	2,00	2,00						
Cocina		1,00	2,00	2,00						
Puerta fiscalizacion		1,00	2,00	2,00						
Puerta bodega recaudo		1,00	2,00	2,00						
Puerta cocina		1,00	2,00	2,00						
Baño 2do piso		5,90	2,50	14,75						
Ventana baño 2do piso		2,50	0,60	1,50						
Ventana baño 2do piso		0,85	0,60	0,51						
Puerta secretaria de direccion		1,00	2,00	2,00						
Puerta comercial		1,00	2,00	2,00						
			SUBTOTAL	**73,48**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				5,50						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				29,14						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				12,10						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				14,40						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				12,35						
			TOTAL	**73,48**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**3. MAMPOSTERIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**3.3. MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO**	**UNIDAD:** **m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cocina		1,30	2,10	2,73						
Fachada		1,00	4,27	4,27						
			SUBTOTAL	**7,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				7,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**7,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**3. MAMPOSTERIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**3.4 MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACIÓN VERTICAL PARED DOBLE**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Auditorio		0,90	2,00	1,80						
			SUBTOTAL	**1,80**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				1,60						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				0,20						
			TOTAL	**1,80**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**3. MAMPOSTERIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**3.5** **VIGA DE AMARRE DE 12*20 CMS EN CONCRETO ESTRUCTURAL DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	**UNIDAD:**	**ml**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Muro divisorio baños hombre y mujeres	3,00			3,00						
Muro frontal baño hombres y mujeres 1er piso	6,00			6,00						
Muro puerta baños hombres	1,50			1,50						
Muro puerta baños hombres	1,50			1,50						
			SUBTOTAL	**12,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				12,00						
			TOTAL	**12,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**3. MAMPOSTERIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**3.6 PLACA FACIL BLOQUELON**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Placa nueva 2do piso	2,50	2,00		5,00						
			SUBTOTAL	**5,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				5,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**5,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**4.2 ANCLAJE EN CONCRETO EN VARILLA DE 1/2"**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa nueva segundo piso				15,00						
Baño 1er piso				10,00						
Baño segundo piso				15,00						
			SUBTOTAL	**40,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				40,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**40,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**4.3 ACERO DE REFUERZO**	**UNIDAD:**	**kg** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa nueva segundo piso				30,00						
Baño segundo piso				20,00						
			SUBTOTAL	**50,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				50,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**50,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**5. CUBIERTAS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**5.1**	**CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR ARENA O GRIS, AISLAMIENTO CON POLIURETANO IGNIFUGO DE ALTA DENS 38KG/M3 ESPESOR DE 30MM, CARA INTER EN LÁMINA DE ACERO GAL CAL 28**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baños 1er piso	3,30	9,60		31,68						
Baños 1er piso	5,70	9,60		54,72						
Auditorio	2,50	24,40		61,00						
Auditorio	5,80	24,40		141,52						
Comercial	5,80	5,00		29,00						
Oficina Pablo	5,80	1,40		8,12						
Oficina Pablo	3,30	12,00		39,60						
Polfa	5,50	2,30		12,65						
Baños 1er piso	4,00	4,00		16,00						
Direccion y secretaria	5,50	17,10		94,05						
Fiscalizacion	4,10	15,10		61,91						
Fiscalizacion	4,30	15,10		64,93						
Frontal a parque	1,90	26,00		49,40						
Comercial	6,40	8,10		51,84						
Polfa	2,30	25,70		59,11						
			SUBTOTAL	**775,53**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				775,53						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**775,53**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA**
				11/04/2021
				DIA / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**5. CUBIERTAS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 30 CMS DE ANCHO-**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Frente al parque	25,70			25,70						
Frente al forum	26,00			26,00						
Frente al forum	17,10			17,10						
Frente al parque	12,00			12,00						
Frente cruz roja	15,10			15,10						
Frente al sena	4,10			4,10						
			SUBTOTAL	**100,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				100,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**100,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**5. CUBIERTAS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**5.3 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA INCLUYE INMUNIZACION Y PINTURA**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Director	5,40	0,90		4,86						
Secretaria de director	4,90	2,40		11,76						
Pasillo 2do piso	0,80	1,50	5,00	6,00						
Documentacion	2,40	4,20		10,08						
Juridica	4,60	2,80		12,88						
Salientes de cubierta	0,90	7,91		7,12						
			SUBTOTAL	**52,70**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				52,70						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**52,70**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**6. CIELOS RASOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**6.1 CIELO RASO TIPO LAY IN DE HUNTER DOUGLAS PERFORADO O SIMILAR--**	**UNIDAD:**	**m2**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Baño piso 2	5,30	4,10		21,73						
Baño piso 1	4,80	2,80		13,44						
Juridica	10,90	3,40		37,06					24,46	12,60
			SUBTOTAL	47,77						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				35,17						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				12,60						
			TOTAL	47,77						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**7. ENCHAPE Y ACCESORIOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**7.1**	**ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO .30 X ,45M TIPO ARTIC DE CORONA O SIMILAR, INCLUYE PEGA Y EMBOQUILLE, WIN PLASTICO. INCLUYE PEGA Y**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño 1er piso		22,60	2,30	51,98						
Baño 1er piso		2,85	1,50	4,28						
Baño segundo piso		20,60	2,30	47,38						
Baño director		7,30	2,10	15,33						
			SUBTOTAL	**118,97**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				56,26						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				47,38						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				15,33						
			TOTAL	**118,97**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**7. ENCHAPE Y ACCESORIOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**7.2 ESPEJO BISELADO CRISTAL DE 5 MM--**	**UNIDAD:** **m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño 1er piso		0,50	0,80	2,00	0,80					
Baño 1er piso		0,50	0,80	2,00	0,80					
Baño segundo piso		0,50	0,80	2,00	0,80					
Baño segundo piso		0,50	0,80	2,00	0,80					
Baño director		0,50	0,80		0,40					
			SUBTOTAL	**3,60**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,60						
			TOTAL	**3,60**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**7. ENCHAPE Y ACCESORIOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**7.4 TAPAS REGISTRO 20X20--**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño 1er piso				1,00						
Baño 1er piso				1,00						
Baño segundo piso				1,00						
Baño segundo piso				1,00						
Baño director				1,00						
SUBTOTAL				**5,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				2,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				3,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
TOTAL				**5,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.1 SALIDA SANITARIA 6"--**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Bajantes de placas de cubierta				7,00						
Bajantes en viga canales				15,00						
			SUBTOTAL	**22,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				2,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				20,00						
			TOTAL	**22,00**						

CROQUIS

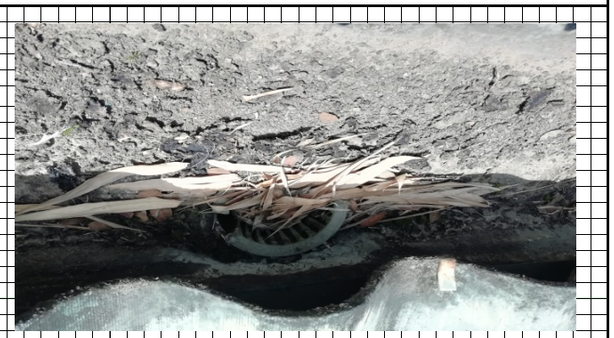



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.2 REJILLAS SOSCO 3X2--**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Baño hombre 1er piso				1,00						
Baño mujer 1er piso				1,00						
Baño director				1,00						
Baños antiguos 1er piso				1,00						
			SUBTOTAL	**4,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				3,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				2,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 1,00						
			TOTAL	**4,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.3 SALIDA SANITARIA 3"--**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Orinal baño hombres 2do piso				2,00						
Orinal baño hombres 1er piso				2,00						
			SUBTOTAL	**4,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**4,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.4 RED SANITARIA PVC DE 2"**	**UNIDAD:** **ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Red lavamanos baño mujeres 2do piso	3,20			3,20						
Red lavamanos baño hombres 2do piso	3,00			3,00						
Red lavamanos baño mujeres 1er piso	3,50			3,50						
Red lavamanos baño hombres 1er piso	6,50			6,50						
Red lavamanos baño director	2,30			2,30						
Red lavamanos sala amiga	4,30			4,30						
Reparacion de fuga en fiscalizacion	1,00			1,00						
Reparacion fuga en polfa	1,50			1,50						
			SUBTOTAL	**25,30**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				6,40						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				3,80						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				15,10						
			TOTAL	**25,30**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA / **MES** / **AÑO**	

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**8.5**	**REJILLA TIPO CÚPULA CONCENTRICA, A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO COLREJILLAS CC 4"-2", CC 6" - 3", CC 6" - 4", CC 8" - 4", CC 8" - 6" O EQUIVALENTE O SUPERIOR. (ANEXAR FICHA TÉCNICA).**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bajantes en placa de cubierta				10,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.6 RED DE BAJANTE AGUAS LLUVIA 6**	**UNIDAD:**	**ml**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Bajantes de placa de cubierta			3,20	5,00	16,00					
Frente a cruz roja			6,20		6,20					
Frente a el sena			4,50		4,50					
Frente a cruz roja			5,10		5,10					
Frente a el sena			3,50		3,50					
			SUBTOTAL	**35,30**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				80,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 44,70						
			TOTAL	**35,30**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.7 TUBERÍA PVCS 4**	**UNIDAD:** **ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño mujeres 1er piso (sanitarios)	13,30			13,30						
Baño hombre 1er piso (sanitarios)	17,40			17,40						
Baño mujeres 2do piso (sanitarios)	11,00			11,00						
Baño hombre 2do piso (sanitarios)	8,00			8,00						
			SUBTOTAL	**49,70**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				23,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				24,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,70						
			TOTAL	**49,70**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.8 CAJA INSPECCIÓN 60X60**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Antiguo baño de juridica				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.10 SALIDA SANITARIA 2"--**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Lavamanos baño hombres 2do piso				2,00						
Lavamanos baño mujeres 2do piso				2,00						
Lavamanos baño hombres 1er piso				2,00						
Lavamanos baño mujeres 1er piso				2,00						
Lavamanos baño director				1,00						
Lavamanos sala amiga				1,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				6,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				6,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				6,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 8,00						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.11 SALIDA SANITARIA 4"--**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Sanitario baño hombres 2do piso				1,00						
Sanitario baño mujeres 2do piso				3,00						
Sanitario baño hombres 1er piso				1,00						
Sanitario baño mujeres 1er piso				3,00						
Sanitario baño director				1,00						
			SUBTOTAL	**9,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				12,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 3,00						
			TOTAL	**9,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.12 RED SANITARIA COLECTORA 8 SIN ACCESORIOS**	**UNIDAD:**	**ml**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Red colectora baños hombre y mujer 1er piso	9,50			9,50						
Red colectora baños hombre y mujer 2do piso	9,50			9,50						
			SUBTOTAL	**19,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				19,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**19,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**8. RED SANITARIA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**8.13 REVENTILACIÓN 3--**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Red orinales baño hombres 2do piso	6,50			6,50						
Red orinales baño hombres 1er piso	7,40			7,40						
Red rejillas baño hombre 1er piso	4,50			4,50						
Red rejillas baño mujer 1er piso	5,50			5,50						
SUBTOTAL				**23,90**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				23,90						
TOTAL				**23,90**						

CROQUIS

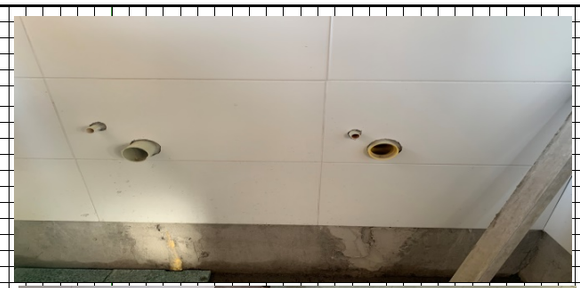

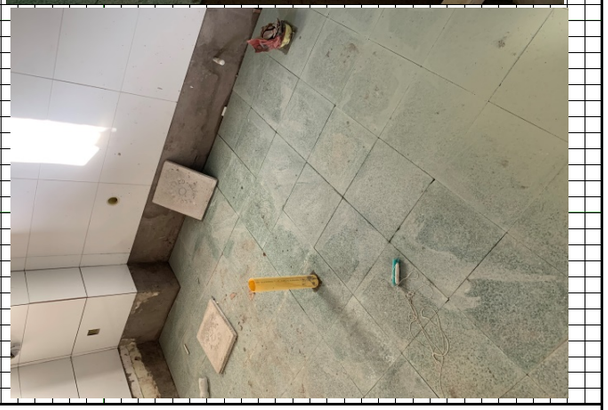

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.1** **ACOMETIDA 1#12AWG-FASE + 1#12AWG-NEUTRO + 1#12AWG TIERRA ó 2#12AWG-FASES + 1#12AWG TIERRA EN CABLE HF FR LS CT, INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Recaudo y juridica	143,10				143,10					
Pasillo y baño 1er piso	19,90				19,90					
Pasillo	120,90				120,90					
Pasillo y jefe fiscalizacion	19,83				19,83					
Escalera grande	16,47				16,47					
Baño 2do piso	33,50				33,50					
Direccion y secretaria	79,10				79,10					
Auditorio	158,40				158,40					
Pasillo y oficina pablo	150,40				150,40					
Comercial	21,93				21,93					
RAC	8,50				8,50					
Viga canal	122,30				122,30					
Descuentos por salidas	-729,00				-729,00					
				SUBTOTAL	**165,33**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				400,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 234,67						
				TOTAL	**165,33**					

CROQUIS

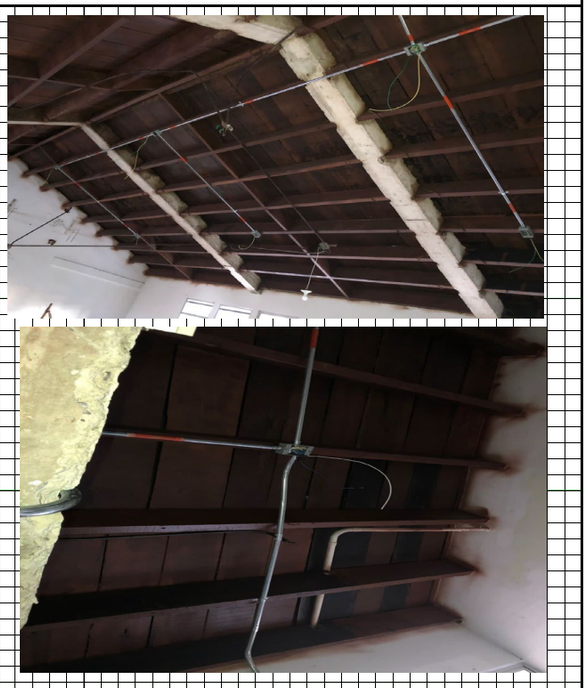

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA** / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.2** **ACOMETIDA 1#10AWG-FASES + 1#10AWG-NEUTRO + 1#10AWG TIERRA ó 2#10AWG-FASES + 1#10AWG TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Acometida aires	32,00			3,00	96,00						
Tablero de auditorio a placa de cubierta	60,90			3,00	182,70						
				SUBTOTAL	**278,70**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				278,70							
				TOTAL	**278,70**						

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.3**	**ACOMETIDA 3#8AWG-FASES + 1#8AWG-NEUTRO + 1#10AWG- TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Acometida electrobombas	25,60			3,00	76,80						
Acometida aires acondicionados	39,80			3,00	119,40						
			SUBTOTAL	**196,20**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				100,00							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				96,20							
			TOTAL	**196,20**							



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.4** **ACOMETIDA 3#6-FASES + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Acometida a tacos y electrobomba 1er piso	18,50			1,00	18,50					
Acometida aires acondicionados	23,20			3,00	69,60					
				SUBTOTAL	**88,10**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				88,10						
				TOTAL	**88,10**					

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.5**	**ACOMETIDA 3#6-FASES + 1#6-NEUTRO + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Acometida hasta caja de totalizador en RAC	117,00			1,00	117,00					
			SUBTOTAL	**117,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				117,00						
			TOTAL	**117,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA / **MES** / **AÑO**	

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.6** **ACOMETIDA 3#4-FASES + 1#4-NEUTRO + 1#8-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Acometida hasta tableros en la ups	124,00			1,00	124,00					
			SUBTOTAL	**124,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				124,00						
			TOTAL	**124,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.7**	**ACOMETIDA 3#2-FASES + 1#6-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Acometidas del 1er piso hasta auditorio	32,90			1,00	32,90					
			SUBTOTAL	**32,90**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				32,90						
			TOTAL	**32,90**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.8**	**ACOMETIDA 3#1/0-FASES + 1#6-TIERRA EN CABLE THHN 90°C. INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN--**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Acometida hasta tableros 2 en la ups	33,00			2,00	66,00					
			SUBTOTAL	**66,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				66,00						
			TOTAL	**66,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.10**	**PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DOBLE 6A: TOMA DATOS DOBLE, TOMA NORMAL, TOMA REGULADA. INCLUYE CANALETA PERIMETRAL, CABLEADO ELÉCTRICO (NORMAL Y REGULADO), RACK, PATCH CORD, PATCH PANEL Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS RACK EXISTENTE**	**UNIDAD: und** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Direccion	2,00				2,00					
Auditorio	2,00				2,00					
RAC	3,00				3,00					
Comercial	3,00				3,00					
Secreteria direccion	5,00				5,00					
Oficina Pablo	4,00				4,00					
Fiscalizacion	5,00				5,00					
Jefe fiscalizacion	3,00				3,00					
Juridica	5,00				5,00					
Jefe recaudo	1,00				1,00					
Recaudo	6,00				6,00					
Pasillo	1,00				1,00					
				SUBTOTAL	**40,00**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				40,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
				TOTAL	**40,00**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.12 Interruptor Senc. Conmutable Ave Clásica**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Punto fijo escalera pequeña	2,00			2,00						
Pasillo 1er piso	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				3,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.13 Interruptor Senc. Conmutable Luminex Clásica**	**UNIDAD:**	**und** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Escalera grande	2,00			2,00						
Garita celadores	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				3,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	MUNICIPIO DE ARAUCA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA	FECHA		
		11/04/2021		
		DIA	MES	AÑO

CONTRATISTA DE OBRA:	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	CONTRATO OBRA No. 00-133-2020	
INTERVENTORIA:	N.A	CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	EMPERATRIZ BONILLA V	FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	DESDE 1/01/2021	HASTA 31/03/2021	TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS

CAPITULO	9. RED ELECTRICA	SUB CAPITULO	NA	
ITEM:	9.14 Interruptor Sencillo Ave Clásica	UNIDAD:	und	Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Oficina Pablo				1,00						
RAC				1,00						
Sala amiga				1,00						
Pasillo				2,00						
Vano escalera pequeña				1,00						
Secretaria direccion				2,00						
Baño direccion				1,00						
Vano escalera grande				1,00						
Baño 2do piso				3,00						
Archivo oficina pablo				1,00						
Baño 1er piso				2,00						
Corredor antes de los baños				1,00						
Pasillo fiscalizacion				1,00						
Jefe recaudo				1,00						
Archivo recaudo				1,00						
Pasillo				2,00						
Celaduria				1,00						
Cuarto electrico				1,00						
Afuera cuarto eectrico				1,00						
Cuarto ing de sistemas				1,00						
Archivo juridica				1,00						
			SUBTOTAL	27,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				3,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				24,00						
			TOTAL	27,00						

CROQUIS

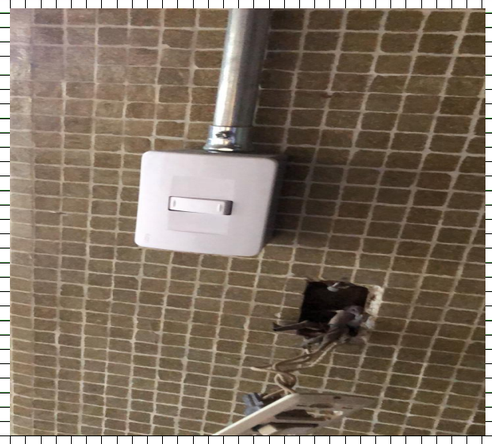

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.15 Interruptor Triple Luminex Clásica**	**UNIDAD:**	**und** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Auditorio				1,00						
Fiscalizacion				3,00						
Jefe fiscalizacion				1,00						
Juridica				1,00						
Recaudo				1,00						
Cocina				1,00						
Afuera curto electrico				1,00						
SUBTOTAL				**9,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				8,00						
TOTAL				**9,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.16 Interruptor Triple Luminex Ambia**		**UNIDAD:**	**und** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
			SUBTOTAL	-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-							
			TOTAL	-							

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.16**	**DESCONEXION Y DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS HASTA 42 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Cuarto debajo de escalera				4,00							
Cocina				1,00							
RAC				1,00							
			SUBTOTAL	**6,00**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				1,00							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				5,00							
			TOTAL	**6,00**							

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE PRESENCIA PARA ILUMINACION MULTIFUNCON--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Pasillo 1er piso				1,00						
Antes de baño 1er piso				1,00						
Escalera grande				1,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.19** **LUMINARIA PANEL LED 18W DE SOBREPONER O INCRUSTAR, 100- 240V, 6500K, MINIMO 1170 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 70, MINIMO 65LM/W, MINIMO 25.000 HRS.-- REF 24338 O SIMILAR**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Escalera grande				2,00						
Escalera pequeña				2,00						
Pasillo				4,00						
Baño				5,00						
Baño direccion				1,00						
Bodega ecretaria direccion				1,00						
Bodega oficina pablo				1,00						
Celaduria				3,00						
Afuera cuarto electrico				2,00						
Viga canal				25,00						
				SUBTOTAL	**46,00**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				17,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				29,00						
				TOTAL	**46,00**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.20** LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Oficina pablo				3,00						
RAC				2,00						
Sala amiga				1,00						
Fiscalizacion				24,00						
Baños 1er piso				4,00						
Pasillos				10,00						
Juridica				6,00						
Archivo juridica				1,00						
Ing. De sistemas				1,00						
Jefe recaudo				2,00						
Recaudo				6,00						
Archivo recaudo				2,00						
Cocina				6,00						
Cuarto electrico				2,00						
Baño cocina				2,00						
			SUBTOTAL	**72,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				72,00						
			TOTAL	**72,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.22**	**LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR O SUSPENDER, CHASIS DE ALUMINIO, 100-277V, 6000K, MINIMO 3600 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, MINIMO 90LM/W, F.P MAYOR A 0.92, MINIMO 50.000 HRS-- ALTURAS MAYORES A 7 MTS**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		**L**	**a**	**h**		
Auditorio				10,00						
Direccion				6,00						
Secretaria de direccion				4,00						
Comercial				4,00						
			SUBTOTAL	**24,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				20,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				4,00						
			TOTAL	**24,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.23 TUBO EMT DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE**	**UNIDAD:**	**ml**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Viga canal				28,00						
Viga canal				36,00						
Viga canal				19,00						
Viga canal				8,00						
Viga canal				17,00						
Viga canal				24,00						
Viga canal				16,00						
Frente a cruz roja				9,00						
Cuarto electrico				14,00						
Celaduria				9,00						
Descuentos por salidas				-180,00						
				SUBTOTAL	-					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				120,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 120,00						
				TOTAL	-					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.24 TUBO EMT DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE**	**UNIDAD:**	**ml** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Pasillo y baño 1er piso				19,90							
Pasillo y jefe fiscalizacion				19,83							
Escalera grande				16,47							
Baño 2do piso				13,50							
Dirccion y secretaria de direccion				59,10							
Auditorio				52,80							
Pasillo y oficina pablo				75,20							
Comercial				21,93							
RAC				8,50							
Descuentos por salida				-96,00							
			SUBTOTAL	**191,23**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				100,00							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				91,23							
			TOTAL	**191,23**							



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.25 TUBO EMT DE 1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE**	**UNIDAD:**	**ml** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Pasillo 1er piso	4,50			3,00	13,50					
Pasillo 1er piso	4,50			3,00	13,50					
Pasillo 1er piso	4,50			3,00	13,50					
Pasillo 1er piso	13,00			3,00	39,00					
Pasillo 1er piso	4,20			3,00	12,60					
Pasillo 1er piso	3,30			3,00	9,90					
Pasillo 1er piso	3,30			3,00	9,90					
Pasillo 1er piso	3,00			3,00	9,00					
			SUBTOTAL	**120,90**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				120,90						
			TOTAL	**120,90**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.26 TUBO EMT DE 1". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE**	**UNIDAD:**	**ml** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Red tuberia 1" Recaudo	47,70			1,00	47,70					
Red tuberia para Electrobomba pequeña	19,00			1,00	19,00					
			SUBTOTAL	**66,70**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				27,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				39,70						
			TOTAL	**66,70**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.27 TUBO EMT DE 2". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE**	**UNIDAD:**	**ml**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**		**L**	**a**	**h**		
Red cubierta grande	85,10			1,00	85,10					
Red no regulada	32,50			1,00	32,50					
Red de tablero auditorio a Aires	32,00			1,00	32,00					
			SUBTOTAL	**149,60**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				6,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				143,60						
			TOTAL	**149,60**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.28 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MIN, INCLUYE DOS (2) BOMBILLAS.**	**UNIDAD:**	**und** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Pasillo 2do psio				3,00						
Escalera grande				2,00						
Pasillo 1er piso				2,00						
celaduria				1,00						
Recaudo				1,00						
Juridica				1,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				10,00						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.29 ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X8 + 1X10 AWG Ø 1 EMT**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Aire 1 placa de cubierta pequeña	42,00			1,00	42,00					
Aire 2 placa de cubierta pequeña	45,00			1,00	45,00					
Aire 3 placa de cubierta pequeña	48,00			1,00	48,00					
Aire 1 viga canal frente a parque	28,00			1,00	28,00					
Aire 1 viga canal frente a parque	24,80			1,00	24,80					
			SUBTOTAL	**187,80**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				187,80						
			TOTAL	**187,80**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.30 ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X2/0 + 1X1/0 AWG Ø 2 EMT**	**UNIDAD:**	**ml** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Tablero auditorio 36 ctos				15,00						
Tablero auditorio 12 ctos				15,00						
Tablero RAC 12 ctos				41,42						
			SUBTOTAL	**71,42**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				71,42						
			TOTAL	**71,42**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.31 ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X2 + 1X4 AWG Ø 1- 1/2 EMT**	**UNIDAD:**	**ml** / **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Tablero RAC ctos				58,70							
			SUBTOTAL	**58,70**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4											
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				58,70							
			TOTAL	**58,70**							





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.33 ACOMETIDA DE CIRCUITO EN CABLE CU 3X6 + 1X8 AWG Ø 1- 1/2 EMT**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Aire 1 frente al sena				78,20						
Aire 2 frente al sena				78,20						
Aire 3 frente al sena				51,50						
			SUBTOTAL	**207,90**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				207,90						
			TOTAL	**207,90**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.35 SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Cocina				1,00						
Oficina Pablo				1,00						
Pasillo 1er piso				1,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.36**	**SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, TOMA DOBLE, CLAVIJA, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Lamparas 60x60 segundo piso				24,00						
Lamparas 60x60 primer piso				72,00						
Lamparas segundo piso				16,00						
Lamparas primer piso				5,00						
Lamparas viga canal				25,00						
			SUBTOTAL	**142,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				47,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				32,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				63,00						
			TOTAL	**142,00**						

CROQUIS

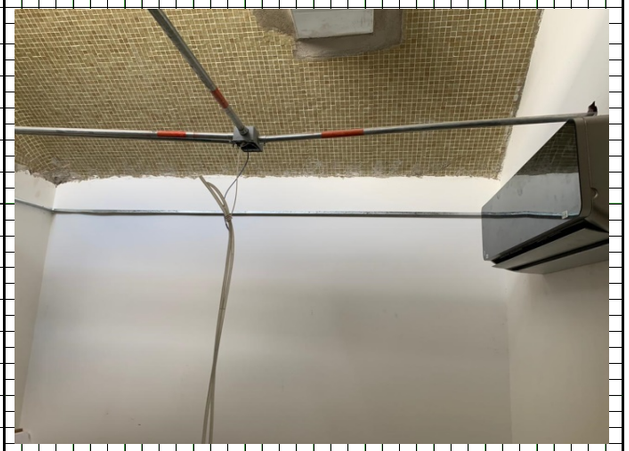

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:** **90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.37**	**SALIDA DE INTERRUPTOR INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Oficina Pablo				1,00							
RAC				1,00							
Sala amiga				1,00							
Pasillo				2,00							
Vano escalera pequeña				1,00							
Secretaria direccion				2,00							
			SUBTOTAL	**8,00**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				4,00							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				4,00							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-							
			TOTAL	**8,00**							

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.38**	**SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD: und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Baño direccion				1,00							
Vano escalera grande				1,00							
Archivo oficina Pablo				1,00							
Baño 1er piso				2,00							
			SUBTOTAL	**5,00**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3											
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				8,00							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 3,00							
			TOTAL	**5,00**							

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.39** **SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Celaduria				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				8,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 7,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS

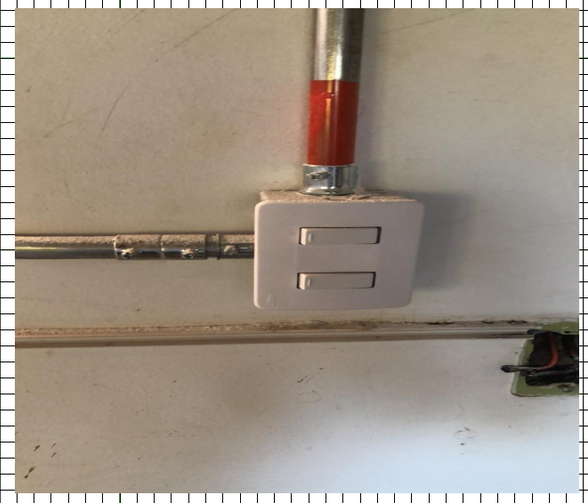

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.40**	**SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD: und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Fiscalizacion				3,00						
Jefe fiscalizacion				1,00						
			SUBTOTAL	**4,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3										
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				4,00						
			TOTAL	**4,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.41**	**SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Auditorio				1,00						
Juridica				1,00						
Recaudo				1,00						
Cocina				1,00						
Afuera cuarto electrico				1,00						
SUBTOTAL				**5,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				1,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				2,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,00						
TOTAL				**5,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.42**	**SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Corredor a baños 1er piso				1,00						
Pasillo fiscalizacion				1,00						
Jefe recaudo				1,00						
Archivo recaudo				1,00						
Pasillo 1er piso				2,00						
Celaduria				1,00						
Escalera grande				1,00						
Cuarto electrico				1,00						
Afuera cuarto electrico				1,00						
Cuarto ing. Sistemas				1,00						
Archivo juridiica				1,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				6,00						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:** **90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.43**	**SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F- N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Direccion				1,00						
Comercial				2,00						
Baño cocina				1,00						
Auditorio				3,00						
			SUBTOTAL	**7,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**7,00**						

CROQUIS

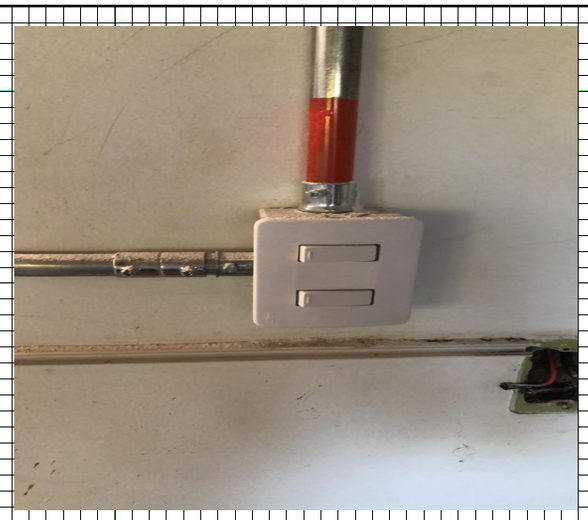

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.44 Salida Bifásica+ Toma Tubo Emt Ø 1/2**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cocina				1,00						
Motobomba				1,00						
Oficina Pablo				1,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.45 Salida Bomba Trifásica Tubo Emt--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Bomba 1 placa				1,00						
Bomba 2 placa				1,00						
			SUBTOTAL	**2,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,00						
			TOTAL	**2,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.46** **SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V - 15A CON PROTECCIÓN GFCI, INCLUYE CABLEADO NO. 12 AWG THHN (F-N-T), TOMA DOBLE GFCI, DUCTERIA EMT 1/2", CAJA METALICA TIPO RAWELT, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Mesones de cocina				3,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS

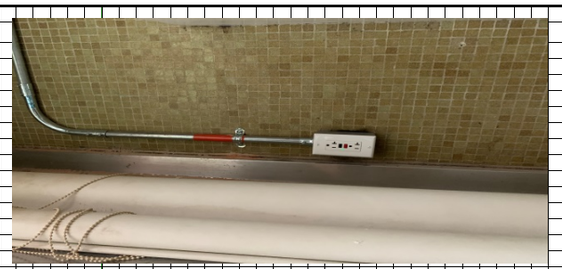



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.47**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE 120V, 15A INCLUYE TOMA DOBLE COLOR BLANCO, CAJA METÁLICA TIPO RAWLET, DUCTERÍA EMT 1/2", CABLEADO N°12AWG THHN (F-N-T), ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Oficina pablo				1,00						
RAC				1,00						
Sala amiga				1,00						
Pasillo 2do piso				2,00						
Vano escalera pequeña				1,00						
Secretaria direccion				2,00						
Direccion baño				1,00						
Vano escalera grande				1,00						
Baño 2do piso				3,00						
Archivo oficia pablo				1,00						
Baño 1er piso				2,00						
Pasillos 1er piso y celaduria				6,00						
Juridica				2,00						
Fiscalizacion				1,00						
Recaudo				1,00						
Cocina				2,00						
Cuarto electrico				2,00						
			SUBTOTAL	**30,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				10,00						
			TOTAL	**30,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**9.48**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) SOBREPUESTO. INCLUYE TOMA, TAPA, CAJA TIPO RAWELT 2X4, DUCTERÍA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG THHN. 3ML X SALIDA**	**UNIDAD: und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Fiscalizacion				3,00						
Recaudo				5,00						
Juridica				1,00						
Jefe fiscalizacion				1,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				10,00						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS



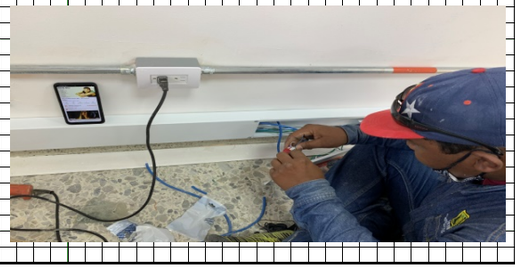

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.50 BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 30 A 50 AMP AJUSTABLE-**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Tablero 18 ctos				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS

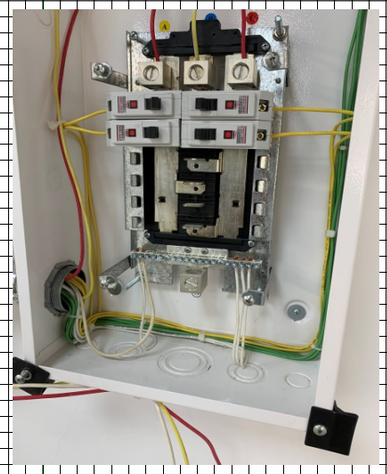

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.51 BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 56 A 80 AMP AJUSTABLE-**	**UNIDAD:**	**und** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Tablero 32 ctos				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.52 BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 87 A 125 AMP AJUSTABLE-**	**UNIDAD:**	**und** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Tablero 12 ctos				3,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.54 BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 70-100 AMP 25KA AJUSTABLE--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Caja 1 cuarto electrico				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.55 BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 112-160A 25kA AJUSTABLE--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Caja 2 cuarto electrico				1,00						
				SUBTOTAL	**1,00**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
				TOTAL	**1,00**					

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**


CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.56 BREAKER INDUSTRIAL DE 3 X 140-200A 25kA AJUSTABLE--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Caja 3 cuarto electrico				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS

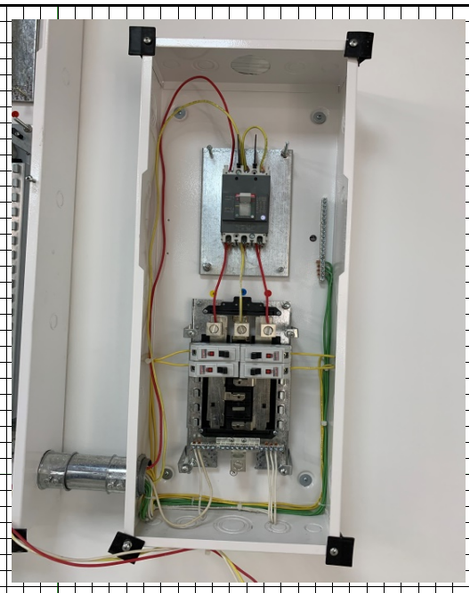

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.57 BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A ó 2X30A DE 10KA-**	**UNIDAD:** **und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Tablero de 32 ctos				10,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				10,00						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.58 BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40A DE 10KA-**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Tablero de 32 ctos				4,00						
Tablero de 12 ctos				3,00						
			SUBTOTAL	**7,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				7,00						
			TOTAL	**7,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.59 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X30A o 3X40A DE 10KA-**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Tablero de 18 ctos				3,00						
Tablero 1 de 12 ctos				2,00						
			SUBTOTAL	**5,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				5,00						
			TOTAL	**5,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.63 Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 12 Ctos**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto electrico				1,00						
Auditorio				1,00						
RAC				1,00						
			SUBTOTAL	**3,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				3,00						
			TOTAL	**3,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.65 Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 36 Ctos**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Auditorio				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS

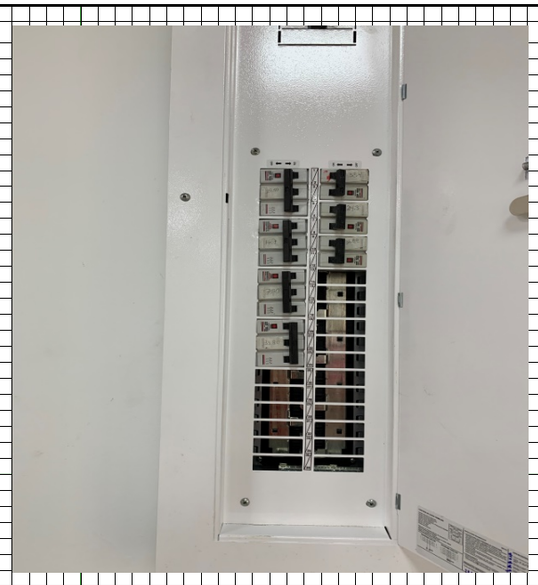

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED ELECTRICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**9.66 Tablero Trif. C/Puerta Y Chapa 18 Ctos**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
RAC				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**10. CARPINTERIA METALICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**10.1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 (INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO-- INOX)--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Puerta baño de hombres				2,00						
Puerta baño de mujeres				2,00						
Puerta baño director				1,00						
Secretaria de direccion				2,00						
Bodega secretaria de direccion				1,00						
Oficina Pablo				1,00						
Comercial				1,00						
RAC				1,00						
Sala amiga				1,00						
Jefe fiscalizacion				1,00						
				SUBTOTAL	**13,00**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				13,00						
				TOTAL	**13,00**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**10. CARPINTERIA METALICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PARA VENTANERÍA DE TRÁFICO PESADO, TODO ELEMENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DOBLE VIDRIO EN COLOR HUMO TEMPLADO LAMINADO (4MM+4MM) CON PELÍCULA INTERMEDIA**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	VALOR		L	a	h		
Comercial	1,20	0,85	4,00	4,08						
RAC	1,20	0,85	2,00	2,04						
Auditorio	1,20	0,85	11,00	11,22						
Direccion	1,20	0,85	5,00	5,10						
Secretaria de direccion	1,20	0,85	5,00	5,10						
Oficina Pablo	1,20	1,20		1,44						
Placa cubierta grande	1,35	0,80	3,00	3,24						
Placa cubierta grande	14,90	0,55		8,20						
Placa cubierta grande	10,50	0,85		8,93						
Baño 2do piso	1,30	2,50		3,25						
Baño 2do piso	0,85	0,85		0,72						
Baño 1er piso	0,80	0,80	7,00	4,48						
Ventanilla gestion de fiscalizacion	1,50	1,50		2,25						
			SUBTOTAL	**60,04**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				40,72						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				19,32						
			TOTAL	**60,04**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**10. CARPINTERIA METALICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**10.3** **PUERTAS EN VIDRIO TEtemplado 10 MM DE 1.8 MTS ALT 2.20 (INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRAULICA, CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO-- INOX)--**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	VALOR		L	a	h		
Direccion			1,00	1,00						
Juridica			1,00	1,00						
			SUBTOTAL	**2,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,00						
			TOTAL	**2,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**10. CARPINTERIA METALICA**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**10.4**	**ESCALERA DE GATO CON GUARDA HOMBRE INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y ANCLAJES**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	VALOR		L	a	h			
Ubicada frente supermercado			2,50	2,50							
			SUBTOTAL	**2,50**							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-							
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,50							
			TOTAL	**2,50**							



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**	
		11/04/2021	
		DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**11. PINTURAS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**11.1 ESTUCO Y PINTURA BAJO TECHOS --**	**UNIDAD:** **m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	**ELEMENTOS LLENOS**				**VALOR PARCIAL**	**VANOS**			**VALOR PARCIAL**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**VALOR**		**L**	**a**	**h**		
Viga canal frente forum	3,00		1,80	5,40						
Viga canal frente forum	17,00		3,20	54,40						
Viga canal frente forum	24,40		3,20	78,08						
Frente al sena	15,00		3,20	48,00						
Frente al sena	6,20		3,20	19,84						
Frente al sena	8,60		3,20	27,52						
Frente al parque	33,00		3,60	118,80						
Frente al parque	24,00		3,20	76,80						
Frente a cruz roja	11,60		3,40	39,44						
Frente a cruz roja	3,80		3,20	12,16						
Frente a cruz roja	3,30		3,70	12,21						
Frente a cruz roja	4,50		3,70	16,65						
Polfa	15,00		3,20	48,00						
Viga canal de placas de cubierta	8,95		2,20	19,70						
			SUBTOTAL	**577,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				175,06						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				401,94						
			TOTAL	**577,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**11. PINTURAS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**11.2 PINTURA ESMALTE TUBERIA DIAMETROS VARIOS ALTURA MAYORES A 4 METROS**	**UNIDAD:**	**ml**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	VALOR		L	a	h		
Frente a cruz roja			9,75							
Frente a el sena			9,60							
			SUBTOTAL	**19,35**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				15,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				4,35						
			TOTAL	**19,35**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**11. PINTURAS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**11.4 VINILO TIPO I 3 MANOS INCLUYE RESANES**		**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR	VANOS			VALOR	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PARCIAL	L	a	h	PARCIAL	
Auditorio				152,42	152,42				20,00	132,42
Direccion				83,62	83,62				12,00	71,62
Secretaria de direccion				116,22	116,22				7,00	109,22
Comercial				107,00	107,00				8,00	99,00
Pasillos				64,25	64,25					64,25
Oficina Pablo				47,50	47,50					47,50
Vanos escalera				48,00	48,00					48,00
PRIMER PISO										
Juridica y jefe de recaudo				118,69	118,69				9,18	109,51
Recaudo				102,50	102,50				16,58	85,92
Pasillo entrada				9,50	9,50				2,00	7,50
Afuera antiguo cuarto electrico				11,00	11,00				2,00	9,00
Jefe fiscalizacion				54,50	54,50				9,52	44,98
Fiscalizacion				123,00	123,00				3,53	119,47
Puerta sellada en recaudo				2,15	2,15					2,15
Puerta sella cocina				2,10	2,10					2,10
Marco cocina				3,52	3,52					3,52
Reparacion fuga fiscalizacion				0,66	0,66					0,66
			SUBTOTAL	**956,82**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				956,82						
									TOTAL	956,82

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**11. PINTURAS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**11.5**	**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA EXISTENTE INCLUYE LIJADO, PINTURA, INMUZANTE Y CAMBIO DE PIEZAS**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Auditorio	14,80	6,00		2,00						177,60
Director	9,20	6,00								55,20
Secretaria de director	6,00	5,30								31,80
Comercial	5,90	4,90								28,91
Oficina Pablo	5,40	3,00								16,20
Vano Escalera pequeña	2,55	6,10								15,56
RAC	4,20	3,30								13,86
			SUBTOTAL	**339,13**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				487,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 147,88						
									TOTAL	**339,13**

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**11. PINTURAS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**11.7 ESTUCO PLASTICO --**	**UNIDAD:** **m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Pasillo y sala amiga		12,00	1,25		15,00					
Pasillo y sala amiga		2,10	1,35	2,00	5,67					
Vano escalera demolida		5,70	2,50		14,25					
Comercial				16,42	16,42					
Vano escalera auxiliar				15,90	15,90					
Oficina Pablo				24,38	24,38					
Vano escalera auxiliar				38,40	38,40					
Secretaria de despacho				47,04	47,04					
Puerta secretaria de despacho				2,00	2,00					
Director				30,70	30,70					
Auditorio				14,00	14,00					
Vano escalera demolida 1er piso				17,79	17,79					
Primer piso					82,10					
			SUBTOTAL	**323,65**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				150,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				173,65						
			TOTAL	**323,65**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**12. CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**12.1 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 1500 P.S.I.**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Zapata para postes de alumbrado publico	0,60	0,60	0,08	8,00	0,23					
			SUBTOTAL	**0,23**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 9,77						
			TOTAL	**0,23**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		13/11/2020		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 10/10/2020**	**HASTA 13/11/2020**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 34 DIAS**

CAPITULO	**10. CONCRETO- MORTEROS Y PAÑETES**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**12.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cantidad de muro nuevo construido			73,48	2,00	146,97					
Pañete en altura segundo piso	28,00		2,20		61,60					
Pañete debajo de escalera demolida		6,50	2,10		13,65					
Pañete baño recaudo		2,50	2,20		5,50					
Pañete baño juridica		1,80	2,00		3,60					
Reparacion fuga fiscalizacion		1,10	0,60		0,66					
				SUBTOTAL	**231,98**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				87,92						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				89,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				52,46						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				2,60						
				TOTAL	**231,98**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**9. RED DE GAS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**13.1**	**DESMONTES Y REINSTALACION DE AIRES TIPO CONDENSADORAS INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACION POSTERIOR EN SITIO INDICADO**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Antiguo ing. De sistemas	1,00			1,00						
Director	2,00			2,00						
Auditorio	2,00			2,00						
Secretaria de despacho	1,00			1,00						
Cuarto de RAC	1,00			1,00						
Baño 1er piso	1,00			1,00						
Antigua oficina Pablo	2,00			2,00						
Comercial	1,00			1,00						
Recaudo	2,00			2,00						
Fiscalizacion	2,00			2,00						
Jefe fiscalizacion	1,00			1,00						
Sala amiga	1,00			1,00						
Recaudo	2,00			2,00						
Jefe recaudo	1,00			1,00						
Baño 2do piso	1,00			1,00						
Juridica	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**22,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				11,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				11,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**22,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**15. IMPERMEABILIZACION**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**15.1**	**PREPARACIÓN SUSTRATO (SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR) MODO MANUAL O MECÁNICO QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM D 42 58 Y PERFIL DE ANCLAJE ICR Y GRADO MÍNIMO CSP 2 .**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa grande	24,10	2,75		66,28						
Placa grande	7,30	2,40		17,52						
Placa grande	0,53	24,10		12,77						
Placa grande	14,10	1,50		21,15						
Placa grande	0,55	5,20		2,86						
Placa grande	12,80	0,50		6,40						
Placa grande	16,40	2,00		32,80						
Placa grande	15,60	2,00		31,20						
Placa grande	28,10	1,80		50,58						
Placa pequeña	9,20	3,80		34,96						
			SUBTOTAL	**276,52**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				276,52						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**276,52**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**15. IMPERMEABILIZACION**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**15.2**	**SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPRIMANTE**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa grande	24,10	2,75		66,28						
Placa grande	7,30	2,40		17,52						
Placa grande	0,53	24,10		12,77						
Placa grande	14,10	1,50		21,15						
Placa grande	0,55	5,20		2,86						
Placa grande	12,80	0,50		6,40						
Placa grande	16,40	2,00		32,80						
Placa grande	15,60	2,00		31,20						
Placa grande	28,10	1,80		50,58						
Placa pequeña	9,20	3,80		34,96						
			SUBTOTAL	**276,52**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				276,52						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**276,52**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**15. IMPERMEABILIZACION**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**15.3**	**SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL (CERESTIC, BRONCOELASTICO O EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE**	**UNIDAD:** **m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa grande	24,10	2,75		66,28						
Placa grande	7,30	2,40		17,52						
Placa grande	0,53	24,10		12,77						
Placa grande	14,10	1,50		21,15						
Placa grande	0,55	5,20		2,86						
Placa grande	12,80	0,50		6,40						
Placa grande	16,40	2,00		32,80						
Placa grande	15,60	2,00		31,20						
Placa grande	28,10	1,80		50,58						
Placa pequeña	9,20	3,80		34,96						
			SUBTOTAL	**276,52**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				138,26						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				138,26						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 0,00						
			TOTAL	**276,52**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**		
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**		
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**15. IMPERMEABILIZACION**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**15.4 REGATEO EN ANTEPECHOS PARA SELLOS POR MEDIOS MECÁNICO.**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Regateo en fachada	24,10			24,10						
Regateo en fachada	7,30			7,30						
Regateo en fachada	24,10			24,10						
Regateo en fachada	14,10			14,10						
Regateo en fachada	1,20			1,20						
Regateo en fachada	12,80			12,80						
Regateo en fachada	16,40			16,40						
			SUBTOTAL	**100,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				100,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**100,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**16. RED HIDRAULICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**16.1 PUNTO A.F. DE 1/2"--**	**UNIDAD:**	**und**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Orinales				4,00						
Lavamanos baños 2do piso				4,00						
Lavamanos baños 1er piso				4,00						
Lavamanos sala amiga				1,00						
Lavamananos direccion				1,00						
Sanitarios baños 2do piso				4,00						
Sanitarios baños 1er piso				4,00						
Sanitario direccion				1,00						
			SUBTOTAL	**23,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				12,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**23,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**16. RED HIDRAULICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**16.2**	**SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CONFORMADO POR: 2 BOMBAS DE 2 A 3 HP CADA UNA, UN TANQUE HIDROFLO DE 200 LITROS, INCLUYE TABLERO ELECTRICO Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO --**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa de cubierta				1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**16. RED HIDRAULICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**16.3 RED DE TUBERIA PVCP DE 1/2" RDE 13.5 CON ACCESORIOS.-**	**UNIDAD:**	**ml** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño direccion	8,00			8,00						
Baños 1er piso	35,00			35,00						
Baños 2do piso	25,50			25,50						
Sala amiga	7,00			7,00						
			SUBTOTAL	**75,50**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				55,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				20,50						
			TOTAL	**75,50**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**16. RED HIDRAULICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**16.4 PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA**	**UNIDAD:** un	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Frente a parque	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**1,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**1,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**16. RED HIDRAULICA**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**16.5 VÁLVULA DE REGISTRO 1/2**	**UNIDAD:**	**und**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VANOS L	a	h	VALOR PARCIAL	TOTAL
Baños 1er piso	2,00			2,00						
Baños 2do piso	2,00			2,00						
Baño director	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**5,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				1,00						
			TOTAL	**5,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**17. FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**17.1**	**DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM PELICULA PVB COLOR TIPO PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y ACEESORIOS EN ACERO INOX--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Direccion		4,50	2,20		9,90	2,00	0,80	2,00	3,20	
Sala amiga		2,00	2,30		4,60	1,00	0,80	2,00	1,60	
RAC		2,05	2,30		4,72	1,00	0,80	2,00	1,60	
Oficina Pablo		2,20	2,30		5,06	1,00	0,80	2,00	1,60	
Jardin		2,70	2,80		7,56					
Divisiones en sanitarios		12,55	1,80		22,59					
Divisiones en orinales		1,00	0,70	4,00	2,80					
				SUBTOTAL	**49,23**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				49,23						
				TOTAL	**49,23**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**18. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**18.1**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWER ONE O SIMILAR--**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baños 1er piso	4,00			4,00						
Baños 2do piso	4,00			4,00						
Baño director	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**9,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				9,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**9,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA**
				11/04/2021
				DIA / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**18. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**19.1** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA---**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baños 1er piso	2,00			2,00						
Baños 2do piso	2,00			2,00						
SUBTOTAL				**4,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				4,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
TOTAL				**4,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**18. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**19.1**	**MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 10 CMS INCLUYE ESTRUCTURA METALICA --**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Meson baño hombes 1er piso	1,60			1,60						
Meson baño mujeres 1er piso	1,60			1,60						
Meson baño hombres 2do piso	1,60			1,60						
Meson baño mujeres 2do piso	1,60			1,60						
Meson baño director	1,20			1,20						
Meson sala amiga	1,20			1,20						
			SUBTOTAL	**8,80**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				10,30						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 1,50						
			TOTAL	**8,80**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

	CAPITULO	**18. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**18.6**	**LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA TI´PO PUSH- Y VALVULA DE PEDAL**	**UNIDAD:**	**und**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Lavamanos baño 1er piso	4,00			4,00						
Lavamanos baño 2do piso	4,00			4,00						
Lavamanos baño director	1,00			1,00						
Lavamanos sala amiga	1,00			1,00						
			SUBTOTAL	**10,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				10,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**10,00**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	MES / AÑO
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**19. PISOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**19.1 PISO EN GRANITO DE 33X 33 PULIDO Y SELLADO**		**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño 1er piso	2,30	3,15		7,25						
Baño 1er piso	3,00	1,15		3,45						
Baño 1er piso	1,60	1,95		3,12						
Baño 1er piso	4,50	1,00		4,50						
Bajo nueva placa	2,50	1,86		4,65						
Juridica	2,00	1,60		3,20						
Recaudo	1,30	1,96		2,55						
Baño 2do piso	3,30	2,40		7,92						
Baño 2do piso	3,10	1,30		4,03						
Baño 2do piso	2,40	2,55		6,12						
Baño direccion	1,80	1,85		3,33						
Pasillo	4,80	3,50		16,80						
Pasillo	2,90	4,90		14,21						
Sala amiga	2,00	2,40		4,80						
Placa nueva	4,86	2,00		9,72						
Cocina	1,10	2,80		3,08						
			SUBTOTAL	**98,72**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				59,93						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				16,74						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				22,05						
			TOTAL	**98,72**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**	**FECHA**		
		11/04/2021		
		DIA	**MES**	**AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**19. PISOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**19.2 MEDICAÑA EN GRAVILLA FINA**	**UNIDAD:** **ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Fachada frontal	12,50			12,50						
			SUBTOTAL	**12,50**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				12,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				0,50						
			TOTAL	**12,50**						

CROQUIS

[redacted]

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA


OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA**
				11/04/2021
				DIA / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**19. PISOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**19.3 MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON XYPEX O EQUIVALENTE**	**UNIDAD:**	**ml**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa de cubierta pequeña	9,20			9,20						
Placa de cubierta pequeña	9,20			9,20						
Placa de cubierta pequeña	3,80			3,80						
Placa de cubierta grande	24,10			24,10						
Placa de cubierta grande	7,30			7,30						
Placa de cubierta grande	24,10			24,10						
			SUBTOTAL	**77,70**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				46,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				14,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				17,70						
			TOTAL	**77,70**						

CROQUIS

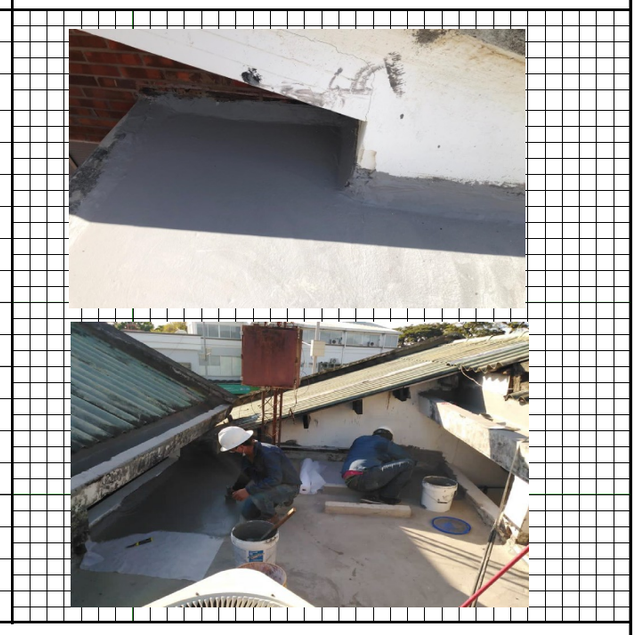

Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**19. PISOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**19.4 PISO EN GRANITO DE 33X 33 PULIOD Y SELLADO ANCHOS MENORES A 60 CMS**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Segundo piso	23,00				23,00					
Primer piso	12,00				12,00					
			SUBTOTAL	**35,00**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				30,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				5,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				-						
			TOTAL	**35,00**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**19. PISOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**19.5 ALISTADO DE PISO 4CM**	**UNIDAD:**	**m2**

Pagina 1 de 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa de cubierta pequeña	9,20		3,80	34,96						
Placa de cubierta grande	24,10		2,75	66,28						
Placa de cubierta grande	7,30		2,40	17,52						
			SUBTOTAL	**118,76**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				98,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				90,69						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				- 69,93						
			TOTAL	**118,76**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	MES / AÑO
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**19. PISOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**19.6 ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO--**	**UNIDAD:**	**m2**	**Pagina**	**1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Baño 1er piso	2,30	3,15		7,25						
Baño 1er piso	3,00	1,15		3,45						
Baño 1er piso	1,60	1,95		3,12						
Baño 1er piso	4,50	1,00		4,50						
Bajo nueva placa	2,50	1,86		4,65						
Juridica	2,00	1,60		3,20						
Recaudo	1,30	1,96		2,55						
Baño 2do piso	3,30	2,40		7,92						
Baño 2do piso	3,10	1,30		4,03						
Baño 2do piso	2,40	2,55		6,12						
Baño direccion	1,80	1,85		3,33						
Pasillo	4,80	3,50		16,80						
Pasillo	2,90	4,90		14,21						
Sala amiga	2,00	2,40		4,80						
Placa nueva	4,86	2,00		9,72						
Cocina	1,10	2,80		3,08						
			SUBTOTAL	**98,72**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				48,65						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				22,74						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				27,33						
			TOTAL	**98,72**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA**
				11/04/2021
				DIA / **MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**NP. NO PREVISTOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**NP1 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CIELO RASO EN DRYWALL**	**UNIDAD:**	**m2** — **Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Pasillo	15,00	3,10		46,50						
RAC	2,00	1,90		3,80						
Sala amiga	2,50	2,00		5,00						
Escalera	2,05	2,90		5,95						
Comercial	4,55	2,60		11,83						
Baño 1er piso	2,00	4,50		9,00						
Salida a patio	2,30	2,50		5,75						
Baño director	2,00	2,20		4,40						
			SUBTOTAL	**92,23**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				73,08						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				19,15						
			TOTAL	**92,23**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**			**FECHA** **11/04/2021** **DIA / MES / AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**NP. NO PREVISTOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**
ITEM:	**NP2 GUARDAESCOBA EN GRANO DE MARMOL O SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD:**	**m2**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Pasillo	18,40			18,40						
RAC	3,80			3,80						
Sala amiga	6,50			6,50						
Escalera	8,20			8,20						
Escalera demolida	13,80			13,80						
Antiguo baño de recaudo	4,39			4,39						
Baño 1er piso	9,01			9,01						
			SUBTOTAL	**64,10**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				64,10						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				0,00						
			TOTAL	**64,10**						

CROQUIS



Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**
CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No.**	**00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.**	**N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA**	**DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD:**	**90 DIAS**

CAPITULO	**NP. NO PREVISTOS**		**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**NP3 FRISO LISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES MURO-CUBIERTA**		**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD		L	a	h		
Lineal muro- techo	70,00				70,00					
Filos puerta		0,90	2,10	11,00	42,90					
Filos puerta grande director		2,00	4,40	1,00	8,40					
Comercial		1,20	0,85	4,00	16,40					
RAC		1,20	0,85	2,00	8,20					
Auditorio		1,20	0,85	11,00	45,10					
Direccion		1,20	0,85	5,00	20,50					
Secretaria de direccion		1,20	0,85	5,00	20,50					
Secretaria de direccion		1,30	0,90	1,00	4,40					
Oficina Pablo		1,20	1,20	1,00	4,80					
Placa cubierta grande		1,35	0,80	3,00	12,90					
Placa cubierta grande		14,90	0,55	1,00	30,90					
Placa cubierta grande		10,50	0,85	1,00	22,70					
Baño 2do piso		1,30	2,50	1,00	7,60					
Baño 2do piso		0,85	0,85	1,00	3,40					
Baño 1er piso		0,80	0,80	7,00	22,40					
Ventanilla gestion de fiscalizacion		1,50	1,50	1,00	6,00					
			SUBTOTAL	**347,10**						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				219,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				128,10						
			TOTAL	**347,10**						

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**MUNICIPIO DE ARAUCA** **DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES** **MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA**	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S CONTRATISTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA**		**FECHA**	
			11/04/2021	
			DIA	**MES** / **AÑO**

CONTRATISTA DE OBRA:	**BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**CONTRATO OBRA No. 00-133-2020**	
INTERVENTORIA:	**N.A**	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. N.A**	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	**EMPERATRIZ BONILLA V**	**FRENTE DE OBRA DIAN- ARAUCA**	
FECHAS DEL PRESENTE INFORME	**DESDE 1/01/2021**	**HASTA 31/03/2021**	**TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD: 90 DIAS**

CAPITULO	**NP. NO PREVISTOS**	**SUB CAPITULO**	**NA**	
ITEM:	**NP4 ESTUCO Y RESANES**	**UNIDAD:**	**ml**	**Pagina 1 de 1**

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				VALOR PARCIAL	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD		L	a	h		
Lineal muro- techo	70,00				70,00					
Filos puerta		0,90	2,10	11,00	42,90					
Filos puerta grande director		2,00	4,40	1,00	8,40					
Comercial		1,20	0,85	4,00	16,40					
RAC		1,20	0,85	2,00	8,20					
Auditorio		1,20	0,85	11,00	45,10					
Direccion		1,20	0,85	5,00	20,50					
Secretaria de direccion		1,20	0,85	5,00	20,50					
Secretaria de direccion		1,30	0,90	1,00	4,40					
Oficina Pablo		1,20	1,20	1,00	4,80					
Placa cubierta grande		1,35	0,80	3,00	12,90					
Placa cubierta grande		14,90	0,55	1,00	30,90					
Placa cubierta grande		10,50	0,85	1,00	22,70					
Baño 2do piso		1,30	2,50	1,00	7,60					
Baño 2do piso		0,85	0,85	1,00	3,40					
Baño 1er piso		0,80	0,80	7,00	22,40					
Ventanilla gestion de fiscalizacion		1,50	1,50	1,00	6,00					
Vigas direccion	6,20		3,00	2,00	37,20					
Ventanilla gestion de fiscalizacion	6,20		3,00	3,00	55,80					
				SUBTOTAL	**440,10**					
COBRO EN ACTA PARCIAL No 1				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 2				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 3				149,00						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 4				-						
COBRO EN ACTA PARCIAL No 5				291,10						
				TOTAL	**440,10**					

CROQUIS





Observaciones

ELABORÓ: JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA	CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA
REVISÓ: PABLO HERNANDEZ CORREDOR	CARGO: SUPERVISOR SECCIONAL DE ARAUCA	FIRMA

BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
CONTRATISTA

EMPERATRIZ BONILLA V
Vo.Bo. SUPERVISOR

BROKA CONSTRUCCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
901.167.911
CLL 12B N 19E-40
(035) 3052594456
Valledupar - Colombia
brokasas09@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FVEB-32

Cliente: DIAN
Nit: 800.197.268
Teléfono: (031) 0000000
Dirección: Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	01/06/2021, 10:22
Expedición	01/06/2021, 10:32
Vencimiento	01/06/2021
Vendedor	CARLOS ANDRES NARVAEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ADECUACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA	1.00	212,001,677.45	0 %	212,001,677.45
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	44,520,352.26	0 %	44,520,352.26
3	IMPREVISTO 1%	1.00	2,120,016.77	0 %	2,120,016.77
4	UTILIDAD 5%	1.00	10,600,083.87	19 %	10,600,083.87

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos setenta y un millones doscientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con 0.29

Condiciones de Pago:
Contado Consignación Consignación bancaria $ 271,256,146.29

Total Bruto	269,242,130.35
IVA 19%	2,014,015.94
Total a Pagar	271,256,146.29

Observaciones:
Favor consignar los siguientes recursos en la cuenta de Ahorros No. 52392339019 de Bancolombia a nombre de BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S #$13-10-00-000; 00-133-2020; ebonillav@dian.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764008205022 aprobado en 20201128 prefijo FVEB desde el número 1 al 180 Vigencia: 12** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10

CUFE: 6b108c5188694342498810672478452edf8b24cc99be5a7e6120bbaaef18b40b82fd699de942542adfbf26b951b50ade

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra**	**FT-FN-2336**
Proceso: Recursos Financieros		**Versión** 2

Numero:	51	**Fecha:**	Día	Mes	Año
			1	6	2021

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	00-133-2020	Contrato de Interventoría N°	
Contratista: razón social o nombre	BROKA CONSTRUCCIONES E	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	Emperatriz Bonilla Villabona
Nit/C.C	901167911-0	Nit/C.C	

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	11	8	2020		31	3	2021

Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Mediante pagos parciales por entrega de avances de obra, de acuerdo a la unidad de medida de los diferentes Items requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato. La DIAN efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura con todos los documentos soportes para que el supervisor trámite su pago. La DIAN pagará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros de la DIAN, de acuerdo con las actividades realizadas, facturadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor designado por LA DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados.

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción		Valores	
Número de registro presupuestal	140620	Fecha:	31	7	2020	Rubro	C-1399-1000-4-0-1399016-02	Valor	$ 844.464.649,19
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro		Valor	$ 0,00
Número de acta	4	Número de factura:	FVEB-32			Fecha:	1 6 2021	Valor total factura	$ 271.256.146,29
		Número de factura:				Fecha:		Valor total factura	$ 0,00
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$ 0,00
Otras deducciones								Valor	$ 0,00
Valor a pagar									**$ 271.256.146,29**

Información ejecución por inmueble

Sede	Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional de Arauca	SBI placa N°	1	SBI ID componente N°	1217

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 271.256.146,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 271.256.146,29**

Descripción:	Adecuación de cielos rasos, pinturas bajo techos, baños de la seccional, muros

Sede	Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional de Arauca	SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**

Descripción:	
Valor total de las Intervenciones	**$ 271.256.146,29**

Certificación de recibido a satisfacción

Enel desarrollo del contrato, el Contratista ejecutó las actividades del contrato y trabajos de obra en la adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Arauca entre otras, cambio de cubierta, mantenimiento y cambio de redes hidro sanitarios en los baños del primer y segundo piso, elementos sanitarios, enchapes en baños, cambio de redes electricas, lámparas led, cableado estructurado, instalación de cielo raso y guarda escoba, cambio de ventanas en el segundo piso entre otras en el desarrollo de contrato en el mes de enero a marzo del 2021, trabajos de obra en la adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la Seccional de Impuesto y

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

El contratista procedio a remitir las afiliaciones al sistema de de seguridad social y parafiscales, las cuales se verificarón, posteriormente efectuó la remisión de la planilla de seguridad social correspondiente de los meses enero a marzo de 2021 y conforme a lo establecido por la legislación Colombiana fue remitiado la certificaión del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales emitido por el Contador FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO en su calidad de revisor fiscal matriculado en la junta central de contadores de colombia con T.P 131281 –T.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos del contrato N° 00-133-2020 se encuentran cargados en el secop II

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA	PABLO A. HERNÁNDEZ CORREDOR
Firma		

Jefe Coordinación de Infraestructura

Nombres y apellidos	OMAR DE JESÚS PUERTA RINCÓN
Vo Bo. Jefe Coordinación de Infraestructura	

BROKA CONSTRUCCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 901.167.911
CLL 12B N 19E-40
Tel: (035) 3052594456
Valledupar - Colombia
brokasas09@gmail.com

Nota Crédito
No. 2- 11

Fecha Nota Crédito	2021-05-31
Factura de Venta	FVEB-22
Generación	31/05/2021, 16:17
Expedición	31/05/2021, 16:17
Vencimiento	31/05/2021

Señores	DIAN		
NIT	800.197.268	**Teléfono**	(031) 0000000
Dirección	Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ADECUACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ARAUCA	1.00	212,001,677.45
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	44,520,352.26
3	IMPREVISTO 1%	1.00	2,120,016.77
4	UTILIDAD 5%	1.00	10,600,083.87
5	IVA/UTILIDAD 19%	1.00	2,014,015.94

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos setenta y un millones doscientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con 0.29

Condiciones de Pago:
Consignación $ 271,256,146.29

Total Bruto	271,256,146.29
Total	271,256,146.29

Observaciones:
Se procede a elaborar la siguiente nota crédito para darle nulidad a la factura No. FVEB-22 debido a que hay errores en ella, los cuales deben ser corregidos.
#$13-10-00-000; 00-133-2020; ebonillav@dian.gov.co#$

CUDE: 950db4fcae1bbc4fd7a285e28f44982bbf50894579a719abc2ca594a758dc0eec905a9b6b2b06faa4e42c78b4a002c39
CUFE factura: bd5d8e95a98663fed46a09bc17986d6333bc606849b0c356054ea43374e28b18b3dec044ec471e8464f574d4ed28e314

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO** identificado con 8.785.891 de Soledad , y con Tarjeta Profesional No 131281 –T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.** identificada con Nit 901.167.911-0 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Valledupar a los 7 días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,

FERNANDO JOSE ANDRADE OROZCO
C.C. 8.785.891 DE SOLEDAD (ATLANTICO)
REVISOR FISCAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167911	0	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	calle 17 # 8	VALLEDUPAR-CESAR	5722356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	882690091	9415929992	E	2021/02/03	2021/02/04	BANCOLOMBIA	1	$3,376,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (4 Afiliados)						$3,634,104	$581,600			$3,634,104	$145,600			$3,541,935	$142,000			$3,634,104	$253,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,664,132	$106,800			$2,725,578	$189,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,664,132	$106,800			$2,725,578	$189,900		$0	$0
1	CC	7573366	ARAUJO MIGUEL	231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
2	CC	1065634367	NARVAEZ CARLOS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
3	CC	19516697	RODRIGUEZ YORYIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINICIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
4	CC	19517612	ROJANO JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAVIMENTO (3 Afiliados)						$1,090,233	$174,600			$1,090,233	$43,800			$1,090,233	$43,800			$1,090,233	$75,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PLATO (3 Afiliados)						$1,090,233	$174,600			$1,090,233	$43,800			$1,090,233	$43,800			$1,090,233	$75,900		$0	$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)						$1,090,233	$174,600			$1,090,233	$43,800			$1,090,233	$43,800			$1,090,233	$75,900		$0	$0
5	CC	72277082	OCHOA ANTONIO	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC07	12	$363,411	$14,600	CCF33	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
6	CC	12597952	RIPOLL RUBEN	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC24	12	$363,411	$14,600	CCF33	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
7	CC	77038844	RUIZ WILFRIDO	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC24	12	$363,411	$14,600	CCF33	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIMAR (10 Afiliados)						$3,634,110	$582,000			$3,634,110	$146,000			$3,634,110	$146,000			$3,634,110	$253,000		$0	$0
Centro de Trabajo: BUENAVENTURA (10 Afiliados)						$3,634,110	$582,000			$3,634,110	$146,000			$3,634,110	$146,000			$3,634,110	$253,000		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (10 Afiliados)						$3,634,110	$582,000			$3,634,110	$146,000			$3,634,110	$146,000			$3,634,110	$253,000		$0	$0
8	CC	38466302	CAICEDO SANDRA	25-14	12	$363,411	$58,200	EPS016	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
9	CC	16479083	CONRADO JUSTINIANO	25-14	12	$363,411	$58,200	ESSC24	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
10	CC	16494685	CONRRADO WILBERT	25-14	12	$363,411	$58,200	ESSC18	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
11	CC	1151443236	HURTADO LUIS	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC62	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
12	CC	16495520	LOZANO PORFIRIO	230301	12	$363,411	$58,200	EPS012	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
13	CC	1144032510	MURILLO MIGUEL	230201	12	$363,411	$58,200	EPS016	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
14	CC	16486336	OBANDO FRANCISCO	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC24	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
15	CC	16479760	OBANDO MARCO	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC18	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
16	CC	14473894	PRADO RAFAEL	25-14	12	$363,411	$58,200	EPS012	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
17	CC	16481967	SINISTERRA SEGUNDO	25-14	12	$363,411	$58,200	EPS005	12	$363,411	$14,600	CCF57	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIAN (7 Afiliados)						$2,543,877	$407,400			$2,543,877	$102,200			$2,543,877	$102,200			$2,543,877	$177,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ARAUCA (7 Afiliados)						$2,543,877	$407,400			$2,543,877	$102,200			$2,543,877	$102,200			$2,543,877	$177,100		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (7 Afiliados)						$2,543,877	$407,400			$2,543,877	$102,200			$2,543,877	$102,200			$2,543,877	$177,100		$0	$0
18	CC	1006476378	DURAN JAVIER	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC33	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
19	CC	1065646798	GONZALEZ JOSE	230301	12	$363,411	$58,200	EPS005	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
20	CC	17589242	MARTINEZ LUIS	230301	12	$363,411	$58,200	EPS037	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	CC	1116802061	MONTES AMALEX	230301	12	$363,411	$58,200	EPS041	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
22	CC	1093908706	MONTES EIDER	230301	12	$363,411	$58,200	EPS041	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
23	CC	17596319	ORTIZ DUMAR	230301	12	$363,411	$58,200	ESSC33	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
24	CC	1116776508	ORTIZ NELSON	230301	12	$363,411	$58,200	EPS037	12	$363,411	$14,600	CCF67	12	$363,411	$14,600	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			**$10,902,324**	**$1,745,600**			**$10,902,324**	**$437,600**			**$10,810,155**	**$434,000**			**$10,902,324**	**$759,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167911	0	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	calle 17 # 8	VALLEDUPAR-CESAR	5722356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	882690091	9415929992	E	2021/02/03	2021/02/04	BANCOLOMBIA	1	$3,376,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$1,745,600	$0	$0	$1,745,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$291,000	$0	$0	$291,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$1,251,000	$0	$0	$1,251,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$58,200	$0	$0	$58,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$759,200	$0	$0	$759,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$759,200	$0	$0	$759,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$434,000	$0	$0	$434,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$43,800	$0	$0	$43,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$142,000	$0	$0	$142,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$146,000	$0	$0	$146,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	7	$102,200	$0	$0	$102,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				24	$437,600	$0	$0	$437,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$14,600	$0	$0	$14,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$29,200	$0	$0	$29,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	$65,600	$0	$0	$65,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$29,200	$0	$0	$29,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$58,400	$0	$0	$58,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$29,200	$0	$0	$29,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$14,600	$0	$0	$14,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$65,600	$0	$0	$65,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$29,200	$0	$0	$29,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$102,000	$0	$0	$102,000
TOTAL				**24**	**$3,376,400**	**$0**	**$0**	**$3,376,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167911	0	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	calle 17 # 8	VALLEDUPAR-CESAR	5722356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	913062662	9417187810	E	2021/03/03	2021/03/04	BANCOLOMBIA	1	$6,856,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (4 Afiliados)						$3,512,968	$562,200			$3,512,968	$140,700			$3,424,895	$137,300			$3,512,968	$244,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$2,604,442	$416,800			$2,604,442	$104,300			$2,547,092	$102,100			$2,604,442	$181,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)						$2,604,442	$416,800			$2,604,442	$104,300			$2,547,092	$102,100			$2,604,442	$181,500		$0	$0
1	CC	7573366	ARAUJO MIGUEL	231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
2	CC	1065634367	NARVAEZ CARLOS	230301	26	$787,390	$126,000	EPS005	26	$787,390	$31,500	CCF15	26	$760,763	$30,500	14-11	26	$787,390	$54,900	26	$0	$0
3	CC	19516697	RODRIGUEZ YORYIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINICIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
4	CC	19517612	ROJANO JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAVIMENTO (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$189,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PLATO (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$189,900		$0	$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$189,900		$0	$0
5	CC	72277082	OCHOA ANTONIO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	12597952	RIPOLL RUBEN	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	77038844	RUIZ WILFRIDO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIMAR (11 Afiliados)						$9,236,681	$1,478,300			$9,236,681	$370,100			$9,231,561	$369,900			$9,236,681	$643,600		$0	$0
Centro de Trabajo: BUENAVENTURA (11 Afiliados)						$9,236,681	$1,478,300			$9,236,681	$370,100			$9,231,561	$369,900			$9,236,681	$643,600		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (11 Afiliados)						$9,236,681	$1,478,300			$9,236,681	$370,100			$9,231,561	$369,900			$9,236,681	$643,600		$0	$0
8	CC	38466302	CAICEDO SANDRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	16479083	CONRADO JUSTINIANO	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	16494685	CONRRADO WILBERT	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	6162806	DIAZ JULIO	231001	5	$151,421	$24,300	ESSC24	5	$151,421	$6,100	CCF57	5	$146,301	$5,900	14-11	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
12	CC	1151443236	HURTADO LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC62	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	16495520	LOZANO PORFIRIO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS012	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	1144032510	MURILLO MIGUEL	230201	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	16486336	OBANDO FRANCISCO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	16479760	OBANDO MARCO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
17	CC	14473894	PRADO RAFAEL	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS012	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
18	CC	16481967	SINISTERRA SEGUNDO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIAN (9 Afiliados)						$6,662,524	$1,066,400			$6,662,524	$267,000			$6,662,524	$267,000			$6,662,524	$464,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ARAUCA (9 Afiliados)						$6,662,524	$1,066,400			$6,662,524	$267,000			$6,662,524	$267,000			$6,662,524	$464,300		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (9 Afiliados)						$6,662,524	$1,066,400			$6,662,524	$267,000			$6,662,524	$267,000			$6,662,524	$464,300		$0	$0
19	CC	1006476378	DURAN JAVIER	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
20	CC	1065646798	GONZALEZ JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	CC	1116807450	LINARES KELLY	230301	5	$151,421	$24,300	EPS037	5	$151,421	$6,100	CCF67	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
22	CC	17589242	MARTINEZ LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
23	CC	1116802061	MONTES AMALEX	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
24	CC	1093908706	MONTES EIDER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
25	CC	17590792	MORENO LIZANDRO	230301	5	$151,421	$24,300	EPS005	5	$151,421	$6,100	CCF67	5	$151,421	$6,100	14-11	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0
26	CC	17596319	ORTIZ DUMAR	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
27	CC	1116776508	ORTIZ NELSON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(27)**			**$22,137,751**	**$3,543,100**			**$22,137,751**	**$887,000**			**$22,044,558**	**$883,400**			**$22,137,751**	**$1,542,600**		**$0**	**$0**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167911	0	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	calle 17 # 8	VALLEDUPAR-CESAR	5722356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	913062662	9417187810	E	2021/03/03	2021/03/04	BANCOLOMBIA	1	$6,856,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$3,543,100	$0	$0	$3,543,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$169,700	$0	$0	$169,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$727,000	$0	$0	$727,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,501,000	$0	$0	$2,501,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,542,600	$0	$0	$1,542,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,542,600	$0	$0	$1,542,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$883,400	$0	$0	$883,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$109,200	$0	$0	$109,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$137,300	$0	$0	$137,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	11	$369,900	$0	$0	$369,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$267,000	$0	$0	$267,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				27	$887,000	$0	$0	$887,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	$109,200	$0	$0	$109,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$151,700	$0	$0	$151,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$115,300	$0	$0	$115,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$146,800	$0	$0	$146,800
TOTAL				**27**	**$6,856,100**	**$0**	**$0**	**$6,856,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167911	0	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	calle 17 # 8	VALLEDUPAR-CESAR	5722356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	949313286	9418453957	E	2021/04/07	2021/04/08	BANCOLOMBIA	1	$7,315,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,664,132	$106,800			$2,725,578	$189,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,786,329	$71,600			$1,817,052	$126,600		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,786,329	$71,600			$1,817,052	$126,600		$0	$0
1	CC	7573366	ARAUJO MIGUEL	231001	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
2	CC	19516697	RODRIGUEZ YORYIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINICIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$877,803	$35,200			$908,526	$63,300		$0	$0
3	CC	19517612	ROJANO JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF15	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAVIMENTO (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$189,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PLATO (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$189,900		$0	$0
Ciudad: PLATO Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$189,900		$0	$0
4	CC	72277082	OCHOA ANTONIO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	12597952	RIPOLL RUBEN	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	77038844	RUIZ WILFRIDO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF33	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIMAR (11 Afiliados)						$9,993,786	$1,599,400			$9,993,786	$400,400			$9,963,063	$399,200			$9,993,786	$696,300		$0	$0
Centro de Trabajo: BUENAVENTURA (11 Afiliados)						$9,993,786	$1,599,400			$9,993,786	$400,400			$9,963,063	$399,200			$9,993,786	$696,300		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (11 Afiliados)						$9,993,786	$1,599,400			$9,993,786	$400,400			$9,963,063	$399,200			$9,993,786	$696,300		$0	$0
7	CC	38466302	CAICEDO SANDRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
8	CC	16479083	CONRADO JUSTINIANO	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	16494685	CONRRADO WILBERT	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	6162806	DIAZ JULIO	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	1151443236	HURTADO LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC62	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	16495520	LOZANO PORFIRIO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS012	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	1144032510	MURILLO MIGUEL	230201	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	16486336	OBANDO FRANCISCO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	16479760	OBANDO MARCO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC18	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
16	CC	14473894	PRADO RAFAEL	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS012	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
17	CC	16481967	SINISTERRA SEGUNDO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIAN (9 Afiliados)						$8,176,734	$1,308,600			$8,176,734	$327,600			$8,176,734	$327,600			$8,176,734	$569,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ARAUCA (9 Afiliados)						$8,176,734	$1,308,600			$8,176,734	$327,600			$8,176,734	$327,600			$8,176,734	$569,700		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (9 Afiliados)						$8,176,734	$1,308,600			$8,176,734	$327,600			$8,176,734	$327,600			$8,176,734	$569,700		$0	$0
18	CC	1006476378	DURAN JAVIER	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
19	CC	1065646798	GONZALEZ JOSE	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
20	CC	1116807450	LINARES KELLY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	CC	17589242	MARTINEZ LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
22	CC	1116802061	MONTES AMALEX	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
23	CC	1093908706	MONTES EIDER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
24	CC	17590792	MORENO LIZANDRO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
25	CC	17596319	ORTIZ DUMAR	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC33	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
26	CC	1116776508	ORTIZ NELSON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF67	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(26)**			**$23,621,676**	**$3,780,400**			**$23,621,676**	**$946,400**			**$23,529,507**	**$942,800**			**$23,621,676**	**$1,645,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167911	0	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	calle 17 # 8	VALLEDUPAR-CESAR	5722356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	949313286	9418453957	E	2021/04/07	2021/04/08	BANCOLOMBIA	1	$7,315,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,780,400	$0	$0	$3,780,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$727,000	$0	$0	$727,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,617,200	$0	$0	$2,617,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,645,800	$0	$0	$1,645,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,645,800	$0	$0	$1,645,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$942,800	$0	$0	$942,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$109,200	$0	$0	$109,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$106,800	$0	$0	$106,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	11	$399,200	$0	$0	$399,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$327,600	$0	$0	$327,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				26	$946,400	$0	$0	$946,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	$109,200	$0	$0	$109,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$182,000	$0	$0	$182,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$72,800	$0	$0	$72,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$145,600	$0	$0	$145,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$145,600	$0	$0	$145,600
TOTAL				**26**	**$7,315,400**	**$0**	**$0**	**$7,315,400**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14680633691

(415)7707212489984(8020) 000001468063369 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 7 9 1 1	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 B 19 E 40 BRR GARUPAL

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
hernanbarriosc@gmail.com		3 2 1 4 2 0 1 2 2 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 8 0 3 2 6	4 2 1 0	2 0 1 8 0 3 2 6		4 1 1 2	7 0 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2020 - 01 - 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre APARICIO RUEDA LAURA JOSEFINA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO
