	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	2
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/06/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/05/2021	**AL:**	31/05/2021
CONTRATO Nº	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020	**CONTRATISTA**	CARLOS VERGARA NEGRETE		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ – CALI - VALLE DEL CAUCA				
FECHA DE INICIO	15/12/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14/12/2021		

VALOR INICIAL	$ 790.607.197,14	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ -	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -	**VALOR TOTAL**	$ 790.607.197,14

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE APROBÓ POR AMBAS PARTES EN LA PLATAFORMA SECOP II EL DIA 06-NOV-2020, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO MEDIANTE CRP No. 545420 del 12-NOV-2020 Y NUMERO DE POLIZA No.75-44-101108836 QUE CONTEMPLA LOS SIGUIENTES MECANISMOS DE COBERTURA: Cumplimiento del contrato: Desde 06/11/2020 hasta 31/08/2022 por valor de $237.182.159,10; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Desde 06/11/2020 hasta 10/12/2024 por valor de $39.530.359,85 Calidad del servicio: Desde 06/11/2020 hasta 06/11/2025 por valor de $395.303.598,50.

Mediante de acta de suspensión No.1, se realiza suspensión del contrato de interventoría No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020 del 12 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2021 inclusive por las jornadas del Paro Nacional en la Ciudad de Cali-Valle del Cauca que dio inicio desde el pasado 27 de abril de 2021, la cual esta afectando el normal funcionamiento de la ejecución del contrato de obra No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020. Por lo anterior y siendo el contrato de interventoria anexo al de obra, se procede a la suspensión. Por lo anterior y siendo el contrato de interventoria anexo al de obra, se realiza la suspensión, estableciendose como nueva fecha tentativa de inicio el dia 22 de mayo de 2021 despues de evaluación de garantias para dar inicio al mismo.

Despues de la evaluación, se establece que no existen garantias para dar reinicio al contrato de obra y por ende al de interventoría por la situación que se esta presentando en cali del paro nacional, por lo tanto, mediante acta de suspensión No.2, se continua suspensión del contrato de obra No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 y por ende el contrato de interventoría No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020 del 22 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 inclusive por la continuidad de las jornadas del Paro Nacional en la Ciudad de Cali-Valle del Cauca que dio inicio desde el pasado 27 de abril de 2021, la cual esta afectando el normal funcionamiento de la ejecución del contrato de obra No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020. Por lo anterior y siendo el contrato de interventoria anexo al de obra, se continua la suspensión, estableciendose como nueva fecha tentativa de inicio el dia 01 de junio de 2021 despues de evaluación de garantias para dar inicio al mismo. De acuerdo a la evaluación del mejoramiento de garantias de suministro de materiales y traslado de persona, se establece ue se dara reinicio a los contratos como se tiene establecido del 01 de junio de 2021.

Teniendo en cuenta las suspensiones realizadas en el presente mes de mayo de veinte (20) dias, se realizará en el mes de junio/21, la gestión del modificatorio al contrato de obra e interventoría, legalizando la nueva fecha de finalización de los contratos que será el día 03 de enero de 2022 y la nueva forma de pago de acuerdo a reprogramación suministrada.

En dicho periodo (01 del mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021), se verificó que el contratista de interventoria diera cumplimiento al pago de la seguridad social del personal técnico y administrativo (planilla pila) y de parafiscales de ley (certificación). Así mismo, que dentro de su planta de personal aun se conserva el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar al otorgamiento de puntaje por este concepto. Para ello se evidenció la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA


Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				Oficina campamento (incluye servicios públicos, Equipos de sistemas, utiles de oficina, papeleria, etc)	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50	50	SI	Bitácora
				Vehiculo	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100	100	SI	Bitácora
				Comunicación (celular, internet)	1	SISO	1	100	100	SI	Bitácora
				Camara fotografica	1	AUXILIAR DE INGENIERIA	1	100	100	SI	Bitácora
						MENSAJERO	1	20	20	SI	Trabajo en oficina (certificación)
						SECRETARIA	1	20	20	SI	Trabajo en oficina (certificación)
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 21	0,96%	**10,97%**	**10,97%**	**0,00%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**10,97%**
EJECUTADO		**10,97%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SIENDO ACCESORIO DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE AVANCE QUE ESTE ULTIMO (LEY 1474 DE 2011 ART. 84 Y 85 / DERECHO CIVIL - Principios - PRINCIPIO DEL DERECHO CIVIL - Lo accesorio sigue a lo principal) . Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contratro de obra estuvo suspendido desdel el dia 12 de mayo de 2021 hasta el 21 de mayo de 2021, y continua la suspensión desde el dia 22 de mayo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021, se conserva la igualdad del % programado Vs % Ejecutadola del 10,97% de acuerdo a la programación de obra entregada por el contratista. Por lo anterior, se recomienda a la interventoria una vez se de reinicio al contrato de obra (se establece preliminarmente que será el 01 de junio de 2021), continuar las labores de seguimiento y control permanente, con el fin de evitar que se presenten atrasos a futuro sobre todo de aquellas actividades que impactan directamente en la programación.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	365	168	197
Proyección	365	168	197

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Informe para primera suspensión	SI	SI	SI	La Interventoría presentó informe semanal del control de obra para suspensión del 12 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2021 incluisive (Periodo del 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021)
Informe para segunda suspensión	SI	SI	SI	La Interventoría presentó informe semanal del control de obra para continuidad de suspensión del 22 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 inclusive - Periodo del 12 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2021)
Bitácora de Obra	SI	SI	SI	La Interventoría realiza diariamente el diligenciamiento de la Bitácora de obra, indicando las actividades realizadas, las condiciones climáticas y el personal en obra tanto de interventoría como de obra. (Periodo laborado del 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021)
Comités de Obra Semanales	SI	SI	SI	La interventoría lidera comités de obra, de los cuales se realiza su respectiva acta (Periodo laborado del 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021)
Cumplimiento al pago de la seguridad social del personal técnico y administrativo (planilla pila) y de parafiscales de ley (certificación)	SI	SI	SI	La Interventoría presenta planillas PILA del personal técnico y administrativo, y certificación de pago de parafiscales (Periodo laborado del 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021)
Cumplimiento planta de personal de conservación del número de trabajadores con discapacidad que dio lugar al otorgamiento de puntaje por este concepto	SI	SI	SI	La interventoría presenta certificación expedida por el Ministerio de Trabajo (Período laborado del 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021)

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo se realizaron las asiguientes actividades y se tramitaron los siguientes documentos:

* Ejecución de actividades del día 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021 y que se presento primera suspensión de diez (10) dias del 12 de mayo de 2021 al 21 de mayo de 2021 inclusive, seguido de una segunda suspensión de diez (10) dias del 22 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 inclusive. teniendo como fecha de reinicio tentativa si las condiciones que motivaron la suspencion del contrato de obra cambian el dia 01/06/2021, el cual segun monitoreo se dará la misma. La suspensión es motivada principalmente por: 1- La interventoría indica la afectación de la clausula 17 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor, debido a que continúan los traumas por causas relacionadas a las jornadas de Paro Nacional en la Ciudad de Cali-Valle del Cauca que dio inicio desde el pasado 27 de abril de 2021, por lo que las condiciones normales del contrato de la interventoría se vieron afectadas en razón de que se imposibilita el tránsito de su grupo técnico para que haga presencia en el sitio de trabajo para realizar las funciones de control sobre el Contrato Electrónico de Obra No.143- 00-A-COFAC-DIFRA-2020. 2. La continuidad de la suspensión del contrato de obra No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020, al cual el Ingeniero CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE le esta realizando la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica.
* Mediante oficios Cód. CVN-FAC147-082-2020 (10-05-21), la interventoria en cumplimiento de sus funciones remite informe semanal a la Entidad.
* Mediante oficio Cód. CVN-FAC147-083-2020 (11-05-21), la interventoria en cumplimiento de sus funciones da el aval a la solicitud de SUSPENSIÓN N. 1 al Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFACDIFRA-2020.
* Mediante oficio Cód. CVN-FAC147-084-2021 (10-05-21), la interventoria solicita la suspensión del Contrato Electrónico de Interventoría No.147-00-A-COFAC-DIFRA2020"
* Durante el periodo del 01 de mayo de 2021 al 11 de mayo de 2021, la interventoria reporto las siguientes actividades en obra: 1.Se realiza retiro de entarimado primer nivel Bloque A, Luego de cumplir los 19 dias de curado de la fundida de viga de entre piso del segundo nivel, 2. Se realiza armado de entarimado en el segundo nivel Bloque A, para iniciar armado de viga de entre piso (Tercer nivel Bloque A), 3.Se continua con la instalación de tubería sanitaria 8" (filtro), segun planos entregado por la FAC. 4. El constructor termina con el armado de acero de refuerzo para vigas de entre piso tercer nivel - bloqué A, segun planos entregados por la FAC. 5. El contratista acatando las recomendaciones impuestas por la interventoría, inició con las actividades de caja en concreto para registro (valvula) en las redes de suministro de agua potable para el proyecto. 6. El contratista realizó todos las acciones encaminadas al cumplimiento del PAPSO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE CALIDAD, CERRAMIENTOS, PLAN SST. 7. El contratista cuenta con un sistema de acceso a la placa de piso II y III, acorde en andamio certificado. 8. El Contratista, dota el campamento con un kit anti derrames, para suplir cualquier eventualidad y/o emergencia de tipo ambiental, 9. Se le ha requerido al constructor la entrega de propuesta para escalera en perfileria metálica del proyecto, todo con el fin de iniciar los trámites pertinentes para la inclusión en presupuesto general, 10. La interventoría indica que por problema de seguridad y movilidad debido a paros en la ciudad, el constructor se ha visto perjudicado en los suministros de materiales (concretos y rellenos) por parte de trasportadores de la ciudad lo que ha afectado de manera directa a los rendimientos de las actividades programadas para el periodo del presente informe.
* Mediante correo electrónico del dia 21-05-21, la interventoria en cumplimiento de sus funciones remite informe semanal a la Entidad (periodo de suspensión)
* Mediante oficio Cód. CVN-FAC147-087-2020 (21-05-21), la interventoria en cumplimiento de sus funciones da el aval a la solicitud de continuidad de la suspension del Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFACDIFRA-2020.
* Mediante oficio Cód. CVN-FAC147-088-2021 (21-05-21), la interventoria solicita la continuidad de la suspensión del Contrato Electrónico de Interventoría No.147-00-A-COFAC-DIFRA2020"
* Durante el periodo, la interventoria reporto las siguientes actividades en obra: 1. Monitoreo a la evolución de las circunstancias que motivaron la suspension del contrato de obra (desmanes en la ciudad de Cali producto del paro Nacional que impide el suministro de manteriales y equipos, y el normal transito del personal a la obra), con el fin de establecer la continuidad de la suspensión o proceder al reinicio programado, la cual se establece aprobación de la continuidad de la suspensión del 22 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 inclusive, por la persistencia de las condiciones de desmanes en la ciudad de Cali, que impiden la normal ejecución del contrato de obra. Asi mismo, por los anteriores motivos, el contrato de interventoria surte la misma suerte de continuar con la suspensión del 22 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 inclusive.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Como principal actividad pendiente por realizar se tiene el reincio del contrato de obra por parte de la intervnetoria y por ende el de interventoría el dia 01 de junio de 2021, segun monitoreo y evaluación de las partes.
2. Retomar las actividades que se dejaron el dia 11 de mayo de 2021 consistente en: continuar actividades del capitulo de excavaciones, rellenos, estructura, instalaciones electricas e hidrosanitraias. Asi mismo dar continuidad al cumplimiento del PAPSO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE CALIDAD, CERRAMIENTOS, PLAN SST.
3. Continuar monitoreo permante a los eventos del paro con el fin de establecer acciones a seguir en casos de atrasos.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 790.607.197,14	$ 790.607.197,14	$ 86.729.609,53	10,97%	$ 703.877.587,61	89%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 790.607.197,14	$ 790.607.197,14				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 790.607.197,14	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 790.607.197,14	
ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2020	$ 9.282.000,00	PAGADO
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 1ER CUATRIMESTRE 2021	$ 60.086.146,98	PAGADO
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA	$ 721.239.050,16	POR EJECUTAR Y TRAMITAR

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* La interventoría debe continuar monitoreando la evolución de los circunstancias que motivaron la suspension del contrato de obra (desmanes en la ciudad de Cali producto del paro Nacional que impide el suministro de manteriales y equipos, y el normal transito del personal a la obra), con el fin de establecer posibles impactos de atrasos futuros posterior al reinicio programado, debido al bajo rendimiento de actividades programadas en el conograma en el mes de junio/21 y las que se dejaron de ejecutar en el periodo de suspensión.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Para el periodo del presente informe, predominó los dias soleado, sin embargo se tuvieron lluvias moderadas las cuales no afectaron la realizacion de las actividades programadas




Mayor. **JULIAN ANDRES SALAS RODRIGUEZ**
Supervisor Suplente Contrato de Interventoria No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		

9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	A la fecha el contrato de interventoría se encuentra en ejecución



My. Salas Rodríguez Julián Andrés

Supervisor del contrato No.147-00-A-COFAC-DIFRA-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/06/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/05/2021	**AL:**	31/05/2021
CONTRATO Nº	Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI		
OBJETO	**LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA**				
FECHA DE INICIO	15/12/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14/12/2021		

VALOR INICIAL	$ 7.261.542.854,55	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 1.218.821.207,15	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -	**VALOR TOTAL**	**$ 8.480.364.061,70**

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se da inicio al contrato de obra **No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020** con firma entre las partes el día **15 de diciembre de 2020**, el mismo se encuentra amparado con la Póliza de Seguros N. 15-44-101234369 (Cumplimiento), y vigencia desde 15/12/2020 hasta 14/05/2027, y Póliza de Seguros **N.15-44-101067262** (Responsabilidad Civil Y Extracontractual) y vigencia 15/12/2020 hasta 14/06/2022 con fecha de terminación inicial el día 14 de diciembre de 2021. Así mismo se realiza adición presupuestal al mismo, con actualización de las garantías conforme a M ODIFICATORIO N.1

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
Ensayos a compresión concretos	Cumplió	Parales tipo Guadas	100 UN	Estación Total (Topografía)	0	Director de Obra	1	**50**	**0**	**No**	**Teniendo en cuenta que la ausencia del profesional en obra ha sido reiterativo, la firma interventora solicitará al constructor informe por tal novedad, y se le recomendará cambio de profesional en la eventualidad que no se pueda dar cumplimiento a este ítem.**
Ensayo de asentamiento a los concretos instalados en obra	Cumplió	Tela Polisombra cerramiento	200m2	Herramienta Menor	10	Residente de Obra	1	**100**	**100**	**Si**	
Diseño de mezclas para concretos elaborados en obra	Cumplió	Acero de refuerzo	21971	Pulidora	1	Inspector SISO de Obra	1	**100**	**100**	**Si**	
Proctor Modificado del material producto de excavación	Cumplió	Tubería sanitaria Novafor 18"	21971kg	Minicargador	1	Auxiliar Administrativa	1	**0**	**100**	**Si**	**Discrecional del Contratista**
Granulometría del material a utilizaro con base de relleno.	Cumplió	Geotextil Nt2500	210 M2	Mezcladora de Concreto	1	Topógrafo	1	**25**	**0**	**No**	**En la presente semana, no cumplió con el porcentaje y la dedicación esperada.**
Densidades en rellenos compactados	Cumplió	Cemento	400 und.	Cortadora dewalt 18185	1	Almacenista	1	**0**	**100**	**Si**	**Discrecional del Contratista**
		Subase granular	96 m3	Vibro compactador tipo Canguro	1						
				Vibro compatador tipo Rana	1						
				Martillo neumático	0						
				Vibrador de concreto	2						
OTROS											
				Parales	120 und						
				Cerchas	120						
				Plaquetas en madera de (70 x 1.40)	400 und						
PERSONAL OPERATIVO											
						Maestro de Obra	0	**0**	**0**	**No**	**La obra se encuentra bajo la dirección del Director y del Residente de Obra.**
						Oficiales de Obra	1	**100**	**100**	**Si**	
						Hidrosanitarios	2	**0**	**100**	**Si**	
						Ayudantes de Obra	13	**100**	**101**	**Si**	
						Conductor de Minicargador	0	**0**	**100**	**Si**	**Discrecional del Contratista**
						TOTAL	22				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
		10,97%	**10,97%**	**0,00%**
Semana 21	0,96%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA






AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**10,97%**
EJECUTADO		**10,97%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**92,00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**94,00%**
	EJECUTADO		**82,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**23,00%**
	EJECUTADO		**41,00%**

5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		12,00%
	EJECUTADO		11,00%
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		4,00%
	EJECUTADO		1,00%
8. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. INSTALACIONES MECANICAS (VER EQUIPOS)	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CIELORRASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. PINTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. INTRAESTRUCTURA	PROGRAMADO		45,00%
	EJECUTADO		52,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25.VIAS N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26.EQUIPOS	PROGRAMADO		3,00%
	EJECUTADO		0,00%
27.EQUIPOS EXCENTOS DE IVA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	364	167	197
Proyección	364	167	197

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
167	0	**14/12/2021**

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1.Se realiza retiro de entarimado primer nivel Bloque A, Luego de cumplir los 19 dias de curado de la fundida de viga de entre piso del segundo nivel. 2. Se realiza armado de entarimado en el segundo nivel Bloque A, para iniciar armado de viga de entre piso (Tercer nivel Bloque A). 3.Se continua con la instalación de tubería sanitaria 8" (filtro), segun planos entregado por la FAC. 4. El constructor termina con el armado de acero de refuerzo para vigas de entre piso tercer nivel - bloqué A, segun planos entregados por la FAC. 5. El contratista acatando las recomendaciones impuestas por la interventioría, inició con las actividades de caja en concreto para registro (valvula) en las redes de suministro de agua potable para el proyecto. 6. El contratista realizó todos las acciones encaminadas al cumplimiento del PAPSO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE CALIDAD, CERRAMIENTOS, PLAN SST. 7.- El contratista cuenta con un sistema de acceso a la placa de piso II y III, acorde en andamio certificado. 8.- El Contratista, dota el campamento con un kit anti derrames, para suplir cualquier eventualidad y/o emergencia de tipo ambiental. 9.- Se le ha requerido al constructor la entrega de propuesta para escalera en perfilería metálica del proyecto, todo con el fín de iniciar los trámites pertinentes para la inclusión en presupueto general. 10.- La interventoría indica que por problema de seguridad y movilidad debido a paros en la ciudad, el constructor se ha visto perjudicado en los suministros de materiales (concretos y rellenos) por parte de trasportadores de la ciudad lo que ha afectado de manera directa a los rendimientos de las actividades programadas para el periodo del presente informe.	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES	SI	X	NO	
	INSTALACIONES ELECTRICAS (acometidas electrica media tension).		x		
	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø6" y 8"		x		
	INICIO DE LAS COMPRA DE EQUIPO INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE RED CONTRA INCENDIO		x		

OBSERVACIONES:

-Durante este periodo se suspende el contrato de obra, dicha solicitud la realizo el contratista de obra el día 11 de mayo de 2021, mediante oficio No. COEC-OBRA-041-2021 y avala por la interventoría mediante oficio N. CVN-FAC147-083-2020 la cual va del 12/05/2021 - 21/05/2021, esto debido a que el pasado 27 de abril de 2021, se viene cursando en el país un paro nacional que ha afectado las condiciones de la seguridad nacional. Así mismo la ciudad de Cali ha acentuado de tal forma que ha repercutido en el normal desarrollo de la obra.

- Luego de pasar los 10 dias calendario , el contratista solicita una Suspensión No.2, mediante oficio No. COEC-OBRA-044-2021 y avala por la interventoría mediante oficio N. CVN-FAC147-087-2020, la cual va desde el día 22/05/2021 hasta al 31/05/2021 inclusive, o por el periodo donde se pueda garantizar la seguridad del personal operario en el proyecto durante el traslado de los mimos, el suministro permanente de materiales constructivos (concretos, rellenos, insumos) para la ejecución de contrato previo acuerdo entre las partes.

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 7.261.542.854,55	$ 7.261.542.854,55	$ 930.295.937,57	10,97%	$ 7.550.068.124,14	89,03%
Adiciones	N/A	$ 1.218.821.207,15				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 7.261.542.854,55	$ 8.480.364.061,70				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 7.261.542.854,55	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 1.218.821.207,15	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 8.480.364.061,70	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 3.630.771.427,28	Se aprueba por parte de la interventoría 24 operaciones bancarias para afectar recursos del anticipo de obra, las cuales suman el valor de $1.471.318.396,7 millones de pesos. Equivalente al 40,52% del valor del anticipo.
PRIMER PAGO PAC XXXXX	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PLANES A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	7/12/2020	14/12/2020	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES :

TECNICO:

1. La interventoria realizo revision de acero de refuerzo de la vigas de entre piso , tercer nivel - bloque A, los cuales se encontraba armado acorde a los planos entregado por la FAC.
2.Durante el presente periodo bajo el rendimiento de la obra, Debido a los desmanes por paro nacional en la ciudad de Cali, los cuales iniciaron el día 27 de abril de 2021, ya que algunos de los trabajadores no podían llegar a la Emavi, los materiales como son el concreto, material pétreo, no los pudieron suministrar

ADMINISTRATIVO:

1. Mediante el presente periodo se realizaron toda la documentación pertinente a la suspension N°1 y N°2 del contrato.
2. Durante el presente periodo se realiza comite virtual solicitado por la FAC - sobre Revisión Informe novedades .
3.Durante el presente periodo se le solicito al contratista realizar monitoreando a la evolución de los circunstancias que motivaron la suspension de su contrato (desmanes en la ciudad de Cali producto del paro Nacional que impide el suministro de manteriales y equipos, y el normal transito del personal a la obra), con el fin de establecer la continuidad de la suspensión o proceder al reinicio programado.

SST AMBIENTAL:

1. Durante el presente periodo s**e** tomo y controlo temperatura de todo el personal, al ingreso a la obra, durante los dias que se laborarón.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

.- Para el periodo del presente informe, predominó los dias soleado , sin embargo se tuvieron lluvias moderadas las cuales no afectaron la realizacion de las actividades programadas.

ELABORO: ARQ. ALEXANDER PALACIO RODRIGUEZ	REVISO: ARQ. FABIAN RADA SEGURA
	
Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO



























	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	11/05/2021	PERIODO REPORTADO DEL: 1/05/2021	AL: 11/05/2021
CONTRATO Nº	Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI
OBJETO	LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO	15/12/2020	FECHA DE TERMINACIÓN	14/12/2021

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	VALOR TOTAL
$ 7.261.542.854,55	$ 1.218.821.207,15	$ -	$ 8.480.364.061,70

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se da inicio al contrato de obra **No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020** con firma entre las partes el día **15 de diciembre de 2020**, el mismo se encuentra amparado con la Póliza de Seguros N. 15-44-101234369 (Cumplimiento), y vigencia desde 15/12/2020 hasta 14/05/2027, y Póliza de Seguros **N.15-44-101067262** (Responsabilidad Civil Y Extracontractual) y vigencia 15/12/2020 hasta 14/06/2022 con fecha de terminación inicial el día 14 de diciembre de 2021. Así mismo se realiza adición presupuestal al mismo, con actualización de las garantías conforme a M ODIFICATORIO N.1

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
Ensayos a compresión concretos	Cumplió	Parales tipo Guadas	100 UN	Estación Total (Topografía)	0	Director de Obra	1	50	0	No	Teniendo en cuenta que la ausencia del profesional en obra ha sido reiterativo, la firma interventora solicitará al constructor informe por tal novedad, y se le recomendará cambio de profesional en la eventualidad que no se pueda dar cumplimiento a este ítem.
Ensayo de asentamiento a los concretos instalados en obra	Cumplió	Tela Polisombra cerramiento	200m2	Herramienta Menor	10	Residente de Obra	1	100	100	Si	
Diseño de mezclas para concretos elaborados en obra	Cumplió	Acero de refuerzo	21971	Pulidora	1	Inspector SISO de Obra	1	100	100	Si	
Proctor Modificado del material producto de excavación	Cumplió	Tubería sanitaria Novafor 18"	21971kg	Minicargador	1	Auxiliar Administrativa	1	0	100	Si	Discrecional del Contratista
Granulometría del material a utilizaro con base de relleno.	Cumplió	Geotextil Nt2500	210 M2	Mezcladora de Concreto	1	Topógrafo	1	25	0	No	En la presente semana, no cumplió con el porcentaje y la dedicación esperada.
Densidades en rellenos compactados	Cumplió	Cemento	400 und.	Cortadora dewalt 18185	1	Almacenista	1	0	100	Si	Discrecional del Contratista
		Subase granular	96 m3	Vibro compactador tipo Canguro	1						
				Vibro compatador tipo Rana	1						
				Martillo neumático	0						
				Vibrador de concreto	2						
				OTROS							
				Parales	120 und						
				Cerchas	120						
				Plaquetas en madera de (70 x 1.40)	400 und						
						PERSONAL OPERATIVO					
						Maestro de Obra	0	0	0	No	La obra se encuentra bajo la dirección del Director y del Residente de Obra.
						Oficiales de Obra	1	100	100	Si	
						Hidrosanitarios	2	0	100	Si	
						Ayudantes de Obra	13	100	101	Si	
						Conductor de Minicargador	0	0	100	Si	Discrecional del Contratista
						TOTAL	22				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
		10,97%	10,97%	0,00%
Semana 21	0,96%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA




AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		10,97%
EJECUTADO		10,97%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		92,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		94,00%
	EJECUTADO		82,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		23,00%
	EJECUTADO		41,00%

5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		12,00%
	EJECUTADO		11,00%
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		4,00%
	EJECUTADO		1,00%
8. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. INSTALACIONES MECANICAS (VER EQUIPOS)	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CIELORRASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. PINTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. INTRAESTRUCTURA	PROGRAMADO		45,00%
	EJECUTADO		52,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25.VIAS N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26.EQUIPOS	PROGRAMADO		3,00%
	EJECUTADO		0,00%
27.EQUIPOS EXCENTOS DE IVA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	364	147	217
Proyección	364	147	217

6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
147	0	**14/12/2021**

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1.Se realiza retiro de entarimado primer nivel Bloque A, Luego de cumplir los 19 dias de curado de la fundida de viga de entre piso del segundo nivel. 2. Se realiza armado de entarimado en el segundo nivel Bloque A, para iniciar armado de viga de entre piso (Tercer nivel Bloque A). 3.Se continua con la instalación de tubería sanitaria 8" (filtro), segun planos entregado por la FAC. 4. El constructor termina con el armado de acero de refuerzo para vigas de entre piso tercer nivel - bloqué A, segun planos entregados por la FAC. 5. El contratista acatando las recomendaciones impuestas por la interventioría, inició con las actividades de caja en concreto para registro (valvula) en las redes de suministro de agua potable para el proyecto. 6. El contratista realizó todos las acciones encaminadas al cumplimiento del PAPSO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE CALIDAD, CERRAMIENTOS, PLAN SST. 7.- El contratista cuenta con un sistema de acceso a la placa de piso II y III, acorde en andamio certificado. 8.- El Contratista, dota el campamento con un kit anti derrames, para suplir cualquier eventualidad y/o emergencia de tipo ambiental. 9.- Se le ha requerido al constructor la entrega de propuesta para escalera en perfilería metálica del proyecto, todo con el fín de iniciar los trámites pertinentes para la inclusión en presupueto general. 10.- La interventoría indica que por problema de seguridad y movilidad debido a paros en la ciudad, el constructor se ha visto perjudicado en los suministros de materiales (concretos y rellenos) por parte de trasportadores de la ciudad lo que ha afectado de manera directa a los rendimientos de las actividades programadas para el periodo del presente informe.	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES	SI	X	NO	
	INSTALACIONES ELECTRICAS (acometidas electrica media tension).		x		
	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø6" y 8"		x		
	INICIO DE LAS COMPRA DE EQUIPO INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE RED CONTRA INCENDIO		x		

OBSERVACIONES:
-El presente informe tiene como objeto informar que se suspende el contrato de obra, el cual se estima que va de 12/05/2021 - 21/05/2021 debido a que el pasado 27 de abril de 2021, se viene cursando en el país un paro nacional que ha afectado las condiciones de la seguridad nacional. Así mismo la ciudad de Cali ha acentuado de tal forma que ha repercutido en el normal desarrollo de la obra, por lo anterior a continuación se presenta los siguientes aspectos.

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 7.261.542.854,55	$ 7.261.542.854,55	$ 930.295.937,57	10,97%	$ 7.550.068.124,14	89,03%
Adiciones	N/A	$ 1.218.821.207,15				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 7.261.542.854,55	$ 8.480.364.061,70				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 7.261.542.854,55	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 1.218.821.207,15	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 8.480.364.061,70	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 3.630.771.427,28	Se aprueba por parte de la interventoría 24 operaciones bancarias para afectar recursos del anticipo de obra, las cuales suman el valor de $1.471.318.396,7 millones de pesos. Equivalente al 40,52% del valor del anticipo.
PRIMER PAGO PAC XXXXX	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PLANES A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	7/12/2020	14/12/2020	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES :

TECNICO:
1. La interventoria realizo revision de acero de refuerzo de la vigas de entre piso , tercer nivel - bloque A, los cuales se encontraba armado acorde a los planos entregado por la FAC

ADMINISTRATIVO:
1. Mediante el presente periodo se realizaron toda la documentación pertinente a la suspension N°1 del contrato.
2.- Durante el presente periodo se realiza comite virtual solicitado por la FAC - sobre Revisión Informe novedades .
3.El contratista de obra debe seguir monitoreando la evolución de los circunstancias que motivaron la suspension de su contrato (desmanes en la ciudad de Cali producto del paro Nacional que impide el suministro de manteriales y equipos, y el normal transito del personal a la obra), con el fin de establecer la continuidad de la suspensión o proceder al reinicio programado.

SST AMBIENTAL:
1. Durante el presente informe se tomo y controlo temperatura de todo el personal, al ingreso a la obra.
2. Se le solicito al contratista mejorar la ruta de evacuación del nivel II en el bloque A.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

.- Para el periodo del presente informe, predominó los dias soleado , sin embargo se tuvieron lluvias moderadas las cuales no afectaron la realizacion de las actividades programadas.

ELABORO: ARQ. ALEXANDER PALACIO RODRIGUEZ	REVISO: ARQ. FABIAN RADA SEGURA
 Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	 Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO



























	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	21/05/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	12/05/2021	**AL:**	21/05/2021
CONTRATO Nº	Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020	**CONTRATISTA**	CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI		
OBJETO	**LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA**				
FECHA DE INICIO	15/12/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14/12/2021		

VALOR INICIAL	$ 7.261.542.854,55	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 1.218.821.207,15	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -	**VALOR TOTAL**	**$ 8.480.364.061,70**

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se da inicio al contrato de obra **No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020** con firma entre las partes el día **15 de diciembre de 2020**, el mismo se encuentra amparado con la Póliza de Seguros N. 15-44-101234369 (Cumplimiento), y vigencia desde 15/12/2020 hasta 14/05/2027, y Póliza de Seguros **N.15-44-101067262** (Responsabilidad Civil Y Extracontractual) y vigencia 15/12/2020 hasta 14/06/2022 con fecha de terminación inicial el día 14 de diciembre de 2021. Así mismo se realiza adición presupuestal al mismo, con actualización de las garantías conforme a M ODIFICATORIO N.1

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
Ensayos a compresión concretos	Cumplió	Parales tipo Guadas	100 UN	Estación Total (Topografía)	0	Director de Obra	1	**50**	**0**	**No**	**Teniendo en cuenta que la ausencia del profesional en obra ha sido reiterativo, la firma interventora solicitará al constructor informe por tal novedad, y se le recomendará cambio de profesional en la eventualidad que no se pueda dar cumplimiento a este ítem.**
Ensayo de asentamiento a los concretos instalados en obra	Cumplió	Tela Polisombra cerramiento	200m2	Herramienta Menor	10	Residente de Obra	1	**100**	**100**	**Si**	
Diseño de mezclas para concretos elaborados en obra	Cumplió	Acero de refuerzo	21971	Pulidora	1	Inspector SISO de Obra	1	**100**	**100**	**Si**	
Proctor Modificado del material producto de excavación	Cumplió	Tubería sanitaria Novafor 18"	21971kg	Minicargador	1	Auxiliar Administrativa	1	**0**	**100**	**Si**	**Discrecional del Contratista**
Granulometría del material a utilizaro con base de relleno.	Cumplió	Geotextil Nt2500	210 M2	Mezcladora de Concreto	1	Topógrafo	1	**25**	**0**	**No**	**En la presente semana, no cumplió con el porcentaje y la dedicación esperada.**
Densidades en rellenos compactados	Cumplió	Cemento	400 und.	Cortadora dewalt 18185	1	Almacenista	1	**0**	**100**	**Si**	**Discrecional del Contratista**
		Subase granular	96 m3	Vibro compactador tipo Canguro	1						
				Vibro compatador tipo Rana	1						
				Martillo neumático	0						
				Vibrador de concreto	2						
OTROS											
				Parales	120 und						
				Cerchas	120						
				Plaquetas en madera de (70 x 1.40)	400 und						
PERSONAL OPERATIVO											
						Maestro de Obra	0	**0**	**0**	**No**	**La obra se encuentra bajo la dirección del Director y del Residente de Obra.**
						Oficiales de Obra	1	**100**	**100**	**Si**	
						Hidrosanitarios	2	**0**	**100**	**Si**	
						Ayudantes de Obra	13	**100**	**101**	**Si**	
						Conductor de Minicargador	0	**0**	**100**	**Si**	**Discrecional del Contratista**
						TOTAL	22				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
		10,97%	**10,97%**	**0,00%**
Semana 21	0,96%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA




AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**10,97%**
EJECUTADO		**10,97%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**92,00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**94,00%**
	EJECUTADO		**82,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**23,00%**
	EJECUTADO		**41,00%**

5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		12,00%
	EJECUTADO		11,00%
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		4,00%
	EJECUTADO		1,00%
8. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. INSTALACIONES MECANICAS (VER EQUIPOS)	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CIELORRASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. PINTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. INTRAESTRUCTURA	PROGRAMADO		45,00%
	EJECUTADO		52,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25.VIAS N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
26.EQUIPOS	PROGRAMADO		3,00%
	EJECUTADO		0,00%
27.EQUIPOS EXCENTOS DE IVA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
2	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	364	157	207
Proyección	364	157	207

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
157	0	**14/12/2021**

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. realizar monitoreo a la evolución del paro, con el fin de determinar el reinicio en la fecha estimada (22-mayo-2021).		SI		NO	

OBSERVACIONES: -El presente informe tiene como objeto informar que se continua con la suspension del contrato de obra, la cual solicito la firma contratista CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI mediante comunicado N. COEC-OBRA-044-2021, en el tiempo desde el día 22 hasta al 31 de mayo de 2021 inclusive, o por el periodo donde se pueda garantizar la seguridad del personal operario en el proyecto durante el traslado de los mimos, el suministro permanente de materiales constructivos (concretos, rellenos, insumos) para la ejecución de contrato previo acuerdo entre las partes.

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 7.261.542.854,55	$ 7.261.542.854,55	$ 930.295.937,57	10,97%	$ 7.550.068.124,14	89,03%
Adiciones	N/A	$ 1.218.821.207,15				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 7.261.542.854,55	$ 8.480.364.061,70				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 7.261.542.854,55	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 1.218.821.207,15	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 8.480.364.061,70	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 3.630.771.427,28	Se aprueba por parte de la interventoría 24 operaciones bancarias para afectar recursos del anticipo de obra, las cuales suman el valor de $1.471.318.396,7 millones de pesos. Equivalente al 40,52% del valor del anticipo.
PRIMER PAGO PAC XXXXX	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PLANES A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	7/12/2020	14/12/2020	SI	
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	7/12/2020	14/12/2020	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES :

TECNICO: No reportado debido a que el contrato de obra se encontraba suspendido.

ADMINISTRATIVO: Mediante el presente periodo se realizaron toda la documentación pertinente a la continuacion a la suspension del contrato.

SST AMBIENTAL: No reportado debido a que el contrato de obra se encontraba suspendido.
.

ELABORO: ARQ. ALEXANDER PALACIO RODRIGUEZ

Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

REVISO: ARQ. FABIAN RADA SEGURA

Director de Interventoria
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO



























	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	10	**Lugar y Fecha**	Virtual Microsoft Teams – 04/05/2021
Asunto	Revisión Informe novedades		
Oficina Productora	Supervisión FAC.		
Hora Inicio	02:00 p.m.	**Hora Finalización**	04:00 p.m.
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:

1. Aclaración de la información del oficio Cód. CVN-FAC147-080-2020 Asunto:" Primer requerimiento para la ejecución de actividades atrasadas en el proyecto"

Desarrollo:

En el día de hoy, 04 de mayo de 2021, se reunieron por medio de Microsoft teams, la señora MY. LILIANA LOPEZ GIRALDO - subdirectora de seguimiento y control DIFRA, el señor MY. JULIAN ANDRES SALAS RODRIGUEZ - supervisor encargado, Arq. Fabián Rada segura - Director de Interventoría, Arq. Alexander Palacio Rodríguez - Residente de la Interventoría, Ing. Carmen Ramos Arteaga - Auxiliar Ingeniera de Interventoría.

Se dá inicio al presente comité del seguimiento de obra, siendo las 14:00 hrs; en donde se contemplas los siguientes aspectos Técnicos así:

- El MY Julián Andrés salas Rodríguez inicia presentando al personal de la interventoría a la MY Liliana López y expone su preocupación por el oficio CVN-FAC-147-080-2020 Asunto: PRIMER REQUERIMIENTO PARA INICIO DE ACTIVIDADES ATRASADA EN CTO 143 enviado por la interventoría el día 03 de mayo de 2021.

- La MY López aclara que la interventoría deberá hacer seguimiento de la programación de obra independientemente que la obra se encuentre en adelanto.

- La interventoría manifiesta y explica punto por punto los motivos por el cual envió el oficio, el cual fue con el fin de recordarle el contratista que tiene actividades programadas, las cuales no ha realizado de acuerdo a la programación existente, encontrando:

  - Placa maciza bloque B (no se ha realizado dicha actividad teniendo en cuenta que no se cuenta con material pétreo, y en el lugar donde se debe fundir la placa maciza está ocupada por la formaleta empleada para fundición de la placa aligera - cubierta).

- Escalera bloque A (debido a que se está seleccionando el tipo de material de construcción el cual mejora el proceso constructivo, rendimiento de ejecución y acabo arquitectónico, el contratista debe presentar nueva propuesta en otra clase de material).
- Estructura fotocelda (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).
- Caja de inspección codensa (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).
- Maniobras de energización (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).
- Registro de red agua (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).
- Tapa lamina en alfajor tanque de almacenamiento (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).
- Red acometida RCI (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).
- Suministro de equipo como hidroneumático – hydroflow incluye conexión, equipó RCI importación y bomba sumergible (la actividad se encuentra en atraso respeto al cronograma).

- La MY lopez y el My salas, solicita de manera urgente que se le requiera al contratista un plan de contingencia con el cual subsane el atraso de las actividades en el menor tiempo posible.

- La interventoría se compromete a enviar oficio al contratista solicitándole el plan de contingencia.

- El contratista de obra a entregar plan de contingencia a la interventoría con el fin de adelantar las actividades que se encuentran atrasadas según cronograma.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Oficio de solicitud de plan de contingencia	Interventor	03-mayo-2021
Oficio de entrega de plan de contingencia	Contratista de obra	04-mayo-2021
Oficio de aprobación plan de contingencia	Interventor	07-mayo.2021

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

Ing. Yudy Gutiérrez Ortegón
Directora de obra
Consorcio obra espacial

Arq. Fabián Rada Segura
Director de interventoría

Arq. Alexander Palacio Rodríguez
Residente de Interventoría

Ing. Carmen Ramos Arteaga
Auxiliar ingeniera de interventoría

My Julián Andrés Salas Rodríguez
Supervisor de interventoría

My Liliana López Giraldo
Subdirectora de seguimiento y control DIFRA

Elaboró: Auxiliar ingeniera de Interventoría- Ing. Carmen ramos.
Revisó: Residente de Interventoría-Arq. Alexander Palacio Rodríguez.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	11	Lugar y Fecha	Campamento de Obra – Edificio Espacial FAC – Cali, 06 de mayo de 2021
Asunto	Reunión lineamientos, prohibiciones y responsabilidades del Personal de la Obra		
Oficina Productora	Supervisión FAC.		
Hora Inicio	03:20 p.m.	Hora Finalización	04:05 p.m.
Ausentes	S/N		

Orden del día:

1. Normas de comportamiento dentro de la FAC - EMAVI.
2. Política de NO registro fílmico ni fotográfico dentro de la FAC-EMAVI.
3. Normas de circulación dentro de la EMAVI.
4. Confidencialidad de la Obra.
5. Dudas y aclaraciones (Varios).
6. Finalización Instrucción.

Desarrollo:

En el día de hoy, 06 de mayo de 2021, se dieron cita en las instalaciones del campamento de Obra – Edificio el Espacio de la EMAVI, el Personal Administrativo, y Operativo del Contratista (Consorcio Obras Espacial Cali) e Interventoría (Carlos Vergara Negrete) – Personal Administrativo.

Se reúnen en la obra, el Residente de la Interventoría – Arq. Alexander Palacio, la Auxiliar Ingeniera de Interventoría – Ing. Carmen Ramos, el Residente HSE de Interventoría – Técn. S.O. Jhovanny Escobar; el Residente de Obra Arq. Cristian Muñoz, el Residente SST de Obra y el Tecn. SST Alberto Jaraba y todo el personal Operativo, firmantes en el listado anexo.

Se dá inicio a la presente socialización, con el fin de dictarles instrucciones acerca de los lineamientos, prohibiciones y responsabilidades de todo el personal en Obra. Brindando las respectivas normas de comportamiento dentro de la EMAVI:

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

1. Respeto constante con el personal de la FAC-EMAVI, al ingresar y/o salir de la obra; y durante la permanencia en las instalaciones de la misma.
2. Uso permanente del tapabocas.
3. Guardar y respetar el distanciamiento social.
4. En caso de ser requerida, alguna información adicional. Deberá suministrarla de forma clara y veraz.

NORMAS DE CIRCULACIÓN

5. Presentar siempre, el documento de identidad (Cédula de ciudadanía – original)
6. El personal operativo, ingresar siempre en grupo, con el color de camiseta que los identifica (Color gris).
7. En caso de ser necesario, el personal operativo, para poder transitar por la EMAVI, sea desde y hacia la puerta principal, deberá estar acompañado en todo momento, por su respectivo jefe inmediato, en su defecto por el Centinela de turno.

POLÍTICA DE NO REGISTRO FÍLMICO NI FOTOGRÁFICO DENTRO DE LA EMAVI

8. Se le recuerda al personal operativo, que está terminantemente PROHIBIDO, realizar cualquier clase de video o registro fotográfico en cualquier espacio dentro de la EMAVI. Más cuándo se están realizando actividades propias de seguridad interna de la misma. Y en su defecto, subirlas en las redes sociales de su preferencia. Traerá consigo, implicaciones legales.

CONFIDENCIALIDAD DE LA OBRA

9. Se le recuerda a todo el personal que ha sido contratado para la ejecución de la Obra, que el proyecto es de CARÁCTER – CONDIDENCIAL. En caso de incurrir en la falla del presente punto, deberá responder por las implicaciones legales, a que pudieran llevar.

DUDAS Y ACLARACIONES – VARIOS.
Con los presentes, se aclaran las respectivas dudas que se presentaron durante el proceso de la socialización.

Se dá cierre de la presente socialización, siendo las 04:05 p.m. sin contratiempos.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Socialización de los lineamientos, prohibiciones y responsabilidades del Personal de la Obra	La Interventoría y el Contratista de la Obra: Edificio Espacial Cali.	06 de mayo de 2021
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

FIRMAS,

ARQ. ALEXANDER PALACIO
Residente Interventoría

Carmen R
Ing. Auxiliar Interventoría

Residente HSE Interventor

Elaboró: Residente SST de Interventoría-Jhovanny Andrés Escobar Grajales

ÉSTE ESPACIO ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO

lacrimógeno, manifestando en los trabajadores y personal Administrativo irritación en los ojos y malestar en la garganta. Se detienen actividades y se les recomienda de la parte de SST, hidratación y lavado de los ojos. De igual forma, el Residente SST de Obra, cambia los tapabocas a todo el personal. Después de una media hora, regresan normalle a realizar las labores. No se presentan mayores contratiempos.

- Siendo las 10:02 a.m, se presentan lluvias moderadas constantes.

Residente HSE Interventor.

El Contratista decide terminar labores siendo la 13:30 hrs por motivo de desmanes por paro nacional en la ciudad de Cali.

Residente Obra.

Fecha: 01 de Mayo de 2021- Sabado
Siendo las 7:50 pm del dia 30 de abril de 2021 la directora de obra Ing Yudy informa lo siguiente. "Buenas noches para informar que el dia de mañana no se realizarán actividades en la obra dado las condiciones de orden publico proyectado para el dia de mañana". Esto lo informa por el grupo de whatsapp OBRA EDIF EL ESPACIO CALI. EMANI.

Residente de obra.

Carmen
Adv. Interventoría
Interventoría

Fecha: 02 de Mayo de 2021 - Domingo
Día no laboral.

Fecha 03 de Mayo de 2021 - Lunes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente SST de obra, 1 auxiliar administrativa, 1 almacenista, 1 oficial 2 electricos 1+1 ayudantes, 1 director de interventoria 1 residente de interventoria, 1 residente de SST de interventoria, 1 auxiliar ingeniera de interventoria.
Horario: 7:00am - 13:00hrs
Clima: Mañana: Nuvia moderada
Actividades realizadas: Se continúa armado de vigas y viguetas de entre piso tercer nivel - Bloque A.

El contratista decide terminar labores siendo la 13:00 hrs por motivo de continuación de semanas por paro nacional en la ciudad de Cali.


SST
- El Contratista cumple con realizar el cambio del sistema de acceso a la placa del segundo al 3er nivel.
- Se realiza inspección al personal operativo en trabajo seguro en alturas, cumplen con la utilización de las eslingas y línea de vida.

Residente HSE Interventor.


- El Contratista manifiesta preocupación por el ingreso y suministro de material e insumos a la obra, es de recalcar que material tipo recebo para el bloque B "placa de Contrapiso" Gravilla 3/4" para filtro y madera para vigas aereas del nivel 7,7 del bloque A, no han podido ser suministrados a la obra por motivos de orden público lo que esta afectando la correcta programacion de actividades de obra.

El Contratista hace presentación de esquema del Carcamo para revisión y aprobacion.

Escaneado con CamScanner

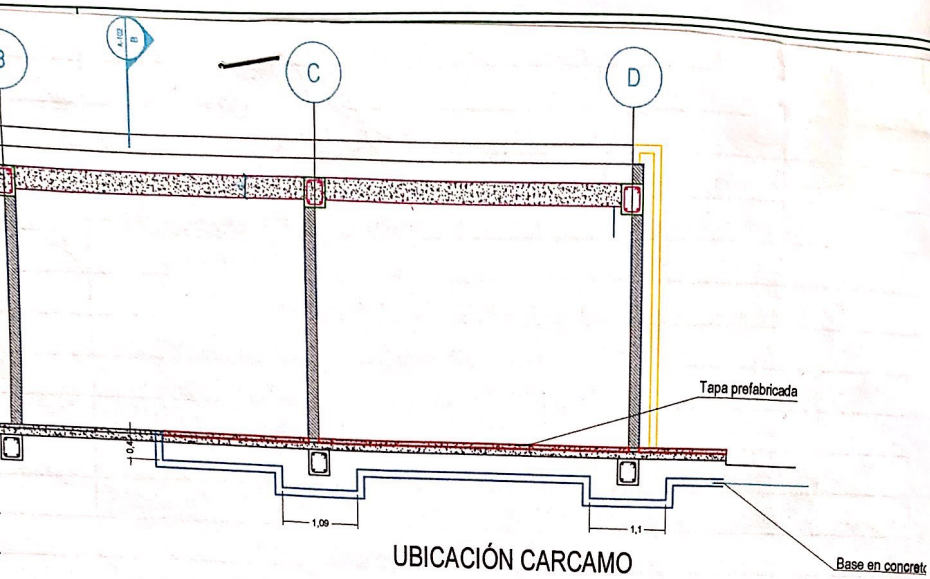

UBICACIÓN CARCAMO



DETALLE

Carmen Ruiz
Aux. Interventoria

Fecha: 04 de Mayo de 2021 - Martes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente SST de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 hidrosanitario, 1 opcial, 13 ayudantes, 1 director de interventoria, 1 residente de interventoria, 1 residente SST de interventoria, 1 auxiliar Ingenieria de interventoria.
Horario 7:00Am - 13:00 hrs
Clima: Mañana: Soleado Tarde: soleada
Actividades realizadas: Continuan armado de acero de refuerzo para vigas y viguetas de entrepiso, Inician Armado de formaleta metalica Bloque A-

Escaneado con CamScanner

Tercer piso.

SST y Ambiental

- Se recomienda al Contratista, realizar una jornada de orden y aseo general de la Obra.

- Se identifica el cubrimiento del área ~~q~~ del tanque que se encuentra abierta.
- Se inspeccionan las actividades en alturas. Se recomienda acciones inmediatas de cubrir un área al vacio. El Contratista lo realiza de forma rápida; en el Blque A, 3er nivel.
- El acopio del punto ecológico, se identifica acorde.

Residente HSE Interventor.

El contratista termina labores siendo las 13:00hrs debido a que continuan los desmanes por el paro nacional en la ciudad de Cali.

Residente Obra.

Carmen
Aux. Interventoria

Fecha: 05 de Mayo de 2021 - Miercoles

El contratista informa que por motivos del Paro nacional anunciado por centrales obreras y marchas continuas y problemas de orden público, se toma la decisión no ejecutar actividades y velar por la Seguridad del personal de obra, administrativo e interventoria.

Residente Obra.

Fecha: 06 de Mayo de 2021 - Jueves

Personal: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST de Obra 1 Aux. Administrativa, 1 Almacenista, 2 Hidrosanitarios, 1 Oficial, 1 Soldador, 12 Ayudantes; 1 Residente de Interv.

Escaneado con CamScanner

1 Ing. Auxiliar de Interventoría y 1 Residente SST de Interventoría. 1 Director de Interventoría.
Horario: 07:00 AM – 14:00 hrs.
Clima: Mañana: Soleada – Tarde: Soleada.
Actividades realizadas: Continúan armando acero de refuerzo para vigas y viguetas de entrepiso, continúan armando la formaleta metálica para las mencionadas del tercer piso - Bloque A.

SST y Ambiental
- Se realiza acompañamiento y supervisión en las actividades de trabajo seguro en Alturas. Nuevamente se le reitera al Contratista que el personal operativo debe contar con los barbuquejos.
- Se reitera la entrega oportuna de los estudios de seguridad del personal faltante.
- Se reitera el uso de la camisa gris en la obra, hay personal laborando con camisa de color verde.
- Reponer un área de la polisombra verde al lado del container de la Interventoría.
- Se le recomienda al Contratista, inspeccionar y asegurar nuevamente las guaduas del cerramiento perimetral que se encuentran desniveladas.

Residente HSE Interventor.

El Contratista termina Labores siendo las 14:00 hrs. debido a que continúan los desmanes por Paro Nacional en la Ciudad de Cali. Valle.

- El Contratista manifiesta las dificultades aún presentes para el ingreso y despacho del material faltante para dar Continuación a las actividades de obra "madera, gravilla, receba, malla electrosoldada, steldeck y tubería para acometidas eléctricas." lo cual esta generando atrasos en actividades.

Escaneado con CamScanner

Aux. Interventoría

Res. Obra.

Fecha: 07 de mayo de 2021 - Viernes
Personal: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST de Obra, 1 Auxiliar Administrativa, 1 Almacenista, 2 Hidrosanitarios, 1 Soldador, 1 Oficial y 14 Ayudantes. 1 Residente de Interventoría, 1 Director de Interventoría, 1 Ing. Aux. de Interventoría y 1 Residente HSE de Interventoría
Horario: 07:00 a.m - 17:00 hrs.
Clima: Mañana: Nublada. - Tarde: Soleada.
Personal: 1 Topógrafo de Obra.
Actividades realizadas: Se termina armado de vigas y viguetas de entrepiso, continuan la instalación de la formaleta metálica tercer nivel- Bloque A. Se realiza trazado de ejes para caja de acometida eléctrica por parte del Topógrafo. Se realiza perforación de las platinas para la IPe. Instalación de tubería sanitaria de 6" para conexión de los baños del primer piso bloque A a pozo de inspección #1.

SST y Ambiental
- Solicitud de la planilla de seguridad social paga. Personal (eléctricos y del conductor del vehiculo).
- Reutilización del material excavado (tierra) proviniente de la misma para el cubrimiento de la tubería sanitaria de 6".
- Seguimiento a la Inspección del Uso de los EPPis del personal operativo.

Residente HSE Interventoría.

El dia de hoy pudo ingresar a la Obra la madera solicitada dias atrás para terminar de armar y apuntalar la estructura del nivel 7.7 m. Por motivos de orden público aún no ha podido hacer ingreso a la obra el material petreo,

Escaneado con CamScanner

malla electrosoldada, steldeca y tuberia electrica para acomedidas. Se estan ejecutando actividades que no tienen mayor repercusión en avance de obra.

Carmen Ruiz
Aux. Interventoria

Res. obra.

Fecha: 08 de Mayo de 2021 - Sabado
Personal: 1 residente de obra, 1 residente SST de obra, 1 auxiliar administrativa, 1 opicial, 2 hidrosanitario, 1 soldador, 1 electrico, 12 ayudantes, 1 residente de interventoria, 1 asistor ingeniera de interventoria, 1 residente SST de interventoria, 1 director de interventoria.
Horario: 7:00am - 12:00 hrs
Clima: Mañana: Soleada.
Actividades realizadas: realizan excavación para tuberia de 6" para conexión de los baños primer piso Bloque A, asi mismo estaban realizando instalación y relleno de la mencionada. Continuan con la instalación de formaleta metalica para vigas y viguetas tercer nivel - Bloque A.

SST y Ambiental.
- Reiteración a la solicitud de la planilla de SS paga. Personal (Eléctricos y del conductor del vehiculo).
- Reiteración a la solicitud de: Inspeccionar y asegurar nuevamente las guaduas del cerramiento perimetral que se encuentran desniveladas.

Residente HSE Interventoria

Se le solicita al contratista organizar las varillas que se encuentran en la obra, ya que se encuentra expuesta al piso y al agua.

Carmen Ruiz
Aux Interventoria

Res. Obra.

Escaneado con CamScanner

Fecha: 09 de Mayo de 2021 - Domingo
Obra no laboral

Fecha: 10 de Mayo de 2021 - Lunes
Personal: 1 residente de obra 1 residente SST de obra, 1 oficial, 1 hidraulico, 1 soldador, 2 ayudantes, 1 residente de interventoria, 1 residente SST de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoria.
Horario: 7:00Am - 17:00hrs
Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Actividades realizadas: Se termina armado de formaleta metálica de entre piso tercer nivel Bloque A. Continúa perforación de las placas para las IPE, Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación para tubería de 6".

Cabe anotar que del personal que normalmente labora en la obra solo pudo llegar un 30% dado la falta de Movilidad, restricciones y bloqueos presentados en la ciudad de cali. La empresa Cemex encargada de suministrar Concreto a la obra envia nuevamente comunicado reiterando que los despachos están suspendidos al orden publico.

Carmen
Aux. Interventoria

Residente obra

SST y Ambiental
- Solicitud de la planilla de SS del personal del Consorcio.
- Solicitud del cambio de la señalización de evacuación y de Bioseguridad del área del Campamento del personal operativo.
- Se realiza seguimiento al control del uso de los

Escaneado con CamScanner

EPP, del personal operativo en la Obra
- Solicitud de orden y aseo en el área de almacenamiento temporal de bodegaje de tubería.

Residente HSE Interventor.

Fecha: 11 de Mayo de 2021 - Martes
En el día de hoy el contratista solicita a la interventoría la suspensión temporal del contrato mediante oficio No. COEC-OBRA-041-2021 referenciando los siguientes aspectos:
Como es de su conocimiento desde el pasado 27 de abril de 2021, se viene cursando en el país un paro nacional que ha afectado las condiciones de la seguridad nacional. Así mismo la ciudad de cali ha acentuado de tal forma que ha repercutido en el normal desarrollo de la obra. La interventoría dá aval a dicha solicitud, mediante oficio No CVN-FAC-147-083-2020, Se suspende el contrato de obra No 143-00-A-COFAC-OIFRA-2020 y el contrato de interventoría No 147-00-A-COFAC-OIFRA-2020 desde el 12-04-2021 hasta 27-04-2021.
Carmen
Aux. Interventoría

Basada en las condiciones de orden público que continúan presentandose en la ciudad de Cali, Por el paro nacional que viene aconteciendo desde el pasado 27 de abril del año en curso y sumando sumado a ello la imposibilidad de llevar actividades dado que tanto los proveedores de materiales, transporte, equipo que se encuentran imposibilitados de prestar servicios, El contratista solicita una nueva suspensión mediante oficio No. COEC-OBRA-044-2021.

Escaneado con CamScanner

la cual avala la interventoria mediante oficio No CVN-FAC-147-084-2020. y se da desde el 22-04-2027 hasta 31-04-2027.

Carmen
Aux. Interventoria

Escaneado con CamScanner

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2021

Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - FAC
MY. JULIÁN ANDRES SALAS RODRÍGUEZ.
Supervisor Encargado.

REF., **CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORÍA NO.147-00-A-COFAC-DIFRA-2020, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA.**

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DEDICACIÓN MENSAJEDRO Y SECRETARIA.

Cordial saludo**,**

Por medio de la presente yo CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE representante legal, certifico que el personal de interventoría de mensajería y secretaria cumplió con su dedicación minina contractual del 10% y 20% correspondientemente, durante el mes de mayo de 2021 desarrollando actividades consecuentes a su profesión para el proyecto de la referencia.

Dado en montería, a los (31) días del mes de mayo de 2021.

ING. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Dirección: Cra 13 No. 66-47, Bogotá D.C

Ref. Contrato de Interventoría 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ – CALI - VALLE DEL CAUCA"

Respetados señores.

Yo, **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado (a) con C.C. No. **79.508.558** de Bogotá D.C., de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Nota 1: Siendo persona natural empleadora me encuentro exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF, por lo que mis empleados devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Nota 2: Actualmente no tengo acuerdos de pago con las entidades recaudadoras respecto a alguna de las obligaciones mencionadas.

Dado en **Montería** a los **veintiocho** (**28**) días del mes de **mayo** de **2021.**

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

JAIRO ALBERTO ARGEL MARTINEZ
C.C. No.1.063.151.436 de Lorica
T.P. 246221-T
Contador Público

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7788487656**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/05/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		976495651	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:									**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79508558	VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.000.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	79508558	$ 139.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 709.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7789425271**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			989998631

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	9	$ 1.621.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.621.600	$ 0	$ 1.621.600
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 745.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.400	$ 0	$ 745.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 426.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.800	$ 0	$ 426.800
230301	230301-PORVENIR	14	$ 2.647.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.647.000	$ 0	$ 2.647.000
SUBTOTALES:										**$ 5.440.800**	**$ 0**	**$ 5.440.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 50.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 335.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.600	$ 0	$ 0	$ 335.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 230.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 222.800
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 432.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.600	$ 0	$ 0	$ 432.600
SUBTOTALES:													**$ 1.380.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.380.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	31		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.145.300	$ 2.145.300	$ 0	$ 0	$ 2.145.300
SUBTOTALES:									**$ 2.145.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.145.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	2	$ 22.800	$ 0	$ 22.800
CCF16	CCF16-COMFACOR	15	$ 648.200	$ 0	$ 648.200
CCF21	CCF21-CAFAM	9	$ 452.800	$ 0	$ 452.800
CCF30	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 36.400	$ 0	$ 36.400
CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	1	$ 50.000	$ 0	$ 50.000
SUBTOTALES:			**$ 1.380.200**	**$ 0**	**$ 1.380.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																							
1	CC 1003062592	CAMPO HERNANDEZ LEIDY JUDITH	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF21-CAFAM	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003139779	MURILLO ESPITIA LUZ DANEYS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018482286	ACOSTA ARIZA MANUELA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF21-CAFAM	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1032416452	NAVARRETE ACUÑA FABIAN IGNACIO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF21-CAFAM	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1063135682	FAJARDO NEGRETTE LILIA MARIA DEL CARMEN	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI		30															231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF21-CAFAM	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1063154680	ALVAREZ CASTRO MARTIN JAVIER	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1063172856	VERGARA MACIAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1063174281	RAMOS ARTEAGA CARMEN MARCELA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7789425271**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	989998631

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
9	CC 1064999665	BETTIN NEGRETE KARINE STELLA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1065006516	MARZOLA HERNANDEZ OVER LUIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF67-COMFIAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1066182134	BARRETO BARRETO MARTHA CECILIA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1067905667	PADILLA PEÑATE ALBERTO RAFAEL	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI		26														25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.083.334	79508558	$ 75.500	26	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1067929208	BETANCUR D'AMBROSIO OTILIA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1067932822	AYAZO VERGARA INGRID PAOLA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1067955823	VELASQUEZ HOYOS UBER	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1070810605	YANCE CARVAJAL JOHANA PATRICIA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1100395023	RAMIREZ ARRIETA LUCIA CAROLINA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1100395135	ESPINOSA LOZANO KAREN PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	79508558	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF21-CAFAM	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	**CC 11036554**	**PALACIO RODRIGUEZ ALEXANDER AUGUSTO**	**DEPEND**		**$ 1.500.000**	**FIJO**			**SI**																230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF21-CAFAM	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1128481790	BUENDIA SIERRA LUIS GUILLERMO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1131107846	CENTANARO ONTIVERO VERONICA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1140887534	ROMERO RODRIGUEZ AUGUSTO ALBERTO	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI	29															25-14 COLPENSIONES	2	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-11 - ARL SURA	2	$ 83.334	79508558	$ 5.900	2	$ 83.334	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	**CC 15030184**	**RADA SEGURA FABIAN MIGUEL**	**DEPEND**		**$ 1.500.000**	**FIJO**			**SI**																230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF21-CAFAM	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 15031661	FIGUEROA SMITH YOVIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 15034904	HERRERA GUEVARA BLADIMIR LENIN	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 36756014	ESTRADA LOZA AIDA CRISTINA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF35-CCF DE NARINO	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 40936577	AVILA LUBO ASTRID AZYADED	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	**CC 4547915**	**ESCOBAR GRAJALES JHOVANNY ANDRES**	**DEPEND**		**$ 1.250.000**	**FIJO**			**SI**																230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF56-COMFENALCO	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 45561087	CONTRERAS SUAREZ CARMEN CECILIA	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI		30					01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF21-CAFAM	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 5107680	PADILLA DE LA PEÑA JOSE SEBASTIAN	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 908.526	FIJO			SI	15																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 19.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 484.548	79508558	$ 33.800	16	$ 484.548	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 79374308	RODRIGUEZ VARGAS ISRAEL	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF21-CAFAM	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 10.346.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7789562236**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				990004373

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 745.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.400	$ 0	$ 745.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
230301	230301-PORVENIR	5	$ 890.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 890.800	$ 0	$ 890.800
SUBTOTALES:										**$ 1.781.600**	**$ 0**	**$ 1.781.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 50.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 50.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 259.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 50.000
SUBTOTALES:													**$ 445.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 445.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 117.300	$ 117.300	$ 0	$ 0	$ 117.300
SUBTOTALES:									**$ 117.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 117.300**


TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	10	$ 445.600	$ 0	$ 445.600
SUBTOTALES:			**$ 445.600**	**$ 0**	**$ 445.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	1063144892	ARGEL MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	1063151436	ARGEL MARTINEZ JAIRO ALBERTO	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	1067932195	CARVAJAL MARTELO LINDA MELISA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	1067946213	LOPEZ LOPEZ YENNIS JULIETH	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC	1068661309	AVILEZ ARRIETA ADRIANA LUZ	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC	1070807306	TORRES IBAÑEZ YESICA MARIA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 4.800	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC	1073813535	AVILA COGOLLO MARIA PAULINA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC	30656944	VERGARA NEGRETE ELIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC	30671452	MONTES PATERNINA ARLET PATRICIA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	**CC**	**78076762**	**FIGUEROA VEGA CARLOS ALFONSO**	**DEPEND**		**$ 908.526**	**FIJO**			**SI**																231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.790.100**

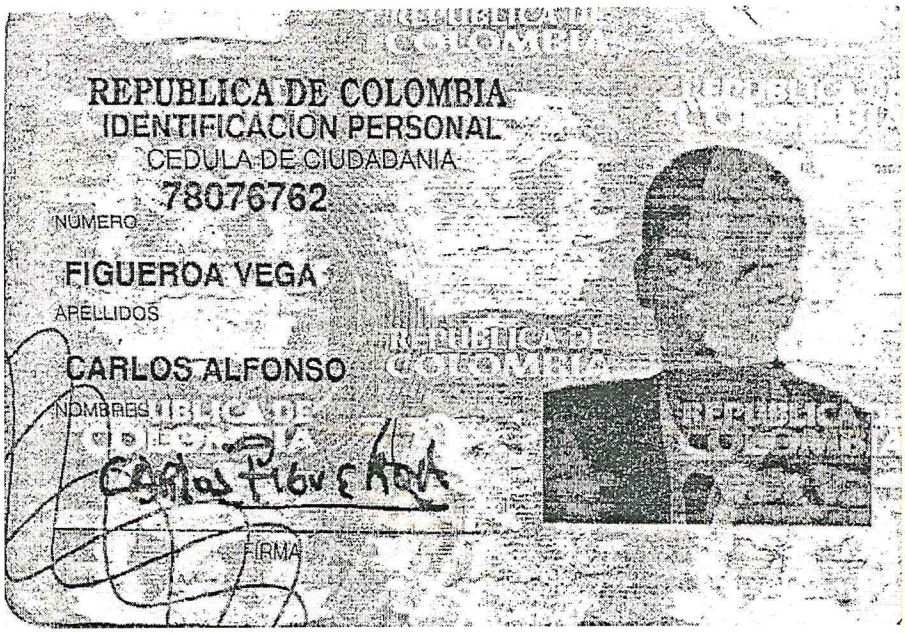

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
78076762
NUMERO
FIGUEROA VEGA
APELLIDOS
CARLOS ALFONSO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1982
LORICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 ESTATURA
B- G.S. RH
M SEXO
15-MAR-2001 LORICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BOLIVAR
Reglamentada mediante Decreto 2463 de 2001 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

El suscrito Secretario de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOLIVAR

CERTIFICA

Que la sala de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar en declaración del día 30 Sept/08 procedió a calificar a CARLOS FIGUEROA VEGA identificado con CC No. 78.076.762 establecidos los fundamentos de hecho y de derecho, así como los *criterios de evaluación de acuerdo al Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo de 1999)*, determinó que la pérdida de capacidad laboral es así:

DIAGNÓSTICO: Distrofia Muscular Progresiva - no se puede Poner de Pie ni Caminar

CONCEPTO	%
Deficiencia	50.00
Discapacidad	10.20
Minusvalía	22.75
TOTAL P. C. L.	88.95 %

RESPONSABLES DE LA CALIFICACIÓN:

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ BOLIVAR
PSICOLOGO O TERAPISTA
SECRETARIO

VALIDO UNICAMENTE PARA INSCRIPCIÓN Y TRAMITE DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 1355 DE ABRIL 25 DE 2008.
Contra el presente certificado no procede ningún recurso

Huella



Recibí:

Nombre: Carlos Alfonso Figueroa Vega

CC. No. 78.076.762

El empleo es de todos Mintrabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 3.0** **Fecha: Marzo 14 de 2019** **Página 1 de 1**

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE CORDOBA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	**05EE2021742300100000883** **05EE2021712300100000911**
FECHA RADICADO:	**2021-05-04** **2021-05-11**
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
IDENTIFICACIÓN:	**79.508.558**

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	10
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.*	**10%**

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, articulo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Montería a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)

LILIANA ISABEL OSORIO HERRERA

Verificó y Elaboró: Kattya L.
Revisó/Aprobó: Liliana O.

OBJETO INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA.
CONTRATO ELECTRONICO INTERVENTORIA No.	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020
INTERVENTOR:	CARLOS VERGARA NEGRETE
LOCALIZACIÓN:	EMAVI – CALI VALLE

FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC
REPORTE DE SEGIMIENTO AL PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA

FOTO 1



Descripción item 4,1 Comunicación (celular, internet) residente y oficina director

FOTO 2




Descripción ítem 5.3: Campamento oficina Interventoría.

FOTO 3



Descripción item 5.5: Tarjeta de propiedad vehiculo Interventoría

FOTO 4



Descripción item 5.5: Tarjeta de propiedad vehiculo Interventoría.

OBJETO INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA.
CONTRATO ELECTRONICO INTERVENTORIA No.	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020
INTERVENTOR:	CARLOS VERGARA NEGRETE
LOCALIZACIÓN:	EMAVI – CALI VALLE

FOTO 5



Descripción item 5.5: Revisión Tecno-mecánica vehículo Interv.

FOTO 6




Descripción item 5.5: Revisión Tecno-mecánica vehículo Interv.

FOTO 7



Descripción: Seguro SOAT Vehículo Interv.

FOTO 8

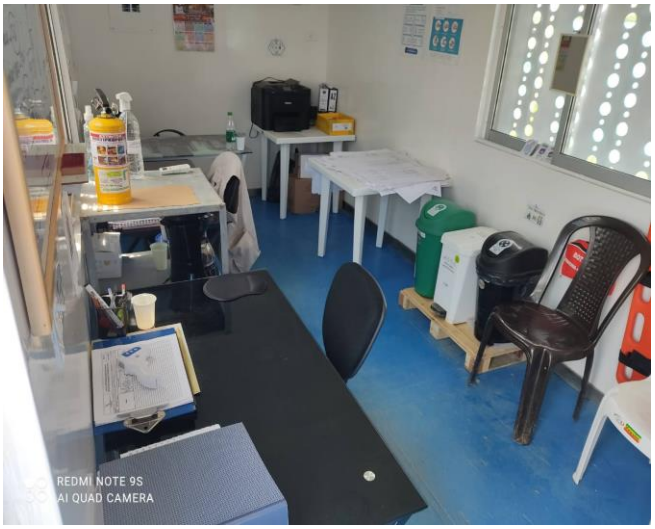

Descripción: ítem 5.3: Campamento oficina Interventoría.

FOTO 7	FOTO 8
	
Descripción: Vehículo Interventoría	Descripción: Vehículo Interventoría

Paga seguro con:

Fecha: 2021-06-02 09:55:01

Tu transacción ha sido aprobada

Referencia de pago: **1514356610**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 1009947435
Dirección IP: 191.108.136.222
Estado : **APROBADA**

Datos de contacto de la tienda

AVANTEL SAS EN REORGANIZACIÓN
NIT: 8300160461

Dirección: Cra 11 No 93 92
Teléfono: 018000 510 002

Resumen de la compra

Referencia: 110000017687195

Descripción: Pagos desde miavantel a pago de facturas-PTP

Total compra:	$75,596.00
IVA:	$14,363.00
Total pagado.....	**$89,959.00**

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.
