	INFORME DE SUPERVISION	FECHA DEL INFORME:
		7-abr.-21
	CONTRATO SENA - CONSORCIO NACIONAL SENA 2020	PERIODO:
		FEBRERO - MARZO 2021

SUPERVISOR SENA / GRUPO DE CONSTRUCCIONES — ***Ing. José Samuel Gomez Estrella***
PROFESIONAL DE APOYO / GRUPO DE CONSTRUCCIONES — ***Ing. Brian Roberto Ramos Carrillo***

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.1635462**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de junio de 2020
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE". LOTE 5
CONTRATISTA	**CONSORCIO CONSORCIO NACIONAL SENA 2020**
NIT	901.388.704-0
REP. LEGAL FRENTE AL CONTRATO	ARQUITECTO YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA	ARQUITECTO YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN
PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	
PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1	
PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 DE ABRIL DE 2021
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	ING JAVIER FONSECA
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y F.	DR. WILSON JAVIER ROJAS MORENO

1 *INFORMACION DEL PERSONAL EXIGIDO OBRA*

ÍTEM	ESPECIALIDAD	DEDICACION	NOMBRE	CUMPLE- NO CUMPLE		OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	70%	YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN	CUMPLE		
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	100%	LUIS JAIME MATEUS MORENO	CUMPLE		
3	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2	100%	GERHARDO ACEVEDO CABALLERO	CUMPLE		
4	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3	100%	FRANCISCO PABLO GARZÓN	CUMPLE		
5	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 1	100%	EDWIN FERNANDO CADAVID	CUMPLE		
6	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 2	100%	JAIME MOLINA FONSECA	CUMPLE		
7	PROFESIONAL HSE	40%	JOPHN JAIME GIRALDO DUQUE	CUMPLE		
8	SECRETARIA	100%	ISABEL CASTRILLÓN ORTÍZ	CUMPLE		
	TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA DISEÑOS					

2 *INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATO DE INTERVENTORIA*

	%	VALOR TOTAL	ANTICIPO ENTREGADO	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO	% POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100	460.900.000					
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	0						
VALOR ADICION OTROSÍ No 2							
VALOR ADICION OTROSÍ No 3				64.511.334	396.388.666	86%	
VALOR ADICION OTROSÍ No 5							
VALOR ADICION OTROSÍ No 6							
VALOR TOTAL		**460.900.000**					

	FECHA	COSTO DIRECTO	IVA 16%	SUBTOTAL FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO 15%	VALOR NETO PAGO	SALDO POR AMORTIZAR A LA FECHA		FECHA FACTURA
SUMATORIA				**64.511.334**		**64.511.334**	-		
PAGO 1	14/09/2020	5.376.616	1.021.557	6.398.173		6.398.173	-		FACTURA FCNS1 ACTA PARCIAL 01
PAGO 2	1/10/2020	2.899.513	550.907	3.450.420		3.450.420	-		FACTURA FCNS2 ACTA PARCIAL 02
PAGO 3	1/12/2020	45.935.076	8.727.664	54.662.740		54.662.740	-		FACTURA FCNS3 ACTA PARCIAL 03
PAGO 4							-		
PAGO 5							-		
PAGO 6							-		
PAGO 7							-		
PAGO 8							-		
PAGO 9							-		
PAGO 10							-		

	INFORME DE SUPERVISION	FECHA DEL INFORME:
		7-abr.-21
	CONTRATO SENA - CONSORCIO NACIONAL SENA 2020	PERIODO:
		FEBRERO - MARZO 2021

2	*VERIFICACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:*

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1	El Contratista deberá contar con el equipo idóneo mínimo exigido de los profesionales y técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o con terceros.	SI CUMPLE	
2	Suministrar y mantener durante la ejecución del Contrato, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido en su propuesta y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el presente documento.	SI CUMPLE	
3	Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran.	SI CUMPLE	
4	En caso de que el contratista de obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, éste deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el Supervisor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA deberá aprobar, previamente, el reemplazo.	SI CUMPLE	
5	Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias y dotarlo de mínimo un botiquín tipo B, de acuerdo a la Resolución 0705 de 2007, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.	SI CUMPLE	
6	Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista.	SI CUMPLE	
7	Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como la celebración y ejecución de subcontratos necesarios, no darán lugar al surgimiento ni a la existencia de ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.	SI CUMPLE	
8	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por causa o con ocasión del contrato.	SI CUMPLE	
9	Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	SI CUMPLE	
10	Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de mantenimiento, la Interventoría requerirá de éste la elaboración de los respectivos contratos de trabajo del personal que ejecutará el proyecto; supervisará que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo del programa; verificará que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos señalados en la propuesta, y exigirá al contratista de obra el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Verificar que el personal operativo cuente con los cursos necesarios vigentes para realizar tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico entre otros).	SI CUMPLE	
11	El interventor debe realizar seguimiento a los requerimientos de Seguridad y Salud en el trabajo por lo cual debe tener formación en el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI CUMPLE	
12	En el caso que el interventor de la obra requiera dentro de las operaciones realizar tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados y riesgo eléctrico), debe contar con los certificados vigentes de capacitación, al igual que la utilización de los equipos y elementos de protección personal	SI CUMPLE	
13	Informe de aspectos en SST, accidentalidad, charlas preoperacionales, entrega de EPP, etc.	SI CUMPLE	
14	Verificar el cumplimiento de todos los requerimientos de SST, establecidos en la normatividad.	SI CUMPLE	
15	Exigir a las personas naturales y jurídicas contratadas para el desarrollo del contrato todas las garantías que estime convenientes para amparar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los servicios y productos prestados, so pena de responder ella misma.	SI CUMPLE	
16	Crear un archivo organizado de los originales de toda la documentación inherente al desarrollo de cada una de las actividades que se lleven a cabo en el desarrollo del contrato. Este archivo debe estar de acuerdo con la Tabla de Retención Documental del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y debe ser entregado mensualmente.	SI CUMPLE	
17	Asistir conjuntamente a las reuniones de seguimiento de la ejecución del contrato de obra, programadas por el Supervisor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o por el Ordenador del Gasto del SENA.	SI CUMPLE	
18	Hacer uso de la identidad visual del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en todos aquellos informes y demás elementos de visibilidad que se generen con ocasión del contrato. El uso de la imagen corporativa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA debe contar con la aprobación previa del Supervisor del SENA.	SI CUMPLE	

	INFORME DE SUPERVISION	FECHA DEL INFORME:
		7-abr.-21
	CONTRATO SENA - CONSORCIO NACIONAL SENA 2020	PERIODO:
		FEBRERO - MARZO 2021

2	*INFORMACION TECNICA*

La interventoría ha cumplido con los terminos de referencia y las obligaciones contractuales
De acuerdo a la reprogramación de obra realizada y aprobada, el contratista posee un avance programado de 90,31% y una ejecución del 36,88%; esto deja en evidencia un atraso del 53,43%.

En desarrollo del contrato se ha avanzado en los siguientes ítems de obra con sus respectivos avances a la fecha del presente informe conforme al presupuesto contractual

Diseño y Metrología: En este periodo reiniciaron actividades de reparación de cubiertas sobre los ambientes de CGI-Metrología; Se han cambiado de tejas # 6 atendiendo emergencia sobre aula 101.
Ítem 1.6 CORRECION /AJUSTE EN CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO O SIMILARES. Ejecutado en un 75 %
NP-10.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO # 6 Ejecutado en un 70 %
NP-10.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE ARTCULADO. Ejecutado en un 50 %
Tiene porcentaje de ejecución del 58.66 %. En este periodo presenta un atraso del 20 % ya que según programación debían haber terminado los arreglos en cubierta el 20 de marzo 2021.

Electricidad-Electrónica y Telecomunicaciones: Se continuaron con las actividades en cubiertas.
Ítem 5.2.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE. Ejecutado en un 100%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%
NP-10.36 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE. (Inicio el 17 febrero 2021) Ejecutado en un 100%
NP-10.60 PENDIENTADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA. Ejecutado en un 100%
NP-10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Ejecutado en un 80%
Tiene porcentaje de ejecución del 75 %. En este periodo presenta un atraso del 8.50 % ya que según programación se debía haber retirado los escombros del manto y presentar los certificados de disposición final.

Formación de talento en Salud: Se terminaron actividades que se habían dejado inconclusas y se instaló el manto asfaltico en las cubiertas.
Ítem 5.2.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE. Ejecutado en un 100%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%
NP-10.36 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE. (Inicio el 17 febrero 2021) Ejecutado en un 100%
NP-10.49 CONCERTINA PARA SEGURIDAD CON VECINO Ejecutado en un 80%
NP-10.60 PENDIENTADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA. Ejecutado en un 100%
NP-10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Ejecutado en un 100%
Tiene porcentaje de ejecución del 76 %. En este periodo presenta atraso del 28% ya que según programación el suministro y la instalación la instalación dela teja shingle debía haberse finalizado antes del 20 de marzo 2021. Además, se continúan dejando actividades sin terminar como la instalación de techo en pvc de biblioteca y aula 202, instalación de concertina, limpieza de vidrios en ala 303, arreglo de malla cerramiento dañada en poda de árboles, instalación de puertas en madera, instalación de piso en guarda escobas en caucho en subdirección, reparación de goteras en biblioteca y retiro de escombros de manto y realizar la disposición final.

Actividad Física y Cultural. Sedes Kennedy- Onassis: En esta sede ya se finalizaron las actividades a ejecutar, incluidas las garantías que estaban pendientes en cubiertas de aula de danzas y aula del teatríno. Esta sede presenta una ejecución del 100 %.

Gestión Administrativa: En esta sede se solo se continuó las actividades de suministro de instalación de manto asfaltico en piso once y terrazas de pisos cuatro y tercero.
Ítem 5.2.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE. Ejecutado en un 100%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%
NP-10.36 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE. Ejecutado en un 100%
NP-10.60 PENDIENTADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA. Ejecutado en un 100%
NP-10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Ejecutado en un 100%
Tiene porcentaje de ejecución del 69.24 %. En este periodo presenta atraso del 35% ya que según programación debía estar terminado los suministros e instalación de válvula anti vandálica de pusch de orinales; suministro de lámparas led, mantenimiento de cerraduras y gatos hidráulicos, suministro de mangueras para gabinetes de incendios, demolición de piso en caucho e instalación, retiro de escombros de mantos y realizar disposición final. A final de este periodo se han reportado humedades en piso once.

Gestión de Mercado y logística calle 52: Tiene un porcentaje de ejecución del 92%. Presenta atraso del 11 % reflejado en la no culminación en la aplicación del hidrófugo en fachada; el desmonte de canal en área gimnasio. En este periodo se reinició la actividad el lavado de fachada (por garantía). En el proceso de lavado de fachadas se quemaron protectores de cámaras de seguridad en primer piso- 2 cámaras de domo y 1 de cámaras de PTZ; los vidrios de ingreso a las sedes se mancharon con el ácido aplicado; se dañó la nomenclatura de la dirección del edificio, actividades que están pendientes por solucionar.
Hasta el 2 de marzo 2021 se reinició con el lavado de la fachada, actividad que se está realizando por garantía.
Ítem 8.80 LIMPIZA DE FACHADAS (ANTEPECHOS, TERRAZAS) Ejecutado en un 90%
Ítem 5.2.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE. Ejecutado en un 100%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%

Gestión Industrial. Torre occidental- carrera 32: En esta sede tiene un porcentaje de ejecución del 47.5 %. En este periodo se instala totalizador legrad de 1600 amp. Presenta un atraso del 49 % ya que aún no se terminado la instalación de tejas translucidas ni los caballetes articulados, remplazo de tejas fibrocemento # 6 y flanches metálicos.
Ítem 5.1.1 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE SUPERFICIAL. Ejecutado en un 100%
Ítem 5.3.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE PLASTICO. Ejecutado en un 100%
Ítem 9.7 REVISION PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL Ejecutado en un 100%
Ítem 9.8 LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS. Ejecutado en un 100%
NP-10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Ejecutado en un 100%
NP-10.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRASLUCIDA # 6 Ejecutado en un 50%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%
NP-10.36 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE. Ejecutado en un 100%

Manufacturas en Cueros y Textiles: En esta sede tiene un porcentaje de ejecución del 36%. Presenta un atraso del 52 % ya que aún no se iniciado la impermeabilización de fachadas sobre muro (emboquillada), la aplicación de hidrófugos, limpiezas de canales y la instalación de manto en frio sobre áreas de monitores.
Ítem 5.3.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE PLASTICO. (Meisen y Usme) Ejecutado en un 100%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%
En este periodo no se realizaron actividades, por lo que se ha aumentado el atraso.

Gestión Servicios Financieros: En esta sede tiene un porcentaje de ejecución del 58%. Presenta un atraso del 27 % ya que aún no se iniciado los enchapes en baños y en lo referente a la instalación de los orinales anti vandálicos, instalación hidrosanitaria para orinales enchape cerámico en baños, instalación de barandas en rampa.
Ítem 8.28 RESANES GENERALES PAÑETES SOBRE MURO Y BAJO PLACA Ejecutado en un 100%
Ítem 8.41 PLACA DE CONTRAPISO E = 0.15. Ejecutado en un 100%
Ítem 8.43 MEDIA CAÑA EN GRANITO E = 0.10 Ejecutado en un 80%
Ítem 8.67 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR Ejecutado en un 100%
NP -10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ADOQUIN EXISTENTE Ejecutado en un 90%

Gestión de Tecnologías del Transporte: En esta sede tiene un porcentaje de ejecución del 22%. Presenta un atraso del 24 % ya que aún no se iniciado la instalación de piso en caucho, mantenimiento cerramiento metálico, pintura epóxica en piso, instalación de logos en caucho, obras exteriores en acceso, construcción de escalones, camino en adoquín, suministro e instalación teja UPVC , suministro e instalación de manto asfaltico,

Ítem 1.2 HIDROFUGO DE FACHADAS. Ejecutado en un 100%
Ítem 8.16 DESMONTE DE FACHADA Y PAREDES EN SUPERBOARD. Ejecutado en un 60%
Ítem 8.24 SUMINISTRO PARA FACHADAS MUROS SUPERBOARD. Ejecutado en un 55%
Ítem 8.80 LIMPIEZA DE FACHADAS (ANTEPECHOS, TERRAZAS). Ejecutado en un 90%
Ítem 9.7 REVISION PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL Ejecutado en un 80%
Ítem 9.8 LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS. Ejecutado en un 100%

Gestión de Tecnologías para la construcción y la madera: Tiene porcentaje de ejecución del 15%. Con un atraso del 25% que corresponde a pintura de cancha y su demarcación.
Ítem 5.1.1 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE SUPERFICIAL. Ejecutado en un 100%
Ítem 5.3.4 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON SIKA MONOTOP Ejecutado en un 100%
Ítem 9.7 REVISION PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL Ejecutado en un 80%
Ítem 9.8 LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS. Ejecutado en un 100%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%
NP-10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Ejecutado en un 70%

Metalmecánico: Tiene porcentaje de ejecución del 83%. Presenta un atraso del 14 %. Que corresponde al trasiego y disposición de manto.
NP-10.36 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE. (Inicio el 17 febrero 2021) Ejecutado en un 100%
NP-10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Ejecutado en un 80%

Hotelería Turismo y alimentos: En esta sede no se realizaron actividades en este periodo, en la sede de paloquemado que presenta una ejecución real del 60%; en la sede de álamos se realizaron arreglos en cubierta.
Ítem 5.1.1 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE SUPERFICIAL. Ejecutado en un 100%
Ítem 5.3.1 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE ELEVADO. Ejecutado en un 100%
Ítem 9.7 REVISION PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL(álamos) Ejecutado en un 80%
ítem 9.8 LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS. Ejecutado en un 80%
NP-10.23 TOMA DE MUESTRA Y CERTIFICACION-FISICOQUIMICA. Ejecutado en un 100%

Centro para la comunicación Gráfica: En esta sede no se realizaron actividades en este periodo, Presenta un avance real del 94%.

Despacho Regional: Tiene porcentaje de ejecución del 10%. con un atraso del 20% que corresponde a aplicación de sikaplan para poder programar el lavado del tanque, instalación de poliuria en cubierta piso 19.

Dirección General: Tiene porcentaje de ejecución del 18.80 %. con un atraso del 40% que corresponde a instalación de manto, instalación de canales y pisos en caucho.
NP-10.36 DESMONTE DE MANTO EXISTENTE. Ejecutado en un 10%

Mitú Vaupés: Se suspenden actividades de forma unilateral en este periodo. En este periodo no se realizaron actividades en la sede.

Inírida Guainía: A la fecha del presente informe no se ha iniciado obras en esta sede, se ha informado al SENA para el inicio del proceso por incumplimiento contractual.

San José del Guaviare: Se suspenden actividades de forma unilateral en este periodo¸ dejando sin realizar actividades como el montaje de los parlantes en salón de video conferencias; la totalidad de los aires acondicionados fueron desinstalados para realizar el respectivo mantenimiento y no fueron instalados nuevamente. En este periodo no se realizaron actividades en la sede.

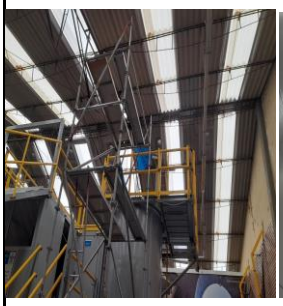
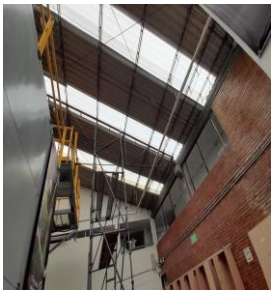
Puerto Carreño Vichada: Se suspenden actividades de forma unilateral en este periodo. En este periodo no se realizaron actividades en la sede.

Leticia Amazonas: Se suspenden actividades de forma unilateral en este periodo. En este periodo no se realizaron actividades en la sede.

	INFORME DE SUPERVISION	FECHA DEL INFORME:
		7-abr.-21
	CONTRATO SENA - CONSORCIO NACIONAL SENA 2020	PERIODO:
		FEBRERO - MARZO 2021




Georreferenciación	Descripción
	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA Y APLICACIÓN DE MANTO GESTIÓN INDUSTRIAL – TORRE OCCIDENTAL

Georreferenciación	Descripción
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA GESTIÓN INDUSTRIAL – CARRERA 32




Georreferenciación	Descripción
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO ASFALTICO FORMACIÓN TALENTO EN SALUD




Georreferenciación	Descripción
	LIMPIEZA DE FACHADAS (ANTEPECHOS, TERRAZAS) GESTIÓN DE MERCADO Y LOGÍSTICA CALLE 52

ING. JOSÉ SAMUEL GOMEZ E.

SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.1635462

ING. BRIAN ROBERTO RAMOS CARRILLO

APOYO A LA SUPERVISION
