SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No 22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanuvaot@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	56. IED BICENTENARIO	Carpinteria	16/06/2020	EN EJECUCION
2	81. IED LA JOYA - Barandas	Barandas - Proteccion	12/08/2020	EN EJECUCION
3	82. IED GARCES NAVAS	Estructural	13/08/2020	EN EJECUCION
4	83. IED PALESTINA A	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
5	84. IED PALESTINA B	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
6	87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION
7	93. IED LA MERCED	Tala - Poda	22/09/2020	EN EJECUCION
8	94. PALESTINA - Tala	Tala - Poda	09/09/2020	EN EJECUCION
9	96. IED PORVENIR - Hidraulico	Hidraulico	31/08/2020	EN EJECUCION
10	95. IED REPUBLICA DE BOLIVIA - Tala	Tala - Poda	22/09/2020	EN EJECUCION
11	101. IED MIGUEL ANTONIO CARO	Cubierta	23/08/2020	EN EJECUCION
12	102. IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	Cubierta	10/09/2020	EN EJECUCION
13	105. IED ESTANISLAO ZULETA	Cubierta	14/09/2020	EN EJECUCION
14	106. IED PALERMO - Terraza	Impermeabilizacion	07/09/2020	EN EJECUCION
15	107. IED PALESTINA - Tala II	Tala - Poda	14/09/2020	EN EJECUCION
16	108. IED EL JAZMIN	Cubierta	14/09/2020	EN EJECUCION
17	109. IED CAMILO TORRES	Electrico	21/09/2020	22/09/2020
18	110. LOTE SAN DIEGO	Cerramiento	18/09/2020	EN EJECUCION
19	112. IED ACACIAS II	Hidraulico	17/09/2020	21/09/2020
20	113. IED JUAN DEL CORRAL - Carcamos	Hidraulico	21/09/2020	EN EJECUCION
21	114. IED PALERMO - Electrico	Electrico	22/09/2020	EN EJECUCION
22	115. INEM DE KENNEDY - Tala	Tala - Poda	22/09/2020	EN EJECUCION
23	116. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B - Tala	Tala - Poda	21/09/2020	EN EJECUCION

OBSERVACIONES	

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 16/06/2020	**INSTITUCION:** **56. IED BICENTENARIO**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLIVAR**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	**DIRECCION:** Calle 81 Sur No 18 P 08	**TIPO DE EMERGENCIA:** BARANDAS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se evidencia desplome en el muro circular de la fachada en el area de la Biblioteca infantil, el cual se encuentra contiguo a un pasillo de circulacion con el riesgo latente de que en caso que colapse provocaria lesiones fisicas graves a la poblacion estudiantil que transite en ese momento. De igual forma se presenta un riesgo en la totalidad de las barandas metalicas del colegio las cuales estan sueltas y muy deterioradas, generando el colapso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

CONCRETO BASE GRADAS DE 0.30 - 3000 PSI

Aseo de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS: Las actividades se ejecutan en sitio con equipos y mano de obra calificada en carpinteria metalica y soldadura. Aseo final y fino solicitado por la SED y el colegio para entregar espacios limpios y desinfectados

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 285.513,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1421

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 12/08/2020	INSTITUCION: 81. IED LA JOYA (DON BOSCO I) SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1973	DIRECCION: CALLE 80 A SUR No. 18 C 70	TIPO DE EMERGENCIA: CARPINTERIA - BARANDAS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - PUNTOS FIJOS - RAMPAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El área donde la poblacion estudianti realiza su desplazamiento al interior del colegio esta delimitada por un antepecho en mamposteria que cuenta con una altura inferior a la exigida por la norma haciendo de este inseguro, y en consecuencia el riesgo latente de que cualquier persona pueda caer, mas aun cuando esto facilita lapráctica de deportes urbanos de alto riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA


Se continuan actividades de alistado y corte de material

instalacion de anclajes

Instalacion de Platinas y Barandas

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO

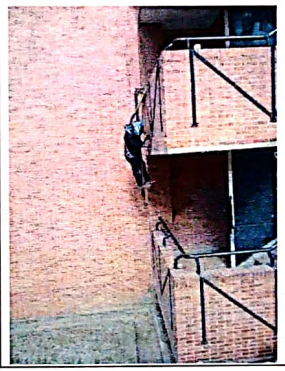





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en ornamentacion, carpinteria metalica y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 3.964.800,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	INSTITUCION: 82. IED GARCES NAVAS - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	DIRECCION: CRA. 104 A No. 77C-50	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la instalacion de estructura para muros internos

Suministro e instalacion de muros en superboard

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.299.000,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la excavacion para realizar cimentacion

Suministro e instalacion de acero para vigas y cimentacion

Suministro e instalacion de malla electrosoldada

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.694.000,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	**INSTITUCION:** 84. IED LA PALESTINA - SEDE B		**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	**DIRECCION:** AV. CLL. 80 No.78-88	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE TERMINA DE FUNDIR PLACA DE CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI.

INSTALACION DE DOVELAS PARA LEVANTAR MURRO

SE INICIA CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO = 12CM

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.156.374,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 25/07/2020	INSTITUCION: 87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR - SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 541	DIRECCION: CARRERA 14 No. 95 A 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B mediante comunicación escrita de fecha 12 de junio del año en curso manifiesta que se presenta emergencia debido a que "(...) por la inclemencia del clima que estamos viviendo en la ciudad, se presentaron filtraciones de aguas lluvias en la sala de sistemas de dicha sede, generando, daños en el mobiliario y la estructura física de la sala (...)".

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ASEO Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 656.000,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	**INSTITUCION:**	**93. IED LA MERCED**	**LOCALIDAD:** **PUENTE ARANDA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1631	**DIRECCION:**	Av. Cll 13 No.42A-51	**TIPO DE EMERGENCIA:**	TALA - PODA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**DIAGNOSTICO DE LA VISITA**
La secretaria Distrital de ambiente realizo visita de evaluacion de silvicultura al colegio la Merced y mediante acta de visita MOG/20200572/047 del 9 de Julio de 2020 autorizo la TALA de UN (1) arbol de la especie CEREZO, un (1) arbol de la especie HOLLY LISO dado que presentan estado avanzado de marchitez y la PODA de un (1) arbol de la especia CHICALA que presenta fisura en una de sus bifurcaciones	Se realizó visita técnica el día 27 de Julio del 2020 por parte de la interventoría y el contratista a la IED La Merced, donde se evidencia un individuo arboreo de la especie CHICALA que presenta una fisura en una de sus bifucarciones con inclinación a la vía de acceso vehicular. Adicionalmente, se evaluan dos árboles de la especie CEREZO y HOLLY LISO con un avanzado estado de marchitez, por lo que se considera tecnicamente viable su TALA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
PODA DE ÁRBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m. tala de individuos arbóreos de 0> H <5 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES		**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y ejecucion de la actiividad. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**$ 858.602,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 09/09/2020	INSTITUCION: 94. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: TALA - PODA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La secretaria Dstrital de ambiente mediante radicado E-2020-28960 de 20 de Febrero de 2020 informo que mediante Acta de VisitaJN/538/124 y posteriromente mediante concepto tecnico de atencion de emergencias silviculturales SSFS-09454 de 24 de septiembre de 2015 autorizal la TALA de OCHO (8) arboles de las especies CIPRES #2, CAUCHO DE LA INDIA #5, EUCALIPTO POMARROSO #6, PINO CANDELABRO #10, SAUCE LLORON #19 CEREZO #25, CAUCHO SABANERO #32 Y CHICALA #33, debido a que presentan deficiente estado fisico y sanitario, altura excesiva para el lugar de siembra y espacio insuficiente de emplazamiento, elementos que en conjunto generan riesgo de volcamiento en proyeccion a zona de trafico peatonal de estudiantes. Asi mismo aprobo la PODA DE ESTRUCTURA DE VEINTISEIS (26) arboles y la PODA DE ESTABILIDAD de UN (1) arbol.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

tala de individuos arbóreos de 10> H <15 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

tala de individuos arbóreos de 20> H <25 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Durante la visita técnica realiza por interventoria el dia 22 de Julio del 2020, no se evidencio en pie los individuos arboreos de especie CAUCHO DE LA INDIA #5 y EUCALIPTO POMARROSO #6 con viabilidad técnica para TALA de acuerdo con el concepto SSFFS-09454.

De igual manera, no se evidenciaron en pie los individuos arboreos de las especies JAZMÍN DEL CABO #21 Y #22, ACACIA MORADA #30 y CEDRILLO #35 viables para podas de estructura de acuerdo con el concepto SSFFS-09454.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.693.114,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1728

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 31/08/2020	**INSTITUCION:** **96. IED PORVENIR**		**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**731**	**DIRECCION:**	**Cll. 51 No.91D - 56**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**HIDRAULICO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**CUARTO DE EQUIPOS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institucion educativa se encuentra sin suministro de agua potable debido a un fallo en los equipos hidroneumaticos de bombeo y la red hidraulica del colegio. Si bien la aseguradora realizo actividades de mantenimiento en una motobomba, el colegio persiste con la problematica en su red hidraulica ya que esta ultima no esta comprendida dentro del alcance de la aseguradora

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 974.944,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 95. IED REPUBLICA DE BOLIVIA		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CARRERA 68 G # 78-90	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La rectora del colegio Bolivia mediante radicado E-2019-169470 de 29 de octubre de 2019 solicito la Tala autorizada por la Secretaria Distrital de Ambiente mediante concepto tecnico de atencion de emergencias silviculturales 2013GTS2393 del 24 de Agosto de 2013, posteriormete mediante radicado E-2020-28960 DE 27 de febrero de 2020 remitio copia del concepto señalado en el cual autoriza la TALA de UN (1) individuo de la especia URAPAN. En visita realizada el 2 de julio de 2020 se evidencio que el arbol efectivamente no ha sido talado y esta generando riesgo por inadecuado emplazamiento, afectacion de infraestructura, agrietamiento de anden y levantamiento de terreno en zona de paso de estudiantes.	Se realizó visita técnica el día 22 de Julio del 2020 por parte de la interventoria y el contratista; se evidencia un individuo arboreo de la especie URAPAN con una altura aproximada de 12 metros en el interior del colegio República de Bolivia, especificamente entre dos aulas escolares, generando afectación de infraestructura, agretamiento del anden y levantamiento de terreno en zona de tránsito escolar.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
tala de individuos arbóreos de 10> H <15 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS	  

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y ejecucion de la actiividad. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 1.276.800,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 23/08/2020	INSTITUCION: 101. IED MIGUEL ANTONIO CARO		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1025	DIRECCION: Transv. 94 No.81A-29	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se desajustaron y quebraron varias unidades de la cubierta de asbesto cemento en un bloque de aulas, generando el ingreso de agua lluvias a estas dañando material didactico y mobiliario.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE TEJA ONDULADA EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.528.765,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 10/09/2020	**INSTITUCION:** **102. IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ**		**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 746	**DIRECCION:** Cll.72 sur No.100A-71	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA


Fallo en el sumnistro de agua potable al plantel. No hay alimentacion a los tanques de reserva. El colegio hace mantenimiento rutinario pero la averia persiste. No se ha logrado ubicar los puntos de fuga porque presumiblemente se requieren obras de mayor trascendencia de exploracion y excavacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

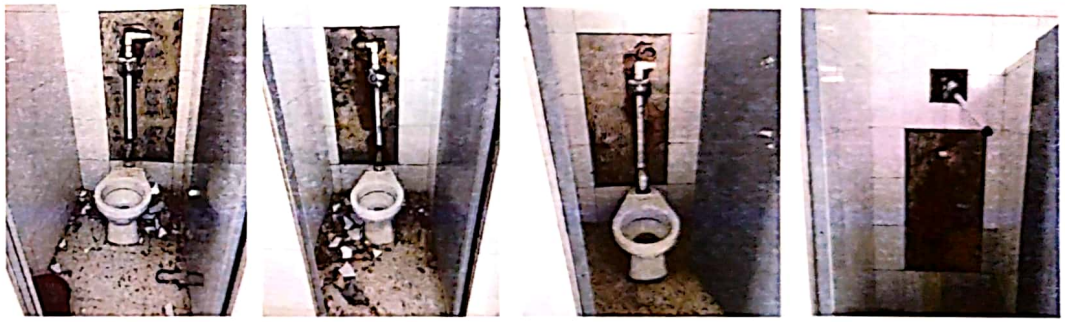

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 32.000,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 14/09/2020	INSTITUCION: 105. IED ESTANISLAO ZULETA		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 529	DIRECCION: Cra. 4 este No.90D-24 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a su alta vetustes sumado a una fuerte ventisca se encuentra afectada la cubierta de cemento tipo canales 90 en un (01) aula, afectando ducteria electrica, sistema de iluminacion y generando el ingreso de aguas lluvias a esta pudiendo afectar mobiliario y material didactico

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"

REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE

TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"

TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO















OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 334.306,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

2800

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 07/09/2020	**INSTITUCION:**	**106. IED PALERMO**	**LOCALIDAD:** TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	**DIRECCION:** Cra.23 No.49-51	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA - IMPERMEABILIZACION	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TERRAZA - AULA SISTEMAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta del aula de sistemas presenta fallas en su impermeabilizacion, generando filtracion de agua lluvia a este espacio y por ende el contacto de estas con las instalaciones electricas localizadas a su interior produciendo variaciones de craga, corto circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de computo y redes de datos

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO











OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 7.985.461,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1734

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 14/09/2020	INSTITUCION: 107. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La secretaria Distrital de ambiente mediante radicado E-2020-93125 de 8 de septiembre de 2020 informo que mediante concepto tecnico SSFFS-08833 de 9 de Junio de 2020 autorizo la TALA de UN (1) arbol de la especia URAPAN, UN (1) arbol de la especia NOGAL, Un arbol de la especie ACACIA BRACATINGA, DOS (2) arboles de la especie CEREZO y un (1) SAUCO debido a que presentan deficiente estado fisico y sanitario, inclinacion, inadecuado distanciamiento de plantacion, crecimiento excesivo para su lugar de emplazamiento i distanciamiento inadecuada a infraestructura. Se debera reportar el resultado de la verificacion de la existencia de nidos y su correspondiente manejo previo a la intervencion de los arboles y certificar la disposicion final de los residuos resultantes de las talas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA


tala de individuos arbóreos de 5> H <10 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

tala de individuos arbóreos de 10> H <15 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

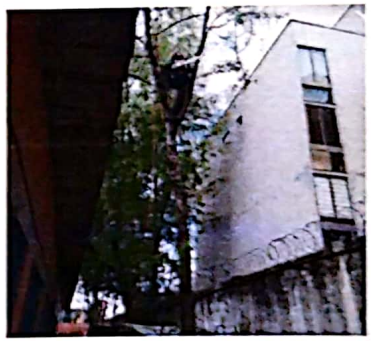

OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y ejecucion de la actividad. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.364.677,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

2802

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 14/09/2020	INSTITUCION: 108. IED EL JAZMIN		LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1612	DIRECCION: Carrera 41 B No 4 C 27	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLO Y DEPOSITO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se desajustaron, quebraron y levantaron varios módulos de cubierta en policarbonato, unidades de cubierta en fibrocemento, la tapa de un tanque plástico de almacenamiento de agua, y la rotura de un tramo de tubería hidráulica, elementos localizados sobre el deposito de materiales de educación física, permitiendo el ingreso de agua lluvia y el contacto directo de esta con los elementos almacenados, mobiliario e instalaciones eléctricas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.709.937,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1736

Escaneado con CamScanner

2803

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	INSTITUCION: 103. IED EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES		LOCALIDAD: SANTAFE
FECHA DE TERMINACION: 22/09/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 319	DIRECCION: AVENIDA CARRERA 7a No. 33-64	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la evidente vetustes de ñas redes electricas existentes, se presento un corto circuito, el cual genero un conato de incendio en las areas de circulacion donde se encuentran localizados los tableros principales, impidiendo el correcto funcionamiento del sistema de seguridad (alarmas) y por ende el riesgo latente de ingreso de personal no autorizado a la instaitucion educativa con el fin de invadir o realizar hurtos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se atiende emergencia reportada por la SED en horas de la noche debido al corto circuito que afecto el colegio. Se realiza reparacion provisional. En la presente visita se realiza evaluacion del sistema donde se evidencia falla en el sistema electrico donde se presenta sulfatacion en el conductor, lo que esta generando alteracion en la frecuencia del fluido electrico. Los breakers son de alto ampejaje y no estan cumpliendo la funcion de proteger en caso de una sobre carga. El pin de amperaje no es el adecuado para el tablero electrico existente. Los tableros se encuentran fuera de norma

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE REALIZA REVISION, MEDICION Y BALANCEO DE CARGAS

DESMONTE DE APARATOS, TABLEROS Y COMPONENTES

SUMINISTRO E INSTALCION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOSCON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A

RESANES GENERALES

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.381.720,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1737

Escaneado con CamScanner

2804

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 18/09/2020	INSTITUCION: 110. LOTE SAN DIEGO		LOCALIDAD: SANTAFE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 327	DIRECCION: Cra. 3 No.26-40	TIPO DE EMERGENCIA: CERRAMIENTO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El area delimitada por el cerramiento provisional en alambre de puas fue retirado, lo cual genero sustraccion de elementos y que los predios del colegio sean utilizados como deposito de escombreos, lo cual esta generando problemas de inseguridad, sumados a condiciones de insalubridad para transeuntes y residentes del sector

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE COTINUAN ACTVIDADES CON EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

ASEO GENERAL DE LOTE, RETIRO DE MALEZA, RESIDUOS Y BASURA PARA ABRIR SENDERO PEATONAL

ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla tecnica para realizar el trasiego y la intervencion de obra en el lote. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 6.155.126,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1738

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 17/09/2020	INSTITUCION: 112. IED ACACIAS II		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: 21/09/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 319	DIRECCION: Diagonal 62 sur No438-42	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PATIO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presume la ocurrencia de un fenómeno de sobrepresión de la red hidráulica afectando un tramo de tubo ubicado dentro de la placa de contrapiso en la cancha múltiple generando fugas de agua, y por ende desperdicio de agua potable y afectaciones en el funcionamiento de las redes hidráulicas generando emergencia de tipo hidráulica .

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

ACCESORIOS Ø 3" PVC-P

ASEO Y LIMPIEZA DIARIA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 134.824,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

2806

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	INSTITUCION: 113. IED JUAN DEL CORRAL		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	DIRECCION: Cra.69B No79A-42	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERNO - CARCAMOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria en la institucion educativa debido a la acumulacion de lodo, insectos muertos, basura y generacion de malos olores en los carcamos perimetrales a la cancha multiple; elementos a los cuales no se les pudo realizar actividades de aseo en su interior debido al elevado peso de las tapas en concreto, las cuales adicionalmente presentan fisuramiento y riesgo de rotura, asi mismo se aprecia afloracion de agua limpia en diferentes sectores del carcamo y aula de clase de primer piso

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita al colegio donde se presenta alta contaminacion en los carcamos existentes del colegio por la presencia de basura, piedras, palos, lodo e insectos, lo que ocasiona mal olor y agua aposada en ellos. Asi mismo las tapas en concreto que las recubren presentan fisuradas, con alto deterioro y riesgo por su mal estado. Debido al peso considerable de las tapas es dificil realizar aseo y limpieza a los carcamos por el personal de aseo. La pendiente de los carcamos no es la adecuada, lo que genera que el agua no fluya hacia los sifones, ocasionando aposamiento e incremento del mal olor y contaminacion.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 6.547.866,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1740

Escaneado con CamScanner

2807

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 114. IED PALERMO	LOCALIDAD:	TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: Cra.23 No.49-51	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a filtraciones provenientes de la placa de cubierta de las aulas de sistemas, provocan el contacto directo de aguas lluvias con las instalaciones electricas produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a euipos de computo y redes de datos. Igualmente se presentan problemas de cortos circuitos en las areas de circulacion	Se realiza la revision de todo el sistema electrico que presenta afectaciones, encontrando que la red presenta sobrecarga por la no adecuada distribucion de los circuitos. Gran parte de la iluminacion no se puede apagar, lo que genera alto consumo en el colegio. Iluminacion en mal estado, cables expuestos y conexiones en mal estado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS	   

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	$ 927.598,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1741

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 115. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 866	DIRECCION: Cll.38C sur No.79-08	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La secretaria Distrital de ambiente mediante radicado E-2020-6896 del 17 de Enero de 2020 remitio a la SED concepto tecnico de atencion de emergencias silviculturales SSFFS-04865 del 19 de mayo de 2015 mediante el cual autorizo la TALA de UN (1) arbol de la especie EUCALIPTUS CINEREA, UN (1) arbol de la especie EUCALYPTUS GLOBULUS y SEIS (6) ACACIA DECURRENS que presentan ramas secas, copa asimetrica, fuste inclinado, mal anclaje y susceptibilidad al volcamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realizó visita técnica el dia 27 de Julio del 2020 por parte de la interventoria y el contratista; se evidencia un individuo arboreo de la especie EUCALIPTO COMÚN con una altura aproximada de 11 metros y un individuo arboreo de la especie EUCALIPTO PLATEADO con una altura aproximada de 10 metros los cuales presentan copa asimetrica, con ramas en peligro de caida, fuste fisurado, con gomosis, cercania a salones de preescolar y alta susceptibilidad de volcamiento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

tala de individuos arbóreos de 5> H <10 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

tala de individuos arbóreos de 10> H <15 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Durante la visita técnica realizada por la interventoria y el contratista a las instalaciones del colegio INEM Francisco de Paula Santander no se encontraron en pie los seis individuos arboreos de especie ACACIA NEGRA reportados para TAÑA en el concepto técnico SSFFS - 04865.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.087.877,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

2809

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 23.1 (Septiembre 21 - Septiembre 22)		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	INSTITUCION: 116. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA - SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 526	DIRECCION: Cra.2A No.137D-20 sur	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La secretaria Distrital de ambiente mediante radicado E-2020-65812 del 17 de junio de 2020 informo que mediante acta de visita STR-20190326-18724 y posteriormente mediante concepto tecnico de atencion de mergencias silviculturales SSFFS-04653 de 18 de marzo de 2020 autorizo la TALA de UN (1) arbol de la especie NOGAL, el cual se encuentra seco, preseta perdida de estabilidad, sistema radicular mal desarrollado y madera revirada

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realizó visita técnica el día 27 de Julio del 2020 por parte de la interventoria y el contratista; se evidencia un individuo arboreo de la especie NOGAL con una altura aproximada de 07 metros en el interior del colegio Francisco Antonio Zea de Usme - Sede B, especificamente al costado derecho de la entrada escolar.

El individuo arboreo presenta pérdida de estabilidad, sistema radicular mal desarrollado y madera revirada.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

tala de individuos arbóreos de 5> H <10 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y ejecucion de la actiividad. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 811.077,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1743

Escaneado con CamScanner
