SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.527-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanuevaf@yahoo.com licitacionesdatis@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71 # No 82-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109436 / 311 383 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitaciones2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 426.828.400,00 COP

SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	81. IED LA JOYA - Barandas	Barandas	13/08/2020	EN EJECUCION
2	82. IED GARCES NAVAS	Estructural	13/08/2020	EN EJECUCION
3	83. IED PALESTINA A	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
4	84. IED PALESTINA B	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
5	106. IED PALERMO - Terraza	Impermeabilizacion	07/09/2020	EN EJECUCION
6	113. IED JUAN DEL CORRAL - Carcamos	Hidraulico	21/09/2020	EN EJECUCION
7	114. IED PALERMO - Electrico	Electrico	22/09/2020	EN EJECUCION
8	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baño	05/10/2020	EN EJECUCION
9	119. IED LAS MARGARITAS	Cubierta	01/10/2020	EN EJECUCION
10	121. IED REPUBLICA DE ECUADOR	Hidraulico	05/10/2020	09/10/2020
11	122. IED USAQUEN SEDE B	Estructural	05/10/2020	EN EJECUCION
12	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	06/10/2020	EN EJECUCION
13	129. IED PASQUILLA RURAL	Hidraulico	07/10/2020	EN EJECUCION
14	132. IED LAUREANO GOMEZ - Hidraulico	Hidraulico	08/10/2020	EN EJECUCION
15	134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	Hidraulico	07/10/2020	EN EJECUCION

OBSERVACIONES:	

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2022	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 12/08/2022	INSTITUCION: 81. IED LA JOYA (DON BOSCO I) SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1973	DIRECCION: CALLE 80 A SUR No. 18 C 70	TIPO DE EMERGENCIA: CARPINTERIA - BARANDAS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - PUNTOS FIJOS - RAMPAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El área donde la población estudiantil realiza su desplazamiento al interior del colegio esta delimitada por un antepecho en mamposteria que cuenta con una altura inferior a la exigida por la norma haciendo de este insegura, y en consecuencia el riesgo latente de que cualquier persona pueda caer, mas aun cuando este facilita la práctica de deportes urbanos de alto riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA


Se continuan actividades de alistado y corte de material Para escaleras y Rampas

Instalacion de anclajes en Rampas (muros y pisa)

Instalacion de Platinas y Barandas

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO

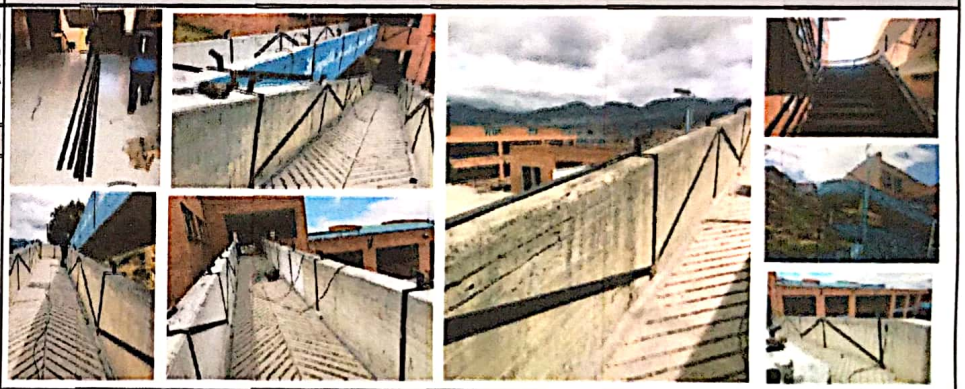

OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en ornamentacion, carpinteria metalica y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 7.094.952,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)**		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	**INSTITUCION:** **82. IED GARCES NAVAS - SEDE B**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	**DIRECCION:** CRA. 104 A No. 77C-80	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la instalacion de aeabados en piso - enchapes



Resane y pintura de muros internos con vinilo

Resane y pintura de muros externos con pintura Koraza

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO

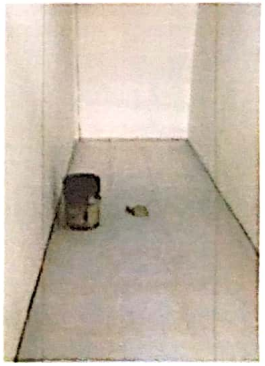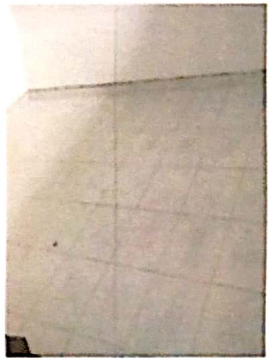

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 2.202.208,20

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 28/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la instalacion de mamposteria para muros de cerramiento

Instalacion de dovelas de refuerzo

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.562.911,68

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 84. IED LA PALESTINA - SEDE B	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1067	DIRECCION: AV. CLL. 80 No.78-88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MUROS EN LADRILLO = 12CM

INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISOS INTERIORES

ASEO Y LIMPIEZA A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 771.558,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)**		
FECHA DE INICIO: 07/09/2020	**INSTITUCION:** **106. IED PALERMO**		**LOCALIDAD:** **TEUSAQUILLO**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	**DIRECCION:** Cra.23 No.49-51	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA - IMPERMEABILIZACION	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TERRAZA - AULA SISTEMAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta del aula de sistemas presenta fallas en su impermeabilizacion, generando filtracion de agua lluvia a este espacio y por ende el contacto de estas con las instalaciones electricas localizadas a su interior produciendo variaciones de craga, corto circuitos y conatos de incendio y por ende serios averias a equipos de computo y redes de datos

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO DE MANTO ASFALTICO

LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 655.598,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Iván Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)**		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	**INSTITUCION:** **113. IED JUAN DEL CORRAL**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	**DIRECCION:** Cra.69B No79A-42	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERNO - CARCAMOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria en la institucion educativa debido a la acumulacion de lodo, insectos muertos, basura y generacion de malos olores en los carcamos perimetrales a la cancha multiple; elementos a los cuales no se les puede realizar actividades de aseo en su interior debido al elevado peso de las tapas en concreto, las cuales adicionalmente presentan fisuramiento y riesgo de rotura. asi mismo se aprecia afloracion de agua limpia en diferentes sectores del carcamo y aula de clase de primer piso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO

PAÑETE DE MUROS INTERNO DE CARCAMO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.123.602,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440644	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 114. IED PALERMO		LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: Cra.23 No.49-81	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a filtraciones provenientes de la placa de cubierta de las aulas de sistemas, proveeran el contacto directo de aguas lluvias con las instalaciones electricas produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de compute y redes de datos. Igualmente se presentan problemas de cortos circuitos en las areas de circulacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT

S.I. DE SALIDA PARA LAMPARA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.530.220,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.161C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solicitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 113.010,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 01/10/2020	INSTITUCION: 119. INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITAS	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 868	DIRECCION: CARRERA 86 C No 43-53 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AREA COMUN ASCENSOR Y TGA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En el área común, se presenta el colapso de una estructura provisional de cubierta elaborada en madera y plástico. Despues de varias precipitaciones se evidencia que el agua lluvia ingresaba a aulas y circulaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica y equipos - cuadrilla especial en ornamentacion e impermeabilizacion, certificado para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.534.365,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 05/10/2020	INSTITUCION: 121. IED REPUBLICA DE ECUADOR	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: 09/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 410	DIRECCION: Cra.1A No.6C-80 sur	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PATIO INTERNO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El peticionario del predio realizo a la inspeccion una visita para dar manifiesto su inconformismo por la presencia de humedades al interior de su vivienda, generadas presuntamente por aguas servidas provenientes de una caja de inspeccion del colegio, la cual indico que pueden generar accidentes de tipo legal en contra de la Entidad. Mientras que la casa (...)".

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la visita realizada, se evidencia una caja de recoleccion que se encuentra en el patio interno de la sede y colindante a un predio de carácter habitacional y de vivienda. En el momento de la visita no se percibe inundacion del area y la caja se encuentra llena en un 30% de su capacidad. El area se encuentra en una zona de alta humedad y tambien se evidencia que por los acabados existentes se incrementan los niveles freaticos, ocasionando tambien que este problema que es de caracter natural, se vea reflejado en los muros interiores de las edificaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE ESCOMBROS)

RELLENO DE CAJA

APINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PLASTICO

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 188.509,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440648	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 08/10/2020	INSTITUCION: 122. IED USAQUEN SEDE B	LOCALIDAD:	USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 125	DIRECCION: Av. Cra.9 No.146-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - MURO/ACCESO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CERRAMIENTO Y PATIO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Un módulo del muro de cerramiento de la institución educativa presenta una fisura representativa longitudinal, lo cual afecta seriamente su estabilidad e integridad estructural, y enconsecuencia un alto riesgo de colapso, que si se diera provocaria lesiones fisicas graves a las personas que transiten cerca a el en ese momento.	En visita se verifica la emergencia reportada en donde se evidencia que la fisura reportada sobre el muro a primera vista y con el diagnostico inicial, es sobre el pañete, el cual es de gran espesor. Asi mismo se inspeccionan cada una de las secciones del cerramiento, encontrando que los muros del partico entre columnas, presentan una dilatacion considerable. Los muros internos y divisorios del cuarto de servicio, de la poceta y del aula, tambien presentan dilataciones y no estan amarrados al del cerramiento, lo que esta causando una carga sobre este. Se evidencia igualmente riesgo alto sobre las placas de concreto frente a los salones y al ingreso del colegio, lo que esta ocasionando apozamiento de agua lluvia y tambien podria causar tropiezos y accidentes a la comunidad estudiantil.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA INSTALCION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO Ó SIMILAR, H=2.15 m, INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE 2.00 m, CADA UNA, + PASADOR DE SEGURIDAD Ó CADENA Y CANDADO. DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro) ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo, construcción de muros y placas en concreto. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 8.982.973,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 06/10/2020	INSTITUCION: 124. IED GENERAL SANTANDER	LOCALIDAD:	USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 138	DIRECCION: CII.189 No.8-84/88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vias respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.	De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en riesgo reportadas, presentan elementos estructurales que estan a punto de colapsar. Algunos muros presentan fisuras. Pisos en mal estado y cubierta obsoletas que estan permitiendo la entrada de agua lluvia al interior de las aulas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro) ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 1.037.350,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 07/10/2020	INSTITUCION: 129. IED RURAL DE PASQUILLA SEDE E - La Finca		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1977	DIRECCION: El Rubi - Pasquilla	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERNO - AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Hacia el perimetro de un bloque de aulas se presentan empozamientos e inundaciones cuando llueve por mas leve que esta sea, generando una emergencia de tipo hidraulico debido a la no eficiente recolección y evacuación de aguas lluvias.	Una vez realizada la visita a la zona, se identifica la emergencia reportada, donde se evidencia que la cuneta que existe actualmente no posee la suficiente capacidad de recolección del agua lluvia que cae en la zona y de la que baja por el terreno adjunto, generando un problema y riesgo en la comunidad estudiantil debida a que el area se inunda constantemente por la poca y lenta fluidez del agua alli apozada.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA DEMOLICION DE PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro) CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm) ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial para ejecucion de actividades en obra civil. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 5.841.711,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACSR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCONTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 08/10/2020	INSTITUCION: 132. IED LAUREANO GOMEZ	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1005	DIRECCION: Cra 95G #90A-24	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una filtracion de agua se inunda el cuarto de bombeo afectando e inutilizando los equipos hidroneumáticos y tablero eléctrico de control, generando deficiencias en el funcionamiento de la red hidráulica, adicionalmente se presentan fugas en el tanque de almacenamiento debido a la ausencia de impermeabilización.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita para la inspeccion inicial de los equipos con el personal teenico especialista donde se evidencia la emergencia reportada, encontrando que por causas de la inundacion presentada en el cuarto de equipos de bombeo, los aparatos se encuentran con daños catastroficos e irreparables. Se procede a revisar los daños. De acuerdo a esta valoracion, se encuentra que los equipos ha sufrido daño completo y no tienen reparacion, por lo cual es necesario su reemplazo junto con todos sus componentes. Se encuentran valvulas, cheques, reglahs, unions y tuberia en pesimas condiciones. Asi como tuberia hidraulica tapada y en mal estado. Presentan fugas y no sellan. Tableres electricos en corto y daño total. Presencia de malas conexiones con posible riesgo de cortos circuitos. Las espacios se encuentran en pesimas condiciones. Las condiciones de los tanques de almacenamiento son desfavorables asi como los elementos en su interior.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE INICIAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARA EL DESMONTE DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS EXISTENTES QUE PRESENTAN COMPLETO DETERIORO

INSTALACION DE ELEMENTOS HIDRAULICOS (TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HG

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Se le recuerda al contratista que estas actividades se deberan ejecutar con personal calificado y especializado en hidraulica/electrica. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 13.437.163,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACSR - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 25 (Octubre 05 - Octubre 11)		
FECHA DE INICIO: 07/10/2020	INSTITUCION: 134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA RUECA No. 878	DIRECCION: CR.42F Sur No.88A-28	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.	Se atiende la emergencia con la inspeccion inicial de los equipos con el personal tecnico especialista donde se realiza revision del area y los equipos alli presentes. Se evidencia que los elementos y equipos se encuentran fuera de servicio y claramente se percibe que no han tenido mantenimiento por un buen tiempo. El cuarto se encuentra obstaculizada por la presencia de elementos que no hacen parte del sistema hidraulico (equipos, materiales y herramientas de obra y construccion) lo que claramente esta generando el acceso de personas ajenas y no calificadas para manipular los equipos. Entre los equipos existentes estan, dos bombas para agua lluvia, dos bombas para agua potable, tres tanques hidroacumuladores y dos tablero electrico. Se procede a revisar los daños donde se encuentra que los equipos trabajan en vacio y no tienen reparacion, por lo cual es necesario su reemplazo junto con la mayoria de sus componentes. Se encuentran valvulas, cheques, registros, uniones y tuberia en pesimas condiciones y con fugas. Se realiza medicion de cargas en tablero de control, en donde se encuentran que presentan fallas de todo su sistema electrico. Presencia de malas conexiones en equipos, cableado, tubulizadores y soldar electricas que estan ocasionando un posible riesgo electrico. Asi mismo el estado interno de los tanques de almacenamiento y sus elementos no es favorable. Todo esto sumado ha generado que el colegio no tenga el suministro de agua plenamente y se encuentra con flujo directo del acueducto, lo que hace que tenga baja presion. Se deberia evaluar tanque de almacenamiento que no posee impermeabilizacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARA EL DESMONTE DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS EXISTENTES QUE PRESENTAN COMPLETO DETERIORO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HG SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	    

OBSERVACIONES		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	$ 11.398.164,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner
