**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**
**FASE No. 2 OBRA**
**No. 4_SEDE NIÑO JESÚS**

| FECHA | 29/03/2021 | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | **4. CHOCÓ- QUIBDÓ, HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS, CL 14 # 5 B - 16 BARRIO NIÑO JESUS** |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | No.0101646 - 2020 | | CONTRATO No.: | No 0101649 - 2020 | |
| PLAZO INICIAL: | UN MES Y VEINTICINCO DÍAS | | PLAZO INICIAL: | UN MES Y QUINCE DÍAS | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | SEIS MESES | | PLAZO ACTUALIZADO: | CINCO MESES VEINTE DÍAS | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | viernes, 6 de noviembre de 2020 | | FECHA DE INICIACIÓN: | viernes, 6 de noviembre de 2020 | |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 : | - | | *FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 : | - | |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | - | | *FECHA DE REINICIACIÓN: | - | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | jueves, 31 de diciembre de 2020 | | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | lunes, 21 de diciembre de 2020 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | jueves, 6 de mayo de 2021 | | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | domingo, 25 de abril de 2021 | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 182 | | PLAZO ACTUALIZADO: | 171 | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 143 EQUIVALE AL | 79% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 143 EQUIVALE AL | 84% |
| VALOR INICIAL : | $ 249.043.319,00 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 733.959.553,00 | |
| VALOR INICIAL : | $ 249.043.319,00 | | VALOR FRENTE DE TRABAJO : | $ 216.861.673,16 | |
| VALOR ADICION(ES): | $ - | | VALOR ADICION(ES): | $ 12.827.960,00 | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 249.043.319,00 | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 229.689.633,16 | |
| VALOR PAGADO: | $ - | | VALOR PAGADO: | $ - | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 249.043.319,00 | | VALOR POR PAGAR: | $ 229.689.633,16 | |
| SUPERVISOR: | LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA | | INTERVENTOR: | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ | | REPRESENTANTE LEGAL: | EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA | |

## 2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

### 2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

| PERSONAL DE OBRA | DEDICACIÒN | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORIA | DEDI. | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | 100% | 1 | REPRESENTANTE LEGAL | 100% | 1 |
| DIRECTOR DE OBRA | 50% | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 50% | 1 |
| RESIDENTE DE OBRA | 100% | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1 | 100% | 1 |
| RESIDENTE SISOMA | 100% | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2 | 100% | 1 |
| ESP. HIDROSANITARIO | 5% | 1 | RESIDENTE SISOMA | 100% | 1 |
| ESP. ELÉCTRICO | 5% | 1 | ASESOR HIDROSANITARIO | 5% | 1 |
| RESIDENTE DE COSTOS. | 5% | 1 | ASESOR ELÉCTRICO | 5% | 1 |
| MAESTRO DE OBRA | 100% | 1 | PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES | 5% | 1 |
| AYUDANTE DE OBRA | 100% | 1 | APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA | 100% | 1 |

### 2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DEL CLIMA | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☐ Tiempo Seco<br>☑ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa |
| DURACIÓN (h) | NO APLICA | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |

**AFECTACIÓN A LA OBRA POR LLUVIAS**

**OBSERVACIONES**

**ESTA SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS MODERADAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SIN AFECTACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

### 2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

| DESCRIPCIÓN | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados? | ☑ | ☐ |
| ¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación? | ☑ | ☐ |
| ¿El personal destinado fue suficiente? | ☑ | ☐ |
| ¿El personal era idóneo para la actividad? | ☑ | ☐ |
| ¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto? | ☑ | ☐ |

## 3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución y/o adelantadas | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

| No | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | CAN | UN | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha Inicial programada por | Fecha Final programada por | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| | **SUBPROYECTO No.1 Remodelación Total cocina, remodelación de baños adultos** | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | **4/01/2021** | **22/01/2021** | **19** | **6/01/2021** | **16/01/2021** | **11** | **-2** | **6** |
| **1,9** | Desmonte Aparatos Sanitarios | **UND** | 2,00 | 4/01/2021 | 10/01/2021 | 7 | 4/01/2021 | 10/01/2021 | 7 | 0 | 0 |
| **1,11** | Desmonte Tubería Pvcs Y Pvcp | **ML** | 5,50 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | **6** | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| **1,14** | Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material | **M2** | 38,43 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | **8** | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 8 | 0 | 0 |
| **1,16** | Desmonte O Demolicion De Guarda Escoba En Cualquier Tipo De Material | **ML** | 21,70 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | **8** | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 8 | 0 | 0 |
| **1,17** | Demolición De Enchape De Muro | **M2** | 42,72 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | **8** | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 8 | 0 | 0 |
| **1,18** | Demolición De Enchape De Muro | **ML** | 20,80 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | **8** | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 8 | 0 | 0 |
| **1,21** | Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable | **ML** | 3,30 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | **6** | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |

| FECHA | 29/03/2021 | | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,31 | Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) | ML | 8,70 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,45 | Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente. | UND | 6,00 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,49 | Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado | M3 | 12,00 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 8 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 1,5 | Desmonte Punto Hidraulico | UND | 7,00 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,51 | Desmonte De Punto Sanitario | UND | 2,00 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,54 | Retiro de angeo existente | M2 | 9,06 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,56 | Desmonte E Intalacion De Repisas Y Estanteria | UND | 2,00 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 11/01/2021 | 16/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,67 | Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado | M2 | 11,42 | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | 17/01/2021 | 16/01/2021 | - | 0 | 6 |
| **6** | **PAÑETES** | | | **27/01/2021** | **5/02/2021** | **10** | **4/01/2021** | **5/02/2021** | **33** | **23** | **0** |
| 6,2 | Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal) | ML | 26,00 | 4/01/2021 | 10/01/2021 | 7 | 4/01/2021 | 10/01/2021 | 7 | 0 | 0 |
| 6,5 | Pañete Liso Sobre Muros 1:4 | M2 | 47,88 | 27/01/2021 | 5/02/2021 | 10 | 27/01/2021 | 5/02/2021 | 10 | 0 | 0 |
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | **6/02/2021** | **23/02/2021** | **18** | **6/02/2021** | **23/02/2021** | **18** | **0** | **0** |
| 9,2,3 | Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte) | UND | 14,00 | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,2,5 | Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte) | M2 | 26,20 | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,2,7 | Reja Bancaria (Antic - Esmalte) | M2 | 10,87 | 14/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 14/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,2,16 | Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm | M2 | 10,79 | 14/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 14/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,2,17 | Malla Galvanizada C-10 Recubierta Para Ventana | M2 | 10,79 | 20/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 20/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 9,2,21 | Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposicion Final ) | M2 | 18,79 | 6/02/2021 | 7/02/2021 | 2 | 6/02/2021 | 7/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 9,2,26 | Suministro E Instalacion De Angeo (Incluye Angulo ) | M2 | 9,05 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| **9,3** | **CARPINTERÍA DE MADERA** | | | **14/02/2021** | **17/02/2021** | **4** | **14/02/2021** | **17/02/2021** | **4** | **0** | **0** |
| 9,3,3 | Cerradura De Pomo Tipo Alcoba | UND | 11,00 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| **10** | **PISOS BASES** | | | **27/01/2021** | **1/02/2021** | **6** | **27/01/2021** | **1/02/2021** | **6** | **0** | **0** |
| 10,1 | Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4 | M2 | 38,43 | 27/01/2021 | 1/02/2021 | 6 | 27/01/2021 | 1/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| **11** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO** | | | **19/01/2021** | **26/01/2021** | **8** | **19/01/2021** | **26/01/2021** | **8** | **0** | **0** |
| 11,1 | Acometida En Pvc 1/2" 5M | UND | 1,00 | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 4 | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,2 | Acometida En Pvc 3/4" 5M | UND | 1,00 | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 4 | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,8 | Conexión Tanque Elevado Pvc | UND | 3,00 | 18/02/2021 | 21/02/2021 | 4 | 18/02/2021 | 21/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,9 | Instalación Aparato Sanitario | UND | 1,00 | 18/02/2021 | 21/02/2021 | 4 | 18/02/2021 | 21/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,13 | Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2" | UND | 6,00 | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 4 | 19/01/2021 | 22/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,14 | Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 3/4" | UND | 1,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,16 | Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2" | UND | 2,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,18 | Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 4" | UND | 3,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,19 | Salida Sanitaria Pvc-S/Sifon 3" Incluye Rejilla Metalica | UND | 1,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,23 | Red Suministro Pvc Ø 1" (Inc. Accesorios) | ML | 5,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,24 | Red Suministro Pvc Ø 1/2" (Inc. Accesorios) | ML | 25,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,27 | Red Suministro Pvc Ø 3/4" (Inc. Accesorios) | ML | 5,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,28 | Red Sanitaria Pvc-S 2" (Incluye Accesorios) | ML | 7,50 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,29 | Red Sanitaria Pvc-S 3" (Incluye Accesorios) | ML | 5,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,3 | Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios) | ML | 5,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,33 | Registro Ø 1/2" | UND | 1,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |

| | FECHA | 29/03/2021 | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,34 | Registro Ø 3/4" | UND | 1,00 | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 12,1 | **EQUIPO DE ILUMINACION** | | | 10/02/2021 | 15/02/2021 | 6 | | 10/02/2021 | 15/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 12,34 | Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B | UND | 7,00 | 10/02/2021 | 15/02/2021 | 6 | | 10/02/2021 | 15/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 12,2 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 12,2,2 | Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación | UND | 7,00 | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 12,2,4 | Salida Para Tomacorriente Doble Con Polo A Tierra Monofásico Tipo Gfci Hasta 9 M. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación | UND | 5,00 | 29/01/2021 | 3/02/2021 | 6 | | 29/01/2021 | 3/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 12,2,24 | Retiro De Puntos Eléctricos | UND | 4,00 | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 12,5 | **SISTEMA DE PROTECCION** | | | 23/01/2021 | 28/01/2021 | 6 | | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 1 | -5 | 0 |
| 12,5,3 | Suministro E Instalación De Tablero Eléctrico De 12 Circuitos Trifásico Con Puerta Y Espacio Para Totalizador Y Barraje Independiente De Tierra Y Neutro | UND | 1,00 | 23/01/2021 | 28/01/2021 | 6 | | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 1 | -5 | 0 |
| 12,5,29 | Suministro E Instalaciòn De Interruptor Termomagnètico Bipolar 2X60 A | UND | 3,00 | 23/01/2021 | 28/01/2021 | 6 | | 23/01/2021 | 28/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | **PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS** | | | 2/02/2021 | 17/02/2021 | 16 | | 2/02/2021 | 17/02/2021 | 16 | 0 | 0 |
| 13,6 | Baldosa Cerámica Piso-Pader 20x20 Calidad Primera ( incluye Pegacor Y boquilla) | M2 | 48,28 | 2/02/2021 | 13/02/2021 | 12 | | 2/02/2021 | 13/02/2021 | 12 | 0 | 0 |
| 13,7 | Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 Calidad Primera | ML | 26,00 | 2/02/2021 | 13/02/2021 | 12 | | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 13,16 | Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) | M2 | 38,43 | 2/02/2021 | 5/02/2021 | 4 | | 2/02/2021 | 5/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 13,2 | Guarda Escoba En Ceramica (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) | ML | 14,50 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 13,22 | Media Caña En Cemento Mortero 1:3 | ML | 19,80 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | **PINTURAS** | | | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 6 | | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 15,15 | Pintura Epoxica | M2 | 57,39 | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 6 | | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 15,21 | Pintura Epóxica (Lineal) | ML | 33,89 | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 6 | | 18/02/2021 | 23/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 17,1 | **APARATOS SANITARIOS** | | | 14/02/2021 | 25/02/2021 | 12 | | 18/02/2021 | 25/02/2021 | -91 | -4 | 0 |
| 17,1,8 | Suministro E Instalación Sanitario En Porcelana De Tanque (Dos Piezas) Para Adulto | UND | 1,00 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 8 | | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 17,1,13 | Suministro E Instalación Lavamanos En Porcelana De Colgar (Incluye Accesorios Y Grifería) | UND | 1,00 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 8 | | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 17,1,43 | Suministro E Instalación De Grifería Para Lavaplatos Tipo Monocontrol | UND | 1,00 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 17,2 | **ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS** | | | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | | 14/02/2021 | 17/02/2021 | -95 | 0 | 0 |
| 17,2,1 | Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación | UND | 7,00 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 17,2,3 | Rejilla De Piso Metálica Tipo Sosco De 3" X 2" | UND | 6,00 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | **RED DE GAS** | | | 17/01/2021 | 9/02/2021 | 24 | | 17/01/2021 | 28/02/2021 | -56 | 0 | -19 |
| 18,1 | Acometida De Gas Unifamiliar | UND | 1,00 | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 18,11 | Instalacion Interna Punto Principal 15 M | UND | 1,00 | 23/01/2021 | 28/01/2021 | 6 | | 23/01/2021 | 28/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 18,13 | Manguera De Conexion Flexible | ML | 4,00 | 29/01/2021 | 3/02/2021 | 6 | | 29/01/2021 | 3/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 18,32 | Suministro E Instalación De Registro Bola Gas De 1/2", Incluye Universal Galvanizada De 1/2 Pulg, E Incluye Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación Y Funcionamiento | UND | 1,00 | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | **MOBILIARIO URBANO** | | | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | | 24/02/2021 | 25/02/2021 | -97 | 0 | 0 |

| FECHA | 29/03/2021 | | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,22 | Aseo General | M2 | 39,96 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 1 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 1 | 0 | 0 |
| | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS** | | | **12/02/2021** | **13/02/2021** | **2** | **12/02/2021** | **17/02/2021** | **-93** | **0** | **-4** |
| NP-01 | Meson De Trabajo En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras. Dimensiones Longitud=1.0 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M | ML | 9,50 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 2 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| NP-02 | Lavaplatos Doble Poceta En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras, Dos Pocetas De 50X50X30 Cm. Dimensiones Longitud=1.2 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M. No Incluye Griferia Ni Sifon | UND | 1,00 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| | **SUBPROYECTO No.2 Remodelación total baños 2do piso, baños niños 2do y 3er Piso, Instalación Cielo Raso en PVC, Red Hidraúlica, Pintura General** | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | **4/01/2021** | **13/01/2021** | **10** | **4/01/2021** | **13/01/2021** | **-89** | **0** | **0** |
| 1,9 | Desmonte Aparatos Sanitarios | UND | 15,00 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,11 | Desmonte Tubería Pvcs Y Pvcp | ML | 41,70 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,14 | Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material | M2 | 78,82 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,16 | Desmonte O Demolicion De Guarda Escoba En Cualquier Tipo De Material | ML | 25,60 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,17 | Demolición De Enchape De Muro | M2 | 23,10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,18 | Demolición De Enchape De Muro | ML | 7,50 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,21 | Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable | ML | 3,00 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,29 | Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material | M2 | 84,92 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 4/01/2021 | 13/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 1,3 | Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) | M2 | 16,43 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,31 | Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) | ML | 17,40 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,49 | Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado | M3 | 12,00 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,5 | Desmonte Punto Hidraulico | UND | 29,00 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,51 | Desmonte De Punto Sanitario | UND | 5,00 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 1,67 | Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado | M2 | 3,84 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 18/02/2021 | 46 | 0 | -40 |
| 4 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | **10/01/2021** | **24/01/2021** | **15** | **10/01/2021** | **25/02/2021** | **47** | **0** | **-32** |
| 4,17 | Acero Figurado 60000 Psi | KG | 129,79 | 10/01/2021 | 13/01/2021 | 4 | 10/01/2021 | 13/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 4,19 | Viga Cinta 3500 Psi | M3 | 0,33 | 10/01/2021 | 13/01/2021 | 4 | 10/01/2021 | 13/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 4,31 | Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mampostería Nueva | ML | 20,00 | 14/01/2021 | 16/01/2021 | 3 | 14/01/2021 | 16/01/2021 | 3 | 0 | 0 |
| 4,36 | Mesones En Concreto De 60 Cm | ML | 4,50 | 17/01/2021 | 20/01/2021 | 4 | 17/01/2021 | 25/02/2021 | 40 | 0 | -36 |
| 4,41 | Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm ( Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero) | UND | 20,00 | 21/01/2021 | 24/01/2021 | 4 | 21/01/2021 | 24/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | **MAMPOSTERÍA** | | | **25/01/2021** | **30/01/2021** | **6** | **25/01/2021** | **30/01/2021** | **6** | **0** | **0** |
| 5,08 | Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 38,00 | 25/01/2021 | 30/01/2021 | 6 | 25/01/2021 | 30/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 5,09 | Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal) | ML | 10,00 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 4 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | **PAÑETES** | | | **31/01/2021** | **11/02/2021** | **12** | **31/01/2021** | **11/02/2021** | **12** | **0** | **0** |
| 6,2 | Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal) | ML | 75,00 | 31/01/2021 | 5/02/2021 | 6 | 31/01/2021 | 5/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 6,5 | Pañete Liso Sobre Muros 1:4 | M2 | 108,00 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,1 | **CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE** | | | **20/02/2021** | **23/02/2021** | **4** | **20/02/2021** | **23/02/2021** | **4** | **0** | **0** |
| 9.1.5 | Divisiones Y Puertas Para Baños En Acero Inoxidable C-20, E=300 Cms., Emtanborada Con Lamina C-20, Estructura En Tubo Cuadrado Galavanizado | M2 | 30,60 | 20/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 20/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 9,2 | **CARPINTERIA METALICA** | | | **4/01/2021** | **19/02/2021** | **47** | **4/01/2021** | **19/02/2021** | **47** | **0** | **0** |
| 9.2.3 | Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte) | UND | 9,00 | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9.2.5 | Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte) | M2 | 18,20 | 14/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 14/02/2021 | 19/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,2,21 | Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposicion Final ) | M2 | 18,80 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 4/01/2021 | 9/01/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 9,3 | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | **20/02/2021** | **23/02/2021** | **4** | **20/02/2021** | **23/02/2021** | **4** | **0** | **0** |

| FECHA | 29/03/2021 | | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.3 | Cerradura De Pomo Tipo Alcoba | UND | 9,00 | 20/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 20/02/2021 | 23/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | **PISOS BASES** | | | **14/01/2021** | **17/01/2021** | 4 | **14/01/2021** | **17/01/2021** | 4 | 0 | 0 |
| 10,1 | Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4 | M2 | 78,82 | 14/01/2021 | 17/01/2021 | 4 | 14/01/2021 | 17/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO** | | | **29/01/2021** | **13/02/2021** | 16 | **12/02/2021** | **25/02/2021** | 14 | -14 | -12 |
| 11,8 | Conexión Tanque Elevado Pvc | UND | 3,00 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 2 | 12/02/2021 | 25/02/2021 | 14 | 0 | -12 |
| 11,9 | Instalación Aparato Sanitario | UND | 11,00 | 31/01/2021 | 3/02/2021 | 4 | 31/01/2021 | 3/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 11,13 | Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2" | UND | 35,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,16 | Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2" | UND | 16,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,18 | Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 4" | UND | 11,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,19 | Salida Sanitaria Pvc-S/Sifon 3" Incluye Rejilla Metalica | UND | 5,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,23 | Red Suministro Pvc Ø 1" (Inc. Accesorios) | ML | 5,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,24 | Red Suministro Pvc Ø 1/2" (Inc. Accesorios) | ML | 25,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,27 | Red Suministro Pvc Ø 3/4" (Inc. Accesorios) | ML | 5,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,28 | Red Sanitaria Pvc-S 2" (Incluye Accesorios) | ML | 7,50 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,29 | Red Sanitaria Pvc-S 3" (Incluye Accesorios) | ML | 5,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,3 | Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios) | ML | 5,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 11,33 | Registro Ø 1/2" | UND | 5,00 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 12,1 | **EQUIPO DE ILUMINACION** | | | **12/02/2021** | **19/02/2021** | 8 | **12/02/2021** | **19/02/2021** | 8 | 0 | 0 |
| 12,12 | Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V. | UND | 23,00 | 12/02/2021 | 15/02/2021 | 4 | 12/02/2021 | 15/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 12,34 | Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B | UND | 4,00 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 4 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 12,2 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | **6/02/2021** | **9/02/2021** | 4 | **12/02/2021** | **17/02/2021** | 6 | -6 | -8 |
| 12,2,2 | Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación | UND | 22,00 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | **PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS** | | | **12/02/2021** | **17/02/2021** | 6 | **12/02/2021** | **14/02/2021** | 3 | 0 | 3 |
| 13,6 | Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera (Incluye Pegacor Y Boquilla) | M2 | 88,40 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 12/02/2021 | 14/02/2021 | 3 | 0 | 3 |
| 13,7 | Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera | ML | 38,00 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 12/02/2021 | 14/02/2021 | 3 | 0 | 3 |
| 13,16 | Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) | M2 | 78,82 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 12/02/2021 | 14/02/2021 | 3 | 0 | 3 |
| 13,2 | Guarda Escoba En Ceramica (Incluye Corte, Pegacor Y Boquilla) | ML | 27,80 | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 12/02/2021 | 14/02/2021 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | **CIELOS RASOS - DIVISIONES** | | | **29/01/2021** | **11/02/2021** | 14 | **6/02/2021** | **11/02/2021** | 6 | -8 | 0 |
| 14,5 | Cielo Raso En Pvc (Incluye Estructura Y Accesorios De Fijación) | M2 | 180,94 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 6/02/2021 | 11/02/2021 | 6 | 0 | 0 |
| 14,6 | Tapas En Superboard 10Mm | ML | 11,60 | 29/01/2021 | 5/02/2021 | 8 | 29/01/2021 | 5/02/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | **PINTURAS** | | | **31/01/2021** | **7/02/2021** | 8 | **31/01/2021** | **7/02/2021** | 8 | 0 | 0 |
| 15,1 | Regatas Sobre Muro Para La Instalacion De Ductos De Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Electricas Y De Gas En Diferentes Diametros Hasta 2" | ML | 50,00 | 31/01/2021 | 3/02/2021 | 4 | 31/01/2021 | 3/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 15,3 | Resane De Muros | M2 | 15,00 | 4/02/2021 | 7/02/2021 | 4 | 4/02/2021 | 7/02/2021 | 4 | 0 | 0 |
| 17,1 | **APARATOS SANITARIOS** | | | **18/02/2021** | **19/02/2021** | 2 | **18/02/2021** | **25/02/2021** | 8 | 0 | -6 |
| 17,13 | Instalación Lavamanos Existente O Reutilizado Tipo Cerámico | UND | 4,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,1,12 | Suministro E Instalación Sanitario Infantil Dos Piezas (Incluye Accesorios) | UND | 11,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,1,19 | Suministro E Instalación Lavamanos De Sobreponer En Acero Inoxidable (Incluye Accesorios Y Grifería) | UND | 7,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,1,28 | Suministro E Instalación Orinal Infantil De Colgar En Porcelana (Incluye Accesorios Y Grifería) | UND | 5,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,2 | **ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS** | | | **18/02/2021** | **23/02/2021** | 6 | **18/02/2021** | **19/02/2021** | 2 | 0 | 4 |
| 17,2,1 | Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación | UND | 5,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,2,3 | Rejilla De Piso Metálica Tipo Sosco De 3" X 2" | UND | 5,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,2,14 | Dispensador De Jabón En Acero Inoxidable | UND | 5,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,2,15 | Dispensador De Papel En Acero Inoxidable | UND | 11,00 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 17,2,16 | Dispensador De Toallas De Papel En Acero Inoxidable | UND | 4,00 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | **MOBILIARIO URBANO** | | | **24/02/2021** | **25/02/2021** | 2 | **24/02/2021** | **26/02/2021** | 3 | 0 | -1 |

| | FECHA | 29/03/2021 | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,22 | Aseo General | M2 | 67,96 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| | SUBPROYECTO No.3 Impermeabilización Cubiertas y pintura General | | | | | | | | | | | |
| 7 | CUBIERTAS | | | 4/01/2021 | 22/02/2021 | 50 | | 4/01/2021 | 27/01/2021 | 24 | 0 | 26 |
| 7,7 | Suministro E Instalación De Impermeabilización Con Manto Edil 3 Mm | M2 | 10,89 | 13/02/2021 | 22/02/2021 | 10 | | 13/02/2021 | 14/02/2021 | 2 | 0 | 8 |
| 7,9 | Media Caña En Mortero 1:3 | ML | 13,20 | 4/01/2021 | 17/01/2021 | 14 | | 4/01/2021 | 17/01/2021 | 14 | 0 | 0 |
| 7,31 | Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25 | ML | 15,00 | 18/01/2021 | 27/01/2021 | 10 | | 18/01/2021 | 27/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| 7,43 | Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50 | ML | 15,00 | 28/01/2021 | 4/02/2021 | 8 | | 28/01/2021 | 4/02/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO | | | 5/02/2021 | 12/02/2021 | 8 | | 5/02/2021 | 12/02/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 11,4 | Bajante Aguas Lluvias Pvc 4" | ML | 12,00 | 5/02/2021 | 12/02/2021 | 8 | | 5/02/2021 | 12/02/2021 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | PINTURAS | | | 1/02/2021 | 23/02/2021 | 23 | | 1/02/2021 | 20/02/2021 | 20 | 0 | 3 |
| 15,17 | Pintura Vinilo 100% Acrílica Plástica Mate, Con Altos Sólidos, De Alta Calidad Con Máxima Protección Para Intemperie; Alta Elasticidad, Hidrorrepelente; Resistente A Algas, Hongos, Adhesión De Suciedad, Álcali Y Humos; Sin Contenido De Plomo Ni Cromo; Aplicada En Tres (3) Capas, Tipo Koraza Doble Vida De Pintuco O Equivalente De Igual Calidad O Superior. Incluye Preparación De Superficie. | M2 | 430,83 | 1/02/2021 | 20/02/2021 | 20 | | 1/02/2021 | 20/02/2021 | 20 | 0 | 0 |
| 15,2 | Pintura Sobre Muros Existentes Interiores Incluye Resanes Con O Sin Estuco | M2 | 87,84 | 4/02/2021 | 23/02/2021 | 20 | | 4/02/2021 | 23/02/2021 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | MOBILIARIO URBANO | | | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 0 | 0 |
| 21,22 | Aseo General | M2 | 48,00 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 1 | | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 2 | 0 | -1 |
| | ACTIVIDADES DE ADICIÓN Y PRÓRRIGA | | | | | | | | | | | |
| | SUBPROYECTO No.4 Remodelación baño tercer piso y relleno de Piscina con acabado en Grama Sintética | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | 26/02/2021 | 8/03/2021 | 11 | | 26/02/2021 | 7/03/2021 | 10 | 0 | 1 |
| 1,9 | Desmonte Aparatos Sanitarios | M2 | 2,00 | 26/02/2021 | 8/03/2021 | 11 | | 26/02/2021 | 7/03/2021 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | CIMIENTOS | | | 21/03/2021 | 1/04/2021 | 12 | | 8/03/2021 | 11/03/2021 | 4 | 13 | 21 |
| 2,3 | Fundición de concreto con Malla Electrosoldada | M2 | 19,81 | 21/03/2021 | 1/04/2021 | 12 | | 8/03/2021 | 11/03/2021 | 4 | 13 | 21 |
| 10 | PISOS BASES | | | 9/03/2021 | 20/03/2021 | 12 | | 8/03/2021 | 11/03/2021 | 4 | 1 | 9 |
| 10,11 | Subbase Recebo Zonas Exteriores | M2 | 25,24 | 9/03/2021 | 20/03/2021 | 12 | | 8/03/2021 | 11/03/2021 | 4 | 1 | 9 |
| 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO | | | 9/03/2021 | 20/03/2021 | 12 | | 9/03/2021 | 20/03/2021 | 12 | 0 | 0 |
| 11,9 | Instalaciòn Aparato Sanitario. | M2 | 1,00 | 9/03/2021 | 20/03/2021 | 12 | | 9/03/2021 | 20/03/2021 | 12 | 0 | 0 |
| 12,1 | EQUIPO DE ILUMINACION | | | 18/04/2021 | 25/04/2021 | 8 | | 15/03/2021 | 21/03/2021 | -2 | 34 | 35 |
| 12,1,2 | Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V. | M2 | 2,00 | 18/04/2021 | 25/04/2021 | 8 | | 15/03/2021 | 21/03/2021 | 7 | 34 | 35 |
| 12,1,8 | Suministro, Montaje y Conexión de Lámpara Wall Pack/ Reflector LED 70 X. Incluye Accesorios para su conexión que cumpla la norma RETILAP | M2 | 2,00 | 18/04/2021 | 25/04/2021 | 8 | | 20/03/2021 | 29/03/2021 | 10 | 29 | 27 |
| 12,2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | 2/04/2021 | 7/04/2021 | 6 | | 5/03/2021 | 28/03/2021 | 24 | 28 | 10 |
| 12,2,2 | Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación | UND | 2,00 | 2/04/2021 | 7/04/2021 | 6 | | 5/03/2021 | 28/03/2021 | 24 | 28 | 10 |
| 12,2,25 | Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye mano de obra y Materiales | UND | 6,00 | 2/04/2021 | 7/04/2021 | 6 | | 5/03/2021 | 28/03/2021 | 24 | 28 | 10 |
| 14 | CIELOS RASOS - DIVISIONES | | | 8/04/2021 | 17/04/2021 | 10 | | 20/03/2021 | 28/03/2021 | -90 | 19 | 20 |
| 14,5 | Cielo Raso En Pvc (Incluye Estructura Y Accesorios De Fijación) | UND | 3,30 | 8/04/2021 | 17/04/2021 | 10 | | 20/03/2021 | 28/03/2021 | 9 | 19 | 20 |
| 17,1 | APARATOS SANITARIOS | | | 21/03/2021 | 1/04/2021 | 12 | | 15/03/2021 | 21/03/2021 | 7 | 6 | 11 |
| 17.1.8 | Suministro e Instalación Sanitario en Porcelana de Tanque ( Dos Piezas) para Adulto | UND | 1,00 | 21/03/2021 | 26/03/2021 | 6 | | 15/03/2021 | 21/03/2021 | 7 | 6 | 5 |
| 17.1.13 | Suministro e Instalación Sanitario Lavamanos en Porcelana de Colgar ( Incluye Aceesorios y Grifería) | UND | 1,00 | 27/03/2021 | 1/04/2021 | 6 | | 15/03/2021 | 21/03/2021 | 7 | 12 | 11 |
| 21 | MOBILIARIO URBANO | | | 2/04/2021 | 13/04/2021 | 12 | | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 21,35 | Grama sintética | UND | 19,81 | 2/04/2021 | 13/04/2021 | 12 | | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | ENTREGA FINAL DE SUBPROYECTOS EJECUTADOS | | | 25/04/2021 | 26/04/2021 | 2 | | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Plazo del proyecto en días | | | | | | | | | | 171 | | |

**OBSERVACIONES:**
**DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE PRESENTO AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO EN LA SEDE NIÑO JESÚS.**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO | DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE | | % sobre el plazo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | $ 221.750.938,12 | 96,54% | -7,30% | Al inicio de la actividad | 9 | 5,26% |

| | |
|---|---|
| Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas | **LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**<br>**FASE No. 2 OBRA**<br>**No. 4_SEDE NIÑO JESÚS** |

| FECHA | 29/03/2021 | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | $ | 222.253.248,81 | 89,24% | | | Al final de la actividad | | 19 | 11,11% |

**4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS**

**3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

**01. EL CONTRATISTA HA PRESENTADO UN GRAN AVANCE FRENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.**

**3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

La calidad de las actividades ejecutadas en la etapa No. 2 fue buena,atendiendo a observaciones de la interventoría y subsanando de acuerdo a las mismas, a la fecha no se presentan incorformidades con las obras ejecutadas.

**5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| **01**. N/A | | |
| | | |

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

| FECHA | 29/03/2021 | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A

## 7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 22 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE MARZO DE 2021

01. N/A

## 8. REGISTRO FOTOGRÀFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 22 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE MARZO DE 2021

1. HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS _ QUIBDÓ




9. INSTALACION DE GRAMA SINTETICA.



10. GRAMA SINTETICA INSTALADA .



11. GRAMA SINTETICA INSTALADA.

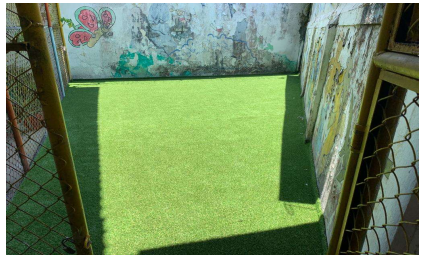

12. GRAMA SINTETICA INSTALADA.

## 9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01. N/A

## 10. CUADRO DE SEGUMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción de Item | PROGRAMADO | | | | REAL EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PESO | % PROGRAMADO | % | VALOR PROGRAMADO | AVANCE | % | DINERO EJECUTADO |
| | **SUBPROYECTO No.1 Remodelación Total cocina, remodelación de baños adultos** | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 1,13% | 100,00% | 1,13% | $ 2.066.205,00 | 100% | 1,13% | $ 2.066.205,00 |
| 6,00 | PAÑETES | 1,12% | 100,00% | 1,12% | $ 2.046.082,00 | 100% | 1,12% | $ 2.046.082,00 |
| 9,20 | CARPINTERIA METALICA | 6,55% | 100,00% | 6,55% | $ 11.949.738,00 | 100% | 6,55% | $ 11.949.738,00 |
| 9,30 | CARPINTERÍA DE MADERA | 0,33% | 100,00% | 0,33% | $ 610.599,00 | 100% | 0,33% | $ 610.599,00 |
| 10,00 | PISOS BASES | 0,91% | 100,00% | 0,91% | $ 1.661.663,00 | 100% | 0,91% | $ 1.661.663,00 |
| 11,00 | INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA IN( | 1,64% | 100,00% | 1,64% | $ 2.983.865,00 | 100% | 1,64% | $ 2.983.865,00 |
| 12,10 | EQUIPO DE ILUMINACION | 0,55% | 100,00% | 0,55% | $ 1.002.008,00 | 100% | 0,55% | $ 1.002.008,00 |
| 12,20 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0,99% | 100,00% | 0,99% | $ 1.800.985,00 | 100% | 0,99% | $ 1.800.985,00 |
| 12,50 | SISTEMA DE PROTECCION | 0,53% | 100,00% | 0,53% | $ 964.922,00 | 100% | 0,53% | $ 964.922,00 |
| 13,00 | PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS | 4,33% | 100,00% | 4,33% | $ 7.897.179,00 | 100% | 4,33% | $ 7.897.179,00 |
| 15,00 | PINTURAS | 0,64% | 100,00% | 0,64% | $ 1.159.663,00 | 100% | 0,64% | $ 1.159.663,00 |
| 17,10 | APARATOS SANITARIOS | 0,55% | 100,00% | 0,55% | $ 1.004.292,00 | 100% | 0,55% | $ 1.004.292,00 |
| 17,20 | ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS | 0,14% | 100,00% | 0,14% | $ 246.855,00 | 100% | 0,14% | $ 246.855,00 |
| 18,00 | RED DE GAS | 0,94% | 100,00% | 0,94% | $ 1.708.714,00 | 100% | 0,94% | $ 1.708.714,00 |
| 21,22 | ASEO GENERAL | 0,11% | 100,00% | 0,11% | $ 193.406,00 | 100% | 0,11% | $ 193.406,00 |
| - | ACTIVIDADES NO PREVISTAS | 6,82% | 100,00% | 6,82% | $ 12.440.398,00 | 100% | 6,82% | $ 12.440.398,00 |
| | **SUBPROYECTO No.2 Remodelación total baños 2do piso, baños niños 2do y 3er Piso, Instalación Cielo Raso en PVC, Red Hidraúlica, Pintura General** | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 2,25% | 100,00% | 2,25% | $ 4.106.527,00 | 100% | 2,25% | $ 4.106.527,00 |
| 4,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 1,35% | 100,00% | 1,35% | $ 2.459.368,00 | 100% | 1,35% | $ 2.459.368,00 |
| 5,00 | MAMPOSTERIA | 1,02% | 100,00% | 1,02% | $ 1.851.548,00 | 100% | 1,02% | $ 1.851.548,00 |
| 6,00 | PAÑETES | 2,76% | 100,00% | 2,76% | $ 5.023.845,00 | 100% | 2,76% | $ 5.023.845,00 |
| 9,10 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOX | 10,97% | 100,00% | 10,97% | $ 19.991.255,00 | 100% | 10,97% | $ 19.991.255,00 |
| 9,20 | CARPINTERIA METALICA | 3,44% | 100,00% | 3,44% | $ 6.280.119,00 | 100% | 3,44% | $ 6.280.119,00 |
| 9,00 | CARPINTERIA DE MADERA | 0,27% | 100,00% | 0,27% | $ 499.581,00 | 100% | 0,27% | $ 499.581,00 |
| 10,00 | PISOS BASES | 1,87% | 100,00% | 1,87% | $ 3.407.940,00 | 100% | 1,87% | $ 3.407.940,00 |
| 11,00 | INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA IN( | 3,86% | 100,00% | 3,86% | $ 7.036.896,00 | 100% | 3,86% | $ 7.036.896,00 |
| 12,10 | EQUIPO DE ILUMINACION | 2,96% | 100,00% | 2,96% | $ 5.398.827,00 | 100% | 2,96% | $ 5.398.827,00 |
| 12,20 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1,79% | 100,00% | 1,79% | $ 3.266.780,00 | 100% | 1,79% | $ 3.266.780,00 |

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 4_SEDE NIÑO JESÚS

| FECHA | 29/03/2021 | | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 11 | DEL | 22/03/2021 | AL | 28/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,00 | PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS | 7,63% | 100,00% | 7,63% | $ 13.911.053,00 | 100% | 7,63% | $ | 13.911.053,00 | | |
| 14,00 | CIELO RASOS - DIVISIONES | 10,58% | 100,00% | 10,58% | $ 19.279.390,00 | 100% | 10,58% | $ | 19.279.390,00 | | |
| 15,00 | PINTURAS | 0,37% | 100,00% | 0,37% | $ 671.135,00 | 100% | 0,37% | $ | 671.135,00 | | |
| 17,10 | APARATOS SANITARIOS | 4,93% | 100,00% | 4,93% | $ 8.994.267,00 | 100% | 4,93% | $ | 8.994.267,00 | | |
| 17,20 | ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS | 2,00% | 100,00% | 2,00% | $ 3.652.469,00 | 100% | 2,00% | $ | 3.652.469,00 | | |
| 21,22 | ASEO GENERAL | 0,18% | 100,00% | 0,18% | $ 328.926,00 | 100% | 0,18% | $ | 328.926,00 | | |
| | SUBPROYECTO No.3 Impermeabilización Cubiertas y pintura General | | | | | | | | | | |
| 7,00 | CUBIERTAS | 1,24% | 100,00% | 1,24% | $ 2.253.754,00 | 100% | 1,24% | $ | 2.253.754,00 | | |
| 11,00 | INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA IN( | 0,25% | 100,00% | 0,25% | $ 452.832,00 | 100% | 0,25% | $ | 452.832,00 | | |
| 15,00 | PINTURAS | 7,28% | 100,00% | 7,28% | $ 13.279.765,00 | 100% | 7,28% | $ | 13.279.765,00 | | |
| 21,22 | ASEO GENERAL | 0,13% | 100,00% | 0,13% | $ 232.320,00 | 100% | 0,13% | $ | 232.320,00 | | |
| | ACTIVIDADES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | | | | | | | | | | |
| | SUBPROYECTO No.4 Remodelación baño tercer piso y relleno de Piscina con acabado en Grama Sintética | | | | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 0,02% | 100,00% | 0,02% | $ 45.384,00 | 100% | 0,02% | $ | 45.384,00 | | |
| 2,00 | CIMIENTOS | 1,11% | 100,00% | 1,11% | $ 2.027.276,00 | 100% | 1,11% | $ | 2.027.276,00 | | |
| 10,00 | PISOS BASES | 1,51% | 52,50% | 0,79% | $ 1.443.444,45 | 67% | 1,01% | $ | 1.842.110,06 | | |
| 11,00 | INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA IN( | 0,03% | | 0,00% | $ - | | 0,00% | $ | - | | |
| 12,10 | EQUIPO DE ILUMINACION | 0,45% | 44,00% | 0,20% | $ 364.326,16 | 44% | 0,20% | $ | 364.326,16 | | |
| 12,20 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0,39% | | 0,00% | $ - | | 0,00% | $ | - | | |
| 14,00 | CIELO RASOS - DIVISIONES | 0,19% | | 0,00% | $ - | | 0,00% | $ | - | | |
| 17,10 | APARATOS SANITARIOS | 0,43% | | 0,00% | $ - | | 0,00% | $ | - | | |
| 21,22 | ASEO GENERAL | 1,45% | | 0,00% | $ - | | 0,00% | $ | - | | |
| | | TOTAL PESO | % PROGRAMADO | | VALOR PROGRAMADO | % EJECUTADO | | | VALOR EJECUTADO | | |
| - | TOTALES | 100,00% | 96,54% | | $ 175.995.601,61 | 96,76% | | $ | 176.394.267,22 | | |
| | | | ADMINISTRACIÓN | 16,70% | $ 29.391.265,47 | ADMINISTRACIÓ | 16,70% | $ | 29.457.842,63 | | |
| | | | IMPREVISTOS | 4,30% | $ 7.567.810,87 | IMPREVISTOS | 4,30% | $ | 7.584.953,49 | | |
| | | | UTILIDAD | 4,20% | $ 7.391.815,27 | UTILIDAD | 4,20% | $ | 7.408.559,22 | | |
| | | | IVA / UTILIDAD | 19,00% | $ 1.404.444,90 | IVA / UTILIDAD | 19,00% | $ | 1.407.626,25 | | |
| | | | TOTAL PROGRAMADO | | $ 221.750.938,12 | TOTAL EJECUTADO | | $ | 222.253.248,81 | | |
| PORCENTAJE DE ATRASO A LA FECHA 28 DE MARZO DE 2021 | | | -0,22% | | DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO | | | -$ | 502.310,70 | | |


| SUBPROYECTO 1 | 27,28% | SUBPROYECTO 2 | 58,23% | SUBPROYECTO 3 | 8,90% | SUBPROYECTO 3 | 5,58% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas | **LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**<br>**FASE No. 2 OBRA**<br>**No. 4_SEDE NIÑO JESÚS** | | | | | | |
| FECHA | 29/03/2021 | **PERÍODO DE OBRA No.** | 11 | DEL | **22/03/2021** | AL | **28/03/2021** |

**10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

***NOTA ACLARATORIA:EL CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA SE AJUSTÓ DE ACUERDO A LOS SUBPROYECTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD PARA LA ETAPA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO EN LA SEDE NIÑO JESÚS EN QUIBDÓ, ASÍ MISMO SE AJUSTÓ EL CUADRO DE SEGUIMIENTO GENERAL CON EL FLUJO DE INVERSIÓN APROBADO PARA EJECUTAR EL SUBPROYECTO No. 4, DE ESTA MANERA SE CONSIDERÓ EL VALOR DE LA ADICIÓ NDE ESTA SEDE POR UNA CUANTÍA DE $12.827.960.**

**LOS INFORMES MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE DAN A PARTIR DEL INFORME SEMANAL No.8.**

**01.** Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

**02.**El día 26 de febrero de 2021 se dio inicio a las actividades de la fase de adición y prórroga para la sede hogar infantil Niño Jesús en Quibdó.

**03.** De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto . **las actividades programadas corresponden al 96,54% hasta el dia 28 de marzo de 2021, y el avance real ejecutado es del 96,76%**


**04.** Dado lo anterior **la ejecuciòn de las actividades de obra para la sede Niño Jesùs presenta un avance del 0,22%.**

**05.**Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de $221.750938,12** en contraste con **las actividades ejecutadas que representan un valor de $222,253.248,81** es decir, una diferencia de **$502.310,70** por encima de las actividades programadas.


**06.** El avance evidenciado representa la culminaciòn del proyecto dentro de los plazos establecidos con fecha final de entrega el día 25 de abril de 2021

**07.** Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.

**10. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

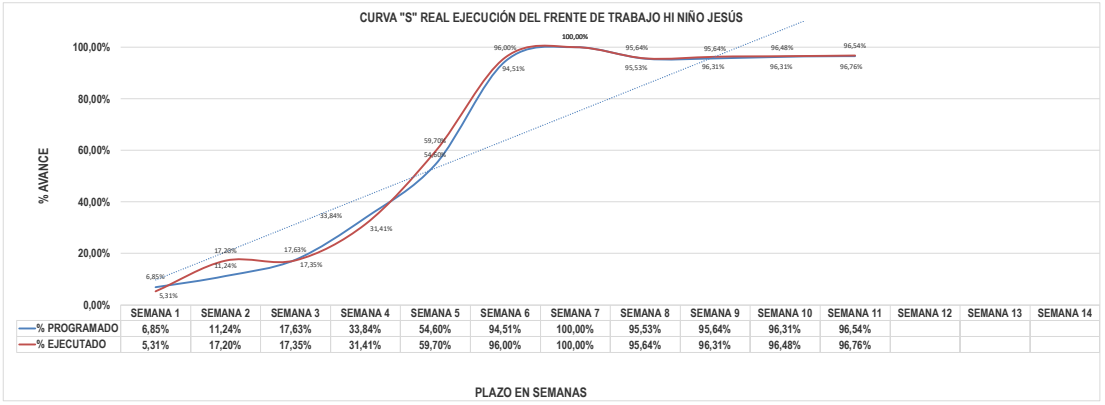


| | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % PROGRAMADO | 6,85% | 11,24% | 17,63% | 33,84% | 54,60% | 94,51% | 100,00% | 95,53% | 95,64% | 96,31% | 96,54% | | | |
| % EJECUTADO | 5,31% | 17,20% | 17,35% | 31,41% | 59,70% | 96,00% | 100,00% | 95,64% | 96,31% | 96,48% | 96,76% | | | |

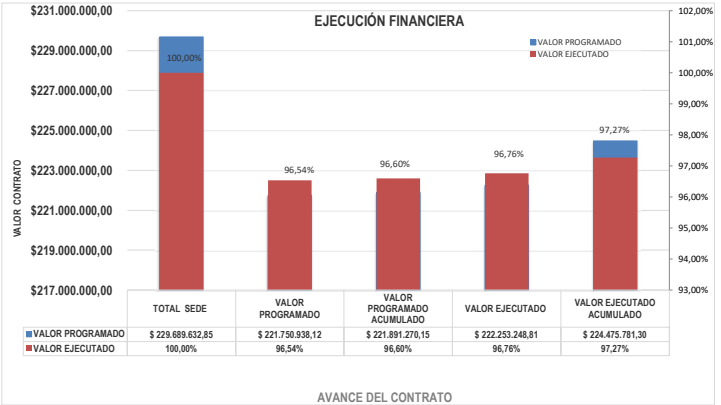


| | TOTAL SEDE | VALOR PROGRAMADO | VALOR PROGRAMADO ACUMULADO | VALOR EJECUTADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PROGRAMADO | $ 229.689.632,85 | $ 221.750.938,12 | $ 221.891.270,15 | $ 222.253.248,81 | $ 224.475.781,30 |
| VALOR EJECUTADO | 100,00% | 96,54% | 96,60% | 96,76% | 97,27% |

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE :PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
