LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
5. CDI OTUN 2

FECHA	17/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	2	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5. RISARALDA- PEREIRA, CDI OTUN 2 CR 1 # 27 - 70

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020			CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020		
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS			PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS		
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	TRES MESES Y DIECINUEVE DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020			FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020		
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-			*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-			*FECHA DE REINICIACIÓN:	-		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	sábado, 6 de marzo de 2021			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 25 de febrero de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	121			PLAZO ACTUALIZADO:	112		
PLAZO TRANSCURRIDO:	80	EQUIVALE AL	66%	PLAZO TRANSCURRIDO:	80	EQUIVALE AL	71%
VALOR INICIAL :	$		249.043.319,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$		733.959.553,00
VALOR INICIAL :	$		249.043.319,00	VALOR FRENTE DE TRABAJO :	$		58.530.413,01
VALOR ETAPA No.1: DIAGNÓSTICOS:	$		70.915.135,93	VALOR ETAPA No.1 DIAGNÓSTICOS	$		94.195.674,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		249.043.319,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		58.530.413,01
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		249.043.319,00	VALOR POR PAGAR:	$		58.530.413,01
SUPERVISOR:	LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS			INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PEDRO JOSÉ LEÓN DIAZ			REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA		

2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

PERSONAL DE OBRA	DEDICACIÓN	CANT.	PERSONAL DE INTERVENTORIA	DEDI.	CANT.
REPRESENTANTE LEGAL	100%	1	REPRESENTANTE LEGAL	100%	1
DIRECTOR DE OBRA	50%	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	1
RESIDENTE DE OBRA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1	100%	1
RESIDENTE SISOMA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2	100%	1
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	5%	1	RESIDENTE SISOMA	100%	1
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	5%	1	ASESOR HIDROSANITARIO	5%	1
RESIDENTE DE COSTOS Y PRE.	5%	1	ASESOR ELÉCTRICO	5%	1
MAESTRO DE OBRA	100%	1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES	5%	1
AYUDANTE DE OBRA	100%	1	APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	100%	1

2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO DEL CLIMA	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco
	☑ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada
	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa
DURACIÓN (h)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AFECTACIÓN A LA OBRA POR LLUVIAS

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	SI	NO
¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados?	☑	☐
¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación?	☑	☐
¿El personal destinado fue suficiente?	☑	☐
¿El personal era idóneo para la actividad?	☑	☐
¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto?	☑	☐

3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	CAN	UN	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
				Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
SUBPROYECTO No.1 Acondicionamiento De Area Para Enfermeria: Demolicion De Bateria De Lavamanos, Mamposteria, Pañetes, Estuco Y Pintura Epoxica, Piso En Ceramica Con Guardaescobas, Mediacaña En Esquinas, Puerta Y Ventana En Aluminio, Instalacion De Lavamanos, Instalacion De Iluminacion Led Y Tomacorrientes.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	**M2**	4,50	12/01/2021	14/01/2021	3	12/01/2021	14/01/2021	3	0	0
1,18	Demolición De Enchape De Muro	**ML**	1,20	12/01/2021	14/01/2021	3	12/01/2021	14/01/2021	3	0	0
1,21	Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable	**ML**	2,50	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
1,3	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	**M2**	6,10	12/01/2021	16/01/2021	5	17/01/2021	22/02/2021	37	-5	-37
1,31	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	**ML**	1,00	17/01/2021	19/01/2021	3	17/01/2021	22/01/2021	6	0	-3
1,46	Desmonte De Punto Electrico	**UND**	2,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	**M3**	12,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
1,5	Desmonte Punto Hidraulico	**UND**	6,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**20/01/2021**	**29/01/2021**	**10**	**22/01/2021**		**ejecución**	**-2**	**ejecución**
4,17	Acero Figurado 60000 Psi	**KG**	79,49	22/01/2021	25/01/2021	4	22/01/2021		ejecución	0	ejecución
4,19	Viga Cinta 3500 Psi	**M3**	0,14	26/01/2021	29/01/2021	4	22/01/2021		ejecución	4	ejecución
4,31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva	**ML**	7,80	22/01/2021	25/01/2021	4	23/01/2021		ejecución	-1	ejecución
4,41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	**UND**	12,00	20/01/2021	21/01/2021	2	23/01/2021		ejecución	-3	ejecución
5	**MAMPOSTERÍA**			**26/01/2021**	**31/01/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**

FECHA 17/01/2021 PERÍODO DE OBRA No. 2 DEL 18/01/2021 AL 24/01/2021

5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	7,80	26/01/2021	31/01/2021	6	22/01/2021		ejecución		4	ejecución
5,09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	3,20	26/01/2021	31/01/2021	6	23/01/2021		ejecución		3	ejecución
6	**PAÑETES**			**29/01/2021**	**3/02/2021**	**6**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
6,2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	7,20	29/01/2021	3/02/2021	6			no iniciado		no iniciado	no iniciado
6,5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	16,80	29/01/2021	3/02/2021				no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**M2**		**18/02/2021**	**21/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
9,1,4	Puerta En Aluminio Color Champaña, Con Perfileria En Aluminio Tipo Alm Serie 4525-3 Para Puertas Batientes, Sistema 500-3 Biselado Para Cuerpos Fijos Y Cristal Incoloro Templado De Seguridad De 5Mm, Incluye Manijas.	M2	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**16/01/2021**	**21/02/2021**	**37**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
9,2,3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	M2	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	2,63	16/01/2021	19/01/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**20/02/2021**	**21/02/2021**	**2**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	1,00	20/02/2021	21/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
10	**PISOS BASES**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	4,50	6/02/2021	9/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**4/02/2021**	**5/02/2021**	**2**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
11,13	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
11,16	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
11,33	Registro Ø 1/2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**10/02/2021**	**13/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	1,00	10/02/2021	13/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	1,00	6/02/2021	7/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
12.2.3	Salida Para Toma Corriente 110 V. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación	UND	2,00	8/02/2021	9/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**10/02/2021**	**17/02/2021**	**8**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	4,50	10/02/2021	13/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
13,22	Media Caña En Cemento Mortero 1:3	ML	27,55	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
15	**PINTURAS**			**14/02/2021**	**21/02/2021**	**8**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
15,2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	UND	31,10	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
15,15	Pintura Epoxica	UND	31,10	18/02/2021	21/02/2021	4			no iniciado		no iniciado	no iniciado
17,1	**APARATOS SANITARIOS**			**22/02/2021**	**23/02/2021**	**2**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
17,1,3	Suministro E Instalación Lavamanos En Porcelana De Colgar (Incluye Accesorios Y Grifería)	UND	1,00	22/02/2021	23/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
17,2	**ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			**6/02/2021**	**7/02/2021**	**2**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
17,2,1	Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación	UND	1,00	6/02/2021	7/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**		**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	M2	4,50	24/02/2021	25/02/2021	2			no iniciado		no iniciado	no iniciado

SUBPROYECTO No.2 Acondicionamiento De Nueva Aula: Nivelacion De Pisos En Concreto, Pañete Impermeabilizado Y Estucado De Muros, Enchape De Pisos En Ceramica Con Guardaescobas, Puertas Y Ventanas En Aluminio, Instalacion De Iluminacion Y Tomacorrientes, Pintura General,Construccion De Bodega En Area De Lavanderia: Mamposteria, Pañetes, Puerta En Aluminio, Instalacion De Iluminación Y Tomacorrientes, Pintura General.Instalacion De Flanches Contra Predio Vecino.

1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**23/01/2021**	**12**	**12/01/2021**		**ejecución**	**0**	**ejecución**	
1.19	Demolición Pañete Muro	**M2**	15,30	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0	
1.31	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	**ML**	2,30	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	18/01/2021	7	0	-3	
1.40	Demolición Placa Maciza 0.15 - 0.25 M	**M2**	7,48	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021		ejecución	0	ejecución	
1.45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	**UND**	2,00	20/01/2021	23/01/2021	4	17/01/2021		ejecución	3	ejecución	
1.67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	**M2**	3,54	20/01/2021	23/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
2	**CIMIENTOS**			**28/01/2021**	**30/01/2021**	**3**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
2,3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	**M2**	21,04	28/01/2021	30/01/2021	3			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**31/01/2021**	**5/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
4.17	Acero Figurado 60000 Psi	**M2**	60,32	31/01/2021	3/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
4.19	Viga Cinta 3500 Psi	**M2**	0,16	4/02/2021	5/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
4.31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mampostería Nueva	**UND**	7,80	31/01/2021	3/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
4.41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	**M2**	28,00	31/01/2021	1/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
5	**MAMPOSTERÍA**			**25/01/2021**	**30/01/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	**M2**	11,72	2/02/2021	5/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
5,09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	**ML**	4,60	2/02/2021	5/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
6	**PAÑETES**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
6.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	**ML**	9,60	6/02/2021	9/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
6.3	Pañete Impermeabilizado Muros 1:4, E=1.5 Cm	**M2**	3,00	6/02/2021	9/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	

	FECHA	17/01/2021			PERÍODO DE OBRA No.	2	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021	
6.5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	47,88	6/02/2021	9/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6.7	Pañete Impermeabilizado Muros 1:3, E=1.5 Cm (Lineal)	ML	27,00	6/02/2021	9/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	**CUBIERTAS**			**16/02/2021**	**17/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
7,31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	35,00	16/02/2021	17/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**24/01/2021**	**17/02/2021**	**25**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9.2.3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	UND	2,00	10/02/2021	13/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.7	Reja Bancaria (Antic - Esmalte)	M2	2,64	14/02/2021	17/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	M2	2,30	12/02/2021	15/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9.2.21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	5,25	24/01/2021	27/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	**PISOS BASES**			**24/01/2021**	**27/01/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	21,04	24/01/2021	27/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**28/01/2021**	**29/01/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
11,17	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 3"	UND	1,00	28/01/2021	29/01/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**20/02/2021**	**21/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	6,00	20/02/2021	21/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**16/02/2021**	**19/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	6,00	16/02/2021	17/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.2.3	Salida Para Toma Corriente 110 V. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación	UND	6,00	18/02/2021	19/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**30/01/2021**	**10/02/2021**	**12**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	21,04	30/01/2021	4/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	20,80	5/02/2021	10/02/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	**PINTURAS**			**18/02/2021**	**23/02/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
15.2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	ML	58,10	18/02/2021	21/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15.13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	M2	103,28	20/02/2021	23/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	M2	27,40	24/02/2021	25/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**21/01/2021**	**10**	**12/01/2021**	**22/01/2021**	**11**	**0**	**-1**
1.1	Descapote Y Limpieza	M2	64,00	12/01/2021	21/01/2021	10	12/01/2021	22/01/2021	11	0	-1
2	**CIMIENTOS**			**27/01/2021**	**3/02/2021**	**8**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
2.2	Relleno Con Material Seleccionado	M3	12,72	27/01/2021	3/02/2021	8	22/01/2021		ejecución	5	ejecución
2.3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	M2	63,60	8/02/2021	15/02/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			**17/01/2021**	**26/01/2021**	**10**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
16,4	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	M3	19,08	17/01/2021	26/01/2021	10			no iniciado	no iniciado	no iniciado
20	**ANDENES Y SARDINELES**			**4/02/2021**	**23/02/2021**	**20**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
20,7	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	ML	16,00	4/02/2021	11/02/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
20,29	Suministro E Instalación Piso En Caucho Granulado Para Área Deportiva Exterior.	M2	63,60	16/02/2021	23/02/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.4Cambio De Puerta En Lamina Para Baños Niños A La Salida Al Patio Trasero,Construccion De Mediacañas E Impermeabilizacion De Cubierta Del Pasillo Central. Instalacion De Canales En Lamina Y Bajantes,Revision De Puntos Electricos E Instalacion De Tomacorrientes Gfci En Cocina. Demolicion De Mochetas De Mamposteria En Aulas.										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**0**	**0**
1.14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	5,06	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
1.30	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	20,80	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021	17/01/2021	2	0	2
6	**PAÑETES**			**1/02/2021**	**4/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
2.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	M3	12,72	1/02/2021	4/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	**CUBIERTAS**			**12/01/2021**	**4/02/2021**	**24**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
7.7	Suministro E Instalación De Impermeabilización Con Manto Edil 3 Mm	M2	70,76	12/01/2021	17/01/2021	6	12/01/2021	22/01/2021	11	0	-5
7.9	Media Caña En Mortero 1:3	ML	56.14	18/01/2021	23/01/2021	6	18/01/2021	23/01/2021	6	0	0
7.31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	5,00	24/01/2021	29/01/2021	6	23/01/2021		ejecución	1	ejecución
7.43	Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50	ML	3,00	30/01/2021	4/02/2021	6	23/01/2021		ejecución	7	ejecución
9.2	**CARPINTERÍA METALICA**			**20/01/2021**	**8/02/2021**	**20**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,2,5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	M2	2,47	5/02/2021	8/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	2,44	20/01/2021	23/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**5/02/2021**	**8/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	0,01	5/02/2021	8/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
11,4	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	ML	0,18	5/02/2021	8/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
5. CDI OTUN 2

FECHA	17/01/2021			PERÍODO DE OBRA No.	2	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021	
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,2,5	Suministro De Toma Corriente Gfci.	**UND**	3,00	9/02/2021	10/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,2,25	Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye Mano De Obra Y Materiales	**UND**	10,00	7/02/2021	8/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13.0	**PISOS, ECHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**24/01/2021**	**31/01/2021**	**8**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	**M2**	5.06	24/01/2021	27/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	**ML**	2,40	28/01/2021	31/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	**PINTURAS**			**11/02/2021**	**23/02/2021**	**13**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
15,3	Resane De Muros	**ML**	12,20	11/02/2021	15/02/2021	5			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15,9	Esmalte Sobre Rejas	**M2**	16,80	16/02/2021	19/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15,13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	**M2**	12,00	20/02/2021	23/02/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	ENTREGA FINAL DE SUBPROYECTOS EJECUTADOS			**25/02/2021**	**25/02/2021**	**1**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
Plazo del proyecto en días									**112**		

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN APROBADA.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA EN TIEMPO (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 10.594.512,84	18,10%	-13,28%	Al inicio de la actividad	4	3,57%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 12.013.713,73	4,82%		Al final de la actividad	2	1,79%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

01. EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO EN LA SEMANA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

02. LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO AFECTAN LAS OBRAS PROGRAMADAS YA QUE SON BAJO CUBIERTA.

03. EL CONTRATISTA DE OBRA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, NO OBSTANTE SE SOLICITARÀ AUMENTAR EL PERSONAL CUANDO SE EVIDENCIE ATRASO DE ACTIVIDADES QUE PUEDAN GENERAR DEMORAS EN LA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de los productos de la Etapa No. 1 Diagnósticos fue buena, y se atendieron a satisfacción las observaciones y solicitudes realizadas por la interventoría.
La calidad de las actividades de la Etapa No. 2 Obra será exigida por la interventoría con el fin de entregar los espacios en óptimas condiciones.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
01. Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	CONTRATISTA DE OBRA	martes, 19 de enero de 2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A

7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2021

01. SE AVANZO CON LOS ITEMS DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA, Y EL ITEM DE CUBIERTA.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2021

1. HOGAR INFANTIL CDI OTUN 2 _ PEREIRA




1. SUMINISTRO DE MATERIALES





2. LISPIEZA DE CUBIERTA EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE MANTO EDIL PARA IMPERMEABILIZACIÓN



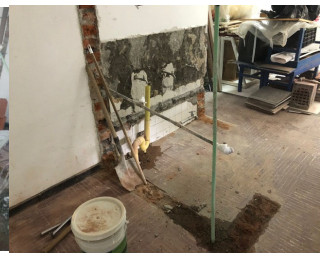

3. CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA AMPLIACIÓN DE ENFERMERIA E INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA



4. AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS AREA DE ENFERMERIA

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
5. CDI OTUN 2

FECHA	17/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	2	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021



5. DEMOLICIÓN DE MOCHETAS DE AULAS PAR AAMPLIAR ESPACIO UTIL



6. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PARA DISPOSICIÓN FINAL



7. CUBIERTA IMPERMEABILIZADA



8. DINDEL Y MARCO PARA PUERTA, Y CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE AMARRE

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SUBPROYECTO 1

01. Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)

02. Pañete Liso Sobre Muros 1:4

SUBPROYECTO 2

03.Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada

04. Acero Figurado 60000 Psi

05.Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)

06.Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva

SUBPROYECTO 3

04.Relleno Con Material Seleccionado

05. Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada

SUBPROYECTO 4

06. NA

10. CUADRO DE SEGUMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción de Item	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO		
		PESO	% PROGRAMADO	%	VALOR PROGRAMADO	AVANCE	%	DINERO EJECUTADO
	SUBPROYECTO No.1 Acondicionamiento De Area Para Enfermeria: Demolicion De Bateria De Lavamanos, Mamposteria, Pañetes, Estuco Y Pintura Epoxica, Piso En Ceramica Con Guardaescobas, Mediacaña En Esquinas, Puerta Y Ventana En Aluminio, Instalacion De Lavamanos, Instalacion De Iluminacion Led Y Tomacorrientes.							
1,00	PRELIMINARES	1,58%	100,00%	1,58%	$ 742.234,00	100,00%	1,58%	$ 742.234,00
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,98%	40,00%	0,79%	$ 372.051,20	42,00%	0,83%	$ 390.653,76
5,00	MAMPOSTERÍA	0,80%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
6,00	PAÑETES	1,23%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
9,10	CARPENTERÍA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	1,06%	52,00%	0,55%	$ 257.761,92	51,00%	0,54%	$ 252.804,96
9,20	CARPINTERÍA METALICA	0,42%	50,00%	0,21%	$ 98.545,00	52,00%	0,22%	$ 102.486,80
9,30	CARPINTERIA EN MADERA	0,10%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
10,00	PISOS BASES	0,39%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,33%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,28%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,56%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
13,00	PISOS , ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	1,98%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
15,00	PINTURAS	1,40%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
17,10	APARATOS SANITARIOS	0,82%		0,00%	$ -		0,00%	$ -
17,20	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS	0,04%		0,00%	$ -		0,00%	$ -

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
5. CDI OTUN 2

FECHA	17/01/2021				PERÍODO DE OBRA No.	2	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021
21,00	ASEO GENERAL	0,04%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
	SUBPROYECTO No.2 Acondicionamiento De Nueva Aula, Adecaución En Area De Lavanderia: Mamposteria, Pañetes, Puerta En Aluminio, Instalacion De Iluminación Y Tomacorrientes, Pintura General.									
1,00	PRELIMINARES	1,31%	100,00%	1,31%	$ 614.838,71	100,00%	1,31%	$ 614.838,71		
2,00	CIMIENTOS	4,18%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2,41%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
5,00	MAMPOSTERÍA	1,19%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
6,00	PAÑETES	3,97%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
7,00	CUBIERTAS	1,99%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
9,10	CARPINTERÍA METALICA	3,13%	10,00%	0,31%	$ 146.685,63	15,00%	0,47%	$ 220.028,45		
10,00	PISOS BASES	1,81%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA	0,11%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	1,66%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,54%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
13,00	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	3,74%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
15,00	PINTURAS	3,14%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
21,00	ASEO GENERAL	0,25%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.									
1,00	PRELIMINARES	0,82%	50,00%	0,41%	$ 192.864,00	55,00%	0,45%	$ 212.150,40		
2,00	CIMIENTOS	13,13%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
16,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,84%	70,00%	1,29%	$ 602.756,28	70,00%	1,29%	$ 602.756,28		
20,00	ANDENES Y SARDINELES	21,80%	25,00%	5,45%	$ 2.553.985,60	30,00%	6,54%	$ 3.064.782,72		
	SUBPROYECTO No.4 Cambio De Puerta En Lamina Para Baños Niños A La Salida Al Patio Trasero, Impermeabilizacion De Cubierta Del Pasillo Central. Instalacion De Canales En Lamina Y Bajantes.									
1,00	PRELIMINARES	0,88%	100,00%	0,88%	$ 410.241,90	100,00%	0,88%	$ 410.241,90		
6,00	PAÑETES	0,94%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
7,00	CUBIERTAS	10,13%	50,00%	5,07%	$ 2.373.617,32	51,00%	5,17%	$ 2.421.089,67		
9,20	CARPINTERIA METALICA	1,25%	20,00%	0,25%	$ 116.950,46	25,00%	0,31%	$ 584.752,30		
9,30	CARPINTERIA DE MADERA	0,10%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	1,33%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
12,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,65%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
13,00	PISOS,ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	0,84%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
15,00	PINTURAS	0,87%		0,00%	$ -		0,00%	$ -		
		TOTAL PESO	% PROGRAMADO		VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO		VALOR EJECUTADO		
-	TOTALES	100,00%	18,10%		$ 8.482.532,02	19,59%		$ 9.618.819,94		
			ADMINISTRACIÓN	16,00%	$ 1.357.205,12	ADMINISTRACIÓN	16,00%	$ 1.539.011,19		
			IMPREVISTOS	3,90%	$ 330.818,75	IMPREVISTOS	3,90%	$ 375.133,98		
			UTILIDAD	4,20%	$ 356.266,34	UTILIDAD	4,20%	$ 403.990,44		
			IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 67.690,61	IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 76.758,18		
			TOTAL PROGRAMADO		$ 10.594.512,84	TOTAL EJECUTADO		$ 12.013.713,73		
	PORCENTAJE DE ATRASO A LA FECHA 17 DE ENERO DE 2021		-1,49%		DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO			-$ 1.419.200,89		

SUBPROYECTO 1	13,00%	SUBPROYECTO 2	31,42%	SUBPROYECTO 3	37,59%	SUBPROYECTO 4	17,98%









10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **5. CDI OTUN 2**

FECHA	17/01/2021	PERÍODO DE OBRA No.	2	DEL	18/01/2021	AL	24/01/2021

***NOTA ACLARATORIA: El control de las actividades de la Ruta critica se ajustaron de acuerdo a los subproyectos aprobados por la interventoría y la entidad, asi mismo el cuadro de seguimiento general se ajustò con los flujos de inversiòn aprobados con el fin de realizar el control financiero para la sede CDI OTUN 2_ el Valor final aprobado para la ejecución de los subproyectos es $58.530.431**

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. El inicio de actividades de obra preliminares en la sedeCDI Otun 2 dieron inicio el dia 12 de enero de 2021.

03. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto , **las actividades programadas corresponden al 18,10% hasta el dia 24 de enero de 2021, y el avance real ejecutado es del 19,59%**


04. Dado lo anterior **la ejecuciòn de las actividades de obra para la sede CDI OTUN 2 presenta una avance de 1,49%,** correspondiente a la ejecución de actividades tales como mamposteròa, estructuras en concreto e impermeabilización de las cubiertas.

05. Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de $10,594,512,84** en contraste con **las actividades ejecutadas que representan un valor de $12,013,713,73**,45 es decir, una diferencia de **$1,419,200,89**

06. El avance evidenciado es minimo, no osbtante se indica la culminaciòn del proyecto dentro de los plazos establecidos con fecha final de entrega el dia 25 de febrero de 2021.

07. Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.

10. RESUMEN DE EJECUCIÓN

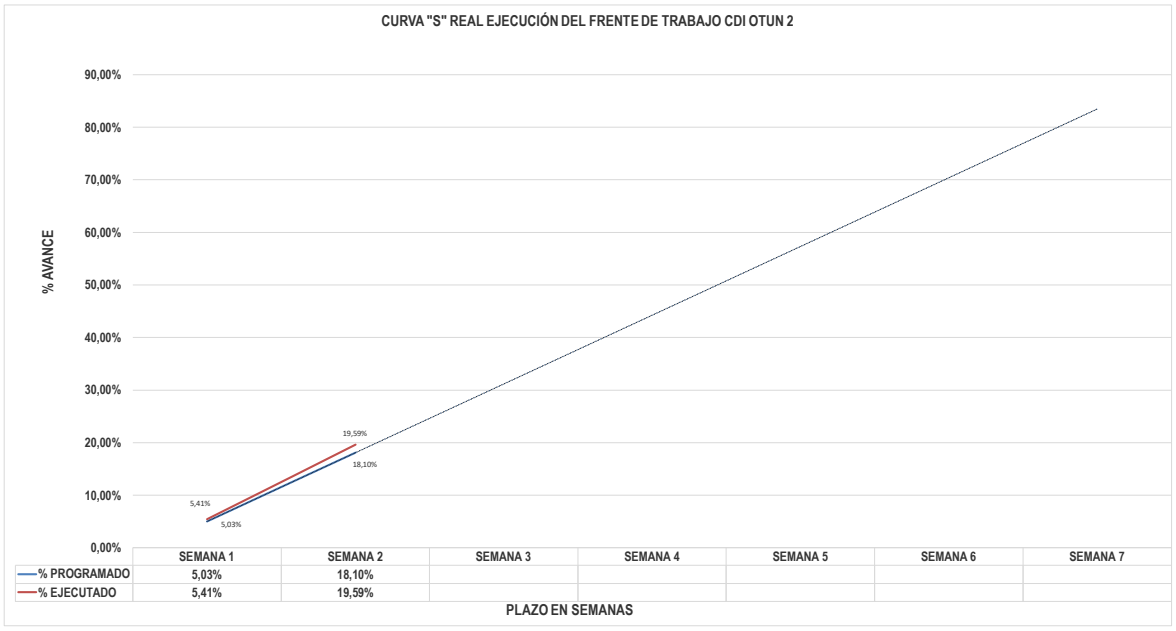

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
% PROGRAMADO	5,03%	18,10%					
% EJECUTADO	5,41%	19,59%					



	TOTAL SEDE	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR PROGRAMADO	$ 58.530.413,01	$ 10.594.512,84	$ 13.538.516,51	$ 12.013.713,73	$ 15.912.331,18
VALOR EJECUTADO	100%	23,13%	5,03%	19,59%	25,00%

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : PEDRO JOSE LEÓN DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
