NIÑO JESUS – QUIBDO

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO
96,54 %
AVANCE DE OBRA EJECUTADO
96,76%
AVANCE
0,22%



Remodelación baño 3er piso y relleno de piscina con acabado grama sintética.

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

05 ENTREGA DE SEDES TERMINADAS

Se radico oficio ante la entidad las fechas tentativas de la entrega de las sedes y se solicito el acompañamiento por parte de la entidad.

06 DOCUMENTACIÒN PENDIENTE

1. Entrega de informes semanales de obra.
recomendación: *Revisión de obligaciones contractuales y su cumplimiento.*
2. Formalizar por que no se ejecutó el cerramiento de obra provisional para aval de interventoría.
3. Remitir certificados de escombrera.
4. Entregar los correspondientes esquemas (formato dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en medio físico y magnético (CD).

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 19 GRUPO 4

AGENDA

05 de abril de 2021

01 PRESENTACIÓN
Asistentes

02 GENERALIDADES
Actividades de la semana

03 AVANCE CONTRATO
Porcentajes de avance por sede

04 ENTREGA DE SEDES TERMINADAS
Formalizar a la interventoría para coordinar recibo

05 DOCUMENTACIÒN PENDIENTE
Relación de cumplimiento de obligaciones contractuales

06 OBSERVACIONES FINALES
Cierre de Reunión y compromisos

1. Hogar Infantil Malhabar
Manizales
2. Hogar Infantil Pulgarcito
Manizales
3. Centro de Desarrollo Infantil Otún 2
Pereira
4. Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Colores
La Ceja, Antioquia
5.Hogar Infantil Niño Jesús
Quibdó

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

Contrato de obra No: 0101649-2020
CONSORCIO INGENIERIA X

Logia 3

Contrato de Interventoría No:
0101646-2020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

BIENESTAR FAMILIAR

Entidad ICBF.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

03 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

02 GENERALIDADES

Actividades realizadas a la fecha

DESCRIPCIÓN	FECHA
01. Revisión de pre - actas	30-marzo-2021
02. Radicación de acta de comité No. 18	30-marzo-2021
03. Se llevo a cabo el comité No. 17	24-marzo-2021

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO
93,00%
AVANCE DE OBRA EJECUTADO
96,00%
AVANCE
3,00%

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Plazo inicial	6 MESES(182)	Plazo Actualizado	CINCO MESES VEINTE DIAS (172)
Fecha de inicio	6 de noviembre de 2020	Fecha de inicio	6 de noviembre de 2020
Fecha finalización actualizada	06 de mayo de 2021	Fecha finalización actualizada	26 de abril de 2021
Plazo Transcurrido	152 días equivalente al 85% del plazo	Plazo Transcurrido	152 días equivalente al 89% del plazo
Faltan	30 días	Faltan	20 días
Valor inicial	$ 249.043.319,00	Valor inicial	$ 733.959.553,00
Valor Etapa No. 1	$ 70.915.135,93 Pagado.	Valor Etapa No.1	$ 94.195.674
Valor Etapa No. 2	$177.466.318,40	Valor Etapa No. 2	$ 638.149.842
Valor Adición	$122.001.795	Valor Adición	$193.402.561
Valor Total contrato	$371.045.114	Valor Total contrato	$927.362.114

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

MALHABAR – MANIZALES

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO

97,63 %





AVANCE DE OBRA EJECUTADO

98,70%

AVANCE

1,07%






Terminación de Instalación de cielo raso y luminarias, instalación de puertas en aulas, desmonte, suministro e instalación de malla eslabonada.

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

CDI OTUN 2 – PEREIRA

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO
92,50 %
AVANCE DE OBRA EJECUTADO
95,00%
AVANCE
2,50%



Instalación de Piso Caucho granulado

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

MUNDO DE COLORES – LA CEJA ANTIOQUIA

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO
92,76 %
AVANCE DE OBRA EJECUTADO
94,55 %
AVANCE
1,79 %



avances de Instalación eléctrica y terminación de cubierta.


LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®


NIÑO JESUS – QUIBDO


AVANCE DE OBRA PROGRAMADO
96,76 %

AVANCE DE OBRA EJECUTADO
98,12%

AVANCE
1,36%

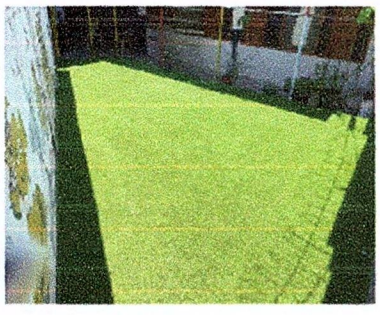

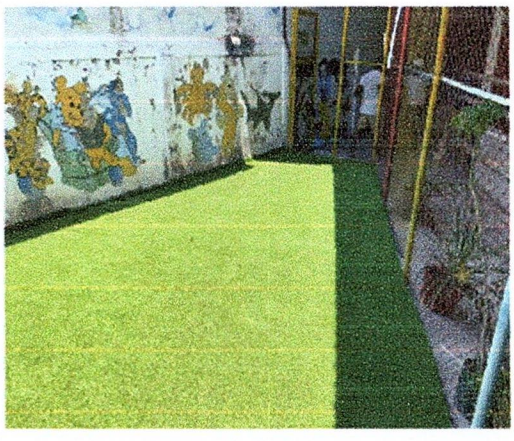

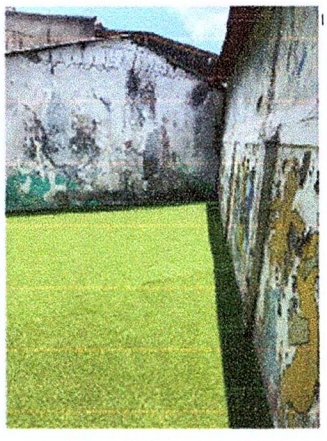

Remodelación baño 3er piso y relleno de piscina con acabado grama sintética.

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

05 ENTREGA DE SEDES TERMINADAS

Se radico oficio ante la entidad las fechas tentativas de la entrega de las sedes y se solicito el acompañamiento por parte de la entidad. Pendiente definir con apoyo a la Supervisión.

06 DOCUMENTACIÒN PENDIENTE

1. Entrega de informes semanales de obra e informe mensual de obra.

recomendación: ***Revisión de obligaciones contractuales y su cumplimiento.***

2.Formalizar por que no se ejecutó el cerramiento de obra provisional para aval de interventoría.

3.Remitir certificados de escombrera.

4.Entregar los correspondientes esquemas (formato dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en medio físico y magnético (CD).

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 20 GRUPO 4

AGENDA

14 de abril de 2021

01 PRESENTACIÓN
Asistentes

02 GENERALIDADES
Actividades de la semana

03 AVANCE CONTRATO
Porcentajes de avance

04 ENTREGA DE SEDES TERMINADAS
Avance por sedes

05 RECIBO INTERVENTORIA Y ENTIDAD
Entrega de sedes

06 DOCUMENTACIÒN PENDIENTE
Relación de cumplimiento de obligaciones contractuales

1. Hogar Infantil Malhabar
Manizales
2. Hogar Infantil Pulgarcito
Manizales
3. Centro de Desarrollo Infantil Otún 2
Pereira
4. Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Colores
La Ceja, Antioquia
5.Hogar Infantil Niño Jesús
Quibdó

Cierre de Reunión y compromisos

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

Contrato de obra No: 0101649-2020
CONSORCIO INGENIERIA X

Logia 3

Contrato de Interventoría No:
0101646-2020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

BIENESTAR FAMILIAR

Entidad ICBF.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

INTERVENTORÍA

Plazo inicial	6 MESES(182)
Fecha de inicio	6 de noviembre de 2020
Fecha finalización actualizada	06 de mayo de 2021
Plazo Transcurrido	152 días equivalente al 90% del plazo
Faltan	20 días
Valor inicial	$ 249.043.319,00
Valor Etapa No. 1	$ 70.915.135,93 Pagado.
Valor Etapa No. 2	$177.466.318,40
Valor Adición	$122.001.795
Valor Total contrato	$371.045.114

CONTRATO DE OBRA

Plazo Actualizado	CINCO MESES VEINTE DIAS (172)
Fecha de inicio	6 de noviembre de 2020
Fecha finalización actualizada	26 de abril de 2021
Plazo Transcurrido	152 días equivalente al 94% del plazo
Faltan	12 días
Valor inicial	$ 733.959.553,00
Valor Etapa No.1	$ 94.195.674 Pagado
Valor Etapa No. 2	$ 638.149.842
Valor Adición	$193.402.561
Valor Total contrato	$927.362.114

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

02 GENERALIDADES

Actividades realizadas a la fecha

DESCRIPCIÓN	FECHA
01. Radicación acta de comité No. 19	09-abril-2021
02. Radicación informes semanales de obra de las sedes	09-abril-2021
03. Radicación de informes semanales de interventoría	09-abril-2021

03 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO
95,00%
AVANCE DE OBRA EJECUTADO
98,70%
AVANCE
3,70%

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

04 SEDES TERMINADAS

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	AVANCE
98,80 %	100,00%	1,20%

MALHABAR – MANIZALES

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	AVANCE
96,20 %	98,45%	2,25%

CDI OTUN - PEREIRA

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	AVANCE
98,70 %	99,25%	0,55%

MUNDO DE COLORES -ANTIOQUIA

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	AVANCE
98,70 %	100%	1,30%

NIÑO JESÚS-QUIBDO

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

CDI OTUN 2 – PEREIRA



05 RECIBO INTERVENTORIA Y ENTIDAD

Pendiente definir fechas de entrega con apoyo a la Supervisión.

06 DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

1.Formalizar por que no se ejecutó el cerramiento de obra provisional para aval de interventoría.
2.Remitir certificados de escombrera.
3.Entregar los correspondientes esquemas (formato dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en medio físico y magnético (CD).

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ®

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

ANEXO No. 6
REGISTROS FOTOGRÁFICOS


Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

ANEXO No. 6.1
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
SEDE PULGARCITO - MANIZALES

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021
SEDE PULGARCITO - MANIZALES

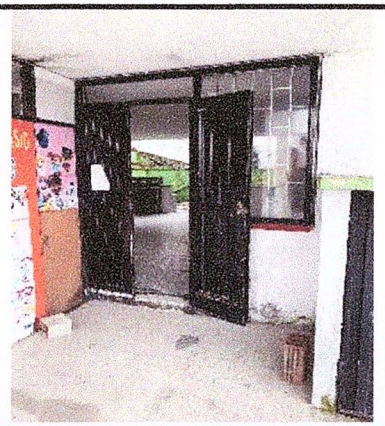ESPACIO INTERVENIDO ANTES	ESPACIO INTERVENIDO DESPUÉS
	

1	Cambio de puerta metalica de las mismas condiciones para garantizar seguridad

2	Suministro e instalaciòn de canal y bajante de agua lluvia.


212

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021





3	Cambio de ventanerìa tipo reja en vidrio, por ventanas en cuerpo fijo con ventanas corredizas.

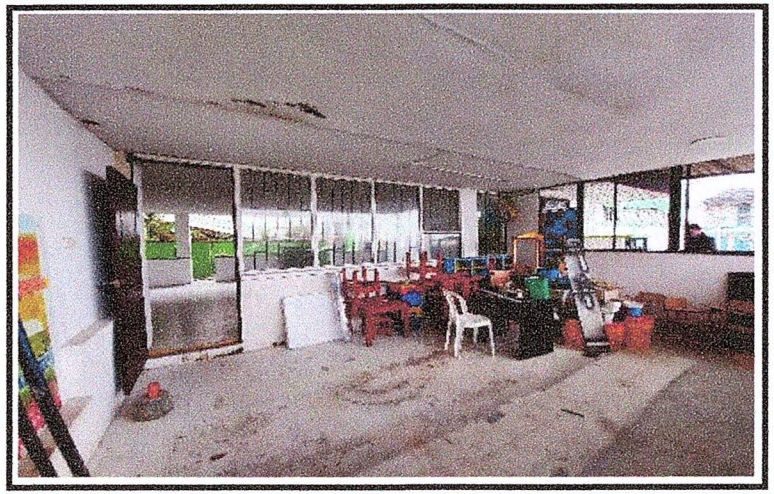





4	Suministro e instalaciòn de cielo raso y sobrepiso con enchape a nivel de área de comedor

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021



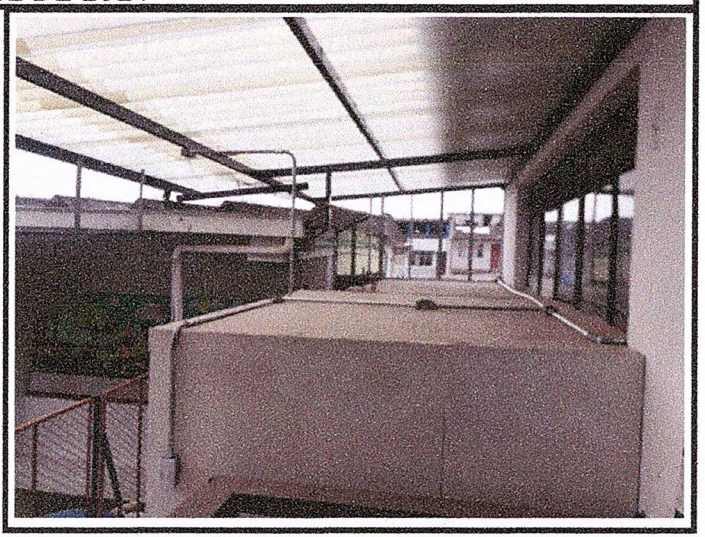

5	Desmonte, suministro e instalaciòn de cubeirta traslúcida sobre áre a de enfermería.

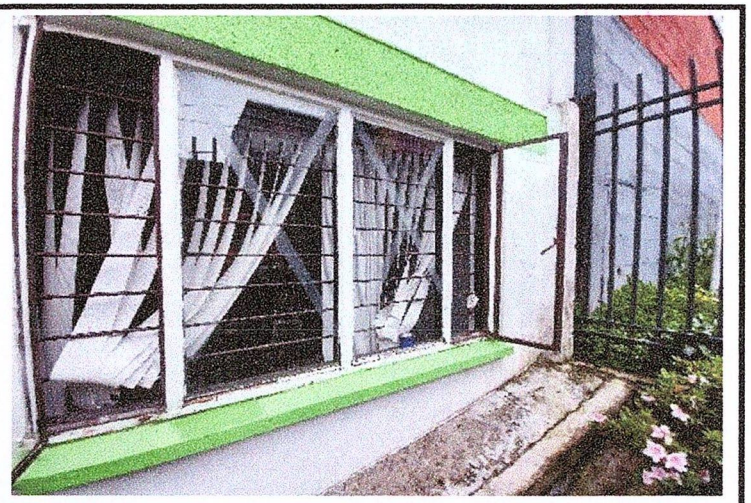




6	Cambio de ventanería de la fachada principal, con reja de seguridad.

214


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021



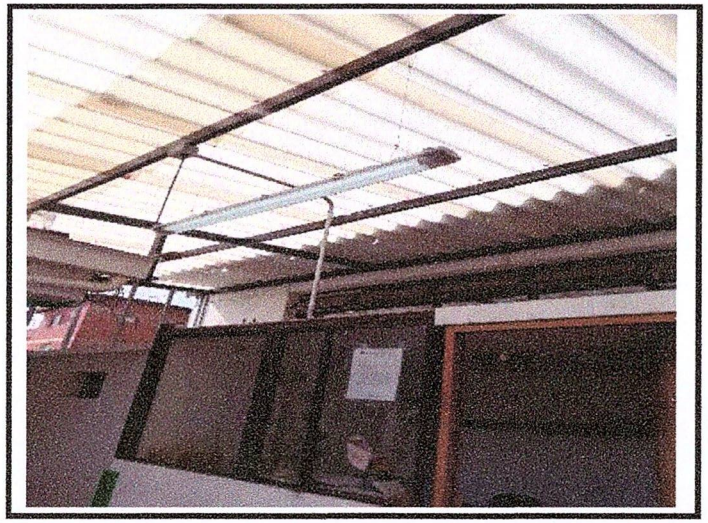

7	Desmonte, suministro e instalaciòn de cubeirta traslúcida sobre áre a de lavandería



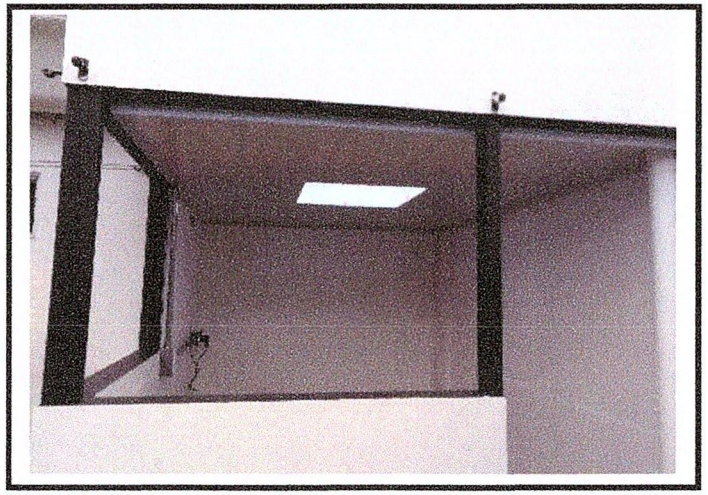


8	Cambio de cielo raso en área de lactancia, cambio de luminaria y adiciòn de puntos eléctricos

215

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021



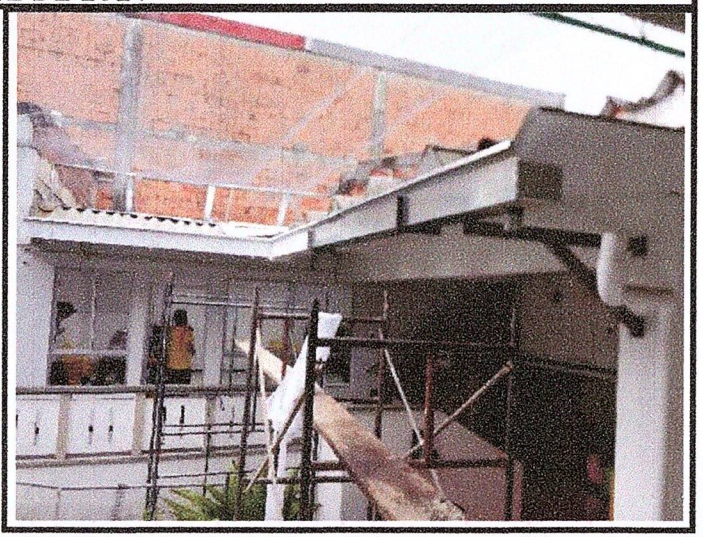

9	suministro de canales y bajantes de mayor capacidad área de patio principal






10	Cambio de ventanas en àrea de cocina hacia el patio posterior.

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8


ANEXO No. 6.2
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
SEDE MALHABAR - MANIZALES

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021
SEDE MALHABAR - MANIZALES

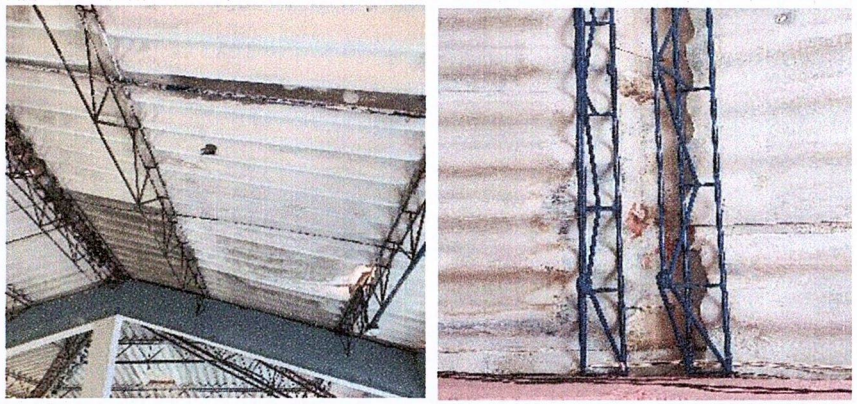ESPACIO INTERVENIDO ANTES	ESPACIO INTERVENIDO DESPUÉS
	

1	Cambio de cubierta existente de fibrocemento por teja termoacùstica

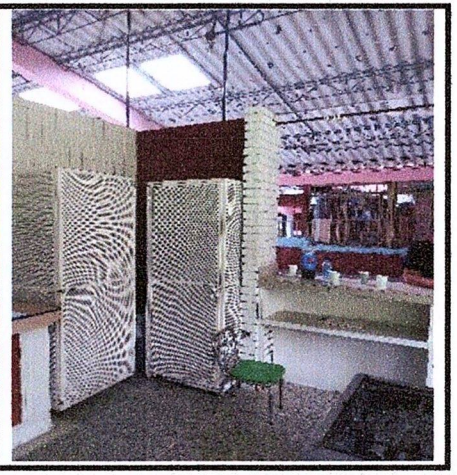2	Remodelaciòn completa cocina


218


REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021






3	Cambio de ventanería deteriorada por nueva carpinteria metalica con reja de seguridad

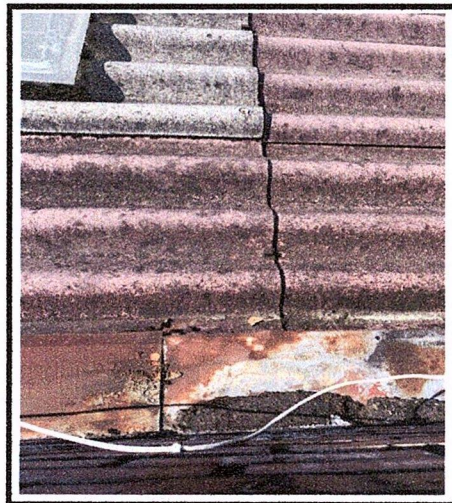




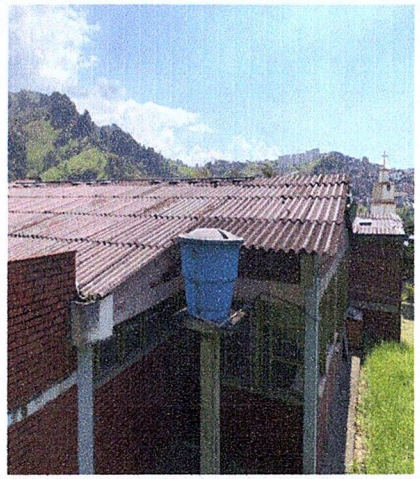


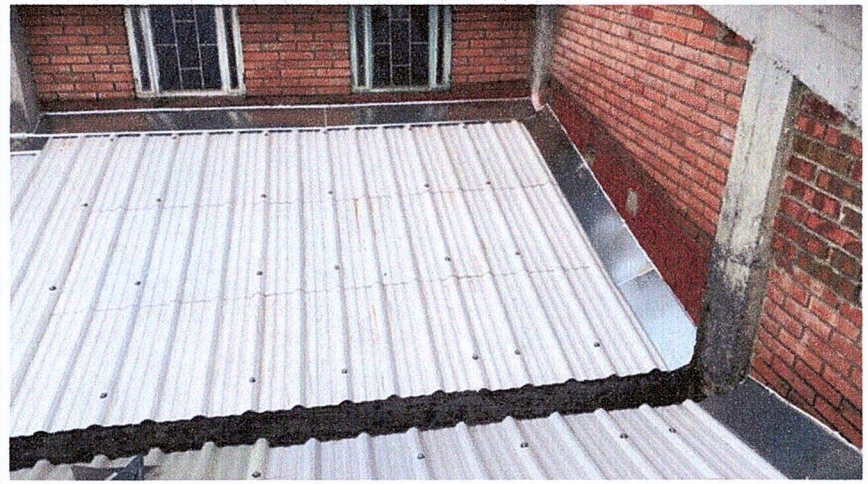


4	Instalación de flanches en cubierta


219

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

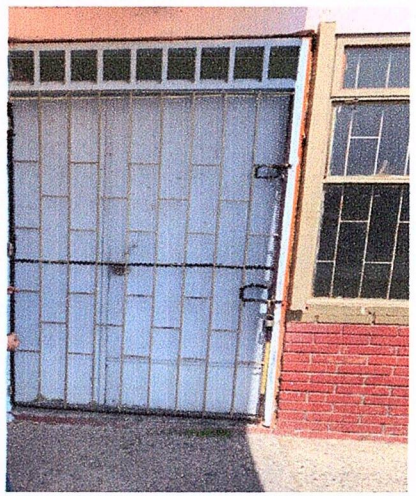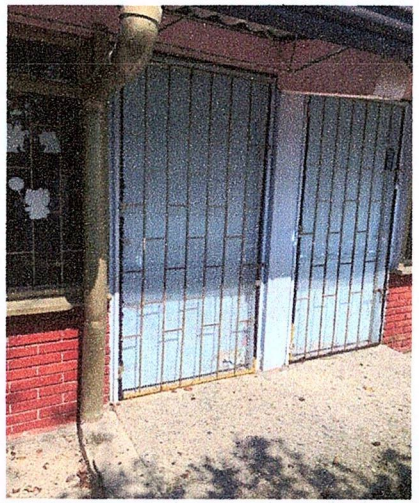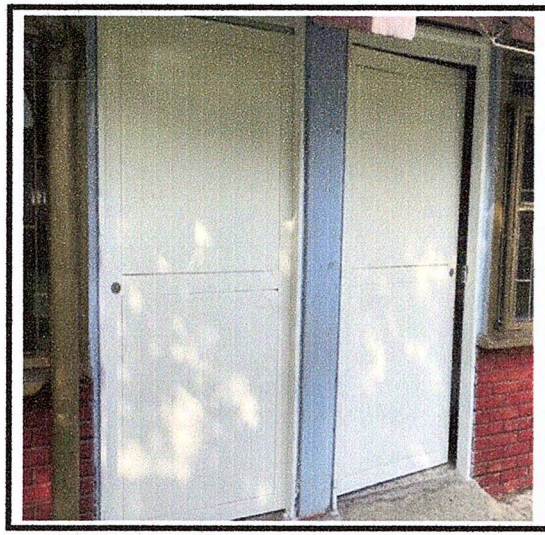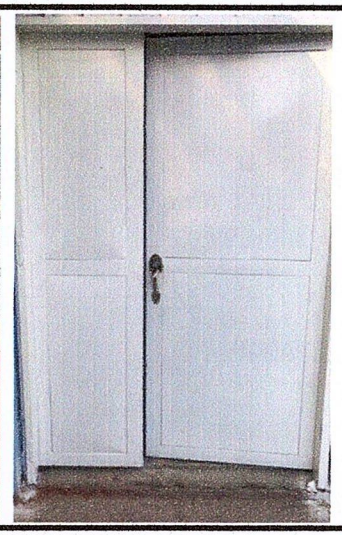5	Desmonte, cambio de puerta tipo reja por puertas fijas metálicas





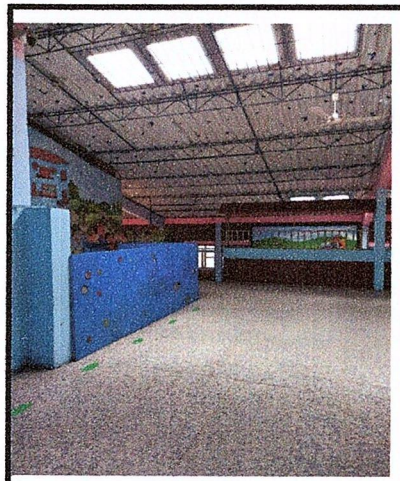



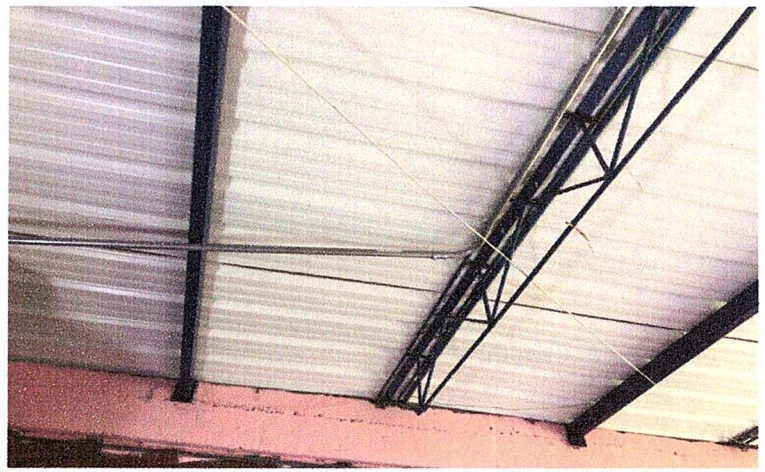
6	Completar estructura metálica de la cubierta para el traslapo de la cubierta termoacústica.

220

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

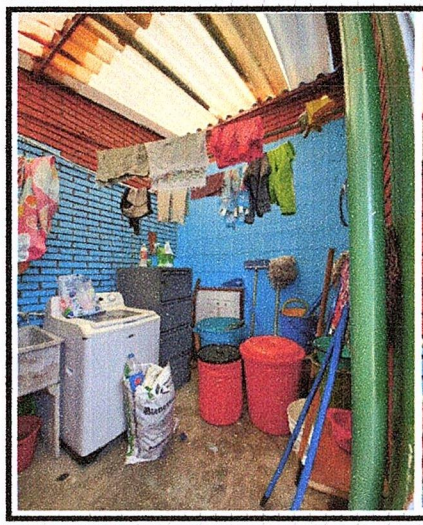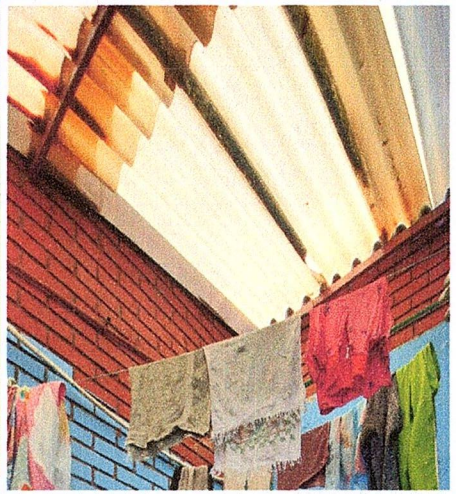
7	Cambio de cubierta traslùcida en área de lavanderia




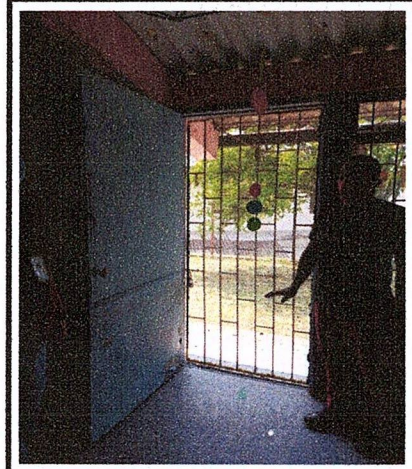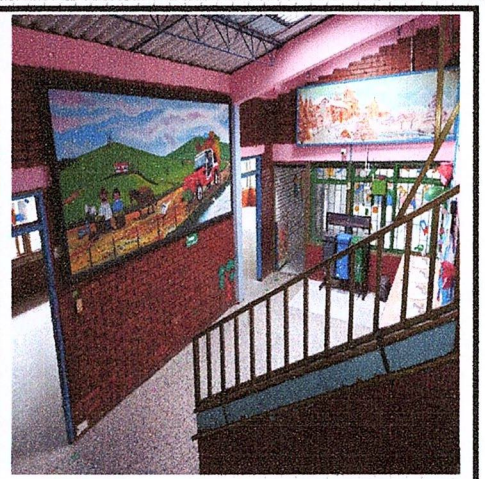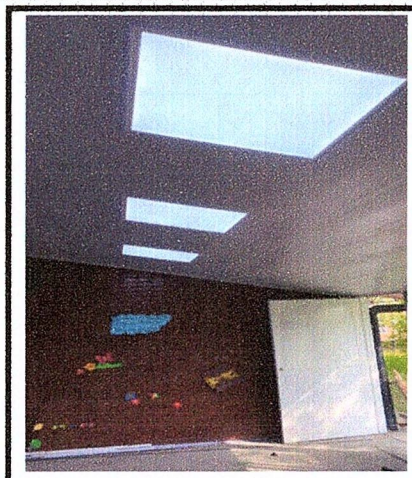


8	Suministro e instalaciòn de luminarias en aulas de clase, debido a la mala calidad lùminica del espacio.

221

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

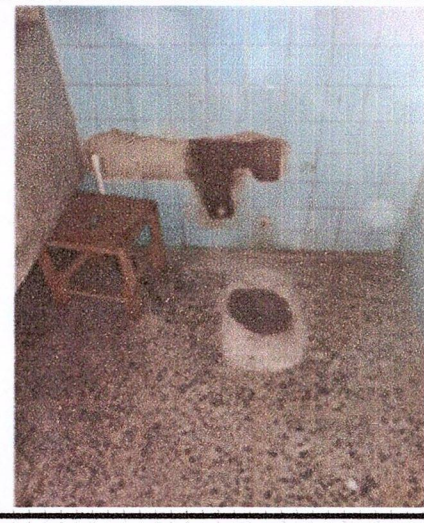



9	Retiro de baño fuera de servicio para adecuar área de aseo complementaria a la cocina







10	Desmonte de malla eslabonada en mal estado, suministro e instalaciòn de malla nueva con sus respectivos soportes.



222

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8


ANEXO No. 6.3
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
SEDE NIÑO JESÚS - QUIBDÓ

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021
SEDE NIÑO JESÚS - QUIBDÓ

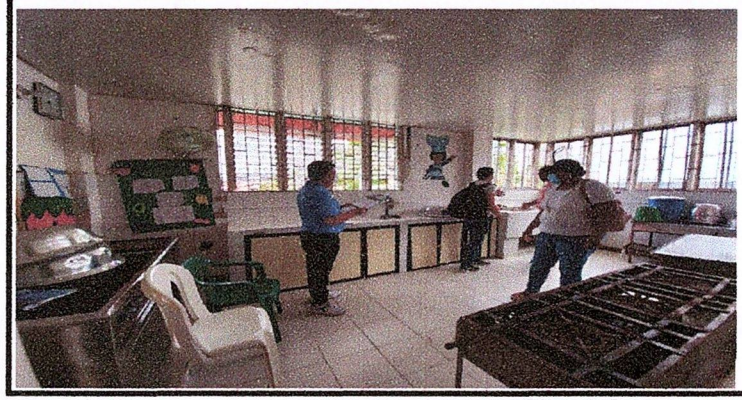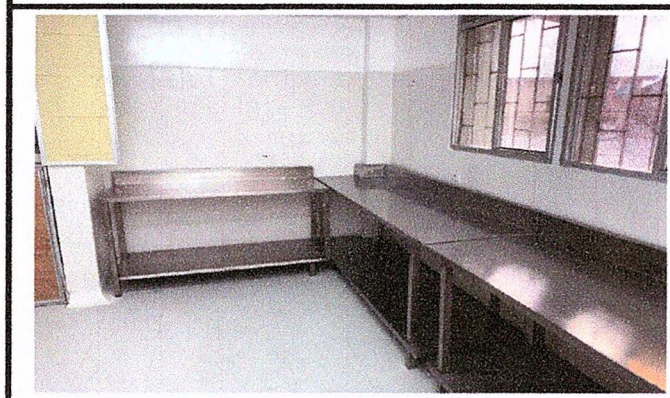ESPACIO INTERVENIDO ANTES	ESPACIO INTERVENIDO DESPUÉS
	


1	Remodelaciòn completa Cocina, desmonte de mesones en concreto y siministro de mesones en acero inoxidable

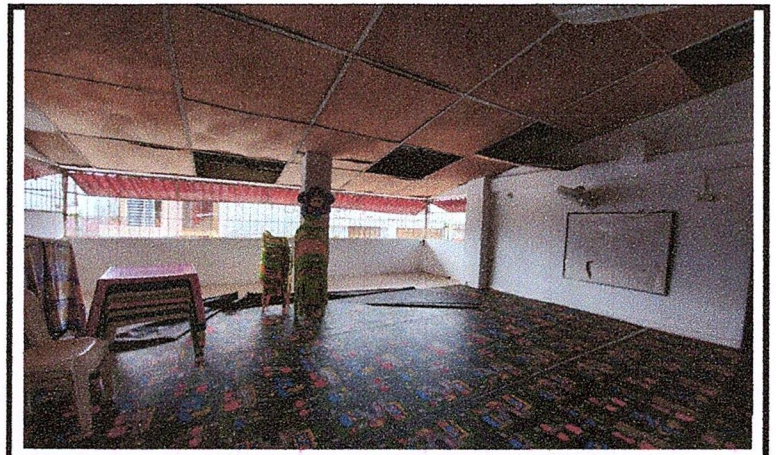2	Suministro e instalaciòn de cielo raso e iluminaciòn.

224


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021



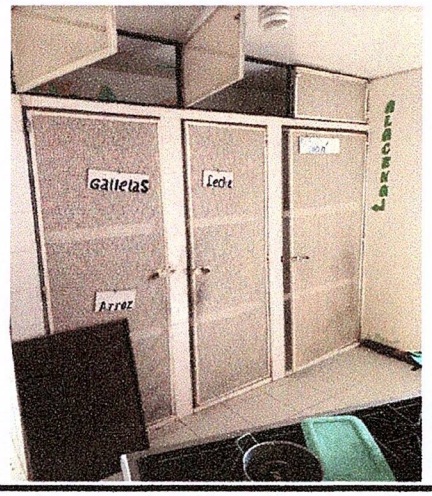


3	suministro e instalación de puertas para la Despensa.



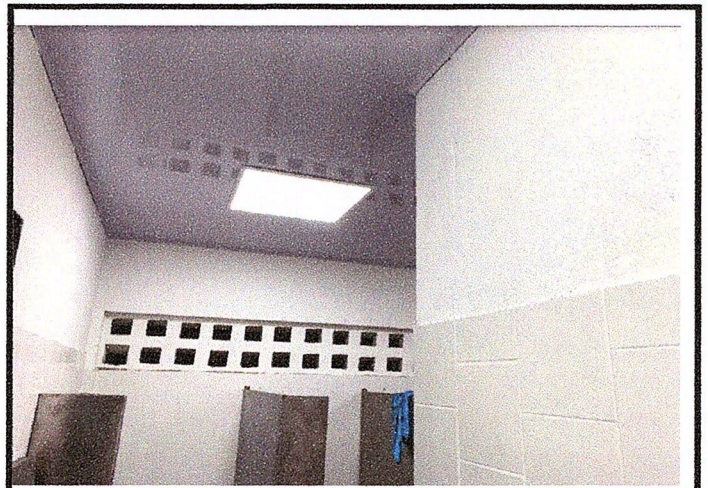


4	Remodelaciòn de Baños infantiles segundo piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

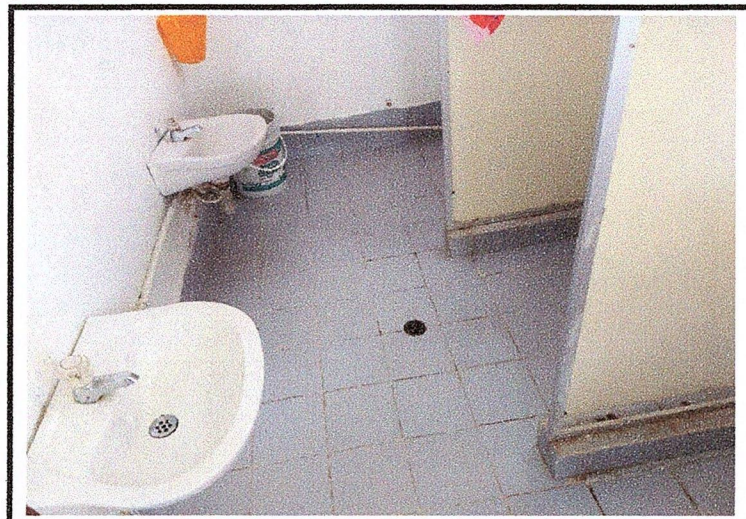



5	Remodelación de baños infantiles áreas de salones 2do piso

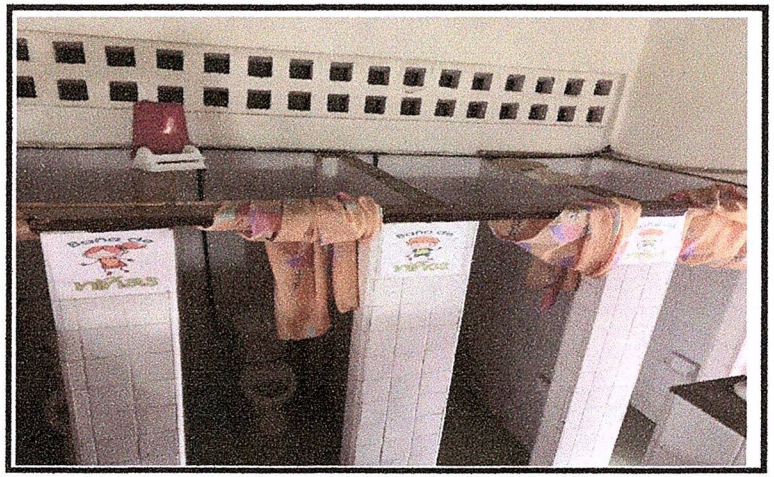




6	Demoliciòn de mamposteria, para suministro de nuevos sanitarios y divisiones metálicas.

226

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021



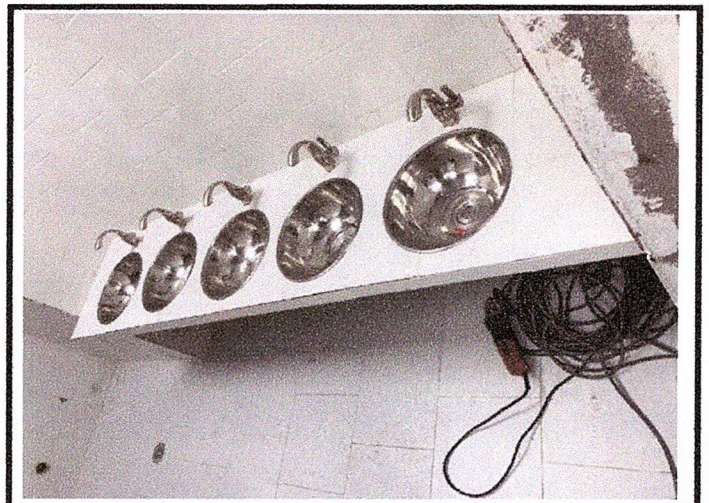


7	Demoliciòn, suministro e instalaciòn de lavamanos baños infantiles 2do piso.







8	Pintura de fachada exterior del Hogar infantil

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

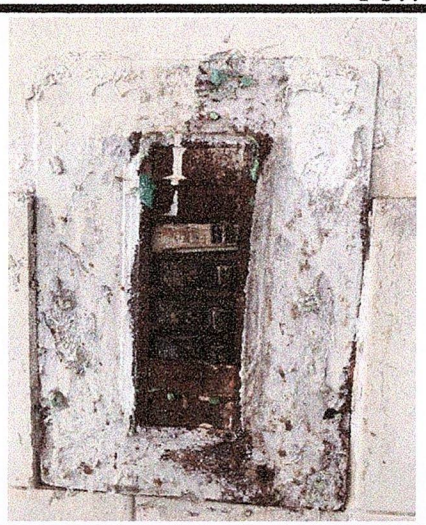

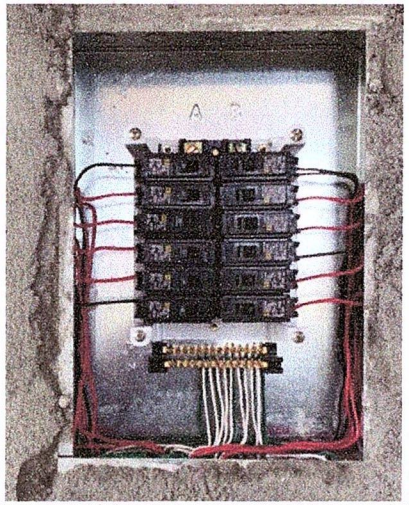

9	Cambio de Tablero electrico y adición de nuevo circuito electrico para iluminaciòn.

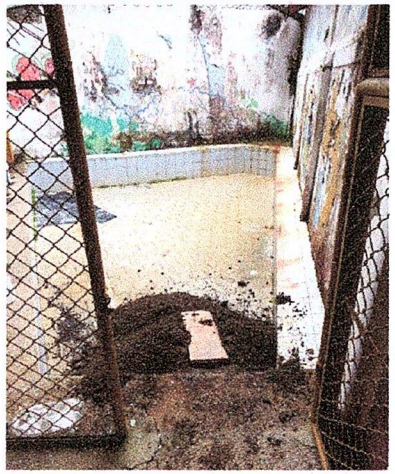



10	Relleno de piscina e instalación de grama sintetica.



228

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8


ANEXO No. 6.4
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
SEDE CDI OTUN 2 - PEREIRA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021
SEDE CDI OTÙN 2- PEREIRA

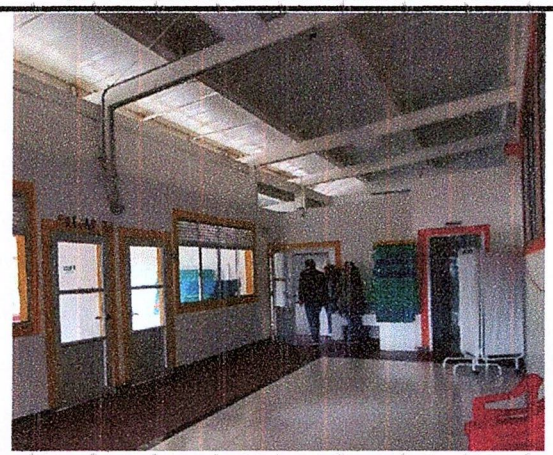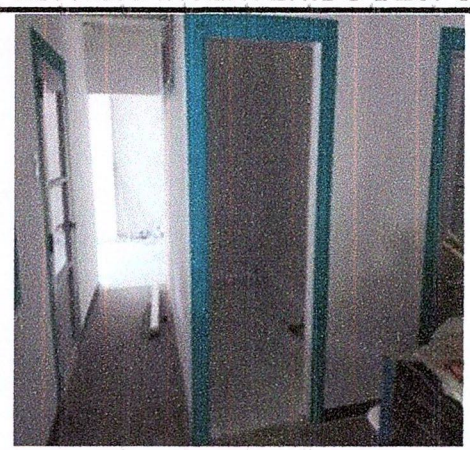ESPACIO INTERVENIDO ANTES	ESPACIO INTERVENIDO DESPUÉS
	

1	Construcción para ampliar área de enfermería

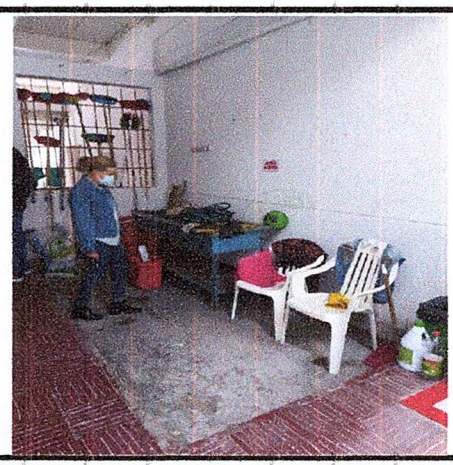2	construcción de área para bodega lavandería.

23


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021





3	Cerrar muro tipo reja, para adecuar bodega como aula nueva y aumentar capacidad de atenciòn




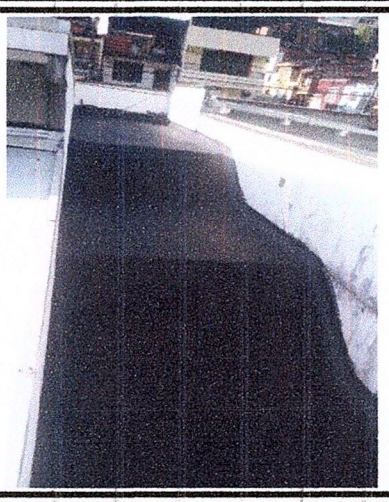


4	Impermeabilizaciòn de la cubierta sobre ciruclaciòn principal


231

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

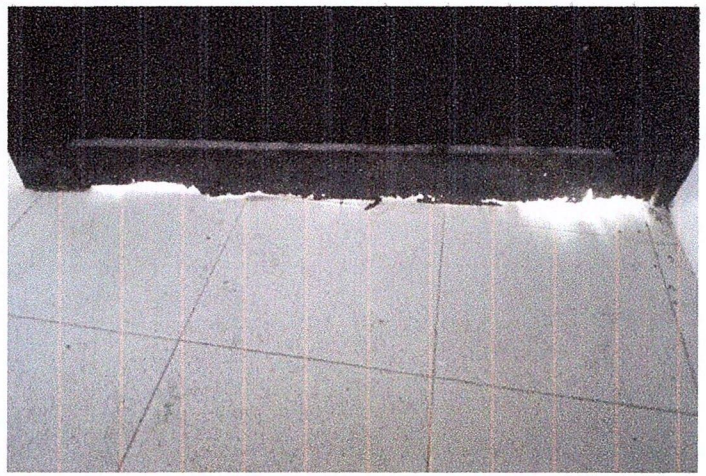

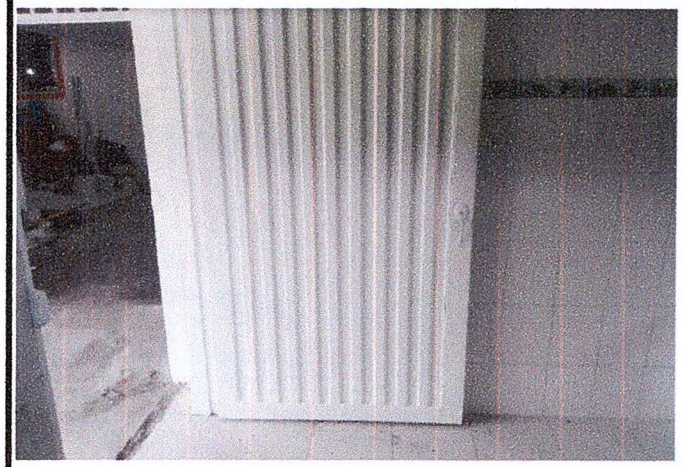

5	Cambio de puerta deteriorada en área de baños infantiles

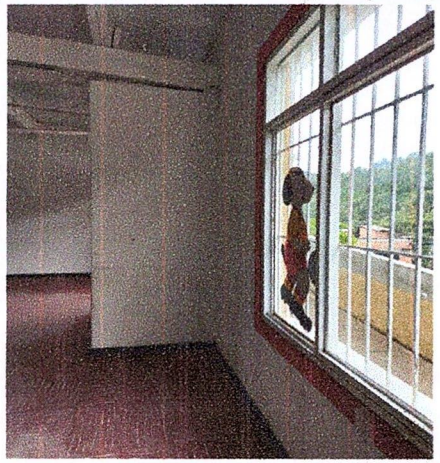





6	Demolición de mochetas en aulas para ampliar espacio util


232

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

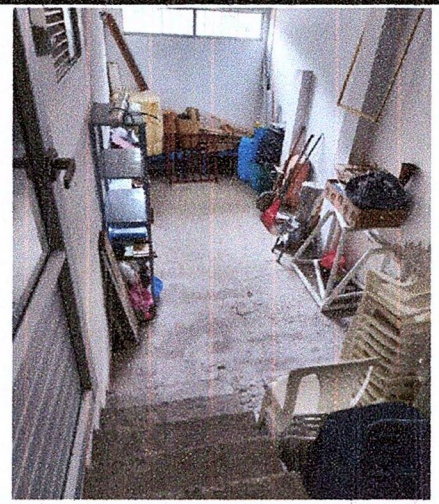

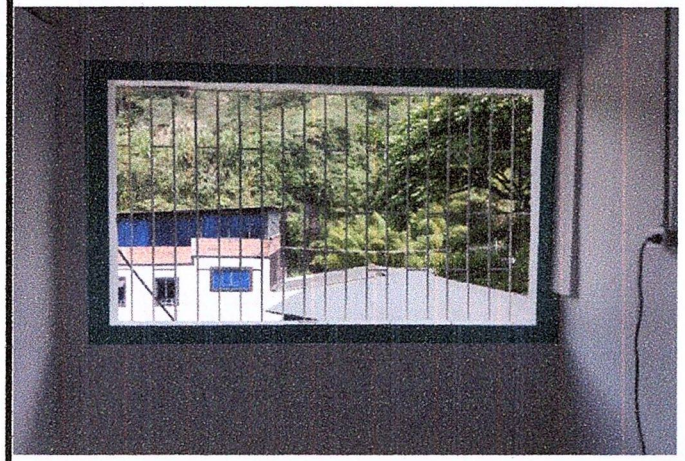

7	Ampliar vano de ventana de bodega actual para mejorar las condiciones de iluminaciòn del aula nuev

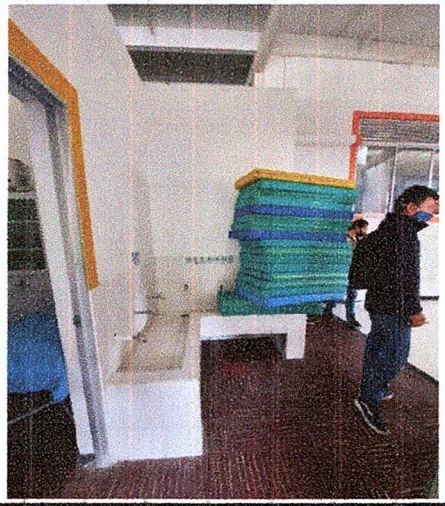





8	Desmonte de lavamanos para ampliaciòn de área de enfermerìa.


233

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

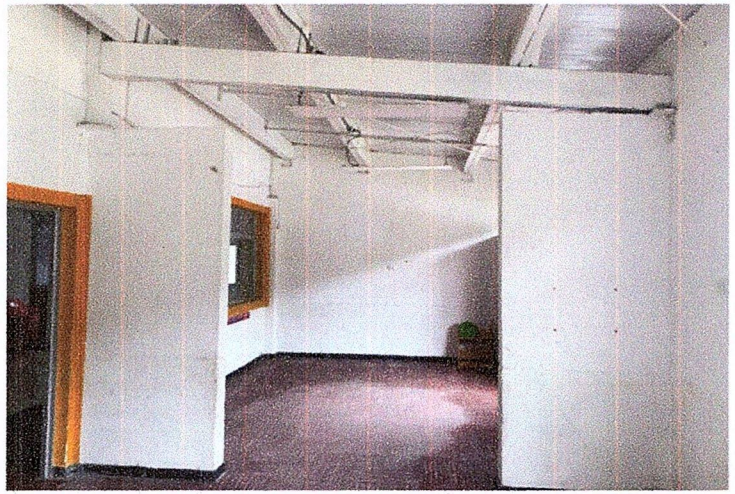

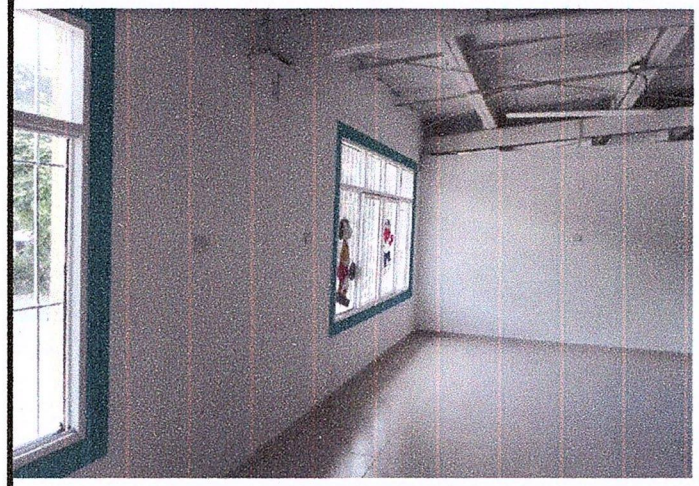

9	Demoliciòn de mechetas en aulas para ampliar espacio util y adecuaciòn de puntos eléctricos.

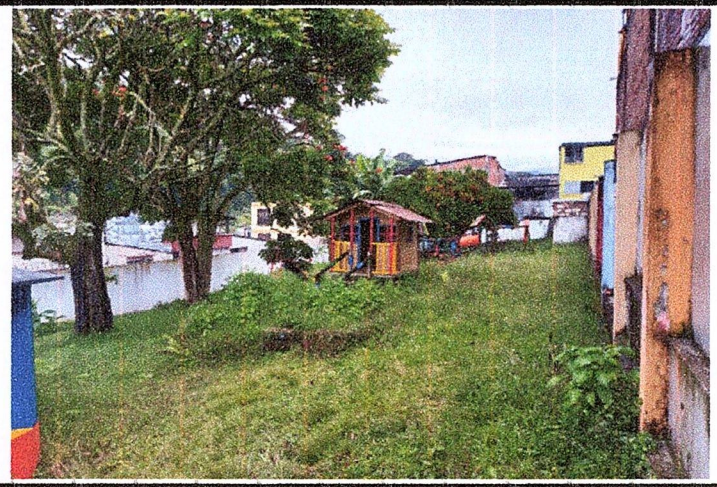





10	construcción de senderos y placas de concreto para reubicar zona de juegos infantiles.

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8


ANEXO No. 6.5
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
SEDE CDI MUNDO DE COLORES – LA CEJA, ANTIOQUIA

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021
SEDE CDI MUNDO DE COLORES- LA CEJA, ANTIOQUIA

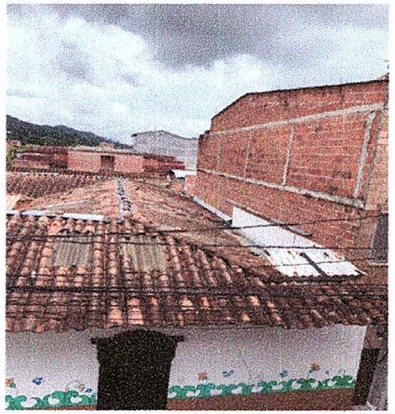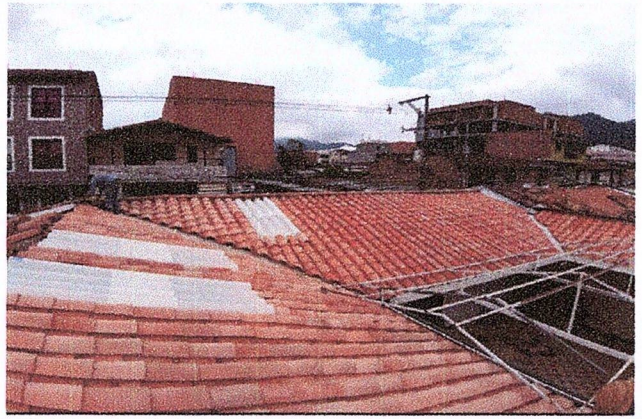ESPACIO INTERVENIDO ANTES	ESPACIO INTERVENIDO DESPUÉS
	


1	Desmonte de cubierta en mal estado e instalaciòn de nueva teja de barro e impermeabilizaciòn.

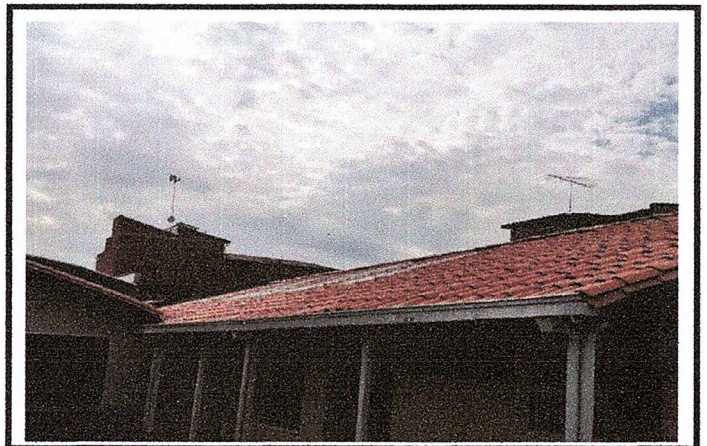
	

2	Cambio de canales y bajantes en área frente a parque infantil

236

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

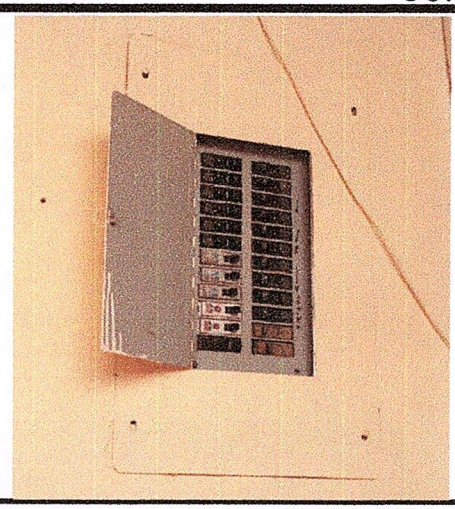

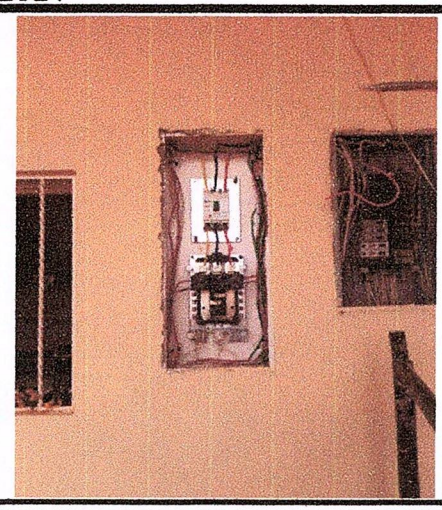

3	Nuevo tablero electrico para nuevos circuitos de iluminaciòn en áulas de desarrollo y patio principal







4	Cambio de aparatos sanitarios

237


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

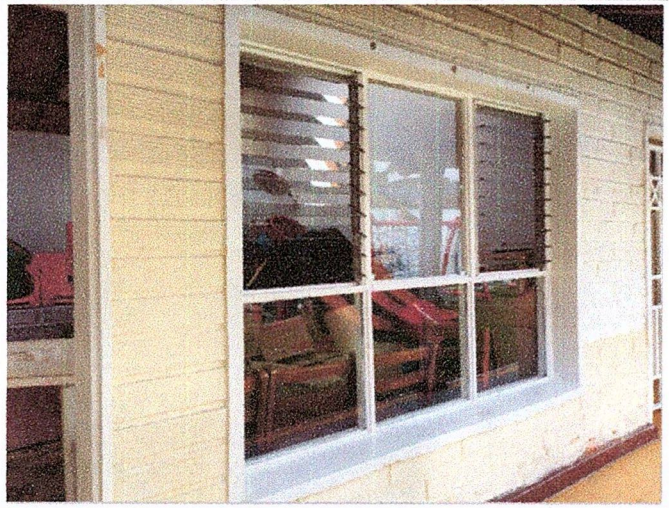

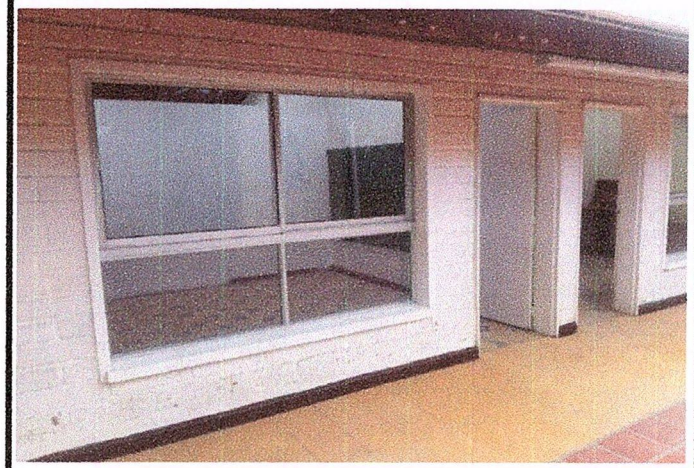

5	Cambio de la carpintería metálica (ventanas) dejando un cuerpo fijo con ventana corrediza.







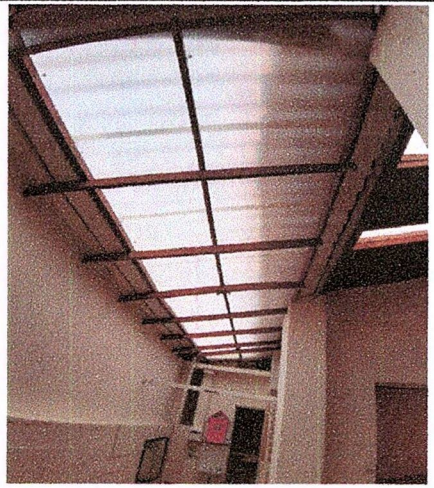



6	Cambio de teja traslucida en àrea de salones frente a patio principal

233

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021

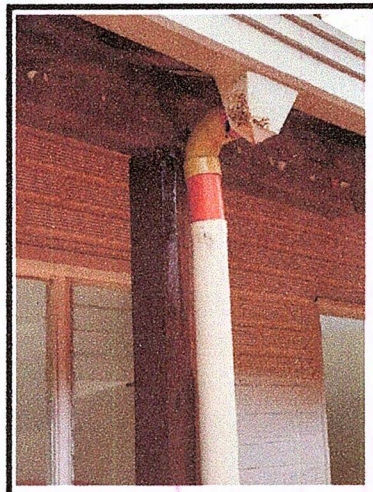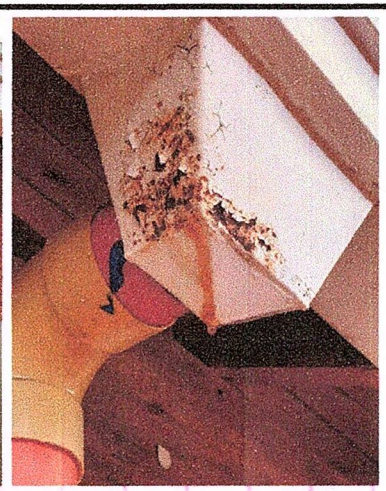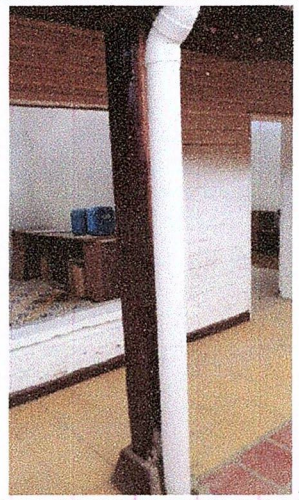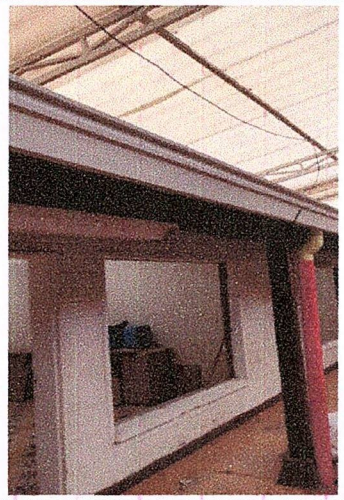7	cambio de canales y bajantes en patio frente a comedor


8	suministro e instalación de estructura metalica y teja traslúcida para recuperar espacio de huerta

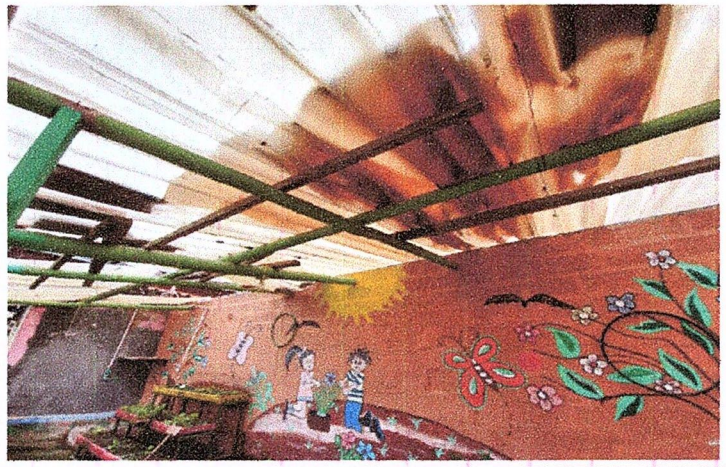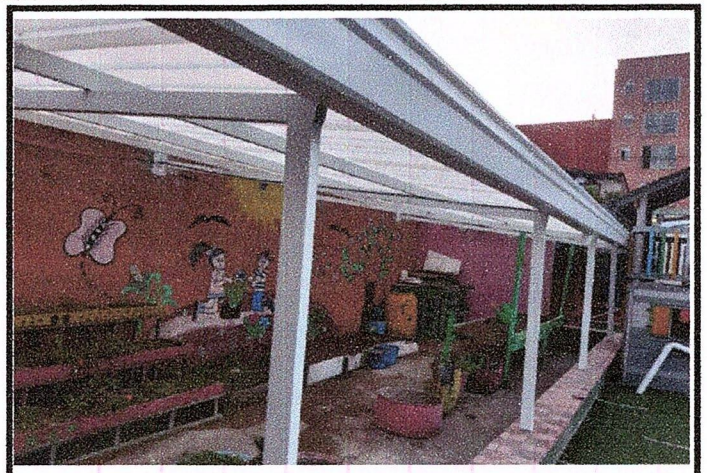
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01016462020
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CORTE 15 DE ABRIL DE 2021





9	Relleno de piscina e instalaciòn de gramá sintética.

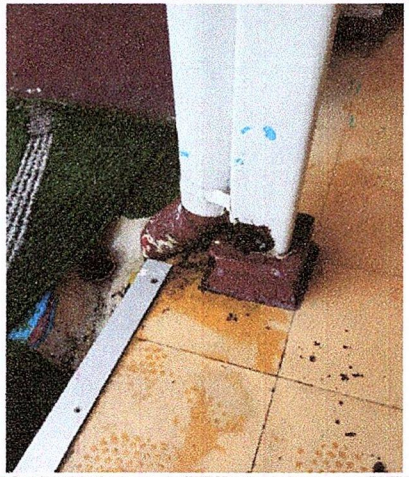

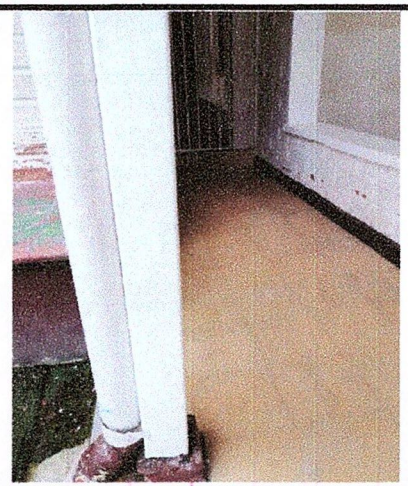

10	Cambio de columnas en madera deterioradas por nuevas columnas en madera con pintura.

243
